INFORME AVANCE DE OBRA
(01/06/2026 – 30/06/2026)

INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S - INTERCONS DE COLOMBIA SAS.

OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META

CONTRATO DE OBRA No 324 DEL DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE 2026

INTERVENTORIA:
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS
RL. LINA LORENA SALGADO GARCIA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONTRATO 4
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
4. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO 6
5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA. 7
6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7
7. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 8
Personal Operativo. *8*
Personal que desistió *8*
8. PÓLIZAS Y GARANTIAS 8
Perfeccionamiento del contrato. *8*
Póliza según acta de inicio *9*
9. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO. 10
10. AVANCE MENSUAL 12
11. TOTAL, EJECUTADO PROGRAMADO VS EJECUTADO. 15
12. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS. 16
13. CONCLUSIONES 22

1. INTRODUCCIÓN

Por medio de este documento, se detallan las actividades ejecutadas, en el marco del desarrollo de la obra correspondiente al contrato de obra No. 324 de 2026. Este contrato tiene como objetivo principal **"OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META".**

En esta instancia, el contratista **INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**. presenta las actividades ejecutadas, evidenciando el avance financiero, el avance físico y el informe de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONTRATO

El municipio de Acacías se encuentra localizado en el departamento del Meta, en la región centro-suroriental del mismo. En una zona de transición entre piedemonte llanero y llanura aluvial. Geográficamente, se ubica en las coordenadas 3°59'20" de latitud norte y 73°45'53" de longitud oeste, con una altitud promedio de 498 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Villavicencio, al sur con San Martín, al oriente con Castilla La Nueva y al occidente con El Calvario. Su acceso principal se realiza por la vía nacional que conecta Villavicencio con los municipios del sur del Meta.

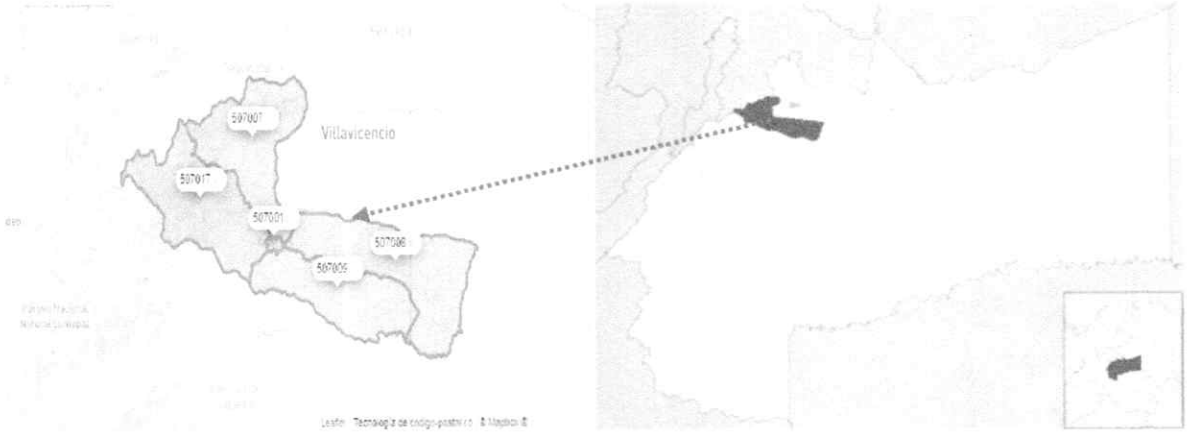


Ilustración 1. Localización Geográfica del Departamento del Meta y Municipio de Acacías.

Límites del municipio
Norte: Villavicencio
Oriente: Castilla La Nueva
Occidente: El Calvario
Sur: San Martin



Ilustración 2 Ubicación Proyecto, Puesto de Montelíbano.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto denominado "Obra de Adecuaciones Menores para el Puesto de Salud de Montelíbano en el Municipio de Acacías, Meta" surge como respuesta a la necesidad institucional de garantizar la prestación eficiente, continua y segura de los servicios de atención primaria en salud a la población del centro poblado de Montelíbano y su área de influencia. La intervención se fundamenta en el deber constitucional y legal del Estado de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, así como en las obligaciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura física destinada a la atención de la comunidad.

El estudio previo evidenció que la infraestructura existente, con un área aproximada de 222,95 m² y más de una década de funcionamiento, presentaba deterioros significativos asociados a filtraciones, humedades, daños en cielorrasos, deficiencias en la cubierta, desgaste de acabados y obsolescencia de las redes hidrosanitarias y eléctricas, condiciones que limitaban la adecuada prestación de los servicios de salud y afectaban directamente los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad requeridos para la atención de los usuarios. Estas circunstancias incrementaban el riesgo sanitario, reducían la capacidad operativa del establecimiento y generaban barreras de acceso para la población beneficiaria.

En este contexto, la intervención fue concebida como una estrategia de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de primer nivel, orientada a recuperar las condiciones físicas y funcionales del puesto de salud mediante la ejecución de actividades de demolición y desmontaje controlado, mejoramiento de elementos estructurales y de cimentación, renovación integral de cubiertas, construcción e instalación de cielorrasos, adecuación de acabados arquitectónicos, modernización de las redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, instalación de aparatos sanitarios y ejecución de actividades complementarias de limpieza y puesta en funcionamiento.

Desde el punto de vista de planeación, el proyecto se encuentra articulado con los instrumentos de desarrollo nacional, departamental y municipal, particularmente con las políticas de aseguramiento y prestación integral de los servicios de salud, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura pública destinada a la atención de aproximadamente 1.600 habitantes entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Asimismo, la inversión busca garantizar el cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por la normatividad vigente, especialmente los contemplados en la Resolución 3100 de 2019, promoviendo espacios seguros, funcionales y adecuados para la prestación de servicios asistenciales.

4. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El Puesto de Salud de Montelibano, con una construcción aproximada de 222,95 m² distribuidos en una sola planta y una antigüedad estimada de 12 años, presenta un deterioro significativo en su infraestructura, evidenciado principalmente por afectaciones de humedad en el cielo raso, filtraciones en cubierta y otras patologías constructivas que comprometen la prestación adecuada de los servicios de salud y atención primaria a la comunidad de la vereda Montelibano y su área de influencia.

Con el fin de restablecer las condiciones óptimas de funcionamiento del puesto de salud, el contrato contempla la ejecución de las siguientes intervenciones, organizadas por capítulos de obra:

Desmontes y demoliciones: retiro de lavamanos, desmonte de cielo raso en drywall, teja de fibrocemento y estructura metálica de cubierta, demolición de pañete de muros y placa aligerada, cortes en mampostería y retiro de puntos de iluminación existentes.
Excavaciones y rellenos: excavación manual, relleno compactado y transporte y disposición final de escombros.
Cimentación: construcción de placa de contrapiso, bordillos fundidos, solado de limpieza, zapatas, vigas, columnas, muros en ladrillo y alfajías, todos en concreto de 3.000 PSI.
Estructuras metálicas: suministro e instalación de acero de refuerzo, cerramiento en malla eslabonada y estructura metálica de cubierta en acero estructural ASTM A500.
Pañete: aplicación de mortero 1:4 impermeabilizado en muros exteriores y culatas, y mortero 1:4 en muros interiores con filos y dilataciones.
Pintura: aplicación de pintura vinilo tipo coraza en exteriores, vinilo tipo 1 de alta calidad en interiores, impermeabilización de fachadas con Masterseal 485, sellador hidroprotector transparente y esmalte sintético para ventanas.
Cielo raso: suministro e instalación de cielo raso en PVC de 10 mm con estructura de soporte y accesorios, en un área de 162,43 m².
Cubierta: suministro e instalación de cubierta tipo sándwich calibre 26 prepintada sobre los 222,95 m² del área total de la edificación.
Red hidráulica: instalación de tubería y accesorios PVCP, válvulas de corte y tanque séptico tipo Imhoff ovoide de 2.000 litros.
Red sanitaria: instalación de tuberías PVCS de 2" y 6", salidas sanitarias y accesorios.
Red eléctrica interna: acometida parcial, salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra, tomas GFCI, salidas de lámparas LED, paneles LED de 60x60W y redondos de 18W, e instalación de electrobomba Barnes.
Aparatos sanitarios: instalación de lavamanos con grifería, juego de incrustaciones, rejilla anticucarachas y espejos.

Aseo y limpieza: limpieza de pisos, senderos y muros con hidrojet para entrega y puesta en funcionamiento.

El alcance total de la intervención busca garantizar que el puesto de salud cuente con espacios óptimos y seguros para la prestación de servicios primarios de salud, beneficiando a una población aproximada de 1.600 habitantes entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores del centro poblado de Montelibano y su área de influencia.

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 800.037.021.7
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META".
CONTRATO NO:	324 DE 2026
FECHA	16 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE LA OBRA:	INTERCONS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.849.552-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO POSADA VARELA CC. Nº 1.094.921.302 de Armenia
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 323.330.566,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	04 DE MAYO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 1 Información del contratista.

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO:	334 DEL 29 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORIA INTEGRAL, (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANC\ERA Y JURIDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIN MENOR DEL CENTRO MONTELIBANO DE ACACIAS, META.**
CONTRATISTA	**EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS** NIT: 901.629.216-3
REPRESENTANTE LEGAL	**LINA LORENA SALGADO GARCIA** CC. 1.122.647.270 de Restrepo.
SUPERVISOR	**HUGO FERNANDO ROJAS OSPINA**
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($16.665.289,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 2 Información del contrato Interventoría

7. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

N°.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	% DEDICACION
1	JUAN CAMILO POSADA VARELA	1.094.921.302	RESIDENTE DE OBRA	100%
2	WILLIAM ANDRES OVIEDO ARIAS	4.617.487	RESIDENTE DE OBRA	100%

Tabla 3.Personal Administrativo

Personal Operativo.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JOSE ALEJANDRO MOSQUERA POSADA	1113791483	AYUDANTE
2	DIEGO FERNANDO VERGARA BARBOSA	16550585	OFICIAL DE OBRA
3	JAISSON PAEZ MARQUEZ	86071378	AYUDANTE

Tabla 4 Personal Operativo.

Personal que desistió.

N°.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETIRO
1	JUAN CAMILO POSADA VARELA	1.094.921.302	RESIDENTE DE OBRA	04/05/2026	02/06/2026

8. PÓLIZAS Y GARANTIAS

En cumplimiento de lo establecido en la minuta contractual No 324 se establecieron las respectivas pólizas de cumplimiento con la Compañía de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA como se detalla a continuación:

Perfeccionamiento del contrato.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**320-47-994000037497**
ANEXO N°	**1**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**320-74-994000016255**
ANEXO N°	**1**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Tabla 5 Pólizas según minuta.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/04/2026	16/12/2026	$64.666.113,20
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	16/04/2026	16/08/2029	$16.166.528.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMAPARA 5 AÑOS		$32.333.056,60
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/04/2026	16/08/2026	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16/04/2026	16/08/2026	$350,181,000.00
RESPOSABILIDAD CIVIL PATRONAL	16/04/2026	16/08/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16/04/2026	16/08/2026	$350,181,000.00

Tabla 6 Amparos según minuta.

Póliza según acta de inicio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**320-47-994000037497**
ANEXO N°	**2**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**320-74-994000016255**
ANEXO N°	**2**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Tabla 7 Pólizas según acta de inicio.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/05/2026	04/01/2027	$64.666.113,20
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/05/2026	04/09/2029	$16.166.528.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMAPARA 5 AÑOS		$41.992.100,50
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/08/2026	03/09/2026	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16/08/2026	03/09/2026	$350,181,000.00
RESPOSABILIDAD CIVIL PATRONAL	16/08/2026	03/09/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16/08/2026	03/09/2026	$350,181,000.00

Tabla 8 Garantías según acta de inicio.

9. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO.

OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**				
1.01	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	11,56	$ 1.729,00	$ 19.987,00
1.02	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$ 32.517,00	$ 195.102,00
1.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	162,43	$ 8.549,00	$ 1.388.614,00
1.04	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222,95	$ 14.662,00	$ 3.268.893,00
1.05	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	537,84	$ 13.007,00	$ 6.995.685,00
1.06	DEMOLICION MECÁNICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E= 0.45 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	23,39	$ 198.000,00	$ 4.630.824,00
1.07	DESMONTE DE PUNTO DE ILUMINACIÓN	UN	42,00	$ 21.678,00	$ 910.476,00
1.08	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222,95	$ 18.922,00	$ 4.218.660,00
2.00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	12,65	$ 73.164,00	$ 925.429,00
2.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	7,39	$ 73.636,00	$ 543.949,00
2.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	464,40	$ 1.723,00	$ 800.161,00
3.00	**CIMENTACIÓN**				
3,01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,76	$ 869.600,00	$ 663.809,00
3,02	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	5,13	$ 142.441,00	$ 730.722,00
3,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,43	$ 682.607,00	$ 290.688,00
3,04	PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	M2	2,84	$ 1.591,00	$ 4.517,00
3,05	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,70	$ 988.895,00	$ 690.249,00
3,06	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,44	$ 1.059.849,00	$ 462.359,00
3,07	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,22	$ 1.434.240,00	$ 313.740,00
3,08	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	4,89	$ 143.896,00	$ 703.076,00
3,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,09	$ 1.924.017,00	$ 181.300,00
4.00	**ESTRUCTURAS METALICAS**				
4,01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	283,85	$ 8.362,00	$ 2.373.514,00
4,02	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE	M2	10,47	$ 137.281,00	$ 1.437.332,00

	AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
4,03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	1.194,32	$ 31.896,00	$ 38.093.910,00
5.00	**PAÑETE**				
5,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	178,40	$ 38.830,00	$ 6.927.272,00
5,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	359,44	$ 27.728,00	$ 9.966.552,00
6.00	**PINTURA**				
6,01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	178,40	$ 14.860,00	$ 2.651.024,00
6,02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	359,44	$ 12.387,00	$ 4.452.383,00
6,03	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	178,40	$ 34.765,00	$ 6.202.076,00
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	178,40	$ 36.532,00	$ 6.517.309,00
6,05	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	25,31	$ 24.267,00	$ 614.076,00
7	**CIELO RASO**				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 10 MM, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS DE INSTALACION	M2	162,43	$ 238.965,00	$ 38.815.085,00
8	**OBRAS EN CUBIERTA**				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	222,95	$ 232.292,00	$ 51.789.501,00
9	**RED ELECTRICA INTERNA**				
9,01	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 5.463,00	$ 76.482,00
9,02	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9,00	$ 17.590,00	$ 158.310,00
9,03	VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 128.271,00	$ 256.542,00
9,04	TANQUE SÉPTICO TIPO IMHOFF OVOIDE VERDE 2000 LT SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 2.488.240,00	$ 2.488.240,00
10	**RED SANITARIA**				
10,01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7,45	$ 29.434,00	$ 219.283,00
10,02	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,48	$ 112.166,83	$ 1.287.675,00
10,03	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 118.904,00	$ 118.904,00
10,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	1,00	$ 69.035,00	$ 69.035,00
10,05	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 11.066,00	$ 88.528,00
10,06	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 161.645,30	$ 323.291,00
11	**RED ELECTRICA INTERNA**				
11,01	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	165,37	$ 116.462,00	$ 19.259.321,00
11,02	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	24,00	$ 122.078,00	$ 2.929.872,00
11,03	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	$ 178.596,00	$ 892.980,00
11,04	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	7,00	$ 243.154,00	$ 1.702.078,00
11,05	PANEL LED 60X60 W	UN	9,00	$ 143.184,00	$ 1.288.656,00
11,06	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	29,00	$ 49.840,00	$ 1.445.360,00
11,07	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	$ 4.589.414,00	$ 4.589.414,00
12	**APARATOS SANITARIOS**				
12,01	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	5,00	$ 544.399,00	$ 2.721.995,00
12,02	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	1,00	$ 121.453,00	$ 121.453,00
12,03	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	1,00	$ 21.545,00	$ 21.545,00
12,04	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4,90	$ 160.512,00	$ 786.509,00
13	**ASEO Y LIMPIEZA**				
13,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	117,95	$ 6.836,00	$ 806.306,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 239.430.053,00**
ADMINISTRACION (A) %					$ 67.040.414,84
IMPREVISTOS (I) %					$ 4.788.601,06
UTILIDAD (U) %					$ 11.971.502,65
COSTOS INDIRECTOS					$ 83.800.518,55
VALOR TOTAL					**$ 323.230.572,00**

10. AVANCE MENSUAL

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026 se ejecutaron las actividades de obra correspondientes al proyecto "Obra de Adecuación Menor del Centro de Salud Montelibano", ubicado en el municipio de Acacías, departamento del Meta, abarcando la totalidad de los capítulos previstos en el presupuesto contractual: desmonte y demoliciones, excavaciones y rellenos, cimentación, estructuras metálicas y refuerzo, pañetes, pintura e impermeabilización, obras en cubierta y carpintería metálica e hidrosanitaria.

En primer lugar se adelantaron los trabajos preliminares de desmonte y demolición, que habilitaron los frentes de trabajo para el resto de actividades. Estos incluyeron el corte vertical en mampostería con cortadora para delimitar las zonas de intervención, el desmonte de dos lavamanos con su traslado al sitio de acopio, el retiro del cielo raso en drywall en un área de 162,43 m², el desmonte de la cubierta existente en teja de fibrocemento sobre 222,95 m², la demolición manual del pañete de muros en 537,84 m² con su respectivo trasiego y cargue, y el desmonte de 39 puntos de iluminación previo a la intervención de redes eléctricas. Los escombros y sobrantes generados por estas actividades fueron transportados y dispuestos en escombrera autorizada, gestionando un volumen de 464,40 m3/km.

En cuanto a la cimentación, se fundió el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI y se instaló el plástico polietileno calibre 6 como barrera de vapor, sobre los cuales se construyó la placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI mezclado en obra, con un volumen de 0,76 m³, reforzada con 120 kg de acero Fy=4200 MPa suministrado, figurado, armado y colocado en obra. Adicionalmente, se instaló un cerramiento en malla eslabonada galvanizada tipo ciclón, con postes de línea en tubería galvanizada de 2" y pie de amigo en ángulo galvanizado, sobre un área de 10,47 m².

En los acabados, se aplicó pañete en mortero 1:4 sobre 57,00 m² de muros exteriores y culatas, incorporando aditivo impermeabilizante, y sobre 7,00 m² de muros interiores, incluyendo el tratamiento de filos y dilataciones. Posteriormente se ejecutó el sistema de protección e impermeabilización de fachadas mediante la aplicación de Masterseal 485 y un sellador hidroporotector tipo Sika transparente sobre 178,40 m², seguido de la pintura vinilo tipo coraza en tres manos sobre esa misma área en fachada y pintura vinilo tipo 1 de alta calidad sobre 359,44 m² en muros interiores.

En cubierta se suministró e instaló un sistema tipo sándwich en lámina calibre 26 prepintada con núcleo aislante en icopor, sobre un área de 100,00 m², en reemplazo de la cubierta en fibrocemento previamente desmontada, constituyendo la actividad de mayor incidencia económica del periodo. Finalmente, en redes hidrosanitarias se suministraron e instalaron dos válvulas de corte de 1" en las baterías intervenidas.

El valor total de las actividades ejecutadas durante el periodo, incluyendo costos directos e indirectos (administración, imprevistos y utilidad), ascendió a $84.230.763,00, cifra que corresponde al valor total contractual del proyecto.

OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META					
CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.00	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**				
1.01	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	11,56	$ 1.729,00	$ 19.987,00
1.02	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 32.517,00	$ 65.034,00
1.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	162,43	$ 8.549,00	$ 1.388.614,00
1.04	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222,95	$ 14.662,00	$ 3.268.893,00
1.05	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	537,84	$ 13.007,00	$ 6.995.685,00
1.07	DESMONTE DE PUNTO DE ILUMINACIÓN	UN	39,00	$ 21.678,00	$ 845.442,00
2.00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	464,40	$ 1.723,00	$ 800.161,00
3.00	**CIMENTACIÓN**				
3,01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,76	$ 869.600,00	$ 663.809,00


3,03	SOLADO,LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000PSI)	M3	0,27	$ 682.607,00	$	184.304,00
3,04	PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	M2	2,84	$ 1.591,00	$	4.517,00
4.00	**ESTRUCTURAS METALICAS**					
4,01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	120,00	$ 8.362,00	$	1.003.440,00
4,02	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	10,47	$ 137.281,00	$	1.437.332,00
5.00	**PAÑETE**					
5,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	57.00	$ 38.830,00	$	2.213.310,00
5,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	7.00	$ 27.728,00	$	194.096,00
6.00	**PINTURA**					
6,01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	178,40	$ 14.860,00	$	2.651.024,00
6,02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	359,44	$ 12.387,00	$	4.452.383,00
6,03	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	178,40	$ 34.765,00	$	6.202.076,00
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	178,40	$ 36.532,00	$	6.517.309,00
8	**OBRAS EN CUBIERTA**					
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA.INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	100,00	$ 232.292,00	$	23.229.200,00
9	**CARPINTERIA METALICA**					

9,03	VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 128.271,00	$	256.542,00
				COSTOS DIRECTOS	**$**	**62.393.158,00**
				ADMINISTRACION (A) %	$	17.470.084,24
				IMPREVISTOS (I) %	$	1.247.863,16
				UTILIDAD (U) %	$	3.119.657,90
				COSTOS INDIRECTOS	$	21.837.605,30
				VALOR TOTAL	**$**	**84.230.763,00**

Tabla 9 Presupuesto contractual.

- Se ha verificado un avance acumulado **financiero del 26.06%** en diversas actividades acumuladas, contempladas en el proyecto, correspondiente a la fase de obra civil, la cual forma parte integral de los ítems contratados.

11. TOTAL, EJECUTADO PROGRAMADO VS EJECUTADO.

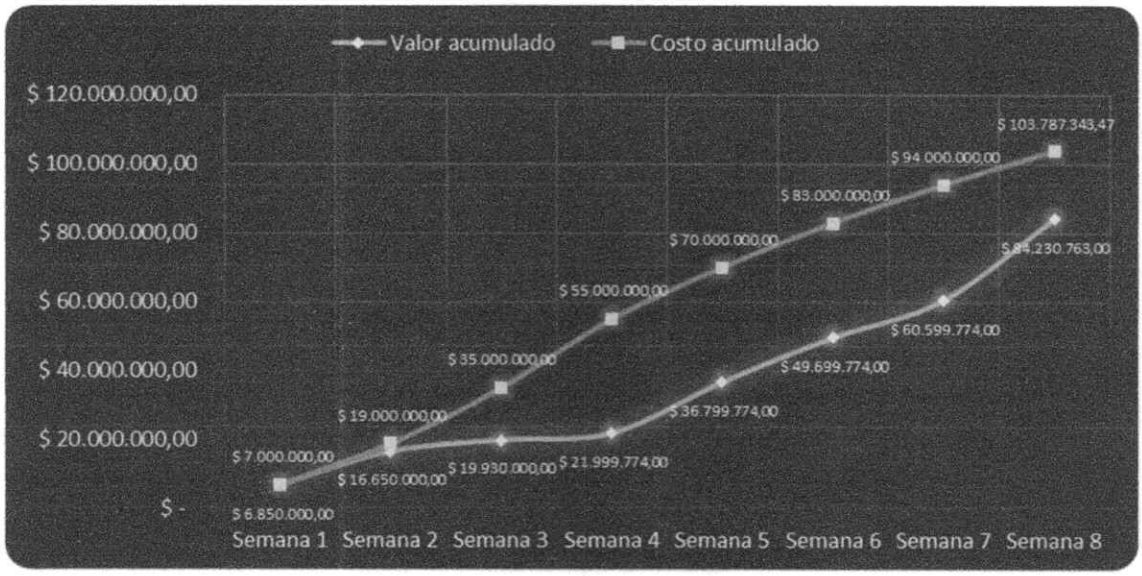

Semana	Costo	Costo acumulado	% Programado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor ejecutado	Valor acumulado	% Ejecutado
Semana 1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	2,17%	04/05/2026	10/05/2026	$ 6.850.000,00	$ 6.850.000,00	2,12%
Semana 2	$ 12.000.000,00	$ 19.000.000,00	5,88%	11/05/2026	17/05/2026	$ 9.800.000,00	$ 16.650.000,00	5,15%
Semana 3	$ 16.000.000,00	$ 35.000.000,00	10,83%	18/05/2026	24/05/2026	$ 3.280.000,00	$ 19.930.000,00	6,17%
Semana 4	$ 20.000.000,00	$ 55.000.000,00	17,02%	25/05/2026	31/05/2026	$ 2.069.774,00	$ 21.999.774,00	6,81%
Semana 5	$ 15.000.000,00	$ 70.000.000,00	21,66%	01/06/2026	07/06/2026	$ 14.800.000,00	$ 36.799.774,00	11,38%
Semana 6	$ 13.000.000,00	$ 83.000.000,00	25,68%	08/06/2026	14/06/2026	$ 12.900.000,00	$ 49.699.774,00	15,38%


Semana 7	$ 11.000.000,00	$ 94.000.000,00	29,08%	15/06/2026	21/06/2026	$ 10.900.000,00	$ 60.599.774,00	18,75%	
Semana 8	$ 9.787.343,47	$ 103.787.343,47	32,11%	22/06/2026	30/06/2026	$ 23.630.989,00	$ 84.230.763,00	26,06%	

12. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.01	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	11,56	11,56	11,56	100%	100%



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.02	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2.00	2.00	2.00	100%	100%

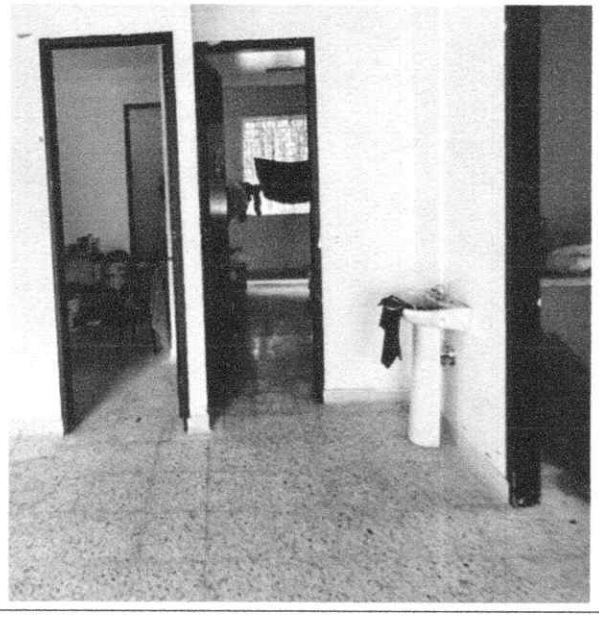




ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.04	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222.95	222.95	222.95	100%	100%







ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
2.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	464.40	464.40	464.40	100%	100%

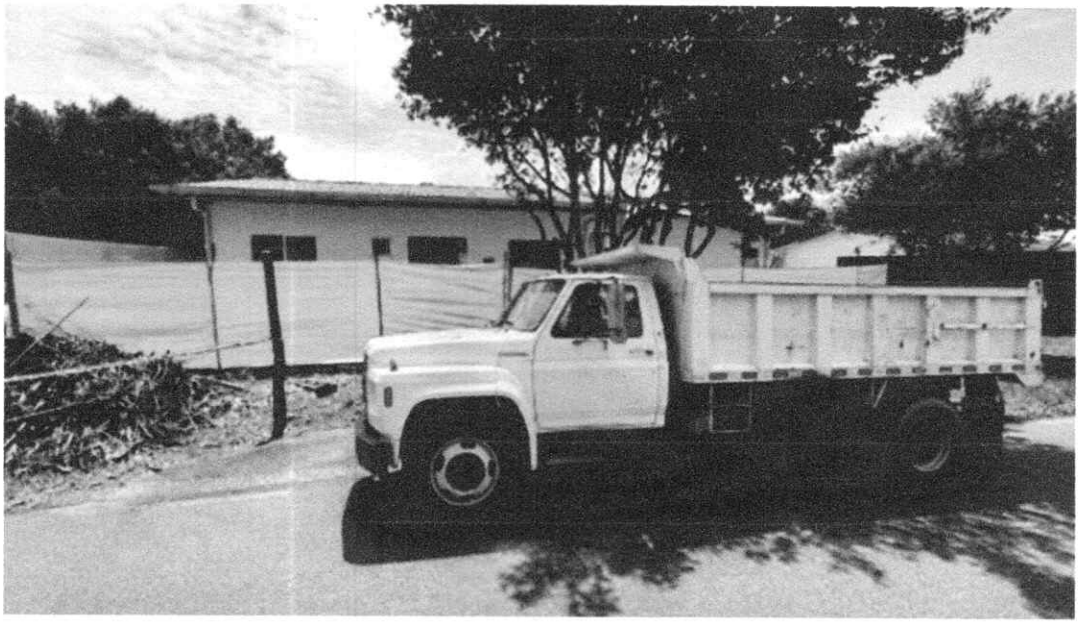


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
3.04	PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	M2	2.84	2.84	2.84	100%	100%

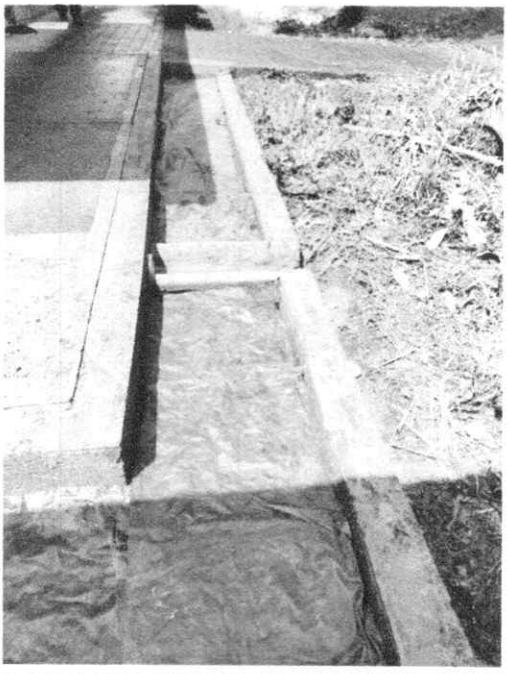


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
4.02	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	10.47	10.47	10.47	100%	100%

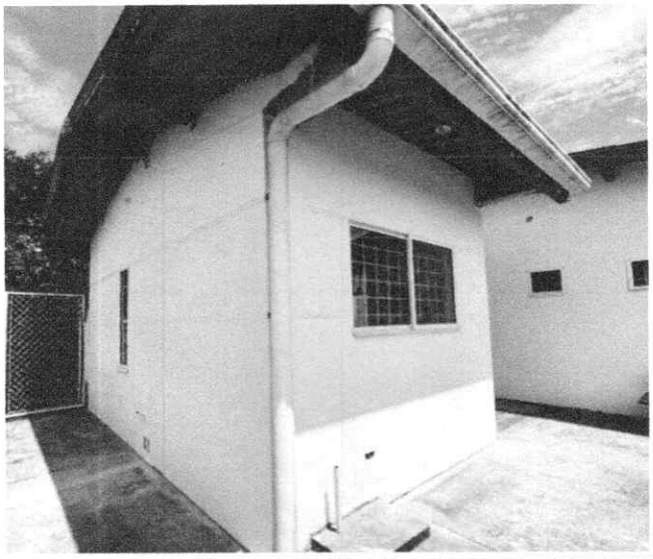


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
5.02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	359.44	7.00	7.00	1.95%	1.95%

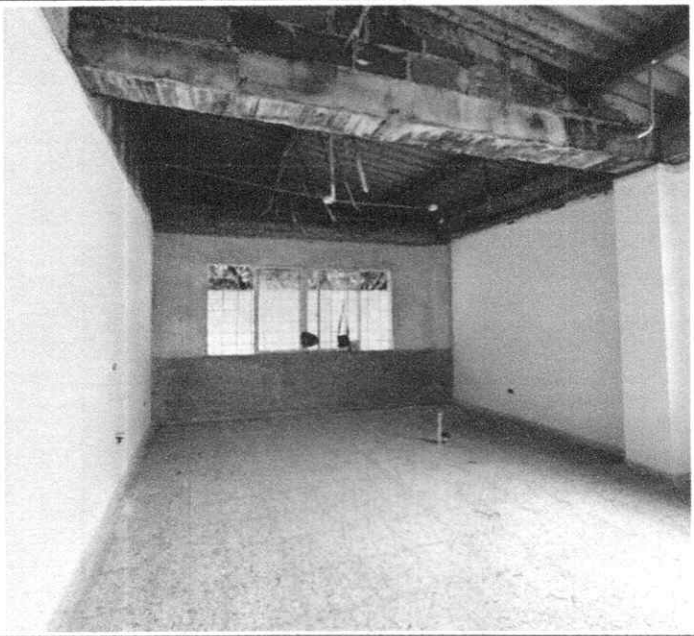


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
6.01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	178.40	178.40	178.40	100%	100%

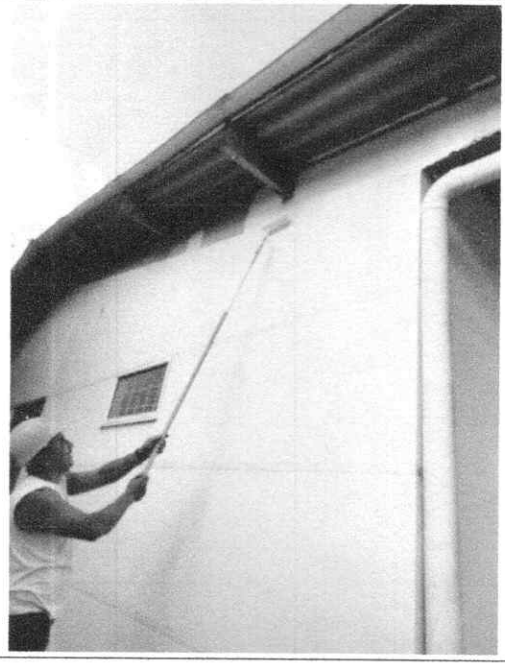


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
6.02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	359.44	359.44	359.44	100%	100%

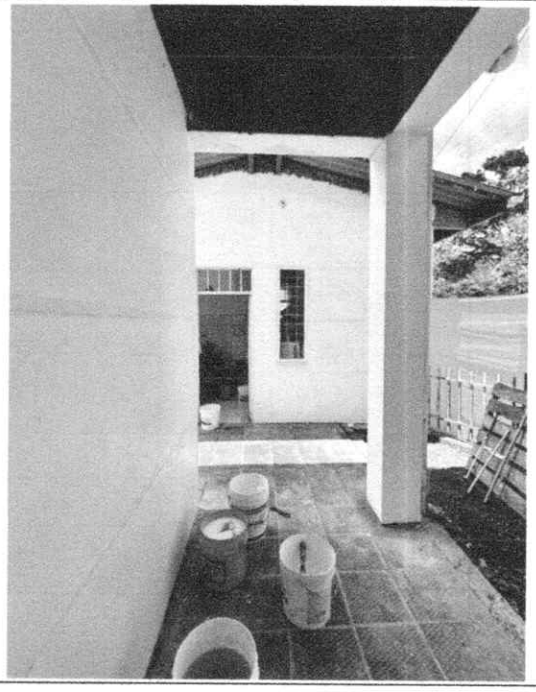

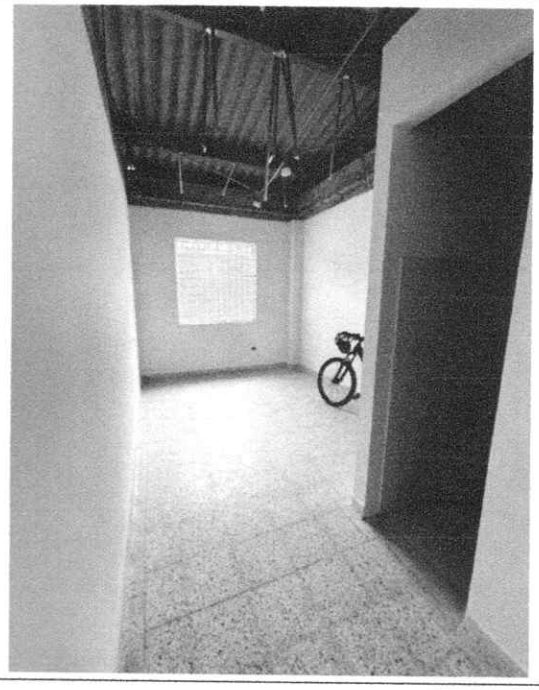

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA.INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	100.00	100.00	100.00	100%	100%

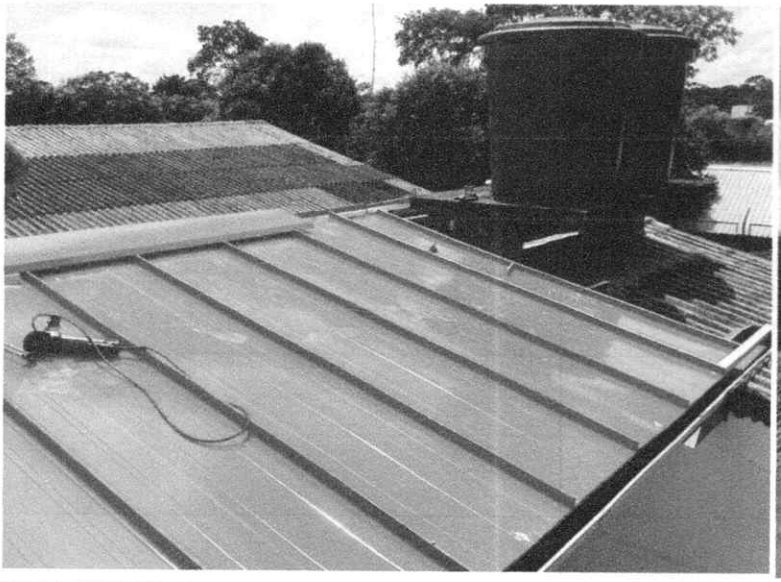



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
9.03	VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	2.00	2.00	100%	100%



13. CONCLUSIONES

Con base en las actividades ejecutadas durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026 en la obra de adecuación menor del Centro de Salud Montelibano, en el municipio de Acacías, Meta, se pueden establecer las siguientes conclusiones generales:

El proyecto avanzó de manera integral y ordenada, cumpliendo con la secuencia lógica constructiva: se inició con las labores preliminares de desmonte y demolición, necesarias para habilitar los frentes de trabajo, y se continuó de forma articulada con las actividades de cimentación, estructuras metálicas, acabados en pañete y pintura, cubierta y elementos hidrosanitarios, sin evidenciarse traslapos ni reprocesos que afectaran el desarrollo normal de la obra.

Las actividades de desmonte y demolición, si bien no representan un valor económico tan alto como otros capítulos, resultaron determinantes para el avance general del proyecto, pues de su correcta y oportuna ejecución dependió el inicio de los demás frentes de trabajo, en particular la intervención de cubierta y de acabados.

Los capítulos de mayor incidencia económica en el periodo fueron las obras en cubierta y los sistemas de pintura e impermeabilización de fachada, lo cual es coherente con el alcance de una adecuación menor orientada principalmente a la recuperación de la envolvente y la protección de la infraestructura existente frente a agentes ambientales.

En términos generales, la obra se desarrolló conforme a las condiciones contractuales pactadas, ejecutando la totalidad de las cantidades y actividades previstas en el presupuesto para el periodo reportado, por un valor total de $84.230.763,00, sin observarse desviaciones significativas respecto a lo programado.

En el presente informe de avance de obra se relaciona el siguiente cuadro de condiciones generales a corte del 30 de junio de 2026:

CONDICIONES ACTUALIZADAS	
VALOR CONDICIONES CONTRATADAS	$ 323.230.572.00
VALOR AVANCE A 30 DE JUNIO	$ 84.230.763,00
PORCENTAJE PRESENTE	26.06%
VALOR POR EJECUTAR	$ 238.999.809,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR	73.94%

WILLIAM ANDRES OVIEDO ARIAS
Residente de Obra
Contrato de Obra No. 324 de 2026

INFORME MENSUAL DE SST OBRA N°02

INTERCONS DE COLOMBIA SAS.

INFORME DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META

.

INTERVENTORIA:

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS

RL. LINA LORENA SALGADO GARCIA

CONTRATO DE OBRA No 324 16 DE ABRIL DE 2026

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MUNICIPIO DE ACACIAS
DEPARTAMENTO DEL META

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL 3
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3. GENERALIDADES 5
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
3.2. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO 6
4. OBJETO 8
5. GENERALIDADES DEL SG-SST 8
6. RELACION DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA 9
Personal Operativo. 9
8. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 11
9. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. 11
10. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN 12
11. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO 12
12. TAREAS DE ALTOS RIESGOS 13
13. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA. 14
14. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 14
15. INDUCCIÓN DE PERSONAL 15
16. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 16
17. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 16
17.1. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO 17
17.2. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES 19
18. REGISTRO FOTOGRAFICO 21

1. INTRODUCCIÓN

Durante el período evaluado, **INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S.** desarrolló las actividades correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientadas a la identificación, prevención y control de los riesgos laborales presentes en la ejecución de la **Obra de Adecuación Menor del Centro de Salud Montelíbano de Acacías, Meta**. Estas acciones se realizaron en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, con el propósito de proteger la salud e integridad de los trabajadores, promover condiciones de trabajo seguras y fortalecer la cultura de prevención, contribuyendo al mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.

De esta manera, las actividades desarrolladas durante el período reportado reflejan el compromiso institucional con la prevención de riesgos laborales, el cumplimiento legal y la mejora continua del desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo entornos laborales seguros, saludables y sostenibles.

OBJETIVO GENERAL

Presentar el informe de las actividades desarrolladas en seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No 324 DEL 16 DE ABRIL DE 2026, CUYO OBJETO ES: OBRA DE ADECUACION MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META**

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar de manera oportuna y organizada los soportes documentales que
- evidencian el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades, compromisos y acciones de mejora, con el fin de asegurar la aplicación efectiva de los controles preventivos y el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Evaluar y evidenciar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, legales y contractuales aplicables a la ejecución de la obra, promoviendo condiciones de trabajo seguras, la prevención de riesgos laborales y el fortalecimiento de la cultura de seguridad y salud en el trabajo.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 800.037.021.7
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META".
CONTRATO NO:	324 DE 2026
FECHA	16 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE LA OBRA:	INTERCONS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.849.552-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO POSADA VARELA CC. Nº 1.094.921.302 de Armenia
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 323.330.566,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	04 DE MAYO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 1. Información del contratista

3. GENERALIDADES

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Contrato de Obra No. 324 DE 2026 ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META". con el fin de garantizar condiciones óptimas para la prestación de servicios de salud en el área rural del municipio. Esta intervención responde a la necesidad urgente de renovar una edificación con más de cuarenta de 12 años de antigüedad, cuyo deterioro estructural y funcional compromete la seguridad, habitabilidad y eficiencia operativa del centro asistencial.

El alcance del contrato contempla las siguientes actividades principales:

- **Desmontes y demoliciones**: retiro de lavamanos, desmonte de cielo raso en drywall, teja de fibrocemento y estructura metálica de cubierta, demolición de pañete de muros y placa aligerada, cortes en mampostería y retiro de puntos de iluminación existentes.
- **Excavaciones y rellenos:** excavación manual, relleno compactado y transporte y disposición final de escombros.
- **Cimentación:** construcción de placa de contrapiso, bordillos fundidos, solado de limpieza, zapatas, vigas, columnas, muros en ladrillo y alfajías, todos en concreto de 3.000 PSI.
- **Estructuras metálicas:** suministro e instalación de acero de refuerzo, cerramiento en malla eslabonada y estructura metálica de cubierta en acero estructural ASTM A500.
- **Pañete:** aplicación de mortero 1:4 impermeabilizado en muros exteriores y culatas, y mortero 1:4 en muros interiores con filos y dilataciones
- **Pintura:** aplicación de pintura vinilo tipo coraza en exteriores, vinilo tipo 1 de alta calidad en interiores, impermeabilización de fachadas con Masterseal 485, sellador hidroprotector transparente y esmalte sintético para ventanas.
- **Cielo raso:** suministro e instalación de cielo raso en PVC de 10 mm con estructura de soporte y accesorios, en un área de 162,43 m².
- **Cubierta:** suministro e instalación de cubierta tipo sándwich calibre 26 prepintada sobre los 222,95 m² del área total de la edificación.

- **Red hidráulica:** instalación de tubería y accesorios PVCP, válvulas de corte y tanque séptico tipo Imhoff ovoide de 2.000 litros.
- **Red sanitaria:** instalación de tuberías PVCS de 2" y 6", salidas sanitarias y accesorios.
- **Red eléctrica interna**: acometida parcial, salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra, tomas GFCI, salidas de lámparas LED, paneles LED de 60x60W y redondos de 18W, e instalación de electrobomba Barnes.
- **Aparatos sanitarios:** instalación de lavamanos con grifería, juego de incrustaciones, rejilla anticucarachas y espejos.
- **Aseo y limpieza:** limpieza de pisos, senderos y muros con hidrojet para entrega y puesta en funcionamiento.

  El alcance total de la intervención busca garantizar que el puesto de salud cuente con espacios óptimos y seguros para la prestación de servicios primarios de salud, beneficiando a una población aproximada de 1.600 habitantes entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores del centro poblado de Montelibano y su área de influencia.

3.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El municipio de Acacías se encuentra localizado en el departamento del Meta, en la región centro-suroriental del mismo. En una zona de transición entre piedemonte llanero y llanura aluvial. Geográficamente, se ubica en las coordenadas 3°59'20" de latitud norte y 73°45'53" de longitud oeste, con una altitud promedio de 498 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Villavicencio, al sur con San Martín, al oriente con Castilla La Nueva y al occidente con El Calvario. Su acceso principal se

realiza por la vía nacional que conecta Villavicencio con los municipios del sur del Meta.

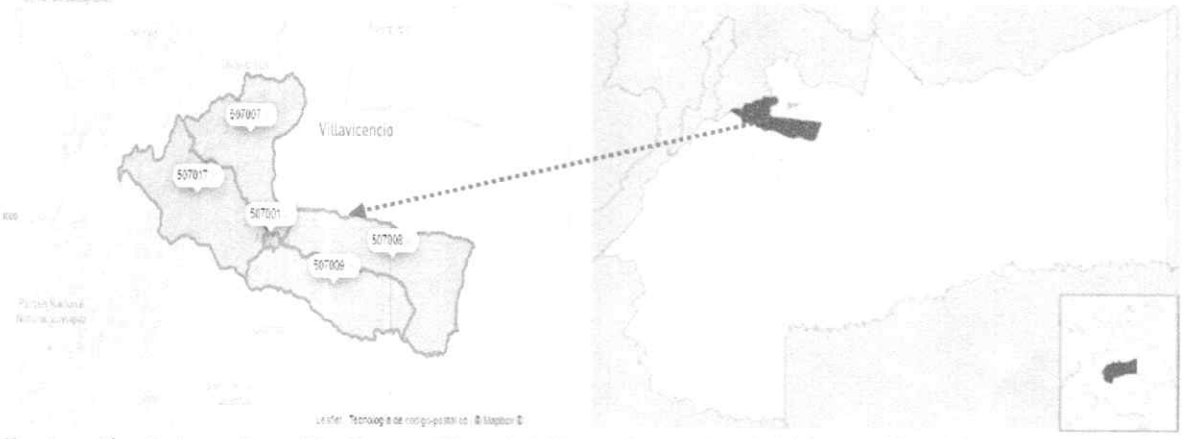


Ilustración 1. Localización Geográfica del Departamento del Meta y Municipio de Acacías

Límites del municipio

Norte: Villavicencio
Oriente: Castilla La Nueva
Occidente: El Calvario
Sur: San Martin



Ilustración 1 Ubicación Proyecto, Puesto de Montelíbano.

4. OBJETO

Mostrar el seguimiento de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementada en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026, en desarrollo del contrato de obra No 324 del 16 abril de 2026, buscando prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera técnica, oportuna y eficiente los peligros y riesgos generados con las actividades del proyecto

5. GENERALIDADES DEL SG-SST

Conscientes de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo (SST) y consecuentes con la reglamentación legal existente en el país, el **INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S** en cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST; en todos los campos; condiciones de salud y condiciones de trabajo para el **CONTRATO DE OBRA No 324 del 16 abril de 2026.**

El presente documento corresponde al informe mensual de las actividades desarrolladas y aplicadas por los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como lo son la ley 9 de 1979, resolución 1016 de 1983, resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1262 de 2012,

decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

6. RELACION DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

N°.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	% DEDICACION
1	WILLIAM ANDRÉS OVIEDO ARIAS	4.617.487	Ing. Residente	100%

Tabla 2.Personal Administrativo

Personal Operativo.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JOSE ALEJANDRO MOSQUERA POSADA	1.113.791.483	AYUDANTE
2	DIEGO FERNANDO VERGARA BARBOSA	16550585	OFICIAL DE OBRA
3	JAISSON PAEZ MARQUEZ	86071378	AYUDANTE

Tabla 3 Personal Operativo.

Personal que se desvinculó en el mes de junio 2026

#	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	N° DE PLANILLA
1	JUAN CAMILO POSADA VARELA	1.094.921.302	Inge Residente	6/01/2026	02/07/2026	9508408566

ANEXO 1. ARL, EXAMEN DE INGRESO

Durante el mes de junio se contó con un de personal conformado por cuatro (4) trabajadores, distribuidos en tres (3) colaboradores operativos y un (1) colaborador administrativo.

Durante el mismo periodo se presentó la desvinculación de un (1) trabajador del área administrativa, situación que fue gestionada conforme a los procedimientos

internos de la organización, manteniendo la actualización del registro de personal y el control de la información correspondiente para efectos del seguimiento administrativo y del SG-SST.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De acuerdo con lo estipulado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y la Política SST del INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S, en el siguiente cuadro se evidencia la ejecución de las actividades, durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2026

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE (SI/NO)
1. LIDERAZGO / COMPROMISO / DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
Inspecciones Gerenciales- director de obra / Residente de obra	SI
Revisión de desempeño en SST	SI
Divulgación de Políticas, Misión, Visión, objetivos y responsabilidades de SST	SI
2. PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS SEGURAS	
Inspecciones de Frente de obra	SI
Inspección Locativa	SI
Inspección de Herramientas, Maquinaria y equipos	SI
Inspección de EPP´S	SI
3. GESTION DEL RIESGO	
Identificación y divulgación de Peligros	SI
3.1. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Demarcación y señalización de área de trabajo	SI
Entrega de Elementos de Protección Personal	SI
Accidentes / Incidentes reportados en el mes	NINGUNO

Charlas diarias de Seguridad y Salud en el Trabajo	SI
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	SI
Inspección de Puestos de trabajo	SI
Inspección de Botiquines	SI
Inspección de Extintores	SI
3.2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
Afiliación a seguridad social	SI
Exámenes médicos preocupacionales - periódicos -Posincapacidad y de egreso	SI
Calistenia, Ejercicios físicos	SI
3.3. SANEAMIENTO BASICO / GESTIÓN AMBIENTAL	
suministro de hidratación	SI
Charla de gestion ambiental	SI
Inspecciones de gestión de residuos y orden y aseo.	SI
Jornadas de Orden y Aseo	SI
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Seguimiento de entrega de informes mensuales	SI

8. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el 01 de junio al 30 de junio de 2026, **INTERCONS COLOMBIA S.A.S**, cumplió a cabalidad con el pago de la seguridad social.

El cual da cumplimiento a los lineamientos establecidos en La ley 100 de 1993 (Marco Legal General De La Seguridad Social).

ANEXO 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

9. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.

(Matriz IPVR y DC): información consolidada sobre los peligros existentes, valoración y control de riesgos existentes en obra.

ANEXO 3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE

RIESGOS Y DE DETERMINACION DE CONTROLES, SE ENTREGA POR MEDIO DIGITAL EN EXCEL, YA QUE ES DEMASIADO EXTENSA.

10. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador a su ingreso a obra y se van renovando por desgaste. El registro de la entrega se hace en el formato de entrega de Equipos de Protección Personal y Dotación, en la que se contempla el Equipo entregado, la cantidad, la fecha de entrega y la firma del trabajador en conformidad.

Conforme al Art.230 SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015.

ANEXO 4. ENTREGA DE EPP Y DOTACION

11. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO

Para el periodo de 01 de junio al 30 de junio de 2026, se reporta 0 accidentes de origen laboral y 0 ausentismo por enfermedad laboral.
Tal como se representa en la siguiente tabla.

ITEM	INDICADRO	ABRI	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
1	No. trabajadores expuestos por mes	0	3	3	0	0	0	0
2	No. De accidentes laborales por mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	No. De accidentes de trabajo mortales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	No. De días de incapacidad por accidente de trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	No. Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	No. De casos nuevos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	No. De días de ausencia por incapacidad laboral o común	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

ANEXO 5. CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD DEL ARL.

12. TAREAS DE ALTOS RIESGOS

Para **INTERCONS COLOMBIA S.A.S,**es imperativo identificar las tareas de alto riesgo que se tengan que desarrollar durante la ejecución del contrato, con el objetivo de implementar acciones como; análisis de trabajo seguro, procedimientos de trabajo seguro, permisos de trabajo, inspecciones de pre-uso entre otras, todos estas tendientes a evitar la materialización de un accidente de trabajo, Como lo son trabajo en caliente por el uso de pulidora, durante 01 de junio al 30 de junio de 2026 no se realizó actividades de alto riesgo.

13. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA.

La obra cuenta con señalización con la finalidad de llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible, De este modo el personal se mantiene bien informado con respecto a la señalización preventiva de obra.

14. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Se realizaron las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte del profesional SST encargado, abarcando temas con referencia a la obra para el personal, logrando así, reforzar el comportamiento proactivo ante los peligros asociados al trabajo que realizan en obra y potenciar sus habilidades de observación preventiva.

ANEXO 6. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Relación de charlas SST

ITEM	TEMAS TRATADOS	FECHA
1	Que son los hábitos saludables	01/06/2026
2	Como prevenir infecciones respiratorias	02/06/2026
3	Cuidado de los ojos	03/06/2026
4	Conciencia ambienta	04/06/2026
5	Trabajo en equipo	05/06/2026
6	Actos y condiciones inseguras	09/06/2026
7	Inspección y mantenimiento de herramientas	10/06/2026
8	Orden y aseo	11/06/2026
9	Uso seguro de herramientas eléctricas	12/06/2026

10	Que es un peligro	13/06/2026
11	Como evitamos los accidentes de trabajo	16/06/2026
12	Uso adecuado de EPP	17/06/2026
13	Riesgo ergonómico	18/06/2026
14	Caídas desde el mismo nivel	19/06/2026
15	Fenómenos naturales	20/06/2026
16	Importancia de la señalización	22/06/2026
17	Como minimizamos los riesgos	23/06/2026
18	Riesgo químico	24/06/2026
19	Como cuidar mi salud mental	25/06/2026
20	Importancia de la hidratación en tiempos de calor	26/06/2026
21	Temperaturas ionizantes y no ionizantes	27/06/2026

15. INDUCCIÓN DE PERSONAL

Para el mes correspondiente al presente informe, en las instalaciones provisionales del equipo constructor, se llevó a cabo la inducción al personal, para el inicio de actividades. Esta inducción es básica para que el trabajador conozca la gestión en seguridad, salud a realizarse en el proyecto, adquiriendo conocimiento de las políticas, reglas y normas de trabajo. Teniendo como instructor al profesional SST a cargo de esta labor.

ANEXO 7. INDUCCIONES

16. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

El análisis de riesgos operacionales es una herramienta clave dentro del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo propósito es identificar, valorar y controlar los peligros asociados a las actividades desarrolladas por los trabajadores. Este análisis permite establecer medidas preventivas que reduzcan la probabilidad de incidentes, accidentes laborales y enfermedades de origen ocupacional.

En el periodo evaluado, se realizó un análisis detallado de las tareas críticas, incluyendo actividades como trabajo en alturas, uso de herramientas eléctricas (pulidora y roto martillo), pañete, aplicación de estuco y demolición manual. Se identificaron riesgos como caídas a distinto nivel, proyección de partículas, exposición al ruido, infección respiratoria y lesiones por esfuerzos físicos.

Como resultado del análisis, se implementaron controles como el uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP), señalización del área de trabajo, verificación de herramientas, capacitación del personal y supervisión continua. Estas acciones buscan garantizar un entorno laboral seguro y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de SST.

17. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Las inspecciones de seguridad es una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros, y se realiza de acuerdo a

los estándares establecidos en el plan de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones pre operacionales a realizar es de la pulidora, rotomartillo, herramientas manuales, camilla, extintor e inspecciones de SST.

17.1. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO.

Se ha realizado la inspección de orden y aseo de la obra para verificar las condiciones en las que se encuentra la obra, para el desarrollo de actividades seguras.

a. Jornada de Aseo

Se realizan jornadas de aseo semanal y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra.

b. Punto ecológico

Se cuenta con un punto Ecológico en los frentes del puesto de salud y dentro de obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

c. Disposición de residuos

Se realizarán semanalmente jornadas de orden y aseo, cuya finalidad sea recoger los residuos que se encuentren en la obra.

Se clasificarán los residuos domésticos, industriales y especiales, los residuos son llevados a un lugar o punto ecológico para que sean dispuestos por la empresa prestadora del servicio del municipio.

El punto ecológico es la zona especial claramente demarcada y señalizada, para incentivar, motivar y sensibilizar a los trabajadores a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, la separación de residuos en la fuente será más fácil, los colores a usar serán los mismos. Los colores son:

- **Blanco:** residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Negro:** residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc



Ilustración 2 Separación de los residuos



Fotografía 1. PUNTO ECOLOGICO

17.2. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

Se han realizado las inspecciones pre-operacionales de herramientas manuales, semanalmente.

ANEXO 8. INSPECIONES

Conclusión

Durante el período evaluado del Centro de Salud Montelíbano, municipio de Acacías, Meta, se evidenció que el contratista ejecutó las actividades programadas en concordancia con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normativa vigente aplicable al sector de la construcción.


En el desarrollo de las actividades no se registraron incidentes ni accidentes de trabajo, reflejando la eficacia de las medidas preventivas implementadas, el seguimiento permanente a las condiciones de seguridad y el control de los peligros identificados. Antes del inicio de cada actividad se verificó la aplicación de los controles operacionales definidos, promoviendo la identificación oportuna de riesgos y la prevención de actos y condiciones inseguras.

De igual manera, el profesional responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó acompañamiento continuo al personal operativo, verificando el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) de acuerdo con las actividades ejecutadas, el cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo, así como el mantenimiento del orden, aseo y señalización de las áreas intervenidas, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura preventiva en la obra.


WILLIAM ANDRES OVIEDO ARIAS
Residente de Obra
Contrato de Obra No. 324 de 2026

18. REGISTRO FOTOGRAFICO


Anexo 1. Charlas SST

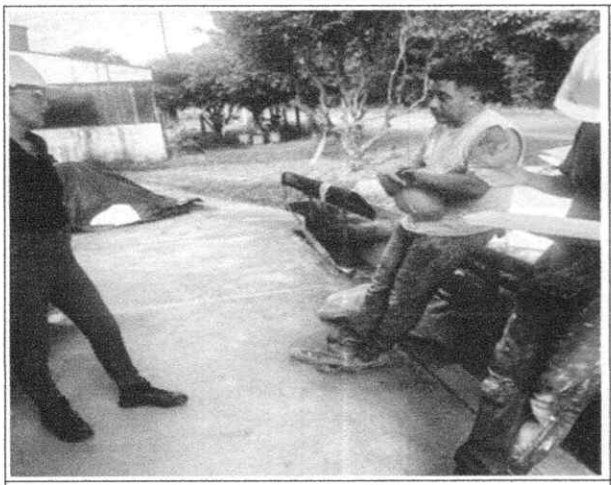


Fotografía 1. Charla SST

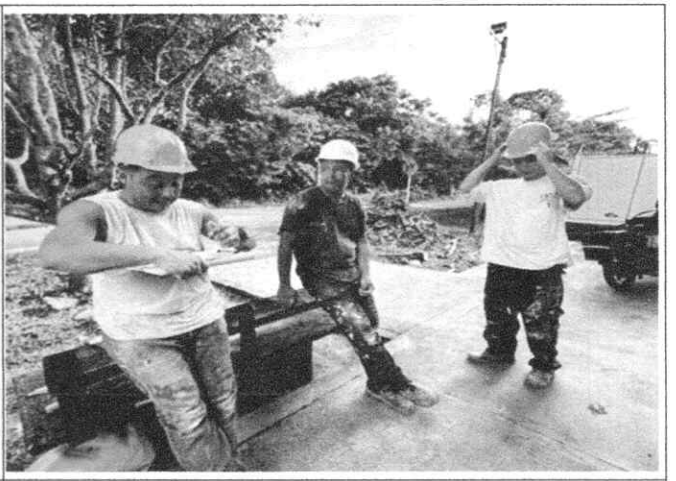

Fotografía 2. Charla SST

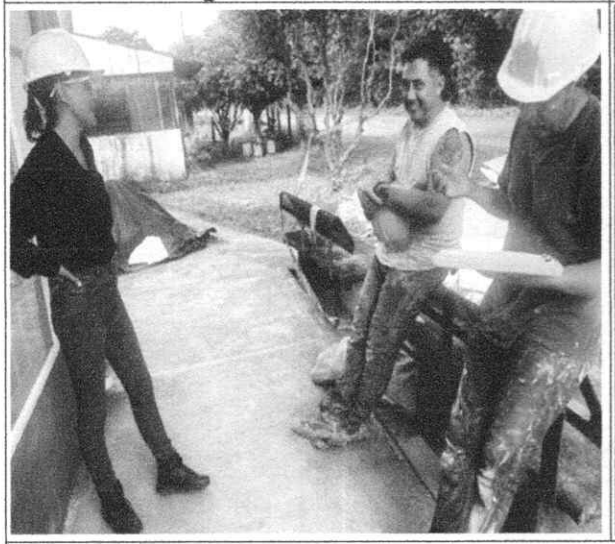


Fotografía 3. Charla SST

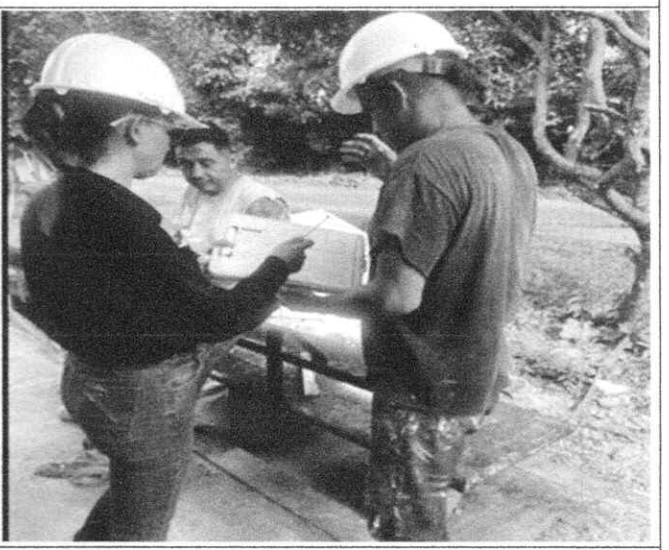


Fotografía 4. Charla SST

Anexo 2. Visita de los entes gubernamentales

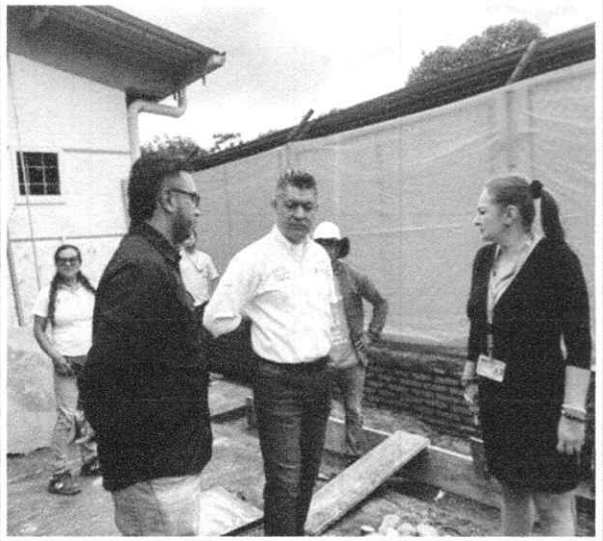




Fotografía 5. Señalización

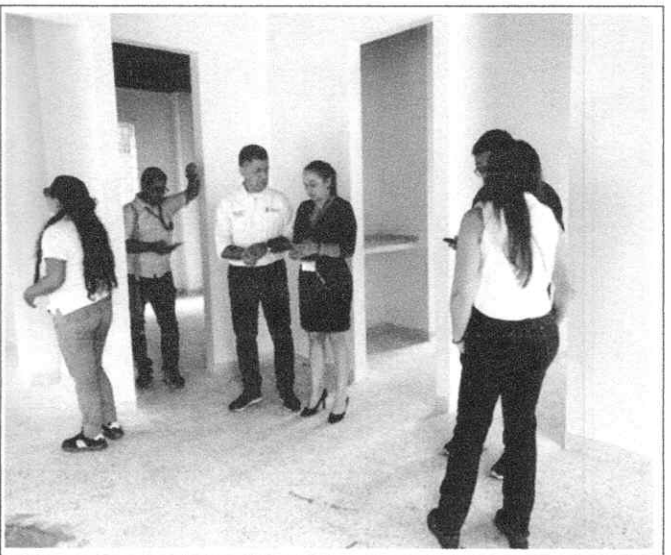


Fotografía 6. Señalización




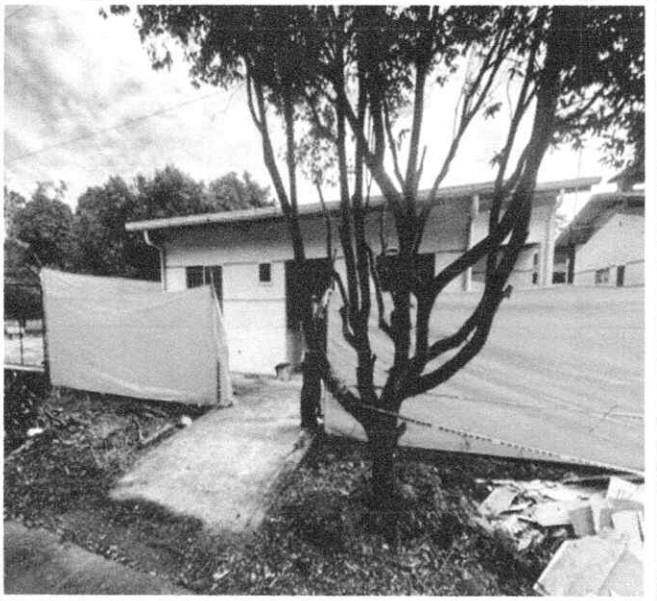

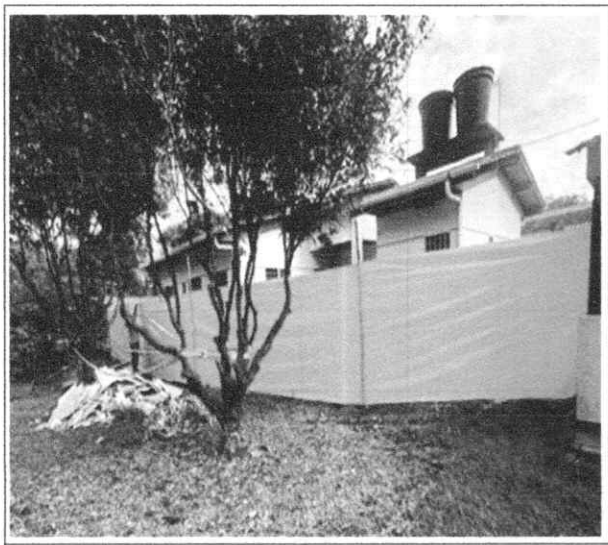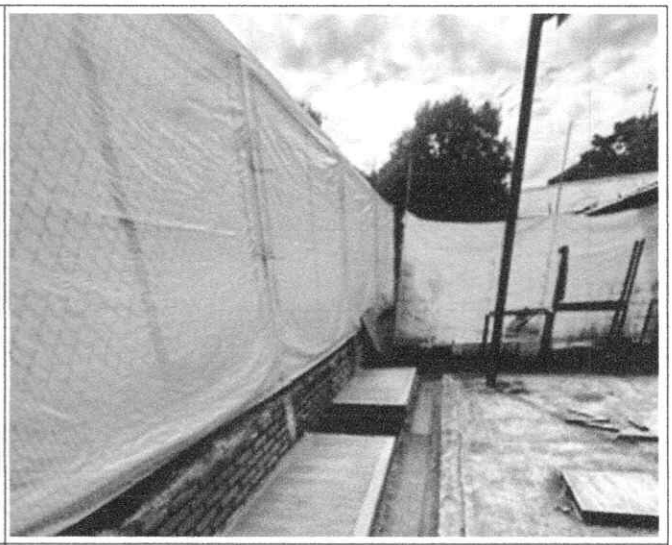	
Fotografía 7. Señalización	Fotografía 8. Señalización

Anexo 3. Preoperacionales

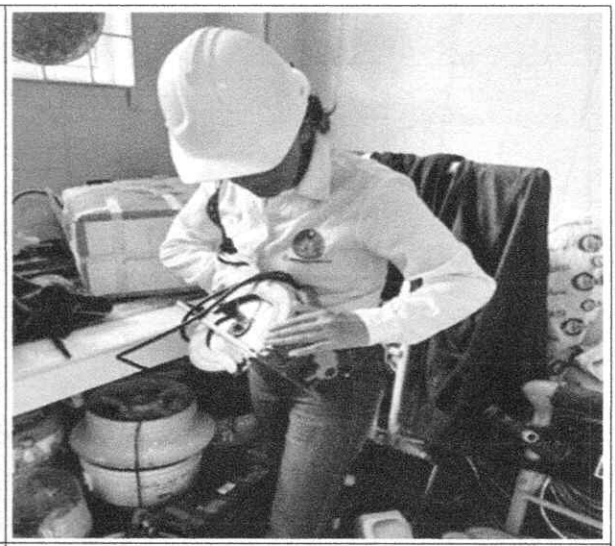	
Fotografía 9. Preoperacionales	Fotografía 10. Preoperacionales

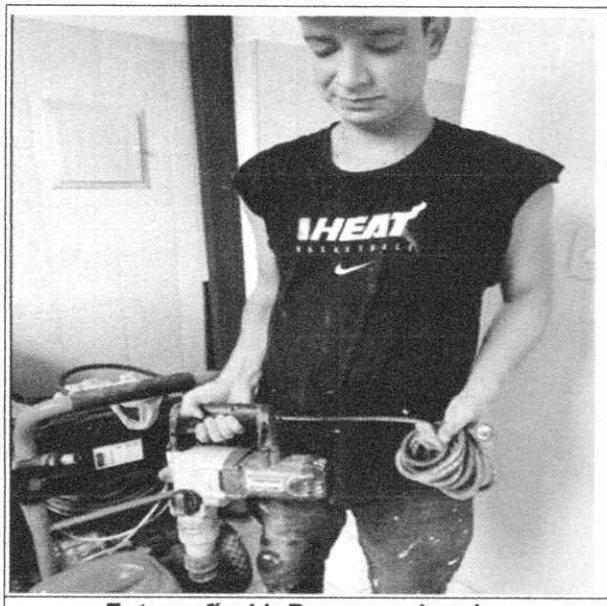


Fotografía 11. Preoperacionales




Fotografía 12. Preoperacionales



Anexo 4. Orden Y limpieza

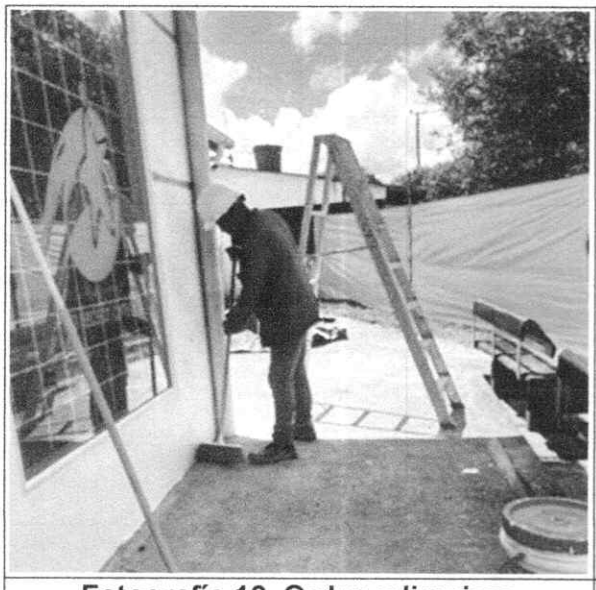



Fotografía 13. Orden y limpieza

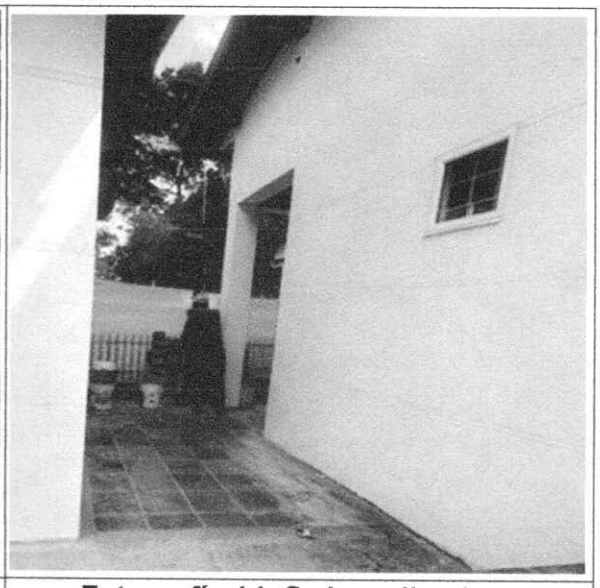


Fotografía 14. Orden y limpieza

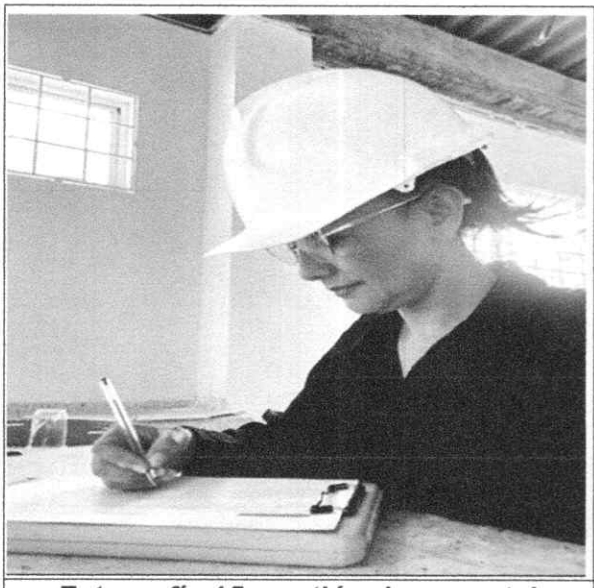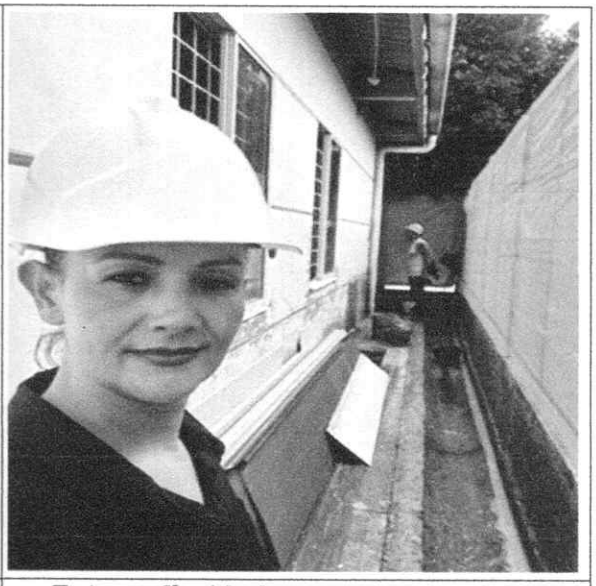
	
Fotografía 15. gestión documental	Fotografía 16. Acompañamiento en obra

Anexo 5. Actividades de obra

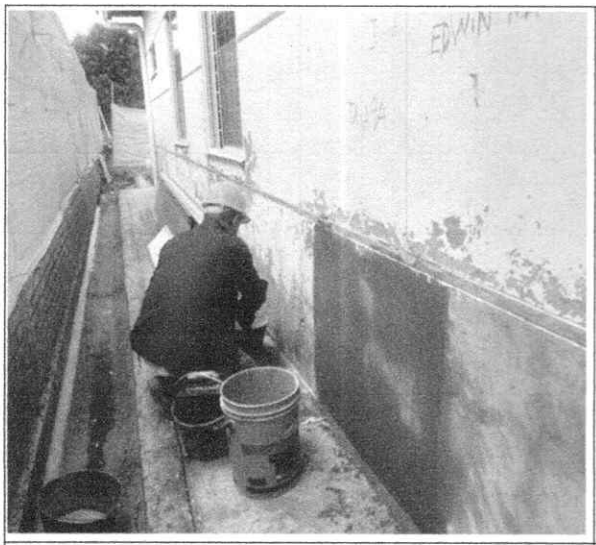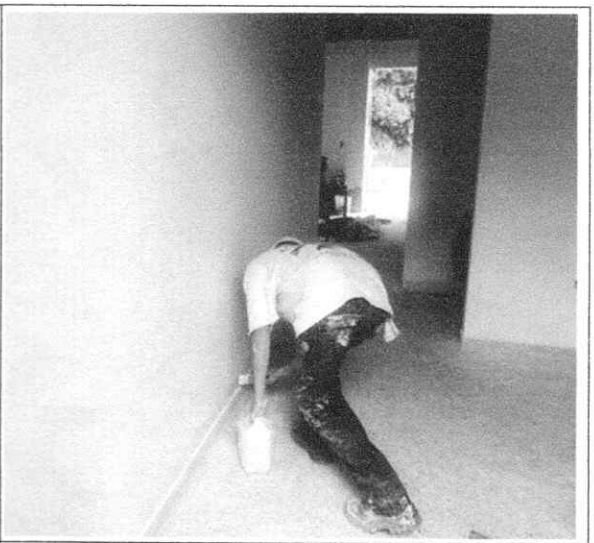
	
Fotografía 17. Actividades en obra	Fotografía 18. Actividades de obra

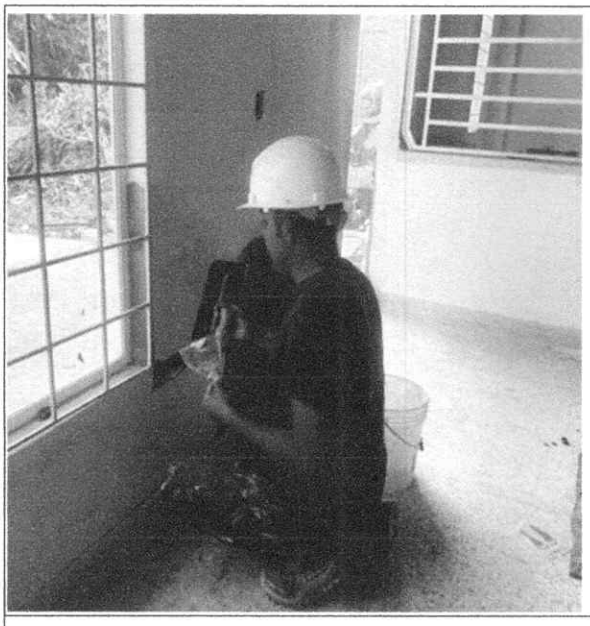


Fotografía 19. Actividades de obra

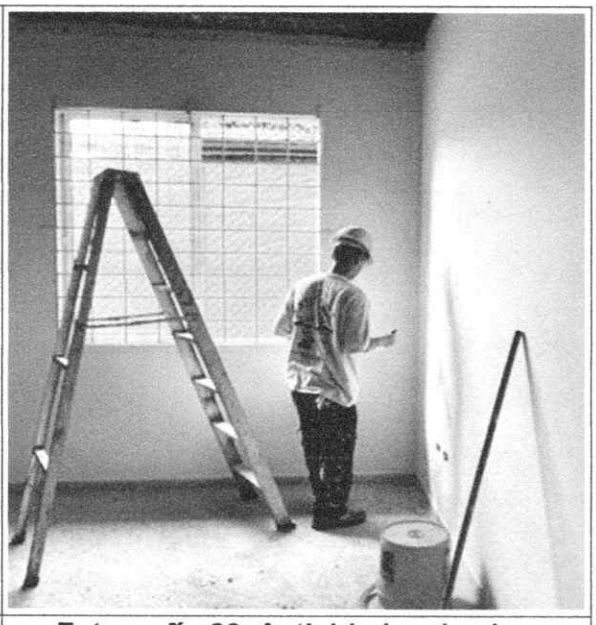

Fotografía 20. Actividades de obra

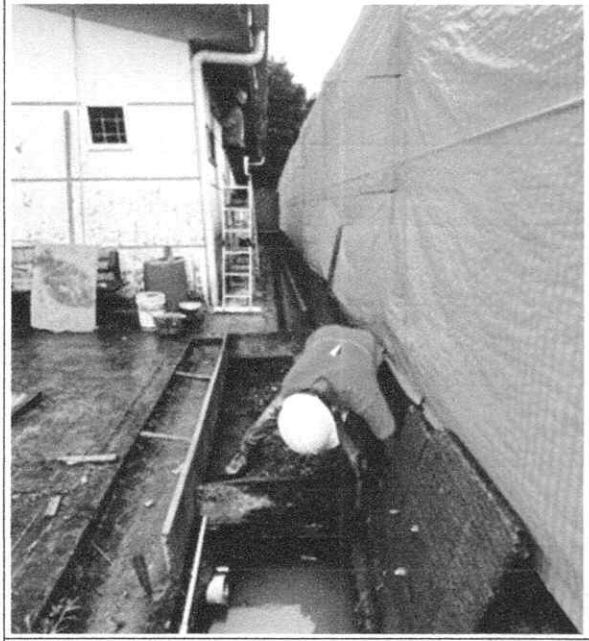

Fotografía 21. Actividades de obra

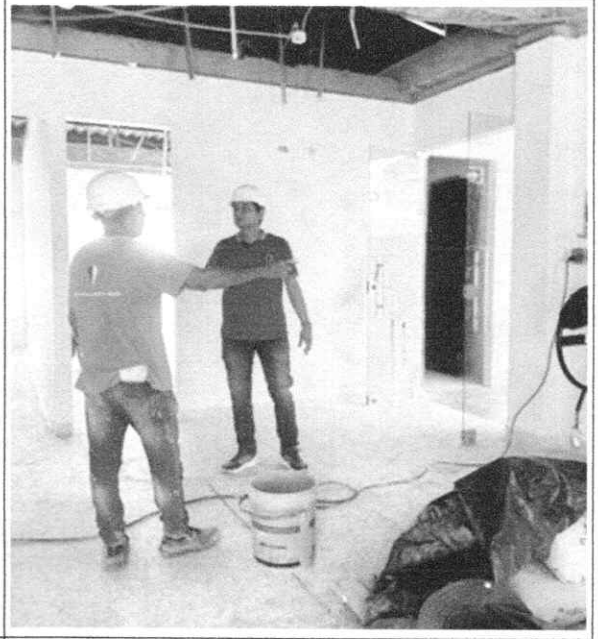

Fotografía 22. Actividades de obra

ANEXO 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 2. CHARLA DE SEGURIDAD, CAPACITACIONES Y ASISTENCIA

ANEXO 3. EVALUACION DE INDUCCION PERSONAL

ANEXO 4 INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849552	3	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOM	MANZANA H9 BIFAMILIAR 8C	VILLAVICENCIO-META	6836783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	505336264	9508408566	E	2026/07/14	2026/07/23	BANCOLOMBIA	9	$2,357,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOM (5 Afiliados)						$7,560,899	$1,210,000			$7,560,899	$302,700			$7,560,899	$302,700			$7,560,899	$526,400		$0	$0
Centro de Trabajo: MONTELIBANO (5 Afiliados)						$7,560,899	$1,210,000			$7,560,899	$302,700			$7,560,899	$302,700			$7,560,899	$526,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)						$7,560,899	$1,210,000			$7,560,899	$302,700			$7,560,899	$302,700			$7,560,899	$526,400		$0	$0
1	CC	1113791483	MOSQUERA JOSE	230301	25	$1,459,088	$233,500	ESSC24	25	$1,459,088	$58,400	CCF34	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0
2	CC	4617487	OVIEDO WILLIAM	230301	28	$2,426,667	$388,300	EPS037	28	$2,426,667	$97,100	CCF34	28	$2,426,667	$97,100	14-11	28	$2,426,667	$168,900	28	$0	$0
3	CC	86071378	PAEZ JAISSON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1094921302	POSADA JUAN	230301	2	$173,334	$27,800	EPS005	2	$173,334	$7,000	CCF34	2	$173,334	$7,000	14-11	2	$173,334	$12,100	2	$0	$0
5	CC	16550585	VERGARA DIEGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$7,560,899	$1,210,000			$7,560,899	$302,700			$7,560,899	$302,700			$7,560,899	$526,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,210,000	$8,100	$0	$1,218,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$929,800	$6,200	$0	$936,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$526,400	$3,500	$0	$529,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$526,400	$3,500	$0	$529,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$302,700	$2,000	$0	$304,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$302,700	$2,000	$0	$304,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$302,700	$2,200	$0	$304,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$58,400	$400	$0	$58,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$97,100	$700	$0	$97,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$500	$0	$70,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$500	$0	$70,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$7,000	$100	$0	$7,100
TOTAL				5	$2,341,800	$15,800	$0	$2,357,600
