

Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesor	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
0		**$ 2.465.593.920**	**$ 4.281.417.5...**	**PROGRAMACION V1 CAPITULOS**			**31%**	**521,25 días**	**mié 12/02/25**	**jue 31/12/26**
1		**$ 2.465.593.920**	**$ 4.281.417.531**	**CONTRATO No. 24001263 H4, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)."**			**31%**	**521,25 días**	**mié 12/02/25**	**jue 31/12/26**
2	✓	$ 0	$ 0	INICIO		4;7;8;15	100%	0 días	mié 12/02/25	mié 12/02/25
3	✓	**$ 1.035.727.500**	**$ 1.035.727.500**	**01 APROPIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**			**100%**	**223,38 días**	**mié 12/02/25**	**mar 2/12/25**
4	✓	$ 700.969.500	$ 700.969.500	APROPIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2;7;8	5	100%	261,63 días	mié 12/02/25	mar 2/12/25
5	✓	$ 232.299.000	$ 232.299.000	BOLSA PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	4	6	100%	261,63 días	mié 12/02/25	mar 2/12/25
6	✓	$ 102.459.000	$ 102.459.000	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL	5	10;11	100%	204,75 días	mié 12/02/25	lun 29/09/25
7	✓	$ 0	$ 0	DISEÑO URBANISMO	2	4	100%	232,75 días	mié 12/02/25	jue 30/10/25
8	✓	$ 0	$ 0	DISEÑOS TERMINAL NACIONAL	2	4	100%	261,63 días	mié 12/02/25	mar 2/12/25
9		**$ 1.417.018.680**	**$ 1.417.018.680**	**02 TERMINAL AEREO PROVISIONAL**			**86%**	**183,5 días**	**lun 29/09/25**	**vie 29/05/26**
10	✓	$ 1.288.198.800	$ 1.288.198.800	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL AEREO PROVISIONAL (INCLUYE	6	13	100%	137,88 días	lun 29/09/25	mar 17/03/26
11	✓	$ 128.819.880	$ 128.819.880	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA IMPREVISTOS DE OBRA	6	12	100%	129,25 días	lun 29/09/25	mar 17/03/26
12		$ 0	$ 0	Nuevo punto de conexión eléctrica y alumbrado sendero peatonal	11	474FC+11 días	0%	51,38 días	mar 17/03/26	mar 26/05/26
13	✓	$ 0	$ 0	TRASLADOS AEROCIVIL Y ENTREGA TERMINAL ACTUAL	10	23FC+10 días;19;18	100%	54 días	mié 18/03/26	vie 29/05/26
14		**$ 0**	**$ 0**	**03 AMIGABLE COMPONEDOR**			**0%**	**2 días**	**mar 29/12/26**	**mié 30/12/26**
15		$ 0	$ 0	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FIGURA AMIGABLE COMPONEDOR	2	650	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
16		**$ 8.507.868**	**$ 780.973.959**	**1 TERMINAL AEREO**			**3%**	**164,38 días**	**jue 28/05/26**	**jue 31/12/26**
17		$ 8.507.868	$ 25.963.052	**PRELIMINARES**			13%	**160,75 días**	**vie 29/05/26**	**mié 30/12/26**
18		$ 2.287.221	$ 25.963.052	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	13	468FC-10 días	80%	130 días	vie 29/05/26	lun 7/12/26
19		$ 933.651	$ 0	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	13	468FC-15 días	0%	145 días	vie 29/05/26	lun 28/12/26
20		$ 5.286.996	$ 0	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	19CC+5 días	21FC-35 días	0%	80 días	vie 5/06/26	lun 21/09/26
21		$ 0	$ 0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	20FC-35 días	27CC-20 días;28CC días;48CC días	0%	100 días	mié 5/08/26	mar 15/12/26
22		$ 0	$ 0	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 16 KM (INCLUYE CARGUE)	23CC	27CC-20 días	0%	93 días	vie 12/06/26	mié 30/12/26
23		$ 0	$ 0	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	13FC+10 días	25CC+50 días;22CC	0%	80 días	vie 12/06/26	jue 26/11/26
24		$ 0	$ 0	DEMOLICION DE VIAS Y PARQUEADEROS EXISTENTES	19CC+50 días	27CC-20 días	0%	85 días	mié 5/08/26	sáb 26/12/26
25		$ 0	$ 0	NP1.1-1DEMOLICION DE CIMIENTO	23CC+50	29FC-10 días	0%	65 días	jue 20/08/26	sáb 12/12/26
26		$ 0	$ 0	**EXCAVACIÓNES Y RELLENOS**			0%	**130 días**	**vie 10/07/26**	**mar 29/12/26**
27		$ 0	$ 0	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 16 KM)	21CC-20 días;24CC días;22CC días	37FC-90 días;38CC días	0%	80 días	vie 10/07/26	jue 22/10/26
28		$ 0	$ 0	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0m	21CC+60 días	41FC-20 días	0%	50 días	jue 22/10/26	mar 29/12/26
29		$ 0	$ 0	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE PARA	25FC-10 días	34FC-25 días	0%	20 días	lun 30/11/26	sáb 26/12/26
30		$ 0	$ 0	RELLENO EN SUELO DE AFIRMAD	25FC-15	41FC-20	0%	18 días	lun 23/11/26	mié 16/12/26
31		$ 0	$ 0	**CIMENTACIÓN**			0%	**133 días**	**lun 6/07/26**	**lun 28/12/26**
32		$ 0	$ 0	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	42CC-15 días	33CC-5 días	0%	10 días	vie 13/11/26	vie 27/11/26
33		$ 0	$ 0	NP1.3- 1 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 5000 PSI	32CC-5 días	45FC-5 días;46FC	0%	20 días	sáb 7/11/26	jue 3/12/26
34		$ 0	$ 0	PEDESTALES EN CONCRETO DE 4000 PSI	39FC-25 días;29FC	468FC-15 días	0%	10 días	lun 23/11/26	vie 4/12/26
35		$ 0	$ 0	NP1.3-2 DADOS EN CONCRETO 5000PSI	39FC-20 días	42CC+5 días;187F	0%	15 días	vie 27/11/26	jue 17/12/26
36		$ 0	$ 0	NP1.3-3 PILOTE PRE EXCAVADO D=80 CM EN CONCRETO DE 5000 PSI, INC. CAMISA RECUPERABLE METALICA Y PERFORACION EN ROCA 2 MTS	37	39FC-35 días	0%	41 días	vie 23/10/26	jue 17/12/26
37		$ 0	$ 0	NP1.3-4 PILOTE PRE EXCAVADO D=90 CM EN CONCRETO DE 5000 PSI, INC. CAMISA RECUPERABLE METALICA Y PERFORACION EN ROCA 2 MTS	27FC-90 días;48FC días	39FC-35 días;36	0%	40 días	mié 2/09/26	vie 23/10/26
38		$ 0	$ 0	NP1.3-5PILOTE PRE EXCAVADO D=100 CM EN CONCRETO DE 5000 PSI, INC. CAMISA RECUPERABLE METALICA Y PERFORACION EN ROCA 2 MTS	27CC-20 días;48CC días	39FC-35 días;50FC	0%	40 días	lun 6/07/26	jue 27/08/26
39		$ 0	$ 0	DEMOLICIÓN CABEZA DE PILOTES	36FC-35	40FC-5 días	0%	40 días	vie 30/10/26	mié 23/12/26
40		$ 0	$ 0	CONTRAPESO EN CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	39FC-5 días	468FC-15 días	0%	2 días	jue 17/12/26	sáb 19/12/26
41		$ 0	$ 0	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	39CC-20	468FC-15	0%	15 días	mar 1/12/26	lun 21/12/26
42		$ 0	$ 0	NP1.3-6 PLASTICO DE 3,5 MM PARA AISLAMIENTO ENTRE RECEBO Y ELEMENTOS	35CC+5 días	468FC-15 días;32CC días	0%	10 días	jue 3/12/26	jue 17/12/26
43		$ 0	$ 0	NP1.3-7DILATACIONES PLACAS	46CC+0,867		0%	5 días	lun 21/12/26	lun 28/12/26
44		$ 0	$ 751.142.792	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			2%	**162,46 días**	**jue 28/05/26**	**mié 30/12/26**
45		$ 0	$ 0	NP1.4-1 COLUMNA CIRCULAR 5000 PSI	33FC-5 días	54FC-45 días	0%	8,75 días	vie 27/11/26	mié 9/12/26
46		$ 0	$ 0	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO,	33FC-5 días	43CC+0,8 días;378F días;49CC	0%	10 días	vie 27/11/26	jue 10/12/26
47		$ 0	$ 0	ESCALERA MACIZA 4000 PSI	48FC-10	468FC-15	0%	10 días	mar 15/12/26	mar 29/12/26
48		$ 0	$ 751.142.792	ACERO FIGURADO 60000 PSI	21CC-65	37FC-90	7%	34 días	jue 28/05/26	mié 30/12/26
49		$ 0	$ 0	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	46CC+5 días	52FC-55 días	0%	5 días	jue 3/12/26	jue 10/12/26
50		$ 0	$ 0	TANQUE EN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD DE 5000 PSI	38FC+5 días	250FC-12 días;379C	0%	80 días	jue 3/09/26	mié 16/12/26
51		$ 0	$ 0	VIGA AÉREA 4000 PSI	54FC-5 días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mié 9/12/26	jue 10/12/26
52		$ 0	$ 0	ENTREPISO PLACA MACIZA 4000PSI E=0.20 M	54FC-5 días;49FC	468FC-15 días	0%	0,88 días	mié 9/12/26	jue 10/12/26
53		$ 0	$ 0	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**			0%	**61,25 días**	**vie 9/10/26**	**jue 31/12/26**
54		$ 0	$ 0	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS MEZANINES, LOCALES COMERCIALES Y FRONTOFFICE, MODULOS 1,2 y 3 INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERÍA, ANTICORROSIVO Y PINTURA .	45FC-45 días	55FC-8,7 días;70FC dia;71FC-dia;72FC-dia;73FC-dia;74FC-dia;75FC-dia;76FC-dia;77FC-dia;78FC-	0%	50 días	vie 9/10/26	mié 16/12/26
55		$ 0	$ 0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PROTECCION CONTRA FUEGO 1 HORAS PARA ESTRUCTURAS METALICAS	54FC-8,7 días	376FC-5 días;377F días	0%	20 días	jue 3/12/26	jue 31/12/26
56		$ 0	$ 0	**MAMPOSTERÍA Y MUROS**			0%	**8,63 días**	**lun 21/12/26**	**jue 31/12/26**
57		$ 0	$ 0	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	68FC-1 día	88FC-6,1 días;89FC	0%	7 días	mar 22/12/26	jue 31/12/26
58		$ 0	$ 0	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	67FC-5 días	68FC-10 días	0%	2,63 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
59		$ 0	$ 0	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	67FC-5 días	68FC-10 días	0%	2,63 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
60		$ 0	$ 0	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO	67FC-5 días	68FC-10 días	0%	2,63 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
61		$ 0	$ 0	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO	67FC-5 días	68FC-10 días	0%	2,63 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
62		$ 0	$ 0	MURO EN BLOQUE N° 5	67FC-2 días	68FC-10 días	0%	2,63 días	mar 29/12/26	jue 31/12/26
63		$ 0	$ 0	MURO EN BLOQUE No. 5 (LINEAL)	67FC-2 días	68FC-10 días	0%	2,63 días	mar 29/12/26	jue 31/12/26
64		$ 0	$ 0	MURO CORTAFUEGO MAMPOSTERIA LADRILLO	67FC-2 días	68FC-10 días	0%	2,63 días	mar 29/12/26	jue 31/12/26
65		$ 0	$ 0	MURO CORTAFUEGO MAMPOSTERIA LADRILLO	67FC-2 días	68FC-10 días	0%	2,63 días	mar 29/12/26	jue 31/12/26
66		$ 0	$ 0	MURO CORTAFUEGO EN CONCRETO FUNDIDO	67FC-2 días	68FC-10 días	0%	2,63 días	mar 29/12/26	jue 31/12/26
67		$ 0	$ 0	ANCLAJE 1/2" L=50CM	43	58FC-5 días	0%	2,63 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
68		$ 0	$ 0	DOVELA GROUTING 3000 PSI PARA ANCLAJE MAMPOSTERIA	58FC-10 días;59FC	57FC-1 día	0%	2,63 días	lun 21/12/26	mié 23/12/26
69		$ 0	$ 0	**FACHADA**			0%	**5 días**	**mar 15/12/26**	**lun 21/12/26**
70		$ 0	$ 0	PANELES DE CERRAMIENTO EN PERFILES DE MADERA TIPO CHOIBÁ. SECCION 8*4CMS. INCLUYE CAPA DE ACABADO MONOCOMPONENTE PARA EXTERIOR BASE AGUA Y BARNIZ QUE APORTA GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL DESGASTE. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTUR	54FC-1 día	468FC-5 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
71		$ 0	$ 0	PANELES PARA PROTECCIÓN SOLAR, COMPUESTO POR PERFILES VERTICALES EN MADERA TIPO CHOIBÁ, SECCIÓN 8*4 CMS. INCLUYE CAPA DE ACABADO MONOCOMPONENTE PARA EXTERIOR BASE AGUA Y BARNIZ QUE APORTA GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL DESGASTE. INCLUYE	54FC-1 día	468FC-5 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
72		$ 0	$ 0	POYO EN CONCRETO REFORZADO FUNDIDO EN SITIO H=.10MM, ANCHO .85 M (INCLUYE	54FC-1 día	468FC-5 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
73		$ 0	$ 0	PANELES EN ACERO TROQUELADOS TIPO EUROMODUL.44 O SIMILAR + PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO MATE CON ACABADO LISO. ENMARCADOS EN PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE. RAL 9011. CON DIMENSIONES Y CALIBRES ACORDE CON	54FC-1 día	468FC-5 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
74		$ 0	$ 0	MUROS EN LADRILLO TOLETE DE GRAN FORMATO, PIEZAS DE FACHADA NO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL, UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA DE 11.5*0.5*39, COLORES COCOA Y TIERRA,	54FC-1 día	468FC-5 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
75		$ 0	$ 0	REVESTIMIENTO PARA INTERIORES ESPESOR 8MM, COMPUESTO POR PANELES QUE ESTÁN REVESTIDOS CON CHAPAS DE MADERA NATURAL, CON UN TRATAMIENTO A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS Y UNA PELÍCULA EXTERIOR QUE LO PROTEGE DE ATAQUES QUÍMICOS Y AGENTES	54FC-1 día	468FC-15 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26

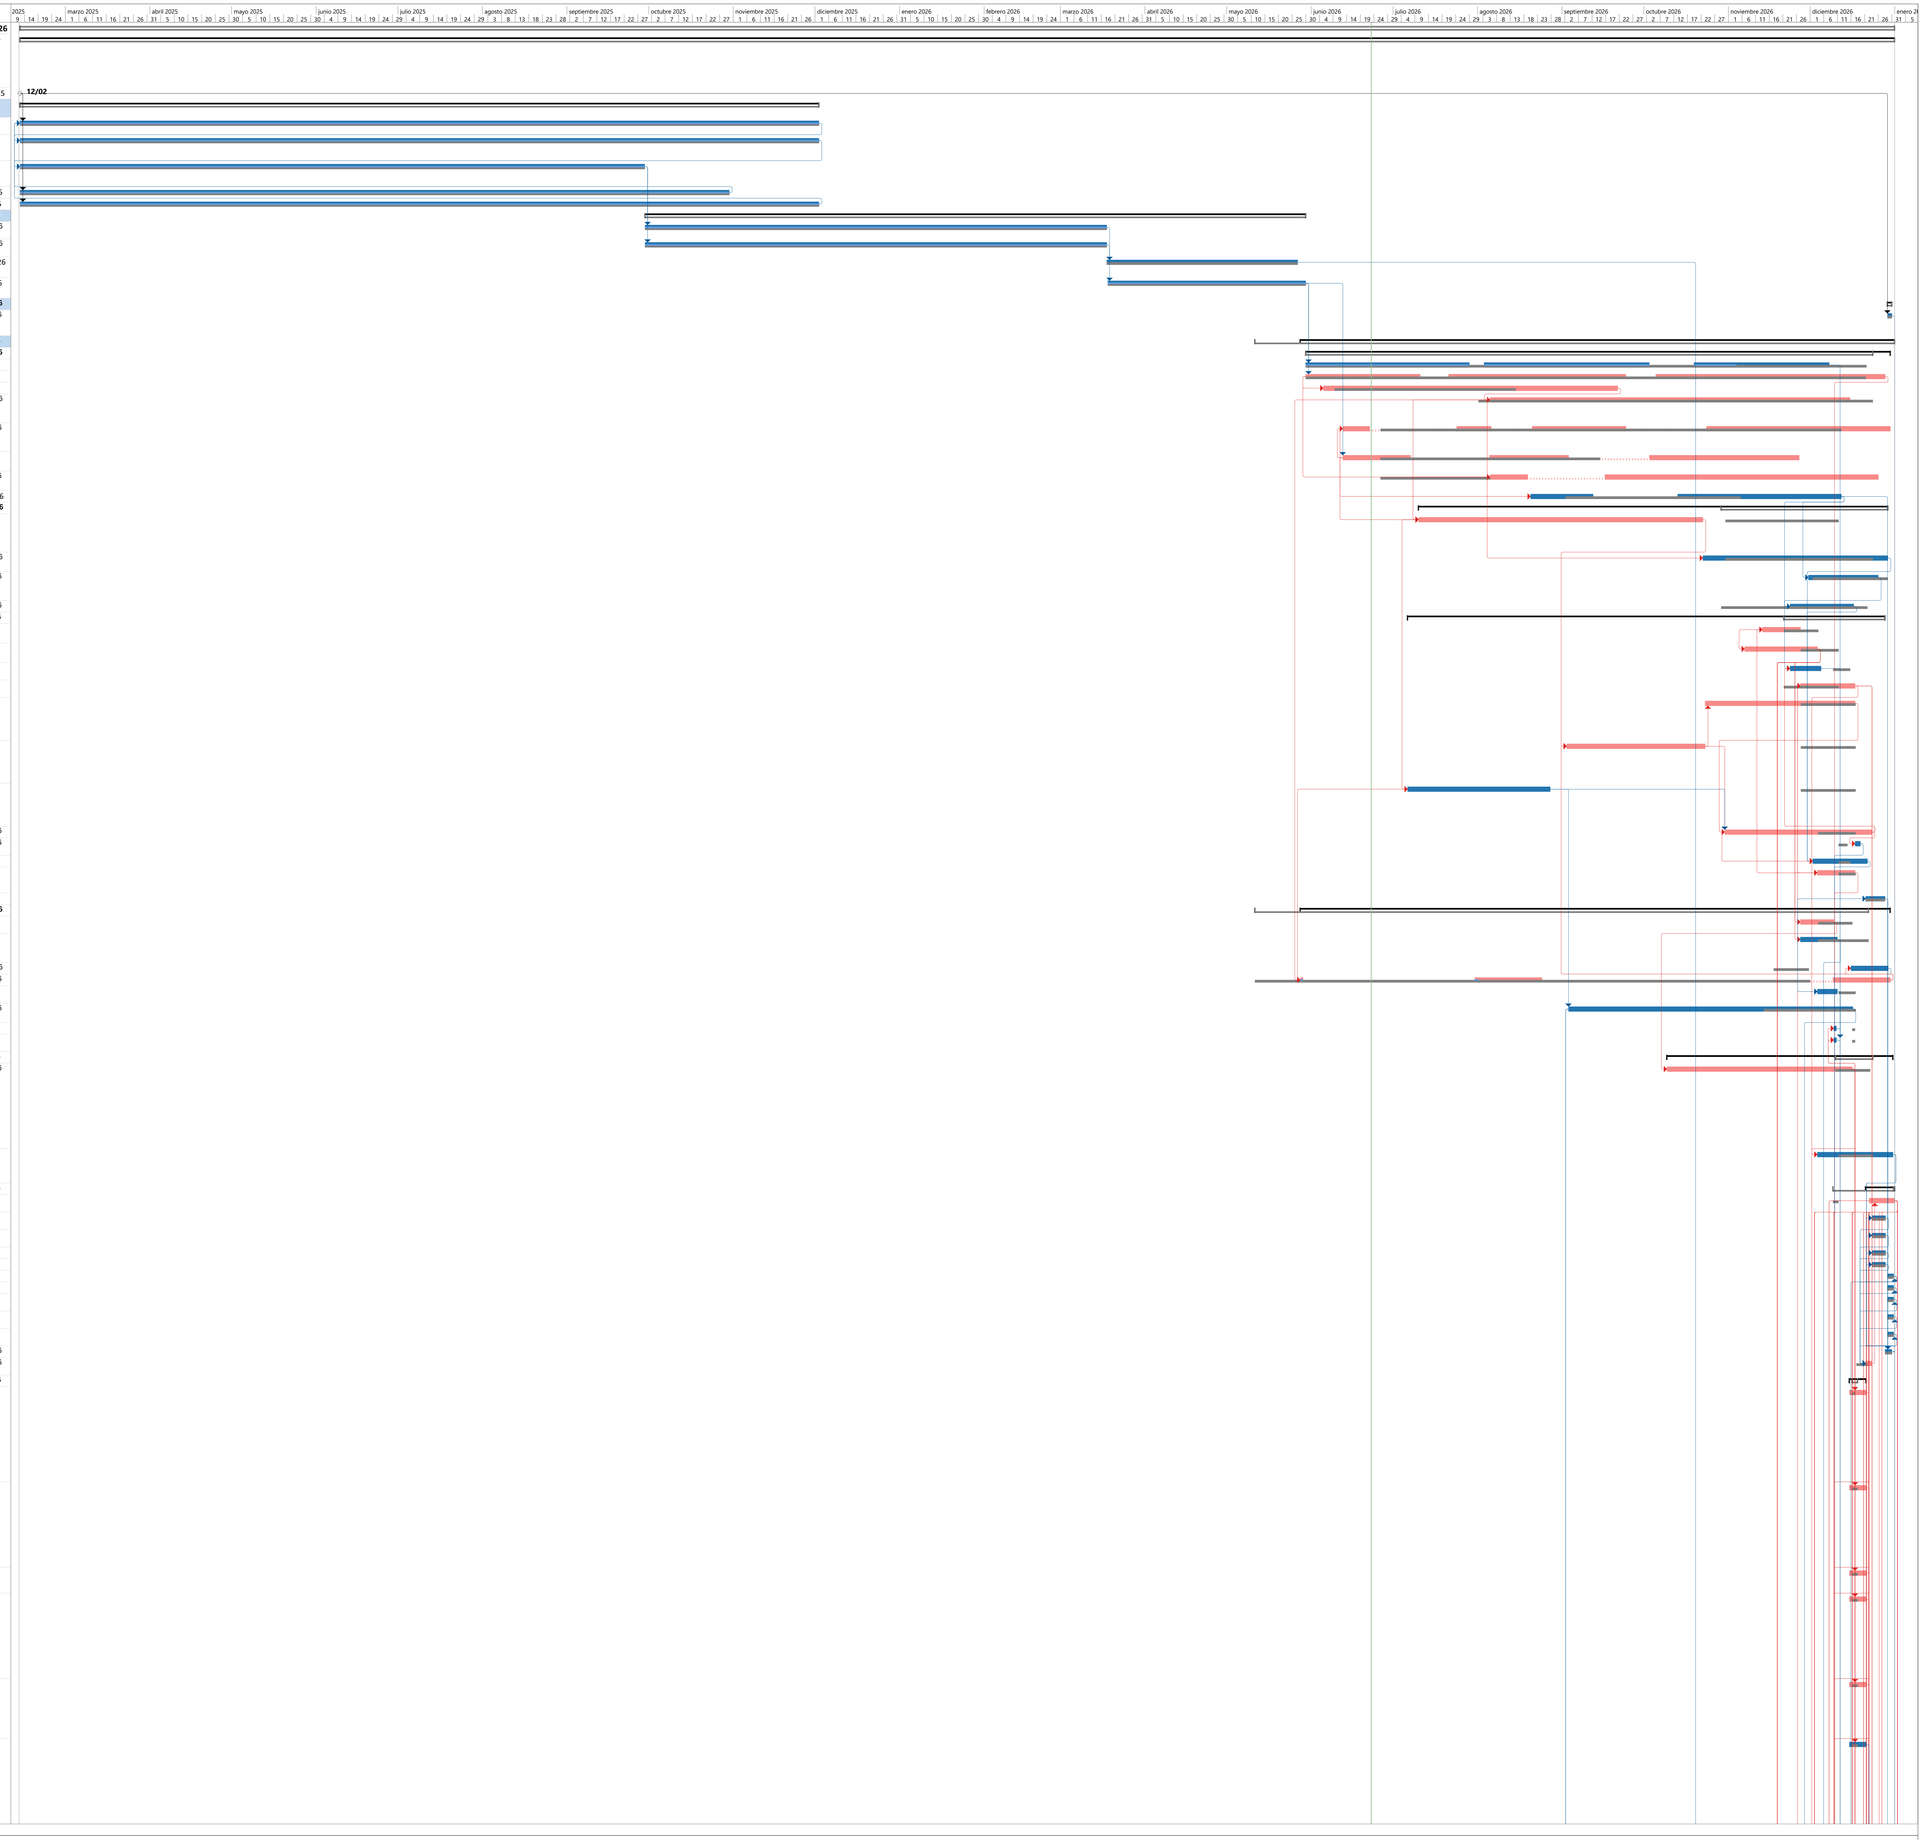

Proyecto: PROGRAMACION V1
Fecha: mar 23/06/26


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Línea base · Hito de línea base · Resumen de línea base · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesoras	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
76		$ 0	$ 0	MATERA EN CONCRETO PREFABRICADO FACHADA AIRE 60X30X34	54FC-1 día	468FC-15 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
77		$ 0	$ 0	MATERA EN CONCRETO PREFABRICADO 95X45X40	54FC-1 día	468FC-15 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
78		$ 0	$ 0	MATERA EN CONCRETO PREFABRICADO FACHADA AIRE 95X45X70	54FC-1 día	468FC-15 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
79		$ 0	$ 0	GUAYAS O CABLES EN ACERO TENSADO, QUE ANCLADAS A ESTRUCTURA EN PERFILES IPE CONFIGURAN UN ENTRAMADO QUE FUNCIONA COMO APOYO PARA EL CRECIMIENTO DE PLANTAS ENREDADERAS EN FACHADA AIRE, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, DISEÑO SEGÚN PLANOS	54FC-1 día	468FC-15 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
80		$ 0	$ 0	PANEL MICROPERFORADO EN ALUMINIO, DE 0.8MM DE ESPESOR, PERFORACIONES DE ACUERDO CON EL DISEÑO DE SEÑALETICA Y PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE	54FC-1 día	468FC-15 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
81		$ 0	$ 0	BANCA FUNDIDA EN SITIO EN CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO, MORTERO DE PEGA, M.O. INSTALACIÓN, ASEO Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	54FC-1 día	468FC-15 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
82		$ 0	$ 0	PANEL ONDULADO MICROPERFORADO EN ALUMINIO CAL 26 ANCLADO A ESTRUCTURA DE ALUMINIO	54FC-1 día	468FC-15 días	0%	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26
83		$ 0	$ 0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			0%	**30,79 días**	**vie 20/11/26**	**jue 31/12/26**
84		$ 0	$ 0	SALIDAS DE ALUMBRADO EN TUBERIA EMT			0%	6 días	mié 23/12/26	jue 31/12/26
85		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación de incrustar. Incluye cable 12AWG, tuberia 3/4, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instalar la salida	57FC-6,11 días	86	0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
86		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación de descolgar. Incluye cable 12AWG, tuberia 3/4, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instalar la salida	57FC-6,11 días;85	88FC-5 días	0%	1 día	mié 30/12/26	jue 31/12/26
87		$ 0	$ 0	Salidas de Tomas En Tuberia EMT			0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
88		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 5-15R placa blanca. Incluye toma, cable 12AWG, tuberia 3/4, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro elemento para instalar la salida	57FC-6,11 días;86FC días	116FC-2,0 días;117F días;118F días;119F días;120F días;121F días;122F días;123F	0%	1,75 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
89		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 5-15R Regulado (placa naranja). Incluye toma, cable 12AWG, tuberia 3/4, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro elemento para instalar la salida	57FC-6,11 días	116FC-2,0 días;117F días;118F días;119F días;120F días;121F días;123F	0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
90		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo GFCI. Incluye toma, cable 12AWG, tuberia 3/4, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro elemento para instalar la salida	57FC-6,11 días	116FC-2,0 días;117F días;118F días;119F días;120F días;121F días;122F	0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
91		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 6-20R. Incluye toma, cable 12AWG, tuberia 3/4, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro elemento para instalar la salida	57FC-6,11 días	116FC-2,0 días;117F días;118F días;119F días;120F días;121F días;122F	0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
92		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación desalida para secador de manos. Incluye cable 12AWG Cu, tuberia 3/4, caja, accesorios y elementos de fijacion	57FC-6,11 días	116FC-2,0 días;117F días;118F días;119F días;120F días;121F días;122F	0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
93		$ 0	$ 0	Tableros de Enchufables y Armario de Medidores			0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
94		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación detablero trifásico NTQ-412-T-S ó TWC-12MBO, barraje de 200A. Incluye kit de llave y tapas obturadoras	57FC-20 días;106F días;107F días;108F días;109F días;110F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
95		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación detablero trifásico NTQ-424-T-S ó TWC-24MBO, barraje de 200A. Incluye kit de llave y tapas obturadoras	57FC-20 días;106F días;107F días;108F días;109F días;110F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
96		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación detablero trifásico NTQ-436-T-S ó TWC-36MBO, barraje de 200A. Incluye kit de llave y tapas obturadoras	57FC-20 días;106F días;107F días;108F días;109F días;110F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
97		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación detablero trifásico NTQ-442-T-S ó TWC-42MBO, barraje de 200A. Incluye kit de llave y tapas obturadoras	57FC-20 días;106F días;107F días;108F días;109F días;110F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
98		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación deArmario de medidores de 6 Cuentas segun norma AE 308 de Codensa. Incluye medidores electronicos trifásicos 5A	57FC-20 días;106F días;107F días;108F días;109F días;110F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
99		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Armario de medidores de 15 Cuentas segun norma AE 308 de Codensa. Incluye medidores eléctronicos trifásicos 5A	57FC-20 días;106F días;107F días;108F días;109F días;110F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
100		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Armario de medidores de 18 Cuentas segun norma AE 308 de Codensa. Incluye medidores eléctronicos trifásicos 5A	57FC-20 días;106F días;107F días;108F días;109F días;110F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
101		$ 0	$ 0	Interruptores			0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
102		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de interruptor enchufable monopolar HOM120 ó	57FC-20 días;106F días;107F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
103		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de interruptor enchufable monopolar HOM220 ó	57FC-20 días;106F días;107F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
104		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de interruptor enchufable tripolar HOM330 ó	57FC-20 días;106F días;107F	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	vie 18/12/26
105		$ 0	$ 0	Acometidas Electricas			0%	15 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26
106		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x8F+1x4N+1x8T Cu AWG en	33FC-10 días	94FC-20 días;95FC días;96FC	0%	15 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26
107		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x6F+1x2N+1x8T Cu AWG en	33FC-10 días	94FC-20 días;95FC días;96FC	0%	15 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26
108		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x4F+1x1/0N+1x8T Cu AWG en	33FC-10 días	94FC-20 días;95FC días;96FC	0%	15 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26
109		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x2F+2x2N+1x6T Cu AWG en	33FC-10 días	94FC-20 días;95FC días;96FC	0%	15 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26
110		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x1/0F+2x1/0N+1x6T Cu AWG en	33FC-10 días	94FC-20 días;95FC días;96FC	0%	15 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26
111		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x4/0F+2x4/0N+1x2T Cu AWG en	33FC-10 días	94FC-20 días;95FC días;96FC	0%	15 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26
112		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x350F+2x350N+1x2T Cu AWG en	33FC-10 días	94FC-20 días;95FC días;96FC	0%	15 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26
113		$ 0	$ 0	Sistema de Captacion de Rayos			0%	3 días	jue 24/12/26	mar 29/12/26
114		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de materiales y puesta en funcionamiento del SIPRA Terminal De Pasajeros. Incluye Captación De Rayos, Bajantes Y Puesta A Tierra Contra Rayos.	376FC-4,4 días;377F días	468FC-15 días	0%	3 días	jue 24/12/26	mar 29/12/26
115		$ 0	$ 0	Control de iluminacion			0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
116		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Sensor de Presencia Argus De Techo Sobreponer Ref: MTN630819. Incluye caja de superficie Ref: MTN550619, elementos de	88FC-2,6 días;89FC días;90FC días;92FC días;91FC días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
117		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Fuente de Alimentación KNX REG-K. 640 mA Ref: MTN684064. Incluye , elementos de fijación y accesorios	88FC-2,6 días;89FC días;90FC días;92FC días;91FC días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
118		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Actuador Binario KNX Basic REG-K/2x/16A con accionamiento Manual. REF MTN647395). Incluye elementos de fijación y accesorios.	88FC-2,6 días;89FC días;90FC días;92FC días;91FC días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
119		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Actuador Binario KNX Basic REG-K/8x/16A con accionamiento Manual. REF MTN647895. Incluye elementos de fijación y accesorios.	88FC-2,6 días;89FC días;90FC días;92FC días;91FC días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
120		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Actuador Binario KNX Basic REG-K/12x/16A con accionamiento Manual. REF MTN648495. Incluye elementos de fijación y accesorios.	88FC-2,6 días;89FC días;90FC días;92FC días;91FC días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
121		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Acoplador REG-K. Ref MTN680204. Incluye elementos de fijación y accesorios	88FC-2,6 días;89FC días;90FC días;92FC días;91FC días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
122		$ 0	$ 0	Controlador de Lógica SpaceLynk Cod: LSS100200. Incluye fuente de alimentación REF MTN693004. elementos de fijación y accesorios	88FC-2,6 días;89FC días;90FC días;92FC días;91FC días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26

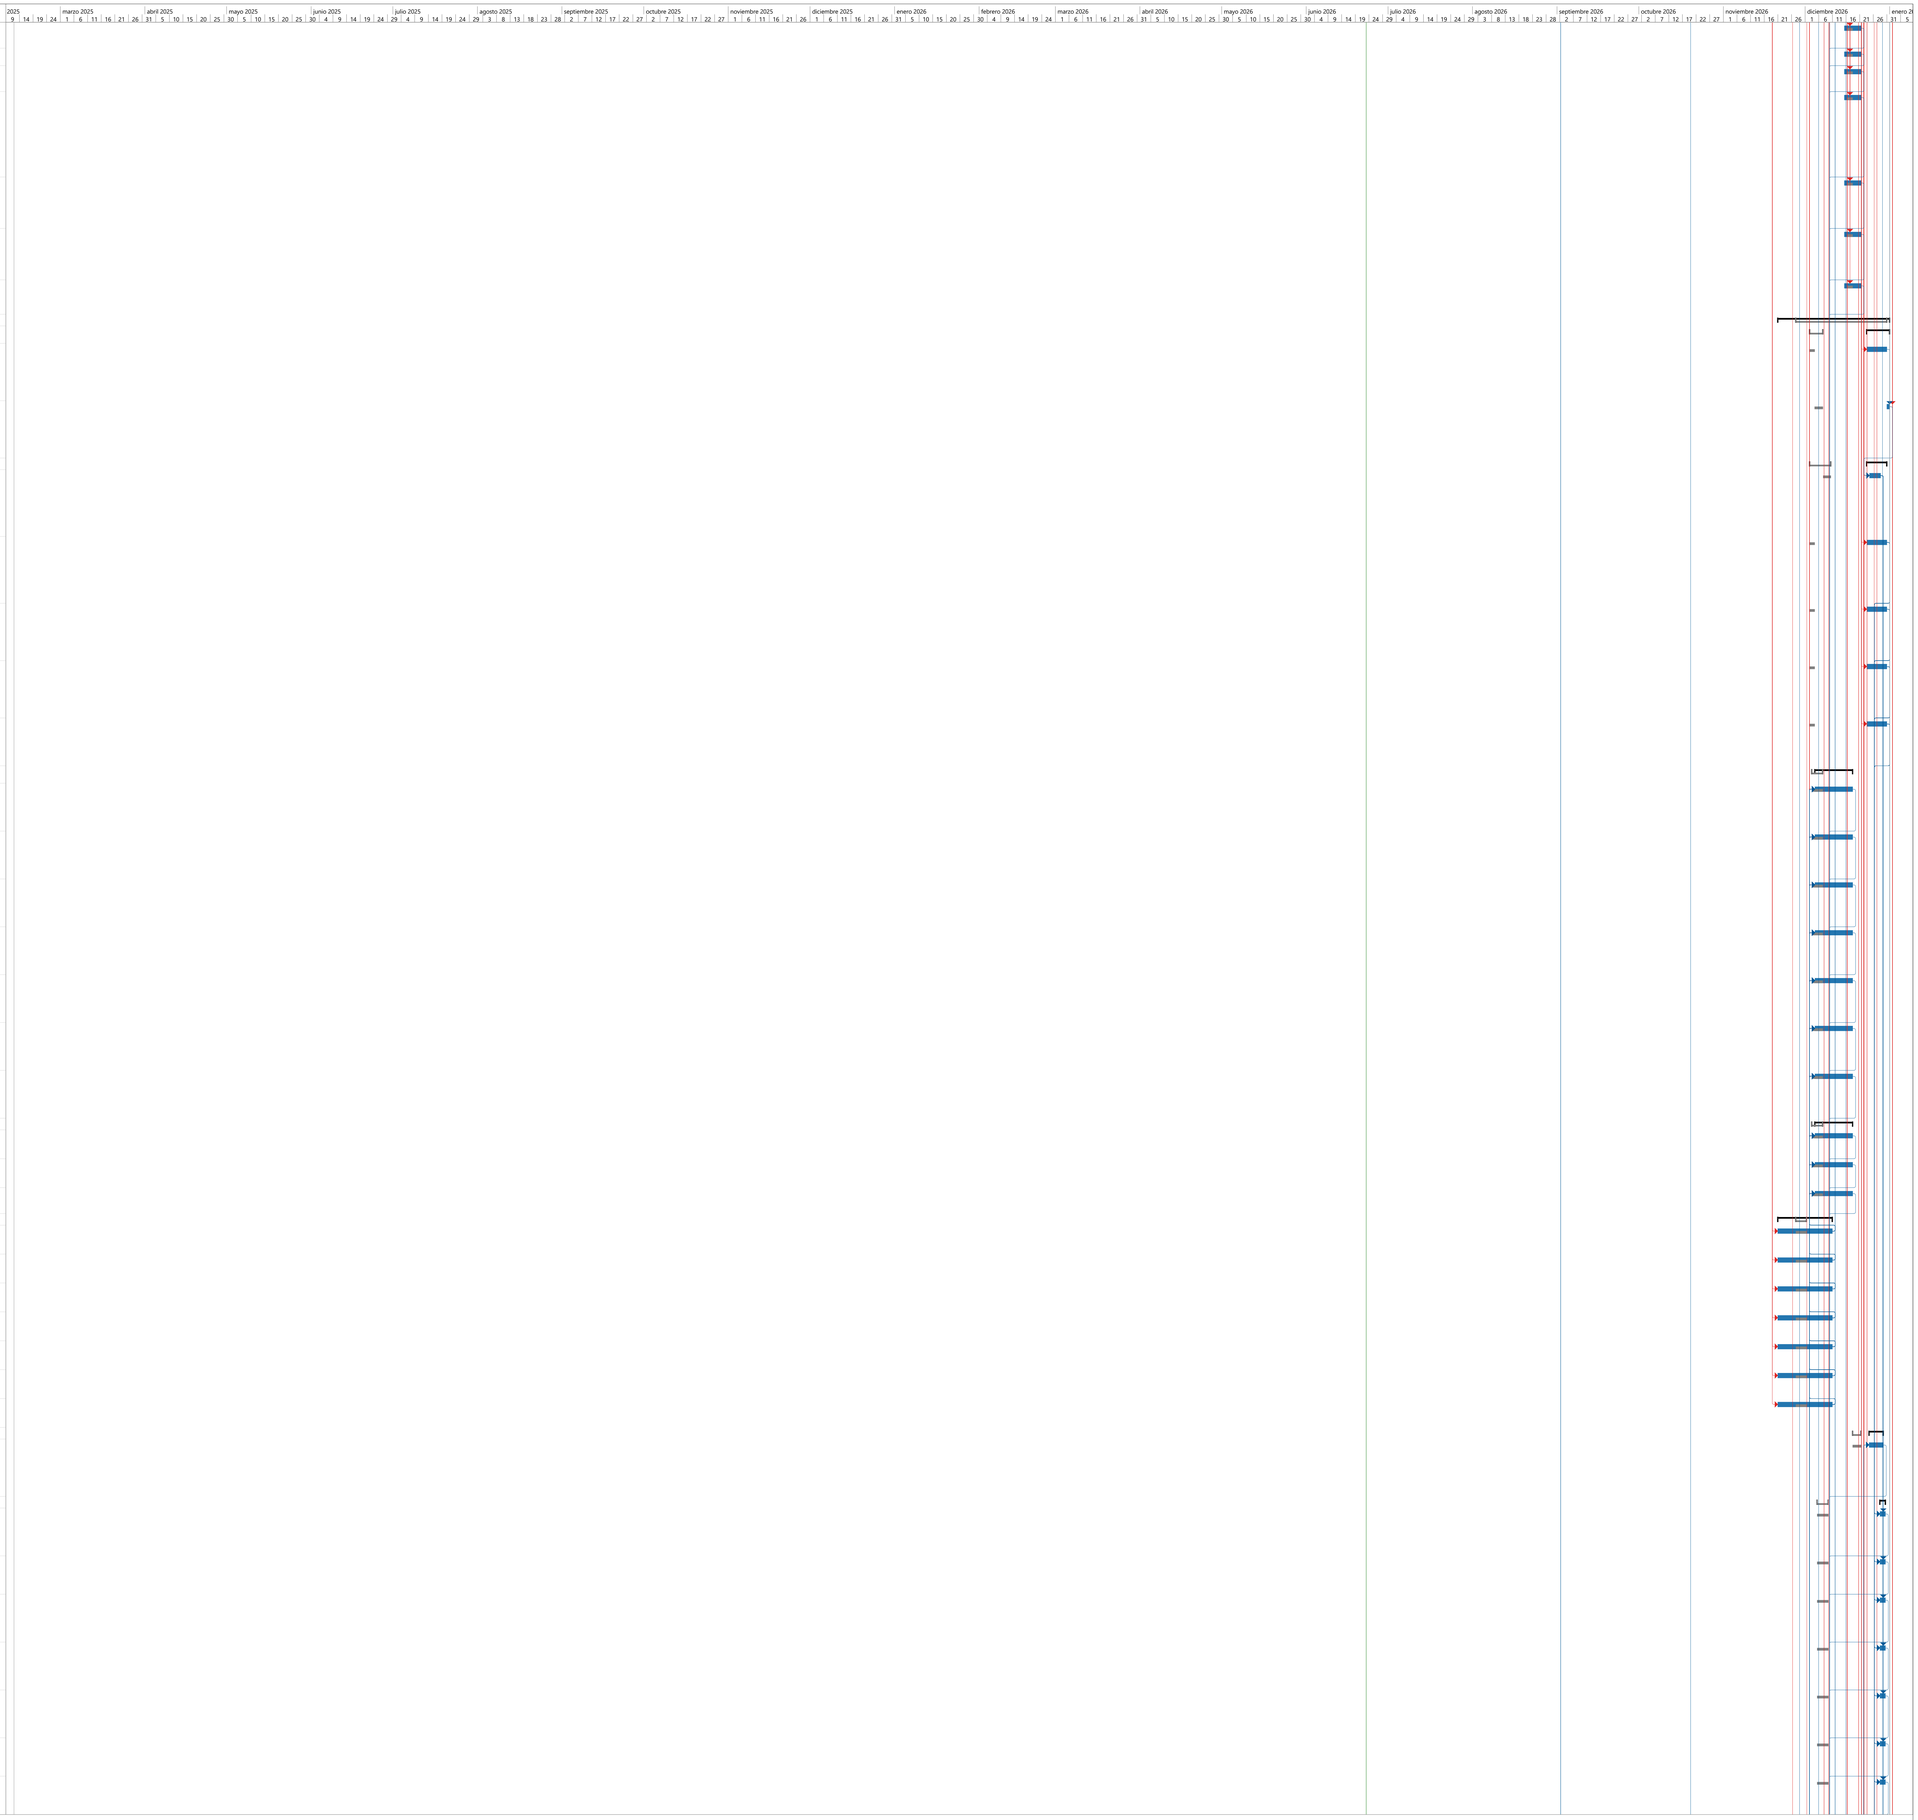

Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesoras	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
123		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de KNX DALI Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1. Ref: MTN6725-0001	88FC-2,6;89FC-1 días;89FC-2 días;90FC-1 días;92FC-1 días;91FC-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
124		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de botonera KNX Ref: MGU3.530.30. Incluye Caja REF: 87665 y placa REF MTN478119	88FC-2,6;89FC-1 días;89FC-2 días;90FC-1 días;92FC-1 días;91FC-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
125		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación deCable KNX TP1	88FC-2,6;89FC-1 días;89FC-2 días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
126		$ 0	$ 0	Configuración y programacion de los dispositivos KNX en software ETS y programacion de lainterfaz gráfica del SpaceLynk. Incluye programación solo por una vez	88FC-2,6;89FC-1 días;89FC-2 días;90FC-1 días;92FC-1 días;91FC-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
127		$ 0	$ 0	Bandejas Portacables, Luminarias			0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
128		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de bandeja portacable Tipo Malla Electrozcada REF: CF54/150. CM000081. Incluye uniones, soportes RCSN. CM013030	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	94FC-20 días;95FC-1 días;96FC-1 días;97FC-1 días;98FC-1 días;99FC-1 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
129		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon Aplique Aragon En Bombilla LED 13 W-1050 Lumenes.Incluye accesorios y elementos de fijacion	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
130		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon Ojo de Buey LED GU12-120V. Incluye accesorios y elementos de fijacion	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
131		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de luminaria Luxycon Hermetica LED 59.7W. Incluye elementos de fijación y accesorios	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
132		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon Easy Spectra SP 4x9W-3R. Incluye elementos de fijación y accesorios	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
133		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon Jupiter LED D74 Difusor BV15-4x9W-4400lm. Incluye elementos de fijación y accesorios	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
134		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon Ojo de Buey Mercury LED 2100lm-21W.Incluye elementos de fijación y accesorios	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
135		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon Spot U LED PAR30 120V-16W-4000k. Incluye riel Spot	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
136		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Isolux Luxycon Spectra 12x9W 13200lm. Incluye elementos de fijación y accesorios	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
137		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Isolux Luxycon Spectra 20x9W 2200lm. Incluye accesorios y elementos de fijacion	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
138		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon Isolux Spectra 8x9W 8800lm. Incluye accesorios y elementos de fijacion	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
139		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon SCRABBLE AI-WA-AR111 15W-4000k 1 Puesto. Incluye elementos de fijación y accesorios	371FC-1,3;372F-1 días;373F-1 días;374F-1 días	468FC-15 días	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
140		$ 0	$ 0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			0%	**20,91 días**	**jue 3/12/26**	**jue 31/12/26**
141		**$ 0**	**$ 0**	**SUMINISTRO AGUA POTABLE Y AGUA SEGURA**			**0%**	**10 días**	**vie 18/12/26**	**jue 31/12/26**
142		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 20 MM PN16 polipropileno-presión nominal de trabajo a 60°C: 16,4 Bares.Color azul	57FC-5 días	143	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
143		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 25 MM PN16 polipropileno-presión nominal de trabajo a 60°C: 16,4 Bares.Color azul	57FC-5 días;142	144	0%	1 día	mar 29/12/26	mar 29/12/26
144		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIPROPILENO 32 MM PN 16 polipropileno-presión nominal de trabajo a 60°C: 16,4 Bares.Color azul.	57FC-10 días;143	145FC-5 días	0%	1 día	mié 30/12/26	mié 30/12/26
145		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIPROPILENO 40 MM PN16 polipropileno-presión nominal de trabajo a 60°C: 16,4 Bares.Color azul.	57FC-15 días;144F-1 días	146	0%	2 días	mié 23/12/26	sáb 26/12/26
146		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIPROPILENO 50 MM PN16 polipropileno-presión nominal de trabajo a 60°C: 16,4 Bares.Color azul.	57FC-10 días;145	147	0%	2 días	lun 28/12/26	mar 29/12/26
147		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIPROPILENO 63 MM PN16 polipropileno-presión nominal de trabajo a 60°C: 16,4 Bares.Color azul.	57FC-10 días;146	148FC-5 días	0%	2 días	mié 30/12/26	jue 31/12/26
148		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIPROPILENO 75 MM PN16 polipropileno-presión nominal de trabajo a 60°C: 16,4 Bares.Color azul.	57FC-15 días;147F-1 días;183F-1 días	155FC-10 días	0%	1 día	jue 24/12/26	sáb 26/12/26
149		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 20 MM presiónnominal de trabajo a 60°C: 300 PSI. marca Poly-Pro o de calidad superior.	57FC-1 día	156FC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
150		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 25 MM presiónnominal de trabajo a 60°C: 300 PSI. marca Poly-Pro o de calidad superior.	57FC-1 día	157FC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
151		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 32 MM presiónnominal de trabajo a 60°C: 300 PSI. marca Poly-Pro o de calidad superior.	57FC-1 día	158FC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
152		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 40 MM presiónnominal de trabajo a 60°C: 300 PSI. marca Poly-Pro o de calidad superior.	57FC-1 día	159FC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
153		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 50 MM presiónnominal de trabajo a 60°C: 300 PSI. marca Poly-Pro o de calidad superior.	57FC-1 día	160FC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
154		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 63 MM presiónnominal de trabajo a 60°C: 300 PSI. marca Poly-Pro o de calidad superior.	57FC-1 día	155FC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
155		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 75 MM presiónnominal de trabajo a 60°C: 300 PSI. marca Poly-Pro o de calidad superior.	57FC-15 días;148F-1 días;154F-1 días	162CC-5 días	0%	1 día	jue 24/12/26	sáb 26/12/26
156		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 20 MM (1/2") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-10 días;149F-1 días	163CC-5 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
157		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 25 MM (3/4") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-10 días;150F-1 días	164CC-5 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
158		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 32 MM (1") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-10 días;151F-1 días	168CC-5 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
159		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 40 MM (1 1/4"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-10 días;152F-1 días	165CC-5 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
160		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 50 MM (1 1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-10 días;153F-1 días	170CC-5 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
161		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2") , Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-1 día	175CC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
162		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 75 MM (2 1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-10 días;155CC-1 días	176CC-5 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
163		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1/2" (20 MM) - Incluye Regata, Tubería, Codos, Tee, Tapón Soldado, Tapón Roscado, Adaptador Macho, Sellante y Demas Accesorios.	57FC-10 días;156CC-1 días	172FC-5 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
164		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PP-R 3/4" (25 MM) - Incluye Regata, Tubería, Codos, Tee, Tapón Soldado, Tapón Roscado, Adaptador Macho, Sellante y Demas Accesorios.	57FC-10 días;157CC-1 días	172FC-5 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
165		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PP-R 1 1/4" (40 MM) - Incluye Regata, Tubería, Codos, Tee, Tapón Soldado, Tapón Roscado, Adaptador Macho, Sellante y Demas Accesorios.	57FC-10 días;159CC-1 días	173FC-5 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
166		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1/2" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior.	57FC-1 día	172FC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26

Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesor	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
167		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 3/4" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior.	57FC-1 día	172FC-10 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
168		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior.	57FC-10 días;158C días	178CC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
169		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior.	57FC-1 día	178CC-10 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
170		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/2 Cuerpo y vastago en bronce, embalaje en teflon, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior.	57FC-10 días;160C	174 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
171		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA Y DESCARGA DE AIRE 1" Ventosa de doble accionamiento, incluye regata, tubería, codo, tapón soldado, roscado, adaptador macho,	57FC-1 día	173FC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
172		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VELOCIMETRICO 1/2", incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos	57FC-15 días;163F días;164F días;166F	177CC-5 días	0%	1 día	jue 24/12/26	sáb 26/12/26
173		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VELOCIMETRICO 1 1/4", incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos	57FC-15 días;165F días;171F días	178CC-5 días	0%	1 día	jue 24/12/26	sáb 26/12/26
174		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VELOCIMETRICO 1 1/2", incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos	57FC-15 días;170	179CC-1 día	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
175		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VELOCIMETRICO 2", incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos normativos.	57FC-10 días;161C días	180CC-1 día	0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
176		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VELOCIMETRICO 2 1/2", incluye medidores, Reg. tub, acc y demas elementos	57FC-10 días;162C días	181CC-1 día	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
177		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA 1 MEDIDOR 1/2". Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en	57FC-10 días;172C días	182	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
178		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA 1 MEDIDOR 1 1/4". Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo	57FC-10 días;168C días;169C días;173C días	182	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
179		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA 1 MEDIDOR 1 1/2". Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo	57FC-10 días;174C día	182	0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
180		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA 1 MEDIDOR 2". Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo Será	57FC-10 días;175C día	182	0%	5 días	mar 22/12/26	mar 29/12/26
181		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA 1 MEDIDOR 2 1/2". Base en concreto Impermebilizado, e=0,125m, paredes en ladrillo recocido, pañete Impermeabilizado, marcos en platina de hierro, el ángulo	57FC-10 días;176C día	182	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
182		$ 0	$ 0	PRUEBAS PARA RED DE SUMINISTRO Agua potable y agua tratada.	57FC-15 días;177C días	184CC-5 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
183		$ 0	$ 0	EXCAVACIÓN MANUAL INCLUYE CARGUE Y RETIRO	57FC-1 día	148FC-7 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
184		$ 0	$ 0	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACIÓN	57FC-10 días;182C días	213CC-15 días	0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
185		**$ 0**	**$ 0**	**DESAGÜES AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS**			**0%**	**20,91 días**	**jue 3/12/26**	**jue 31/12/26**
186		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 2"	35CC+10 días	192	0%	10 días	jue 10/12/26	mié 23/12/26
187		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 3"	35FC+5 días	193FC-15 días	0%	5 días	mié 23/12/26	jue 31/12/26
188		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 4"	35FC+5 días	194FC-15 días	0%	5 días	mié 23/12/26	jue 31/12/26
189		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 6"	35FC-10 días;213C días	195CC-20 días	0%	10 días	jue 3/12/26	jue 17/12/26
190		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 2", no instalar para conducir fluidos, solamente aire.	57FC-5 días	196FC-5 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
191		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-VENT 3", no instalar para conducir fluidos, solamente aire.	57FC-5 días	197FC-20 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
192		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	57FC-15 días;186	196FC-5 días	0%	5 días	mié 23/12/26	jue 31/12/26
193		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3	57FC-15 días;187F días	197FC-20 días	0%	8 días	vie 11/12/26	mar 22/12/26
194		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	57FC-15 días;188F días	198FC-20 días	0%	8 días	vie 11/12/26	mar 22/12/26
195		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 6"	57FC-10 días;189C días	199CC-20 días	0%	8 días	vie 18/12/26	mar 29/12/26
196		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 63 MM (2") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-15 días;190F días;192F días	200CC-15 días;201C días;202C días;203C días	0%	1 día	jue 24/12/26	sáb 26/12/26
197		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 90 MM (3") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-15 días;191F días;193F días	198FC-20 días	0%	3 días	vie 11/12/26	mar 15/12/26
198		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 110 MM (4") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-20 días;194F días;197F días	199	0%	1 día	vie 4/12/26	sáb 5/12/26
199		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE 160 MM (6") Incluye elementos de fijación, abrazadera y demas elementos necesarios.	57FC-10 días;195C días;198	212CC-25 días	0%	1 día	vie 18/12/26	sáb 19/12/26
200		$ 0	$ 0	SALIDA SANITARIA 2", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye cepeta	57FC-15 días;196C días	211	0%	10 días	vie 11/12/26	jue 24/12/26
201		$ 0	$ 0	SALIDA SANITARIA 4", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye cepeta	57FC-15 días;196C días	211	0%	10 días	vie 11/12/26	jue 24/12/26
202		$ 0	$ 0	SALIDA SANITARIA SIFON 3", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, Limpiador y demas elementos necesarios, incluye cepeta	57FC-15 días;196C días	211	0%	10 días	vie 11/12/26	jue 24/12/26
203		$ 0	$ 0	MONTAJE SANITARIO FLUXOMETRO incluye brida desmontable para sanitario, sellante y demas elementos necesarios para su instalación.	57FC-15 días;196C días	204CC-5 días	0%	10 días	vie 11/12/26	jue 24/12/26
204		$ 0	$ 0	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE incluye brida desmontable para sanitario, sellante y demas elementos necesarios para su instalación.	57FC-10 días;203C días	205CC-5 días	0%	10 días	vie 18/12/26	jue 31/12/26
205		$ 0	$ 0	MONTAJE ORINALES , incluye sifón desmontable.	57FC-10 días;204C días	206FC-5 días	0%	10 días	vie 18/12/26	jue 31/12/26
206		$ 0	$ 0	MONTAJE LAVAMANOS , incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1 presión nominal de trabajo 125 PSI	57FC-15 días;205F días	207	0%	3 días	jue 24/12/26	mar 29/12/26
207		$ 0	$ 0	MONTAJE DUCHAS, incluye todos los elementos, accesorios y dispositivos adicionales para el adecuado funcionamiento o de calidad superior	57FC-15 días;206	208FC-5 días	0%	2 días	mié 30/12/26	jue 31/12/26
208		$ 0	$ 0	MONTAJE LAVAPLATOS , incluye sifón desmontable y acoflex diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1 presión nominal de trabajo 125 PSI	57FC-15 días;207F días	209	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
209		$ 0	$ 0	MONTAJE PUNTOS DE ASEO	57FC-10 días	210	0%	2 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
210		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4", tornilleria en acero inoxidable.	57FC-15 días;209	211FC-10 días	0%	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
211		$ 0	$ 0	PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES BAJANTES	57FC-10 días;200;2	212CC-5 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
212		$ 0	$ 0	PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES COLECTORES	57FC-10 días;199C días	214FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
213		$ 0	$ 0	EXCAVACIÓN MANUAL INCLUYE CARGUE Y RETIRO	57FC-15 días;184C días	189CC-30 días	0%	15 días	vie 11/12/26	jue 31/12/26
214		$ 0	$ 0	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACIÓN	57FC-10 días;212F días;215F días	218	0%	1 día	mar 22/12/26	mié 23/12/26
215		$ 0	$ 0	RELLENO EN ARENA INCLUYE TRANSPORTE Y COLOCACIÓN	57FC-10 días	214FC-7 días	0%	10 días	vie 18/12/26	jue 31/12/26
216		$ 0	$ 0	**RED GENERAL CONTRA INCENDIO TERMINAL**			0%	**24,38 días**	**vie 27/11/26**	**mié 30/12/26**
217		**$ 0**	**$ 0**	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE			**0%**	14,38 días	vie 11/12/26	mié 30/12/26
218		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 12 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	290CC-15 días;291C días;292C días	468FC-15 días	0%	5 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26
219		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 16 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	290CC-10 días;291C días;292C días	468FC-15 días	0%	5 días	mié 16/12/26	mar 22/12/26
220		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 30 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	290CC-15 días;291C días;292C días	468FC-15 días	0%	5 días	vie 11/12/26	jue 17/12/26

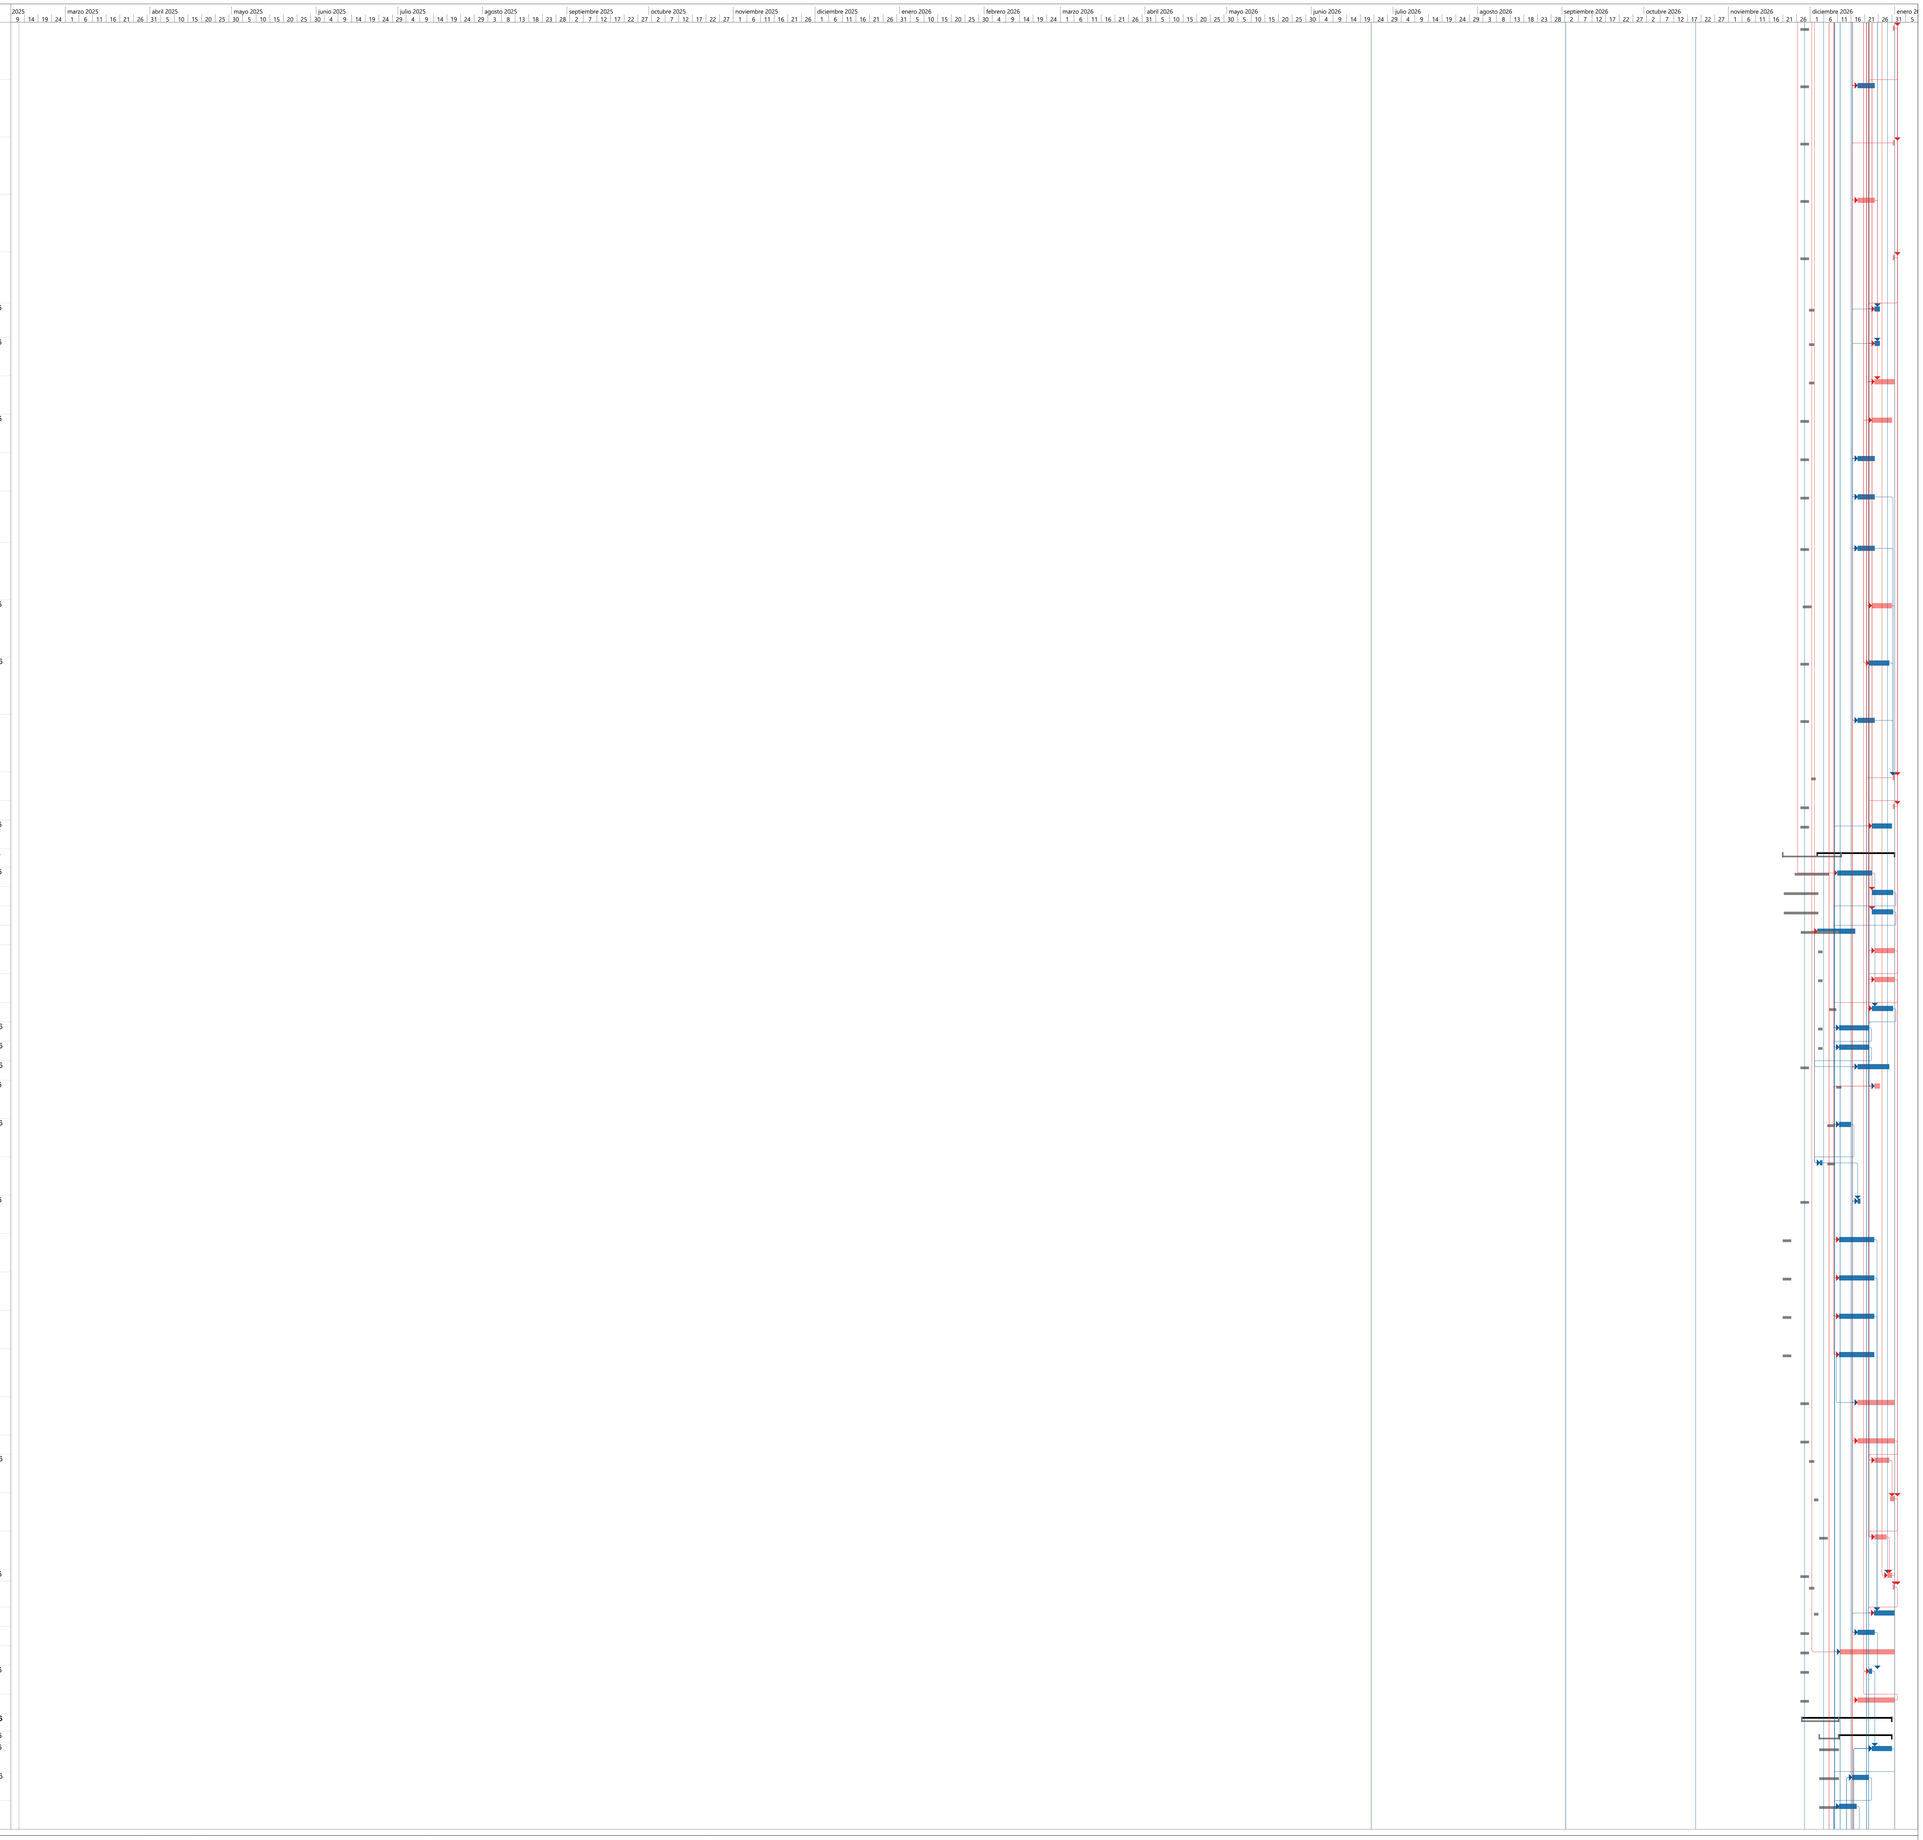

Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesoras	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
221		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOXIDABLE. 38 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	5 días	vie 11/12/26	jue 17/12/26
222		**$ 0**	**$ 0**	**ELEMENTOS INCENDIO**			**0%**	15 días	vie 27/11/26	jue 17/12/26
223		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE CONTROL SVA 20 D00016 30 MM	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	5 días	vie 4/12/26	vie 11/12/26
224		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE CONTROL SBA 40 38 MM	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	5 días	vie 4/12/26	vie 11/12/26
225		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA 38MM	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	5 días	vie 4/12/26	vie 11/12/26
226		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA C20-57 C/0	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
227		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA C30-57 C/1	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 27/11/26	vie 11/12/26
228		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA SN1MCBMC1ORA	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
229		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA LA VÁLVULA	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
230		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA PARA GABINETE	290CC-15 días;291C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
231		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEVANADERA	290CC-15 días;291C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
232		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION LANZA INCENDIO	290CC-15 días;291C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
233		$ 0	$ 0	EXCAVACIÓN MANUAL INCLUYE CARGUE Y RETIRO	290CC-15 días;291C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
234		$ 0	$ 0	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACIÓN	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
235		$ 0	$ 0	ENCAMIZADO EN TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 3"	290CC-15 días;291C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
236		$ 0	$ 0	**VENTILACIÓN MECÁNICA**			0%	**23,38 días**	**lun 30/11/26**	**jue 31/12/26**
237		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION, , PARA USO EN INTFRIORES	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
238		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, DE 12 TONELADAS DE REFRIGERACION, , PARA USO EN INTFRIORES.	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
239		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, DE 50 TONELADAS DE REFRIGERACION, DE DOBLE PARED, PARA USO EN EXTERIORES.	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
240		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UMP UNIDAD MANEJADORA DE PRESICION , DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACION, DE DISPOSICION VERTICAL, PARA USO INTFRNO	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
241		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PARED O CASETTE 4 TON REF. ENFRIADA CON AGUA.	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
242		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PARED O CASETTE 3,5 TON REF. ENFRIADA CON AGUA.	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
243		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PARED O CASETTE 3 TON REF. ENFRIADA CON AGUA.	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
244		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PARED O CASETTE 2,5 TON REF. ENFRIADA CON AGUA.	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
245		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PARED O CASETTE 2 TON REF. ENFRIADA CON AGUA.	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
246		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PARED O CASETTE 1,5 TON REF. ENFRIADA CON AGUA.	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
247		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENFRIADOR DE AGUA EA TIPO PAQUETE DE 90 TONELADAS DE REFRIGERACION, CONDENSACION POR AIRE, DE DOBLE CIRCUITO, COMPRESORES SCROLL, R 410 A. DE CFM, 90 TR, PARA SUPLIR ENTRE 129 Y 310 GPM, 208 - 60	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
248		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENFRIADOR DE AGUA EA TIPO PAQUETE DE 50 TONELADAS DE REFRIGERACION, CONDENSACION POR AIRE, DE DOBLE CIRCUITO, COMPRESORES SCROLL, R 410 A. DE CFM, PARA SUPLIR ENTRE 74 Y 176 GPM, 208 - 60	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
249		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA SISTEMA DE AGUA FRIA DE 12 HP/EQUIPO, CAPACIDAD PARA SUPLIR ENTRE 150 Y 300 GPM, CON UNA CABEZA DE 46 METROS, TRIFASICA 208V - 60HZ. (SISTEMA DUPLEX PARA MANEJAR ALTERNANCIA Y RESPALDO DE UNA BOMBA,	290CC-15 días;291C días;292C días;293C días	468FC-15 días	0%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26
250		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA SISTEMA DE AGUA FRIA DE 8 HP/EQUIPO, CAPACIDAD PARA SUPLIR ENTRE 90 Y 160 GPM, CON UNA CABEZA DE 20 METROS, TRIFASICA 208V - 60HZ. (SISTEMA DUPLEX PARA MANEJAR ALTERNANCIA Y RESPALDO DE UNA BOMBA, SEGÚN CAUDAL DE CO	50FC-12 días	468FC-15 días	0%	10 días	lun 30/11/26	lun 14/12/26
251		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO Ø 2 1/2"	57FC-10 días	252FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
252		$ 0	$ 0	TUBERÍA EN POLIPROPILENO Ø 2"	57FC-10 días	253FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
253		$ 0	$ 0	TUBERÍA EN POLIPROPILENO Ø 1 1/2"	57FC-10 días;252F	254FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
254		$ 0	$ 0	TUBERÍA EN POLIPROPILENO Ø 1 1/4"	57FC-10 días;253F	255FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
255		$ 0	$ 0	TUBERÍA EN POLIPROPILENO Ø 1"	57FC-10 días	256FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
256		$ 0	$ 0	TUBERÍA EN POLIPROPILENO Ø 3/	57FC-10 días	260FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
257		$ 0	$ 0	TUBERÍA EN ACERO SCHEDULE 40 SIN COSTURAS DE Ø 3"	57FC-10 días;258F	263FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
258		$ 0	$ 0	TUBERÍA EN ACERO SCHEDULE 40 SIN COSTURAS DE Ø 4"	57FC-10 días	257FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
259		$ 0	$ 0	AISLAMIENTO EN POLIURETANO PARA TUBERIA DE Ø 3/4"	57FC-10 días;260F	270FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
260		$ 0	$ 0	AISLAMIENTO EN POLIURETANO PARA TUBERIA DE Ø 1"	57FC-10 días;256F	259FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
261		$ 0	$ 0	AISLAMIENTO EN POLIURETANO PARA TUBERIA DE Ø 1 1/4"	57FC-10 días;262F	260FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
262		$ 0	$ 0	AISLAMIENTO EN POLIURETANO PARA TUBERIA DE Ø 1 1/2"	57FC-10 días;263F	261FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
263		$ 0	$ 0	AISLAMIENTO EN POLIURETANO PARA TUBERIA DE Ø 2"	57FC-10 días;257F	262FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
264		$ 0	$ 0	AISLAMIENTO EN POLIURETANO PARA TUBERIA DE Ø 2 1/2"	57FC-10 días;265F	263FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
265		$ 0	$ 0	AISLAMIENTO EN POLIURETANO PARA TUBERIA DE Ø 3"	57FC-10 días;266F	264FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
266		$ 0	$ 0	AISLAMIENTO EN POLIURETANO PARA TUBERIA DE Ø 4"	57FC-10 días	265FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
267		$ 0	$ 0	TUBERIA EN PVC PARA DESAGUES DE LOS EQUIPOS DE	57FC-10 días	260FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
268		$ 0	$ 0	LÁMINA GALVANIZADA CAL 24	57FC-10 días	270FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
269		$ 0	$ 0	LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	57FC-10 días	268FC-10 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
270		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO DUCT WRAP	57FC-10 días;259F	274CC-15 días	0%	5 días	vie 18/12/26	jue 24/12/26
271		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DS4V 9"X9"	371;372;3	468FC-15 días	0%	1 día	mié 30/12/26	jue 31/12/26
272		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE	371;372;3	468FC-15 días	0%	1 día	mié 30/12/26	jue 31/12/26
273		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL DIGITAL DIRECTO PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL TERMINAL, INCLUYE TODOS LOS SENSORES, ACTUADORES Y DEMÁS QUE PERMITAN LA OPERACIÓN CENTRALIZADA DEL	371;372;3	288CC-15 días	0%	1 día	mié 30/12/26	jue 31/12/26
274		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE EXTRACCION POR VENTILADOR TIPO HONGO DE 800 CFM CON TRAMPA DE GRASAS	371CC-15 días;372C días;373C días;374C días;279C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
275		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE EXTRACCION POR VENTILADOR TUBULAR DE 900	371CC-15 días;372C días;373C días;374C días;279C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
276		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE EXTRACCION POR VENTILADOR TUBULAR DE 800	371CC-15 días;372C días;373C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
277		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE EXTRACCION POR VENTILADOR TUBULAR DE 1 50	371CC-15 días;372C días;373C días;374C días;279C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
278		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FLEXIBLE PARA VENTILACION AISLADA DE 10"	57CC-10 días	279CC-10 días	0%	5 días	mié 9/12/26	mié 16/12/26
279		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FLEXIBLE AISLADA DE	57CC-10 días;278C	280CC-15 días	0%	5 días	mié 9/12/26	mié 16/12/26
280		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINAS Y/O RESTAURANTES.	371CC-15 días;372C días;373C días;374C días;279C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26




Proyecto: PROGRAMACION V1
Fecha: mar 23/06/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Línea base · Hito de línea base · Resumen de línea base · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesor	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
281		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE EXTRACCION DE	371CC-15 dias;372C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
282		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DS4V 6"X6"	371CC-15 dias;372C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
283		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE EXTRACCION DE	371CC-15 dias;372C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
284		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DS4V 18"X18"	371CC-15 dias;372C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
285		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE INYECCION POR VENTILADOR TUBULAR DE 2900	371CC-15 dias;372C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
286		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE INYECCION POR VENTILADOR TUBULAR DE 2800	371CC-15 dias;372C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
287		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE INYECCION POR VENTILADOR TUBULAR DE 2400	371CC-15 dias;372C	468FC-15 días	0%	5 días	sáb 5/12/26	sáb 12/12/26
288		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCION 4"X4"	371CC-15 dias;372C	468FC-15 días	0%	5 días	jue 10/12/26	mié 16/12/26
289		$ 0	$ 0	**PAÑETES**			0%	**5 días**	**jue 17/12/26**	**jue 24/12/26**
290		$ 0	$ 0	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 C	62FC-10 d	362;363;3	0%	5 días	jue 17/12/26	jue 24/12/26
291		$ 0	$ 0	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	290CC	362;363;3 dias;224C	0%	5 días	jue 17/12/26	jue 24/12/26
292		$ 0	$ 0	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO	290CC	362;363;3	0%	5 días	jue 17/12/26	jue 24/12/26
293		$ 0	$ 0	FILOS Y DILATACIONES	290CC	362;363;3	0%	5 días	jue 17/12/26	jue 24/12/26
294		$ 0	$ 0	**CARPINTERÍA METÁLICA**			0%	**4 días**	**jue 24/12/26**	**mié 30/12/26**
295		$ 0	$ 0	DIVISIONES DE SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE AISISAE CALIBRE 20 (0,9 MM) (INCLUYE , ACCESORIOS CERROJOS Y PUERTAS)	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
296		$ 0	$ 0	DIVISION PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 INCLUYE INSTALACIÓN	339FC-5 dias;340F dias;342F	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
297		$ 0	$ 0	DIVISIONES PARA DUCHAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 3+3MM DE ESPESOR DE COLOR VERDE FUN DE ACUERDO CON LA LOCALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS DENTRO DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
298		$ 0	$ 0	CANAL DESARROLLO 1.35 M PREFORMADA CAMINABLE DE ACERO, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, ANCLADA A ESTRUCTURA DE CUBIERTA, ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO RAL 9016	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
299		$ 0	$ 0	BARANDAS PARACAMINADERO, CONFORMADAS POR PARALES EN PLATINA DE ACERO NEGRO, Y PASAMANOS EN TOPE DE DE PERFIL DE ACERO (SCM ANCHO)	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
300		$ 0	$ 0	PASARELA EN MALLA EXPANDIDA COLOR NEGRO MATE. INCLUYE PERFILERÍA ESTRUCTURAL EN ACERO	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
301		$ 0	$ 0	BARRA DE PROTECCION VIDRIOS TUBULAR DE 2" EN ACERO INOXIDABLE, ANCLADAS POR MEDIO DISCOS EN ACERO INOXIDABLE DE 5" Y PERNOS	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
302		$ 0	$ 0	PASAMANOS, DOBLE TUBULAR DE 2.5" ANCLADO A LA ESTRUCTURA PERIMETRAL POR MEDIO DE PLATINAS HORIZONTALES. LA PINTURA DE ESTOS PASAMANOS SERÁ CALIDAD ELECTROSTÁTICA.	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
303		$ 0	$ 0	LOCKER METÁLICO 12 PUESTOS PARA VESTIER CON REJILLA DE VENTILACIÓN, INCLUYE PORTA CANDADO Y MANIJA TIPO CONCHA, INCLUYE CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA ALQUÍDICA Y ATOXICA INDUSTRIAL. ACABADO EN ESMALTE	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
304		$ 0	$ 0	PUERTA CORTA FUEGO EN COLD ROLLED 1.5X2.2 M, PUERTA DE VAIVÉN DOBLE EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011. INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
305		$ 0	$ 0	PUERTA EN REVESTIMIENTO DE ALUMINIO 0.94-1.0X2.2 TIPO EURO MODUL 44 O SIMILAR SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS ENMARCADAS POR PERFILES VERTICALES EN ALUMINIO NEGROS, LAS PUERTAS SE CONFIGURAN POR UN MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
306		$ 0	$ 0	PUERTA BATIENTE SENCILLA 0.82-1.0X2.2 M EN LAMINA COLD ROLLED , CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO, COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES EN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE MARCO EN COLD ROLLED, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
307		$ 0	$ 0	REJA ENROLLABLE EN ALUMINIO 5.8X2.56 M PUERTA ENROLLABLE TIPO MALLA, CONFORMADA POR VARILLAS DE ACERO GALVANIZADO DE 7 MM , RECUBIERTAS CON TUBOS DE ALUMINIO DE 3/8" Y CONECTORES DE ALUMINIO DE 5/8" CON ACABADO "CLEAR	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
308		$ 0	$ 0	PUERTA CORREDIZA DE 2MX2.6, SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA CON ACABADO EN TABLEROS ESTRATIFICADOS DE MADERA DE ALTA DENSIDAD,(PRODEMA EQUIVALENTE O SUPERIOR), HACIA EL INTERIOR Y EL EXTERIOR. PANELES DE	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
309		$ 0	$ 0	PUERTA BATIENTE DOBLE 1.5X2.21 M EN LAMINA COLD ROLLED, QUE ABRE HACIA AFUERA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO, COLOR BLANCO. INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO, COLOR BLANCO,	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
310		$ 0	$ 0	PUERTA BATIENTE DOBLE EN LAMINA COLD ROLLED 1.5X2.21, QUE ABRE HACIA AFUERA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO, COLOR BLANCO. INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO, COLOR BLANCO, MANIJA, PERFILES SEG	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
311		$ 0	$ 0	PUERTA BATIENTE DOBLE 1.2X2.21 COLD ROLLED, QUE ABRE HACIA AFUERA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO, COLOR BLANCO. INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO, COLOR BLANCO, MANIJA, PERFILES	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
312		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE AISISAE CAL 20 (0.3MX2M)	339FC-5 dias;340F dias;342F	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
313		$ 0	$ 0	PUERTA BLINDADA DE 7 PASADORES, MIRILLA EN VIDRIO BLINDADO DE 36MM, RELLENO EN SIN FOLL DE ROCA VOLCÁNICA CORTAFUEGO, ESTRUCTURA EN METAL COLD ROLLED CALIBRE 14 CON BLINDAJE EN HR DE 1/4, ACABADOS EN PINTURA ELECTROESTÁTICA; LLAVE	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
314		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN MALLA ESLABONADA 2½" Y TUBERÍA GALVANIZADA 2" PINTADA EN ESMALTE" PARA CONFORMACIÓN DE CANILES INCLUYE ACCESOS	339FC-5 dias;340F dias;342F dias	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
315		$ 0	$ 0	**VENTANERÍA Y VIDRIO**			0%	**4,5 días**	**jue 24/12/26**	**jue 31/12/26**
316		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN SISTEMA DE VIDRIO CAMARA DE COMPOSICION CRUDO KNT-155 6MM + PVB INC 0,76 + 6MM INC // CAMARA SEPARADOR DE 1" // LAMINADO INC 4MM + PVB INC 0,76 + 4MM INC. FACHADA FLOTANTE SISTEMA SERIE 75 ANCLADA A E	371FC-2 dias;372F dias;373F dias;374F dias	(468FC-15 días	0%	3 días	lun 28/12/26	jue 31/12/26
317		$ 0	$ 0	FACHADA FLOTANTE SISTEMA SERIE 75 PIEL DE VIDRIO MONOLÍTICO.SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN VIDRIO TEMPLADO MONOLITICO 8MM INC. ANCLAJE SUPERIOR A VIGA IPE, E INFERIOR A PLACA. ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO.	371FC-2 dias;372F dias;373F dias;374F dias	(468FC-15 días	0%	3 días	lun 28/12/26	jue 31/12/26
318		$ 0	$ 0	FACHADA FLOTANTE SISTEMA SERIE 75 PIEL DE VIDRIO MONOLÍTICOV + M2 DE VIDRIO MULTILAMINADO 6MM CRUDO KNT-155 + PVB INC 0,76 + 8MM INC + PVB INC0,76 + 6MM INC. PERFILES 1101 HORIZONTALES SUPERIOR E INFERIOR Y VERTICALES LATERALES CON INYECCIÓN DE POLIURETAN	371FC-2 dias;372F dias;373F dias;374F dias	(468FC-15 días	0%	3 días	lun 28/12/26	jue 31/12/26



Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesor	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
319		$ 0	$ 0	VENTANA FIJA EN SISTEMA 3890 CON DIVISOR, SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN VIDRIO LAMINADO 5MM+5MM, VIDRIO INFERIOR CON ACABADO SANDBLASTING. PERFILES 1101 HORIZONTALES SUPERIOR E INFERIOR Y VERTICALES LATERALES CON PISA VIDRIO CUADR	371FC-2,{468FC-15 días;372F días;373F días;374F días		0%	3 días	lun 28/12/26	jue 31/12/26
320		$ 0	$ 0	VENTANA FIJA EN SISTEMA 3890 CON SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN VIDRIO MULTILAMINADO 6MM CRUDO KNT- 155 + PVB INC 0,76 + 8MM INC + PVB INC0,76 + 6MM INC. EL MARCO SE COMPONE DE PERFILES 1101 EN ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, HORIZONTAL	371FC-2,{468FC-15 días;372F días;373F días;374F días		0%	3 días	lun 28/12/26	jue 31/12/26
321		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA - VIDRIERA SENCILLA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 10MM EN SISTEMA ZOCALO EN ALUMINIO (9CMS ALTURA) COLOR NEGRO MATE.	339FC-5 días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	3 días	jue 24/12/26	mar 29/12/26
322		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VITRINA CON MONTANTE SUPERIOR, ANCLADO A ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE (CHAPETAS). VIDRIO TEMPLADO 10MM.	339FC-5 días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
323		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA DOBLE EN VIDRIO CAMARA DE COMPOSICION CRUDO KNT-155 6MM + PVB INC 0,76 + 6MM INC // CAMARA SEPARADOR DE 1" // LAMINADO INC 4MM + PVB INC 0,76 + 4MM INC +LOW-E (PELÍCULA, CONTROL BAJO -	339FC-5 días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
324		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA DOBLE + M2 DE VIDRIO MULTILAMINADO 6MM CRUDO KNT-155 + PVB INC 0,76 + 8MM INC + PVB INC0,76 + 6MM INC. PERFILES RELLENOS DE POLIURETANO EXPANDIDO, CON PISA VIDRIO CUADRADO. INCLUYE MANIJA ANTIPÁNICO,	339FC-5 días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
325		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA DOBLE + M2 DE VIDRIO MULTILAMINADO 6MM CRUDO KNT-155 + PVB INC 0,76 + 8MM INC + PVB INC0,76 + 6MM INC. EL MARCO SE COMPONE DE PERFILES EN ALUMINIO ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, RELLENOS DE POLIURETANO E	339FC-5 días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
326		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA DOBLE + M2 DE VIDRIO MULTILAMINADO 6MM CRUDO KNT-155 + PVB INC 0,76 + 8MM INC + PVB INC0,76 + 6MM INC. PUERTA CON SISTEMA DE ZOCALOS DESCOLGADA DESDE LA FACHADA (SIN EMPOTRAR A PISO). SISTEMA DE APE	339FC-5 días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
327		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA - VIDRIERA DOBLE CON MONTANTE SUPERIOR, ANCLADO A ESTRUCTURA METÁLICA, CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE (CHAPETAS). MANIJAS TIPO ROMA DE 40 CMS DE LARGO, Y BISAGRA HIDRÁULICA TIPO SPD (ANCLAJE AL PISO). VI	339FC-5 días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
328		$ 0	$ 0	CORTASOL ACCIONABLE EN ALUZINC (Calibre 21) TIPO AEROSHIELD EQUIVALENTE O SUPERIOR CON ACABADO LISO MAS PINTURA ANTICORROSIVA COLO NEGRO. SISTEMA MOTORIZADO.	339FC-5 días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
329		$ 0	$ 0	VENTANA EN VIDRIO BLINDADO SOBRE ANTEPECHO	339FC-5 días;340F días	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
330		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO PARA BAÑOS SIN MARCO Y SIN BISEL E= 5mm.	339FC-5 días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
331		$ 0	$ 0	**PISOS Y BASES**			0%	**7,38 días**	**lun 21/12/26**	**mié 30/12/26**
332		$ 0	$ 0	PISO EN CONCRETO ENDURECIDO ESMALTADO	290FC-2,{468FC-15 días;291F días		0%	7 días	lun 21/12/26	mié 30/12/26
333		$ 0	$ 0	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	334FC-4,{337FC-2 días		0%	6 días	lun 21/12/26	mar 29/12/26
334		$ 0	$ 0	PLACA BASE CONTRAPISO EN CONCRETO 0.15 4000 PSI	290FC-2,{333FC-4,; días;291F días		0%	4 días	lun 21/12/26	sáb 26/12/26
335		$ 0	$ 0	**ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**			0%	**4,38 días**	**jue 24/12/26**	**jue 31/12/26**
336		$ 0	$ 0	ENCHAPE PARA MUROS EN GRES PORCELANICO, FORMATO 30*60 COLOR GRANITO. INCLUYE MATERIAL DE PEGA.	371FC-3,{344FC-1,; días;372F días;373F días;374F días	349F días;350F días;351F días;352F	0%	4 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
337		$ 0	$ 0	BALDOSA DE GRANITO HABANA TRANI DE 30 CM CON GRANO TRANI Nº 1 - 2, ESPESOR 2,1 CM REF : 132201 O EQUIVALENTE.	333FC-2 días	339FC-2,{ días;340F días	0%	2,63 días	sáb 26/12/26	mié 30/12/26
338		$ 0	$ 0	BALDOSA DE GRANITO COLOR Y TIPO DE GRANO BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE 30 CM. ESPESOR 2,1 CM REF SEGÚN ESPECIFICACIONES.	67FC-2 días	339FC-2,{ días;340F días	0%	2,63 días	mar 29/12/26	jue 31/12/26
339		$ 0	$ 0	GUARDAESCOBA ZOCALO DE BALDOSA DE 7X30 BRILLADO EN GRANITO (INCLUYE M.O. Y MATERIAL PEGA REPELLE ZOCALO RECTO, PULIDO Y RBIII I ADO)	338FC-2,{344FC-1,; días;337F días	345F días;346F días;347F días;348F días;349F	0%	2,63 días	mar 29/12/26	jue 31/12/26
340		$ 0	$ 0	MEDIA CAÑA EN GRANITO	338FC-3,{344FC-1,; días		0%	2,63 días	lun 28/12/26	mié 30/12/26
341		$ 0	$ 0	PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO	333FC-2 días	342FC-2,{ días;344F	0%	2,63 días	sáb 26/12/26	mié 30/12/26
342		$ 0	$ 0	GUARDAESCOBA EN PORCELANA	341FC-2,{344FC-1,; días		0%	2,63 días	sáb 26/12/26	mié 30/12/26
343		$ 0	$ 0	**APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA**			0%	**0,88 días**	**mar 29/12/26**	**mié 30/12/26**
344		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	339FC-1,{ días;340F días;372F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
345		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	339FC-1,{ días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
346		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	339FC-1,{ días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
347		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIOS A PISO TIPO INSTITUCIONAL BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA)	339FC-1,{ días;340F días;342F días;372F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
348		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	339FC-1,{ días;340F días;342F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
349		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	339FC-1,{ días;340F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
350		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA PARA DISCAPACITADOS	339FC-1,{ días;340F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
351		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS	339FC-1,{ días;340F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
352		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS	339FC-1,{ días;340F días;372F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
353		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO PARA CAMBIAR	339FC-1,{ días;340F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
354		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR DE JABON	339FC-1,{ días;340F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
355		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE PAPEL	339FC-1,{ días;340F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
356		$ 0	$ 0	JABONERA EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHA	339FC-1,{ días;340F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
357		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 40 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	339FC-1,{ días;340F días;372F días;373F días;374F	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
358		$ 0	$ 0	MESON CON POCETA EN CORIAN EQUIVALENTE O SUPERIOR	339FC-1,{ días;340F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
359		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA POCETA DE ASEO	339FC-1,{ días;340F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
360		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE EMPOTRAR PARA LAVAMANOS CON VALVULA DE	339FC-1,{ días;340F días;372F días	468FC-15 días	0%	0,88 días	mar 29/12/26	mié 30/12/26
361		$ 0	$ 0	**CIELO RASO**			0%	**2 días**	**jue 24/12/26**	**lun 28/12/26**
362		$ 0	$ 0	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	290;291,2	371FC-0,{ días;372F días;373F	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
363		$ 0	$ 0	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	290;291,2	371FC-0,{ días;372F días;373F	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
364		$ 0	$ 0	CIELO RASO PLANO DRYWALL RH (INCLUYE PINTURA, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE	290;291,2	371FC-0,{ días;372F días;373F	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
365		$ 0	$ 0	CIELO RASO PLANO DRYWALL RH (INCLUYE PINTURA, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE	290;291,2	371FC-0,{ días;372F días;373F	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
366		$ 0	$ 0	CIELO RASO SUPER BOARD (INCLUYE PINTURA, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	290;291,2	371FC-0,{ días;372F días;373F	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
367		$ 0	$ 0	CIELO RASO SUPER BOARD (INCLUYE PINTURA, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	290;291,2	371FC-0,{ días;372F días;373F	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26

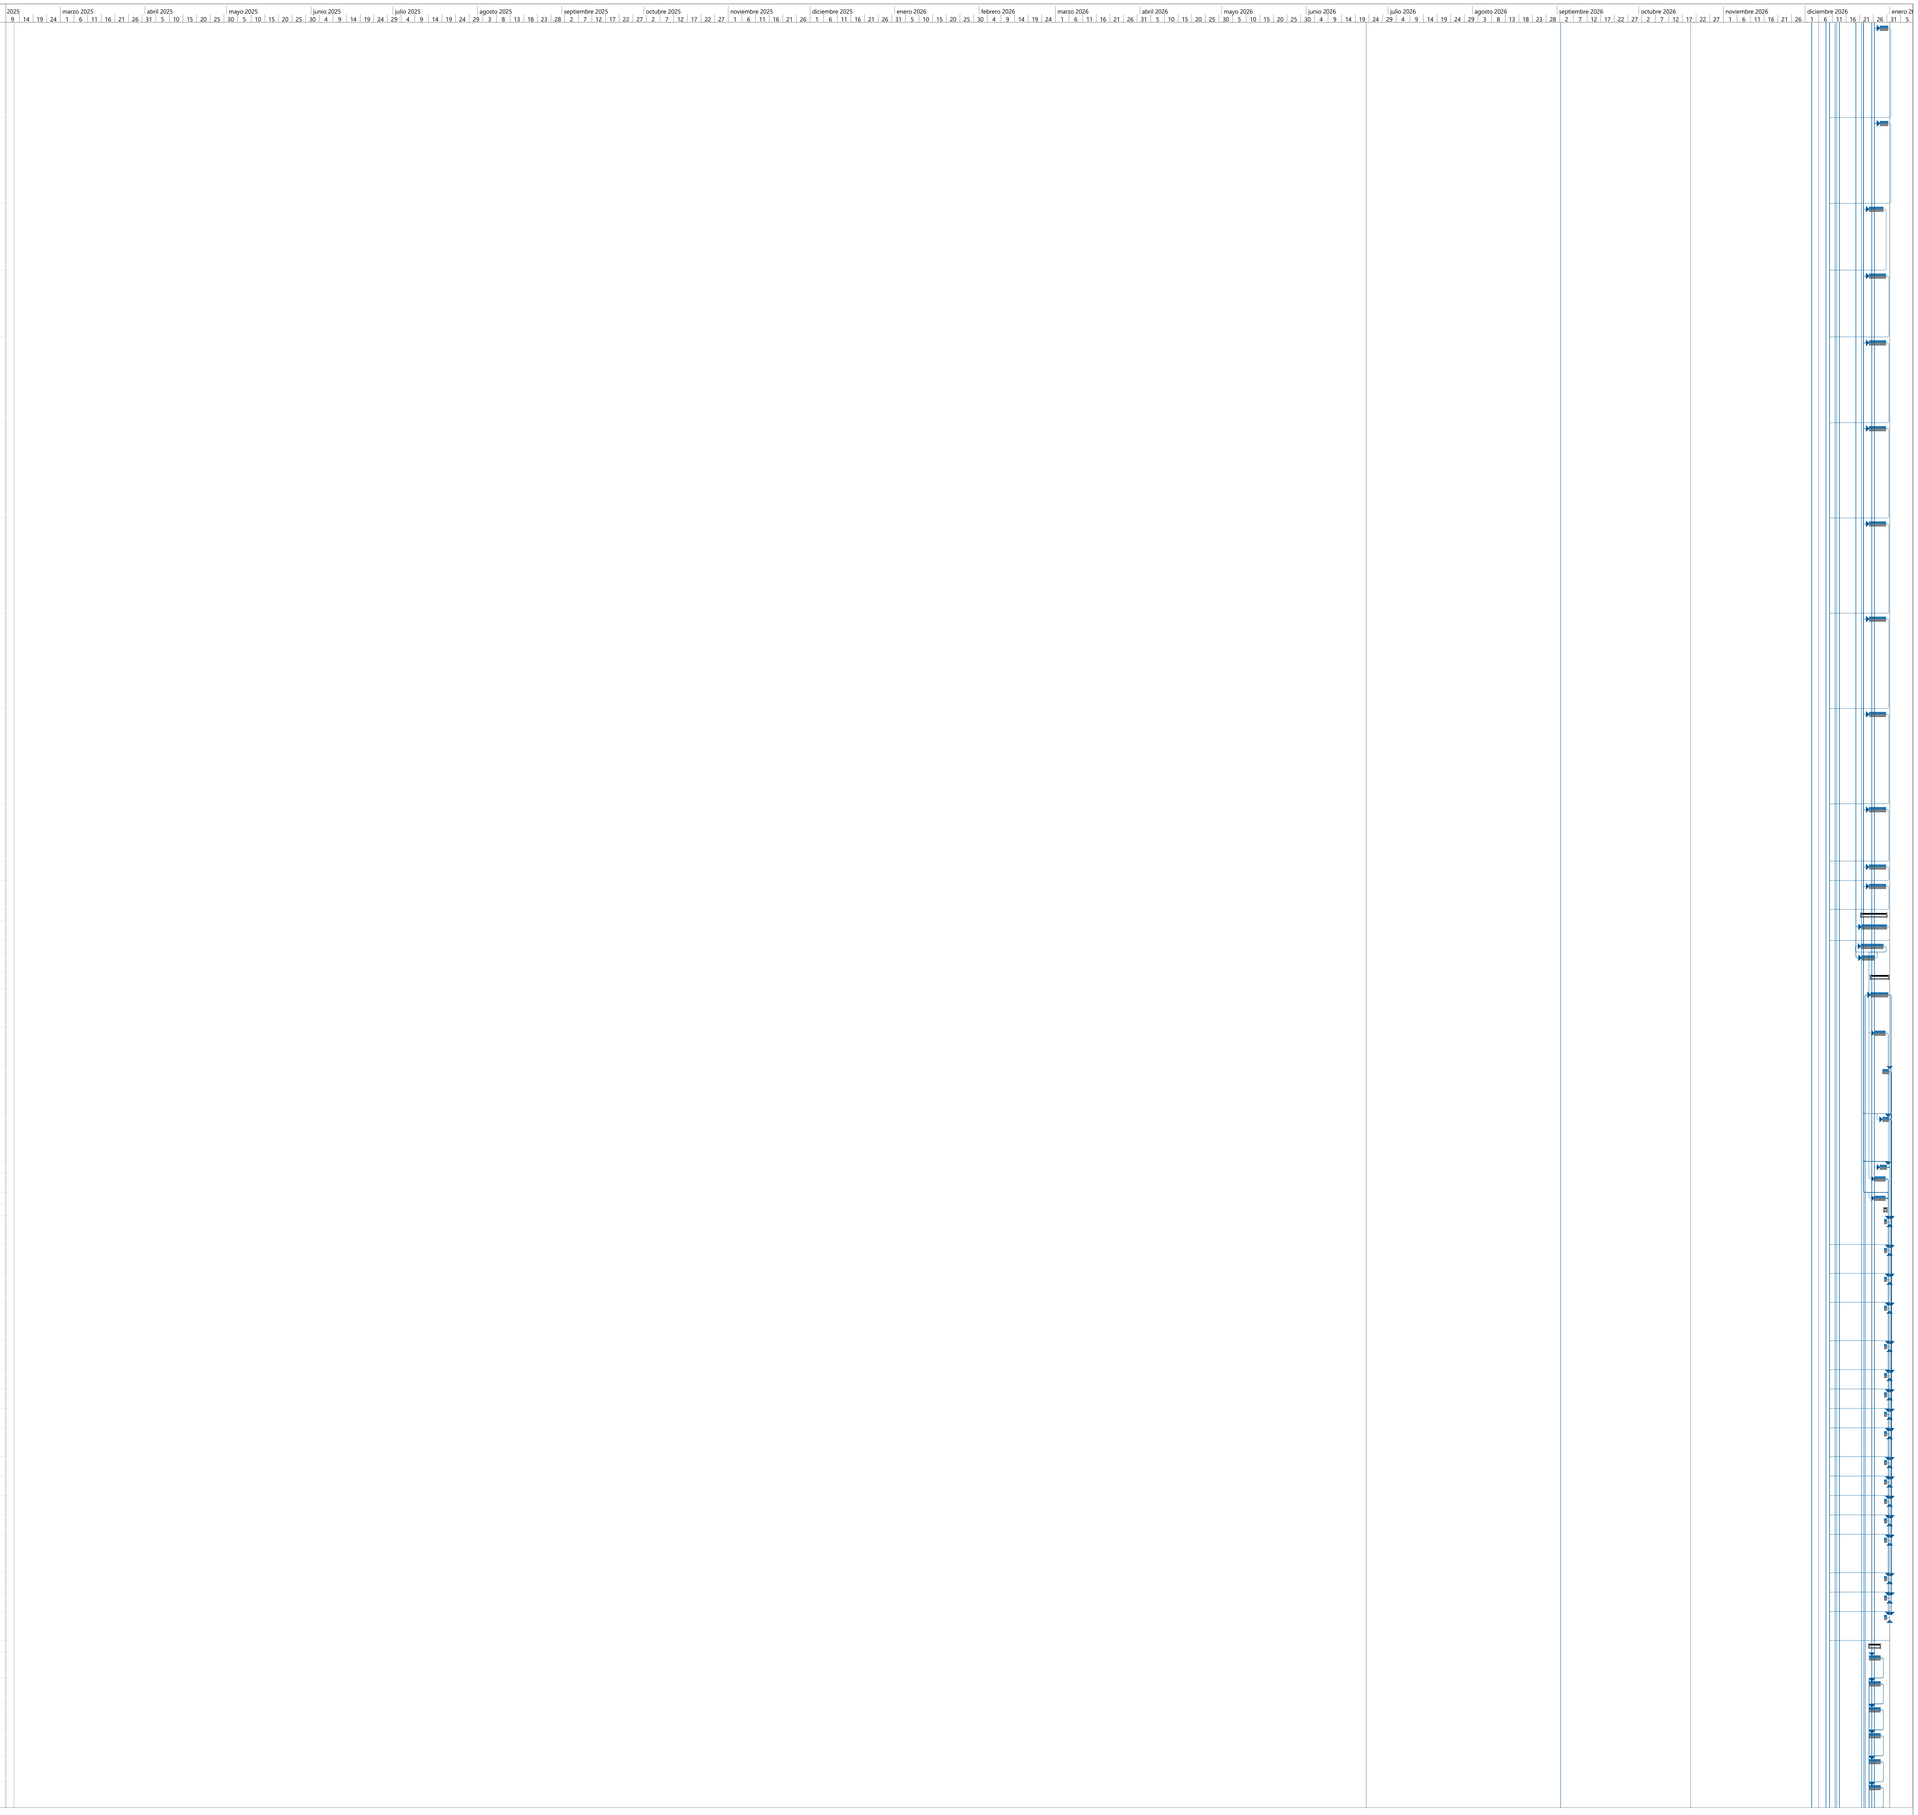


Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesoras	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
368		$ 0	$ 0	CIELO RASO LAMINA MICROPERFORADA EN ALUMINIO (Calibre 26), ESTRUCTURA SEMI OCULTA	290;291;2	371FC-0 días;372F días;373F días;374F	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
369		$ 0	$ 0	CIELO RASO EN FIBRA MINERAL, PANEL EN FIBRA MINERAL, FORMATO DE 61 X 61 CM, COLOR MADERABLE, ANCLADO A SUBESTRUCTURA METALICA	290;291;2	371FC-0 días;372F días;373F días;374F días	0%	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
370		$ 0	$ 0	**PINTURA**			0%	**3 dias**	**sáb 26/12/26**	**mié 30/12/26**
371		$ 0	$ 0	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	362FC-0	128FC-1	0%	3 días	sáb 26/12/26	mié 30/12/26
372		$ 0	$ 0	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINE	362FC-0	128FC-1	0%	3 días	sáb 26/12/26	mié 30/12/26
373		$ 0	$ 0	VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	362FC-0	128FC-1	0%	3 días	sáb 26/12/26	mié 30/12/26
374		$ 0	$ 0	VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	362FC-0	128FC-1	0%	3 días	sáb 26/12/26	mié 30/12/26
375		$ 0	$ 0	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**			0%	**80,71 dias**	**mar 15/09/26**	**jue 31/12/26**
376		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA, ESPESOR 30 A 70 MM, ANCHO ÚTIL 1100 MM. NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DENSIDAD 40 KG/M3 INYECTADA ENTRE DOBLE CHAPA DE ACERO LACADA O GALVANIZADA 0,5/0,6 MM, SISTEMA ESTANCO DE MACHIEMBRADO CON	55FC-5 días	114FC-4 días;382F días;383F días;384F días;385F días;386F días;387F días;388F días;389F días;390F	0%	5 días	mié 23/12/26	jue 31/12/26
377		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO SISTEMA SELLO SECO , E: 8 MM, PROTECCIÓN UV, ACABADO LISO., PERFILERIA EN ALUMINIO ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA, DIMENSIONES, ESPESORES, UNIONES, ANCLAJES SEGÚN DISEÑO	55FC-5 días	114FC-4 días;382F días;383F días;384F días;385F días;386F días;387F días;388F días;389F	0%	5 días	mié 23/12/26	jue 31/12/26
378		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA , CAPA DE 7 CM SOBRE PLACA DE CUBIERTA.	46FC-2 días	468FC-10 días	0%	10 días	lun 7/12/26	jun 21/12/26
379		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE, TRES CAPAS.	50CC+80 días	468FC-15 días	0%	5 días	mié 16/12/26	mar 22/12/26
380		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA IMPERMEABILIZANTE EN PVC PARA ESTRUCTURAS DE	50CC+10 días	468FC-15 días	0%	10 días	mar 15/09/26	lun 28/09/26
381		$ 0	$ 0	**SEÑALIZACIÓN**			0%	**2 días**	**mié 23/12/26**	**lun 28/12/26**
382		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "ORI001 - ORI002 - ORI004 - ORI014". MINI-TOTEM	376FC-5 días;377F días	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
383		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "ORI003 - ORI007 - ORI010". SEÑAL ORIENTADORA SOBRE MARCO	376FC-5 días;377F días	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
384		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "ORI005 - ORI008 - ORI015". SEÑAL ORIENTADORA SOBRE PUERTA CENTRAL	376FC-5 días;377F días	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
385		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "ORI009". SEÑAL ORIENTADORA PUERTAS DE ABORDAJE	376FC-5 días;377F días	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
386		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "ORI012". SEÑAL ORIENTADORA SOBRE PAREDD 2A	376FC-5 días;377F	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
387		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "ORI013". SEÑAL ORIENTADORA SOBRE PAREDD 2B	376FC-5 días;377F	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
388		$ 0	$ 0	TOMEMS INTEGRADOS "TOT001 - TOT002 - TOT003 - TOT004"	376FC-5 días;377F	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
389		$ 0	$ 0	SEÑAL IDENTIFICATIVA "SID001". INGRESO A ZONA DE BAÑOS	376FC-5 días;377F	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
390		$ 0	$ 0	SEÑAL IDENTIFICATIVA "SID002-SID003 - SID004 - SID006". INGRESO A ZONA DE BAÑOS	376FC-5 días;377F días	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
391		$ 0	$ 0	SEÑAL IDENTIFICATIVA "SID008". BANDA RECLAMO DE EQUIPAJE	376FC-5 días;377F	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
392		$ 0	$ 0	SEÑAL IDENTIFICATIVA "SID0013". MODULOS CHECK IN	376FC-5 días;377F	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
393		$ 0	$ 0	SEÑAL IDENTIFICATIVA "OFI001 - OFI002 -OFI003 -OFI004 -OFI005 -OFI006 -OFI007 - OFI008 -OFI009 -OFI010 -OFI011 -OFI012 -OFI013 -OFI014 -OFI015 -OFI016 - OFI017 -OFI018 -OFI019 -OFI020 -OFI021 -OFI022 -OFI023 -OFI024 -OFI025 -OFI026 -OFI027 - OFI028 -OFI029	376FC-5 días;377F días	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
394		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "URG URG001". IDENTIFICATIVA SALIDA DE EMERGENCIA	376FC-5 días;377F días	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
395		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "COR001 - COR002". ORIENTADORA EN	376FC-5 días;377F	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
396		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "COR003 - COR004". ORIENTADORA EN PUENTE	376FC-5 días;377F	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
397		$ 0	$ 0	SEÑAL TIPO "SUP003 - SUP005 - SUP009 - SUP 10". SEÑALES EN LETRA SUELTAS	376FC-5 días;377F días	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
398		$ 0	$ 0	PELICULA SOBRE VIDRIOS	376FC-5	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
399		$ 0	$ 0	CENEFA SEGURIDAD SOBRE VIDRIOS	376FC-5 días;377F	468FC-15 días	0%	2 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
400		$ 0	$ 0	**INSTALACIÓN RED VOZ Y DATOS**			0%	**5 días**	**jue 24/12/26**	**jue 31/12/26**
401		$ 0	$ 0	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS			0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
402		$ 0	$ 0	TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIO CON CUATRO ZONAS DE DETECCIÓN, INCLUYE TUBERIA, CABLE FPLR THHN/THWN NO 16/18, MODULO DE EXPANSIÓN, TECLADO REMOTO Y ELEMENTOS DE FIJACION.	290;291;2	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
403		$ 0	$ 0	SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO ÓPTICO , TUBERIA, CABLE FPLR THHN/THWN NO 18 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR	290;291;2	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
404		$ 0	$ 0	SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO DETECTOR TÉRMICO , TUBERIA, CABLE FPLR THHN/THWN NO 18 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR	290;291;2	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
405		$ 0	$ 0	SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO , TUBERIA, CABLE FPLR THHN/THWN NO 18 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE MODULO	290;291;2	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
406		$ 0	$ 0	SALIDA PARA MODULO DE CONTROL , TUBERIA, CABLE FPLR THHN/THWN NO 18 Y ELEMENTOS DE FIJACION. -	290;291;2	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
407		$ 0	$ 0	SALIDA PARA SIRENA DE EVACUACIÓN, INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE SIRENA	290;291;2	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
408		$ 0	$ 0	SALIDA PARA ESTACION MANUAL EN MURO,INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE	290;291;2	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
409		$ 0	$ 0	SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE GAS , INCLUYE APARATO, TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR	290;291;2	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
410		$ 0	$ 0	SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR BEAM , INCLUYE APARATO, TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 16 YELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR	290;291;2	468FC-15 días	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
411		$ 0	$ 0	CCTV			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
412		$ 0	$ 0	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO IP	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
413		$ 0	$ 0	ESTACION DE TRABAJO	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
414		$ 0	$ 0	ESTACION DE TRABAJO PARA VISUALIZACIÓN	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
415		$ 0	$ 0	DECODIFICADOR AVANZADO DE VIDEO EN RED	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
416		$ 0	$ 0	CONTROLADOR CON RATON 3D PARA ESTACION DE	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
417		$ 0	$ 0	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	290;291;2	468FC-15	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
418		$ 0	$ 0	PANTALLA DE USO INDUSTRIAL	290;291;2	468FC-15	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
419		$ 0	$ 0	MINIDOMO PARA INTERIOR	290;291;2	468FC-15	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
420		$ 0	$ 0	CÁMARA TIPO BALA - PARA EXTERIOR	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
421		$ 0	$ 0	DOMO PTZ 20X – INTERIOR INCLUYE MONTAJE PARA PTZ	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
422		$ 0	$ 0	DOMO PTZ 30X – EXTERIOR INCLUYE MONTAJE PARA PTZ	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
423		$ 0	$ 0	MINIDOMO FIIJO PANORAMICO 360° INTERIOR	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
424		$ 0	$ 0	SISTEMA DE SEGURIDAD			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
425		$ 0	$ 0	SOFTWARE DE INTEGRACIÓN PARA INCENDIOS Y CONTROL DE ACCESO QUE PERMITA CONTROL EN CADA UNO DE ESTOS SISTEMAS COMO EMISIÓNDE ALARMAS, AUTO TEST DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS COMO ACCESO REMOTO AL SISTEMA DE CUAQUIER PARTE	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
426		$ 0	$ 0	LECTORA DE PROXIMIDAD CON ZUMBADOR Y PANTALLA LED DE VARIOS COLORES CON SALIDA WIEGAND INCLUYE TUBUERIA EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CAJA 10X10X5CMS, CON CABLEADO. INCLUYE LECTORA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
427		$ 0	$ 0	TARJETA DE PROXIMIDAD . SISTEMA DE SEGURIDAD.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
428		$ 0	$ 0	CONTROLADOR LECTORAS X 8 CON 30.000 REGISTROS Y 800 REGISTROS DE ALARMAS	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
429		$ 0	$ 0	SALIDA RETENEDOR Y DETECTOR DE APERTURA-INCLUYE RETENEDOR Y	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
430		$ 0	$ 0	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VUELOS			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26

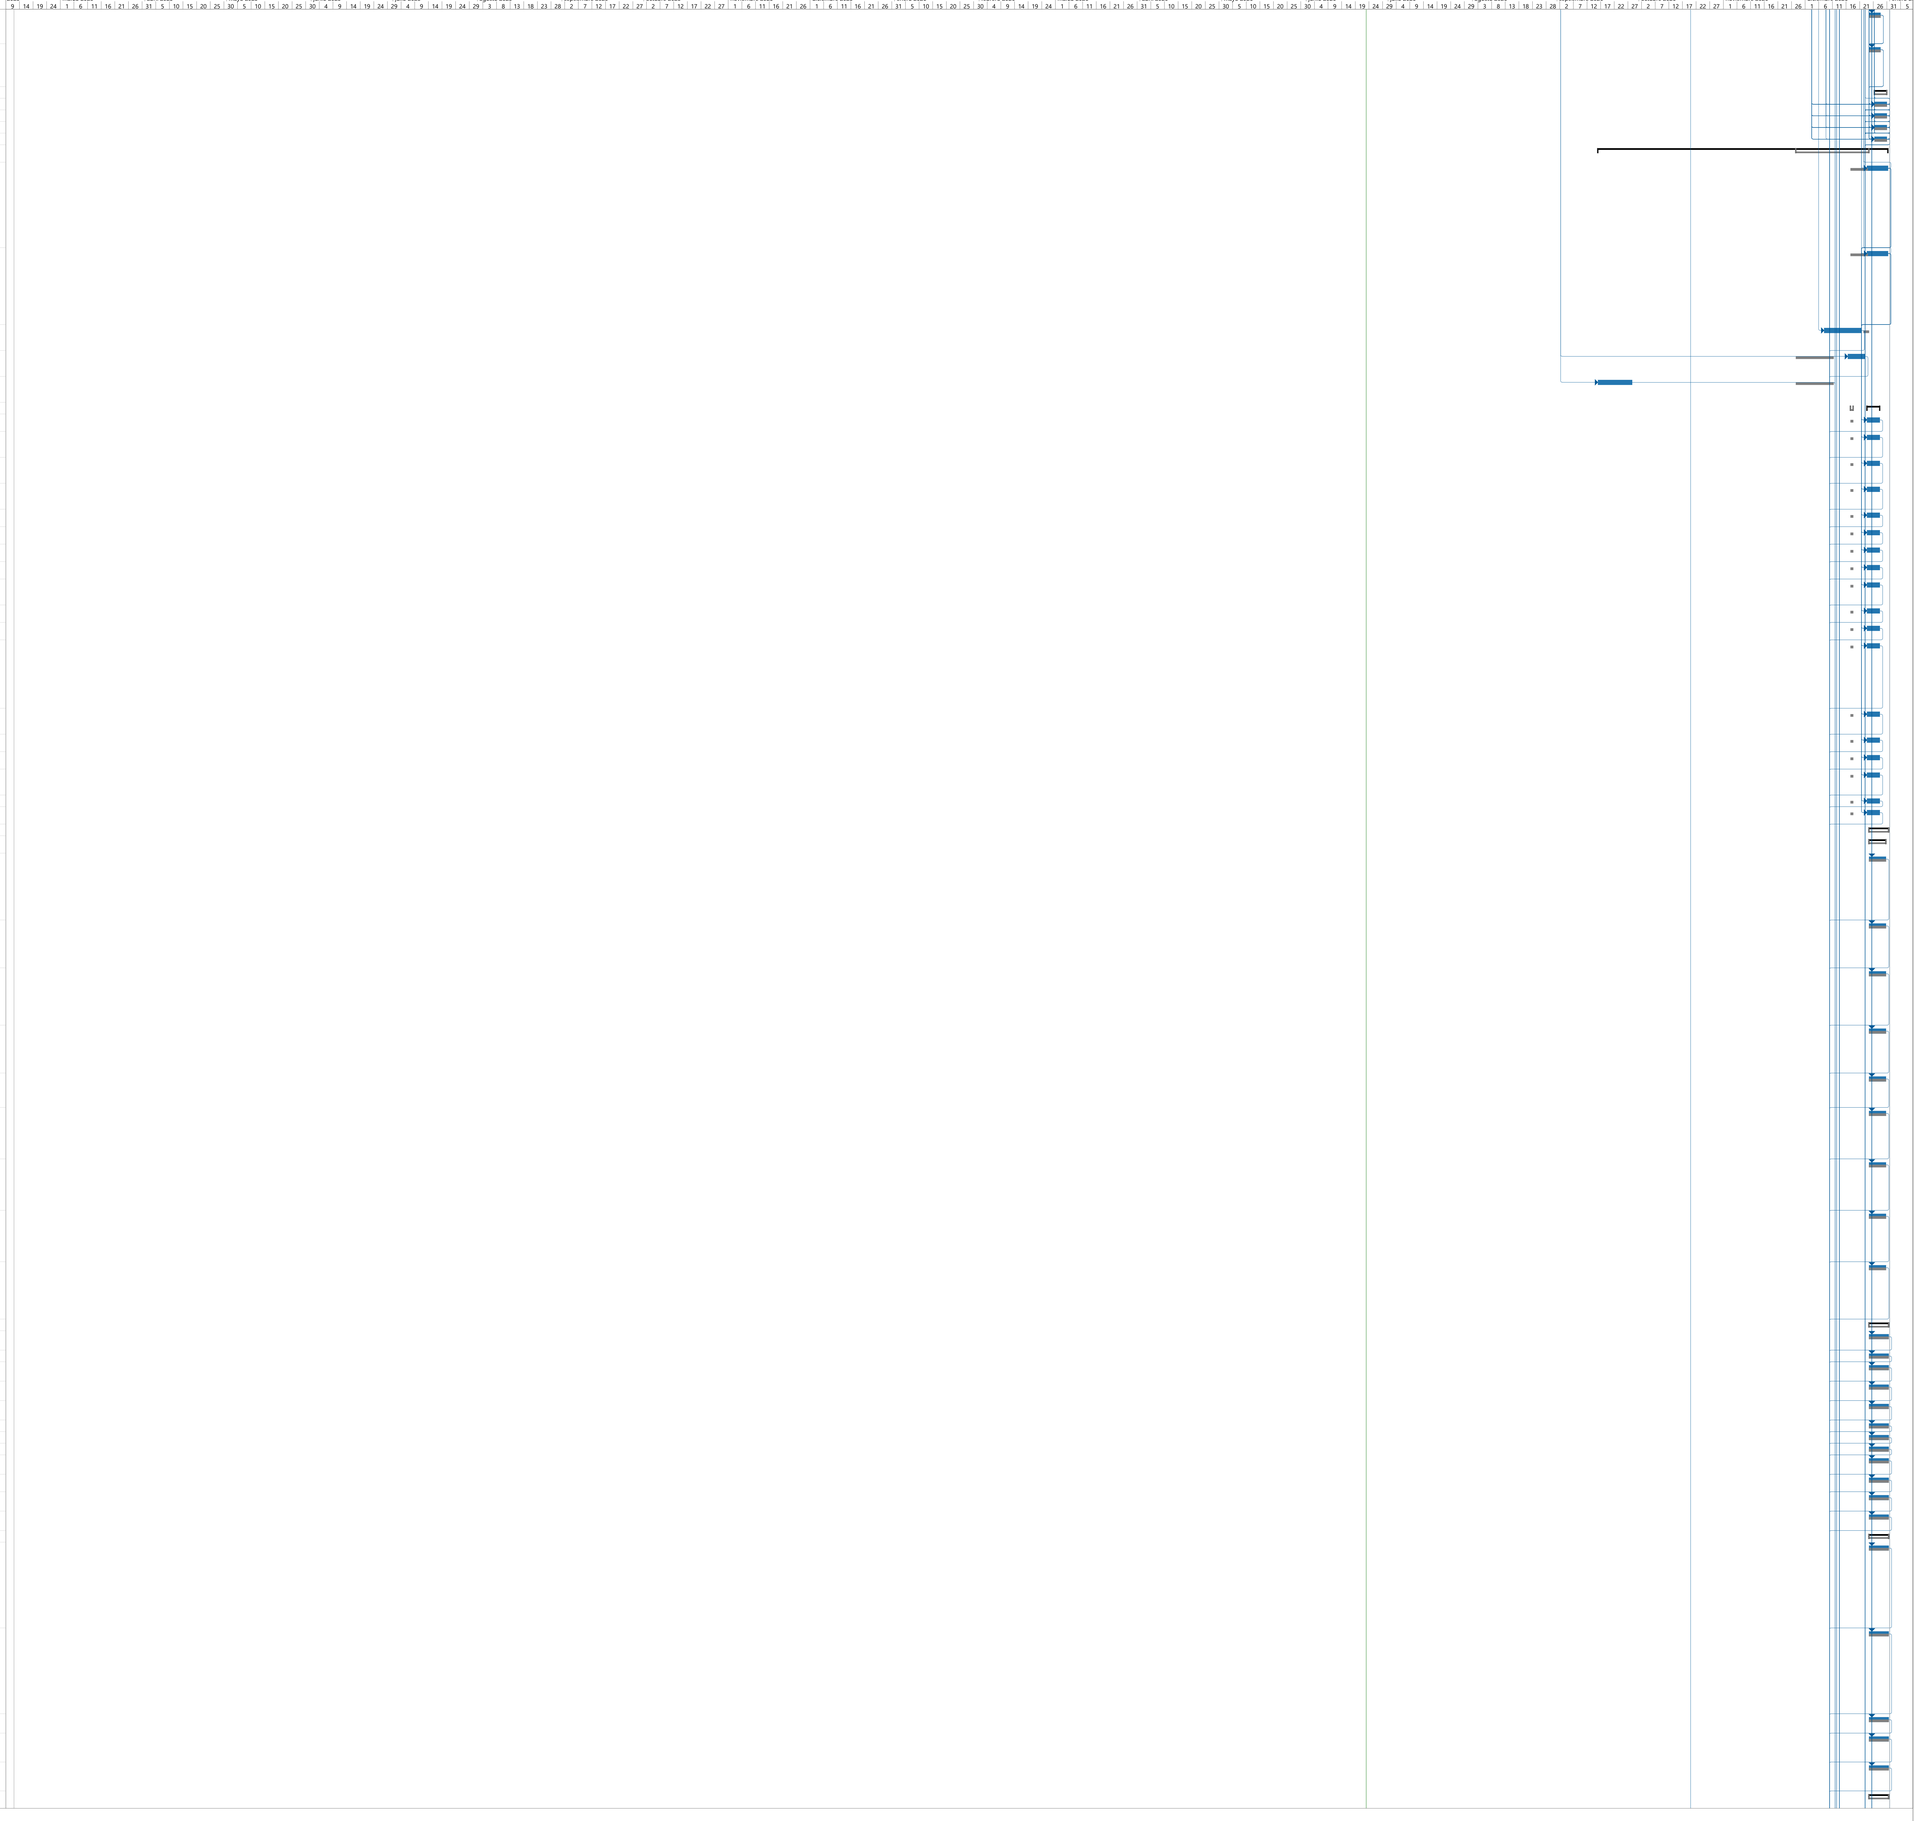

Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesor	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
431		$ 0	$ 0	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VUELOS - SERVIDOR Y SOFTWARE FIDS	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
432		$ 0	$ 0	MONITOR 42" 1080p LCD, LED Backlight, CCFL,RGB, DVI, HDMI Inputs	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
433		$ 0	$ 0	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
434		$ 0	$ 0	SALIDA PARA ALTAVOZ UPM-1XP A 48V D.C. INCLUYE ALTAVOZ, CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, TUBERÍA, ELEMENTOS DE COLGADO Y	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
435		$ 0	$ 0	SALIDA PARA ALTAVOZ MM-4XP A 48V D.C. INCLUYE ALTAVOZ, CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, TUBERÍA, ELEMENTOS DE COLGADO Y	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
436		$ 0	$ 0	SALIDA PARA ALTAVOZ UP-4XP A 48V D.C. INCLUYE ALTAVOZ, CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, TUBERÍA, ELEMENTOS DE COLGADO Y FIJACIÓN.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
437		$ 0	$ 0	SALIDA PARA ALTAVOZ MM-10XP A 48V D.C. INCLUYE ALTAVOZ, CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, TUBERÍA, ELEMENTOS DE COLGADO Y	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
438		$ 0	$ 0	SALIDA PARA MICROFONO SUPERCARDIOIDE CM1-6WS, INCLUYE MICROFONO, CABLE, TUBERÍA Y FIJACIÓN.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
439		$ 0	$ 0	ESTACIÓN DE LLAMADO DS-10, INCLUYE ESTACIÓN, CABLE UTP CAT6A.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
440		$ 0	$ 0	FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL PARA ALTAVOCES DE 48V D. C. INCLUYE FUENTE Y CABLE PARA CONEXIÓN DE ENTRADAS	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
441		$ 0	$ 0	SISTEMA DE MEGAFONIA DESCENTRALIZADO, INCLUYE DISPOSITIVOS DE ENTRADA, DISPOSITIVOS DE SALIDA, SERVIDOR DE MENSAJES, DISPOSITIVO DE COMPENSACION DE RUIDO AMBIENTE E INTERFAZ PARA	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
442		$ 0	$ 0	SISTEMA DE VOZ Y DATOS			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
443		$ 0	$ 0	SALIDA DE DATOS PARA DATOS CAT 6A, INCLUYE TOMA SENCILLA,CABLEADO F/UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT 6A, PATCH CORD PARA PUESTO DE TRABAJO Y DE ADMINISTRACIÓN, CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLA DE CABLEADO Y NUMERACION DE TOMAS.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
444		$ 0	$ 0	SALIDA DE DATOS PARA DATOS 7A(1000MHZ), INCLUYE TOMA SENCILLA,CABLEADO S/FTP CAT. 7A, APARATO CON JACK TERA. PATCH CORD PARA PUESTO DE TRABAJO Y DE ADMINISTRACION. CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLA DE CABLEADO Y NUMERACION	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
445		$ 0	$ 0	SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ Y DATOS DOBLE. INCLUYE TOMA DOBLE CABLEADO F/FTP CAT. 7A, APARATO CON JACK CAT 6A Y JACK TERA, PATCH CORD PARA PUESTO DE TRABAJO Y DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLAS DE CABLEADO, NUMERACION	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
446		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE GABINETE - RACK SISTEM (RS) COMBINES A 2.1M (7 ft) INCLUYE CABLE DE ADMINISTRACIÓN,ORGANIZADO Y COMPLEMENTOS PARA RACK (ORGANIZADORES VERTICALES), REGLETA DE 10 SALIDAS A 15A Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. ACCESORIO	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
447		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA: INCLUYE: ADAPTADORES DE 24 FIBRAS, BANDEJAS DE FIBRA OPTICA DE 19" QUE ACEPTEN 72-PUERTOS LC O 288 PUERTOS MTP. DESLIZABLE INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE GROMMETS , PORTA ETIQUE	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
448		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL ANGULAR NEGRO ZMAX. HERRAJE TERA 24P. JACKS RJ45 CAT 6A JACK, TERA CAT 7A Y MARQUILLADO.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
449		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 10G OM4 (400MTS) 4700 Mhz Y JUMPERDE FIBRA (3 UND)	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
450		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE DATOS SEGÚN NORMA ANSI/J-STD 607, INCLUYE BARRAJE DE COBRE CON PERFORACIÓNES ROSCADAS DE TIERRA. CABLE AWG 3/0 CON CANALIZACIÓN EN TUBERIA.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
451		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30x10 CM GALVANIZADA EN TRAMOS DE 2,44 MTS INCLUYE SUAVIZADOR PARA CURVAS, UNIONES, CABLE DESNUDO, DERIVACIONES PARA TUBERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
452		$ 0	$ 0	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 10G OM4 TIPO EXTERIORES ARMADA INCLUYE CAJAS DE CAMBIO DE MEDIO .FO MM 12H 50MIC RISER IN 10G PARA ADMINISTRACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO DE DATA CENTER Y MARQUILLADO	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
453		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SWITCH DE CORE, INLCUYE SWITCH AT-DC2552XSL3, 48 PUERTOS SFP+, 4 QSPF+, FUENTE DE POTENCIA AC DE 350W REDUNDANTE Y CABLES.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
454		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS PoE 370W, INLCUYE SWITCH AT-x510-28GPX-10 GigE PoE 370W 4 x 10G SFP+, L2+ DOBLE FUENTE DE POTENCIA AC Y CABLES.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
455		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS PoE 740W, INLCUYE SWITCH AT-x510-52GPX-10 GigE PoE 740W 4 x 10G SFP+, L2+ DOBLE FUENTE DE POTENCIA AC Y	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
456		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, INCLUYE ACCES POINT	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
457		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA INALAMBRICA INCLUYE CONTROLADORA INALAMBRICA AT-UWC-60-APL PRINCIPAL PARA GESTION Y	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
458		$ 0	$ 0	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GATEWAY DE VOZ + MODULOS SIP Y 1E1.	290;291;2	468FC-15 días	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
459		$ 0	$ 0	**EQUIPOS ESPECIALES**			0%	**4 días**	**jue 24/12/26**	**jue 31/12/26**
460		$ 0	$ 0	TRANSPORTADOR CARRUSEL CON ALETA MEDIA LUNA (N°. A1) TIPO DE BANDA SOBRE MESA DE 22,65 METROS DE LONGITUD Y DE 100 CMS DE ANCHO TOTAL, CON FALDÓN Y GUARDA LATERAL EN ACERO INOXIDABLE	371FC-3;1468FC-15 días;372F días;373F días;374F días		0%	4 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
461		$ 0	$ 0	TRANSPORTADOR (N°. B2) TIPO DE BANDA SOBRE MESA DE 3.5 METROS DE LONGITUD Y DE 100 CMS DE ANCHO TOTAL, CON GUARDAS LATERALES EN	371FC-3;1468FC-15 días;372F días;373F días;374F días		0%	4 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
462		$ 0	$ 0	TRANSPORTADORES (N°. C3 Y D4) TIPO DE BANDA SOBRE MESA DE 2 METROS DE LONGITUD CADA UNA Y DE 100 CMS DE ANCHO TOTAL, CON GUARDAS LATERALES EN	371FC-3;1468FC-15 días;372F días;373F días;374F días		0%	4 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
463		$ 0	$ 0	TRANSPORTADOR (N°. M1) TIPO CARRUSEL (MONOPLANAR) EN ÓVALO "0" DE 35 METROS DE LONGITUD TOTAL (APROXIMADA) Y DE 100 CM DE ANCHO TOTAL.	371FC-3;1468FC-15 días;372F días;373F días;374F días		0%	4 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
464		$ 0	$ 0	TRANSPORTADORES (N°. M2) TIPO CARRUSEL (MONOPLANAR) EN ÓVALO "0" DE 28 METROS DE LONGITUD TOTAL (APROXIMADA) Y DE 100 CM DE ANCHO TOTAL.	371FC-3;1468FC-15 días;372F días;373F días;374F días		0%	4 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26


Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesoras	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
465		$ 0	$ 0	TRANSPORTADORES (N°. ES Y F6) TIPO DE BANDA SOBRE MESA (PLANA) DE 3.1 METROS DE LONGITUD CADA UNA Y DE 100 CMS DE ANCHO TOTAL, CON GUARDAS LATERALES EN	371FC-3 días;372F días;373F días;374F días	468FC-15	0%	4 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
466		$ 0	$ 0	EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL 2 PARADAS SIN SALA DE MAQUINAS (ASCENSOR) INCLUYE SERVICIO DE	371FC-3 días;372F días;373F días;374F	468FC-15	0%	4 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
467		$ 0	$ 3.868.116	**OBRAS FINALES**			6%	**13,09 días**	**vie 11/12/26**	**mié 30/12/26**
468		$ 0	$ 3.868.116	ASEO GENERAL	42FC-15	651	6%	12 días	vie 11/12/26	mié 30/12/26
469		**$ 4.339.872**	**$ 1.047.697.392**	**2 URBANISMO Y VIAS**			**24%**	**225 días**	**vie 6/03/26**	**jue 31/12/26**
470		$ 2.820.812	$ 139.910.917	**PRELIMINARES**			48%	**225 días**	**vie 6/03/26**	**jue 31/12/26**
471	✓	$ 0	$ 86.572.592	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	474FC-13 días	650	100%	150 días	mié 13/05/26	vie 27/11/26
472		$ 0	$ 0	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	474FC+21 días	650	0%	20 días	vie 4/12/26	jue 31/12/26
473		$ 0	$ 0	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	474FC-13 días	475FC-95 días	0%	100 días	mié 13/05/26	mié 23/09/26
474		$ 2.820.812	$ 0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	12FC+11 días	471FC-13 días	0%	10 días	lun 19/10/26	sáb 31/10/26
475		$ 0	$ 0	MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 16 KM (INCLUYE CARGUE)	473FC-95 días	650	0%	100 días	mié 20/05/26	mar 27/10/26
476		$ 0	$ 0	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	474FC-90 días	650	0%	60 días	mar 7/07/26	mié 23/09/26
477		$ 0	$ 0	DEMOLICION DE VIAS Y PARQUEADEROS EXISTENTES	474FC+3 días	650	0%	15 días	vie 11/12/26	jue 31/12/26
478		$ 0	$ 4.230.079	TALA ARBOLES CLASE I, H<5m, Incluye desenraize, retiro y disposición final.	474FC+3 días	650	60%	10 días	jue 17/12/26	jue 31/12/26
479		$ 0	$ 20.904.526	ITÉM NP4.1-01 TALA ARBOLES CLASE II, H= desde 5m hasta 10m, Incluye desenraize, retiro y disposición final.	474FC-18 días	650	60%	177 días	vie 6/03/26	mié 30/12/26
480		$ 0	$ 13.288.981	ITÉM NP4.1-02 TALA ARBOLES CLASE III, H=>a 10m a 15m, Incluye desenraize, retiro y disposición final.	474FC-18 días	650	60%	202 días	vie 6/03/26	mié 30/12/26
481		$ 0	$ 14.914.740	ITÉM NP4.1-03 TALA ARBOLES CLASE IV, H=> a 15m, Incluye desenraize, retiro y disposición final.	474FC-18 días	484CC-10 días	60%	225 días	vie 6/03/26	jue 31/12/26
482		$ 0	$ 0	**EXPLANACION Y EXCAVACIONES**			0%	**180 días**	**mié 6/05/26**	**jue 31/12/26**
483		$ 0	$ 0	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENI	492CC-20	490CC-15	0%	1 día	vie 27/11/26	sáb 28/11/26
484		$ 0	$ 0	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 16 KM)	473CC-5 días;481C días	492FC+11 días	0%	160 días	mié 6/05/26	jue 3/12/26
485		$ 0	$ 0	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 16 KM)	473CC	486	0%	160 días	mié 13/05/26	vie 11/12/26
486		$ 0	$ 0	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO	492FC-30 días;485	490CC-15 días	0%	15 días	vie 11/12/26	jue 31/12/26
487		$ 0	$ 812.578.224	**ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO**			65%	**74 días**	**jue 24/09/26**	**jue 31/12/26**
488		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN VEHICULAR EN CONCRETO 20X10X8CM (Incluye	491FC+2 días	650	0%	7 días	vie 18/12/26	mar 29/12/26
489		$ 0	$ 249.977.658	ÍTEM: NP4.4-01 ANDEN EN CONCRETO 0.10 3000 PSI ESCOBIADO Y GUALEADO	501CC-25 días;502C días;503C	650;497F días;498F días;499F	95%	40 días	jue 24/09/26	mié 16/12/26
490		$ 0	$ 523.798.532	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR	486CC-15 días;483C	491CC-5 días	68%	35 días	lun 9/11/26	sáb 26/12/26
491		$ 0	$ 0	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR	490CC-5 días	488FC+2 días;500F	0%	15 días	mar 3/11/26	lun 23/11/26
492		$ 0	$ 38.802.034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	484FC+11 días	483CC-20 días;486F días	80%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
493		$ 1.519.060	$ 92.800.768	**ANDENES Y SARDINELES**			6%	**180 días**	**mié 6/05/26**	**jue 31/12/26**
494		$ 0	$ 0	ADOQUÍN TRÁFICO PEATONAL, CEMENTO COLOR OCRE, DIMENSIONES 20X10X6CM. (Incluye capa de arena e=4cm)	474FC+3 días	650	0%	15 días	vie 11/12/26	jue 31/12/26
495		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE RAICES TIPO	474FC+3 días	645FC-5 días;646F	0%	10 días	vie 11/12/26	jue 24/12/26
496		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE RAICES TIPO	474FC+3 días	645FC-5 días;646F	0%	10 días	vie 11/12/26	jue 24/12/26
497		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA A55 TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL, CEMENTO COLOR OCRE, DIMENSIONES	489FC-5 días	507FC-18 días	0%	10 días	jue 10/12/26	mié 23/12/26
498		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TÁCTIL ALERTA A56 TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL, CEMENTO COLOR OCRE, DIMENSIONES (40X40X6) INCLUYE EXCAVACIÓN	489FC-5 días	507FC-18 días	0%	10 días	jue 10/12/26	mié 23/12/26
499		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA A50 TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL, CEMENTO COLOR ;	489FC-5 días	507FC-18 días	0%	10 días	jue 10/12/26	mié 23/12/26
500		$ 0	$ 0	BORDILLO CONTENEDOR DE RAICES CIRCULAR	491FC-25 días	650	0%	50 días	mar 20/10/26	sáb 26/12/26
501		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL A10, DIMENSIONES 20X80X50CM.	491CC-5 días	489CC-25 días	0%	40 días	mar 27/10/26	vie 18/12/26
502		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO A80, DIMENSIONES 20X80X35CM.	491CC-5 días	489CC-25 días	0%	40 días	mar 27/10/26	vie 18/12/26
503		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO A81, DIMENSIONES 15X80X35CM.	491CC-5 días	650;489CC días	0%	40 días	mar 27/10/26	vie 18/12/26
504		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS TL003, CEMENTO COLOR OCRE, DIMENSIONES 20X15X50CM.	491FC-5 días	650	0%	30 días	mar 17/11/26	sáb 26/12/26
505		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE COBERTURA EN MANI	514CC-5 días;515C	650	0%	25 días	lun 19/10/26	sáb 21/11/26
506		$ 0	$ 0	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO PARA DEMARCACION PARQUEADERO EN COLOR	474FC+21 días	507FC-18 días	0%	20 días	vie 4/12/26	jue 31/12/26
507		$ 0	$ 0	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDA EN	497FC-18 días;498F días	508FC-15 días;509F	0%	150 días	mié 6/05/26	sáb 21/11/26
508		$ 0	$ 0	BOLARDOS EN CONCRETO COLOR TEXTURA LISA Y FILOS REDONDEADOS	511FC-15 días;512F días;513F días	650;514CC días;515C días	0%	9 días	sáb 31/10/26	jue 12/11/26
509		$ 0	$ 0	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA EXTERIORES 3000PSI	511FC-15 días;512F	650	0%	8 días	sáb 31/10/26	mié 11/11/26
510		$ 1.519.060	$ 92.800.768	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA GALVANIZADA. INCLUYE: CIMENTACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA	474CC-30 días	650	80%	45 días	jue 10/09/26	sáb 7/11/26
511		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)	491FC-7 días	509FC-15 días;508F días	0%	6 días	jue 12/11/26	sáb 21/11/26
512		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)	491FC-7 días	509FC-15 días;508F días	0%	6 días	jue 12/11/26	sáb 21/11/26
513		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)	491FC-7 días	509FC-15 días;508F días	0%	6 días	jue 12/11/26	sáb 21/11/26
514		$ 0	$ 0	BANCA EN MADERA TIPO 1	508CC-5	650;505C	0%	10 días	lun 26/10/26	sáb 7/11/26
515		$ 0	$ 0	BANCA EN MADERA TIPO 2	508CC-5	650;505C	0%	10 días	lun 26/10/26	sáb 7/11/26
516		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA A125, DIMENSIONES 30X80X22.5CM.	474FC+3 días	650	0%	7 días	vie 11/12/26	lun 21/12/26
517		$ 0	$ 2.407.483	**ILUMINACIÓN EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELECTRICA**			2%	**5,13 días**	**jue 24/12/26**	**jue 31/12/26**
518		$ 0	$ 0	Celdas en Media Tension 36 kV			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
519		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Celda SM6 IM	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
520		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Celda SM6 QM 750	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
521		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Celda SM6 GBC-B	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
522		$ 0	$ 0	Equipos de Transformación y Suministro de Energia			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
523		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Transformador trifásico tipo Seco Clase F de 150 kVA 36kV 220V 60Hz. Incluye Celda	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
524		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Transformador trifásico tipo Seco Clase F de 225 kVA 36kV 220V 60Hz. Incluye Celda	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
525		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Transformador trifásico tipo Seco Clase F de 300 kVA 36kV 220V 60Hz. Incluye Celda	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
526		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Transformador trifásico tipo Seco Clase F de 500 kVA 36kV 220V 60Hz. Incluye Celda	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
527		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de planta electrica 225 kVA 120-208V efectivos .Incluye: silenciador de escape, tanque de combustible, amortiguadres de vibracion, precalentador, gobernador, Cargador automatico de baterias, tablero de control digitalm	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
528		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de planta electrica 300 kVA 120-208V efectivos .Incluye: silenciador de escape, tanque de combustible, amortiguadres de vibracion, precalentador, gobernador, Cargador automatico de baterias, tablero de control digitalm	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
529		$ 0	$ 0	Tableros Generales de Acometidas en BT, transferencias y cajas tipo exterior	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
530		$ 0	$ 0	Terminal de Pasajeros			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
531		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Tablero General de Suplencia de Suplencia Terminal de Pasajeros. Incluye barraje de fase, neutro y tierra, Interruptores	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
532		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Tablero General de Acometidas y Transferencia. Incluye barraje de fase, Neutro y Tierra, interruptores, DPS y mediciones	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
533		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Tablero general Regulado. Incluye barraje de Fase, Neutro y Tierra, DPS y mediciones	474FC+4 días	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26

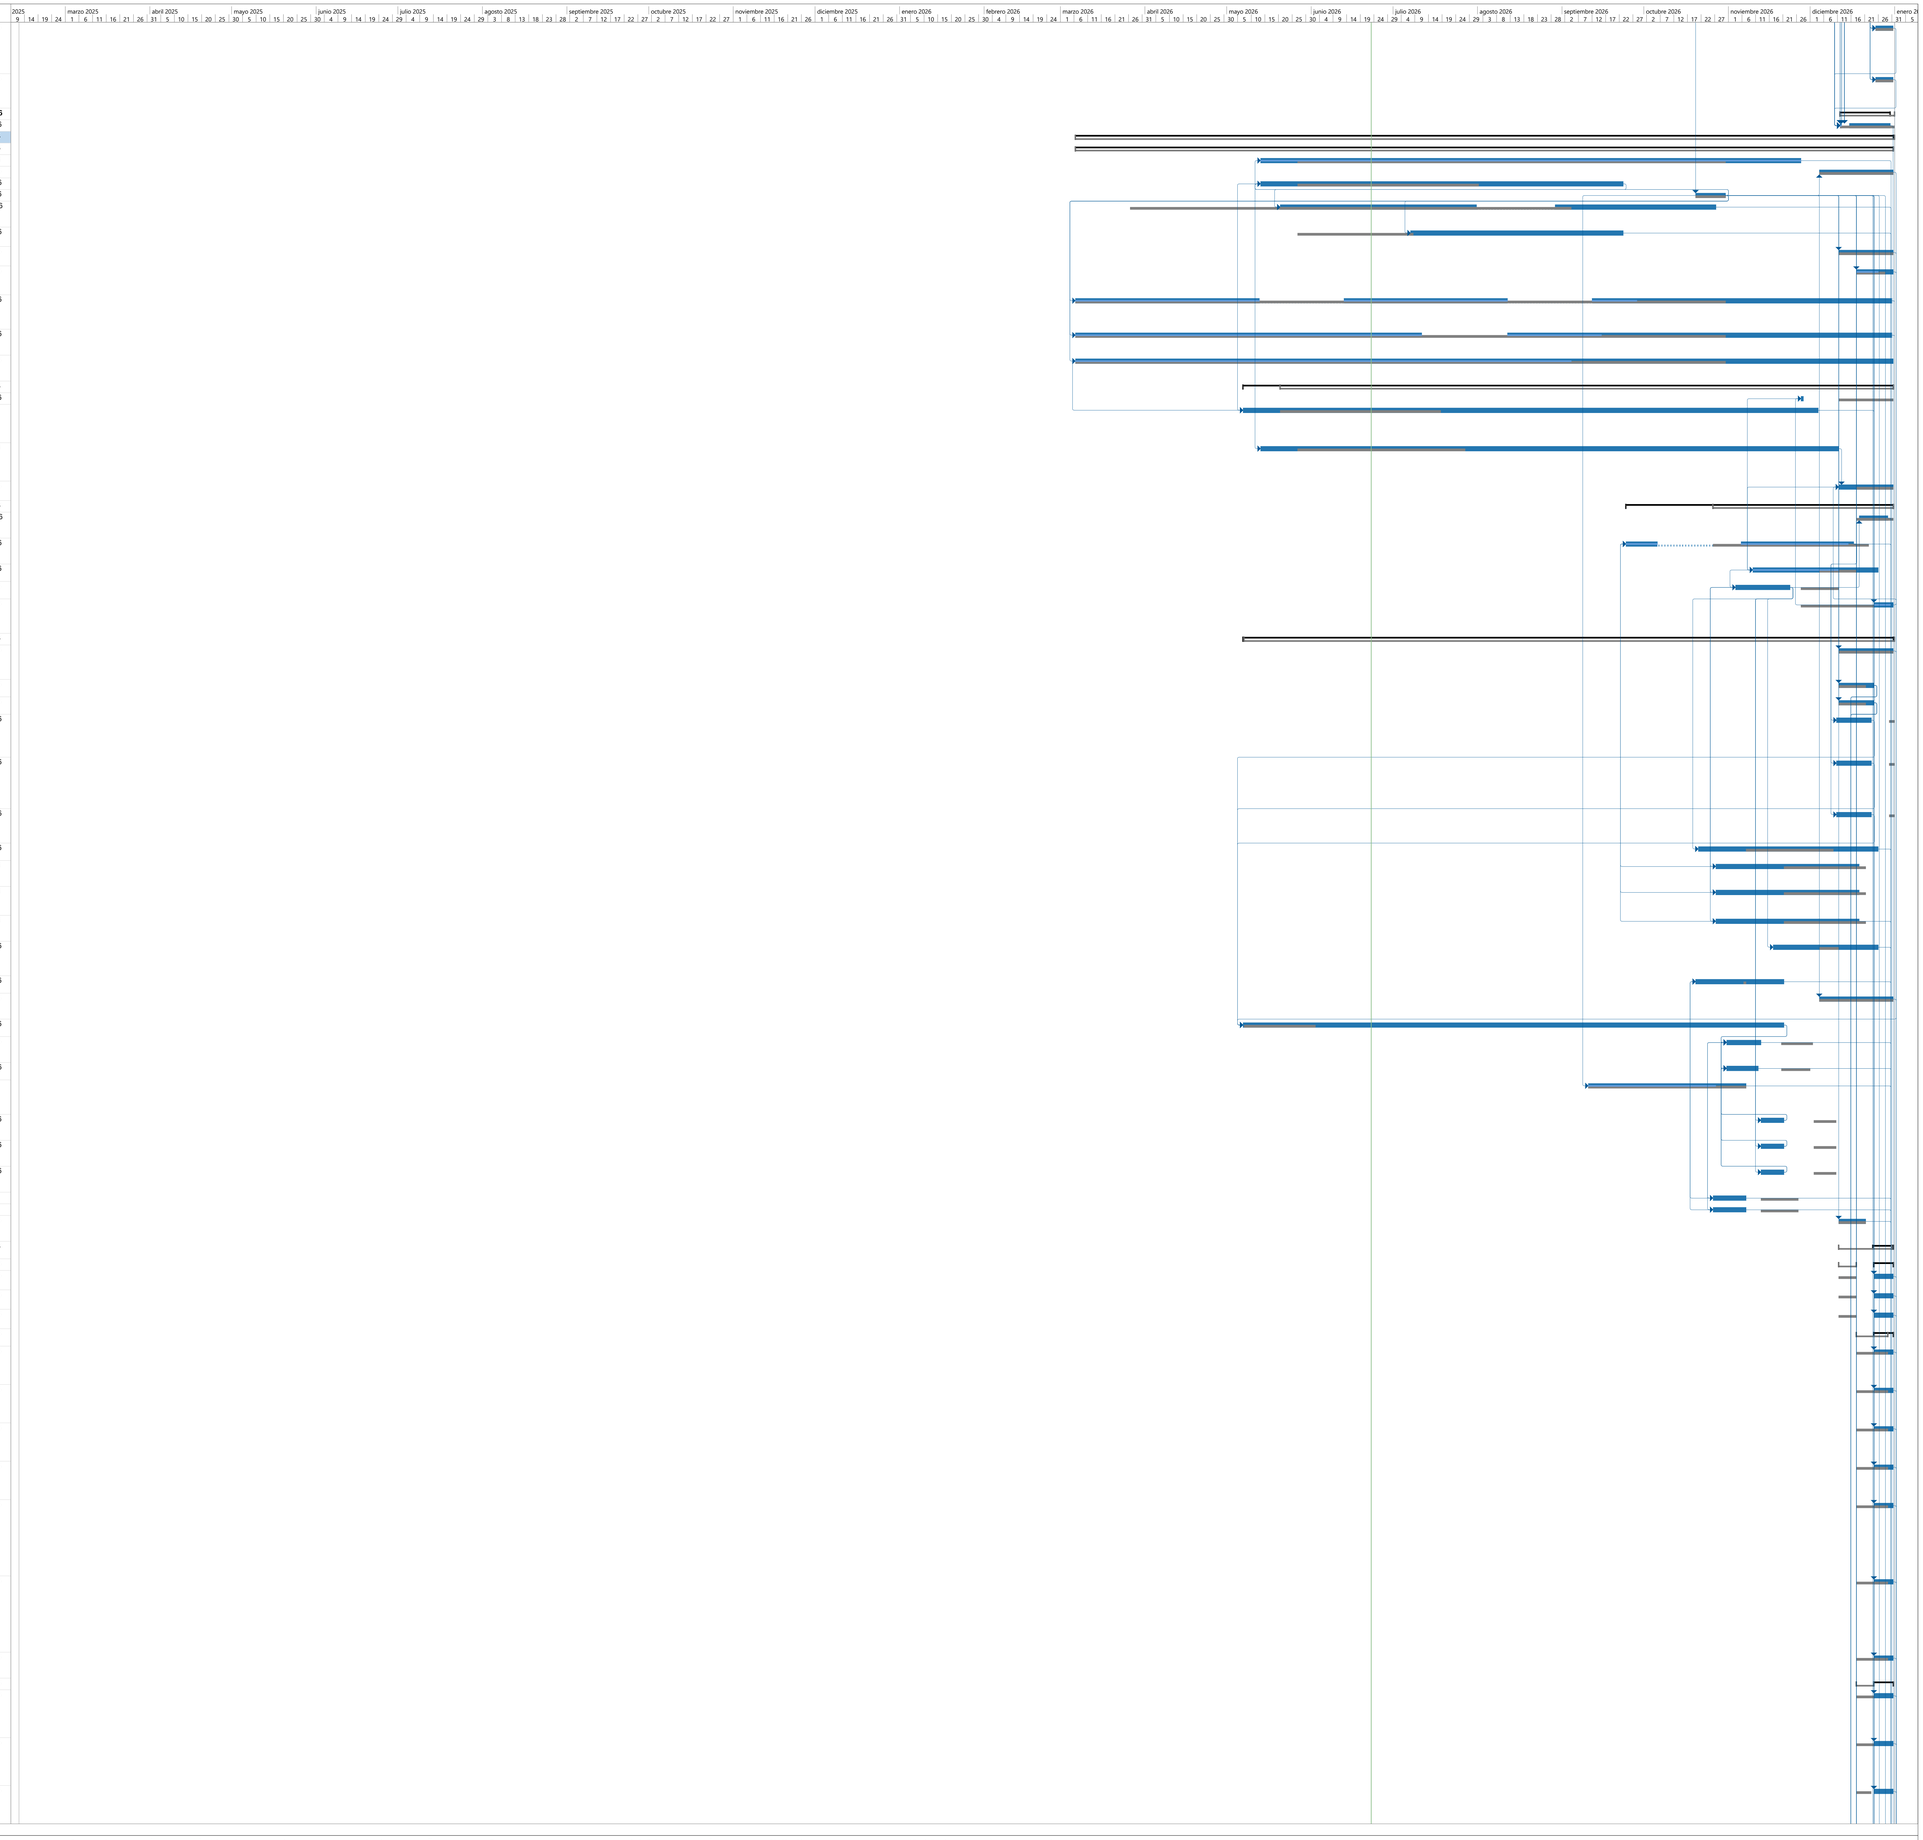

Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesor	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
534		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Tablero General de Acometidas de Equipos. Incluye Interruptores, DPS, barraje de Fase, Neutro, tierra y medidores	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
535		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Tablero General Comercial. Incluye Interruptores, barraje de Fase, Neutro y Tierra	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
536		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación deCaja Metálica para alojar interruptor de Ascensor y Bandas transportadoras. Incluye Interruptor, barraje de Neutro y Tierra	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
537		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Caja Metálica para alojar interruptor de Chiller Oficinas. Incluye barraje de fase, neutro y tierra. Interruptor	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
538		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Caja Metálica para alojar interruptor de Chiller Salidas. Incluye barraje de fase, neutro y tierra. Interruptor	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
539		$ 0	$ 0	Acometidas en MT			0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
540		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida en Media Tensión 3x2 Cu XLPE 37	474FC+3(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
541		$ 0	$ 0	Acometidas en BT			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
542		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de alimentador para alumbrado exterior de vias en	474FC+4(	543	0%	1 día	jue 24/12/26	sáb 26/12/26
543		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x4F+1x1/0N+1x8T Cu AWG en	474FC+4(	650 días;542	0%	1 día	sáb 26/12/26	lun 28/12/26
544		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x2F+2x2N+1x6T Cu AWG en	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
545		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x2/0F+2x1/0N+1x4T Cu AWG en	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
546		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x4/0F+2x4/0N+1x2T Cu AWG en	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
547		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x250F+2x4/0N+1x2T Cu AWG	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
548		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de acometida 3x350F+2x4/0N+1x2T Cu AWG	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
549		$ 0	$ 0	Iluminación Exterior			0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
550		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ampera Mini Neutral White, Fotometria 5136, 16 LED, 36W, 4500 lm. Incluye Accesorios y elementos	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
551		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ampera Midi Neutral White, Fotometria 5103, 32 LED, 71W, 8900 lm. Incluye Accesorios y elementos	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
552		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ampera Midi Neutral White, Fotometria 5103, 48 LED, 106W, 13400 lm. Incluye Accesorios y elementos	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
553		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ampera Midi Neutral White, Fotometria 5120, 48 LED, 106W, 13400 lm. Incluye Accesorios y elementos	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
554		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Omnistar Neutral White, Fotometria 5141, 128 LED, 431W, 45700 lm. Incluye Accesorios y elementos	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
555		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Terra LED Warn White, Fotometria 002A1, 16 LED, 30W. Incluye Accesorios y elementos de	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
556		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Poste metálico Brahman 8 mts Brazo Doble.	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
557		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Poste métalico Brahman 8 mts Brazo Sencillo.	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
558		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Poste metálico 10 mts Doble propósito.	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
559		$ 0	$ 2.407.483	Cajas de Inspeccion y Canalizacion			15%	4,13 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
560		$ 0	$ 0	Construcción y puesta en funcionamiento de Caja de Inspección AP 274.	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
561	✓	$ 0	$ 2.407.483	Construcción y puesta en funcionamiento de Caja de Inspección CS 274.	474FC+4(	650	100%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
562		$ 0	$ 0	Construcción y puesta en funcionamiento de Caja de Inspección CS 275.	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
563		$ 0	$ 0	Construcción y puesta en funcionamiento de Caja de Inspección CS 276.	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
564		$ 0	$ 0	Construcción y puesta en funcionamiento de Caja de Inspección CS 280.	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
565		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Canalización 4#6" PVC TDP Flexible Norma CS 217. Incluye terminal campana y uniones. No incluye obra civil	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
566		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Canalización 2#3" PVC DB Norma AP-207. Incluye terminal campana y uniones. No incluye obra civil	474FC+4(	650	0%	3 días	jue 24/12/26	mar 29/12/26
567		$ 0	$ 0	Terminales Premoldeados, DPS, UPS			0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
568		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de DPS oxido metálico	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
569		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Terminales premoldeados uso interior 34,5 kV	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
570		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de UPS VT 30 kVA APC SUVT30KF3B4. Incluye módulo de baterias SUVTBXR2B6, SUVTBXR6B6, SUVTXR2B6, SUVTXR6B6 y tablero de Bypass	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
571		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de UPS VT 60 kVA APC SUVT30KF3B4. Incluye módulo de baterias SUVTBXR2B6, SUVTBXR6B6, SUVTXR2B6, SUVTXR6B6 y tablero de Bypass	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
572		$ 0	$ 0	Puesta a Tierra De Potencia			0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
573		$ 0	$ 0	Suministro, transporte e instalación de Puesta a tierra de potencia. Incluye 4 electrodos tipo varilla 5/8" 2.4m, cable Cu desnudo 2/0 AWG. Configuración 9x9m, reticula 4.5m . Una caja de Inspeccion 0.3x0.3m, suelo	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
574		$ 0	$ 0	**REDES EXTERIORES HIDROSANITARIAS**			0%	**5 días**	**jue 24/12/26**	**jue 31/12/26**
575		**$ 0**	**$ 0**	REDES EXTERIORES SUMINISTRO AGUA POTABLE Y			**0%**	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
576		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 32 MM PN10	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
577		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 40 MM PN10	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
578		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50MM PN16	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
579		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 63 MM PN16	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
580		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 75MM PN16	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
581		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION POLIETILENO DE ALTA IMPACTO 90MM PN16	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
582		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 110 MM PN16	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
583		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 160 MM PN16	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
584		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO TRAFICO 4"	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
585		$ 0	$ 0	PRUEBAS PARA RED DE SUMINISTRO	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
586		$ 0	$ 0	EXCAVACIÓN MANUAL INCLUYE CARGUE Y RETIRO	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
587		$ 0	$ 0	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACION	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
588		$ 0	$ 0	RELLENO EN RECEBO COMÚN INCLUYE COMPACTACIÓN	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
589		$ 0	$ 0	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO BOMBEO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2 BOMBAS 5HP	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
590		$ 0	$ 0	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO BOMBEO RED DE SUMINISTRO AGUA LLUVIA TRATADA 3 BOMBAS 25 HP/CU	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
591		$ 0	$ 0	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO BOMBEO POZO PROFUNDO 1HP	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
592		$ 0	$ 0	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE COMPACTA	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
593		**$ 0**	**$ 0**	REDES EXTERIORES DESAGUES AGUAS NEGRAS Y AGUAS			**0%**	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
594		$ 0	$ 0	SUMINISTRO Y MONTAJE FOSO EYECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTO POR DOS BOMBAS	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26



Id	Modo de	CPTP	Costo real	Nombre de tarea	Predecesor	Sucesoras	% completado	Duración	Comienzo	Fin
595		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 0.60mX0.60m	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
596		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 0.70mX0.70m	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
597		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 0.80mX0.80m	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
598		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
599		$ 0	$ 0	TRAMPA GRASAS CONCRETO IMPERMEABILIZADO	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
600		$ 0	$ 0	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
601		$ 0	$ 0	SUMINISTRO EN INSTALACION CANAL TIPO MONOBLOCK PD	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
602		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION POZO INSPECCION 1,2M, H	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
603		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 3"	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
604		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-ALC 110 MM	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
605		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION PVC-ALC 160 MM	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
606		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION PVC-ALC 200 MM	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
607		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-ALC 250 MM	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
608		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-ALC 315 MM	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
609		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-ALC 355 MM	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
610		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-ALC 450 MM	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
611		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO ALCANTARILLADO LATERAL	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
612		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
613		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHARNELA 14"	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
614		$ 0	$ 0	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y RETIRO	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
615		$ 0	$ 0	RELLENO EN ARENA	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
616		$ 0	$ 0	RELLENO EN RECEBO COMÚN INCLUYE COMPACTACIÓN	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
617		$ 0	$ 0	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACIÓN	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
618		$ 0	$ 0	CABEZAL DE DESCARGA 10"	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
619		$ 0	$ 0	CABEZAL DE DESCARGA 18"	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
620		$ 0	$ 0	PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES COLECTORES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES EXTERIORES	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
621		$ 0	$ 0	CANAL EN CONCRETO CON REJILLA B:30cm H:20cm	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
622		$ 0	$ 0	**REDES EXTERIORES DE INCENDIO**			0%	**10 días**	**jue 17/12/26**	**jue 31/12/26**
623		**$ 0**	**$ 0**	TUBERIA ACERO INOXIDABLE			**0%**	4 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
624		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA ACERO INOXIDABLE. 30 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	474FC+3(	650	0%	4 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
625		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA ACERO INOXIDABLE. 38 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	474FC+3(	650	0%	4 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
626		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA ACERO INOXIDABLE. 60,3 MM (INCLUYE	474FC+3(	650	0%	4 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
627		**$ 0**	**$ 0**	ELEMENTOS INCENDIO			**0%**	10 días	jue 17/12/26	jue 31/12/26
628		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO PARA LA RESERVA DE AGUA DEL SISTEMA DE INCENDIO	474FC+4(	650	0%	4 días	jue 24/12/26	mié 30/12/26
629		$ 0	$ 0	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA RED DE INCENDIO MSPU 6	474FC+4(	650	0%	3 días	lun 28/12/26	jue 31/12/26
630		$ 0	$ 0	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y RETIRO	474FC+3(	650	0%	4 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
631		$ 0	$ 0	RELLENO EN RECEBO COMÚN INCLUYE COMPACTACIÓN	474FC+3(	650	0%	4 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
632		$ 0	$ 0	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACIÓN	474FC+3(	650	0%	4 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
633		$ 0	$ 0	ENCAMIZADO EN TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 3"	474FC+3(	650	0%	4 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
634		$ 0	$ 0	**SEÑALIZACION**			0%	**5 días**	**jue 24/12/26**	**jue 31/12/26**
635		$ 0	$ 0	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
636		$ 0	$ 0	MARCA VIAL CON PINTURA EN FR	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
637		$ 0	$ 0	TACHAS REFLECTIVAS	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
638		$ 0	$ 0	SEÑAL EXTERIOR "EXT001". TOTEM NOMBRE DEL AEROPUERTO EN LA VIA DE	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
639		$ 0	$ 0	SEÑAL EXTERIOR "EXT002". SEÑAL IDENTIFICATIVA ZONA DE	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
640		$ 0	$ 0	SEÑAL EXTERIOR "EXT003". SEÑAL IDENTIFICATIVA	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
641		$ 0	$ 0	SEÑAL EXTERIOR "EXT004". SEÑAL IDENTIFICATIVA INGRESO PARQUEADERO FUNCIONARIOS	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
642		$ 0	$ 0	SEÑAL EXTERIOR "EXT005 - EXT006 - EXT007 ". TOTEM CIRCULACION EXTERIOR	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
643		$ 0	$ 0	SEÑAL EXTERIOR "EXT008". SEÑAL IDENTIFICATIVA CANILES	474FC+4(	650	0%	5 días	jue 24/12/26	jue 31/12/26
644		$ 0	$ 0	**ARBORIZACIÓN**			0%	**7 días**	**jue 17/12/26**	**lun 28/12/26**
645		$ 0	$ 0	SAMÁN (SUMISNTRO Y PLANTACI	496FC-5	650	0%	7 días	jue 17/12/26	lun 28/12/26
646		$ 0	$ 0	IGUÁ (SUMISNTRO Y PLANTACIÓN	496FC-5	650	0%	7 días	jue 17/12/26	lun 28/12/26
647		$ 0	$ 0	ALGARROBO (SUMISNTRO Y PLANTACIÓN)	496FC-5 días;495F	650	0%	7 días	jue 17/12/26	lun 28/12/26
648		$ 0	$ 0	ALMENDRO (SUMISNTRO Y PLANTACIÓN)	496FC-5 días;495F	650	0%	7 días	jue 17/12/26	lun 28/12/26
649		$ 0	$ 0	PALMA AFRICANA (SUMINISTRO Y PLANTACIÓN)	496FC-5 días;495F	650	0%	7 días	jue 17/12/26	lun 28/12/26
650		$ 0	$ 0	Fin de Urbanismo	15;471;47	651	0%	0 días	jue 31/12/26	jue 31/12/26
651		$ 0	$ 0	FIN DE OBRA	468;650		0%	0 días	jue 31/12/26	jue 31/12/26



Ing. CESAR HUMBERTO SUAREZ APONTE
Director de Interventoría
Consorcio AEROCOIN

ING. JORGE CASTAÑEDA VELASQUEZ
Director de Obra
CONSORCIO EL MORRO – TUMACO

Proyecto: PROGRAMACION V1
Fecha: mar 23/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual
