
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
NIT 891.501.676-1

MEMORIAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 384-2025

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
FECHA	4 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN	PREDIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
ITEM:	2.01 — **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye cargue y retiro a botadero)** — **Unidad** M3

EXCAVACION MANUAL

Área/lugar/elemento	Ancho (m)	Profundidad (m)	Largo (m)		Excavación (m3)	Cant. de elementos	Total Parcial
EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA 6"	0.80	1.94	34.40		53.32	1.00	**53.32**
EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA PLUVIAL 8"	0.80	1.49	58.00		69.02	1.00	69.02
Muro mamposteria (EJE A) (7-10)	0.40	1.05	28.00		11.76	1.00	11.76
Muro combinado 1 (EJE A) (7-3)	0.80	1.35	30.00		32.40	1.00	32.40
VIGAS DE CIMENTACION	**Ancho (m)**	**H (m)**	**Long (m)**		**Excavación (m3)**	**Cant. de elementos**	
VC-101	0.25	1.05	14.07		3.69	1.00	3.69
VC-102	0.25	1.05	16.50		4.33	1.00	4.33
VC-102A	0.25	1.05	4.02		1.06	1.00	1.06
VC-103	0.45	1.05	45.46		21.48	1.00	21.48
	0.45	1.15	22.64		11.72	1.00	11.72
VC-104	0.25	1.05	68.10		17.88	1.00	17.88
VC-105	0.4	1.05	68.10		28.60	1.00	28.60
VC-105A	0.40	1.05	53.60		22.51	1.00	22.51
	0.40	1.15	14.50		6.67	1.00	6.67
VC-104A	0.25	1.05	68.1		17.88	1.00	17.88
VC-106	0.45	1.05	28.35		13.40	1.00	13.40
	0.45	1.15	39.75		20.57	1.00	20.57
VC-107	0.25	1.05	5.01		1.32	1.00	1.32
VC-108	0.60	1.05	5.01		3.16	1.00	3.16
VC-109	0.25	1.05	62.38		16.37	1.00	16.37
VC-110	0.25	1.05	9.49		2.49	1.00	2.49
VC-111	0.25	1.05	10.23		2.69	1.00	2.69
VC-112	0.40	1.05	24.22		10.17	1.00	10.17
VC-113	0.25	1.05	18.46		4.85	1.00	4.85
VC-114	0.40	1.05	18.46		7.75	1.00	7.75
VC-115	0.25	1.05	13.45		3.53	1.00	3.53
VC-116	0.40	1.05	13.45		5.65	1.00	5.65
VC-115A	0.25	1.05	13.45		3.53	1.00	3.53
VC-123	0.45	1.15	9.46		4.90	1.00	4.90
	0.45	1.05	8.98		4.24	1.00	4.24
VC-115B	0.25	1.05	13.45		3.53	1.00	3.53
VC-117	0.40	1.05	18.19		7.64	1.00	7.64
VC-118	0.25	1.05	18.19		4.77	1.00	4.77
VC-119	0.45	1.05	9.38		4.43	1.00	4.43
	0.45	1.15	8.98		4.65	1.00	4.65
VC-118A	0.25	1.05	18.36		4.82	1.00	4.82
VC-117A	0.40	1.05	18.36		7.71	1.00	7.71
VC-120	0.25	1.05	13.45		3.53	1.00	3.53
VC-121	0.45	1.05	9.63		4.55	1.00	4.55
	0.45	1.15	8.98		4.65	1.00	4.65
VC-120A	0.25	1.05	13.45		3.53	1.00	3.53
VC-122	0.40	1.05	13.45		5.65	1.00	5.65
VC-124	0.25	1.05	6.20		1.63	1.00	1.63
VIGA TIPO T TIPO 1	1.00	1.05	5.16		5.42	2.00	10.84
VIGA TIPO T TIPO 2	0.73	1.05	2		1.53	1.00	1.53

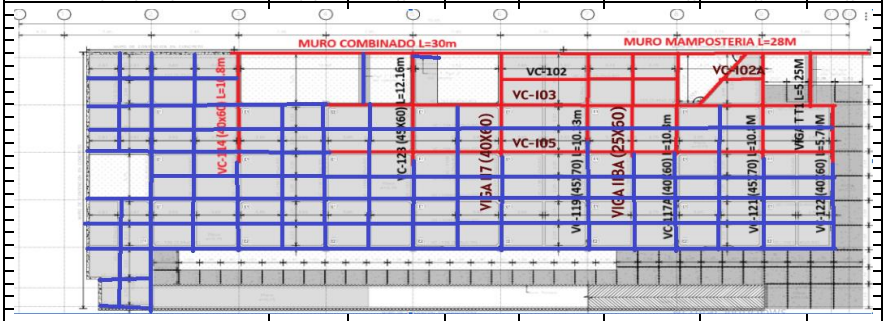

						TOTAL	**480.38**
						PAGADO ACTA ANTERIOR	**246.38**
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**234.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones

Nota: La excavación de las vigas de cimentación se cuantifica considerando la longitud total de las vigas longitudinales. En las vigas transversales se descuentan los tramos coincidentes con las longitudinales para evitar doble contabilización. Asimismo, donde las vigas transversales coinciden con los muros de contención del eje A, prevalece la excavación del muro.

CONTRATISTA
ING. PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
R/ L CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ

INTERVENTOR
ARQ. JULIAN MIGUEL LONDOÑO CASTRILLON
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA ADN-ASTAIZA

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

NIT 891.501.676-1

MEMORIAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 384-2025


OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
FECHA	4 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN	PREDIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
ITEM:	2.03 — **SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS o equivalente(Extendido y compactado)** — **Unidad** M3

Área/lugar/elemento						Cant. de elementos	Total Parcial
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen (m3)	V. PARCIAL		
Pluvial	58	0.80	1.24	57.42	57.42	1.00	57.42
Sanitaria	34.40	0.80	1.69	46.44	46.44	1.00	46.44
RELLENO AJUSTE ÁREA DE ESCOMBROS	15.00	6.00	2.85	256.5	256.50	1.00	256.50
Relleno área arboles	2.80	2.80	1.07	8.42	8.42	29.00	244.30
Eje (D-G) (1-10) Relleno sobreexcavación por material	60.00	1.21	2.75	199.7	199.65	1.00	199.65
Eje (A-D) (1-10) Relleno sobreexcavación por material	58.00	15.40	1.25	1,116.5	1116.50	1.00	1116.50
Relleno zona Muro de contención rampa tipo 2	27.00	3.22	2.78	241.7	241.69	1.00	241.69
VIGAS DE CIMENTACION	**Ancho (m)**	**H (m)**	**Long (m)**		**Relleno**	**Cant. de elementos**	**M3**
VC-101	0.25	0.3	14.07	1.06	1.06	1.00	1.06
VC-102	0.25	0.3	16.50	1.24	1.24	1.00	1.24
VC-102A	0.25	0.3	4.02	0.30	0.30	1.00	0.30
VC-103	0.45	0.3	45.46	6.14	6.14	1.00	6.14
	0.45	0.3	22.64	3.06	3.06	1.00	3.06
VC-104	0.25	0.3	68.10	5.11	5.11	1.00	5.11
VC-105	0.4	0.3	68.10	8.17	8.17	1.00	8.17
VC-105A	0.40	0.3	53.60	6.43	6.43	1.00	6.43
	0.40	0.3	14.50	1.74	1.74	1.00	1.74
VC-104A	0.25	0.3	68.1	5.11	5.11	1.00	5.11
VC-106	0.45	0.3	28.35	3.83	3.83	1.00	3.83
	0.45	0.3	39.75	5.37	5.37	1.00	5.37
VC-107	0.25	0.3	5.01	0.38	0.38	1.00	0.38
VC-108	0.60	0.3	5.01	0.90	0.90	1.00	0.90
VC-109	0.25	0.3	62.38	4.68	4.68	1.00	4.68
VC-110	0.25	0.3	9.49	0.71	0.71	1.00	0.71
VC-111	0.25	0.3	10.23	0.77	0.77	1.00	0.77
VC-112	0.40	0.3	24.22	2.91	2.91	1.00	2.91
VC-113	0.25	0.3	18.46	1.38	1.38	1.00	1.38
VC-114	0.40	0.3	18.46	2.22	2.22	1.00	2.22
VC-115	0.25	0.3	13.45	1.01	1.01	1.00	1.01
VC-116	0.40	0.3	13.45	1.61	1.61	1.00	1.61
VC-115A	0.25	0.3	13.45	1.01	1.01	1.00	1.01
VC-123	0.45	0.3	9.46	1.28	1.28	1.00	1.28
	0.45	0.3	8.98	1.21	1.21	1.00	1.21
VC-115B	0.25	0.3	13.45	1.01	1.01	1.00	1.01
VC-117	0.40	0.3	18.19	2.18	2.18	1.00	2.18
VC-118	0.25	0.3	18.19	1.36	1.36	1.00	1.36
VC-119	0.45	0.3	9.38	1.27	1.27	1.00	1.27
	0.45	0.3	8.98	1.21	1.21	1.00	1.21
VC-118A	0.25	0.3	18.36	1.38	1.38	1.00	1.38
VC-117A	0.40	0.3	18.36	2.20	2.20	1.00	2.20
VC-120	0.25	0.3	13.45	1.01	1.01	1.00	1.01
VC-121	0.45	0.3	9.63	1.30	1.30	1.00	1.30
	0.45	0.3	8.98	1.21	1.21	1.00	1.21
VC-120A	0.25	0.3	13.45	1.01	1.01	1.00	1.01
VC-122	0.40	0.3	13.45	1.61	1.61	1.00	1.61
VC-124	0.25	0.3	6.20	0.47	0.47	1.00	0.47
VIGA TIPO T TIPO 1	1.00	0.3	5.16	1.55	1.55	2.00	3.10
VIGA TIPO T TIPO 2	0.73	0.3	2.00	0.44	0.44	1.00	0.44
Muro mamposteria (EJE A) (7-10)	0.40	0.3	28.00	3.36	3.36	1.00	3.36
Muro combinado 1 (EJE A) (7-3)	0.80	0.3	30.00	7.20	7.20	1.00	7.20

REGISTRO FOTOGRÁFICO





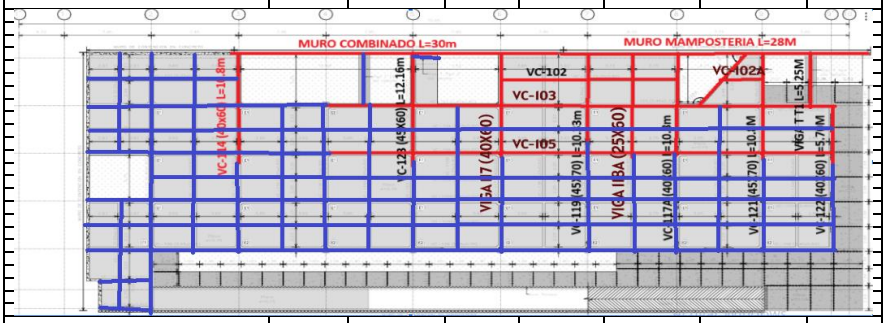

	TOTAL	**2,261.45**
	PAGADO ACTA ANTERIOR	**604.66**
	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**1,656.79**

Observaciones

Nota: El relleno con subbase bajo las vigas de cimentación se cuantifica considerando la longitud total de las vigas longitudinales. En las vigas transversales se descuentan los tramos coincidentes con las longitudinales para evitar doble contabilización. Asimismo, donde las vigas transversales coinciden con los muros de contención del eje A, prevalece el relleno correspondiente al muro

CONTRATISTA
ING. PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
R/ L CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ

INTERVENTOR
ARQ. JULIAN MIGUEL LONDOÑO CASTRILLON
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA ADN-ASTAIZA

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

NIT 891.501.676-1

MEMORIAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 384-2025

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
FECHA	4 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN	PREDIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
ITEM:	3.12 ACERO DE REFUERZO PDR 60 Fy 60000 psi — **Unidad** KG


ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION	DIAMETRO	PESO (KG/ML)	LONGITUD	PESO (KG)	CANTIDAD	ELEMENTO	Total Parcial VALOR PARCIAL (KG)
VC-101						Acero long	167.33
						Estribos	69.72
VC-102						Acero long	208.52
						Estribos	80.64
VC-102A						Acero long	38.70
						Estribos	10.08
VC-103						Acero long	2388.30
						Estribos	1069.20
VC-104						Acero long	956.26
						Estribos	383.88
VC-105						Acero long	2094.70
						Estribos	771.00
VC-105A						Acero long	2047.53
						Estribos	782.30
VC-104A						Acero long	1002.82
						Estribos	351.12
VC-106						Acero long	2748.27
						Estribos	1079.80
VC-107						Acero long	49.59
						Estribos	18.48
VC-108						Acero long	101.28
						Estribos	72.82
VC-109						Acero long	889.73
						Estribos	331.80
VC-110						Acero long	113.85
						Estribos	46.20
VC-111						Acero long	121.50
						Estribos	44.52
VC-112						Acero long	882.15
						Estribos	290.90
VC-113						Acero long	229.72
						Estribos	89.04
VC-114						Acero long	590.67
						Estribos	225.00
VC-115						Acero long	176.58
						Estribos	65.52
VC-116						Acero long	427.32
						Estribos	169.90
VC-115A						Acero long	195.85
						Estribos	72.24
VC-123						Acero long	797.10
						Estribos	314.00
VC-115B						Acero long	221.59
						Estribos	68.88
VC-117						Acero long	621.24
						Estribos	233.80
VC-118						Acero long	233.25
						Estribos	92.40
VC-119						Acero long	828.82
						Estribos	330.10
VC-118A						Acero long	247.13
						Estribos	95.76
VC-117A						Acero long	661.74
						Estribos	233.80
VC-120						Acero long	249.11
						Estribos	76.44
VC-121						Acero long	1098.80
						Estribos	314.40
VC-120A						Acero long	206.30
						Estribos	68.88
VC-122						Acero long	255.25
						Estribos	118.94
VC-124						Acero long	74.25
						Estribos	40.32
VIGA T TIPO 1							821.88
VITA T TIPO 2							210.16


ACERO DE REFUERZO TANQUE	DIAMETRO	PESO (KG/ML)	LONGITUD	PESO (KG)	CANTIDAD	ELEMENTO	VALOR PARCIAL (KG)
Acero #4							7177.70


MUROS DE CONTENCION	DIAMETRO	PESO (KG/ML)	LONGITUD	PESO (KG)	CANTIDAD	ELEMENTO	VALOR PARCIAL (KG)
Muro mamposteria (EJE A) (7-10)							319.24
MURO DE CONTENCION ENTRE EJES 2´ - 2							3703.96
MURO DE CONTENCION ENTRE EJES 2 - 3							4520.56
MURO DE CONTENCION ENTRE EJES A - G							19688.35
MURO DE CONTENCION ENTRE EJES 5 - 7 COMBINADO 1							1041.74
MURO DE CONTENCION ENTRE EJES 5 - 3 COMBINADO 2							1171.45
PANTALA EN EJE 9´ M-1							37.63
PANTALA EN EJE 9´ M-2							55.42
PANTALA EN EJE 9´ M-3							46.01
TOTAL							**67,731.24**
PAGADO ACTA ANTERIOR							**0.00**
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA							**43,716.19**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





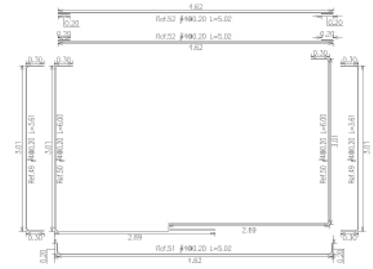













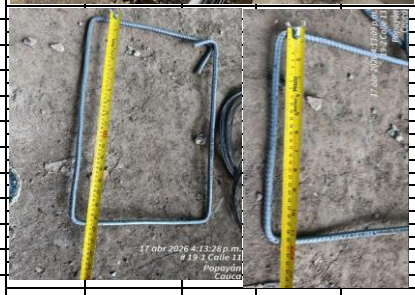



Observaciones

NOTA: REVISAR DETALLE MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA
ING. PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
R/ L CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ

INTERVENTOR
ARQ. JULIAN MIGUEL LONDOÑO CASTRILLON
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA ADN-ASTAIZA

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

NIT 891.501.676-1


MEMORIAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 384-2025

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
FECHA	4 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN	PREDIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
ITEM:	3.13 MALLA ELECTRO SOLDADA Fy 480 Mpa — **Unidad** KG

						Total Parcial
MALLA ELECTROSOLADADA LOSA PISO 1	**REFERENCIA**	**PESO (KG/ML)**	**PESO (KG)**	**CANTIDAD**	**ELEMENTO**	**VALOR PARCIAL (KG)**
Malla losa de cimentación inferior	295.00			71.00		4678.90
Malla losa de cimentación superior	295.00			91.00		5996.90
MALLA ELECTROSOLADADA MUROS PANTALLA	**REFERENCIA**	**PESO (KG/ML)**	**PESO (KG)**	**CANTIDAD**	**ELEMENTO**	**VALOR PARCIAL (KG)**
PANTALA EN EJE 9´ M-1	378.00					169.40
PANTALA EN EJE 9´ M-2	257.00					57.40
PANTALA EN EJE 9´ M-3	335.00					75.10
TOTAL						**10,977.70**
PAGADO ACTA ANTERIOR						**0.00**
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**10,977.70**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

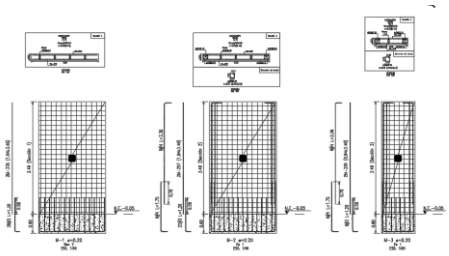

Observaciones

NOTA: REVISAR DETALLE MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA
ING. PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
R/ L CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ

INTERVENTOR
ARQ. JULIAN MIGUEL LONDOÑO CASTRILLON
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA ADN-ASTAIZA

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

NIT 891.501.676-1

MEMORIAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 384-2025

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
FECHA	4 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN	PREDIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

ITEM:	3.14	**PERFIL TUBULAR ASTM A-500 GRADO C Fy=350 Mpa (Incluye Suministro, Fabricación, Montaje, Soldadura, Conexiones anticorrosivo y acabado en pintura esmalte)**	**Unidad**	KG

						Total Parcial
COLUMNAS	**CALIDAD MATERIAL**	**KG/ML**	**LONGITUD**	**PESO (KG)**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL (KG)**
Tubo Cuad 300x300x10,00mm	A 500 GRADO C	91.25	8.05	734.56	32.00	23506.00
Tubo Cuad 300x300x10,00mm	A 500 GRADO C	91.25	4.05	369.56	4.00	1478.25
Tubo Cuad 250x250x10,00mm	A 500 GRADO C	74.22	4.05	300.59	4.00	1202.36
Tubo Cuad 250x250x10,00mm	A 500 GRADO C	74.22	8.05	597.47	2.00	1194.94
Tubo Cuad 200x200x7,00mm	A 500 GRADO C	42.7	8.05	343.74	2.00	687.47
RIOSTRAS	**CALIDAD MATERIAL**	**KG/ML**	**LONGITUD**	**PESO (KG)**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL (KG)**
Tubo Ø 8"x8,18mm	A 500 GRADO C	42.54	4.30	182.92	6.00	1097.53
Tubo Ø 8"x8,18mm	A 500 GRADO C	42.54	4.30	182.92	12.00	2195.06
Tubo Ø 6"x4,00mm	A 500 GRADO C	14.92	4.30	64.16	6.00	384.94
Tubo Cuad 150x150x6,00mm	A 500 GRADO C	27.41	3.10	84.97	8.00	679.77
Tubo Cuad 150x150x6,00mm	A 500 GRADO C	27.41	3.65	100.05	2.00	200.09
Tubo Cuad 150x150x6,00mm	A 500 GRADO C	27.41	3.49	95.66	2.00	191.32
Tubo Cuad 150x150x6,00mm	A 500 GRADO C	27.41	3.10	84.97	8.00	679.77
Tubo Cuad 150x150x6,00mm	A 500 GRADO C	27.41	3.65	100.05	3.00	300.14
Tubo Cuad 150x150x6,00mm	A 500 GRADO C	27.41	3.49	95.66	3.00	286.98
Tubo Cuad 100x100x2,00mm	A 500 GRADO C	6.2	62.08	384.90	2.00	769.79
Tubo Rect 100x50x2,00mm	A 500 GRADO C	4.64	0.61	2.83	66.00	186.81
Tubo Cuad 100x100x2,00mm	A 500 GRADO C	6.2	7.08	43.90	2.00	87.79
Tubo Rect 100x50x2,00mm	A 500 GRADO C	4.64	0.61	2.83	10.00	28.30
VIGAS ENTREPISO N+3.95	**CALIDAD MATERIAL**	**KG/ML**	**LONGITUD**	**PESO (KG)**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL (KG)**
Tubo Rect 200x400x9,00mm	A 500 GRADO C	81.69	1.62	132.34	6.00	794.03
Tubo Rect 200x400x9,00mm	A 500 GRADO C	81.69	1.46	119.27	2.00	238.53
Tubo Rect 200x400x9,00mm	A 500 GRADO C	81.69	2.36	192.87	8.00	1542.96
Tubo Rect 200x400x9,00mm	A 500 GRADO C	81.69	1.82	148.68	8.00	1189.41
TOTAL						**38,922.25**
PAGADO ACTA ANTERIOR						**0.00**
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**21,987.40**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

NOTA: REVISAR DETALLE MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA
ING. PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
R/ L CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ

INTERVENTOR
ARQ. JULIAN MIGUEL LONDOÑO CASTRILLON
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA ADN-ASTAIZA

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

NIT 891.501.676-1

MEMORIAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 384-2025

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
FECHA	4 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN	PREDIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

ITEM:	3.15	**PERFIL ASTM A-572 GRADO 50 Fy=350 Mpa (Incluye Suministro, Fabricación, Montaje, Soldadura, Conexiones anticorrosivo y acabado en pintura esmalte)**	**Unidad**	KG

						Total Parcial
VIGAS ENTREPISO	**CALIDAD MATERIAL**	**KG/ML**	**LONGITUD**	**PESO (KG)**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL (KG)**
W 8"x10	ASTM A-572	15	2.84	42.60	9.00	383.40
W 8"x10	ASTM A-572	15	2.83	42.45	6.00	254.70
W 8"x10	ASTM A-572	15	3.98	59.63	80.00	4770.00
W 8"x10	ASTM A-572	15	3.97	59.48	2.00	118.95
W 8"x10	ASTM A-572	15	3.78	56.63	6.00	339.75
W 8"x10	ASTM A-572	15	4.18	62.63	8.00	501.00
W 8"x10	ASTM A-572	15	1.41	21.15	2.00	42.30
W 8"x10	ASTM A-572	15	3.16	47.40	2.00	94.80
W 8"x10	ASTM A-572	15	3.17	47.55	2.00	95.10
W 8"x10	ASTM A-572	15	0.70	10.50	2.00	21.00
W 8"x10	ASTM A-572	15	1.74	26.10	1.00	26.10
W 8"x10	ASTM A-572	15	1.92	28.80	2.00	57.60
W 8"x10	ASTM A-572	15	1.69	25.32	2.00	50.64
W 8"x10	ASTM A-572	15	1.07	16.07	1.00	16.07
W 8"x10	ASTM A-572	15	2.55	38.30	1.00	38.30
W 8"x13	ASTM A-572	19.3	3.16	60.99	4.00	243.95
W 8"x13	ASTM A-572	19.3	3.17	61.18	4.00	244.72
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	7.81	418.38	1.00	418.38
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	7.65	409.81	19.00	7786.40
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	7.85	420.52	4.00	1682.10
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	7.44	398.56	1.00	398.56
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	5.52	295.71	3.00	887.12
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	7.45	399.10	3.00	1197.29
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	6.18	331.06	2.00	662.13
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	5.52	295.71	1.00	295.71
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	3.73	199.82	1.00	199.82
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	6.23	333.47	1.00	333.47
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	0.47	24.91	1.00	24.91
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	1.53	81.96	1.00	81.96
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	1.69	90.53	1.00	90.53
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	15.45	827.66	1.00	827.66
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	15.63	837.14	1.00	837.14
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	6.24	334.28	1.00	334.28
W 16"x36	ASTM A-572	53.57	1.20	64.28	51.00	3278.48
W 10"x22	ASTM A-572	32.74	2.45	80.21	24.00	1925.11
W 10"x22	ASTM A-572	32.74	5.15	168.61	26.00	4383.89
W 10"x22	ASTM A-572	32.74	4.14	135.41	3.00	406.24
W 10"x22	ASTM A-572	32.74	5.49	179.61	4.00	718.45
W 10"x22	ASTM A-572	32.74	6.40	209.54	1.00	209.54
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	6.13	237.65	1.00	237.65
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	5.15	199.82	2.00	399.64
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	5.34	207.04	2.00	414.07
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	4.91	190.66	1.00	190.66
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	1.69	65.46	1.00	65.46
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	6.41	248.59	1.00	248.59
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	4.92	190.70	1.00	190.70
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	4.25	164.90	1.00	164.90
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	2.75	106.70	1.00	106.70
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	4.35	168.78	1.00	168.78
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	1.72	66.74	1.00	66.74
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	5.06	196.48	2.00	392.97
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	4.25	164.90	1.00	164.90
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	2.75	106.70	1.00	106.70
W 16"x26	ASTM A-572	38.8	4.35	168.78	1.00	168.78
W 16"x31	ASTM A-572	46.1	15.36	708.10	1.00	708.10
TOTAL						**38,072.86**
PAGADO ACTA ANTERIOR						**0.00**
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**37,804.38**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones	
	NOTA: REVISAR DETALLE MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA
ING. PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
R/ L CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ

INTERVENTOR
ARQ. JULIAN MIGUEL LONDOÑO CASTRILLON
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA ADN-ASTAIZA
