CONTRATO DE INTERVENTORIA 101 DEL 09 DE MARZO DE 2026. INTERVENTORÍA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA POPAYÁN E.S.E.	ADN ASTAIZA CONSORCIO
INFORME MENSUAL No. 01	Documento Versión 1

ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORIA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA PARA LA REUBICACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y AREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA POPAYAN E.S.E"
INTERVENTORIA:	CONSORCIO AND ASTAIZA
CONTRATO:	101 DEL 09 DE MARZO DE 2026
VALOR:	OCHOCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 808.339.158)
FECHA DE INICIO:	09 MARZO DE 2026
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 01 (PERIODO MARZO 09 DE 2026 – MARZO 25 DE 2026)



Fuente. Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E

Juan Miguel Londoño Astaiza.
Aprobó: Representante legal Consorcio ADN ASTAIZA

MARZO 25 DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
1.1. Localización. 6
2.2 Justificación 7
2.3 Características del Proyecto. 7
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
3.1 Contrato de Obra. 8
3.2 Póliza del Contrato de Obra. 8
3.4 Pólizas de Interventoría. 9
4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA. 10
4.1 Personal de Interventoría 10
4.2 Personal del contratista de obra. 11
4.4 Correspondencia 12
4.3 Gestión Técnica 12
4.3.1 Avance de obra 12
5. SEGURIDAD SOCIAL 17
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18
7. PERSONAL OBRA – ADMINISTRATIVO 19
8. ENTREGA DE EPP 21
9. CAMPAMENTO 21
10. MAQUINARIA Y/O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA 22
11. INSPECCIÓN DE OBRA 23
12. PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 24
13. SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO PERIMETRAL 25
14. RECOMENDACIONES 26
ANEXOS 27
Anexo 1. Póliza y Responsabilidad civil extracontractual contratista de obra 28
Anexo 2. Póliza y Responsabilidad civil extracontractual Interventoría de obra 32
Anexo 3. Acta de comité de obra 34
Anexo 4. Concepto Estudio de Suelos 39
Anexo 5. Bitácora 41

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los términos establecidos para la CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 001 DE 2026 adelantada por el HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., cuyo objeto es realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA POPAYÁN E.S.E.", según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El contenido y alcance de la presente propuesta de interventoría se encuentra enmarcado bajo los lineamientos normativos vigentes para la infraestructura hospitalaria y el cronograma de ejecución proyectado hasta el 31 de agosto de 2026. Este proceso abarca las actividades de revisión, control y seguimiento integral al contrato de obra derivado del proceso No. HSLV CP-002 2025, asegurando la correcta inversión del presupuesto oficial asignado de OCHOCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($808.339.158).

Entre las funciones principales de esta Interventoría está el velar porque el contratista de obra cumpla estrictamente con el cronograma de ejecución, respetando las especificaciones técnicas generales y especiales de construcción, incluyendo las obligaciones de ley en materia de transparencia y las responsabilidades descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. La información aquí consignada hace referencia a los estudios previos, anexos técnicos del proyecto y la normativa de habilitación de servicios de salud que rige para la entidad en el municipio de Popayán, Cauca.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA POPAYÁN E.S.E.", tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos vigentes y cumplir eficazmente su rol dentro de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta a las necesidades de modernización institucional para el Hospital Susana López de Valencia E.S.E., en el que se evidencia la necesidad técnica de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y áreas administrativas. Esto permitirá dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco del fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y, paralelamente, optimizar los procesos de gestión interna a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento de la planta física hospitalaria, según el proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El Hospital oferta sus servicios a la población del municipio de Popayán y del Departamento del Cauca, la cual requiere de una infraestructura que garantice la eficiencia, seguridad y oportunidad en la atención. La construcción proyectada, cuya interventoría integral es objeto de este proceso, cuenta con un presupuesto oficial de $808.339.158 y un plazo de ejecución establecido hasta el 31 de agosto de 2026.

La infraestructura proyectada tendrá la capacidad de albergar servicios de consulta externa y áreas administrativas, contemplando el cumplimiento de los estándares de habilitación y las especificaciones técnicas de construcción hospitalaria. La interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica será la encargada de velar por el cumplimiento del cronograma y la calidad de la obra, asegurando que la nueva edificación cumpla con su propósito social y asistencial para la comunidad.

1.1. Localización.

El proyecto de interventoría se sitúa en el casco urbano de la ciudad de Popayán, específicamente en la zona suroriental de la meseta. La intervención técnica y administrativa se llevará a cabo en la sede principal de la E.S.E., cuyas coordenadas y detalles de ubicación se describen a continuación:

Entidad: Hospital Susana López de Valencia Popayán E.S.E.

Dirección: Calle 15 No. 17A – 196.

Municipio: Popayán.

Departamento: Cauca.



El área de intervención corresponde a los terrenos destinados para la "Construcción de la Planta Física para la Reubicación de Servicios de Consulta Externa y Áreas Administrativas". Debido a la altitud de la ciudad (aprox. 1.737 m.s.n.m.) y su clima templado, las actividades de interventoría de obra deberán considerar las condiciones de pluviosidad típicas de la meseta de Popayán para el seguimiento estricto de los cronogramas de ejecución física.

2.2 Justificación.

La construcción de la planta física para la reubicación de consulta externa y áreas administrativas del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. se fundamenta en la necesidad de superar las limitaciones funcionales de una infraestructura que no guarda simetría con los estándares de la Resolución 3100 de 2019. Actualmente, la carencia de espacios con accesibilidad universal, ventilación e iluminación natural, sumada a la interferencia operativa entre el servicio de urgencias y las áreas ambulatorias, restringe la capacidad de respuesta institucional ante la creciente demanda del departamento del Cauca. En consecuencia, y bajo el rigor técnico de la normativa NSR-10, RETIE y NTC 1500, este proyecto busca un reordenamiento integral que libere áreas para servicios asistenciales críticos y docencia, asegurando mediante una interventoría técnica que la inversión de $808.339.158 se traduzca en una infraestructura segura, humanizada y funcional antes del 31 de agosto de 2026.

2.3 Características del Proyecto.

Esta convocatoria del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. consiste en la interventoría integral para la construcción de una planta física de dos pisos en Popayán, destinada a la reubicación de servicios de consulta externa y áreas administrativas. El proyecto busca ampliar el portafolio de servicios de tercer nivel para suplir la demanda de alta complejidad, bajo un diseño que optimiza los espacios según la normatividad vigente de la Resolución 3100 de 2019.

La infraestructura contará con 15 consultorios de consulta externa especializada, que abarcan desde medicina interna, pediatría y cirugía general hasta urología y ginecobstetricia. El área de apoyo diagnóstico y terapéutico se fortalecerá con 6 unidades de terapia, incluyendo espacios para fisioterapia con capacidad de 12 pacientes por hora, gimnasio, terapia de lenguaje, fonoaudiología y diagnóstico vascular. El edificio integrará además servicios de medicina nuclear, imágenes diagnósticas no ionizantes y telemedicina, garantizando ambientes normativos para entrevistas y exámenes físicos en todas sus áreas.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1 Contrato de Obra.

CONTRATO N° 384-2025	
Firma contratista	CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LÓPEZ
NIT	902.019.047-1
Objeto del contrato	Construcción de la planta física para la reubicación de servicios de consulta externa y áreas administrativas Hospital Susana López de Valencia Popayán E.S.E.
Valor del Contrato incluido el AIU	$15.668.641.272
Contrato N°	384-2025
Acta de Inicio	09 de marzo de 2026
Plazo inicial estimado	Hasta el 31 de julio de 2026
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026
Registro Presupuestal	1324 del 23 de diciembre de 2025
Imputación Presupuestal	CDP 432 del 15 de septiembre de 2025

Tabla 1. Contrato de obra

3.2 Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°41-44-101300974. Anexo 1	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	09-marzo- 2026	17-abril-2027	$ 3.133.728.254,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	09-marzo- 2026	15-octubre-2029	$ 783.432.063,60
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		$ 1.566.864.127,20

Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3 Contrato de Interventoría

CONTRATO N° 101-2026	
Firma contratista	CONSORCIO INTERVENTORÍA ADN – ASTAIZA
NIT	902044484-2
Objeto del contrato	Interventoría de la obra "Construcción de la planta física para la reubicación de servicios de consulta externa y áreas administrativas Hospital Susana López de Valencia Popayán E.S.E."
Valor del Contrato incluido el AIU	$808.339.158,00
Contrato N°	101 de 2026
Acta de Inicio	09 de marzo de 2026
Plazo inicial estimado	Hasta el 31 de julio de 2026
Fecha de Terminación	31 de agosto de 2026
Registro Presupuestal	RP No. 221 del 09 de marzo de 2026
Imputación Presupuestal	CDP No. 84 del 05 de enero de 2026

Tabla 5. Contrato de Interventoría

3.4 Pólizas de Interventoría.

Seguros del Estado N°40-44-101065501.	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	09-marzo- 2026	28-febrero-2027	$ 161.667.832
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	09-marzo- 2026	31-agosto-2029	$ 40.416.958
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		$ 161.667.832

Tabla 6. Pólizas de Interventoría

Anexo 2. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual Interventoría de obra.

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo del 09 DE MARZO DE 2026 al 25 DE MARZO DE 2026.

4.1 Gestión Administrativa

4.1 Personal de Interventoría

CARGO	**PROFESIONAL**
Director	Julián Miguel Londoño Castrillon
Apoyo/Director	Zulena Añazco
Dedicación 30%	
Residente	Carlos Andrés Martínez Vallejo
Inspector General	Francisco Fernando Astaiza Valencia
Auxiliar Interventoría	Jair Andrés Sabogal Ciro
Dedicación 100%	
Inspector de Instalaciones Técnicas	Jesús Ernesto Sarria Astaiza
Dedicación 90%	
Especialista en estructuras	Diego Fernando Ruiz Muñoz
Especialista Ingeniería Eléctrica	Luis Mario Dávila Rocha
ingeniero Mecánico	Felipe González Gamboa
Dedicación 50%	
Topógrafo	Rómulo Ancizar Enríquez Tello
Dedicación 90%	

Tabla 7. Personal de Interventoría

4.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	**PROFESIONAL**
Director de obra	Pablo Enrique torres
Dedicación 100%	
Director de obra	María Isabel Valencia
Dedicación 50%	
Residente de Obra	Natalia Rivera vergara
Inspector de Obra	Kevin mendez
SISOMA	Yesica Idrobo
Dedicación 100%	

Tabla 8. Personal del contratista de obra.

4.3 Comités de obra.

Durante el periodo se realizó un (1) comité técnico de seguimiento realizados por la interventoría, el contratista.

COMITÉ	**FECHA**
COMITÉ DE OBRA	18-03-2026

Tabla 9. Actas de comité

Anexo 3. Acta de comité de obra

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe. el comité técnico del periodo del 18 de marzo 2026 se llevó a cabo con la presencia del contratista de obra, y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos del proyecto en cuestión, en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

4.4 Correspondencia

Se presenta la correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el periodo del 05 de marzo de 2026 al 25 de marzo de 2026.

Correspondencia mensual

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO DE INTERVENTORIA 101 DEL 09 DE MARZO DE 2026. INTERVENTORÍA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA POPAYÁN E.S.E.	ADN ASTAIZA CONSORCIO

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
11/03/2026	CHSLV-001-2026	PRIORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS	CONSORCIO ADN ASTAIZA	CONSORCIO HOSPITAL SUSANA		X		
20/03/2026	-	SOLICITUD DE APROBACION DE CAMBIO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA-CTO.101-2026	CONSORCIO ADN ASTAIZA	INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SUSANA LOPEZ	X			
21/03/2026	HSLV-001-2026	TRASLADO DE REQUERIMIENTO TÉCNICO Y SOLICITUD DE MATERIALES PARA REUBICACIÓN URGENTE DE CASETA DE PUNTO DE PAGO	CONSORCIO ADN ASTAIZA	INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SUSANA LOPEZ		X		
24/03/2026	CHSLV-002-2026	RECOMENDACIONES TÉCNICAS MEDIDAS DE MOVILIDAD VITAL Y AJUSTE OPERATIVO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	CONSORCIO ADN ASTAIZA	CONSORCIO HOSPITAL SUSANA	X			
25/03/2026	-	SOLICITUD DE APROBACION DE CAMBIO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR Y ORDEN PUBLICO	CONSORCIO ADN ASTAIZA	INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SUSANA LOPEZ	X			

4.3 Gestión Técnica

4.3.1 Avance de obra

Informe mensual de Avance de Obra

Periodo: 09 de marzo del 2026 al 25 de marzo de 2026.

En el periodo comprendido entre el 09 de marzo del 2026 al 25 de marzo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades en obra:

1. Actividades Finalizadas

Estas tareas ya han sido completadas y cuentan con soporte en memorias de cantidades:

Cerramiento Perimetral: 285.9 ML (Ejecutado en Yute y Guadua).

Localización y Replanteo: 2409.89 M2.

Descapote Terreno a Máquina: 2041.04 M2.

Campamento (Oficina, Almacén, Baños): 1 Global.

Excavación Tubería Pluvial 8": 69.02 M3.

Excavación Tubería Sanitaria 6": 53.32 M3.

Instalación de Entibados (8" y 6"): 223.65 M2.

Instalación de Material Granular (Cama y Atraque): 18.48 M3.

Construcción Remate Tubería Pluvial (Aletas): 1 Global.

Recámara para Tubería Sanitaria (Encofrado y Fundición): 1 Global.

2. Actividades en Ejecución (En Curso)

Tareas que presentan avance parcial y requieren seguimiento cercano:

Demolición Caseta Parking (95%): Estructura finalizada; queda pendiente la demolición de los pisos.

Conformación y Nivelación de Subrasante (85%): Pendiente zona posterior por temas de estabilidad.

Instalación Tubería 8" Pluvial (40%): Ejecutada en zona de campamentos y vía. Pendiente confirmación de área.

Lleno para Excavaciones Tubería 8" y 6" (40%): Sincronizado con la instalación de la tubería.

Instalación Tubería 6" Pluvial - Drenajes (40%): Pendiente confirmación de área de proyecto.

Reubicación y Fundición Caseta Parking (35%): En proceso de obra civil/cimentación.

NOTA TÉCNICA

Verificación Topográfica

Como parte de las actividades de control y seguimiento técnico, la Interventoría delegó una comisión topográfica encargada de realizar el levantamiento y validación en sitio. Esta gestión tuvo como objetivo primordial verificar con precisión las cotas de cimentación y tener

plena certeza sobre los volúmenes de movimientos de tierra (descapote y excavaciones) ejecutados por el contratista durante el presente periodo, asegurando la correspondencia con los diseños originales del proyecto. Esta Interventoría verificó que el proceso de excavación respetó los ángulos de fricción interna sugeridos en el informe de suelos, garantizando la estabilidad de los taludes provisionales y la seguridad del personal en obra."







Topografía – 20 marzo de 2026

CONCLUSIONES – COMPONENTE TÉCNICO

El proyecto registra un inicio de obra satisfactorio, con el cumplimiento del 100% en preliminares (cerramiento, descapote y replanteo); no obstante, el avance en redes

hidrosanitarias y excavaciones está supeditado a la entrega de la cartilla topográfica y a la validación de niveles. Técnicamente, la estabilidad de la estructura dependerá de la correcta ejecución de la elevación de la cota cero en 20 cm

4.3.2 Bitácora

Durante el periodo comprendido entre el 9 y el 25 de marzo de 2026, se ejerció un seguimiento estricto a la ejecución del Contrato de Obra No. 384 de 2025, verificando que la bitácora de obra refleje con precisión las actividades preliminares, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones de seguridad en los frentes de trabajo. Se han consignado observaciones fundamentales respecto a la estabilidad del terreno tras el hallazgo de nivel freático a 1.50 m, instruyendo al contratista a implementar un solado de limpieza de 10 cm y a elevar el nivel cero del proyecto en 20 cm para mitigar riesgos de inundación, asegurando que los inconvenientes menores detectados fueran gestionados mediante estrategias de reprogramación para no afectar la ruta crítica del cronograma. Asimismo, se deja constancia de la viabilidad técnica del proyecto supeditada al cumplimiento riguroso de estas recomendaciones y a la consolidación documental de los componentes ambiental y de salud ocupacional para el próximo ciclo mensual.

Registro Fotográfico











5. SEGURIDAD SOCIAL

En el marco de la ejecución del proyecto, la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral constituye un requisito obligatorio e indispensable para el inicio de actividades por parte del personal vinculado a la obra. En este sentido, ningún trabajador podrá ingresar ni desarrollar labores sin contar con afiliación activa a los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales.

El contratista garantiza la gestión, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad legal vigente, asegurando la afiliación y el pago oportuno de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, incluyendo entidades de salud (EPS), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y fondos de pensiones (AFP), para la totalidad del personal vinculado al proyecto.

Por su parte, la interventoría realiza seguimiento permanente a dichos procesos, verificando la trazabilidad, vigencia y consistencia de las afiliaciones y aportes, con el fin de mitigar riesgos legales y laborales asociados al incumplimiento de estas obligaciones.

La documentación soporte correspondiente a las afiliaciones y pagos de seguridad social se encuentra debidamente organizada, sistematizada y archivada en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando su disponibilidad para procesos de auditoría y control.

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividades realizadas del SG-SST.

En el desarrollo del proyecto, se implementan actividades propias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientadas a la identificación, evaluación y control de los peligros, con el propósito de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mitigar impactos que puedan afectar la integridad del personal operativo, administrativo y usuarios del servicio de salud.

A continuación, se relacionan las principales actividades ejecutadas:

Planeación y diagnóstico inicial:

Ejecución de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, estableciendo los respectivos controles operacionales.

Verificación de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral:

Revisión y validación del estado de afiliación del personal a EPS, ARL, AFP y caja de compensación familiar, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

Implementación del Plan de Emergencias:

Definición, socialización y señalización de rutas de evacuación, puntos de encuentro y protocolos de respuesta ante emergencias, acorde con las condiciones del proyecto.

Capacitación y fortalecimiento de competencias:

Desarrollo de jornadas de formación y sensibilización en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo el uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) y prácticas seguras en obra.

Control operativo en obra:

Supervisión permanente de las condiciones de trabajo, verificando el cumplimiento de los estándares de seguridad en actividades constructivas.

Control de accesos

Implementación de medidas de restricción y control para el ingreso y tránsito del personal de obra, con el fin de evitar interferencias y exposición de riesgo.

Gestión de reportes e indicadores:

Registro, seguimiento y análisis de inspecciones, actos y condiciones inseguras, incidentes y accidentes laborales, con el fin de establecer acciones correctivas y preventivas.

7. PERSONAL OBRA – ADMINISTRATIVO

7.1 Personal de Obra

La interventoría verifica el cumplimiento técnico, contractual y de seguridad del proyecto, revisando la calidad de las actividades ejecutadas, el avance de obra y el uso adecuado de los recursos, con el fin de garantizar el desarrollo correcto de las labores.

RELACION MANO DE OBRA MES DE MARZO					
	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE CEDULA	CARGO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INGRESO
1	EDAUARD PANEZO YONDA	76333351	CONTRA MAESTRO	OBRA LABOR	9/03/2026
2	YESSICA GABRIELA ARIAS MARTINEZ	1061738318	AYUDANTE DE OBRA	OBRA LABOR	9/03/2026
3	ANDRES FELIPE MALES MALES	1002956130	AYUDANTE DE OBRA	OBRA LABOR	9/03/2026
4	JOSE JESUS CAMAYO	4641168	AYUDANTE DE OBRA	OBRA LABOR	9/03/2026
5	EVER FERNANDO IBARRA PEÑA	76311618	OFICIAL DE CONSTRUCCION	OBRA LABOR	9/03/2026
6	ANDRES FELIPE MUÑOZ ORDOÑEZ	76329028	AYUDANTE DE OBRA	OBRA LABOR	9/03/2026
7	YONATAN CARRILLO ARAGON	1006003652	AYUDANTE DE OBRA	OBRA LABOR	9/03/2026
8	EDUARDO CALIBIO	1061710110	AYUDANTE DE OBRA	OBRA LABOR	9/03/2026
9	FIDEL JIMENEZ LOPEZ	4695670	AYUDANTE DE OBRA	OBRA LABOR	9/03/2026
10	EDGAR EDUARDO DE LA OSSA PINTO	1061688666	OFICIAL DE CONSTRUCCION	OBRA LABOR	9/03/2026
11	LEIDER WILFREDO VELASCO CERON	4615913	AYUDANTE DE OBRA	OBRA LABOR	9/03/2026
12	DIOGENES PALECHOR	76249522	AYUDANTE DE OBRA	OBRA LABOR	9/03/2026

7.2 Personal Administrativo

RELACION PERSONAL ADMINISTRATIVOS					
	NOMBRE COMPLETO	**NUMERO DE CEDULA**	**CARGO**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INGRESO**
1	KEVIN ALEXANDER MENDEZ MOMPOTES	1061815851	INSPECTOR	OBRA LABOR	9/03/2026
2	INGRIT NATALIA RIVERA VERGARA	1061812212	INGENIERA RESIDENTE	OBRA LABOR	9/03/2026
3	SANTIAGO PAZ	1002964017	ELECTRICO	OBRA LABOR	9/03/2026
4	YESICA KATERINE IDROBO PISAMINA	1061787848	SISOMA	OBRA LABOR	9/03/2026
5	ANYI VIVIANA PEÑA MAMIAN	1061731781	ALMACENISTA	OBRA LABOR	9/03/2026
6	NELSON OVARINO MACIAS IJAJI	4633400	OFICIOS VARIOS	OBRA LABOR	9/03/2026

RELACION PERSONAL DE OBRA PRESTACION DE SERVICIOS					
	NOMBRE COMPLETO	**NUMERO DE CEDULA**	**CARGO**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INGRESO**
1	JHON JAIRO PANEZO YONDA	4613345	MAESTRO DE OBRA	PRESTACION	9/03/2026
2	PABLO TORRES	4611917	DIRECTOR DE OBRA	PRESTACION DE SERVICIOS	9/03/2026
3	MARIA ISABEL VALENCIA PEÑA	34556930	DIRECTORA DE OBRA	PRESTACION DE SERVICIOS	9/03/2026

8. ENTREGA DE EPP

La interventoría realiza la verificación de la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal de obra, asegurando que cada trabajador cuente con los implementos requeridos según su labor. Asimismo, revisa el uso adecuado, el estado de los EPP y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir riesgos y garantizar condiciones seguras en la ejecución de las actividades.

9. CAMPAMENTO

El campamento de obra corresponde a las instalaciones temporales destinadas al apoyo operativo y administrativo, cuya adecuación y condiciones son verificadas por la interventoría conforme a la normatividad vigente.





10. MAQUINARIA Y/O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

La interventoría verifica y revisa el cumplimiento en el uso adecuado de la maquinaria y equipos empleados en la obra, asegurando que se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, con los mantenimientos al día y operados por personal autorizado. Asimismo, se valida que su utilización cumpla con las especificaciones técnicas y las normas de seguridad y salud en el trabajo, garantizando así la correcta ejecución de las actividades y la prevención de riesgos.





11. INSPECCIÓN DE OBRA

La interventoría realiza inspecciones periódicas en obra con el fin de verificar el estado y uso adecuado de la maquinaria y equipos empleados en la ejecución de las actividades. Durante estas inspecciones, se valida que los equipos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, cuenten con los mantenimientos requeridos y sean operados por personal autorizado.

Asimismo, se revisa el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, identificando posibles riesgos o fallas, y generando las recomendaciones necesarias para garantizar la correcta operación y prevenir incidentes en obra.





12. PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

En el marco de la ejecución del proyecto, se implementa el Programa de Orden y Aseo como medida de control orientada a la prevención de riesgos laborales y al mantenimiento de condiciones seguras en las áreas intervenidas.

Al finalizar cada jornada laboral, se ejecutan actividades de limpieza general en los frentes de obra y zonas de influencia, garantizando la recolección, clasificación y disposición temporal de los residuos generados durante las actividades constructivas. Dichos residuos son trasladados a un punto de acopio autorizado dentro del campamento, asegurando su manejo conforme a criterios de seguridad y normatividad ambiental vigente.

Adicionalmente, se establece el adecuado almacenamiento de herramientas, equipos menores y materiales, los cuales son organizados y resguardados en áreas designadas dentro del campamento, con el fin de evitar pérdidas, deterioro y la generación de condiciones inseguras en el entorno de trabajo.

La interventoría realiza seguimiento periódico a la implementación de estas actividades, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos y emitiendo las recomendaciones necesarias para la mejora continua del programa, en concordancia con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

13. SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO PERIMETRAL

La interventoría verifica la correcta instalación y mantenimiento de la señalización y el cerramiento perimetral en la obra, con el fin de garantizar la delimitación adecuada de las áreas de trabajo y la seguridad de trabajadores, usuarios y terceros. Se revisa que la señalización sea visible, suficiente y acorde con los riesgos presentes, así como que el cerramiento se encuentre en buen estado y cumpla con su función de restringir el acceso a personal no autorizado.

Asimismo, se valida el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, asegurando condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.





14. RECOMENDACIONES

Seguir implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015.

- Continuar con el proceso de sensibilización a los trabajadores para una nueva cultura de prevención e identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo.
- Uso obligatorio de elementos de protección personal EPP.
- Capacitación continua del personal.
- Señalización y demarcación de áreas de riesgo.
- Mantenimiento de equipos y herramientas.
- Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
- Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Juan Miguel Londoño Astaiza.
Aprobó: Representante legal Consorcio ADN ASTAIZA

ANEXOS

Anexo 1. Póliza y Responsabilidad civil extracontractual contratista de obra

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101300974	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	23	12	2025	00:00	31	07	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ	NIT: 902.019.047-1	PARCELACION GENAGRA	POPAYAN, CAUCA	3146166972

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.501.676-1	CL 15 N 17 A 196	POPAYAN, CAUCA	8211721

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 384 DEL 2025, QUE TIENE COMO OBJETO:

CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA PARA LA REUBICACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y AREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA POPAYAN E.S.E.

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS:
-HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, NIT: 891501676-1
-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, NIT: 900474727-4

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 09/03/2026 AL CONTRATO No. 384 DEL 2025. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ (31,680,704.00)	$ ****(25,000.00)	$ *(6,024,083.00)	$ ******(37,729,788.00)	$ **(8,617,752,699.60)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

41-44-101300974
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Victor S. Parra

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF225483B 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101300974	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	23	12	2025	00:00	31	07	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ			**NIT: 902.019.047-1**
DIRECCIÓN: PARCELACION GENAGRA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA		**TELÉFONO:** 3146166972

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**NIT: 891.501.676-1**
DIRECCIÓN: CL 15 N 17 A 196	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA		**TELÉFONO:** 8211721

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PARRA JURADO VICTOR GABRIEL	10536855-8	1.00
GRECOSSUR GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL	901335619-5	1.00
VP CONSTRUCTORA SAS	901702288-5	28.00
GRUPO EMPRESARIAL TM SAS	901592775-7	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101300974

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF225483B 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101300974	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	09	03	2026	00:00	15	10	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ	NIT: 902.019.047-1	PARCELACION GENAGRA	POPAYAN, CAUCA	3146166972

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.501.676-1	CL 15 N 17 A 196	POPAYAN, CAUCA	8211721

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 384 DEL 2025, QUE TIENE COMO OBJETO:

CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA PARA LA REUBICACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y AREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA POPAYAN E.S.E.

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS:
-HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, NIT: 891501676-1
-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, NIT: 900474727-4

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/03/2026	17/04/2027	$3,133,728,254.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/03/2026	15/10/2029	$783,432,063.60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15/10/2026	15/10/2031	$1,566,864,127.20	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	09/03/2026	17/04/2027	$3,133,728,254.40	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 09/03/2026 AL CONTRATO No. 384 DEL 2025. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **31,680,704.00	$ ******25,000.00	$ ***6,024,083.00	$ ********37,729,788.00	$ ****8,617,752,699.60	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101300974
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Victor S. Parada

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101300974	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	03	2026	09	03	2026	00:00	15	10	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ		NIT: 902.019.047-1	
DIRECCIÓN: PARCELACION GENAGRA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3146166972

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.501.676-1	
DIRECCIÓN: CL 15 N 17 A 196	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8211721

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PARRA JURADO VICTOR GABRIEL	10536855-8	1.00
GRECOSSUR GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL	901335619-5	1.00
VP CONSTRUCTORA SAS	901702288-5	28.00
GRUPO EMPRESARIAL TM SAS	901592775-7	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


41-44-101300974

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483B 2

Anexo 2. Póliza y Responsabilidad civil extracontractual Interventoría de obra

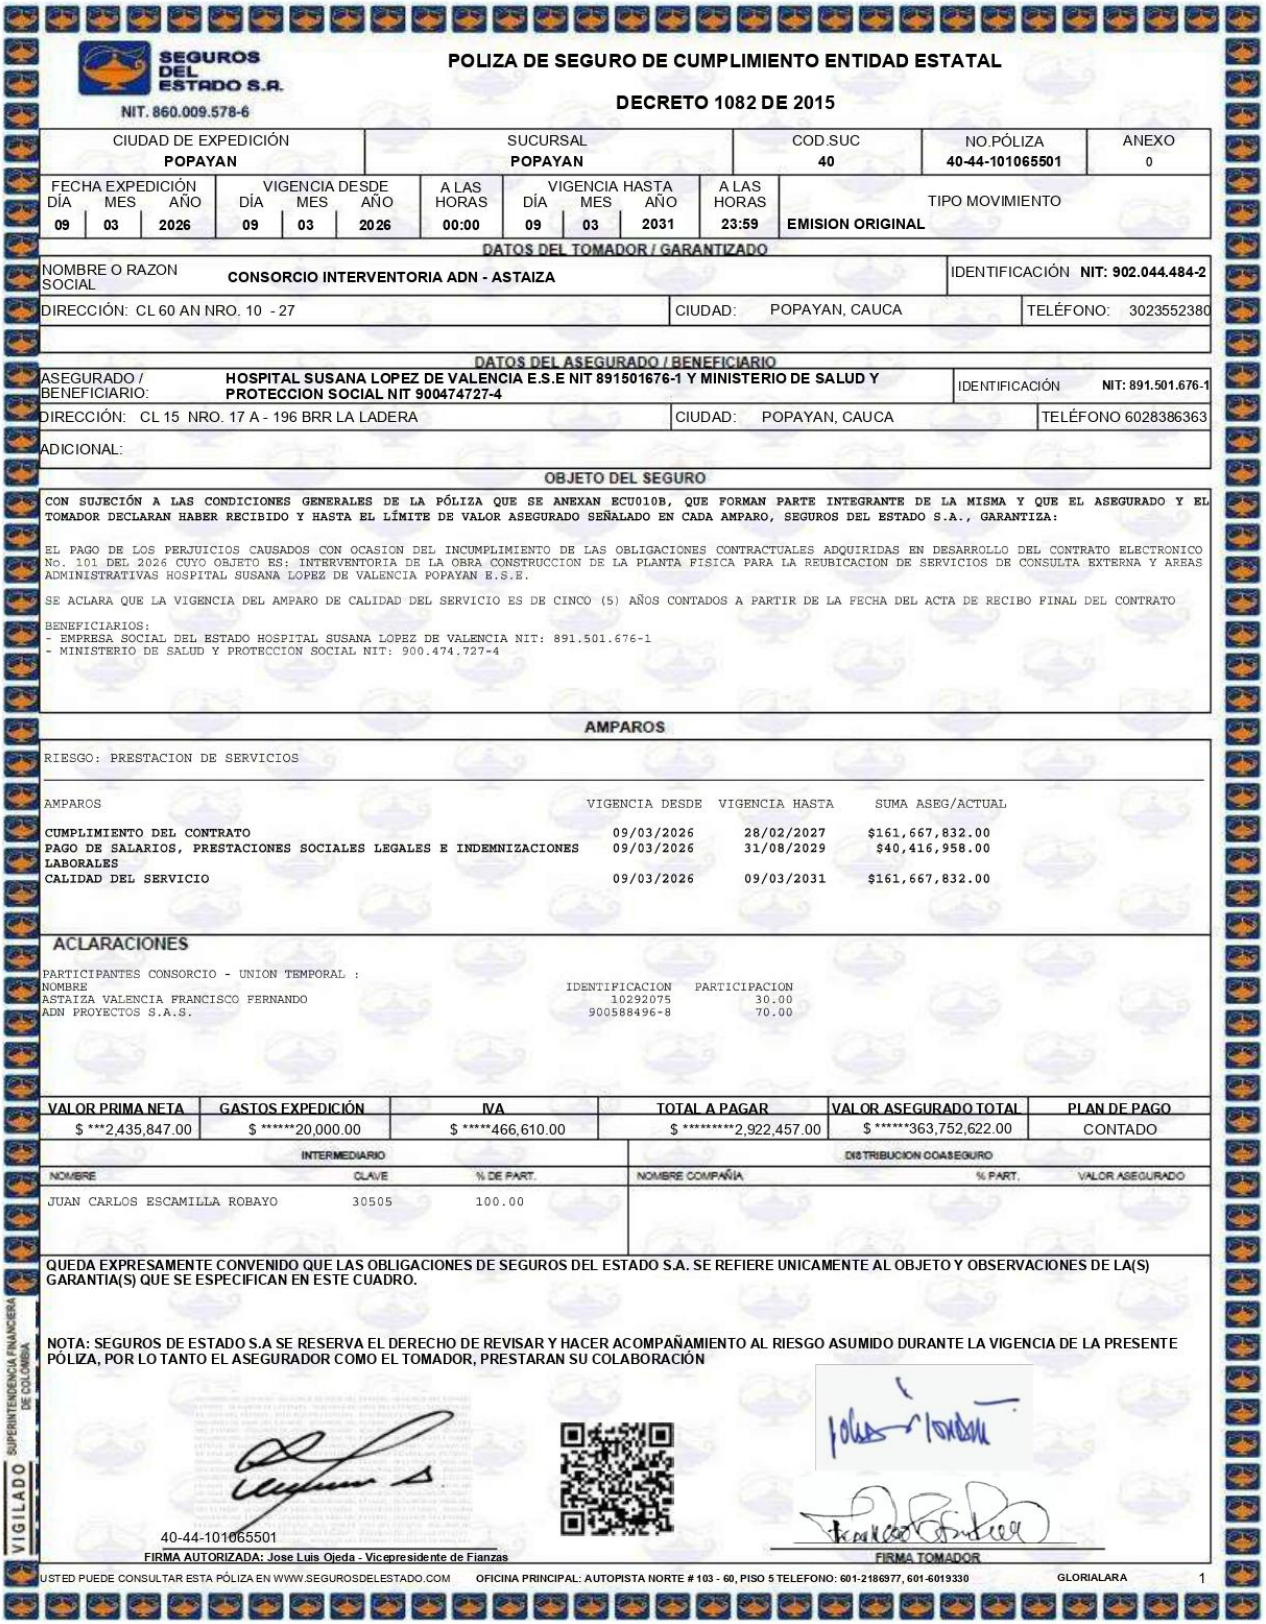

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
POPAYAN	POPAYAN	40	40-44-101065501	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	03	2026	09	03	2026	00:00	09	03	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVENTORIA ADN - ASTAIZA	NIT: 902.044.484-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 60 AN NRO. 10 - 27	POPAYAN, CAUCA	3023552380

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E NIT 891501676-1 Y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT 900474727-4	NIT: 891.501.676-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 NRO. 17 A - 196 BRR LA LADERA	POPAYAN, CAUCA	6028386363

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 101 DEL 2026 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA PARA LA REUBICACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y AREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA POPAYAN E.S.E.

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO

BENEFICIARIOS:
- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA NIT: 891.501.676-1
- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT: 900.474.727-4

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/03/2026	28/02/2027	$161,667,832.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/03/2026	31/08/2029	$40,416,958.00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/03/2026	09/03/2031	$161,667,832.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ASTAIZA VALENCIA FRANCISCO FERNANDO	10292075	30.00
ADN PROYECTOS S.A.S.	900588496-8	70.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,435,847.00	$ ******20,000.00	$ *****466,610.00	$ ********2,922,457.00	$ ******363,752,622.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JUAN CARLOS ESCAMILLA ROBAYO	30505	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

40-44-101065501
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 GLORIALARA 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
POPAYAN	POPAYAN	40	40-44-101065501	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	03	2026	09	03	2026	00:00	09	03	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO INTERVENTORIA ADN - ASTAIZA	NIT: 902.044.484-2	3023552380

DIRECCIÓN: CL 60 AN NRO. 10 - 27 — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E NIT 891501676-1 Y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT 900474727-4	NIT: 891.501.676-1	6028386363

DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 17 A - 196 BRR LA LADERA — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,435,847.00	$ ******20,000.00	$ *****466,610.00	$ *********2,922,457.00	$ ******363,752,622.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JUAN CARLOS ESCAMILLA ROBAYO	30505	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11009103729087(3900)000002922457(96)20270309

REFERENCIA PAGO: 1100910372908-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Anexo 3. Acta de comité de obra

CONSORCIO HOSPITAL Susana López	**ACTA DE REUNIÓN - COMITES**	F02 – CHSL – AR Versión 01 – 2026

REUNIÓN INSTITUCIONAL	☐	REUNIÓN DE CAPACITACIÓN:	☐		
REUNIÓN INTERVENTORIA	☐	REUNIÓN COMITÉ VEEDOR O TECNICO:	☒	HORA DE INICIO:	3:00PM
REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	☐	OTRA:		HORA FINALIZACIÓN:	4:00 PM

OBJETO:	Realizar recorrido técnico en la obra con el fin de verificar las condiciones del suelo, debido a las diferentes situaciones evidenciadas durante las actividades de excavación, así como confirmar las condiciones del material de relleno a utilizar.
LUGAR:	**FRENTE DE OBRA HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA**

ORDEN DEL DÍA	
1. Verificación de asistentes	
2. Recorrido por la obra	
3. Verificación zona de apiques	
4. Revisión diseños en planos	
5. Cierre del recorrido	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Siendo las 3:00 p.m. del día 18 de marzo de 2026, se realiza recorrido técnico en la obra con la participación del equipo anteriormente relacionado, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales del suelo en las zonas intervenidas durante el proceso de excavación.

Durante la inspección, se evidenció que el suelo presenta condiciones asociadas a la presencia de nivel freático a una profundidad aproximada de 1.50 metros respecto al nivel 0 del proyecto.

CONCLUSIONES TÉCNICAS

El ingeniero especialista en suelos manifestó que:

- La presencia del nivel freático identificado no representa inconveniente estructural, teniendo en cuenta que:
  - No se alcanzará dicha profundidad en la ejecución del proyecto.
  - Las cargas estructurales proyectadas son bajas.
- En consecuencia, **no se requiere la implementación de rellenos excesivos.**

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Se establecen las siguientes recomendaciones:

- Ejecutar un solado de concreto de 10 cm en las vigas de cimentación.
- En los puntos donde se evidencien fallas del suelo, realizar mejoramiento mediante la colocación de subbase.
- A partir de información suministrada por la comunidad aledaña (vecinos del sector), quienes manifiestan que la vía contigua presenta problemas de inundación, se recomienda:
  - Elevar el nivel 0 del proyecto en 20 cm, con el fin de prevenir posibles afectaciones futuras por acumulación de agua que puedan comprometer la estructura.

CONCLUSIÓN GENERAL

Con base en las condiciones verificadas y las recomendaciones emitidas por el especialista en suelos, se concluye que es viable continuar con las actividades de obra, siempre y cuando se implementen las medidas técnicas aquí establecidas.

Se deja en constancia la viabilidad por parte de la interventoría y que es de su conocimiento las apreciaciones por parte del Ingeniero German Cujar

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Remisión por parte del Ing. Germán Cujar de un documento técnico en el que se consoliden y formalicen las recomendaciones emitidas durante la visita en sitio a la obra.	Ing German Cujar – Ing Maria Isabel	

FIRMAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ingeniero German Cujar	Especialista en suelos	
Ingeniero Pablo Torres	Director de obra 1	
Ingeniera María Isabel Valencia	Directora de obra 2	
Ingeniera Natalia Rivera	Ingeniera residente de obra	Natalia Rivera V.
Kevin Méndez	Inspector de obra	Kevin Mendez
Arquitecta Zulena	Interventoría	Zulena. A. Arizco. C.
Jhon Panezo	Maestro de Obra	

Proyecto: Yesica Idrobo – Ingeniera y apoyo administrativo /Reviso: Natalia rivera – Ingeniera residente /Aprobó: Pablo Torres – director de Obra


Anexos


REGISTRO FOTOGRAFICO







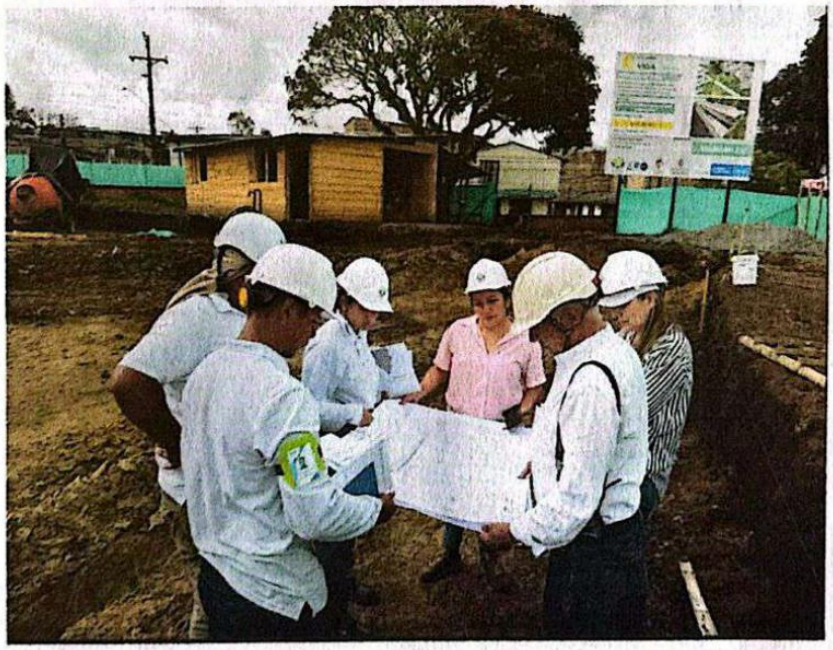

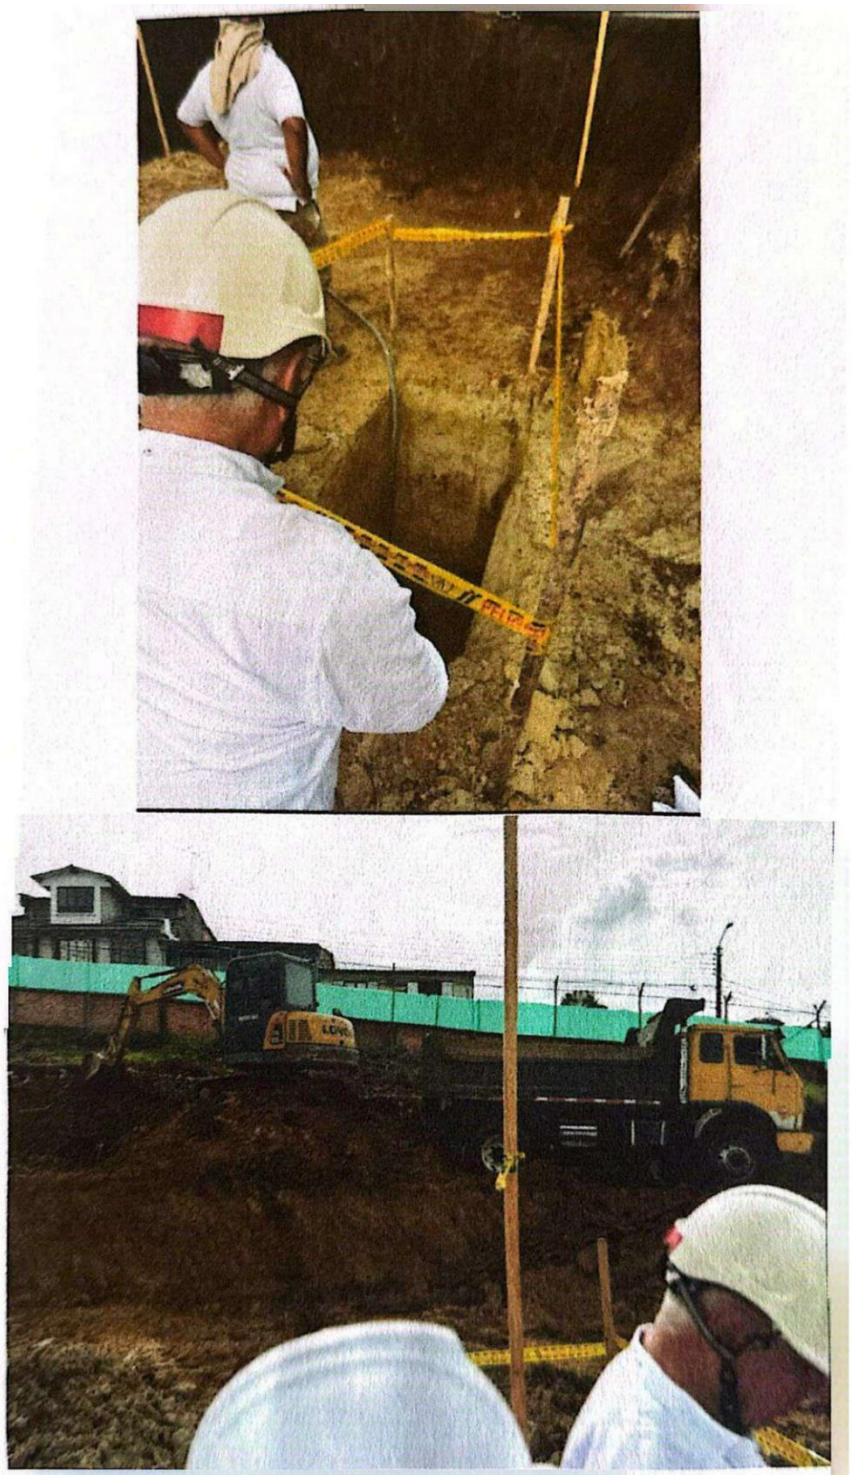

Anexo 4. Concepto Estudio de Suelos

GEOCONSULTA LTDA

ING. GERMAN CUJAR CHAMORRO
MASTER EN MECANICA DE SUELOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
Carrera 17 # 48N - 128 Casa 42
CEL 310 8315444
POPAYÁN - COLOMBIA

Se verifico que el suelo presente en el sitio, es un suelo fino limoso con alta compresibilidad y plasticidad (MH) posee una capacidad portante baja, son suelos de retención de agua alta, se encontró nivel freático a partir de los 1.50 m de profundidad del nivel de implantación (0.00), las condiciones Geotécnicas del terreno disminuyen a media que se profundizan las excavaciones, observaciones hechas mediante la inspección de (5) cinco apiques realizados hasta 1.50 m de profundidad por debajo del nivel de cimentación de la losa de piso, las observaciones anteriores coinciden plenamente con lo estipulado en el estudio de suelos inicial.

2. HALLAZGOS EN APIQUES Y NIVEL FREÁTICO

Durante la inspección de los (5) cinco Apiques realizados con retroexcavadora a una profundidad de 1.50m por debajo del nivel de la cota de implantación, es importante señalar que:

- El terreno ya cuenta con las excavaciones de nivelación previas.
- Se detectó la presencia de nivel freático a los 1.50 de profundidad respecto al nivel 0,0

3 RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN Y SUELO:

Textualmente según el estudio de suelos presenta lo siguiente:

8.0. PROFUNDIDAD DE DESPLANTE

La cimentación se desplantará superficialmente, sobre el suelo clasificado como MH una profundidad de 0.7m tomando como cero la cota del terreno actual.

Se Deberá colocar solado de limpieza de espesor 10cms para evitar remoldeo del suelo al igual que treinta (30)cms de material de sub-base tipo Invias por debajo del solado de limpieza.

9.0. ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES

Dada la consistencia de los suelos, las excavaciones para obras sub-terraneas deben ser a corto plazo que son estables, a largo plazo la estabilidad de esta, se disminuye considerablemente por cambios de contenido de humedad, movimientos externos, trafico etc. Por lo cual las excavaciones mayores de 1.0m de profundidad se deben entibar o apuntalar adecuadamente.

- Se avala el retiro del material orgánico, labor que ya fue realizada, en muchas partes del lote.
- Respecto al solado de limpieza, se colocará únicamente para la cimentación de vigas, losas y muros de contención, utilizando un espesor de 10 cm.

GEOCONSULTA LTDA

ING. GERMAN CUJAR CHAMORRO
MASTER EN MECANICA DE SUELOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
Carrera 17 # 48N - 128 Casa 42
CEL 310 8315444
POPAYÁN - COLOMBIA

- Tan solo debajo de las vigas de la losa colocar 30 cm de subbase.
- Protección Hidráulica: Es imperativo instalar filtros en el trasdós de todos los muros de contención para prevenir filtraciones hacia la edificación. Estos deben estar debidamente conectados al sistema de drenaje de aguas lluvias.
- Cota de Inundación: Se recomienda establecer el nivel 0,0 de la edificación al menos 20 cm por encima de la cota de inundación de la vía.
- El diseño hidrosanitario actual contempla la implementación de un filtro tipo "espina de pescado" bajo la losa de piso, conectado al sistema pluvial para garantizar la estabilidad del terreno y prevenir asentamientos.

  Se requiere revisar el método de implementación del drenaje pluvial bajo placa.


  El diseño actual es de difícil ejecución dada la configuración de las vigas de cimentación, que fragmentan el área e impiden la continuidad del filtro tipo "espina de pescado".
- Mantener el diseño original del filtro en forma de espina de pescado, podría derivar en una ejecución deficiente o daños estructurales; por lo tanto, se recomienda como solución técnica la instalación de una Geomembrana Lisa Polímero de Alta Densidad tipo 20 mil, que asegure la protección contra humedades del piso de la Estructura y disminuyan los posibles asentamientos que se pudieran presentar en la losa de piso.

Atentamente,



ING.GERMAN CUJAR CHAMORRO
Cédula 8.300.610
Mat. Prof. 000708 Cauca

Anexo 5. Bitácora

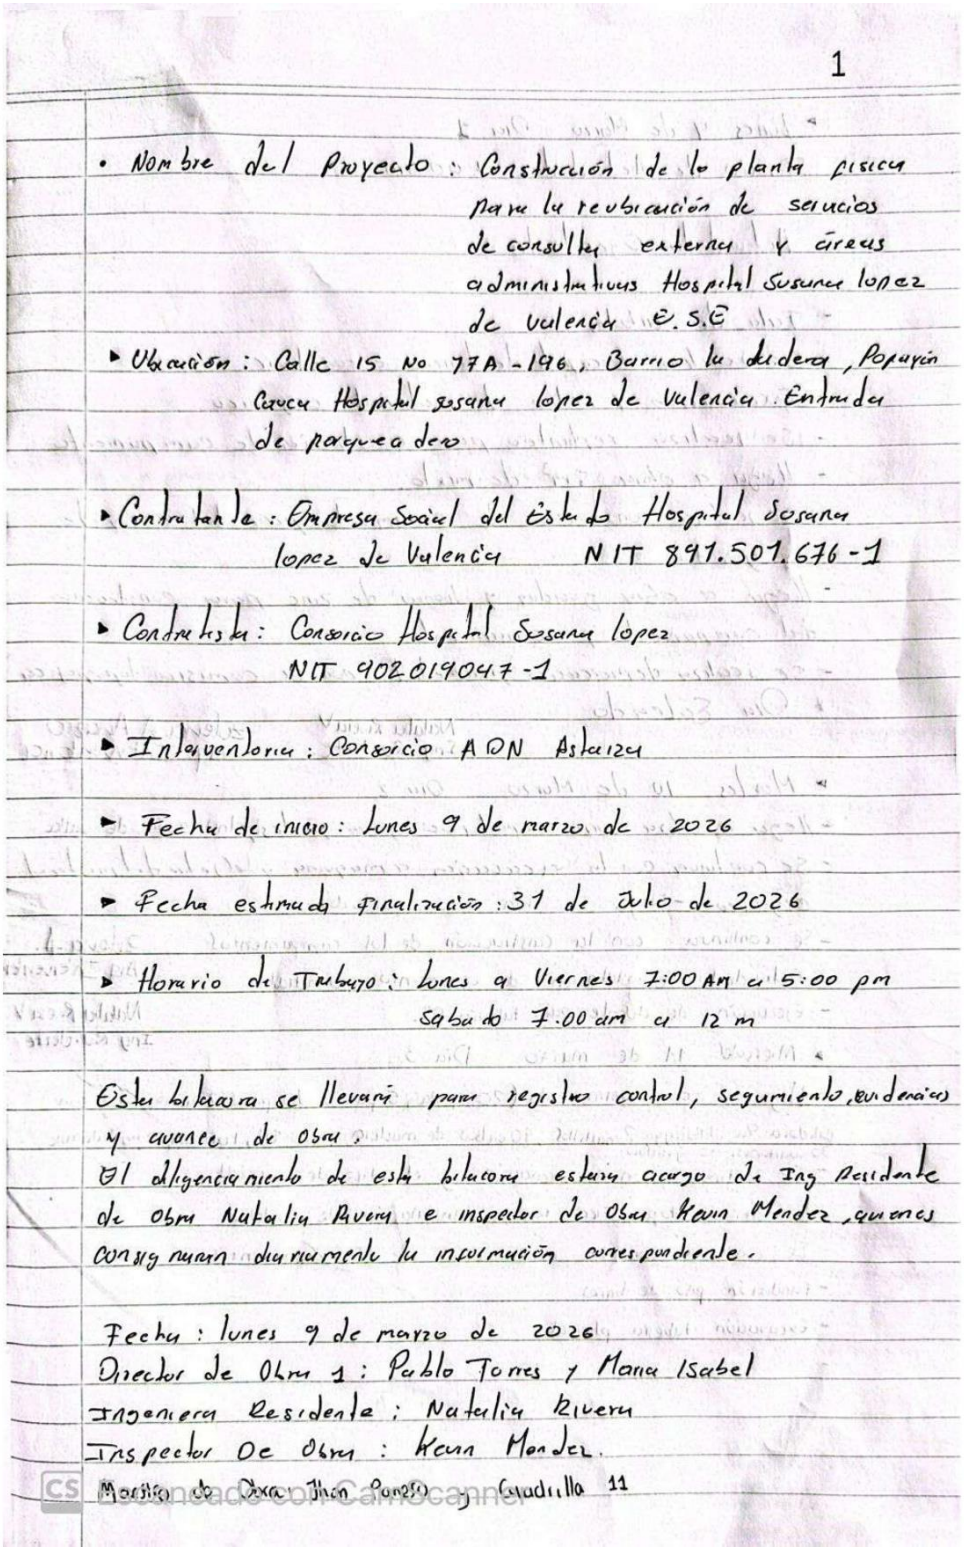


1

- Nombre del Proyecto: Construcción de la planta física para la reubicación de servicios de consulta externa y áreas administrativas Hospital Susana lopez de Valencia E.S.E
- Ubicación: Calle 15 No 77A-196, Barrio la ladera, Popayán Cruce Hospital susana lopez de Valencia. Entrada de parqueaderos
- Contratante: Empresa Social del Estado Hospital Susana lopez de Valencia NIT 891.501.676-1
- Contratista: Consorcio Hospital Susana lopez NIT 902019047-1
- Interventoria: Consorcio ADN Astaiza
- Fecha de inicio: Lunes 9 de marzo de 2026
- Fecha estimada finalización: 31 de Julio de 2026
- Horario de Trabajo: Lunes a Viernes 7:00 AM a 5:00 pm
  Sabado 7:00 am a 12 m

Esta bitacora se llevara para registro control, seguimiento, evidencias y avance de obra.
El diligenciamiento de esta bitacora estara a cargo de Ing Residente de Obra Natalia Rivera e inspector de Obra Kevin Mendez, quienes consignaran diariamente la informacion correspondiente.

Fecha: lunes 9 de marzo de 2026
Director de Obra 1: Pablo Torres y Maria Isabel
Ingeniera Residente: Natalia Rivera
Inspector de Obra: Kevin Mendez.
Maestro de Obra: Jhon Pancho y Cuadrilla 11

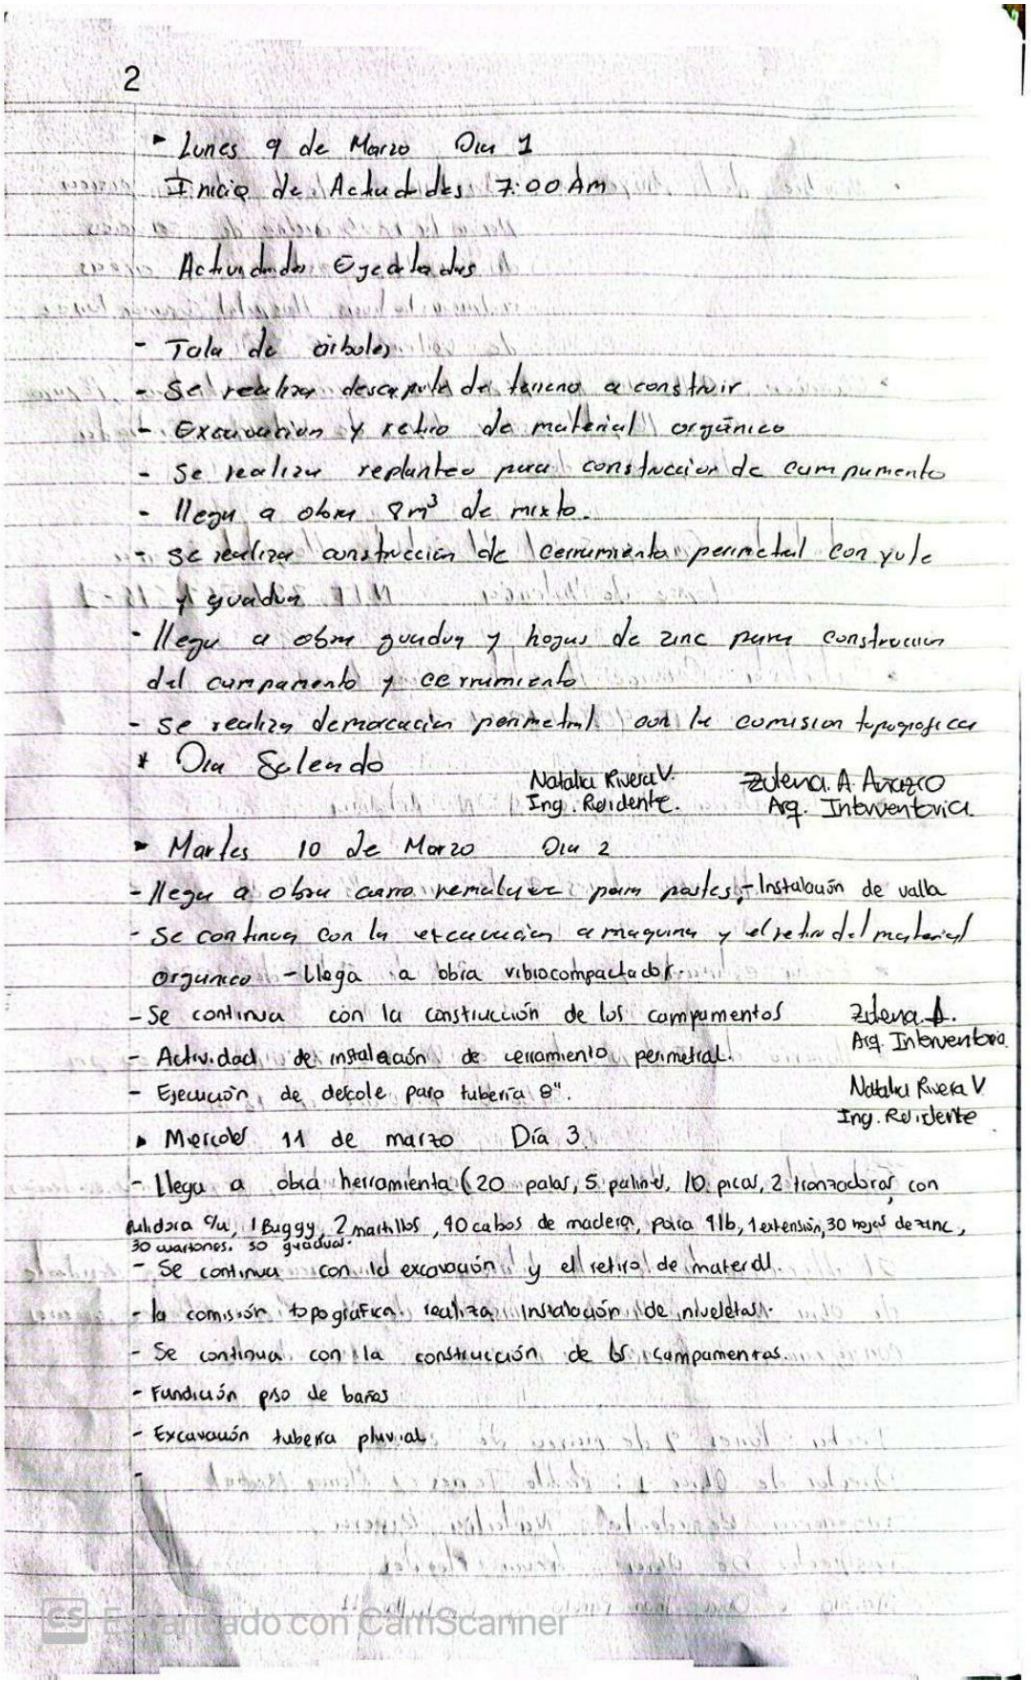

2

► Lunes 9 de Marzo Dia 1
Inicio de Actividades 7:00 AM

Actividades Ejecutadas

- Tala de árboles
- Se realiza descapote de terreno a construir
- Excavación y retiro de material orgánico
- Se realiza replanteo para construcción de campamento
- llega a obra 8m³ de mixto.
- Se realiza construcción de cerramiento perimetral con y/o y guadua
- llega a obra guadua y hojas de zinc para construcción del campamento y cerramiento
- Se realiza demarcación perimetral con la comisión topográfica

* Dia Soleado

Natalia Rivera V.
Ing. Residente.

Zulena A. Arroyo
Arq. Interventora

► Martes 10 de Marzo Dia 2

- llega a obra carro remolque para pastes, - Instalación de valla
- Se continua con la excavación a maquina y el retiro del material orgánico - Llega a obra vibrocompactador.
- Se continua con la construcción de los campamentos
- Actividad de instalación de cerramiento perimetral.
- Ejecución de dedole para tubería 8".

Zulena A.
Arq. Interventora

Natalia Rivera V
Ing. Residente

► Miercoles 11 de marzo Día 3

- llega a obra herramienta (20 palas, 5 palin-V, 10 picas, 2 tronzadoras con cuchilla c/u, 1 Buggy, 2 martillos, 10 cabos de madera, para 11b, 1 extensión, 30 mojes de zinc, 30 machones. 50 gradual.
- Se continua con la excavación y el retiro de material.
- la comisión topográfica realiza instalación de niveletas.
- Se continua con la construcción de los campamentos.
- Fundición piso de baños
- Excavación tubería pluvial
-

Escaneado con CamScanner

▶ Jueves 12 de Marzo Día 4.

- Llega a obra 8 tablas, dotación, (pantalón, botas, casco)
- Se continua con la excavación y retiro de material organico (tierra negra)
- Se continua con la construcción del campamento y se realiza lleno con material amarillo para oficina
- Se continua con la instalación del cerramiento.


Natalia Rivera V. Ing. Residente. Zdenek A. Arq. Interventor

- Se realiza excavación para la reubicación del parking
- Se realiza instalación de entibados para la excavación de aguas lluvias.
- Limpieza de material sobrante de excavación, construcción etantes modelo oficina, suministro e instalación de material Filtrante (triturado) para cama de tubería 8" y atraque. e= 15 cm + atraque 10 cm. Ancho = 0.8m, L=50m.

▶ Viernes 13 de marzo Día 5

- Llega a obra (Santiago) trompo 8m³ de mixto
- Se continua con la excavación y retiro de material organico.
- Se continua con la construcción de los campamentos
- Se continua con la tala de arboles
- Se establece punto electrico y agua potable con el personal de mantenimiento del hospital.
- Se realiza excavación para acometida electrica en oficina. L=8m, H.30 cm, A:30 cm.
- Se realiza descapote segundo nivel a maquina.
- Se continua con el cerramiento material guadua y yute.
- Se realiza lleno con material amarillo en campamento e= 20cm.
- Llega a obra 2 canecas, 10 cuñetes, 1 rollo de manguera de riego
- Se continua con la actividad de tala de arboles
- Se realiza instalación de tierra amarilla para la tuberia de 8"
- Se realiza la instalación de tuberia de 8"
- Se continua con la excavación y retiro de material del proyecto.
- Se realiza trazo de niveles sobre eje de rampa y se llega al nivel 0,
- Se recibe visita del Ing. Cuyar especialista en suelos para recomendaciones del terreno. Se concluye realizar 5 apiques para posterior visita y recomendación
- Se realiza instalación de entibados en excavación tubería 8"
- Se realiza instalación de reflectores para trabajo nocturo (intervención en la via parqueaderos - salida hospital)
- Entrega dotación.
- Llueve 8pm, por lo tanto no se ejecutan trabajos sobre la via, se programa para mañana Sabado 14 de marzo.

Natalia Rivera V. Ing. Residente. Zdenek A. Arq. Interventor

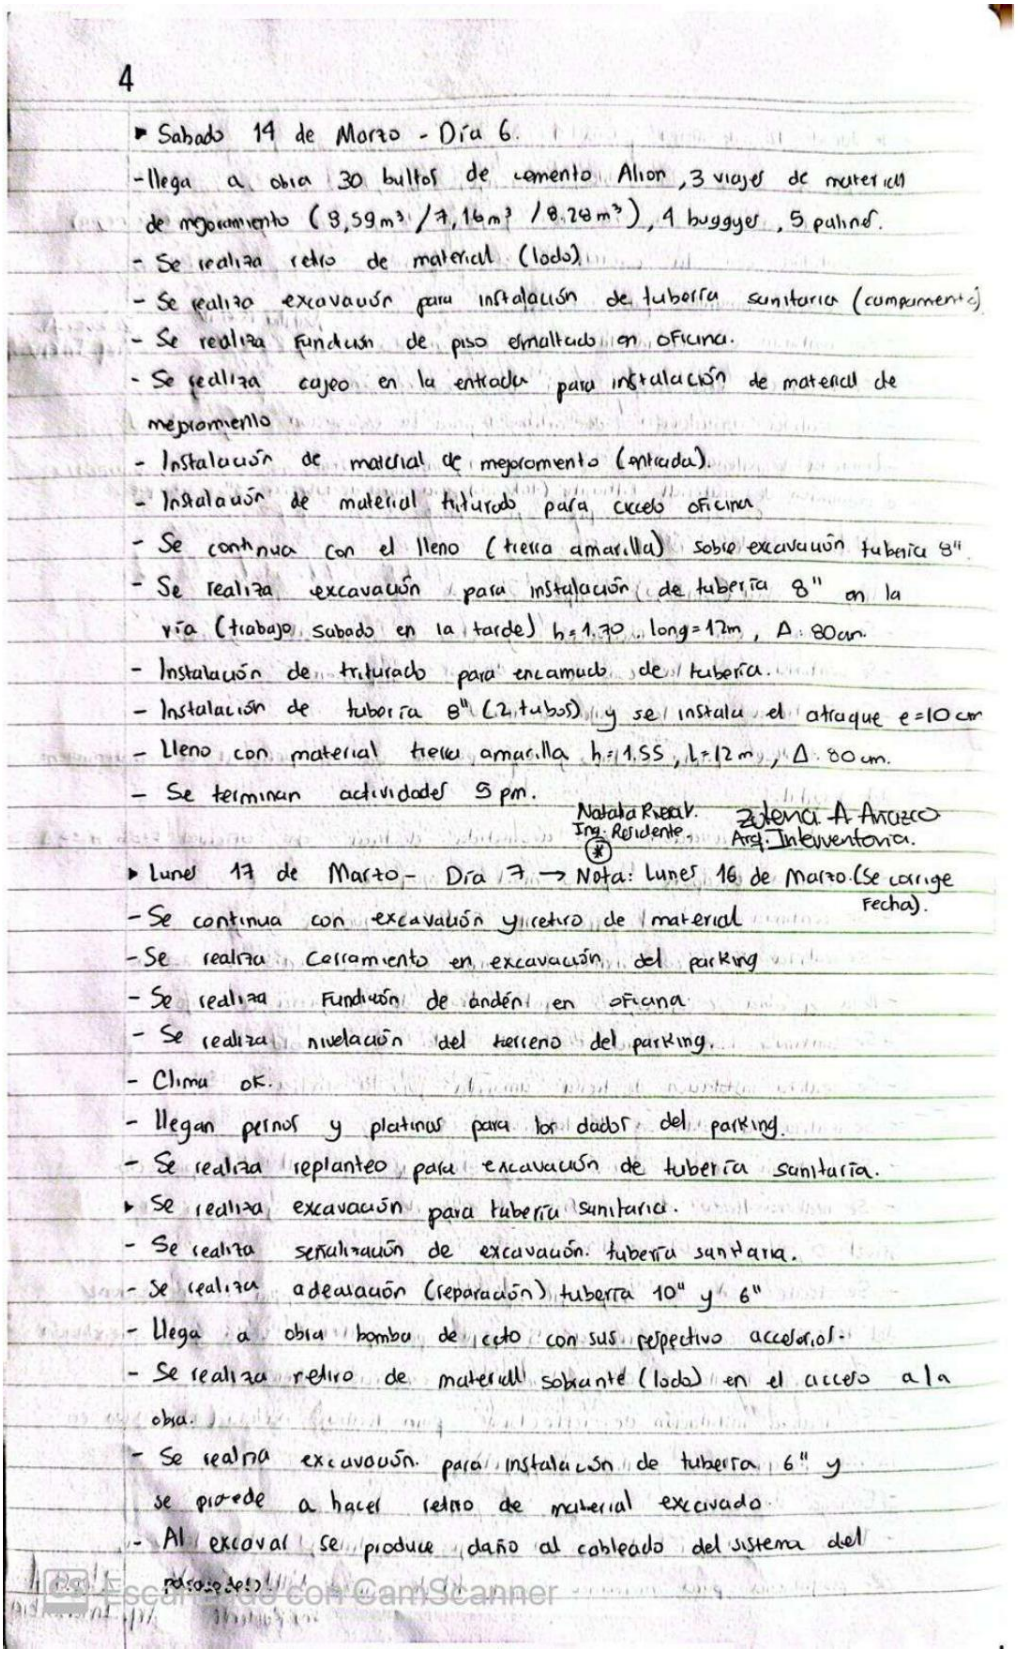

4

▸ Sabado 14 de Marzo - Día 6.

- llega a obra 30 bultos de cemento Alion, 3 viajes de material de mejoramiento (8,59m³ / 7,16m³ / 8.28m³), 1 buggyes, 5 palines.
- Se realiza retiro de material (lodo).
- Se realiza excavación para instalación de tubería sanitaria (campamento).
- Se realiza Fundición de piso elmaltado en oficina.
- Se realiza cajeo en la entrada para instalación de material de mejoramiento.
- Instalación de material de mejoramento (entrada).
- Instalación de material triturado para cuarto oficina.
- Se continua con el lleno (tierra amarilla) sobre excavación tubería 8".
- Se realiza excavación para instalación de tubería 8" en la vía (trabajo sabado en la tarde) h=1.70, long=12m, Δ 80cm.
- Instalación de triturado para encamado de tubería.
- Instalación de tubería 8" (2 tubos) y se instala el atraque e=10cm
- Lleno con material tierra amarilla h=1.55, L=12m, Δ 80cm.
- Se terminan actividades 5 pm.

Natalia Rivera V. Ing. Residente. (*) Yolenca A. Arroyo Arq. Interventoria.

▸ Lunes 17 de Marzo - Día 7 → Nota: Lunes 16 de Marzo (Se corrige Fecha).

- Se continua con excavación y retiro de material
- Se realiza cerramiento en excavación del parking
- Se realiza Fundición de andén en oficina
- Se realiza nivelación del terreno del parking.
- Clima ok.
- llegan pernos y platinas para los dados del parking.
- Se realiza replanteo para excavación de tubería sanitaria.
- ▸ Se realiza excavación para tubería sanitaria.
- Se realiza señalización de excavación tubería sanitaria.
- Se realiza adecuación (reparación) tubería 10" y 6"
- llega a obra bomba de concreto con sus respectivo accesorios.
- Se realiza retiro de material sobrante (lodo) en el acceso a la obra.
- Se realiza excavación para instalación de tubería 6" y se procede a hacer retiro de material excavado
- Al excavar se produce daño al cableado del sistema del [illegible]

Escaneado con CamScanner

- Se compra material para la reparación de la red de camaras del parqueadero.
- Se continua con la tala de arboles
- Se realiza instalación de niveletas para llegar al nivel 0.
- Se continua con excavación y retiro de material.
- Se realiza instalación de entibados para tubería sanitaria.
- llega a obra 20 tablas, 40 cuartones y saltarín.

Natalia Rivera V. Ing. Residente. — Zolena A. Arq. Interventoria.

▸ Martes 17 de Marzo - Día 8.

- Se continua con la nivelación del parking.
- Se continua con la excavación y retiro de material sobrante
- Se continua con la construcción de los campamentos.
- Se realiza replanteo y excavación.
- En la mañana se presenta fuerte lluvia.


Natalia Rivera V. Ing. Residente. — Zolena A. Arq. Interventoria.

▸ Miercoles 18 de marzo - Día 9.

- Se atiende reunión del Hospital Susana lopez (Creación Veeduria)
- Se continua con la construcción del campamento e instalación de tubería
- Excavación para punto hidraulico (Baño o Fincina)
- Se realiza trazado de eje para construcción caseta parking y se realiza excavación de dados 50x50
- Se continua con la tala de arboles y limpieza.
- Se continua con la excavación y retiro de material.
- Se realiza segunda visita del Ing. German Cujar, para revisión de los apiques (5) que solicito para verificar la condición del suelo, en obra se encuentra segun los apiques nivel Freatico a 1.50 m de profundidad. Se recomienda que para la cimentación de vigas de muro aplicar unicamente solado de limpieza de 10 cm.
- Llega topografo a obra para traza de ejes de todo el proyecto (deja trazado en numeros y letras).

Natalia Rivera V. Ing. Residente. — Zolena A. Arq. Interventoria.

Escaneado con CamScanner

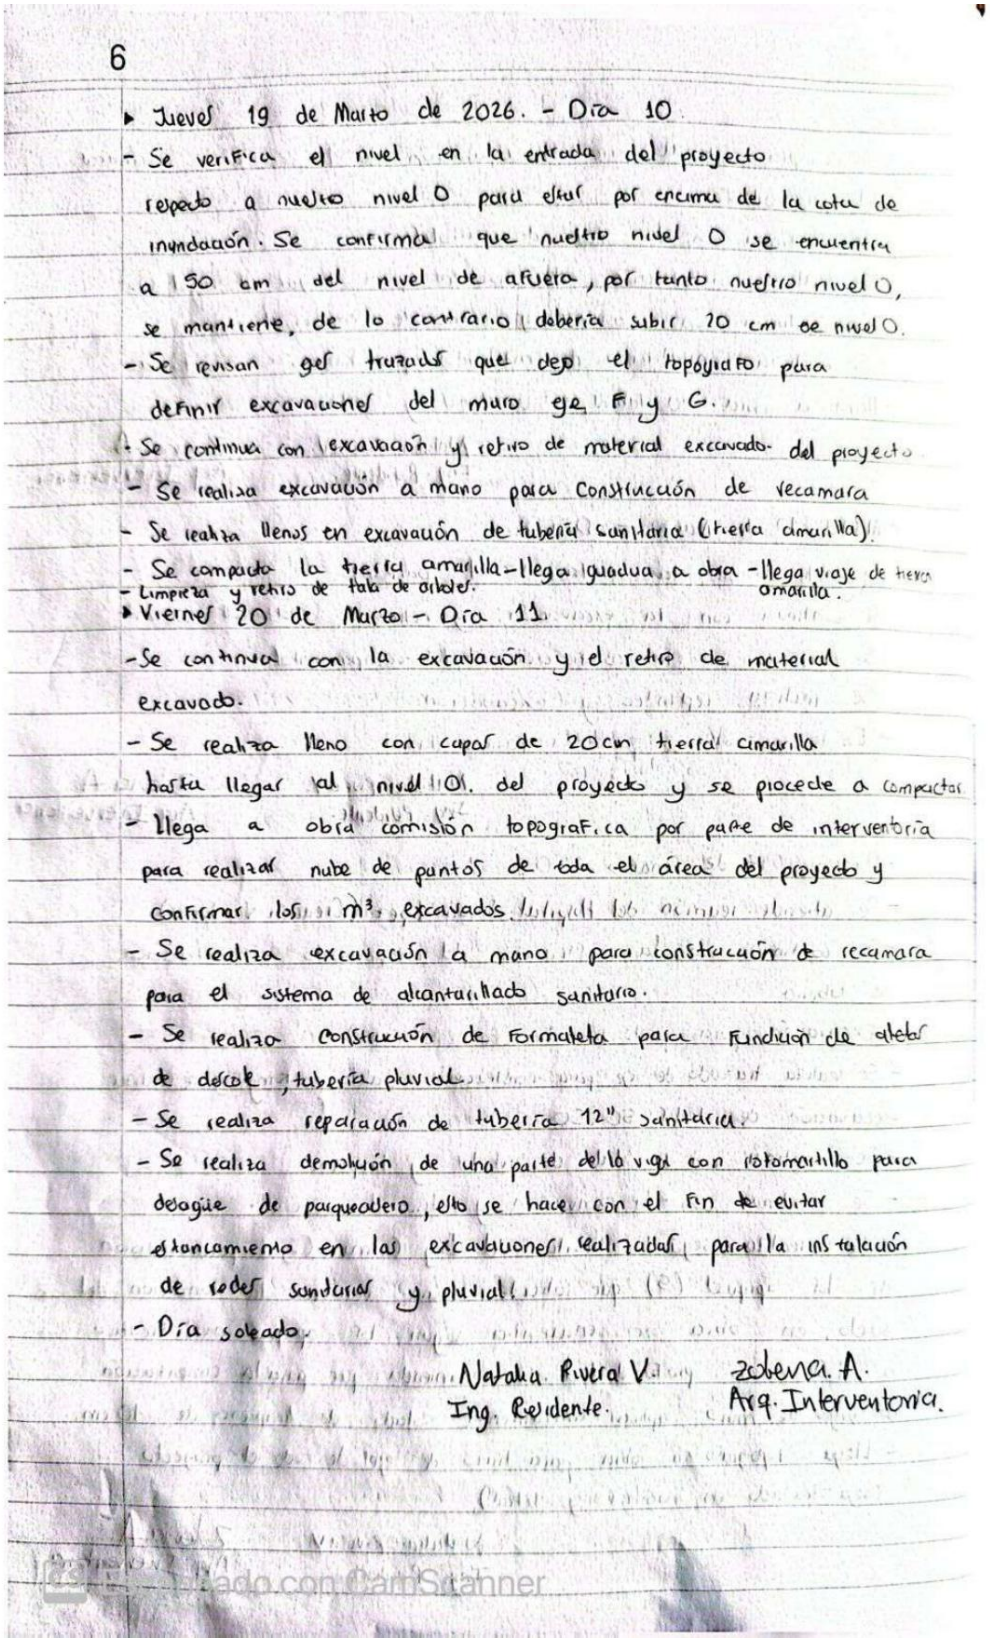

6

▸ Jueves 19 de Marzo de 2026. - Día 10

- Se verifica el nivel en la entrada del proyecto respecto a nuestro nivel 0 para estar por encima de la cota de inundación. Se confirma que nuestro nivel 0 se encuentra a 150 cm del nivel de afuera, por tanto nuestro nivel 0, se mantiene, de lo contrario debería subir 20 cm de nivel 0.
- Se revisan ejes trazados que deja el topógrafo para definir excavaciones del muro eje F y G.
- Se continua con excavación y retiro de material excavado del proyecto
- Se realiza excavación a mano para construcción de recamara
- Se realiza llenos en excavación de tubería sanitaria (tierra amarilla).
- Se compacta la tierra amarilla - llega guadua a obra - llega viaje de tierra amarilla.
- Limpieza y retiro de tala de árboles.

▸ Viernes 20 de Marzo - Día 11

- Se continua con la excavación y el retiro de material excavado.
- Se realiza lleno con capas de 20cm tierra amarilla hasta llegar al nivel 0. del proyecto y se procede a compactar
- Llega a obra comisión topografica por parte de interventoría para realizar nube de puntos de toda el área del proyecto y confirmar los m^3 excavados.
- Se realiza excavación a mano para construcción de recamara para el sistema de alcantarillado sanitario.
- Se realiza construcción de formaleta para fundición de aletas de dercol, tubería pluvial.
- Se realiza reparación de tubería 12" sanitaria.
- Se realiza demolición de una parte de la viga con rotomartillo para desagüe de parqueadero, esto se hace con el fin de evitar estancamiento en las excavaciones realizadas para la instalación de redes sanitarias y pluvial.
- Día soleado.

Natalia Rivera V.
Ing. Residente.

Zabeva A.
Arq. Interventoria.

Escaneado con CamScanner

7

▸ Sabado 21 de marzo de 2026 - Dia 12

- Se realiza excavación para correr punto hidraulico h: 35. Δ:30 L:5.10
- Se continua con la construcción de formaleta para los dados de descole.
- Se continua con la excavación y nivelación del terreno compactado por capas de 30cm
- Se continua con el retiro de basto en recamara para la fundición de losa de la recamara.
- El dia de hoy se trabaja todo el dia para no trabajar el dia lunes Festivo (dia 23).

Natalia Rivera V. Ing. Residente. — Zulena. A. Interventoria.

▸ Lunes 23 de Marzo de 2026 - Dia 13 (Festivo).

- Personal en obra: Inspector Kevin y Topografo Don Quijano.
- Topografia realiza implantación del muro y tanques.

▸ Martes 24 de Marzo de 2026 - Dia 14.

- Demolición de caseta parking h= 2.50 Δ: 2.26 L= 6.10

Cubierta long: 7.8m L 6.10, hoja trapezoidal, tubería 100x50 mm.
Correas 9 tubos, paralel 6 und, Vigas 6 und
Reja 4 tubos Frontal, lateral 7.



- Se presenta lluvia entre la 1:10 - 2:30 p.m.
- Se realiza instalación de lavamanos para el campamento.
- Llega a obra 100 sacos de cemento
- Llegan 100 kg de chipa 3/8 (Santiago)
- Replanteo para perfilar muros de rampa
- Instalación de formaleta para alindro recamara

Natalia Rivera V. Ing. Residente. — Zulena. A. Interventoria.

▸ Miercoles 25 de Marzo de 2026 - Día 15.


- Llega a obra 17.25m³ de arena / 17.23m³ triturado.
- Se realiza Fundición de alindro para recamara h=1.90 Ø 1.50 espesor muro alindro 0.15m.
- Corte, Figuración de acero para brocal recamara.
  Estribos: long 1.20 3/8.
- Corte, Figuración de acero para pedestales caseta parking
  estribos: 0.82 x 5 x 8 pedestales = 40 estribos.
  Bastones: 0.60 x 4 x 8 pedestales = 32 bastones.
  Pernos: 0.7cm x 4 x 8 = 32 pernos 4cm.
  Platinas: 20x20 cm x 8 pedestales.

Escaneado con CamScanner

8

- Fundición de Aletas de descole.

0.621 m³ Muro cabezal e=30
0.21 m² Aletas e=15
Dentellon 40x40x1m



Formaleta aletas - tablero Frontal.

- Corte y desmonte de tuberia 100x50 mm en caseta parking. (2 personas)
- Llovio en la mañana de 8:10 hasta 7:10am, Dia soleado.
- Se realiza instalación de señalización (20) obra en la vía,

Fin de obra.

Natalia Rivera V.
Ing. Residente.

Zulema A.
Interventoria

▸ Jueves 26 de marzo de 2026 - Dia 16.

- Cerramiento caseta parking Largo 9.50x2 x Ancho 7.10x2 h=2m.
- Se realiza Fundición de losa para caseta. e=10cm
  Ancho = 4,50 Largo = 5.70.
- Fundición de dados de cimentación para casetas
  h=0.60, Δ=50x50.
- Instalación de acero de refuerzo para dados.
- 35 sacos de cemento para esta Fundicion.
- Arena 3.5 m³
- Triturado 3.5 m³
- Suministro de materiales
- Suministro de mezcladora, transporte de materiales.
- Replanteo para perfilación y construcción de muros sobre eje (A).
- Se continua con la excavación y retiro de material excavado en terreno.
- Se realiza instalación de acometida para mezcladora de concreto e instalación electrica para el almacén.

Escaneado con CamScanner

9


- retiro de Formaleta en aletas de descole y recamara.
- Amarre de acero de refuerto brocal.
- Instalación de tuberia para parte electrica cuneta parking. (Suministro y transporte).
- Instalación de punto de hidratación.

Natalia Rivera V.
Ing. Residente.

Zulena. A.
Interventoria.

▸ Viernes 27 de marzo de 2026 - Dia 17

- Se inicia excavación a mano para construcción de muro sobre eje A.



- Excavación a mano para construcción de viga 40 x 60 muro mamposteria (replanteo).
- Se realiza Fundición de cuneta perimetro cuneta parking.
  t = 7 cm long = 18,2 ml Δ = 50 cm
- 7 sacos de cemento entre cunetas y rampa.
- llega a obra formaleta de brocal. (Praggio).
- Instalación formaleta de brocal
- Se realiza Fundición de brocal. de camara t = 25cm. ϕ 1.50.
- Se realiza excavación y retiro de material.
- Se realiza reparación (soldadura) en la mezcladora para continuar con las Fundiciones.
- Fundición de cañuelas en camara de inspección sanitaria.

Natalia Rivera V.
Ing. Residente

Zulena. A.
Interventoria.

▸ Sabado 28 de marzo de 2026 - Dia 18

- Se continua con la excavación a mano de la viga de cimentación del muro del eje A → 40x60 para mamposteria y 80x35 para la zarpa del muro en concreto.
- llega a obra 17 m³ de triturado.
- Se realiza 2 viajes de tierra amarilla para relleno en terreno para llegar al nivel 0.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO HOSPITAL Susana López	**ACTA DE REUNIÓN - COMITES**	F02 – CHSL – AR Versión 01 – 2026

REUNIÓN INSTITUCIONAL	☐	REUNIÓN DE CAPACITACIÓN:	☐	
REUNIÓN INTERVENTORIA	☐	REUNIÓN COMITÉ VEEDOR O TECNICO:	☒	HORA DE INICIO: 3:00PM
REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	☐	OTRA:		HORA FINALIZACIÓN: 4:00 PM

OBJETO:	Realizar recorrido técnico en la obra con el fin de verificar las condiciones del suelo, debido a las diferentes situaciones evidenciadas durante las actividades de excavación, así como confirmar las condiciones del material de relleno a utilizar.

LUGAR: **FRENTE DE OBRA HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA**

ORDEN DEL DÍA	
1. Verificación de asistentes	
2. Recorrido por la obra	
3. Verificación zona de apiques	
4. Revisión diseños en planos	
5. Cierre del recorrido	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Siendo las 3:00 p.m. del día 18 de marzo de 2026, se realiza recorrido técnico en la obra con la participación del equipo anteriormente relacionado, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales del suelo en las zonas intervenidas durante el proceso de excavación.

Durante la inspección, se evidenció que el suelo presenta condiciones asociadas a la presencia de nivel freático a una profundidad aproximada de 1.50 metros respecto al nivel 0 del proyecto.

CONCLUSIONES TÉCNICAS

El ingeniero especialista en suelos manifestó que:

- La presencia del nivel freático identificado no representa inconveniente estructural, teniendo en cuenta que:
  - No se alcanzará dicha profundidad en la ejecución del proyecto.
  - Las cargas estructurales proyectadas son bajas.
- En consecuencia, **no se requiere la implementación de rellenos excesivos.**

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Se establecen las siguientes recomendaciones:

- Ejecutar un solado de concreto de 10 cm en las vigas de cimentación.
- En los puntos donde se evidencien fallas del suelo, realizar mejoramiento mediante la colocación de subbase.
- A partir de información suministrada por la comunidad aledaña (vecinos del sector), quienes manifiestan que la vía contigua presenta problemas de inundación, se recomienda:
    - Elevar el nivel 0 del proyecto en 20 cm, con el fin de prevenir posibles afectaciones futuras por acumulación de agua que puedan comprometer la estructura.

CONCLUSIÓN GENERAL

Con base en las condiciones verificadas y las recomendaciones emitidas por el especialista en suelos, se concluye que es viable continuar con las actividades de obra, siempre y cuando se implementen las medidas técnicas aquí establecidas.

Se deja en constancia la viabilidad por parte de la interventoría y que es de su conocimiento las apreciaciones por parte del Ingeniero German Cujar

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Remisión por parte del Ing. Germán Cujar de un documento técnico en el que se consoliden y formalicen las recomendaciones emitidas durante la visita en sitio a la obra.	Ing German Cujar – Ing Maria Isabel	

FIRMAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ingeniero German Cujar	Especialista en suelos	
Ingeniero Pablo Torres	Director de obra 1	
Ingeniera María Isabel Valencia	Directora de obra 2	
Ingeniera Natalia Rivera	Ingeniera residente de obra	Natalia Rivera V.
Kevin Méndez	Inspector de obra	Kevin Mendez
Arquitecta Zulena	Interventoría	Zulena. A. Arcazco. G.
Jhon Panezo	Maestro de Obra	

Proyecto: Yesica Idrobo – Ingeniera y apoyo administrativo /Reviso: Natalia rivera – Ingeniera residente /Aprobó: Pablo Torres – director de Obra


Anexos

REGISTRO FOTOGRAFICO







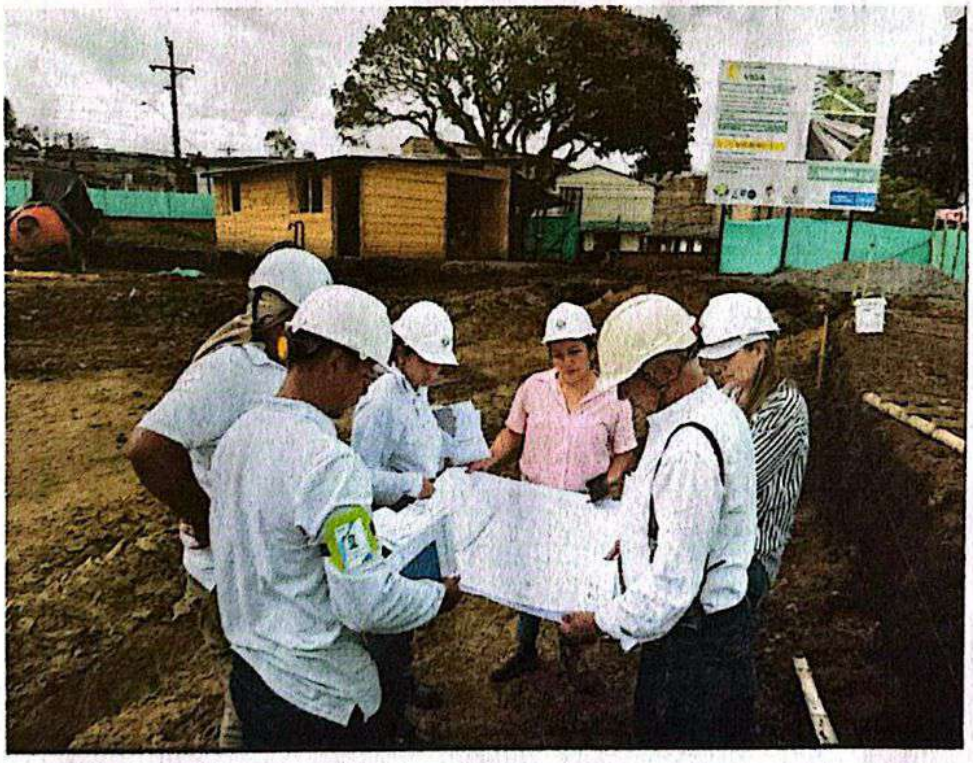





GEOCONSULTA LTDA

ING. GERMAN CUJAR CHAMORRO
MASTER EN MECANICA DE SUELOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
Carrera 17 # 48N - 128 Casa 42
CEL 310 8315444
POPAYÁN - COLOMBIA

Popayán, marzo 28 de 2026

Señores:
CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ
Ciudad

Referencia: CONTRATO 384-2025 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA PARA LA REUBICACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA POPAYÁN E.S.E.

ASUNTO: Recomendaciones técnicas derivadas de la visita de inspección Geotécnica y validación de suelos.

Cordial saludo:
Tras realizar la visita técnica al sitio durante dos jornadas de inspección, y después de analizar el estudio de suelos suministrado por el Contratista, así como la verificación de los ensayos y recomendaciones pertinentes, me permito presentar las siguientes conclusiones y directrices para el proyecto:

1. CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO

Textualmente según el estudio de suelos presenta lo siguiente:

c. ADECUACION DEL TERRENO

En el lote será necesario antes de hacer cualquier cimentación, retirar todo lo correspondiente que se encuentra con material organico, esta capa oscila entre los 70 centimetros hasta el metro de espesor.

A fin de que el proyecto no quede enterrado con respecto al resto del área se recomienda el reemplazo del material organico, con un material tipo sub base de INVIAS, este material granular debe ser compactado con equipo mecánico, en capas de 20 cms hasta obtener un 95% del proctor modificado.

En la parte de debajo de las zapatas debe colocarse treinta centímetros de este mismo material compactado al 95% del proctor modificado y posteriormente colocar un solado de limpieza para proteger la excavación de posible remoldeo del suelo y también mejorar la protección del refuerzo como la comodidad del trabajo.

CIVILAB
LABORATORIO - INGENIERÍA CIVIL

ING. GERMAN CUJAR CHAMORRO
MASTER EN MECANICA DE SUELOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
Carrera 17 # 48N - 128 Casa 42
CEL 310 8315444
POPAYÁN - COLOMBIA

Se verifico que el suelo presente en el sitio, es un suelo fino limoso con alta compresibilidad y plasticidad (MH) posee una capacidad portante baja, son suelos de retención de agua alta, se encontró nivel freático a partir de los 1.50 m de profundidad del nivel de implantación (0.00), las condiciones Geotécnicas del terreno disminuyen a media que se profundizan las excavaciones, observaciones hechas mediante la inspección de (5) cinco apiques realizados hasta 1.50 m de profundidad por debajo del nivel de cimentación de la losa de piso, las observaciones anteriores coinciden plenamente con lo estipulado en el estudio de suelos inicial.

2. HALLAZGOS EN APIQUES Y NIVEL FREÁTICO

Durante la inspección de los (5) cinco Apiques realizados con retroexcavadora a una profundidad de 1.50m por debajo del nivel de la cota de implantación, es importante señalar que:

- El terreno ya cuenta con las excavaciones de nivelación previas.
- Se detectó la presencia de nivel freático a los 1.50 de profundidad respecto al nivel 0,0

3 RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN Y SUELO:

Textualmente según el estudio de suelos presenta lo siguiente:

8.0. PROFUNDIDAD DE DESPLANTE

La cimentación se desplantará superficialmente, sobre el suelo clasificado como MH una profundidad de 0.7m tomando como cero la cota del terreno actual.

Se Deberá colocar solado de limpieza de espesor 10cms para evitar remoldeo del suelo al igual que treinta (30)cms de material de sub-base tipo Invias por debajo del solado de limpieza.

9.0. ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES

Dada la consistencia de los suelos, las excavaciones para obras sub-terraneas deben ser a corto plazo que son estables, a largo plazo la estabilidad de esta, se disminuye considerablemente por cambios de contenido de humedad, movimientos externos, trafico etc. Por lo cual las excavaciones mayores de 1.0m de profundidad se deben entibar o apuntalar adecuadamente.

- Se avala el retiro del material orgánico, labor que ya fue realizada, en muchas partes del lote.
- Respecto al solado de limpieza, se colocará únicamente para la cimentación de vigas, losas y muros de contención, utilizando un espesor de 10 cm.

ING. GERMAN CUJAR CHAMORRO
MASTER EN MECANICA DE SUELOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
Carrera 17 # 48N - 128 Casa 42
CEL 310 8315444
POPAYÁN - COLOMBIA

- Tan solo debajo de las vigas de la losa colocar 30 cm de subbase.

- Protección Hidráulica: Es imperativo instalar filtros en el trasdós de todos los muros de contención para prevenir filtraciones hacia la edificación. Estos deben estar debidamente conectados al sistema de drenaje de aguas lluvias.

- Cota de Inundación: Se recomienda establecer el nivel 0,0 de la edificación al menos 20 cm por encima de la cota de inundación de la vía.

- El diseño hidrosanitario actual contempla la implementación de un filtro tipo "espina de pescado" bajo la losa de piso, conectado al sistema pluvial para garantizar la estabilidad del terreno y prevenir asentamientos.

  Se requiere revisar el método de implementación del drenaje pluvial bajo placa.

  El diseño actual es de difícil ejecución dada la configuración de las vigas de cimentación, que fragmentan el área e impiden la continuidad del filtro tipo "espina de pescado".

- Mantener el diseño original del filtro en forma de espina de pescado, podría derivar en una ejecución deficiente o daños estructurales; por lo tanto, se recomienda como solución técnica la instalación de una Geomembrana Lisa Polímero de Alta Densidad tipo 20 mil, que asegure la protección contra humedades del piso de la Estructura y disminuyan los posibles asentamientos que se pudieran presentar en la losa de piso.

Atentamente,



ING.GERMAN CUJAR CHAMORRO
Cédula 8.300.610
Mat. Prof. 000708 Cauca

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E	LISTADO DE ASISTENTES ACTIVIDADES HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	Página 1 de 2 Versión: 8 SLV-SR-03-F07

Capacitación [ ] Socialización [ ] Comité [ ] Reunión [X] Otro: _____ Hoja No. [ ]

Fecha: 18 MARZO 2026.
Tema: Conformación veeduría HSLV.
Responsable(s): PPCSS.
Hora de Inicio: 9:30 am.
Hora de Finalización:

Nº	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	PROCESO O SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
1	1061788048	Yesica Katerine Idrobo Ramirez	Consorcio HSL	SISOMA	
2	1061812217	Ingrid Natalia Rivera Vergara	Consorcio HSL	Ing. Residente	Natalia Rivera
3	34554929	Carlina Ipia	Asosuarios H.S.L.V	Rep. Voc. J Directiva	Carlina Ipia
4	87245401	Miguel Peracan	Asou HSL	Pte	
5	10522049	Jorge Eduardo Sotelo	Asosuarios	V/Presidente.	
6	76.321893	Samir José Muñoz Hoyos	Junta de Ladera.	Delegado	
7	8772502	Hisando Moreno O	Ladera	Presidente JAC	
8	76389.018	Nelson D. Leiton Muñoz	vecino.	Secretario	
9	7797148	Jose Edinson Hoyos. J		Fiscal	
10	10533808	Rodrigo López López	ASO. USUARIOS	Tesorero	
11	34536730	María Guiomar Mera.	A. de Usuarios	Vocal.	
12	34.533181	Ruz Dary María Zurado A.	Delegado de la Ladera	Delegado.	
13	34524197	Ruz Myriam Chamorro López	Ladera JAC	Cta. Educación, Dignataria	
14	10533878	Jon Vicente Velasco	presidente JAC	presidente	
15	16.383.709	Jose N. Dorado Cordoba	JAC Santa Fé	Fiscal	
16	10537688	Germán A Rivera M	Re Social HSLV	Ulco Reserva	
17	1061763141	Zoleny A Anaya G.	Consorcio astaiza	Interventoria	Zoleny A.
18	34556930	María Isabel Valencia P.	Consorcio HSL Directora Obra	Contratista de Obra	
19	4611917	Pablo Enrique Torres Velencia	Consorcio HS Rep legal.	Contratista de Obra	
20	34.539.171	María Cristina Velásquez N	Secretaria Asociación	Asociación Usuario	

Powered by CamScanner

Nº	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	PROCESO O SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
21	1007208782	Valentina Vargas Lozada	G.A.P	Arquitecta	Valentina V.
22	34327878	Deicy Rodriguez Muñoz	GAT	Lider	
23	1059910499	Jhon Edinson Barbano	Res social	Lider PPCSS	
24	1058675177	Alexander Salazar Alvarado	G.A.T	TOPÓGRAFO	
25	76328487	Oscar Andrés Castillo S.	Comunicaciones	Lider Comunicaciones	
26	1061751786	Lina Vanessa Mestas Mera	Res. Social	APOYO PPCSS.	
27	66858584	Lucy Ximena Ibarra	Gest. Estrategico	Gerente	
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

FIRMA RESPONSABLE: _____

Powered by CamScanner
