

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos
1		**Contrato No 24001269 H4 2024: REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ**	**696 días**	**mar 21/01/25**	**vie 18/12/26**	**$ 35.386.946.673,50**			
2		Acta de inicio	0 días	mar 21/01/25	mar 21/01/25	$ 0,00		3;265FC+554 días	
3		Actividades preliminares	30 días	mar 21/01/25	jue 20/02/25	$ 0,00	2	6FC+60 días;38FC+180 días;5	
4		**1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA DEMARCACIÓN**	**588 días**	**lun 21/04/25**	**lun 30/11/26**	**$ 7.197.508.281,80**			
5		**1.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL - PISTA**	**558 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 31/10/26**	**$ 6.156.362.029,75**			
6		1.1.1 Intervencion 1	20 días	lun 21/04/25	dom 11/05/25	$ 1.397.077.378,56	3FC+60 días	7FC+30 días;78FC+15 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 1[28.647,42]
7		1.1.2 Intervencion 2	15 días	mar 10/06/25	mié 25/06/25	$ 192.243.456,00	6FC+30 días	8FC+15 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 2[3.942]
8		1.1.3 Intervencion 3	15 días	jue 10/07/25	vie 25/07/25	$ 173.150.784,00	7FC+15 días	9FC+15 días;26	1.1 Señalizacion pista Intervencion 3[3.550,5]
9		1.1.4 Intervencion 4	15 días	sáb 9/08/25	dom 24/08/25	$ 222.528.384,00	8FC+15 días	10FC+15 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 4[4.563]
10		1.1.5 Intervencion 5	15 días	lun 8/09/25	mar 23/09/25	$ 763.267.968,00	9FC+15 días	11FC+15 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 5[15.651]
11		1.1.6 Intervencion 6	15 días	mié 8/10/25	jue 23/10/25	$ 21.742.725,12	10FC+15 días	12FC+16 días;23FC+290 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 6[445,84]
12		1.1.7 Intervencion 7	15 días	sáb 8/11/25	dom 23/11/25	$ 45.939.456,00	11FC+16 días	13FC+16 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 7[942]
13		1.1.8 Intervencion 8	15 días	mar 9/12/25	mié 24/12/25	$ 415.576.512,00	12FC+16 días	14FC+16 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 8[8.521,5]
14		1.1.9 Intervencion 9	15 días	vie 9/01/26	sáb 24/01/26	$ 222.528.384,00	13FC+16 días	15FC+16 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 9[4.563]
15		1.1.10 Intervencion 10	15 días	lun 9/02/26	mar 24/02/26	$ 429.694.848,00	14FC+16 días	16FC+16 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 10[8.811]
16		1.1.11 Intervencion 11	15 días	jue 12/03/26	vie 27/03/26	$ 193.657.728,00	15FC+16 días	17FC+16 días;24	1.1 Señalizacion pista Intervencion 11[3.971]
17		1.1.12 Intervencion 12	15 días	dom 12/04/26	lun 27/04/26	$ 192.243.456,00	16FC+16 días	18FC+16 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 12[3.942]
18		1.1.3 Intervencion 13	15 días	mié 13/05/26	jue 28/05/26	$ 269.272.512,00	17FC+16 días	19FC+16 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 13[5.521,5]
19		1.1.14 Intervencion 14	15 días	sáb 13/06/26	dom 28/06/26	$ 318.650.112,00	18FC+16 días	20FC+15 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 14[6.534]
20		1.1.15 Intervencion 15	15 días	lun 13/07/26	mar 28/07/26	$ 602.837.829,12	19FC+15 días	21FC+65 días	1.1 Señalizacion pista Intervencion 15[12.361,34
21		1.1.16 Intervencion 16	30 días	jue 1/10/26	sáb 31/10/26	$ 695.950.496,95	20FC+65 días	276;33	1.1 Señalizacion pista Intervencion 16[14.270,4];
22		**1.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN PINTURA TRAFICO PLASTICO FRIO LLANA.**	**30 días**	**dom 9/08/26**	**mar 8/09/26**	**$ 4.467.872,00**			
23		1.2.1 Intervencion 1	30 días	dom 9/08/26	mar 8/09/26	$ 4.467.872,00	11FC+290 días	24	1.2 Pintura en llana Intervencion 1[50];1.2SUMIN
24		~~1.2.2 Intervencion 2~~	~~30 días~~	~~mar 8/09/26~~	~~jue 8/10/26~~	~~$ 136.716.210,00~~	~~23;16~~		~~1.2 Pintura en llana Intervencion 2[1.530]~~
25		**1.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL - CALLES DE RODAJE.**	**360 días**	**vie 25/07/25**	**lun 20/07/26**	**$ 98.391.383,92**			
26		1.3.1 Intervencion 1	30 días	vie 25/07/25	dom 24/08/25	$ 60.050.188,00	8	27FC+267 días;30CC	1.3 Señalizacion calles m2 Intervencion 1[946]
27		1.3.2 Intervencion 2	63 días	lun 18/05/26	lun 20/07/26	$ 38.341.195,92	26FC+267 días	31CC	1.3 Señalizacion calles m2 Intervencion 2[604];1.
28		~~1.3.3 Intervencion 3~~	~~30 días~~	~~mar 21/01/25~~	~~jue 20/02/25~~	~~$ 15.869.500,00~~			~~1.3 Señalizacion calles m2 Intervencion 3[250]~~
29		**1.4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL - CALLES DE RODAJE, ANCHO: 0,20 m.**	**361 días**	**vie 25/07/25**	**mar 21/07/26**	**$ 912.206.151,73**			
30		1.4.1 Intervencion 1	15 días	vie 25/07/25	sáb 9/08/25	$ 329.615.000,00	26CC		1.4 Señalizacion calles ml intervencion 1[28.600]
31		1.4.2 Intervencion 2	30 días	lun 18/05/26	mié 17/06/26	$ 329.615.000,00	27CC	32FC+19 días	1.4 Señalizacion calles ml intervencion 2[28.600]
32		1.4.3 Intervencion 3	15 días	lun 6/07/26	mar 21/07/26	$ 252.976.151,73	31FC+19 días	276	1.4 Señalizacion calles ml intervencion 3[21.953,
33		**1.5 NP BORRADO SEÑALIZACION MEC**	**30 días**	**sáb 31/10/26**	**lun 30/11/26**	**$ 3.675.691,18**	**21**	**34CC**	1.5 NP Borrado maquina[200];1.5 NP Borrado m
34		**1.6 NP BORRADO SEÑALIZACION EN LLANA MEC**	**30 días**	**sáb 31/10/26**	**lun 30/11/26**	**$ 14.939.724,09**	**33CC**	**35CC**	1.6 NP Borrado mauina m2[200];1.6 NP Borrado
35		**1.7 NP BORRADO SEÑALIZACION CON PINTURA**	**30 días**	**sáb 31/10/26**	**lun 30/11/26**	**$ 7.465.429,13**	**34CC**	**276**	1.7 NP Borrado con pintura[400];1.7 NP Borrado
36		**2. MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVO DE PAVIMENTOS**	**563 días**	**vie 7/03/25**	**lun 21/09/26**	**$ 7.009.654.912,16**			
37		**2.1 FRESADO CARPETA ASFÁLTICA (INCLUYE CORTE, Y TRANSPORTE INTERNO)**	**340 días**	**mar 19/08/25**	**sáb 25/07/26**	**$ 31.256.219,00**			
38		2.1.1 Intervencion 1	45 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	$ 14.323.596,12	3FC+180 días	42CC	2.1 Fresado Intervencion 1[184,68]
39		2.1.2 Intervencion 2	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 16.932.622,88	46FC+250 días	43CC	2.1 Fresado Intervencion 2[218,32];2.1FRESADO
40		~~2.1.3 Intervencion 3~~	~~0 días~~	~~sáb 25/07/26~~	~~sáb 25/07/26~~	~~$ 0,00~~	~~47~~	~~44CC~~	2.1 Fresado Intervencion 3[0]
41		**2.2 SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FAA P-401**	**340 días**	**mar 19/08/25**	**sáb 25/07/26**	**$ 571.928.460,31**			
42		2.2.1 Intervencion 1	45 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	$ 263.680.195,68	38CC	46CC;43;44;84FC+330 días	2.2 Asfalto P-401 Intervencion 1[186,72]
43		2.2.2 Intervencion 2	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 308.248.264,63	39CC;42	47CC	2.2 Asfalto P-401 Intervencion 2[218,28];2.2SUM
44		~~2.2.3 Intervencion 3~~	~~0 días~~	~~sáb 25/07/26~~	~~sáb 25/07/26~~	~~$ 0,00~~	~~40CC;42~~	~~48CC;85~~	2.2 Asfalto P-401 Intervencion 3[0]
45		**2.3 SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA FAA P-603, INCLUYE BARRIDO.**	**340 días**	**mar 19/08/25**	**sáb 25/07/26**	**$ 40.289.137,80**			
46		2.3.1 Intervencion 1	45 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	$ 13.052.751,30	42CC	39FC+250 días;47	2.3 Riego de liga Intervencion 1[3.239,7]
47		2.3.2 Intervencion 2	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 27.236.386,50	43CC;46	40;48	2.3 Riego de liga Intervencion 2[6.760,3];2.3SUM
48		~~2.3.3 Intervencion 3~~	~~0 días~~	~~sáb 25/07/26~~	~~sáb 25/07/26~~	~~$ 0,00~~	~~44CC;47~~		2.3 Riego de liga Intervencion 3[0]
49		**2.4 DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO**	**532 días**	**lun 7/04/25**	**lun 21/09/26**	**$ 5.922.088.806,59**			
50		2.4.1 Intervencion 1	23 días	lun 7/04/25	mié 30/04/25	$ 801.720.000,00	3FC+46 días	51FC+7 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 1[30.000]
51		2.4.2 Intervencion 2	16 días	mié 7/05/25	vie 23/05/25	$ 427.584.000,00	50FC+7 días	52FC+15 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 2[16.000]
52		2.4.3 Intervencion 3	16 días	sáb 7/06/25	lun 23/06/25	$ 427.584.000,00	51FC+15 días	53FC+15 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 3[16.000]
53		2.4.4 Intervencion 4	15 días	mar 8/07/25	mié 23/07/25	$ 427.584.000,00	52FC+15 días	54FC+15 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 4[16.000]
54		2.4.5 Intervencion 5	16 días	jue 7/08/25	sáb 23/08/25	$ 427.584.000,00	53FC+15 días	55FC+15 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 5[16.000]
55		2.4.6 Intervencion 6	16 días	dom 7/09/25	mar 23/09/25	$ 427.584.000,00	54FC+15 días	56FC+14 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 6[16.000]
56		2.4.7 Intervencion 7	15 días	mar 7/10/25	mié 22/10/25	$ 427.584.000,00	55FC+14 días	57FC+16 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 7[16.000]
57		2.4.8 Intervencion 8	16 días	vie 7/11/25	dom 23/11/25	$ 427.584.000,00	56FC+16 días	58FC+14 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 8[16.000]
58		2.4.9 Intervencion 9	16 días	dom 7/12/25	mar 23/12/25	$ 481.032.000,00	57FC+14 días	59FC+15 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 9[18.000]
59		2.4.10 Intervencion 10	15 días	mié 7/01/26	jue 22/01/26	$ 160.344.000,00	58FC+15 días	60FC+16 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 10[6.000]
60		2.4.11 Intervencion 11	16 días	sáb 7/02/26	lun 23/02/26	$ 160.344.000,00	59FC+16 días	61FC+43 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 11[6.000]
61		2.4.12 Intervencion 12	15 días	mar 7/04/26	mié 22/04/26	$ 160.344.000,00	60FC+43 días	62FC+46 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 12[6.000]
62		2.4.13 Intervencion 13	16 días	dom 7/06/26	mar 23/06/26	$ 545.575.270,32	61FC+46 días	63FC+60 días	2.4 Descontaminacion caucho int. 13[20.415,18]
63		2.4.14 Intervencion 14	30 días	sáb 22/08/26	lun 21/09/26	$ 619.641.536,27	62FC+60 días	276	2.4 Descontaminacion caucho int. 14[23.183,2];2
64		**2.5 SELLO DE FISURAS CON RUTEO**	**410 días**	**lun 26/05/25**	**vie 10/07/26**	**$ 252.796.960,63**			
65		2.5.1 Intervencion 1	45 días	lun 26/05/25	jue 10/07/25	$ 126.405.000,00	3FC+95 días	68CC	2.5 Sello fisuras con rut Int.1[15.000]
66		2.5.2 Intervencion 2	45 días	mar 26/05/26	vie 10/07/26	$ 126.391.960,63	68FC+320 días	69CC	2.5 Sello fisuras con rut Int.2[15.000];2.5SELLO
67		**2.6 SELLO DE FISURAS SIN RUTEO**	**410 días**	**lun 26/05/25**	**vie 10/07/26**	**$ 146.497.712,60**			

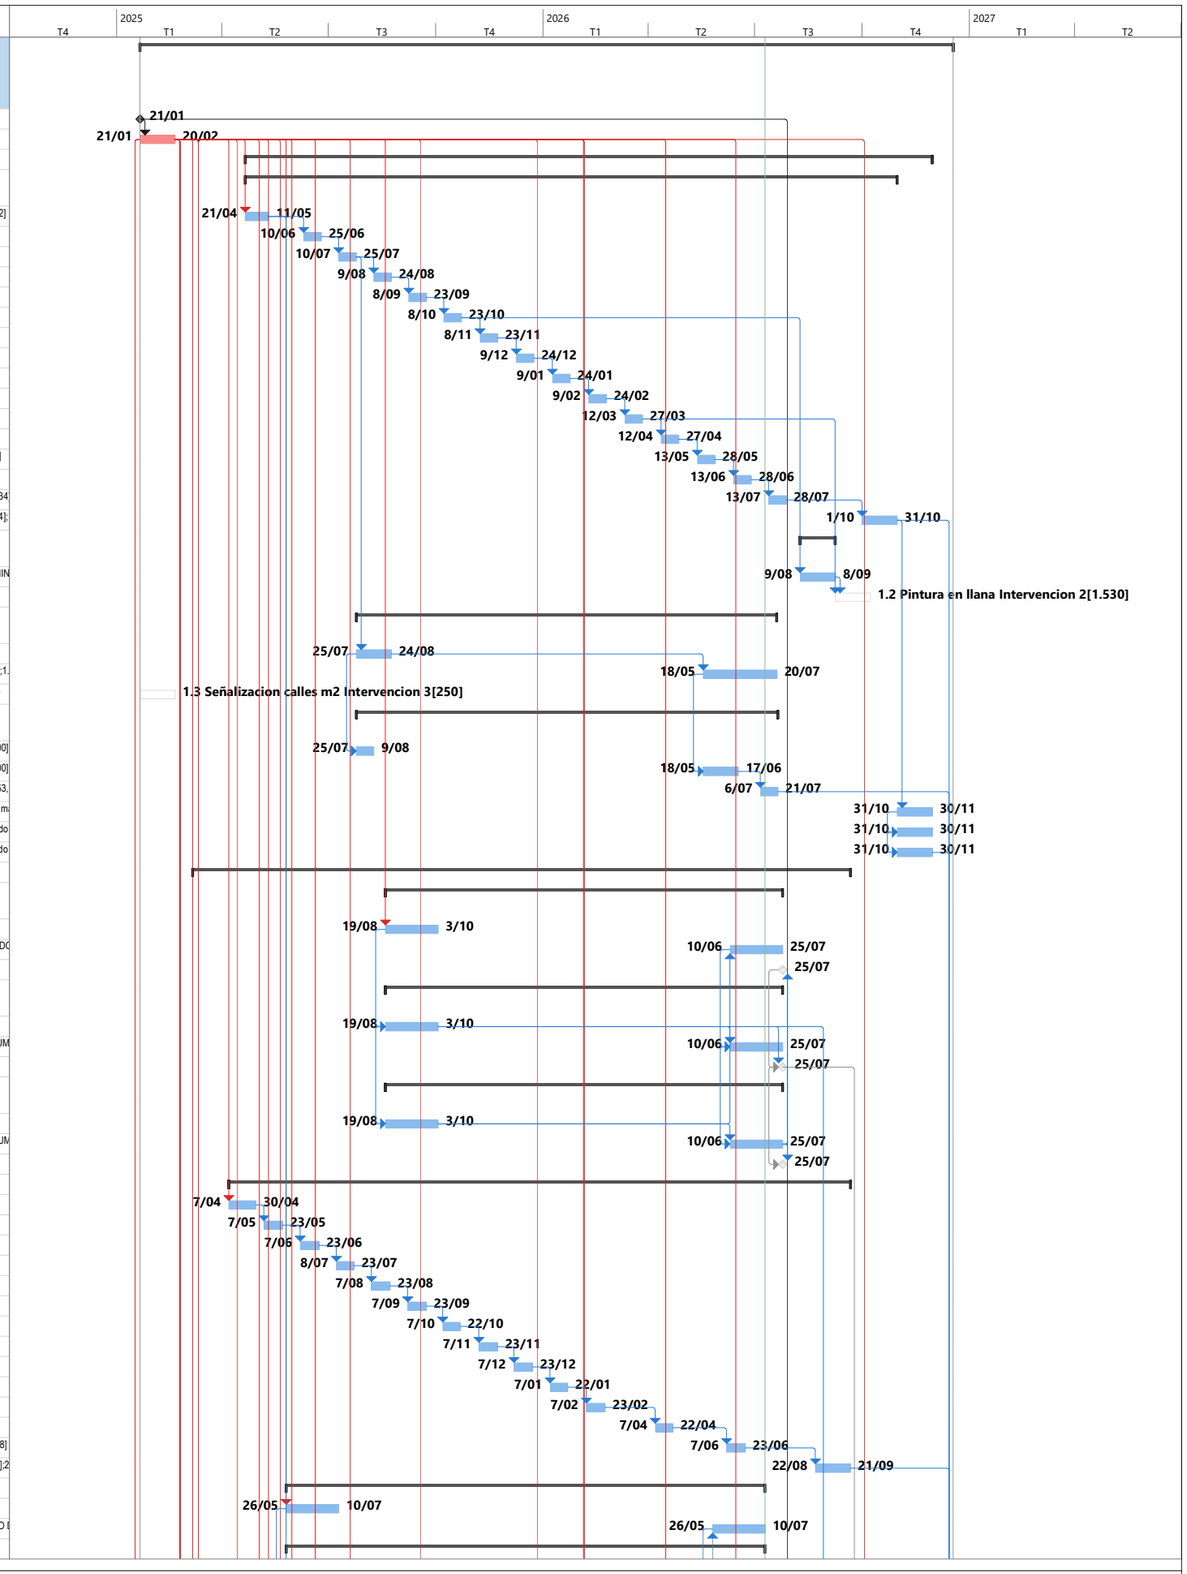

Proyecto: Programacion Aeropu
Fecha: vie 10/07/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos
68		2.6.1 Intervencion 1	45 días	lun 26/05/25	jue 10/07/25	$ 23.754.000,00	65CC	66FC+320 días	2.6 Sello fisuras sin rut Int.1[6.000]
69		2.6.2 Intervencion 2	45 días	mar 26/05/26	vie 10/07/26	$ 122.743.712,60	66CC	276	2.6 Sello fisuras sin rut Int.2[31.000];2.6SELLO D
70		**2.7 SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA**	**485 días**	**vie 7/03/25**	**dom 5/07/26**	**$ 44.797.615,23**			
71		2.7.1 Intervencion 1	90 días	vie 7/03/25	jue 5/06/25	$ 12.217.530,00	3FC+15 días	72FC+15 días	2.7 Mezcla asfalto frio 1[3]
72		2.7.2 Intervencion 2	90 días	vie 20/06/25	jue 18/09/25	$ 12.217.530,00	71FC+15 días	73FC+45 días	2.7 Mezcla asfalto frio 2[3]
73		2.7.3 Intervencion 3	90 días	dom 2/11/25	sáb 31/01/26	$ 12.217.530,00	72FC+45 días	74FC+65 días	2.7 Mezcla asfalto frio 3[3]
74		2.7.4 Intervencion 4	90 días	lun 6/04/26	dom 5/07/26	$ 8.145.025,23	73FC+65 días	75	2.7 Mezcla asfalto frio 4[2];2.7SUMINISTRO E IN
75		~~2.7.5 Intervencion 5~~	~~0 días~~	~~dom 5/07/26~~	~~dom 5/07/26~~	~~$ 0,00~~	74		~~2.7 Mezcla asfalto frio 5[0]~~
76		**3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS DE ACCESO PAVIMENTADAS**	**490 días**	**lun 26/05/25**	**lun 28/09/26**	**$ 199.269.432,77**			
77		**3.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL ML**	**45 días**	**lun 26/05/25**	**jue 10/07/25**	**$ 113.592.398,03**			
78		3.1.1 Intervencion 1	30 días	lun 26/05/25	mié 25/06/25	$ 87.380.000,00	6FC+15 días	79	3.1 Señalizacion horizontal vias ml[10.000]
79		3.1.1 Intervencion 2	15 días	mié 25/06/25	jue 10/07/25	$ 26.212.398,03	78	81	3.1 Señalizacion horizontal vias ml[3.000];3.
80		**3.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL M2**	**30 días**	**jue 10/07/25**	**sáb 9/08/25**	**$ 73.213.239,86**			
81		3.2.1 Intervencion 1	15 días	jue 10/07/25	vie 25/07/25	$ 1.943.050,00	79	82	3.1 Señalizacion horizontal vias m2[50]
82		3.2.1 Intervencion 2	15 días	vie 25/07/25	sáb 9/08/25	$ 71.270.189,86	81	276	3.1 Señalizacion horizontal vias m2[1.834];3
83		**3.3 SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC - 19**	**30 días**	**sáb 29/08/26**	**lun 28/09/26**	**$ 12.463.794,88**			
84		3.3.1 Intervencion 1	30 días	sáb 29/08/26	lun 28/09/26	$ 12.463.794,88	42FC+330 días	85	3.1 Mezcla MDC-19 Int. 1[14];3.3SUMINISTRO,
85		~~3.3.2 Intervencion 2~~	~~0 días~~	~~lun 28/09/26~~	~~lun 28/09/26~~	~~$ 0,00~~	44-84		~~3.1 Mezcla MDC-19 Int. 2[0]~~
86		**4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVO - PODA CESPED E INDIVIDUOS ARBOREOS**	**666 días**	**jue 20/02/25**	**vie 18/12/26**	**$ 6.557.971.175,60**			
87		**4.1 ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y/O CORTE DE CESPED ZONAS VERDES DE SEGURIDAD DE LAS PISTAS, CALLES DE RODAJE, CABECERAS**	**666 días**	**jue 20/02/25**	**vie 18/12/26**	**$ 4.349.400.856,85**			
88		4.1.1 Ciclo 1	60 días	jue 20/02/25	lun 21/04/25	$ 243.903.825,00	3	89	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 1[2.279.475]
89		4.1.2 Ciclo 2	35 días	lun 21/04/25	lun 26/05/25	$ 243.903.825,00	88	90	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 2[2.279.475]
90		4.1.3 Ciclo 3	30 días	lun 26/05/25	mié 25/06/25	$ 243.903.825,00	89	91	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 3[2.279.475]
91		4.1.4 Ciclo 4	30 días	mié 25/06/25	vie 25/07/25	$ 243.903.825,00	90	92	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 4[2.279.475]
92		4.1.5 Ciclo 5	30 días	vie 25/07/25	dom 24/08/25	$ 243.903.825,00	91	93	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 5[2.279.475]
93		4.1.6 Ciclo 6	30 días	dom 24/08/25	mar 23/09/25	$ 243.903.825,00	92	94	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 6[2.279.475]
94		4.1.7 Ciclo 7	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 243.903.825,00	93	95	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 7[2.279.475]
95		4.1.8 Ciclo 8	30 días	jue 23/10/25	sáb 22/11/25	$ 243.903.825,00	94	96	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 8[2.279.475]
96		4.1.9 Ciclo 9	30 días	sáb 22/11/25	lun 22/12/25	$ 243.903.825,00	95	97	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 9[2.279.475]
97		4.1.10 Ciclo 10	30 días	lun 22/12/25	mié 21/01/26	$ 243.903.825,00	96	98	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 10[2.279.475]
98		4.1.11 Ciclo 11	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 243.903.825,00	97	99	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 11[2.279.475]
99		4.1.12 Ciclo 12	30 días	vie 20/02/26	dom 22/03/26	$ 243.903.825,00	98	100	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 12[2.279.475]
100		4.1.13 Ciclo 13	30 días	dom 22/03/26	mar 21/04/26	$ 121.916.140,26	99	101	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 13[1.139.403,
101		4.1.14 Ciclo 14	30 días	mar 21/04/26	jue 21/05/26	$ 176.690.834,47	100	102	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 13[1.651.316,
102		4.1.15 Ciclo 15	35 días	jue 21/05/26	jue 25/06/26	$ 176.690.834,47	101	103	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 13[1.651.316,
103		4.1.16 Ciclo 16	36 días	jue 25/06/26	vie 31/07/26	$ 176.690.834,47	102	104	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 13[1.651.316,
104		4.1.17 Ciclo 17	35 días	vie 31/07/26	vie 4/09/26	$ 194.750.104,01	103	105	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 13[1.820.094,
105		4.1.18 Ciclo 18	35 días	vie 4/09/26	vie 9/10/26	$ 194.750.104,01	104	106	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 13[1.820.094,
106		4.1.19 Ciclo 19	35 días	vie 9/10/26	vie 13/11/26	$ 194.750.104,01	105	107	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 13[1.820.094,
107		4.1.20 Ciclo 20	35 días	vie 13/11/26	vie 18/12/26	$ 186.316.001,15	106	276	4.1 Poda zonas de seguridad ciclo 13[1.820.094,
108		**4.2 ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES, ENTRE ZONAS DE SEGURIDAD Y LAS ZONAS PERIMETRALES.**	**666 días**	**jue 20/02/25**	**vie 18/12/26**	**$ 1.913.670.607,66**			
109		4.2.1 Ciclo 1	30 días	jue 20/02/25	sáb 22/03/25	$ 103.949.634,00	3	110	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 1[1.117.738]
110		4.2.2 Ciclo 2	30 días	sáb 22/03/25	lun 21/04/25	$ 103.949.634,00	109	111	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 2[1.117.738]
111		4.2.3 Ciclo 3	30 días	lun 21/04/25	mié 21/05/25	$ 103.949.634,00	110	112	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 3[1.117.738]
112		4.2.4 Ciclo 4	30 días	mié 21/05/25	vie 20/06/25	$ 103.949.634,00	111	113	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 4[1.117.738]
113		4.2.5 Ciclo 5	30 días	vie 20/06/25	dom 20/07/25	$ 103.949.634,00	112	114	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 5[1.117.738]
114		4.2.6 Ciclo 6	30 días	dom 20/07/25	mar 19/08/25	$ 103.949.634,00	113	115	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 6[1.117.738]
115		4.2.7 Ciclo 7	30 días	mar 19/08/25	jue 18/09/25	$ 103.949.634,00	114	116	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 7[1.117.738]
116		4.2.8 Ciclo 8	30 días	jue 18/09/25	sáb 18/10/25	$ 103.949.634,00	115	117	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 8[1.117.738]
117		4.2.9 Ciclo 9	30 días	sáb 18/10/25	lun 17/11/25	$ 103.949.634,00	116	118	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 9[1.117.738]
118		4.2.10 Ciclo 10	30 días	lun 17/11/25	mié 17/12/25	$ 103.949.634,00	117	119	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 10[1.117.738]
119		4.2.11 Ciclo 11	45 días	mié 17/12/25	sáb 31/01/26	$ 103.949.634,00	118	120	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 11[1.117.738]
120		4.2.12 Ciclo 12	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 103.949.634,00	119	121	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 12[1.117.738]
121		4.2.13 Ciclo 13	45 días	mar 17/03/26	vie 1/05/26	$ 103.949.634,00	120	122	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 14[1.117.738]
122		4.2.14 Ciclo 14	46 días	vie 1/05/26	mar 16/06/26	$ 103.949.634,00	121	123	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 15[1.117.738]
123		4.2.15 Ciclo 15	45 días	mar 16/06/26	vie 31/07/26	$ 92.962.696,77	122	124	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 15[999.598,89
124		4.2.16 Ciclo 16	47 días	vie 31/07/26	mié 16/09/26	$ 92.962.696,77	123	125	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 17[999.598,89
125		4.2.17 Ciclo 17	31 días	mié 16/09/26	sáb 17/10/26	$ 92.962.696,77	124	126	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 18[999.598,89
126		4.2.18 Ciclo 18	31 días	sáb 17/10/26	mar 17/11/26	$ 92.962.696,77	125	127	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 18[999.598,89
127		4.2.18 Ciclo 18	31 días	mar 17/11/26	vie 18/12/26	$ 86.524.944,58	126	276	4.2 Poda fuera zonas de seg ciclo 18[999.598,89
128		**4.3 PODA DE ÁRBOLES DE ALTURA VARIABLE Y DIFERENTES PORTE**	**150 días**	**jue 5/02/26**	**dom 5/07/26**	**$ 103.322.521,51**			
129		4.3.1 Intervencion 1	30 días	jue 5/02/26	sáb 7/03/26	$ 13.246.475,00	3FC+350 días	130FC+30 días	4.3 Poda arboles int. 1[25]
130		4.3.2 Intervencion 2	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 26.492.950,00	129FC+30 días	131FC+30 días	4.3 Poda arboles int. 2[50]
131		4.3.3 Intervencion 3	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 63.583.096,51	130FC+30 días		4.3 Poda arboles int. 3[120];4.3PODA DE ÁRBO
132		**4.4 TALA, CARGUE Y RETIRO DE ÁRBOLES DE ALTURA NO MAYOR A 20 M Y DIÁMETROS MENORES A 0.40 M.**	**505 días**	**mié 21/05/25**	**jue 8/10/26**	**$ 108.420.086,78**			
133		4.4.1 Intervencion 1	5 días	mié 21/05/25	lun 26/05/25	$ 4.395.408,00	3FC+90 días	134FC+270 días;138CC	4.4 Tala arboles <40 cm int. 1[3]
134		4.4.2 Intervencion 2	45 días	vie 20/02/26	lun 6/04/26	$ 58.605.440,00	133FC+270 días;14	135FC+60 días;139CC+120 d	4.4 Tala arboles <40 cm int. 2[40]
135		4.4.3 Intervencion 3	15 días	dom 5/07/26	lun 20/07/26	$ 24.907.312,00	134FC+60 días;143	140CC;136FC+60 días	4.4 Tala arboles <40 cm int. 3[17]
136		4.4.3 Intervencion 3	20 días	vie 18/09/26	jue 8/10/26	$ 20.511.926,78	135FC+60 días	276	4.4 Tala arboles <40 cm int. 3[14];4.4TALA, CAR

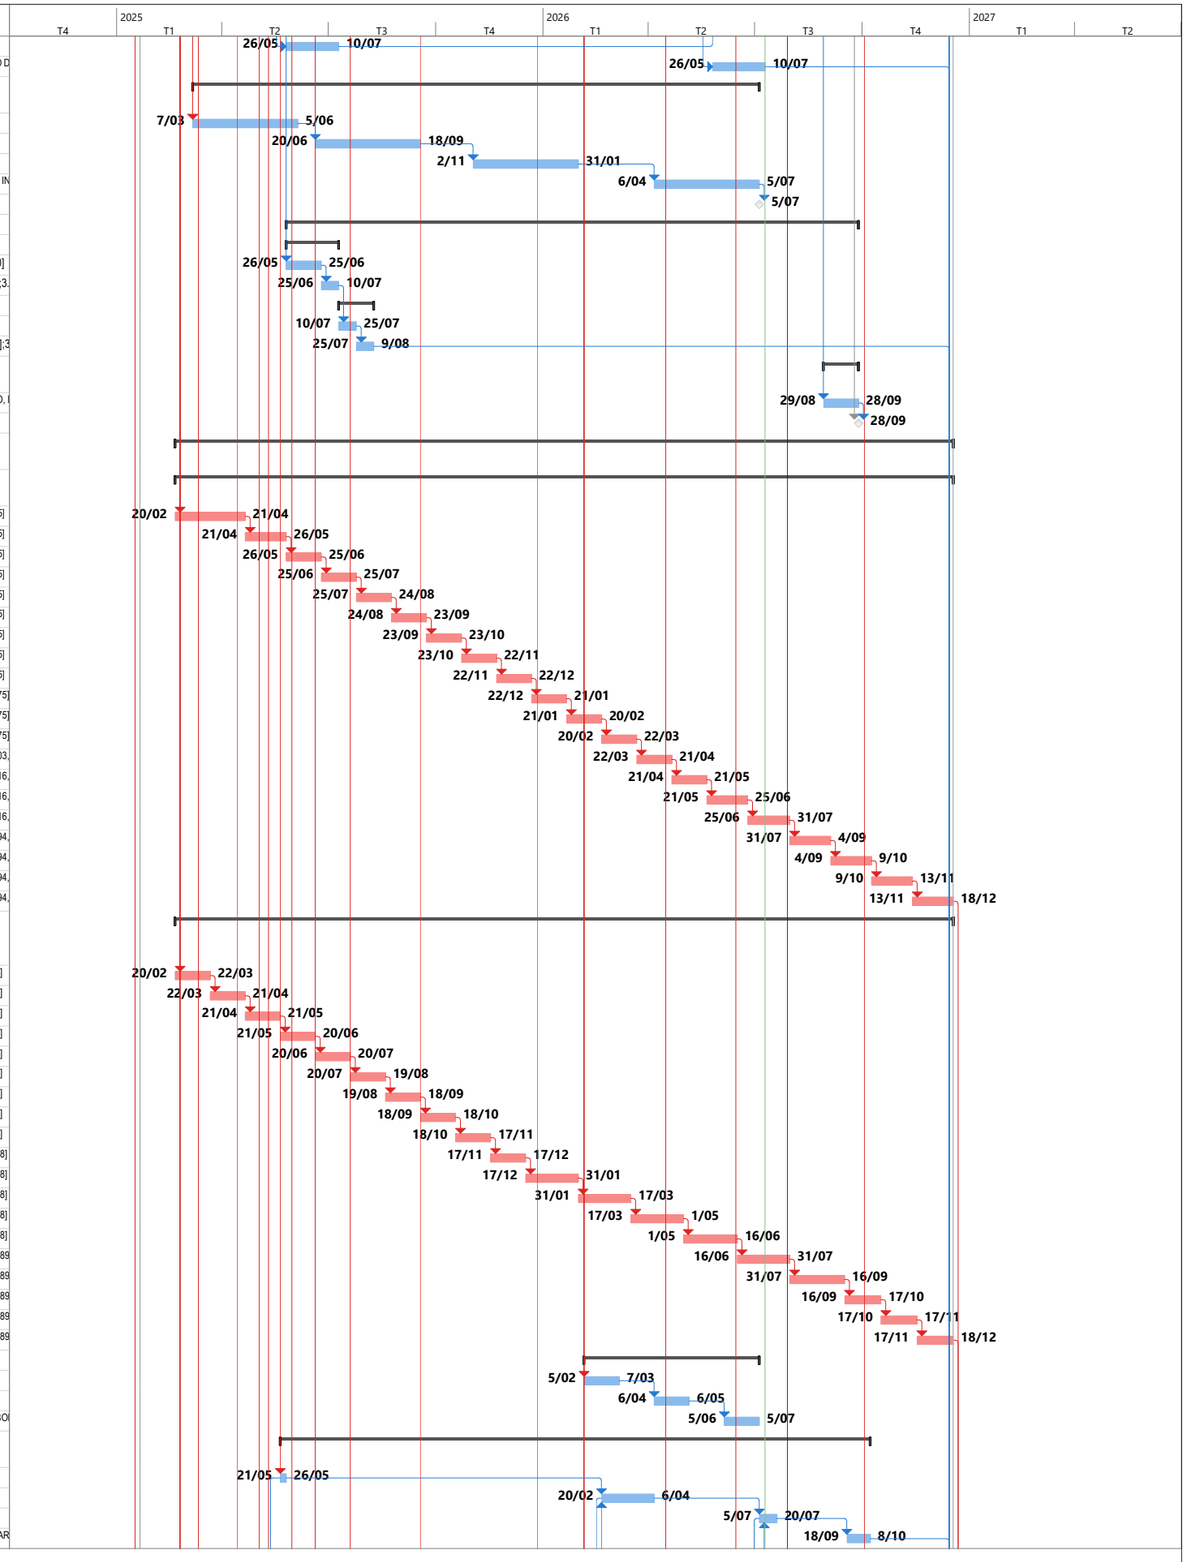

Proyecto: Programacion Aeropu
Fecha: vie 10/07/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos
137		**4.5 TALA, CARGUE Y RETIRO DE ÁRBOLES DE ALTURA NO MAYOR A 20 M Y DIÁMETROS ENTRE 0.41 M Y 0.60 M.**	**425 días**	**mié 21/05/25**	**lun 20/07/26**	**$ 37.675.935,35**			
138		4.5.1 Intervencion 1	5 días	mié 21/05/25	lun 26/05/25	$ 3.767.594,00	133CC	142CC	4.5 Tala arboles 41-60 cm int. 1[2]
139		4.5.2 Intervencion 2	30 días	sáb 20/06/26	lun 20/07/26	$ 33.908.341,35	134CC+120 días	143CC;140	4.5 Tala arboles 41-60 cm int. 2[18];4.5TALA, CA
140		~~4.5.3 Intervencion 3~~	~~0 días~~	~~lun 20/07/26~~	~~lun 20/07/26~~	~~$ 0,00~~	~~135CC;139~~	~~144CC~~	~~4.5 Tala arboles 41-60 cm int. 3[0]~~
141		**4.6 TALA, CARGUE Y RETIRO DE ÁRBOLES DE ALTURA NO MAYOR A 20 M Y DIÁMETROS ENTRE 0.61 M Y 1,00 M.**	**410 días**	**mié 21/05/25**	**dom 5/07/26**	**$ 45.481.167,45**			
142		4.6.1 Intervencion 1	5 días	mié 21/05/25	lun 26/05/25	$ 2.274.058,00	138CC	134	4.6 Tala arboles 61- 100 cm int. 1[1]
143		4.6.2 Intervencion 2	15 días	sáb 20/06/26	dom 5/07/26	$ 43.207.109,45	139CC	135;144	4.6 Tala arboles 61- 100 cm int. 2[19];4.6TALA, C
144		~~4.6.3 Intervencion 3~~	~~0 días~~	~~lun 20/07/26~~	~~lun 20/07/26~~	~~$ 0,00~~	~~140CC;143~~		~~4.6 Tala arboles 61- 100 cm int. 3[0]~~
145		**5. RECONFORMACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD**	**360 días**	**dom 20/07/25**	**mié 15/07/26**	**$ 1.284.049.198,78**			
146		**5.1 MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD NIVELADAS, REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL, INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES REQUERIDOS PARA MANTENER LAS ÁREAS NIVELADAS. (INCLUYE EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS**	**360 días**	**dom 20/07/25**	**mié 15/07/26**	**$ 1.284.049.198,78**			
147		5.1.1 Intervencion 1	70 días	dom 20/07/25	dom 28/09/25	$ 1.147.470.000,00	3FC+150 días	148FC+180 días	5.1 Reconformacion zonas de seguridad int. 1[30
148		5.1.2 Intervencion 2	110 días	vie 27/03/26	mié 15/07/26	$ 136.579.198,78	147FC+180 días	276	5.1 Reconformacion zonas de seguridad int. 3[3.5
149		**6. LIMPIEZA DE BOX COULVERTS, ENCOLES Y DESCOLES**	**315 días**	**dom 24/08/25**	**dom 5/07/26**	**$ 23.444.893,06**			
150		**6.1 LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA Y RETIRO DE MALEZA, ESCOMBROS, BASURAS, LODOS, ARENAS, DE BOX COULVERTS, ENCOLES Y DESCOLES.**	**315 días**	**dom 24/08/25**	**dom 5/07/26**	**$ 23.444.893,06**			
151		6.1.1 Ciclo 1	45 días	dom 24/08/25	mié 8/10/25	$ 3.886.911,00	172	152	6.1 Limpieza box, encoles y descoles ciclo 1[63]
152		6.1.2 Ciclo 2	45 días	sáb 22/11/25	mar 6/01/26	$ 3.886.911,00	174;151	153	6.1 Limpieza box, encoles y descoles ciclo 2[63]
153		6.1.3 Ciclo 3	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 3.886.911,00	175;152	154	6.1 Limpieza box, encoles y descoles ciclo 3[63]
154		6.1.4 Ciclo 4	45 días	vie 20/02/26	lun 6/04/26	$ 3.886.911,00	176;153	155	6.1 Limpieza box, encoles y descoles ciclo 4[63]
155		6.1.5 Ciclo 5	45 días	lun 6/04/26	jue 21/05/26	$ 3.886.911,00	177;154	156	6.1 Limpieza box, encoles y descoles ciclo 5[63]
156		6.1.6 Ciclo 6	45 días	jue 21/05/26	dom 5/07/26	$ 4.010.338,06	178;155	276	6.1 Limpieza box, encoles y descoles ciclo 6[65]
157		**7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTERNA DE CÁRCAMOS Y SUMIDEROS**	**170 días**	**sáb 27/12/25**	**lun 15/06/26**	**$ 6.961.398,82**			
158		**7.1 LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA Y RETIRO DE MALEZA, ESCOMBROS, BASURAS, LODOS, ARENAS, DE CÁRCAMOS Y SUMIDEROS.**	**30 días**	**sáb 27/12/25**	**lun 26/01/26**	**$ 4.971.136,57**			
159		7.1.1 Ciclo 1	30 días	sáb 27/12/25	lun 26/01/26	$ 4.971.136,57	3FC+310 días	160FC+45 días	7.1 Limpieza carcamos/sumideros ciclo 1[398,5]
160		~~7.1.2 Ciclo 2~~	~~30 días~~	~~jue 12/03/26~~	~~sáb 11/04/26~~	~~$ 6.237.500,00~~	~~159FC+45 días~~	~~161FC+45 días~~	~~7.1 Limpieza carcamos/sumideros ciclo 2[500]~~
161		~~7.1.3 Ciclo 3~~	~~0 días~~	~~mar 26/05/26~~	~~mar 26/05/26~~	~~$ 0,00~~	~~160FC+45 días~~	~~162FC+45 días~~	~~7.1 Limpieza carcamos/sumideros ciclo 3[0]~~
162		~~7.1.4 Ciclo 4~~	~~0 días~~	~~vie 10/07/26~~	~~vie 10/07/26~~	~~$ 0,00~~	~~161FC+45 días~~	~~163~~	~~7.1 Limpieza carcamos/sumideros ciclo 4[0]~~
163		~~7.1.5 Ciclo 5~~	~~0 días~~	~~vie 10/07/26~~	~~vie 10/07/26~~	~~$ 0,00~~	~~162~~	~~164~~	~~7.1 Limpieza carcamos/sumideros ciclo 5[0]~~
164		~~7.1.6 Ciclo 6~~	~~0 días~~	~~vie 10/07/26~~	~~vie 10/07/26~~	~~$ 0,00~~	~~163~~		~~7.1 Limpieza carcamos/sumideros ciclo 6[0]~~
165		**7.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS HD Grado 500**	**60 días**	**jue 16/04/26**	**lun 15/06/26**	**$ 1.990.262,25**			
166		7.2.1 Intervencion 1	60 días	jue 16/04/26	lun 15/06/26	$ 1.990.262,25	3FC+420 días	167FC+20 días	7.2 Suministro rejillas int.1[1];7.2SUMINISTRO E
167		~~7.2.2 Intervencion 2~~	~~0 días~~	~~dom 5/07/26~~	~~dom 5/07/26~~	~~$ 0,00~~	~~166FC+20 días~~		~~7.2 Suministro rejillas int.2[0]~~
168		**8. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - CANALES / CUNETAS**	**640 días**	**mié 12/03/25**	**sáb 12/12/26**	**$ 2.735.025.452,15**			
169		**8.1 REMOCIÓN DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACIÓN DE PENDIENTES, LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACIÓN DE CANALES DE DRENAJE.**	**630 días**	**mié 12/03/25**	**mié 2/12/26**	**$ 1.853.852.944,28**			
170		8.1.1 Ciclo 1	60 días	mié 12/03/25	dom 11/05/25	$ 156.259.400,00	3FC+20 días	171	8.1 Limpieza canales ciclo 1[24.200]
171		8.1.2 Ciclo 2	60 días	dom 11/05/25	jue 10/07/25	$ 156.259.400,00	170	172	8.1 Limpieza canales ciclo 2[24.200]
172		8.1.3 Ciclo 3	45 días	jue 10/07/25	dom 24/08/25	$ 156.259.400,00	171	173;151	8.1 Limpieza canales ciclo 3[24.200]
173		8.1.4 Ciclo 4	45 días	dom 24/08/25	mié 8/10/25	$ 156.259.400,00	172	174	8.1 Limpieza canales ciclo 4[24.200]
174		8.1.5 Ciclo 5	45 días	mié 8/10/25	sáb 22/11/25	$ 156.259.400,00	173	175;152	8.1 Limpieza canales ciclo 5[24.200]
175		8.1.6 Ciclo 6	45 días	sáb 22/11/25	mar 6/01/26	$ 156.259.400,00	174	176;153	8.1 Limpieza canales ciclo 6[24.200]
176		8.1.7 Ciclo 7	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 156.259.400,00	175	177;154	8.1 Limpieza canales ciclo 7[24.200]
177		8.1.8 Ciclo 8	45 días	vie 20/02/26	lun 6/04/26	$ 156.259.400,00	176	178;155	8.1 Limpieza canales ciclo 8[24.200]
178		8.1.9 Ciclo 9	45 días	lun 6/04/26	jue 21/05/26	$ 156.259.400,00	177	179;156	8.1 Limpieza canales ciclo 9[24.200]
179		8.1.10 Ciclo 10	45 días	jue 21/05/26	dom 5/07/26	$ 140.045.873,00	178	276;180	8.1 Limpieza canales ciclo 10[21.689]
180		8.1.11 Ciclo 11	50 días	dom 5/07/26	lun 24/08/26	$ 102.496.416,33	179	181	8.1 Limpieza canales ciclo 10[15.873,69]
181		8.1.12 Ciclo 12	50 días	lun 24/08/26	mar 13/10/26	$ 102.496.416,33	180	182	8.1 Limpieza canales ciclo 10[15.873,69]
182		8.1.13 Ciclo 13	50 días	mar 13/10/26	mié 2/12/26	$ 102.479.638,62	181	276	8.1 Limpieza canales ciclo 10[15.873,7];8.1REM
183		**8.2 REMOCIÓN DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACIÓN DE PENDIENTES, LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACIÓN DE CUNETA DE DRENAJE EN PERIMETRALES.**	**540 días**	**vie 20/06/25**	**sáb 12/12/26**	**$ 849.652.226,87**			
184		8.2.1 Ciclo 1	30 días	vie 20/06/25	dom 20/07/25	$ 31.484.000,00	3FC+120 días	185FC+90 días	8.2 Limpieza cunetas ciclo 1[2.000]
185		8.2.2 Ciclo 2	30 días	sáb 18/10/25	lun 17/11/25	$ 94.452.000,00	184FC+90 días	186FC+90 días	8.2 Limpieza cunetas ciclo 2[6.000]
186		8.2.3 Ciclo 3	30 días	dom 15/02/26	mar 17/03/26	$ 394.242.648,00	185FC+90 días	187FC+90 días	8.2 Limpieza cunetas ciclo 3[25.044]
187		8.2.4 Ciclo 4	30 días	lun 15/06/26	mié 15/07/26	$ 125.936.000,00	186FC+90 días	188FC+45 días	8.2 Limpieza cunetas ciclo 3[8.000]
188		8.2.5 Ciclo 5	30 días	sáb 29/08/26	lun 28/09/26	$ 101.772.030,00	187FC+45 días	189FC+45 días;190	8.2 Limpieza cunetas ciclo 3[6.465]
189		8.2.6 Ciclo 6	30 días	jue 12/11/26	sáb 12/12/26	$ 101.765.548,87	188FC+45 días	276	8.2 Limpieza cunetas ciclo 3[6.465];8.2REMOCIÓ
190		**8.3 NP EXCAVACION PARA CUNETAS**	**7 días**	**lun 28/09/26**	**lun 5/10/26**	**$ 2.405.862,99**	188	191	8.3 NP Excavacion para cunetas[150];8.3 NP Ex
191		**8.4 NP CONCRETO PARA CUNETAS**	**7 días**	**lun 5/10/26**	**lun 12/10/26**	**$ 29.114.418,01**	190	276	8.4 NP Concreto para cunetas[150];8.4 NP Conc
192		**9. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CERRAMIENTOS**	**545 días**	**dom 11/05/25**	**sáb 7/11/26**	**$ 2.409.323.283,79**			
193		**9.1 CONSERVACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE MALLA ESLABONADA INTERNA Y EXTERNA, CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CIMIENTO, CONSERVACION O CAMBIO DE LOS ALAMBRES DE PÚAS, PIE DE AMIGO.**	**440 días**	**dom 11/05/25**	**sáb 25/07/26**	**$ 1.034.866.289,45**			
194		9.1.1 Ciclo 1	60 días	dom 11/05/25	jue 10/07/25	$ 748.150.538,24	3FC+80 días	276;195FC+320 días	9.1 Limpieza malla[26.093,42]
195		9.1.2 Ciclo 2	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 286.715.751,21	194FC+320 día	276	9.1 Limpieza malla[10.000];9.1CONSERVACIÓN

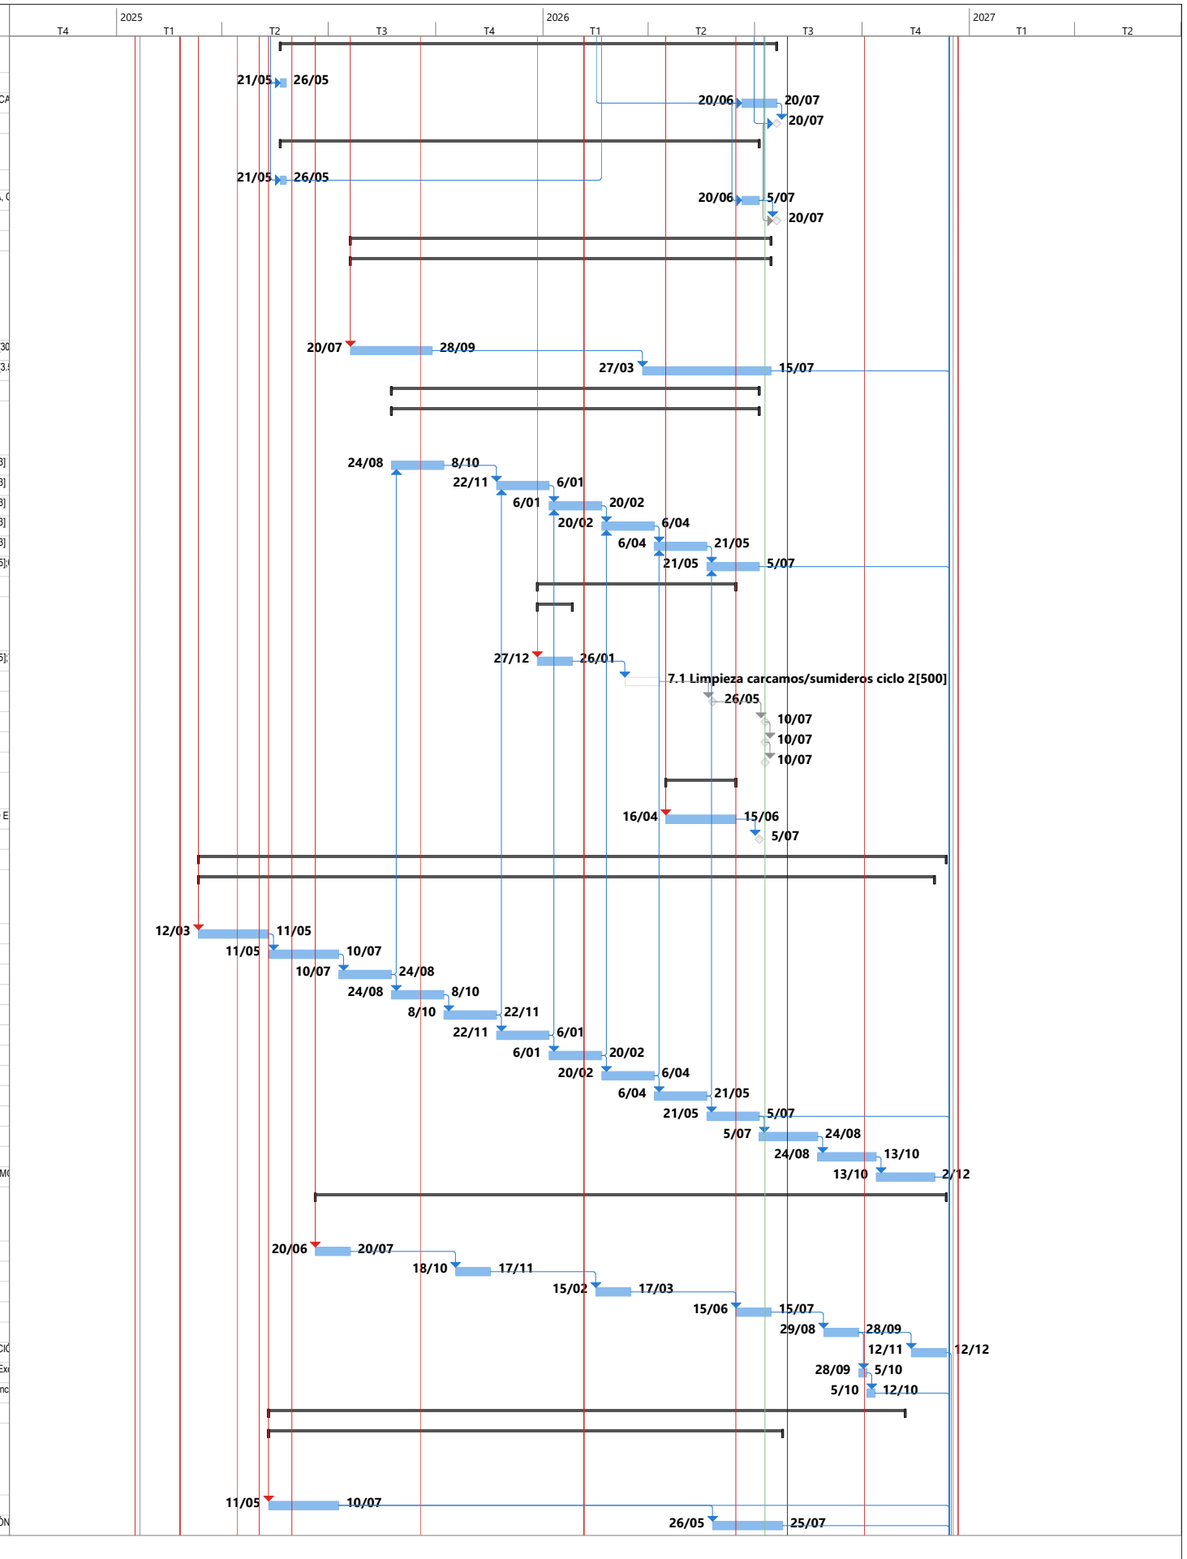

Proyecto: Programacion Aeropu
Fecha: vie 10/07/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos
196		**9.2 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIALES MIXTOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.**	**45 días**	**sáb 31/05/25**	**mar 15/07/25**	**$ 6.495.648,73**	3FC+100 días	197	9.2 Excavacion[180];9.2EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIALES MIXTOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.[1]
197		**9.3 CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEO (60% RAJÓN Y 40% CONCRETO)**	**45 días**	**mar 15/07/25**	**vie 29/08/25**	**$ 80.652.204,50**	196	198;200	9.3 Cimiento ciclopeo[180];9.3CIMIENTO CONC
198		**9.4 VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8"**	**45 días**	**vie 29/08/25**	**lun 13/10/25**	**$ 79.066.438,54**	197	276	9.4 Viga de amarre[108];9.4VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M,
199		**9.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2".**	**45 días**	**vie 29/08/25**	**lun 13/10/25**	**$ 136.201.263,78**			
200		9.5.1 Intervencion 1	45 días	vie 29/08/25	lun 13/10/25	$ 136.201.263,78	197	201CC;203CC;204FC+330 día	9.5 Cerramiento 1 altura Int. 1[1.000];9.5SUMINI
201		~~9.5.2 Intervencion 2~~	~~60 días~~	~~vie 29/08/25~~	~~mar 28/10/25~~	~~$ 136.201.000,00~~	~~200CC~~	~~202FC+30 días~~	~~9.5 Cerramiento 1 altura Int. 2[1.000]~~
202		~~9.5.3 Intervencion 3~~	~~60 días~~	~~jue 27/11/25~~	~~lun 26/01/26~~	~~$ 64.480.400,00~~	~~201FC+30 días~~		~~9.5 Cerramiento 1 altura Int. 3[400]~~
203		**9.6 CIMIENTO PARA PIE AMIGO EN CONCRETO 3000 PSI.**	**45 días**	**vie 29/08/25**	**lun 13/10/25**	**$ 3.212.776,14**	200CC	276	9.6 Cimiento pies de amigo[6];9.6CIMIENTO PAI
204		**9.7 NP DESMONTE CERRAMIENTO**	**30 días**	**mar 8/09/26**	**jue 8/10/26**	**$ 93.704.736,61**	200FC+330 días	205CC;208CC	9.7 NP DESMONTE CERRAMIENTO[3.000];9.7
205		**9.8 NP INSTALACION MALLA**	**30 días**	**mar 8/09/26**	**jue 8/10/26**	**$ 450.296.701,83**	204CC	206;207CC	9.8 NP INSTALACION MALLA[2.325];9.8 NP INS
206		**9.9 NP CONTINUACION VERTICAL**	**30 días**	**jue 8/10/26**	**sáb 7/11/26**	**$ 111.059.088,78**	205	276	9.9 NP CONTINUACION VERTICAL[250];9.9 NP
207		**9.10 NP PINTURA CERRAMIENTO**	**60 días**	**mar 8/09/26**	**sáb 7/11/26**	**$ 372.431.218,11**	205CC	276	9.10 NP PINTURA CERRAMIENTO[3.300];9.10
208		**9.11 NP PAÑETE MUROS CERRAMIENTO**	**45 días**	**mar 8/09/26**	**vie 23/10/26**	**$ 41.336.917,32**	204CC	276	9.11 NP PAÑETE MUROS CERRAMIENTO[500
209		**10. MEJORAMIENTO Y CONSERVACION - VIAS PERIMETRALES DE ACCESO Y DE SERVICIO PAVIMENTADAS Y EN AFIRMADO**	**585 días**	**sáb 3/05/25**	**mié 9/12/26**	**$ 3.810.495.575,25**			
210		**10.1 LIMPIEZA DE MALEZA Y VEGETACIÓN DE LOS BORDES DE LAS VÍAS (INCLUYE EL EQUIPO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO)**	**555 días**	**sáb 3/05/25**	**lun 9/11/26**	**$ 931.204.240,65**			
211		10.1.1 Ciclo 1	30 días	sáb 3/05/25	lun 2/06/25	$ 73.512.600,00	3FC+72 días	212	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 1[13.800]
212		10.1.2 Ciclo 2	30 días	lun 2/06/25	mié 2/07/25	$ 73.512.600,00	211	213	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 2[13.800]
213		10.1.3 Ciclo 3	30 días	mié 2/07/25	vie 1/08/25	$ 73.512.600,00	212	214	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 3[13.800]
214		10.1.4 Ciclo 4	30 días	vie 1/08/25	dom 31/08/25	$ 73.512.600,00	213	215	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 4[13.800]
215		10.1.5 Ciclo 5	30 días	dom 31/08/25	mar 30/09/25	$ 73.512.600,00	214	216	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 5[13.800]
216		10.1.6 Ciclo 6	30 días	mar 30/09/25	jue 30/10/25	$ 73.512.600,00	215	217	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 6[13.800]
217		10.1.7 Ciclo 7	30 días	jue 30/10/25	sáb 29/11/25	$ 73.512.600,00	216	218	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 7[13.800]
218		10.1.8 Ciclo 8	30 días	sáb 29/11/25	lun 29/12/25	$ 73.512.600,00	217	219	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 8[13.800]
219		10.1.9 Ciclo 9	45 días	lun 29/12/25	jue 12/02/26	$ 73.512.600,00	218	220	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 9[13.800]
220		10.1.10 Ciclo 10	45 días	jue 12/02/26	dom 29/03/26	$ 73.512.600,00	219	221	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 10[13.800]
221		10.1.11 Ciclo 11	45 días	dom 29/03/26	mié 13/05/26	$ 11.186.700,00	220	222FC+15 días	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 11[2.100]
222		10.1.12 Ciclo 12	30 días	jue 28/05/26	sáb 27/06/26	$ 63.924.000,00	221FC+15 días	223FC+45 días	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 10[12.000]
223		10.1.13 Ciclo 13	30 días	mar 11/08/26	jue 10/09/26	$ 60.523.243,20	222FC+45 días	224FC+30 días;230	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 10[11.361,6]
224		10.1.14 Ciclo 14	30 días	sáb 10/10/26	lun 9/11/26	$ 60.444.297,45	223FC+30 días	276	10.1 Limpieza bordes de vias ciclo 10[11.361,6];
225		**10.2 CONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES SIN MATERIAL**	**305 días**	**jue 18/09/25**	**lun 20/07/26**	**$ 1.999.304.045,03**			
226		10.2.1 Intervencion 1	45 días	jue 18/09/25	dom 2/11/25	$ 856.755.000,00	3FC+210 días	227FC+60 días	10.2 Conformacion vias[15.000]
227		10.2.2 Intervencion 2	45 días	jue 1/01/26	dom 15/02/26	$ 784.374.624,09	226FC+60 días	228FC+110 días	10.2 Conformacion vias[13.732,77]
228		10.2.3 Intervencion 3	45 días	vie 5/06/26	lun 20/07/26	$ 358.174.420,94	227FC+110 días	276;229FC+60 días;232FC+9	10.2 Conformacion vias[6.270,84];10.2CONFOR
229		**10.3 NP REVEGETALIZACION**	**30 días**	**vie 18/09/26**	**dom 18/10/26**	**$ 149.919.158,06**	228FC+60 días	276	10.3 NP REVEGETALIZACION[3.102];10.3 NP R
230		**10.4 NP LIMPIEZA SEÑALES**	**90 días**	**jue 10/09/26**	**mié 9/12/26**	**$ 7.102.836,97**	223	231CC	10.4 NP LIMPIEZA SEÑALES[100];10.4 NP LIM
231		**10.5 NP LIMPIEZA SEÑALES DEFENSAS**	**90 días**	**jue 10/09/26**	**mié 9/12/26**	**$ 12.113.338,82**	230CC	276	10.5 NP LIMPIEZA SEÑALES DEFENSAS[300];
232		**10.6 NP REMOSION Y PERFILADO MORTERO**	**30 días**	**dom 18/10/26**	**mar 17/11/26**	**$ 163.655.102,36**	228FC+90 días	233CC	10.6 NP REMOSION Y PERFILADO MORTERO
233		**10.7 NP LIMPIEZA ESTRUCTURAS**	**30 días**	**dom 18/10/26**	**mar 17/11/26**	**$ 19.273.098,43**	232CC	234CC	10.7 NP LIMPIEZA ESTRUCTURAS[2.500];10.7
234		**10.8 NP PICADO Y SELLADO ESTRUCTURAS CONCRET**	**30 días**	**dom 18/10/26**	**mar 17/11/26**	**$ 177.561.393,45**	233CC	235CC	10.8 NP PICADO Y SELLADO ESTRUCTURAS
235		**10.9 NP INSTALACION PAÑETE ALTA RESISTENCIA**	**30 días**	**dom 18/10/26**	**mar 17/11/26**	**$ 298.054.991,00**	234CC	276;236	10.9 NP INSTALACION PAÑETE ALTA RESIST
236		**10.10 NP DESMONTE PISA MALLA**	**20 días**	**mar 17/11/26**	**lun 7/12/26**	**$ 16.911.564,57**	235	276	10.10 NP DESMONTE PISA MALLA[1.000];10.1
237		**10.11 NP SUM E INST HITOS PLASTICOS**	**60 días**	**sáb 3/10/26**	**mié 2/12/26**	**$ 35.395.805,91**	3FC+590 días	276	10.11 SUM E INST HITOS[300];10.11 SUM E IN
238		**11. MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE EMERGENCIA Y CONTIGENCIA**	**687 días**	**jue 30/01/25**	**vie 18/12/26**	**$ 1.663.265.842,14**			
239		11.1 INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O MECÁNICAS Y/O ELECTROMECANICAS	5 días	jue 5/02/26	mar 10/02/26	$ 725.688,07	3FC+350 días	276	11.1 Reparaciones electromecanicas[49];11.1INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O
240		11.2 INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA	5 días	jue 5/02/26	mar 10/02/26	$ 800.327,25	3FC+350 días	276	11.2 Reparaciones hidrosanitarias[45];11.2INSTA
241		11.3 INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACION	5 días	jue 5/02/26	mar 10/02/26	$ 1.519.592,63	3FC+350 días	276	11.3 Reparaciones locativas[45];11.3INSTALACI
242		**11.4 EQUIPO DE CONTINGENCIA EVENTUALIDADES Y CORRECTIVOS 24 HORAS INCLUYE**	**687 días**	**jue 30/01/25**	**vie 18/12/26**	**$ 1.660.220.234,19**	**3CC+9 días**		
243		11.4.1 EQUIPO DE CONTINGENCIA INICIAL	547 días	jue 30/01/25	vie 31/07/26	$ 1.341.689.716,00	3CC+9 días	244FC+1 día	11.4 Equipo contingencia 24/7[556]
244		11.4.1 EQUIPO DE CONTINGENCIA ADICION TIEMPO	139 días	sáb 1/08/26	vie 18/12/26	$ 318.530.518,19	243FC+1 día	276	11.4 Equipo contingencia 24/7[132];11.4EQUIPO
245		**12. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS Y/O EDIFICACIONES EN ESTADO INUTILIZABLE Y EN DETERIORO**	**150 días**	**lun 15/06/26**	**jue 12/11/26**	**$ 49.817.571,65**			
246		**12.1 DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA INOPERABLE INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE**	**45 días**	**lun 15/06/26**	**jue 30/07/26**	**$ 45.062.894,24**	3FC+480 días	276;247FC+60 días	12.1 Demolicion[286,34];12.1DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA INOPERABLE, CARGUE Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
247		**12.2 NP DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS MENORES**	**45 días**	**lun 28/09/26**	**jue 12/11/26**	**$ 4.754.677,41**	246FC+60 días	276	12.2 NP DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS MENORES[1];12.2 NP DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS
248		**13. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS.**	**611 días**	**lun 14/04/25**	**mié 16/12/26**	**$ 897.633.402,86**			
249		**13.1 DESINSECTACION**	**600 días**	**lun 14/04/25**	**sáb 5/12/26**	**$ 763.153.974,14**			
250		13.1.1 INTERVENCION 1	120 días	lun 14/04/25	mar 12/08/25	$ 77.854.080,00	3FC+53 días	251;255CC+1 día	14.1 Desinsectacion[20.640]
251		13.1.2 INTERVENCION 2	250 días	mar 12/08/25	dom 19/04/26	$ 328.235.668,00	250	252FC+40 días	14.1 Desinsectacion[87.019]
252		13.1.3 INTERVENCION 3	60 días	vie 29/05/26	mar 28/07/26	$ 174.982.401,04	251FC+40 días	253FC+60 días	14.1 Desinsectacion[46.389,82]
253		13.1.4 INTERVENCION 4	70 días	sáb 26/09/26	sáb 5/12/26	$ 182.081.825,10	252FC+60 días	276	14.1 Desinsectacion[48.271,62];13.1DESIN
254		**13.2 DESINSECTACION METODO PASIVO**	**595 días**	**mar 15/04/25**	**mar 1/12/26**	**$ 101.115.993,53**			
255		13.2.1 INTERVENCION 1	270 días	mar 15/04/25	sáb 10/01/26	$ 60.128.400,00	250CC+1 día	256FC+135 días;259CC	14.2 Desinsectacion pasivos[600]
256		13.2.2 INTERVENCION 2	60 días	lun 25/05/26	vie 24/07/26	$ 20.543.870,00	255FC+135 días	257FC+60 días	14.2 Desinsectacion pasivos[205]
257		13.2.3 INTERVENCION 3	70 días	mar 22/09/26	mar 1/12/26	$ 20.443.723,53	256FC+60 días	276	14.2 Desinsectacion pasivos[204];13.2DESI
258		**13.3 LARVICIDA**	**610 días**	**mar 15/04/25**	**mié 16/12/26**	**$ 29.017.259,83**			
259		13.3.1 INTERVENCION 1	380 días	mar 15/04/25	jue 30/04/26	$ 22.649.627,00	255CC	260;263CC	14.3 Larvicida[187.187]
260		13.3.2 INTERVENCION 2	90 días	jue 30/04/26	mié 29/07/26	$ 3.330.938,82	259	261FC+60 días	14.3 Larvicida[27.528,42]
261		13.3.3 INTERVENCION 3	80 días	dom 27/09/26	mié 16/12/26	$ 3.036.694,01	260FC+60 días	276	14.3 Larvicida[25.299,69];13.3LARVICIDA A

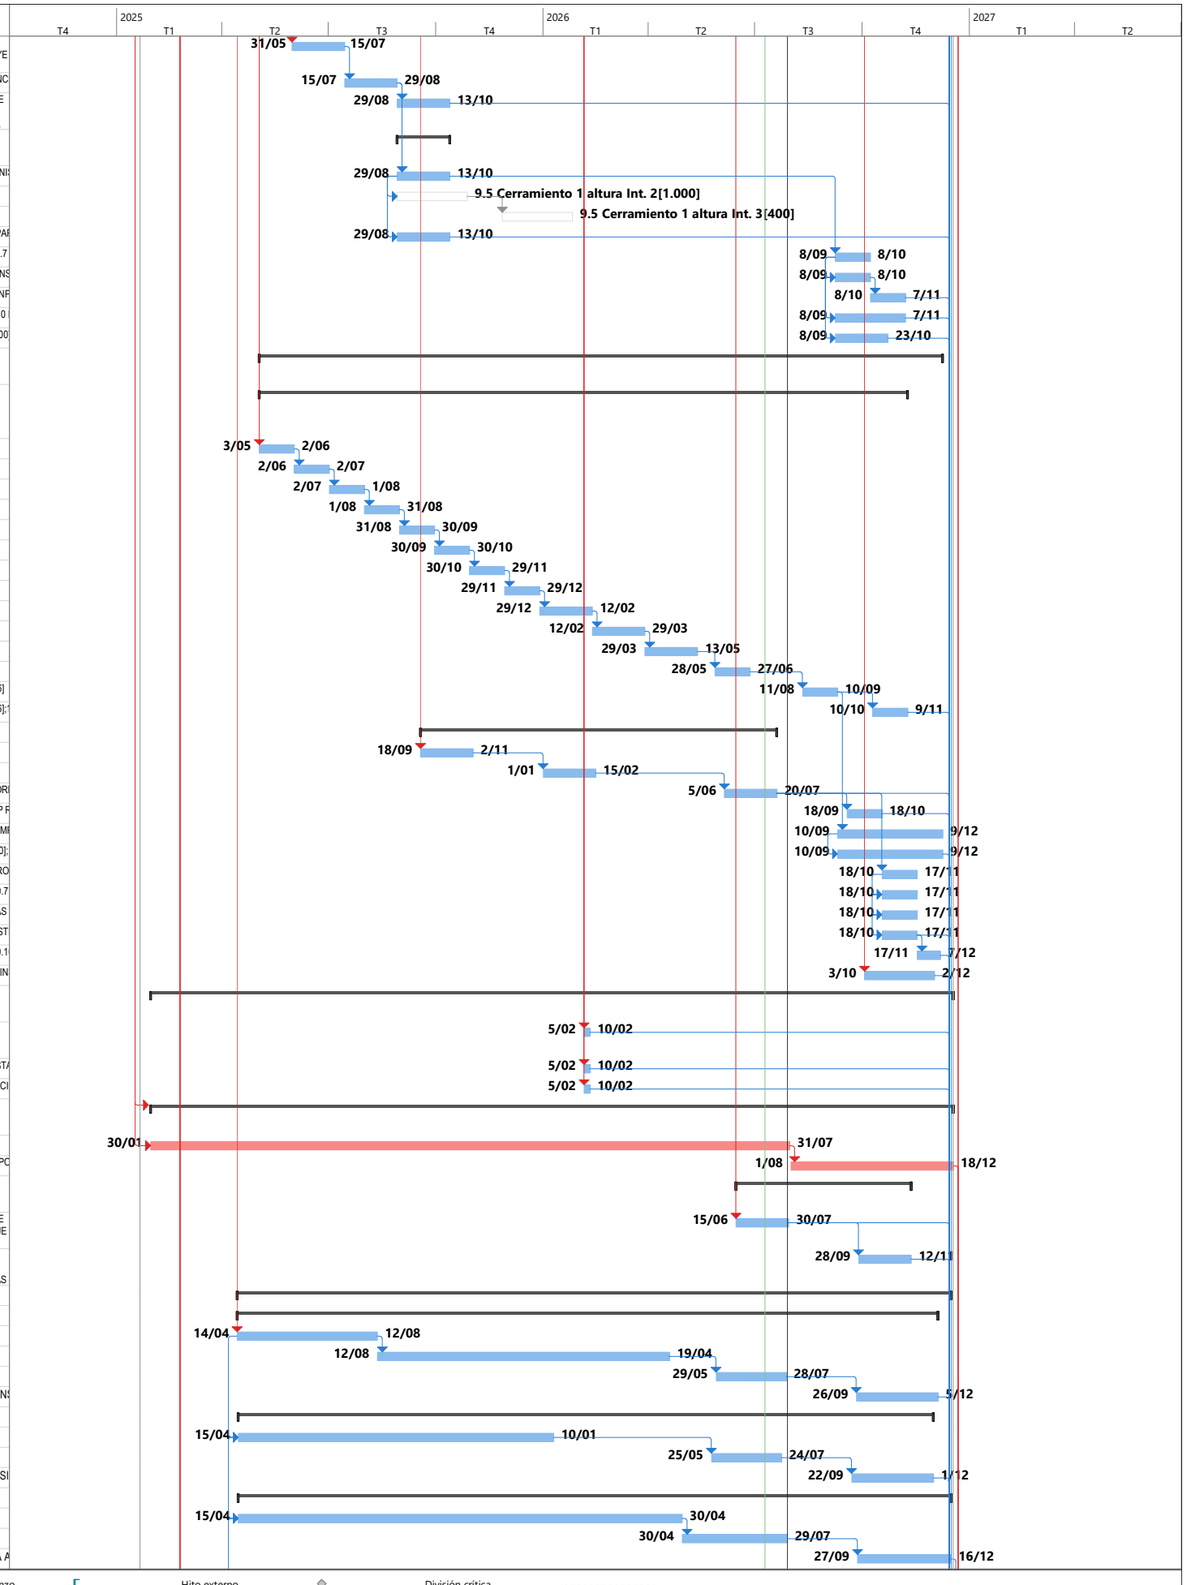

Proyecto: Programacion Aeropu
Fecha: vie 10/07/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos
262		**13.4 INSTALACION ESTACIONES DE CEBADO**	**465 días**	**mar 15/04/25**	**vie 24/07/26**	**$ 4.346.175,36**			
263		13.4.1 INTERVENCION 1	200 días	mar 15/04/25	sáb 1/11/25	$ 2.587.000,00	259CC	264FC+205 días	14.4 Estaciones cebado[50]
264		13.4.2 INTERVENCION 2	60 días	lun 25/05/26	vie 24/07/26	$ 1.759.175,36	263FC+205 días	276	14.4 Estaciones cebado[34];13.4Instalación
265		AJUSTE AL PESO	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26	$ 0,67	2FC+554 días	276	AJUSTE POR REDONDEO[1]
266		**14. BOLSAS DE MONTO AGOTABLE**	**659 días**	**jue 20/02/25**	**vie 11/12/26**	**$ 1.542.526.252,00**			
267		**14.1 BMA: SUMINISTRO DE INSUMOS O REPUESTOS DE ACTIVIDADES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y/O ELECTROMECÁNICAS.**	**659 días**	**jue 20/02/25**	**vie 11/12/26**	**$ 747.710.901,00**			
268		14.1.1 BMA 1	420 días	jue 20/02/25	jue 16/04/26	$ 571.062.690,00	3	276;269	BMA 1.1[1]
269		14.1.2 BMA 2	90 días	jue 16/04/26	mié 15/07/26	$ 133.648.211,00	268	270FC+17 días	BMA 1.2[1]
270		14.1.3 BMA 3	132 días	sáb 1/08/26	vie 11/12/26	$ 43.000.000,00	269FC+17 días	276	BMA 1.3[1]
271		**14.2 BMA: TRAMITES AMBIENTALES / FORESTALES (SI APLICA) Y MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES EN CANALES.**	**659 días**	**jue 20/02/25**	**vie 11/12/26**	**$ 360.315.351,00**			
272		14.2.1 BMA 1	420 días	jue 20/02/25	jue 16/04/26	$ 297.672.288,00	3	273	BMA 2.1[1]
273		14.2.2 BMA 2	90 días	jue 16/04/26	mié 15/07/26	$ 40.000.000,00	272	274FC+17 días	BMA 2.2[1]
274		14.2.3 BMA 3	132 días	sáb 1/08/26	vie 11/12/26	$ 22.643.063,00	273FC+17 días	276	BMA 2.3[1]
275		**14.3 BMA: INSUMOS, EQUIPOS Y PERSONAL PARA EL CONTROL TOPOGRAFICO DE LA OBRA**	596 días	vie 21/02/25	sáb 10/10/26	$ 434.500.000,00	3FC+1 día	276	BMA 3[22]
276		**Fin del proyecto**	**0 días**	**vie 18/12/26**	**vie 18/12/26**	**$ 0,00**	239;240;241;246;3		

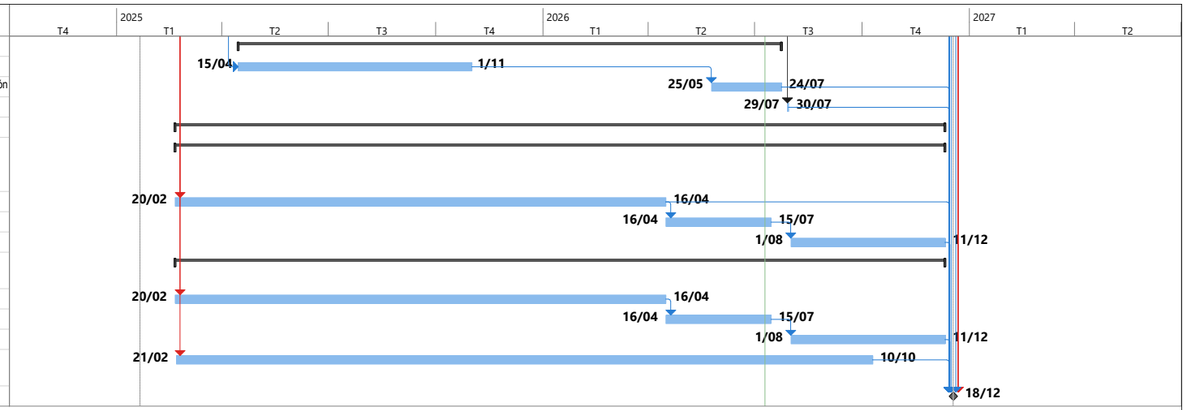

YESSICA ANDREA ORTIZ
DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

JUAN DAVID ALDANA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER-AEROPUERTO

Proyecto: Programacion Aeropu
Fecha: vie 10/07/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
