UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
PERIODO DEL INFORME:	Desde: viernes-29-may-26	Hasta: jueves-4-jun-26	INFORME SEMANAL N° : 168

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Objeto :	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AERONAUTICOS CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)		
Supervisor :	LUIS BERNARDO PUENTES TORRES		
Contratista:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	Número de Contrato:	22001449 H4 de 2022
Interventoría:	CONSORCIO RAS	Número de Contrato:	22001464 H3 de 2022

COSTOS DEL CONTRATO (COP)		OBRA	INTERVENTORÍA
Valor Inicial del Contrato (**A**):		$ 39 264 066 722	$ 3 158 424 339
Valor Adicional acumulado al Contrato (**B**):		$ 11 431 284 462	$ 1 770 720 000
Valor Total del Contrato Actualizado (C): (A+B):		**$ 50 695 351 184**	**$ 4 929 144 339**
Saldo de Facturación **Cto. OBRA** (C-D) con corte a:	Acta Parcial 27 : FEV 29	$ 27 430 612 108	----------
Valor por ejecutar **Cto. OBRA** con corte a informe semanal :	N°: 168	$ 25 586 601 662	----------
Saldo por amortizar del Valor del Anticipo *($10.904.458.163)* **Cto. OBRA**	51.05%	$ 5 566 702 702	----------
Saldo de facturación **Cto INTERVENTORÍA** con corte a:	Acta Parcial 24 : FEV 25	----------	$ 2 708 380 855


FECHAS Y PLAZOS	OBRA	INTERVENTORÍA
Fecha Acta de Inicio:	vie-20-ene-23	vie-20-ene-23
Duración Inicial Contrato (días):	851 días	851 días
Fecha Tin Contrato Previsto:	lun-19-may-25	lun-19-may-25
Plazo Adicional (días):	366 días	366 días
Suspensiónes acumuladas (días) :	56 días	56 días
Fecha Fin Contrato con (suspensiones / prórroga) :	mié-15-jul-26	mié-15-jul-26
Duración Actualizada Contrato (días):	1217 días	1217 días
% Tiempo contractual Transcurrido desde Acta de Inicio: 1176 días	97%	97%
Días faltantes para finalizar obra: 41 días	3%	3%
Fecha Fin Proyectado:	mié-15-jul-26	mié-15-jul-26

FACTURACIÓN - OBRA - AVANCE FINANCIERO			
Valor Avance Financiero Acumulado **Obra (D)**, hasta:	Acta Parcial 27 : FEV 29	$	23 264 739 076
Avance Financiero **Obra** (ejecutado acumulado), hasta :			45.89%
Valor Avance Financiero Acumulado **Interventoría** , hasta:	Acta Parcial 24 : FEV 25	$	2 220 763 484
Avance Financiero **Interventoría** (ejecutado acumulado), hasta			45.05%

AVANCE FÍSICO - LINEA BASE N° 8				
Valor Planeado Acumulado:	$	40 458 851 956	% Avance Físico Prog Acum:	79.81%
Valor Ejecutado Acumulado:	$	25 108 749 522	% Avance Físico Ejec Acum:	49.53%
Valor Desviación Acumulada:	-$	15 350 102 434	-30.28%	ALERTA ! - ATRASO GENERAL EN CRONOGRAMA DE OBRA > 3%
Valor Planeado Semana:	$	2 683 657 825	% Avance Físico Prog semana:	5.29%
Valor Ejecutado Semana:	$	1 072 525 877	% Avance Físico Ejec Semana	2.12%
Valor Desviación Semana:	-$	1 611 131 948	-60%	ATRASO ! VS PLANEACIÓN SEMANAL

INIDICADORES		
Valor Planificado :	PV	79.81%
Valor Ganado :	EV	49.53%
Variación del Cronograma :	SV	-30.28%
Rendimiento del Cronograma :	SPI	0.621
Estado General de Obra :		INCUMPLIMIENTO: ATRASO VS PLAN LINEA BASE: -30.28%

CURVA S - AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA - LINEA BASE N° 8

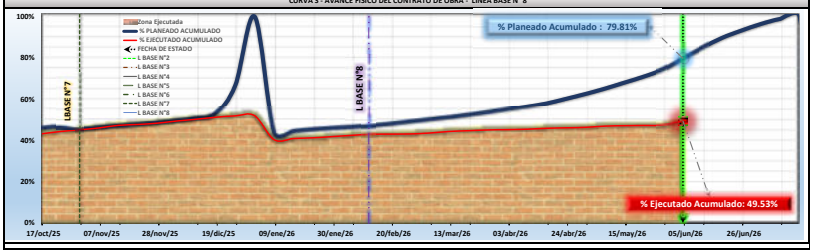

ANÁLIS DE DESVIACIONES

▶ Análisis SPI: El proyecto presenta un valor de 0.621, esto refleja un rendimiento muy bajo respecto a la programación vigente.

▶ Análisis Desviaciones: Se presenta una desviación física acumulada negativa de -30.28% respecto al flujo de inversión extraído de línea base vigente; el índice de causación (AVANCE FINANCIERO DE OBRA - FACTURADO) actualmente es de 45.89%.
La desviación física se presenta en los siguientes capítulos:

VALOR DESVIACIÓN ACUMULADA DE CAPÍTULO VS: LINEA BASE N° 8				OBSERVACIONES
_1	_1 PRELIMINARES	-$ 39 275 038	-0.08% Atraso	
_2	_2 PANTALLAS PRE-EXCAVADAS y PILOTAJE	-$ 2 415 758	0.00% Atraso	
_3	_3 CIMENTACION	$ 211 337 605	0.42% Adelanto	
_4	_4 ESTRUCTURA EN CONCRETO	-$ 3 426 [illegible]	-6.76% Atraso	
_5	_5 ESTRUCTURAS METALICAS	-$ 879 [illegible]	-1.74% Atraso	
_6	_6 MAMPOSTERIA	-$ 679 50[illegible]	-1.34% Atraso	
_7	_7 ELEMENTOS ARQUITECTONICOS en CONCRETO	-$ 1 308 [illegible]	-2.58% Atraso	
_8	_8 PAÑETES	-$ 435 548 [illegible]	-0.86% Atraso	
_9	_9 PISOS	-$ 1 46[illegible]	-2.89% Atraso	
_10	_10 CIELORRASOS y TABIQUERIA	-$ 709 11[illegible]	-1.40% Atraso	
_11	_11 VENTANERIA y CORTASOLES	-$ 667 92[illegible]	-1.32% Atraso	
_12	_12 CARPINTERIA METALICA	-$ 356 271 [illegible]	-0.70% Atraso	
_13	_13 CARPINTERIA DE MADERA	-$ 61 211 079	-0.12% Atraso	
_14	_14 ENCHAPES	-$ 2 808 84[illegible]	-0.01% Atraso	
_16	_16 CERRADURAS	-$ 8 910 327	-0.02% Atraso	
_17	_17 CUBIERTA	-$ 107 697 78[illegible]	-0.21% Atraso	
_18	_18 IMPERMEABILIZACION	-$ 39 531 567	-0.08% Atraso	
_19	_19 PINTURA	-$ 232 888 70[illegible]	-0.46% Atraso	
_20	_20 COCINA	-$ 73 877 15[illegible]	-0.15% Atraso	
_21	_21 EQUIPOS ESPECIALES	-$ 162 972 11[illegible]	-0.32% Atraso	
_22	_22 22 OBRAS EXTERIORES	-$ 192 550 76[illegible]	-0.38% Atraso	
_23	_23 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INC	-$ 932 13[illegible]	-1.84% Atraso	
_24	_24 INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES	-$ 3 267 07[illegible]	-6.44% Atraso	
_25	_25 INSTALACIONES MECANICAS Y AIRE ACONDICIONAD	-$ 479 960 04[illegible]	-0.95% Atraso	
_26	_26 ASEO Y LIMPIEZA	-$ 25 861 995	-0.05% Atraso	
	TOTAL DESVIACIÓN:	-$ 15 350 102 977	-30.28%	

ATRASOS:

Do acuerdo con el Balance de Mayores y Menores Cantidades N.º 14 y la Programación de Obra – Línea Base N.º 8, se evidencian atrasos principalmente en las siguientes actividades críticas:

En términos generales, se evidencia una afectación de la ruta crítica asociada al pórtico estructural del edificio, particularmente en los pisos 3, 4 y 5. Esta situación se originó por el incremento significativo en la duración de la construcción del entrepiso del nivel +5,00 m, cuya ejecución requirió aproximadamente tres veces el tiempo inicialmente programado. Debido a que esta actividad corresponde a una actividad predecesora dentro de la ruta crítica del proyecto y presenta incidencias adicionales asociadas a actividades de acarreo y logística constructiva, su impacto se ha reflejado de manera directa en el cronograma general de ejecución.

Aunado a lo anterior, para el nivel +9,38 m se evidencia un bajo rendimiento en la construcción del sistema de entrepiso correspondiente a dicho nivel, situación que representa un riesgo de incremento en las afectaciones sobre la secuencia constructiva prevista y el cumplimiento de la programación establecida.

Así mismo, se evidencia un avance medio en la ejecución de los elementos estructurales tipo aleros destinados a la conformación de la fachada en el nivel +6,50 m, situación que genera afectación sobre el avance previsto para esta etapa constructiva.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS / EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PERIODO

▶ Fabricación, Viguetas Metalicas en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200 e IPE-220, Placa 3o Piso Niv.+9.38.	*Ver Foto 1*
▶ Anclajes, Platinas, Viguetas Metalicas en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200 e IPE-220, Placa 3o Piso Niv.+9.38.	*Ver Foto 2*
▶ Tablero General de Distribución TGD de 300KVA de acuerdo con el diagrama unifilar	*Ver Foto 3*
▶ Avance encofrado Nivel +6.5m y 9.38m.	*Ver Foto 4*
▶ Amarre de acero de refuerzo entre ejes 1-3 placa Nivel 9.38m.	*Ver Foto 5*
▶ Acabado sobre la zona perimetral a la escalera del NE+9.38 mts / Aplicación de puente epóxico de adherencia con sikadur 32 primer	*Ver Foto 6*
▶ Corte y llave de empalme entre ejes (B-C); (1-2)-Nivel 9.38m	*Ver Foto 7*
▶ Vaciado de concreto sobre la zona perimetral a la escalera del NE+9.38 mts	*Ver Foto 8*
▶ Encofrado Nivel 6.5m, Aceros N 9.38m / elaboración de cilindros.	*Ver Foto 9*
▶ Demolición de placa puntal par accesos Gálibo Rampara 1 / Control recurso operativo Directo e Indirecto y/ actividades en Obra.	*Ver Foto 10*

CANTIDADES DE ITEMS EJECUTADOS EN EL PERIODO VS CANTIDADES CONTRATADAS VIGENTES SEGÚN BALANCE + & - CANTIDADES N° 14

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	CAPÍTULO	% DE INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PERIODO		UND	CONTRATADO		EJECUTADO SEMANA		ACUMULADO		LIBERACIÓN ACTIVIDAD
			VALOR	%		CANTIDAD	PONDERADO	CANTIDAD	%EJECT - ITEM	CANTIDAD	%EJECT - ITEM	
	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME →		**$ 1 069 632 054**							**49.53%**		
5.1.2	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Viguetas Perfiles Metalicos en Perfiles Estructurales	ESTRUCTURAS METALICAS	$ 272 633 118	25.5%	kg	15 707	0.49%	17 401	110.8%	18 008	115%	
5.1.3	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Viguetas Perfiles Metalicos en Perfiles Estructurales	ESTRUCTURAS METALICAS	$ 266 347 189	24.9%	kg	15 561	0.48%	17 000	109.2%	17 000	109%	
24.4.2	Tablero de transferencia red planta para una carga de 300 KVA	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 92 088 741	8.6%	UN	1	0.18%	1	100.0%	1	100%	
24.3.2	Luminarias hermética rectangular THD<15% F.P>0.95	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 83 326 392	7.8%	UN	364	0.26%	230.20	63.2%	230	63%	
24.4.1	Tablero Tablero General de Distribución TGD de 300KVA de acuerdo con el diagrama unifilar	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 77 205 298	7.2%	UN	1	0.15%	1.00	100.0%	1	100%	
24.2.10	Salidas para luminaria hermetica rectangular	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 57 685 746	5.4%	UN	364	0.19%	217.40	59.7%	217	60%	
4.6.5	Acero PDR-60 Vigas Aéreas	ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 47 177 996	4.4%	kg	104 165	1.76%	5 500	5.3%	55 824	54%	
4.2.2	Vigas Aéreas en Concreto Reforzado Color Gris f'c=4.000 psi 28 Mpa Placa 3o.Piso Niv.+9.38	ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 40 743 204	3.8%	m3	133	0.36%	30	22.3%	60	45%	
4.1.2	Columnas Rectangulares en Concreto Reforzado Color Gris a la vista f'c=4.000 psi 28 Mpa	ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 19 236 394	1.8%	m3	979	2.56%	14.50	1.5%	467	48%	
24.2.15	Salidas para sensor de movimiento, incluye sensor	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 15 082 190	1.4%	UN	96	0.06%	45	46.4%	45	46%	
24.4.3	Tablero para cargas reguladas incluye selector de by pass	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 14 185 511	1.3%	UN	1	0.03%	1.00	100.0%	1	100%	
21.1.1	Ascensor No.1 con capacidad de 1000 kg o 13 personas, ocho (8) paradas, foso de 1400x2350x1650	EQUIPOS ESPECIALES	$ 9 287 280	0.9%	und	1	0.46%	0	4.0%	1	93%	
21.1.2	Ascensor No.2 con capacidad de 1000 kg o 13 personas, ocho (8) paradas, foso de 1400x2350x1650	EQUIPOS ESPECIALES	$ 9 115 555	0.9%	und	1	0.45%	0	4.0%	1	93%	
24.12.2	Gabinete de by pass automático para UPS capacidad 250A	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 8 647 599	0.8%	un	1	0.02%	1	90.0%	1	90%	
4.6.2	Acero PDR-60 Columnas	ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 8 406 261	0.8%	kg	163 673	2.77%	980	0.6%	121 488	74%	
21.1.5	Ascensor No.3 con capacidad de 1000 kg o 13 personas, ocho (3) paradas, foso de 1400x2030x1650	EQUIPOS ESPECIALES	$ 6 624 820	0.6%	UND	1	0.33%	0	4.0%	1	93%	
23.1.6	TUBERIA PVC.P 3"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 4 412 734	0.4%	ML	214	0.03%	60	28.0%	60	28%	
24.2.11	Salida para luminaria de emergencia	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 3 868 042	0.4%	UN	152	0.14%	8	5.3%	8	5%	
23.2.3	Accesorios PVC.S 6" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 3 854 033	0.4%	UN	64	0.02%	20	31.3%	20	31%	
23.3.2	Tuberia PVC. S 4"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 3 592 063	0.3%	ML	178	0.02%	80	44.9%	80	45%	
23.3.1	Tuberia PVC. S 3"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 3 257 946	0.3%	ML	648	0.04%	100	15.4%	100	15%	
23.2.4	Tuberia PVC. S 4"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 2 873 348	0.3%	ML	693	0.07%	54	7.8%	54	8%	
24.1.1	Suministro de materiales transporte e instalación para salida para toma monofásica 180 w. S-15 R.	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 2 793 318	0.3%	UN	343	0.19%	10	2.8%	10	3%	
23.1.10	Accesorios PVC.P 1-1/2" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 2 747 653	0.3%	UN	188	0.01%	166	88.3%	166	88%	
23.1.8	Accesorios PVC.P 1-1/4" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 2 136 645	0.2%	UN	266	0.01%	200	75.2%	200	75%	
24.16.2	CONTROLADOR DE ACCESS POINT	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1 653 842	0.2%	UND	1	0.00%	1	100.0%	1	100%	
23.1.13	Accesorios PVC.P 3" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 1 541 633	0.1%	UN	112	0.02%	20	17.9%	20	18%	
4.7.2	Demolición Parcial Placa Anden y Puntal para ubicación Rampas y Escaleras (incluye retiro, cargue y	ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 1 297 633	0.1%	m3	61	0.05%	3	4.9%	43	70%	
24.1.5	Toma corriente doble con protección falla a tierra GFCI	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 905 298	0.1%	UN	28	0.01%	4	14.3%	4	14%	
23.1.7	TUBERIA PVC.P 1-1/4"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 720 362	0.1%	ML	466	0.02%	40	8.6%	40	9%	
23.1.5	TUBERIA PVC.P 2-1/2"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 621 216	0.1%	ML	59	0.01%	12	20.3%	12	20%	
23.2.7	Tuberia PVC.Ventilacion 2"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 609 606	0.1%	UN	201	0.01%	40	19.9%	40	20%	
23.2.2	Accesorios PVC.S 4" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 569 591	0.1%	UN	373	0.02%	17	4.6%	17	5%	
23.1.1	TUBERIA PVC.P 1/2"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 560 776	0.1%	ML	641	0.01%	60	9.4%	60	9%	
24.1.4	Suministro de materiales transporte e instalación para salida para toma monofásica 180 w. S-15 R.	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 547 765	0.1%	UN	220	0.11%	2	1.0%	2	1%	
_1.2.1	Alquiler Contenedor Oficina (20 pies. 6.10x2.44x2.59 m) + Contenedor Almacén (20 pies.	PRELIMINARES	$ 486 770	0.0%	mes	31	0.12%	0	0.8%	28	93%	
23.1.3	TUBERIA PVC.P 1-1/2"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 479 920	0.0%	ML	211	0.01%	21	10.0%	21	10%	
_1.2.2	Alquiler dos (2) unidades de Cabina Sencilla Baño Portátil + Aseo Diario. Incluye Transporte +	PRELIMINARES	$ 371 716	0.0%	mes	30	0.09%	0	0.8%	28	92%	
23.1.4	TUBERIA PVC.P 2"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 312 371	0.0%	ML	16	0.00%	10	62.5%	10	63%	
23.4.1	TUBERIA PVC.P 1/2"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 280 388	0.0%	ML	113	0.00%	30	26.5%	30	27%	
23.2.6	Tuberia PVC. S 3"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 242 391	0.0%	ML	92	0.01%	7	8.1%	7	8%	
23.2.1	Accesorios PVC.S 2" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 220 552	0.0%	UN	575	0.02%	14	2.4%	14	2%	
23.3.4	Accesorios PVC.S 4" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 201 032	0.0%	UN	88	0.01%	6	6.8%	6	7%	
23.4.2	TUBERIA PVC.P 3/4"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 199 695	0.0%	ML	144	0.00%	20	13.9%	20	14%	
23.1.38	ABRAZADERAS TIPO PERA 1.1/4"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 143 924	0.0%	UN	256	0.00%	15	5.9%	15	6%	
23.1.39	ABRAZADERAS TIPO PERA 1.1/2"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 102 909	0.0%	UN	177	0.00%	10	5.6%	10	6%	
23.3.3	Accesorios PVC.S 3" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 80 393	0.0%	UN	18	0.00%	4	22.2%	4	22%	
23.1.40	ABRAZADERAS TIPO PERA 2"	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 63 187	0.0%	UN	406	0.01%	5	1.2%	5	1%	
23.1.11	Accesorios PVC.P 2" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 53 396	0.0%	UN	20	0.00%	2	10.0%	2	10%	
23.4.5	Accesorios PVC.P 3/4" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 18 478	0.0%	UN	109	0.00%	4	3.7%	4	4%	
23.4.4	Accesorios PVC.P 1/2" (Sum + Instalación)	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 18 150	0.0%	UN	25	0.00%	6	24.0%	6	24%	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Lámina metal deck 2" calibre 20	m2					491.8	**0.092%**	
Acabado superficial de rampa vehicular, estriado tipo espina de pescado, escobillado y guiseado en bordes.	m2					240.0	**0.025%**	
PLACA EN VOLADIZO ALIGERADO CON ACABADO ARQUITECTONICO PARA EL NIVEL NV 6+50 SECCIÓN 1 EJE 9-10 ENTRE B Y F	m2					-	-	
PLACA EN VOLADIZO ALIGERADO CON ACABADO ARQUITECTONICO PARA EL NIVEL NV 6+50 SECCION 2 EJE E-F ENTRE 1-10	m2					25.0	**0.135%**	
PLACA EN VOLADIZO ALIGERADO CON ACABADO ARQUITECTONICO PARA EL NIVEL NV 6+50 SECCION 3 EJE 1 ENTRE C Y F	m2					27.0	**0.114%**	
PLACA EN VOLADIZO ALIGERADO CON ACABADO ARQUITECTONICO PARA EL NIVEL NV 6+50 SECCION 4 EJE 1 ENTRE B Y C	m2					7.9	**0.018%**	
PLACA EN VOLADIZO ALIGERADO CON ACABADO ARQUITECTONICO PARA EL NIVEL NV 6+50 SECCION 0-1 EJE ENTRE B Y C y 8-10	m2					-	-	
	Porcentaje Aproximado de Avance / Global						*0.383%*	

ITEM	Obervación: Alerta: 6 items contratados requieren Justificar Mayor Cantidad Reportada:	CAPÍTULO	VALOR EXCEDIDO DEL BALANCE	UND	CONTRATADO CANTIDAD	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO %EJECT - ITEM	ALERTA BALANCE M&MC
5.1.2	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Viguetas Perfiles Metalicos en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200 e IPE-220, según diseño estructural.	ESTRUCTURAS METALICAS	-$ 36 051 813	kg	15 707	18 008	115%	
4.6.3	Malla Electrosoldada f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa) M-1.88 Torta Superior Placas Aligeradas	ESTRUCTURA EN CONCRETO	-$ 30 967 347	kg	22 703	25 749	113%	
5.1.3	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Viguetas Perfiles Metalicos en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200, IPE-220 e IPE-3240, según diseño	ESTRUCTURAS METALICAS	-$ 22 545 348	kg	15 561	17 000	109%	
3.7.10	Anclaje: Perforación + Inyección epoxico Ø 1" L= 38.10 cm	CIMENTACIÓN	-$ 7 523 210	und	56	104	186%	
3.7.5	Anclaje: Perforación + Inyección epoxico Ø 3/8" L= 14.29 cm	CIMENTACIÓN	-$ 4 473 691	und	3 775	3 932	104%	
3.7.7	Anclaje: Perforación + Inyección epoxico Ø 5/8" L= 23.81 cm	CIMENTACIÓN	-$ 3 230 782	und	135	190	141%	

MINISTERIO DE TRANSPORTE - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL -MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN 1
PÁGINA 2 de 6

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

PERIODO DEL INFORME: Desde: viernes-29-may-26 Hasta: jueves-4-jun-26 INFORME SEMANAL N° : 168

TAREA / CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

Alerta: Se identifican 613 actividades con atraso físico, cada una con un desfase negativo en la inversión prevista ≤ -200 mil COP. Se requiere implementar un plan de contingencia:

			CONTRATADO %POND	CONTRATADO VALOR	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN ACUMULADA	VARIACIÓN	VARIACIÓN NEGATIVA - < 200MIL COP →		PLANEADO L-BASE COMIENZO	PLANEADO L-BASE FIN
			100.0%	$ 50 695 351 173	79.81%	49.53%	-30.28%	-$ 15 938 312 173		20-ene-23	14-jul-26
10.1.3	CIELORRASOS Y TABIQ	Cielorraso Woodlines Bafle 100 paso 100 Hounter Douglas o equivalente compuesto por plafón liso en Aluzinc 0.6 acabado pintura poliéster im	1.6%	$ 802 723 556	63%	-	-63%	-$ 507 321 290	3%	29-may-26	8-jun-26
4.6.3	ESTRUCTURA EN CON	Acero PDR-60 Vigas Aéreas	1.8%	$ 893 509 218	100%	54%	-46%	-$ 414 662 748	3%	11-ene-26	31-may-26
4.1.2	ESTRUCTURA EN CON	Columnas Rectangulares en Concreto Reforzado Color Gris a la vista f'c=4.000 psi 28 Mpa	2.6%	$ 1 298 257 614	78%	48%	-30%	-$ 389 627 652	2%	2-nov-25	30-jun-26
7.1.5	ELEMENTOS ARQUITE	Cortasol Prefabricado en Panel Ligero de Concreto Reforzado con Fibra de Vidrio (GRC), con aislante de poliestireno expandido y acabado en co	1.1%	$ 554 363 391	67%	-	-67%	-$ 370 591 933	2%	16-mar-26	14-jul-26
4.6.2	ESTRUCTURA EN CON	Acero PDR-60 Columnas	2.8%	$ 1 403 955 408	100%	74%	-26%	-$ 361 849 960	2%	22-nov-25	22-mar-26
4.6.8	ESTRUCTURA EN CON	Metaldeck 2" Calibre 22 (0.75 mm)	0.6%	$ 293 358 153	121%	-	-121%	-$ 354 925 472	2%	26-mar-26	14-jun-26
7.1.6	ELEMENTOS ARQUITE	Cortasol Prefabricado en Panel Ligero de Concreto Reforzado con Fibra de Vidrio (GRC), con aislante de poliestireno expandido y acabado en co	0.9%	$ 445 217 349	79%	-	-79%	-$ 350 513 267	2%	14-feb-26	4-jul-26
8.1.1	PAÑETES	Pañete Corriente Muros con mortero M.1:4 y espesor e=2 cm	0.7%	$ 379 564 450	90%	2%	-88%	-$ 332 993 617	2%	26-jun-25	13-jul-26
9.2.2	PISOS	Piso en Porcelanato ref: FUZ1DB60009D - Tipo: DENIA GRIS 60X60 MATE,TONO ACERO,CALIBRE CERO, marca : Attmosferas ó similar para tráfico	0.8%	$ 403 355 083	79%	-	-79%	-$ 319 188 312	2%	25-mar-26	23-jun-26
23.5.1	INSTALACIONES HIDR	BOMBA INCENDIO CAUDAL NOMINAL Q=870 GPM, HDT=107 m, POTENCIA 120 HP, TABLERO CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA, BOMBA JOCKE	0.6%	$ 303 571 399	100%	-	-100%	-$ 303 571 400	2%	15-abr-26	25-abr-26
6.1.1	MAMPOSTERIA	Muros espesor e=12 cm en Bloque de Arcilla No. 4 de 23 x 33 x 9 cm con mortero de pega M.1:4	0.7%	$ 368 097 768	76%	-	-76%	-$ 279 827 369	2%	5-mar-26	3-jul-26
24.11.8	INSTALACIONES ELEC	Generador 300 KVA 220/127 V (300 KVA EFECTIVOS A 2600 msnm)	0.6%	$ 313 337 775	84%	-	-84%	-$ 264 561 515	2%	23-feb-26	23-jun-26
24.3.3	INSTALACIONES ELEC	Luminarias tipo bala LED 21w THD<15% F.P>0.95	0.7%	$ 357 917 171	73%	-		-$ 262 404 395	2%	14-abr-26	23-jun-26
5.1.4	ESTRUCTURAS METAL	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Viguetas Perlines Metalicos en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200 e IPE-220, según diseño estru	0.5%	$ 242 810 696	100%	-	-100%	-$ 242 810 691	2%	26-abr-26	10-may-26
5.4.1	ESTRUCTURAS METAL	Mortero Ignifugo Proyectado Clase A-1 de Perlita-Vermiculita de espesor 20 mm Recubrimiento Inferior Laminas Steel-Deck Entrepisos, para	0.7%	$ 354 174 856	59%	-		-$ 207 900 631	1%	30-abr-26	29-jun-26
12.5.1	CARPINTERIA METAL	Baranda Escaleras Emergencia h=1.10 m con marco y nave en tubular metalico de 1" con doble pasamanos en tuberia redonda estructural de	0.4%	$ 199 671 690	100%	-		-$ 199 671 690	1%	7-may-26	17-may-26
4.3.13	ESTRUCTURA EN CON	Placa Steel Deck e= 11 cm en concreto de f'c=3.000 psi 21 Mpa. com Metal Deck 2" Calibre 22 de 0.94x5.60. Incluye conectores de cortant	0.4%	$ 193 886 271	100%	-	-100%	-$ 193 886 277	1%	26-abr-26	24-may-26
4.3.11	ESTRUCTURA EN CON	Placa Steel Deck e= 11 cm 3o.Piso Niv.+9.38	0.4%	$ 193 872 039	100%	-	-100%	-$ 193 872 053	1%	15-feb-26	15-mar-26
4.3.12	ESTRUCTURA EN CON	Placa Steel Deck e= 11 cm en concreto de f'c=3.000 psi 21 Mpa. com Metal Deck 2" Calibre 22 de 0.94x5.60. Incluye conectores de cortant	0.4%	$ 191 422 286	100%	-	-100%	-$ 191 422 278	1%	22-mar-26	19-abr-26
9.6.3	PISOS	Piso en Concreto endurecido, pulido, brillado, pulido y dilatado, conformado por Torta de sobrepiso espesor e=5 a 7 cm en concreto f'c=3.000 ps	0.4%	$ 185 109 764	100%	-	-100%	-$ 185 109 751	1%	22-feb-26	23-may-26
4.2.3	ESTRUCTURA EN CON	Vigas Aéreas en Concreto Reforzado Color Gris f'c=4.000 psi 28 Mpa Placa 4o.Piso Niv.+13.75	0.4%	$ 182 707 593	100%	-	-100%	-$ 182 707 600	1%	22-mar-26	19-abr-26
4.2.4	ESTRUCTURA EN CON	Vigas Aéreas en Concreto Reforzado Color Gris f'c=4.000 psi 28 Mpa Placa 5o.Piso Niv.+18.13	0.3%	$ 177 133 649	100%	-	-100%	-$ 177 133 640	1%	26-abr-26	24-may-26
5.1.1	ESTRUCTURAS METAL	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Viguetas Perlines Metalicos en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200, IPE-220 e IPE-360	0.3%	$ 155 237 940	209%	100%	-109%	-$ 169 061 832	1%	11-ene-26	25-ene-26
24.14.1	INSTALACIONES ELEC	CARRETE DE 305 METROS DE CABLE CAT6A, UTP.	0.4%	$ 190 844 712	79%	-	-79%	-$ 151 233 846	1%	25-mar-26	23-jun-26
24.17.4	INSTALACIONES ELEC	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO (50T) PARA GARANTIZAR 30 DIAS DE ALMACENAMIENTO	0.4%	$ 207 592 736	69%	-		-$ 142 962 200	1%	24-abr-26	23-jun-26
24.5.7	INSTALACIONES ELEC	Alimentador 6(400)+(4/0) desde TRAFO y GEN B extinción	0.3%	$ 167 680 526	84%	-		-$ 141 578 286	1%	23-feb-26	23-jun-26
4.5.1	ESTRUCTURA EN CON	Muros + Base + Tapa Tanque de Agua Suministro e Incendio en concreto reforzado f'c=4.000 psi 28 Mpa. Niv.-6.00	0.3%	$ 93 970 067	150%	-	-150%	-$ 140 830 130	1%	4-dic-25	13-ene-26
10.1.2	CIELORRASOS Y TABIQ	Cielorraso en Lamina de Fibtrocemento Superboard de 6 mm de espesor, con estructura en perfilería metálica galvanizada, dilatado	0.5%	$ 264 871 430	52%	-		-$ 138 262 892	1%	4-may-26	3-jul-26
7.1.2	ELEMENTOS ARQUITE	Cortasol Prefabricado en Panel Ligero de Concreto Reforzado con Fibra de Vidrio (GRC), con aislante de poliestireno expandido y acat	0.3%	$ 154 355 983	84%	-	-84%	-$ 129 195 972	1%	15-abr-26	14-jun-26
4.5.2	ESTRUCTURA EN CON	Muros + Base + Tapa Tanque de Agua Incendio e Incendio en concreto reforzado f'c=4.000 psi 28 Mpa. Niv.-6.00	0.2%	$ 118 649 706	100%	-		-$ 118 649 690	1%	4-dic-25	13-ene-26
4.6.7	ESTRUCTURA EN CON	Acero PDR-60 Tanques de Agua	0.2%	$ 116 210 727	100%	-	-100%	-$ 116 210 725	1%	4-dic-25	13-ene-26
24.10.1	INSTALACIONES ELEC	Cable de cobre 2 AWG XLPE 15 KV	0.2%	$ 125 234 386	93%	-		-$ 116 175 778	1%	13-feb-26	13-jun-26
24.11.2	INSTALACIONES ELEC	Celda de seccionador SF6 15KV	0.3%	$ 137 387 048	84%	-		-$ 116 000 458	1%	23-feb-26	23-jun-26
4.3.14	ESTRUCTURA EN CON	Placa Steel Deck e= 11 cm en concreto de f'c=4.000 psi 28 Mpa. com Metal Deck 2" Calibre 22 de 0.94x5.60. Incluye conectore	0.3%	$ 176 058 405	65%	-		-$ 114 808 418	1%	17-may-26	14-jun-26
9.4.2	PISOS	Piso Deck en Madera Plástica WCP ARKODECK H de Arkos o equivalente, en listones de 140x2800 x2.50 mm, sobre una base de durmi	0.4%	$ 197 567 611	58%	-	-58%	-$ 114 144 681	1%	19-abr-26	8-jul-26
9.1.1	PISOS	Alistado Pisos con mortero M.1:3 espesor e = 3 cm	0.3%	$ 146 434 246	77%	-	-77%	-$ 113 468 300	1%	8-feb-26	8-jul-26
6.2.1	MAMPOSTERIA	Columnetas de Confinamiento dentro de Muro de 9 x 20 cm en concreto reforzado a la vista f'c=3000 psi	0.3%	$ 159 587 447	71%	-	-71%	-$ 113 347 852	1%	11-mar-26	9-jul-26
7.1.3	ELEMENTOS ARQUITE	Cortasol Prefabricado en Panel Ligero de Concreto Reforzado con Fibra de Vidrio (GRC), con aislante de poliestireno expandido y acat	0.3%	$ 154 081 948	72%	-	-72%	-$ 110 542 808	1%	15-abr-26	24-jun-26
23.5.47	INSTALACIONES HIDR	Tubería AC SCH 40 Ø 2"	0.3%	$ 164 641 317	64%	-		-$ 105 150 923	1%	27-abr-26	26-jun-26
25.64	INSTALACIONES MECA	Conductos en lamina galvanizada calibre 24	0.2%	$ 120 625 422	87%	-	-87%	-$ 104 530 525	1%	3-feb-26	23-jun-26
4.2.2	ESTRUCTURA EN CON	Vigas Aéreas en Concreto Reforzado Color Gris f'c=4.000 psi 28 Mpa Placa 3o.Piso Niv.+9.38	0.4%	$ 182 337 823	100%	45%		-$ 100 509 043	1%	15-feb-26	15-mar-26
24.3.1	INSTALACIONES ELEC	Luminarias pánel LED 60*60 cm THD<15% F.P>0.95	0.3%	$ 135 726 188	73%	-	-73%	-$ 99 506 709	1%	14-abr-26	23-jun-26
21.3.3	EQUIPOS ESPECIALES	Banda Escaner Rayos X para revisar las maletas	0.3%	$ 157 216 198	58%	-	-58%	-$ 90 766 153	1%	18-may-26	17-jun-26
24.17.6	INSTALACIONES ELEC	CÁMARAS IP TIPO MINIDOMO CON IR´s PARA INTERIORES	0.3%	$ 127 581 907	69%	-		-$ 87 861 402	1%	24-abr-26	23-jun-26
24.1.1	INSTALACIONES ELEC	Suministro de materiales transporte e instalación para salida para toma monofásica 180 w. 5-15 R. Circuitos normales	0.2%	$ 98 267 479	89%	3%	-86%	-$ 84 719 787	1%	13-feb-26	18-jun-26
24.6.1	INSTALACIONES ELEC	Bandeja tipo ducto galvanizada 30 cm con tapa tipo cerrado	0.2%	$ 93 022 176	89%	-		-$ 82 417 669	1%	18-feb-26	18-jun-26
7.1.4	ELEMENTOS ARQUITE	Cortasol Prefabricado en Panel Ligero de Concreto Reforzado con Fibra de Vidrio (GRC), con aislante de poliestireno expandido y acat	0.2%	$ 98 257 466	84%	-		-$ 82 241 477	1%	15-abr-26	14-jun-26
5.2.5	ESTRUCTURAS METAL	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metálica Escalera E-03 Lobby 1o a 2o Piso un (1) Tramo, conformada por Gualc	0.2%	$ 91 197 427	90%	-		-$ 82 150 129	1%	10-may-26	7-jun-26
24.5.8	INSTALACIONES ELEC	Alimentador 12(400)+(4/0) salida de transf y generador	0.2%	$ 94 500 471	84%	-		-$ 79 789 905	1%	23-feb-26	23-jun-26
6.3.2	MAMPOSTERIA	Acero PDR-60 para elementos confinamiento mampostería	0.2%	$ 104 617 979	75%	-	-75%	-$ 78 640 103	0%	19-feb-26	9-jul-26
24.12.1	INSTALACIONES ELEC	UPS 70 KVA 208V F.P 0.9 :	0.2%	$ 92 507 750	84%	-		-$ 78 107 385	0%	23-feb-26	23-jun-26
24.14.1	INSTALACIONES ELEC	SWITCH BORDE 48 PTOS RJ45 PoE	0.2%	$ 77 131 073	100%	-	-100%	-$ 77 131 080	0%	26-mar-26	25-may-26
4.6.5	ESTRUCTURA EN CON	Acero PDR-60 Placas Macizas	0.2%	$ 85 440 809	90%	-	-90%	-$ 77 087 580	0%	6-mar-26	14-jun-26
24.11.5	INSTALACIONES ELEC	Celdad de medida	0.2%	$ 90 581 969	84%	-	-84%	-$ 76 481 402	0%	23-feb-26	23-jun-26
9.5.4	PISOS	Piso Madera Laminada, ref:CY1ETGRE2218M22 , Tipo: WPC ETIC GREIGE 22X182X0.65 -0.3 EVA,TONO CERO,CALIBRE CERO, marca : A	0.3%	$ 86 752 314	87%	-	-87%	-$ 75 821 528	0%	9-may-26	8-jun-26
19.1.2	PINTURA	Pintura Vinilo Blanco sobre superficie muros en estuco	0.3%	$ 128 881 171	58%	-		-$ 74 922 920	0%	13-abr-26	12-jul-26
9.5.3	PISOS	Piso Madera Laminada, ref:CY1ETGRE2218M22 , Tipo: WPC ETIC GREIGE 22X182X0.65 -0.3 EVA,TONO CERO,CALIBRE CERO, marca : A	0.3%	$ 142 693 539	52%	-	-52%	-$ 73 833 709	0%	29-abr-26	8-jul-26
5.1.5	ESTRUCTURAS METAL	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Viguetas Perlines Metalicos en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200 e IPE-220, según d	0.5%	$ 263 463 461	27%	-	-27%	-$ 71 053 923	0%	31-may-26	14-jun-26
6.2.2	MAMPOSTERIA	Viga de Confinamiento dentro de Muro de 9 x 20 cm en concreto reforzado a la vista f'c=3000 psi	0.2%	$ 97 206 655	71%	-	-71%	-$ 69 047 087	0%	11-mar-26	9-jul-26
7.1.7	ELEMENTOS ARQUITE	Alfajía Prefabricada en Panel Ligero de Concreto Reforzado con Fibra de Vidrio (GRC), con aislante de poliestireno expandido y acabac	0.2%	$ 118 046 700	56%	-	-56%	-$ 65 870 059	0%	15-abr-26	14-jul-26
24.2.2	INSTALACIONES ELEC	Salidas para panel LED 60x60	0.2%	$ 89 144 528	73%	-		-$ 65 355 661	0%	14-abr-26	23-jun-26
25.63	INSTALACIONES MECA	Conductos en lamina galvanizada calibre 22	0.1%	$ 74 998 151	87%	-	-87%	-$ 64 991 245	0%	3-feb-26	23-jun-26
25.46	INSTALACIONES MECA	Control Sistema Ventilación Mecánica	0.1%	$ 64 736 185	100%	-	-100%	-$ 64 736 160	0%	15-nov-25	14-ene-26
19.1.1	PINTURA	Estuco sobre superficie muros en Pañete	0.2%	$ 108 223 717	58%	-	-58%	-$ 62 914 067	0%	13-abr-26	12-jul-26
9.5.2	PISOS	Piso Madera Laminada, ref:CY1ETGRE2218M22 , Tipo: WPC ETIC GREIGE 22X182X0.65 -0.3 EVA,TONO CERO,CALIBRE CERO, marca : A	0.2%	$ 107 166 293	58%	-		-$ 61 915 341	0%	19-abr-26	8-jul-26
NP 4.1	ESTRUCTURA EN CON	Escalera de emergencia en concreto F'c 4000 psi 28 Mpa	0.2%	$ 117 287 838	57%	7%		-$ 58 919 339	0%	14-abr-26	13-jul-26
24.11.6	INSTALACIONES ELEC	TRANSFORMADOR 300 KVA 11.400/220-127 V DYS	0.1%	$ 67 650 499	84%	-	-84%	-$ 57 119 555	0%	23-feb-26	23-jun-26
11.8.3	VENTANERIA Y CORTI	Cortasoles en listones de madera plastica WCP Ecowwod de 150x50 cm separadados cada 20cm sobre perfiles de soporte en listones	0.5%	$ 272 983 186	21%	-		-$ 56 098 048	0%	27-may-26	6-jul-26
4.2.5	ESTRUCTURA EN CON	Vigas Aéreas en Concreto Reforzado Color Gris f'c=4.000 psi 28 Mpa Cubierta Terraza Niv.+22.50	0.4%	$ 181 214 817	30%	-	-30%	-$ 55 095 629	0%	31-may-26	14-jun-26
22.3.1	OBRAS EXTERIORES	Piso Deck Prefabricado en Concreto formato 120 x 14,8 x 5,5 cm color Gris tipo Fibrit o equivalente, para Plazota Acceso	0.2%	$ 88 374 948	62%	-		-$ 54 986 925	0%	3-abr-26	12-jul-26
3.4.3	CIMENTACIÓN	Relleno en Grava de tamaño variable entre 1/2" y 1.1/4", Incluye: Suministro, Colocación y compactación, para conformar capa de filt	0.1%	$ 54 717 589	100%	-		-$ 54 717 585	0%	3-sep-25	23-sep-25
17.3.1	CUBIERTA	Suministro y Siembra Cobertura Vegetal de Bajo Porte para plantar en Jardineras Cubierta y Terras Entrepisos	0.2%	$ 77 197 779	69%	-		-$ 53 034 889	0%	24-abr-26	23-jun-26
27.18.2	INSTALACIONES ELEC	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	0.1%	$ 62 309 932	84%	-		-$ 52 610 309	0%	23-feb-26	23-jun-26
9.6.2	PISOS	Piso en Concreto endurecido, pulido, brillado, pulido y dilatado, conformado por Torta de sobre piso espesor e=5 a 7 cm en concreto	0.1%	$ 52 469 153	100%	-		-$ 52 469 190	0%	22-feb-26	23-may-26
24.4.5	INSTALACIONES ELEC	Tablero de distribución 24 circuitos con espacio para totalizador	0.1%	$ 71 163 223	72%	-		-$ 51 190 091	0%	10-mar-26	8-jul-26
11.1.1	VENTANERIA Y CORTI	Ventana V-04 5.45 x 4.30 Inspeccion (3 un)	0.1%	$ 50 497 528	100%	-	-100%	-$ 50 497 527	0%	24-may-26	27-may-26
11.3.3	VENTANERIA Y CORTI	Ventana V-43 5.45 x 3.68 Fachada Norte (17 un)	0.5%	$ 243 707 554	21%	-		-$ 50 081 904	0%	27-may-26	6-jul-26
24.2.11	INSTALACIONES ELEC	Salida para luminaria de emergencia	0.1%	$ 73 492 801	73%	5%	-68%	-$ 50 012 672	0%	14-abr-26	23-jun-26

TAREA / CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

Observación : Se identifican 39 actividades con avance superior a la programación física prevista, cada una con un desfase positivo en la inversión ≥ 200 mil COP respecto al flujo de inversión..


			CONTRATADO %POND	CONTRATADO VALOR	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN ACUMULADA	VARIACIÓN	VARIACIÓN POSITIVA > 200MIL COP →		PLANEADO L-BASE COMIENZO	PLANEADO L-BASE FIN
			0.0%	$ -	79.81%	49.53%	-30.28%	$ 731 887 151		20-ene-23	14-jul-26
3.6.4	CIMENTACIÓN	Acero PDR-60 Losa de Cimentación	1.0%	$ 487 416 960	66%	100%	34%	$ 168 080 220	23.0%	23-nov-25	2-ene-26
4.6.9	ESTRUCTURA EN CON	Malla Electrosoldada f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa) M.1.88 Torta Superior Placas Aligeradas	0.5%	$ 230 858 363	77%	113%	37%	$ 84 688 166	11.6%	15-sep-25	13-ene-26
NP 3.5.	CIMENTACIÓN	LOSA DE SUBPRESION ALTURA h=30 cm Niv.-6.30 m EN CONCRETO f'c=4.000 Psi 28 Mpa BAJA PERMEABILIDAD	1.4%	$ 692 259 660	92%	100%	8%	$ 57 150 669	7.8%	20-ene-23	20-abr-23
4.6.6	ESTRUCTURA EN CON	Acero PDR-60 Vigas Rampas Vehiculares	0.1%	$ 73 047 493	15%	90%	76%	$ 55 264 252	7.6%	22-dic-25	10-feb-26
4.2.7	ESTRUCTURA EN CON	Vigas Aéreas en Concreto Reforzado Color Gris f'c=4.000 psi 28 Mpa Rampa Vehicular Niv.+0.00 y Niv.-3.00	0.1%	$ 41 208 841	-	93%	93%	$ 38 401 326	5.2%	29-jun-26	13-jul-26
5.1.2	ESTRUCTURAS METAL	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Viguetas Perlines Metalicos en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200 e IPE-220, según diseño estru	0.5%	$ 246 091 466	100%	115%	15%	$ 36 051 814	4.9%	15-feb-26	1-mar-26
24.4.2	INSTALACIONES ELEC	Tablero de transferencia red planta para una carga de 300 KVA	0.2%	$ 92 088 741	63%	100%		$ 34 461 666	4.7%	9-abr-26	8-jul-26
21.1.1	EQUIPOS ESPECIALES	Ascensor No.1 con capacidad de 1000 kg o 13 personas, ocho (8) paradas, foso de 1400x2350x1650 mm, recorrido 31300 mm, velocidad 1.75 m	0.5%	$ 232 181 998	81%	93%	12%	$ 28 219 904	3.9%	10-ene-26	9-jul-26
21.1.2	EQUIPOS ESPECIALES	Ascensor No.2 con capacidad de 1000 kg o 13 personas, ocho (8) paradas, foso de 1400x2350x1650 mm, recorrido 31300 mm, velocidad 1.75 m	0.4%	$ 227 888 863	81%	93%	12%	$ 27 698 144	3.8%	10-ene-26	9-jul-26
4.7.1	ESTRUCTURA EN CON	Demolición Pilotes Constructivos de D=60 cm x 6.00 m (16 und) Incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra	0.1%	$ 57 913 371	55%	98%	43%	$ 25 027 035	3.4%	23-oct-25	22-dic-25
5.1.3	ESTRUCTURAS METAL	Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Viguetas Perlines Metalicos en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200, IPE-220 e IPE-3240, según di	0.5%	$ 243 801 821	100%	109%		$ 22 545 348	3.1%	22-mar-26	5-abr-26
21.1.3	EQUIPOS ESPECIALES	Ascensor No.3 con capacidad de 1000 kg o 13 personas, ocho (3) paradas, foso de 1400x2030x1650 mm, recorrido 11150 mm, velocidad 1.5 m/	0.3%	$ 165 620 504	81%	93%	12%	$ 20 129 864	2.8%	10-ene-26	9-jul-26
3.6.5	CIMENTACIÓN	Acero PDR-60 Pozos y Fosos	0.0%	$ 21 796 749	22%	100%		$ 17 081 698	2.3%	13-dic-25	28-dic-25
3.7.10	CIMENTACIÓN	Anclaje: Perforación + Inyección epoxico Ø 1" L = 38.10 cm	0.0%	$ 8 777 078	14%	186%	171%	$ 15 046 419	2.1%	30-jul-25	30-jul-25
24.4.1	INSTALACIONES ELEC	Tablero Tablero General de Distribución TGD de 300KVA de acuerdo con el diagrama unifilar	0.2%	$ 77 205 298	84%	100%		$ 12 018 239	1.6%	23-feb-26	23-jun-26
3.7.5	CIMENTACIÓN	Anclaje: Perforación + Inyección epoxico Ø 3/8" L = 14.29 cm	0.2%	$ 107 568 049	93%	104%		$ 11 711 370	1.6%	30-jul-25	18-sep-25
4.2.1	ESTRUCTURA EN CON	Vigas Aéreas en Concreto Reforzado Color Gris f'c=4.000 psi 28 Mpa Placa 2o.Piso Niv.+5.00	0.3%	$ 148 168 312	92%	100%	8%	$ 11 449 172	1.6%	11-ene-26	8-feb-26
22.1.3	OBRAS EXTERIORES	Excavacion Manual (incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra)	0.0%	$ 9 997 939	2%	100%	98%	$ 9 808 977	1.3%	28-may-26	7-jul-26
3.5.5	CIMENTACIÓN	Pozos Eyectores y Desareador en concreto reforzado f'c=3.000 psi 35 Mpa	0.0%	$ 12 813 137	28%	100%	72%	$ 9 209 442	1.3%	2-ene-26	12-ene-26
3.7.7	CIMENTACIÓN	Anclaje: Perforación + Inyección epoxico Ø 5/8" L = 23.81 cm	0.0%	$ 7 930 102	48%	141%	93%	$ 7 342 687	1.0%	30-jul-25	30-jul-25
4.7.3	ESTRUCTURA EN CON	Escarificación Manual Superficie en Concreto para Anclaje Vigas Placa Aligerada 1o.Piso Niv.+0.00	0.1%	$ 29 228 936	79%	100%	21%	$ 6 120 236	0.8%	13-sep-25	3-oct-25
22.3.6	OBRAS EXTERIORES	Rampa Peatonal en concreto f´c=3000 psi. espesor e=10 cm en paños diltados de 1.00x1.00 m fundido en sitio según planos estructurales, acat	0.0%	$ 8 885 678	32%	100%	68%	$ 6 064 312	0.8%	3-abr-26	12-jul-26
1.4.3	PRELIMINARES	Demolición Integral de Placas de Contrapiso en concreto de construcciones existentes de cualquier espesor, en Concreto Reforzado. (incluye car	0.0%	$ 24 192 134	81%	100%	19%	$ 4 490 621	0.6%	26-abr-24	16-jun-24
24.4.3	INSTALACIONES ELEC	Tablero para cargas reguladas incluye selector de by pass	0.0%	$ 14 185 511	72%	100%		$ 3 981 365	0.5%	10-mar-26	8-jul-26
NP 3.7.	CIMENTACIÓN	Anclaje estructural pasante en pilotes constructivos nivel -3.00, de acuerdo con el diseno de sistema constructivo. Incluye perforación + epóxico	0.3%	$ 127 382 502	97%	100%	3%	$ 3 429 542	0.5%	5-sep-25	8-nov-25
3.7.6	CIMENTACIÓN	Anclaje: Perforación + Inyección epoxico Ø 1/2" L = 19.05 cm	0.0%	$ 4 678 308	43%	100%	57%	$ 2 685 698	0.4%	30-jul-25	28-sep-25
3.7.4	CIMENTACIÓN	Tratamiento superficial con con Sikadur 32 primer o similar para Anclaje Vigas Placa Aligerada Cimentación Niv.-4.60	0.1%	$ 57 765 597	96%	100%	4%	$ 2 474 307	0.3%	30-jul-25	8-sep-25
22.1.8	OBRAS EXTERIORES	Base de Arena 3 cm	0.0%	$ 5 295 806	18%	58%	40%	$ 2 122 727	0.3%	28-may-26	7-jul-26
24.9.3	INSTALACIONES ELEC	Cable de cobre 2/0 para puesta a tierra tipo B	0.0%	$ 14 334 920	84%	95%		$ 1 491 753	0.2%	23-feb-26	23-jun-26
23.1.10	INSTALACIONES HIDR	Accesorios PVC.P 1-1/2" (Sum + Instalación)	0.0%	$ 3 111 800	42%	88%		$ 1 434 482	0.2%	10-may-26	9-jul-26
NP 3.7.	CIMENTACIÓN	Anclaje estructural pasante en pilotes constructivos nivel -3.00, de acuerdo con el diseno de sistema constructivo. Incluye perforación + epóxico	0.1%	$ 36 756 851	97%	100%	3%	$ 1 007 027	0.1%	5-sep-25	8-nov-25
23.1.9	INSTALACIONES HIDR	Accesorios PVC.P 1-1/4" (Sum + Instalación)	0.0%	$ 2 841 738	42%	75%	33%	$ 937 439	0.1%	10-may-26	9-jul-26
24.7.8	INSTALACIONES ELEC	Cámara CS 276	0.1%	$ 28 812 976	97%	100%		$ 898 893	0.1%	10-ene-26	9-jun-26
3.2.7	CIMENTACIÓN	Excavación Manual Fosos Ascensores (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) a N iv.-6.00	0.0%	$ 9 235 758	91%	100%		$ 817 840	0.1%	5-nov-25	15-nov-25
24.9.7	INSTALACIONES ELEC	Conexión de estructura a tierra	0.0%	$ 4 687 812	84%	100%		$ 729 746	0.1%	23-feb-26	23-jun-26
24.12.2	INSTALACIONES ELEC	Gabinete de by pass automático para UPS capacidad 250A	0.0%	$ 9 608 444	84%	90%		$ 534 906	0.1%	23-feb-26	23-jun-26
24.16.2	INSTALACIONES ELEC	CONTROLADOR DE ACCESS POINT	0.0%	$ 1 653 842	69%	100%		$ 514 897	0.1%	24-abr-26	23-jun-26
4.3.9	ESTRUCTURA EN CON	Placas Rampas Vehiculares Macizas h=10 cm en concreto arquitectónico reforzado color gris claro a la vista f´ c=4.000 psi 28 Mpa, con borde y a	0.1%	$ 65 943 747	91%	91%	1%	$ 372 120	0.1%	1-ene-26	10-feb-26
23.3.2	INSTALACIONES HIDR	Tubería PVC. S 4"	0.0%	$ 7 992 339	42%	45%	3%	$ 219 287	0.0%	10-may-26	9-jul-26

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAÚTICA CIVIL

PERIODO DEL INFORME:	Desde: viernes-29-may-26	Hasta: jueves-4-jun-26	INFORME SEMANAL N° : 168

LOCALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS / DESCRIPCION GRAFICA / CONVENCIONES / AVANCE ACUMULADO





Área con formaleta para placa.

Colocación acero de refuerzo


Vaciado Concreto Estructural (Ccto 28 Mpa)

Nivel Columnas Apoyo para voladizo +6.5M

Cuellos Columnas Apoyo para voladizo +6.5M


Estructura Pantalla (Ccto 28 Mpa)




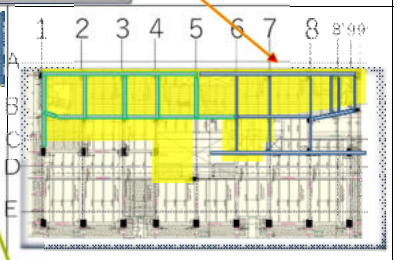

AVANCE RETIRO DE ESCOMBROS SOTANO Y 1 2: 80% / INSTALACIONES ELEC M.T

AVANCE PLACA NIVEL +9.38M = VIGAS EN CCTO





REDES HIDROSA Y ELECTRICAS EN -> SOTANO 1 -> N+0.5M

CONSTRUCCIÓN VOLADIZO N + 6.5M: 40 %


Seguimiento General - Avance Elementos Estructurales en Ejecución.

	DESCRIPCIÓN ELEMENTO ESTRUCTURAL	% Avance Físico Acumulado Anterior	Avance en el Periodo	% Avance Físico Acumulado Actualizado
✓	Construcción Viga guía Perimetral.	100%	0%	100%
✓	Construcción 163 Pilotes	100%	0%	100%
✓	Construcción 31 Barretes y 34 Pantallas.	100%	0%	100%
✓	Construcción Placa Nivel 00m y +0.50m.	100%	0%	100%
	Excavación Mecánica Sótano 1.	100%	0%	100%
	Colocación Acero de Refuerzo Placa Nivel -3m.	100%	0%	100%
	Vaciado de Concreto Placa Nivel -3m.	100%	0%	100%
	Excavación Mecánica Sótano 2. (Zona1, Zona 2 , Zona 3)	100%	0%	100%
	Descabece de Ccto Contaminado Pilotes@N-6m	100%	0%	100%
	Solado cimentación Nivel -6m	100%	0%	100%
	Colocación Acero de Refuerzo Elementos Nivel -6m.	100%	0%	100%
[A]	Vaciado CtoFc 28Mpa - Dados y Conexiónes Nivel -6m.	100%	0%	100%
[A]	Vaciado Columnas Sótano 2 entre Nivel -2.5 @ Nivel -6m.	100%	0%	100%
	Complementos de placa Nivel -3m: Z1 +Z2 + Z3	100%	0%	100%
[A]	Vaciado Columnas Sótano 1 entre Nivel -3.m @ Nivel -0.5m	100%	0%	100%
Nivel	Complementos de placa Nivel 00 y 0.5m: Z1 +Z2 + Z3	100%	0%	100%
	Construcción Columnas para Placa Nivel 2	100%	0%	100%
	Losa de supresión Nivel -6.3m	100%	0%	100%
[A]	Construcción Rampa Sótano 2 a Sótano 1.	100%	0%	100%
[A]	Construcción Rampa Sótano 2 a Nivel 00.	100%	0%	100%
Nivel 2	Construcción Vigas en CCTO Placa Piso 2 (Nivel 5.0m).	100%	0%	100%
	Colocación Platinas y Vigas IPE Piso 2 (Nivel 5.0m).	100%	0%	100%
	Colocación y vaciado losa colaborante (Nivel 5.0m).	100%	0%	100%
	Construcción Columnas para Placa Nivel 3.	100%	0%	100%
Nivel 3	Construcción Vigas en CCTO Placa Piso 3 (Nivel 9.38m).	75%	5%	80%
	Colocación Platinas y Vigas IPE Piso 3 (Nivel 9.38m).	40%	10%	50%
	Colocación y vaciado losa colaborante Piso 3 (Nivel 9.38m).	0%	0%	0%
	Construcción Columnas para Placa Nivel 4.	5%	0%	5%
Nivel 4	Construcción Vigas en CCTO Placa Piso 4 (Nivel 13.75m).	0%	0%	0%
	Colocación Platinas y Vigas IPE Piso 4 (Nivel 13.75m).	0%	0%	0%
	Colocación y vaciado losa colaborante Piso 4 (Nivel 13.75m).	0%	0%	0%
	Construcción Columnas para Placa Nivel 5.	0%	0%	0%
Nivel 5	Construcción Vigas en CCTO Placa Piso 5 (Nivel 18.13m).	0%	0%	0%
	Colocación Platinas y Vigas IPE Piso 5 (Nivel 18.13m).	0%	0%	0%
	Colocación y vaciado losa colaborante Piso 5 (Nivel 18.13m).	0%	0%	0%
	Construcción Columnas para Terraza.	0%	0%	0%
	Construcción Placa - Terraza.	0%	0%	0%
	Construcción Elementos sobre Terraza.	0%	0%	0%


RESUMEN ESTRUCTURAS 100 % EJECUTADAS – ACUMULADO HISTÓRICO




☑ Construcción de 163 Pilotes - Cimentación Profunda.



☑ Construcción 31 Barretes - Cimentación Profunda.
☑ Construcción 34 Pantallas - Cimentación Profunda.




☑ Construcción placa Puntal N.00 / 0.5 Sobre Pilotes Constructivos.




☑ Construcción placa Puntal N.-3M (Sótano 1) Sobre Pilotes Constructivos.



☑ Construcción 37 Dados de Cimentación N.-6.3




☑ Construcción 35 Columnas para Sótano 1 desde N.-6.3m @ -2.5m.




☑ Construcción Complementos de placa Nivel -3m.



☑ Construcción 29 Columnas y 10 Ménsulas para Sótano 2 desde N.-3m @ -0.5 / 00m.



☑ Construcción Complementos de placa Nivel 00 / 0.5m.



☑ Construcción 35 Columnas y 2 Pantallas para Placa Piso 2 : desde N.-00 /0.5 @ 4.5m



☑ Construcción placa de subpresión Nivel -6.3m



☑ Construcción sistema de Entrepiso Nivel +5m.: Vigas en ccto + Viga IPE + Losa Colaborante.



☑ Construcción de 24 columnas y 2 pantallas desde nivel +5m para apoyo de placa entre piso Nivel 9.38m + Avance de 12 tramo de columnas para apoyo sistema de voladizo borde +6.5m.


UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

PERIODO DEL INFORME:	Desde: viernes-29-may-26	Hasta: jueves-4-jun-26	INFORME SEMANAL N° : 168

PERSONAL DIRECTO / INDIRECTO CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA

	% Dedicación	N°		% Dedicació	N°		N°
Especialista estructural	30%	1	Director de Proyecto	70%	1	Personal Operativo en Obra	37
Especialista arquitectónico	50%	1	Residente de obras civiles de estructuras	100%	3		
Especialista en geotecnia	20%	1	Residente administrativo	100%	1		
Especialista hidrosanitario	20%	1	Residente de arquitectura e Instalaciones	100%	3		
Especialista eléctrico	20%	1	Inspector de obras civiles	30%	4		
Especialista urbanismo	20%	1	Inspector SISOMA	100%	2		
Especialista en telecomunicaciones	20%	1	Topógrafo	20%			
Especialista ambiental	20%	1	Cadenero	20%			
Profesional bioclimático	20%	1	Contador	20%	1		
Especialista acústico	20%	1	Auxiliar de servicios generales	100%	1		
Especialista mecánico	20%	1	Personal de seguridad	100%	1		
Especialista de programación y presupuesto	30%	1	Almacenista	100%	1		
			Recursos Humanos	100%	1		


DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL CI



Personal - Especialistas Disponibles:
Personal Administrativo :
Personal Operativo directo :

Personal - Especialistas Disponibles: 12 | **Personal Administrativo : 19** | **Personal Operativo directo : 37**

FLUCTUACIÓN DE PERSONAL EN OBRA : CONTRATISTA CCI

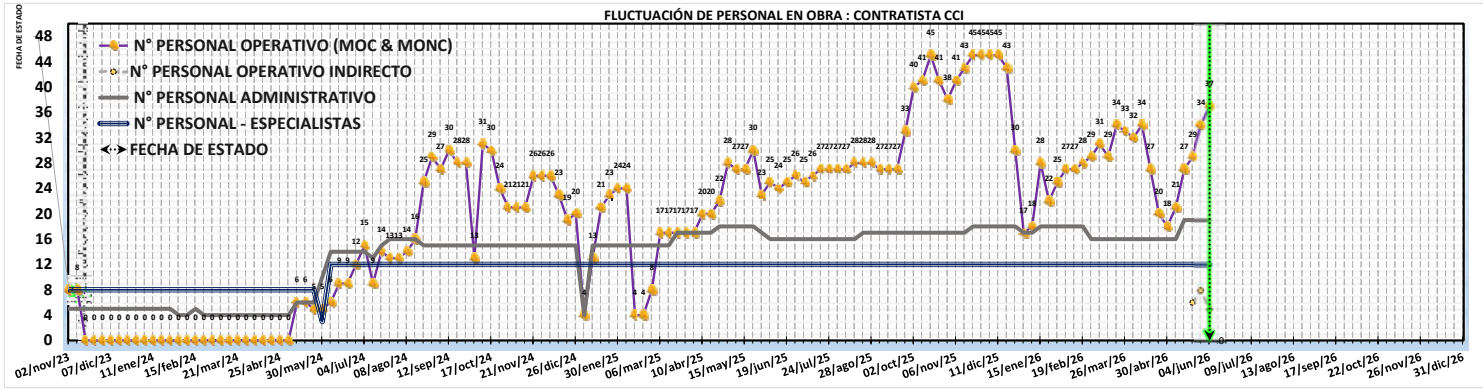

PERSONAL INTERVENTORÍA RA5

Especialista estructural	1	Topógrafo	1	Director de interventoría	1
Especialista arquitectónico	1	Cadenero 1	1	Residente de interventoría de obras civiles de estructur	2
Especialista en geotecnia	1	Profesional auxiliar interventoría	1	Residente de interventoría de arquitectura	1
Especialista hidrosanitario	1	Profesional administrativo de interventoría	1	Inspector obras civiles de interventoría	2
Especialista eléctrico	1	Profesional jurídico	1	Profesional seguridad industrial, salud ocupacional y me	1
Especialista urbanismo	1	Profesional contaduría	1		
Especialista en telecomunicaciones	1	Técnico auxiliar de interventoría	1		
Especialista ambiental	1	Secretaria	1		
Especialista bioclimático	1	Mensajería	1		
Especialista acústico	1				
Especialista mecánico	1				
Especialista de programación y presupuesto	1				

Personal - Especialistas Disponibles: 12 | **Personal Administrativo Disponible: 9** | **Personal Técnico de Campo 7**

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

- 1 Minicargador Bobcat S-130
- 3 Martillo Demoledor Electrico + Puntas:
- 1 Mini Excavadora Caterpillar_ Cat 40-303.5
- 1 Torre Grua Liebherr 63 Lc (Altura 37m)
- 1 Bomba estacionaria Zoom Lion
- 2 Tablero Movil.
- 2 Equipo Vibrador concreto.
- 1 Motobomba.
- 1 Bomba Sumergible 1.5HP.
- 1 Nivel de Precisión.
- 1 Estación Total (Comision Topográfica).
- Kit Herramienta y equipo Menor

ELEMENTOS ADICIONALES EN OBRA

- Formaleta STEN DECK x 1160m2
- Fomaleta ULP
- 1 Equipo - Andamio de Carga (N 6.5m)
- Andamio Certificado Multidireccional 7 secciones
- **Nota: Los equipos y elementos auxiliares, se emplea en función del requerimiento de obra.**

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AFECTACIONES A LA OBRA - REGISTRO

Condiciones adversas durante el periodo (lluvia)	0%	0.0 HORAS
Condiciones buenas durante el periodo (seco):	100%	44.0 HORAS
Acumulado Horas tiempo seco:	95.1%	4829 HORAS
Acumulado Horas lluvia:	4.9%	247 HORAS

Acumulado Horas lluvia: 4.9%



Acumulado Horas tiempo seco: 95.1%

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
PERIODO DEL INFORME:	Desde: viernes-29-may-26	Hasta: jueves-4-jun-26	INFORME SEMANAL N° : 168

OBSERVACIÓNES:

◀ TENICO:	► El 20 de Junio 2025, se instaló 1 Torre Grua Liebherr 63 Lc (Altura 37m) ► ◆ El 21de Mayo de 2025 se realizó visita en obra por parte de Dirección y Geotecnistas de Interventoría y Consorcio CI, en la cual se definieron aspectos contructivos, proceso de excavación para los elementos estructurales de la placa puntal Nivel -3 y N 00, las observaciones quedaron registradas en Bitácora. ► ◆ El 19 de Marzo de 2025 se realizó visita en obra por parte de la dirección de Interventoría y Consorcio CI, en la cual se definieron aspectos contructivos para los elementos estructurales de la placa puntal Nivel -3 y N 00, las observaciones quedaron registradas en Bitácora. ► ◆ El 17 de Mayo de 2025, finalizó la construcción de 10 ménsulas localizadas enel eje A, así como el complemento de 33 pilotes constructivos. ► ◆ A partir del 16 de enero 2025 se comenzaron las actividades de Demolición de Viga guia y posteriormenete zona contaminada de Barretes y Pantallas. ► ◆ El martes 4 feb 2025, el consorcio CI culminó la construcción de todos los barretes y pantallas comtemplados para el proyecto. ► ◆Desde el 23 de octubre 2024 se inició la construcción de barretes y pantallas de acuerdo a diseños. ► ◆ El consorcio CI culminó la construcción de todos los pilotes del proyecto (163) el 14 de octubre 2024. ► ◆ El 21 de enero 2025, se evidenció la ejecución de la maniobra eléctrica por parte de la empresa ENEL, la actividad ejecutada, permitió la liberación de actividades en el eje 0. El 28 de febrero 2025, ENEL culminó los pendientes técnicos de la maniobra realizada; cerrando así la intervención requerida por el proyecto. ► ◆ Actualmente se ejecuta un plan de contingencia orientado al cierre de los pendientes estructurales identificados, con el propósito de mitigar los atrasos presentados y contribuir al cumplimiento de la programación establecida.
◀ ENTORNO:	► El 5 de junio 2025, el contratista presentó ante interventoría la reparación del muro en el edificio cabaña Pijao. ► El contratista realiza seguimiento al componente de ENTORNO, monitoreando el impacto del proyecto en el sector. ► El contratista realizó acompañamiento social y técnico con el área administristativa colindante al proyecto.
◀ SST:	► El contratista ha presentado la documentación de ingreso del personal, al igual que ha desarrollado los análisis de trabajo seguro para todas las actividades que se han desarrollado. ►En el periodo no se presentaron accidentes laborales.► Se han presentado los informes de Gestión de SST. ► Se han realizado reuniones y recorridos del componente SST .►El personal de obra ha laborado acorde a las normas de SST.►La maquinaria existente en obra esta presentada y aprobada.
◀QA/QC:	► Se solicitó al contratista realizar, reportar y documentar análisis de ensayos y control de calidad a los materiales y procesos constructivos.

GESTIÓN INTERVENTORÍA

◀ **TENICO:**	✓ Se realizó inspección técnica y se emitieron recomendaciones al contratista referente a la protección del material en obra y se realizó seguimiento a las actividades en curso. ✓ Se realizaron liberaciones a las actividades realizadas durante la semana. (Ver cuadro pag 1: ITEMS EJECUTADOS EN EL PERIODO)
◀ **SST:**	✓ Se realizó seguimiento en obra al cumplimineto de los planes y normas SST; se emitió en campo recomendaciones de mejora.
◀ **SOCIAL:**	✓ El contratista cuenta con disponibilidad a realizar, gestionar aspectos de entorno en el sitio de obra, se realiza seguimiento desde interventoría.
◀ **AMBIENTAL:**	✓ Se solicitó y revisó la documentación ambiental inherente al proyecto para las actividades ejecutadas.
◀ **QA/QC:**	✓ Se supervisó constantemente la implementación de procedimientos adecuados de aseguramiento de la calidad y control de calidad en la ejecución de obra.
◀ **ADMINISTRATIV**	✓Se convocaron y realizaron reuniones con especialistas estructurales: Tema complementación a diseños estructurales. ✓Se realizó comité de obra semanal, se recibió y emitió comunicados inherentes a la etapa de ejecución del proyecto.

HITOS CONTRACTUALES - RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

FECHA		DESCRIPCIÓN EVENTO
vie-20-ene-23	●	Suscripción de acta de inicio
mar-4-abr-23	●	Interventoría remite concepto mediante SAL-23-006109 de la revisión de estudios y diseños generando observaciones en los aspectos: Geotécnico, Arquitectónico, eléctrico, estructural, hidrosanitarios, GAS, RCI,
mié-17-may-23	●	Se realiza visita en el predio en presencia de la Entidad, Contratista e Interventoría donde se levanta un inventario con su respectivo registro fotográfico con el fin de que sean desinstalados y entregados a la
vie-21-jul-23	●	Se suscribe modificatorio 01 al contrato de obra, ampliando el plazo de la etapa precontractual en 30 días y definiendo el procedimiento para la selección del concepto que emita un tercero sobre las discrepancias
vie-4-ago-23	●	Se reunió la entidad, Contratista e Interventoría con el fin de suscribir el acta de entrega del predio con sus respectivos anexos.
vie-4-ago-23	●	Mediante comunicado SAL-23-012809 del 04 de agosto de 2023 la Interventoría remite las observaciones que persisten en los diseños (Geotécnico, Arquitectónico, eléctrico, estructural, hidrosanitarios, GAS, RCI,
jue-17-ago-23	●	Se recibe de la Entidad la Selección de los profesionales que emitiran los conceptos técnicos.
vie-18-ago-23	●	Se reunió la Entidad, Contratista e Interventoria con el fin de suscribir el acta de suspension de los contratos en mención, a esperas de los conceptos tecnicos.
vie-18-ago-23	●	Inicio de la suspensión temporal número 1.
dom-17-sep-23	●	Término de la suspensión número 1.
mié-20-sep-23	●	Inicio la suspensión número 2, por un término de 10 días, con fecha de culminación del 29 de Septiembre de 2023.
dom-15-oct-23	●	Se generó el levantamiento de la suspensión #2.
mar-14-nov-23	●	se vence el plazo establecido para la etapa de Preconstrucción, sin poder contar con la apropiación y aprobación de los estudios y diseños del proyecto, por lo que se emite documento de APREMIO al contratista
mar-21-nov-23	●	Vencido el plazo concedido al contratista de obra, para la subsanación de los pendientes, persisten observaciones que impiden la aprobación de los diseños por parte de la interventoría.
mié-13-dic-23	●	Se remite a la entidad Informe del presunto INCUMPLIMIENTO, por parte del contratista de obra.
jue-4-ene-24	●	Se dió Traslado de los diseños Arquitectónicos y estructurales validados por la interventoría, para la aprobación de la entidad según Decreto 1077 de 2015.
mar-9-ene-24	●	Aprobados por la Entidad de Arquitectónicos y estructurales.
jue-25-abr-24	●	Suscripción de la apropiación y aprobación de los estudios y diseños por parte del contratista de obra e interventoría.
mié-15-may-24	●	El contratista notifica mediante comunicado : Oficio E-2024-033956 Solicitud Aprobación Diseño para Conexiones Domiciliarias a Construir y Red de Acueducto - Proyecto Aeronáutica Civil AK 72 63F-20
vie-7-jun-24	●	SUSCRIPCIÓN MODIFICATORIO 03: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO - ALCANCE DEL OBJETO, MODIFICACIÓN DEL FORMATO 8 A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INCLUSIÓN DE 3 ÍTEMS NO PREVISTOS SIN ADICIÓN.: NP 2.1.1: PROCESO BARRETES PREEXCAVADOS TIPO; NP 2.2.1: PROCESO PILOTES PREEXCAVADOS TIPO KELLY: EXCAVACIÓN - NP 4.1: ESCALERA DE EMERGENCIA EN CONCRETO F'C 4000 PSI 28 MPA.
vie-19-jul-24	●	Establecimiento de linea base N°2 Para programación de Obra.
jue-7-nov-24	●	Establecimiento programación de Obra de linea base N°3 , aprobada por interventoría mediante comunicado CIAA-OF-CCI-00578 el 7 de noviembre 2024.
jue-19-dic-24	●	Modificatorio No.04 - Modificación de cláusula de forma de pago.
jue-6-feb-25	●	Establecimiento programación de Obra de linea base N°4 , aprobada por interventoría mediante comunicado SAL-25-001793 el 6 de Febrero 2025 y Balance de Cantidades N° 6.
sáb-15-feb-25	●	Balance M&M 7 : Balance requerido para incluir 8 ítems no previstos (NP 1.3.1, NP 1.3.2, NP 1.3.3, NP 1.3.4, NP 1.3.5, NP 2.2.2, NP 2.2.3, NP 2.2.4) relacionados con provisional eléctrica, maniobra protección red M.T, escarificación de concretos, dilatación en poliestileno y protección de vanos.
jue-27-feb-25	●	Se suscribe modificatorio 05 al contrato de obra; en términos generales se Incluyeron ocho (8) ítems no previstos (NP) en la ejecución del contrato de obra sin adicionar recursos.
mar-13-may-25	●	Establecimiento programación de Obra de linea base N°5 Por Modificatorio N°5 , aprobada por interventoría mediante comunicado SAL-25-006559 el 13 mayo 2025.
mié-2-jul-25	●	Se suscribe modificatorio 06 al contrato de obra; en términos generales se Incluyeron siete (7) ítems no previstos (NP) en la ejecución del contrato de obra sin adicionar recursos.
lun-7-jul-25	●	Se suscribe modificatorio 07 al contrato de obra; prórroga al contrato hasta 31 dic 2025.
mié-23-jul-25	●	Establecimiento programación de Obra de linea base N°6 Por Modificatorio N°7 .
mié-15-oct-25	●	Se suscribe el Modificatorio N.º 08 al contrato de obra, mediante el cual se incorporan siete (7) ítems no previstos (NP) relacionados con actividades de cimentación y cruce de vía para la Red MT.
jue-30-oct-25	●	Establecimiento programación de Obra de linea base N°7 Por Modificatorio N°8.
mar-30-dic-25	●	Se suscribe el Modificatorio N.º 09 al contrato de obra, mediante el cual se incorporan: 1) un (01) ítem no previstos (NP) referente al concreto para la losa de supresión, 2) adición por un valor $11.431.284.462, 3)
mié-11-feb-26	●	Establecimiento programación de Obra de linea base N°8 Por Modificatorio N°9.

GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

TEMA A GESTIONAR	GESTIÓN REALIZADA	ESTADO
► **Cumplimiento observaciones a diseños Estructurales.**	✔ La interventoría, mediante comunicados oficiales y en el marco de los comités de obra, solicitó de manera reiterada al contratista la complementación de los estudios y diseños estructurales del proyecto. ✔ Actualmente, la interventoría, y contratista de obra, realizan mesas de trabajo con el fin de concertar y cerrar los Items No previstos que se presentarán formalmente a la Supervisión.	ABIERTO
► **Revisión cantidades ejecutadas para acta parcial.**	✔ Seguimiento diario en Obra. / Solicitudes reiteradas de contingencia al contratista de obra.	ABIERTO

Nombre: Cristian Camilo Preciado
Cargo: Residente de Interventoría Consorcio RA5.

Nombre: Cristian Mauricio Melo Caicedo
Cargo: Director de Interventoría Consorcio RA5.

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
PERIODO DEL INFORME:	Desde: viernes-29-may-26	Hasta: jueves-4-jun-26	INFORME SEMANAL N° : 168

REGISTRO FOTOGRÁFICO

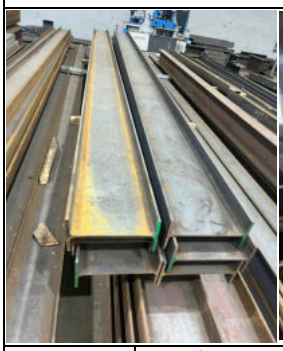
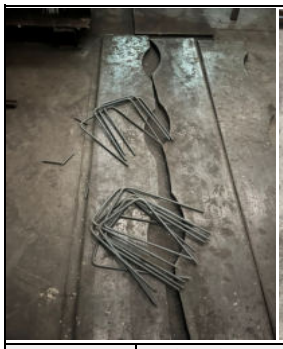



Foto 1	Fabricación, Viguetas Metalicas en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200 e IPE-220, Placa 3o Piso Niv.+9.38.







Foto 2	Anclajes, Platinas, Viguetas Metalicas en Perfiles Estructurales IPE-180 IPE-200 e IPE-220, Placa 3o Piso Niv.+9.38.







Foto 3	Tablero General de Distribución TGD de 300KVA de acuerdo con el diagrama unifilar



Foto 4	Avance encofrado Nivel +6.5m y 9.38m.



Foto 5	Amarre de acero de refuerzo entre ejes 1-3 placa Nivel 9.38m.



Foto 6	Acabado sobre la zona perimetral a la escalera del NE+9.38 mts / Aplicación de puente epóxico de adherencia con sikadur 32 primer



Foto 7	Corte y llave de empalme entre ejes (B-C); (1-2)-Nivel 9.38m



Foto 8	Vaciado de concreto sobre la zona perimetral a la escalera del NE+9.38 mts





Foto 9	Encofrado Nivel 6.5m, Aceros N 9.38m / elaboración de cilindros.





Foto 10	Demolición de placa puntal par acccesos Gálibo Rampara 1 / Control recurso operativo Directo e Indirecto y/ actividades en Obra.

MINISTERIO DE TRANSPORTE - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL -MANUAL DE INTERVENTO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA


UNIDAD EJECUTORA:

ERIODO DEL INFORME | Desde: viernes-29-may-26 | Hasta: jueves-

ANALISIS SEGUIMIENTO FINANCIERO - PROYECCIÓN DE INVERSIÓN OBRA CONTRATO 22001449 H4 de 2022

PERIODO TRIMESTRE	CONCEPTO	PERIODO EJECUTADO		FECHA GENERACIÓN DE FACTURA FEV	VALOR REAL FACTURADO	A		INCORPORACIÓN DE		B	C	D	E	F
						VALOR REAL FACTURADO & PROYECTADO	FACTURADO ACUMULADO	ANTICIPO	ADICION	SALDO DEL CONTRATO	% AMORTIZADO	VALOR AMORTIZADO DEL ACTA	SALDO DEL ANTICIPO	"RP" VALOR PAGADO REGIST PRESUP.: A-D
DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO			DATO		$A - B_{n-1}$	$(B_{n-1}) / (E_{n-2})$	$A * D$	$(E_{n-1}) - B_{n-1}$	$A - D$
T1-2024								$ 5 490 314 500		$ 39 264 066 722			$ 5 490 314 500	
T2-2024	Acta 01 FEV2	15-oct-23	@ 14-ene-24	14-jun-24	$ 65 461 342	$ 65 461 342	$ 65 461 342			$ 39 198 605 380	11.98%	$ 9 153 493	$ 5 481 161 007	$ 56 307 849
T3-2024	Acta 02 FEV3	15-ene-24	@ 14-may-24	16-jul-24	$ 90 388 371	$ 90 388 371	$ 155 849 713			$ 39 108 217 009	11.98%	$ 12 639 052	$ 5 468 521 955	$ 77 749 319
	Acta 03 FEV4	15-may-24	@ 14-jun-24	19-jun-24	$ 256 627 916	$ 256 627 916	$ 412 477 632			$ 38 851 589 070	11.98%	$ 35 884 416	$ 5 432 637 539	$ 220 743 523
	Acta 04 FEV5	15-jun-24	@ 14-jul-24	23-ago-24	$ 640 069 289	$ 640 069 289	$ 852 546 941			$ 38 411 519 781	11.98%	$ 61 535 113	$ 5 371 102 426	$ 378 534 176
	Acta 05 FEV6	15-jul-24	@ 14-ago-24	19-sep-24	$ 1 215 160 373	$ 1 215 160 373	$ 2 067 707 314			$ 37 196 359 408	11.98%	$ 169 916 495	$ 5 201 185 931	$ 1 045 243 878
T4 -2024	Acta 06 FEV7	15-ago-24	@ 14-sep-24	11-oct-24	$ 1 760 008 229	$ 1 760 008 229	$ 3 827 715 543			$ 35 436 351 179	11.98%	$ 246 102 849	$ 4 955 083 082	$ 1 513 905 380
	Acta 07 FEV8	15-sep-24	@ 14-oct-24	12-nov-24	$ 2 201 473 917	$ 2 201 473 917	$ 6 029 189 460			$ 33 234 877 262	11.98%	$ 307 833 221	$ 4 647 249 860	$ 1 893 640 695
	Acta 08 FEV9	15-oct-24	@ 14-nov-24	6-dic-24	$ 1 904 682 057	$ 1 904 682 057	$ 7 933 871 517			$ 31 330 195 205	11.98%	$ 266 332 670	$ 4 380 917 190	$ 1 638 349 427
	Acta 09 FEV10	15-nov-24	@ 14-dic-24	14-dic-24	$ 1 922 535 860	$ 1 922 535 860	$ 9 856 407 437	$ 5 416 143 663		$ 29 407 659 345	11.98%	$ 268 829 171	$ 9 526 231 682	$ 1 653 706 689
T1 -2025	Acta 10 FEV11	15-dic-24	@ 14-ene-25	25-feb-25	$ 803 330 553	$ 803 330 553	$ 10 659 737 970			$ 28 604 328 792	12.39%	$ 260 228 564	$ 9 266 003 118	$ 543 101 989
	Acta 11 FEV12	15-ene-25	@ 14-feb-25	21-mar-25	$ 591 624 561	$ 591 624 561	$ 11 251 362 531			$ 28 012 704 191	12.39%	$ 191 649 141	$ 9 074 353 977	$ 399 975 420
T2 -2025	Acta 12 FEV13	15-feb-25	@ 14-mar-25	28-abr-25	$ 239 738 720	$ 239 738 720	$ 11 491 101 251			$ 27 772 965 471	12.39%	$ 77 660 264	$ 8 996 693 713	$ 162 078 456
	Acta 13 FEV14	15-mar-25	@ 14-abr-25	16-may-25	$ 255 278 331	$ 255 278 331	$ 11 746 379 582			$ 27 517 687 140	12.39%	$ 82 694 121	$ 8 913 999 592	$ 172 584 210
	Acta 14 FEV15	15-abr-25	@ 14-may-25	18-jun-25	$ 431 134 702	$ 431 134 702	$ 12 177 514 284			$ 27 086 552 438	12.39%	$ 139 660 522	$ 8 774 339 070	$ 291 474 180
T3 -2025	Acta 15 FEV16	15-may-25	@ 14-jun-25	10-jul-25	$ 201 113 605	$ 201 113 605	$ 12 378 627 889			$ 26 885 438 833	12.39%	$ 65 148 157	$ 8 709 190 913	$ 135 965 448
	Acta 16 FEV17	15-jun-25	@ 14-jul-25	26-jul-25	$ 1 103 584 084	$ 1 103 584 084	$ 13 482 211 973			$ 25 781 854 749	12.39%	$ 357 491 821	$ 8 351 699 092	$ 746 092 263
	Acta 17 FEV18	15-jul-25	@ 14-ago-25	21-ago-25	$ 1 181 069 565	$ 1 181 069 565	$ 14 663 281 538			$ 24 600 785 184	12.39%	$ 382 592 242	$ 7 969 108 850	$ 798 477 323
	Acta 18 FEV19	15-ago-25	@ 14-sep-25	23-sep-25	$ 558 595 776	$ 558 595 776	$ 15 221 877 314			$ 24 042 189 408	12.39%	$ 180 949 892	$ 7 788 156 958	$ 377 645 884
T4 -2025	Acta 19 FEV20	15-sep-25	@ 15-oct-25	20-oct-25	$ 1 412 463 518	$ 1 412 463 518	$ 16 634 340 832			$ 22 629 725 890	12.39%	$ 457 549 327	$ 7 330 607 631	$ 954 914 191
	Acta 20 FEV21	16-oct-25	@ 14-nov-25	15-dic-25	$ 1 837 031 106	$ 1 837 031 106	$ 18 471 371 938			$ 20 792 694 784	12.39%	$ 596 082 517	$ 6 735 525 114	$ 1 241 948 589
	Acta 21 FEV22	15-nov-25	@ 6-dic-25	15-dic-25	$ 556 686 464	$ 556 686 464	$ 19 028 058 382			$ 20 236 008 340	12.39%	$ 180 331 389	$ 6 555 193 725	$ 376 355 055
	Acta 22 FEV 23	7-dic-25	@ 20-dic-25	22-dic-25	$ 1 063 716 839	$ 1 063 716 839	$ 20 091 775 221			$ 19 172 291 501	12.39%	$ 344 577 341	$ 6 210 616 384	$ 719 139 498
T1 -2026	Acta 23 FEV 24	21-dic-25	@ 14-ene-26	2-feb-26	$ 673 372 005	$ 673 372 005	$ 20 765 147 226		$ 11 431 284 462	$ 29 930 203 958	20.29%	$ 136 652 501	$ 6 073 963 883	$ 536 719 504
	Acta 24 FEV 25	15-ene-26	@ 14-feb-26	23-feb-26	$ 1 110 947 458	$ 1 110 947 458	$ 21 876 094 684			$ 28 819 256 500	20.29%	$ 225 453 015	$ 5 848 510 868	$ 885 494 443
T2 -2026	Acta 25 FEV 26	15-feb-26	@ 14-mar-26	24-mar-26	$ 274 365 635	$ 274 365 635	$ 22 150 460 319			$ 28 544 890 865	20.29%	$ 55 679 105	$ 5 792 831 763	$ 218 686 530
	Acta 26 FEV 27	15-mar-26	@ 14-abr-26	23-abr-26	$ 743 796 779	$ 743 796 779	$ 22 894 257 098			$ 27 801 094 086	20.29%	$ 150 944 336	$ 5 641 887 427	$ 592 852 443
	Acta 27 FEV 28	15-abr-26	@ 14-may-26	25-may-26	$ 370 481 978	$ 370 481 978	$ 23 264 739 076			$ 27 430 612 108	20.29%	$ 75 184 725	$ 5 566 702 702	$ 295 297 253
T3 -2026	Acta 28	15-may-26	@ 14-jun-26	Proyección		$ 9 736 134 084	$ 32 999 873 160			$ 17 794 278 024	20.29%	$ 1 972 433 062	$ 3 593 269 640	$ 7 763 701 022
	Acta 29	15-jun-26	@ 14-jul-26	Proyección		$ 6 461 183 086	$ 39 450 356 251			$ 11 245 094 938	20.29%	$ 1 311 217 016	$ 2 282 052 624	$ 5 149 966 070
Cierre	Cierre		@ 14-jun-26	Proyección	Cierre Variable	$ 11 245 094 938	$ 50 695 351 188			$ -	20.29%	$ 2 282 052 624	$ -	$ 8 963 042 309
	TOTAL CAUSADO				$ 23 264 739 076		$ 23 264 739 076					$ 5 337 755 461	$ 5 566 702 702	$ 17 926 983 615
	TOTAL PROYECTADO / VERIFICACIÓN			Proyección	☑	☑	☑			☑		$ 10 904 458 163	51.05%	$ 39 790 893 023

VIGENCIA	VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL.	PERIODO DE CONSUMO - CONTRATO DE OBRA				ESTADO ACTUALIZADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL A INFORME SEMANAL N° 168			
		PERIODO	% PAGADO	VALOR PAGADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL : "RP"	VALOR ANTICIPO ASIGNADO A RP	VIGENCIA	% CONSUMIDO DE "R.P"	VALOR SALDO REG PRESUP.	
2022	$ 5 490 314 500	2022	0.00%	$ -	$ 5 490 314 500	2022	100%	$ -	
2023	$ 12 373 371 200	2024	100.00%	$ 8 478 180 936	$ 3 895 220 264	2023	100%	$ 30 000	
2024	$ 15 759 081 782	2025	100.00%	$ 6 919 752 506	$ 1 518 923 398	2024	54%	$ 8 839 329 276	
2025	$ 5 641 299 240	2026	100.00%	$ 2 529 050 173		2025	45%	$ 3 112 249 067	
2026	$ 11 431 284 462	2026				2026		$ 11 431 284 462	
--	$ -	--	--	--	--	--	--	--	
TOTALES	$ 50 695 351 184			$ 17 926 983 615	$ 10 904 458 163	TOTALES		$ 21 863 879 406	
VALOR ANTICIPO TOTAL →	$ 10 904 458 163.00	VALOR AMORTIZADO →		$ 5 337 755 461	48.95%	SALDO POR AMORTIZAR →		$ 5 566 702 702	51.05%

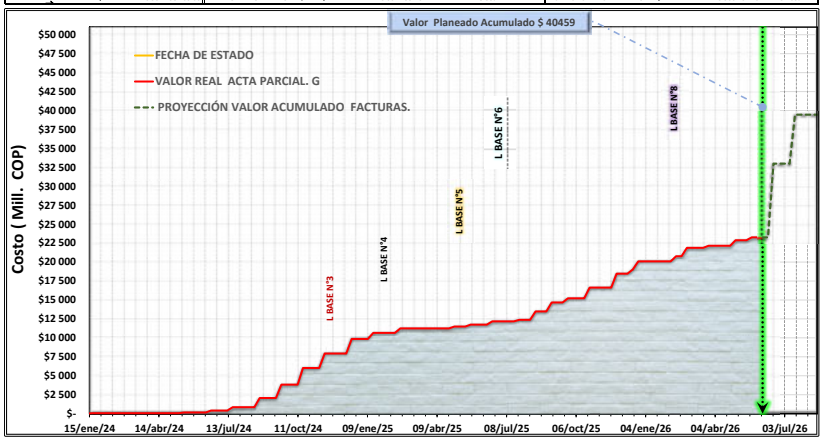

ANALISIS SEGUIMIENTO FINANCIERO - PROYECCIÓN DE INVERSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 22001464 H3 de 2022

PERIODO TRIMESTRE	CONCEPTO	PERIODO EJECUTADO		FECHA GENERACIÓN DE FACTURA FEV	VALOR REAL FACTURADO	A		INCORPORACIÓN DE		B	C	D	E	F
						VALOR REAL FACTURADO & PROYECTADO	FACTURADO ACUMULADO	ANTICIPO	ADICION	SALDO DEL CONTRATO	% AMORTIZADO	VALOR AMORTIZADO DEL ACTA	SALDO DEL ANTICIPO	"RP" VALOR PAGADO REGIST PRESUP.: A-D
DATO	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO			DATO		$A - B_{n-1}$	$(B_{n-1}) / (E_{n-2})$	$A * D$	$(E_{n-1}) - B_{n-1}$	$A - D$
T1-2024								$ 547 031 450		$ 3 158 424 339			$ 547 031 450	
T2-2024	Acta 01 FEV2	15-oct-23	@ 14-ene-24	14-jun-24	$ 3 957 106	$ 3 957 106	$ 3 957 106			$ 3 154 467 233	17.32%	$ 685 361	$ 546 346 089	$ 3 271 745
T3-2024	Acta 02 FEV3	15-ene-24	@ 14-may-24	16-jul-24	$ 6 817 347	$ 6 817 347	$ 10 774 453			$ 3 147 649 886	17.32%	$ 1 180 768	$ 545 165 341	$ 5 636 599
	Acta 03 FEV4	15-may-24	@ 14-jun-24	6-ago-24	$ 19 054 763	$ 19 054 763	$ 29 829 216			$ 3 128 595 123	17.32%	$ 3 300 239	$ 541 865 102	$ 15 754 524
	Acta 04 FEV5	15-jun-24	@ 14-jul-24	23-ago-24	$ 32 715 887	$ 32 715 887	$ 62 545 103			$ 3 095 879 236	17.32%	$ 5 666 312	$ 536 198 790	$ 27 049 575
	Acta 05 FEV6	15-jul-24	@ 14-ago-24	19-sep-24	$ 89 748 301	$ 89 748 301	$ 152 293 404			$ 3 006 130 935	17.32%	$ 15 544 188	$ 520 654 601	$ 74 204 113
T4 -2024	Acta 06 FEV7	15-ago-24	@ 14-sep-24	11-nov-24	$ 129 968 299	$ 129 968 299	$ 282 261 703			$ 2 876 162 636	17.32%	$ 22 510 195	$ 498 144 406	$ 107 458 104
	Acta 07 FEV8	15-sep-24	@ 14-oct-24	12-nov-24	$ 162 590 864	$ 162 590 864	$ 444 852 567			$ 2 713 571 772	17.32%	$ 28 160 364	$ 469 984 042	$ 134 430 500
	Acta 08 FEV9	15-oct-24	@ 14-nov-24	16-dic-24	$ 140 668 459	$ 140 668 459	$ 585 521 066			$ 2 572 903 273	17.32%	$ 24 363 464	$ 445 620 618	$ 116 305 055
	Acta 09 FEV10	15-nov-24	@ 14-dic-24	14-dic-24	$ 164 454 687	$ 164 454 687	$ 749 975 753			$ 2 408 448 586	17.32%	$ 28 483 154	$ 417 137 465	$ 30 846 417
T1 -2025	Acta 10 FEV11	15-dic-24	@ 14-ene-25	25-feb-25	$ 59 329 571	$ 59 329 571	$ 809 305 324			$ 2 349 119 015	17.32%	$ 10 275 738	$ 406 861 727	$ 49 053 833
	Acta 11 FEV12	15-ene-25	@ 14-feb-25	27-mar-25	$ 43 786 731	$ 43 786 731	$ 853 092 055			$ 2 305 332 284	17.32%	$ 7 583 756	$ 399 277 971	$ 36 202 975
T2 -2025	Acta 12 FEV13	15-feb-25	@ 14-mar-25	16-may-25	$ 17 688 680	$ 17 688 680	$ 870 780 735			$ 2 287 643 604	17.32%	$ 3 063 637	$ 396 214 335	$ 14 625 043
	Acta 13 FEV14	15-mar-25	@ 14-abr-25	27-may-25	$ 18 848 593	$ 18 848 593	$ 889 629 328			$ 2 268 795 011	17.32%	$ 3 264 531	$ 392 949 804	$ 15 584 062
	Acta 14 FEV15	15-abr-25	@ 14-may-25	11-jul-25	$ 32 767 554	$ 32 767 554	$ 922 396 882			$ 2 236 027 457	17.32%	$ 5 675 261	$ 387 274 543	$ 27 092 293
T3 -2025	Acta 15 FEV16	15-may-25	@ 14-jun-25	31-jul-25	$ 14 788 895	$ 14 788 895	$ 937 185 777			$ 2 221 238 562	17.32%	$ 2 561 401	$ 384 713 142	$ 12 227 494
	Acta 16 FEV17	15-jun-25	@ 14-jul-25	20-ago-25	$ 437 351 211	$ 437 351 211	$ 1 374 536 988		$ 867 960 106	$ 2 651 847 457	12.45%	$ 54 465 503	$ 330 247 639	$ 382 885 708
	Acta 17 FEV18	15-jul-25	@ 14-ago-25	18-sep-25	$ 119 015 202	$ 119 015 202	$ 1 493 552 190			$ 2 532 832 255	12.45%	$ 14 821 550	$ 315 426 089	$ 104 193 652
T4 -2025	Acta 18 FEV19	15-ago-25	@ 14-sep-25	1-oct-25	$ 59 525 040	$ 59 525 040	$ 1 553 077 230			$ 2 473 307 215	12.45%	$ 7 412 947	$ 308 013 143	$ 52 112 093
	Acta 19 FEV20	15-sep-25	@ 15-oct-25	27-oct-25	$ 142 343 764	$ 142 343 764	$ 1 695 420 994			$ 2 330 963 451	12.45%	$ 17 726 771	$ 290 286 372	$ 124 616 993
	Acta 20 FEV21	16-oct-25	@ 14-nov-25	28-nov-25	$ 185 046 892	$ 185 046 892	$ 1 880 467 886			$ 2 145 916 559	12.45%	$ 23 044 802	$ 267 241 570	$ 162 002 090
	Acta 21 FEV22	15-nov-25	@ 6-dic-25	18-dic-25	$ 56 146 707	$ 56 146 707	$ 1 936 614 593			$ 2 089 769 852	12.45%	$ 6 992 226	$ 260 249 344	$ 49 154 481
	Acta 22 FEV 23	7-dic-25	@ 20-dic-25	24-dic-25	$ 111 020 695	$ 111 020 695	$ 2 047 635 288			$ 1 978 749 157	12.45%	$ 13 825 953	$ 246 423 389	$ 97 194 740
T1 -2026	Acta 23 FEV 24	21-dic-25	@ 14-ene-26	6-mar-26	$ 79 292 298	$ 79 292 298	$ 2 126 927 586		$ 902 759 894	$ 2 802 216 753	8.55%	$ 6 780 987	$ 239 642 402	$ 72 511 311
	Acta 24 FEV 25	15-ene-26	@ 14-mar-26	5-may-26	$ 27 060 959	$ 27 060 959	$ 2 153 988 545			$ 2 775 155 794	8.55%	$ 2 314 223	$ 237 328 179	$ 24 746 736
	Acta 25 FEV 26	15-feb-26	@ 14-mar-26	25-may-26	$ 66 774 939	$ 66 774 939	$ 2 220 763 484			$ 2 708 380 855	8.55%	$ 5 710 517	$ 231 617 662	$ 61 064 422
T2 -2026	Acta 25	15-mar-26	@ 14-abr-26	Proyección	●					$ 2 708 380 855	8.55%	$ -	$ 231 617 662	$ -
	Acta 26	15-abr-26	@ 14-may-26	Proyección	●					$ 2 708 380 855	8.55%	$ -	$ 231 617 662	$ -
T3 -2026	Acta 27	15-may-26	@ 14-jun-26	Proyección	●					$ 2 708 380 855	8.55%	$ -	$ 231 617 662	$ -
	Acta 28	15-jun-26	@ 14-jul-26	Proyección	●					$ 2 708 380 855	8.55%	$ -	$ 231 617 662	$ -
Cierre	Cierre		@ 14-jun-26	Proyección	Cierre Variable					$ 2 708 380 855	8.55%	$ -	$ 231 617 662	$ -
	TOTAL CAUSADO				$ 2 220 763 484	$ -						$ 315 413 788	$ -	$ 1 800 224 580

VIGENCIA	VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL.	PERIODO DE CONSUMO - CONTRATO DE INTERVENTORIA				ESTADO ACTUALIZADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL A INFORME SEMANAL N° 168			
		PERIODO	% PAGADO	VALOR PAGADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL : "RP"	VALOR ANTICIPO ASIGNADO A RP	VIGENCIA	% CONSUMIDO	VALOR SALDO REG PRESUP.	
2022	$ 547 031 450	2022		$ -	$ 547 031 450	2022	100%	$ -	
2023	$ 1 243 929 603	2024	100%	$ 514 956 652		2023	92%	$ 105 125 116	
		2025	55.36%	$ 623 847 835					
2024	$ 962 406 277	2025	44.64%	$ 503 097 622		2024	52%	$ 459 308 655	
2025	$ 1 273 017 115	2026	100.00%	$ 158 322 469		2025	12%	$ 790 485 539	
2026	$ 902 759 894	2026	--	--	--	2026		--	
			--	--					
TOTALES	$ 4 929 144 339			$ 1 800 224 578	$ 547 031 450	TOTALES		$ 1 354 919 310	
VALOR ANTICIPO TOTAL →	$ 547 031 450.00	VALOR AMORTIZADO →		$ 315 413 788	57.66%	SALDO POR AMORTIZAR →		$ 231 617 662	42.34%
