	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	7/07/2026	PERIODO REPORTADO DEL:	1/06/2026	AL:	16/06/2026
CONTRATO Nº	013-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CONTRATISTA	CONSORCIO S2A 2025		
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA				
FECHA DE INICIO	1/09/2025	FECHA DE TERMINACION	16/06/2026		

VALOR INICIAL	$ 6.614.315.008,00	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 6.614.315.008,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL 65-44-101242267 (Cumplimiento) Y 65-40-101083513 (Responsabilidad Civil Y Extracontractual), DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A ,

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se adicionan 14 ítems no previsto conforme al balance de obra, se cambia especificación técnica del transformador de 150 KVA, se constituye en reserva la suma de $2.428.502.479,50 y se establecen 2 pagos, parciales en el primer trimestre de 2026 y saldo en el segundo trimestre de 2026. Se modifica plazo de ejecución hasta el 07 de marzo de 2026 y se modifican las garantías, las cuales el contratista una vez se establezca el valor del SMMLV del año 2026, deberá ajustar la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. El cual fue modificado con ampliación de plazo hasta el 20 de abril 2026.
FORMA DE PAGO	Modificase parcialmente la cláusula 2 - Apropiación presupuestal y forma de pago - del clausulado adicional al contrato electrónico No. 013-00-A-COFAC-DIFRA-2025, numeral 2.2, - Forma de Pago - en el sentido de constituir la suma de $2.428.502.479,50 recursos de la vigencia 2025, en reserva presupuestal los cuales se pagarán así: a. Pagos Parciales: Se harán pagos parciales con cargo al PAC del primer trimestre de 2026; previo recibo a satisfacción del corte de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, acta de recibo parcial a satisfacción debidamente firmada por El Contratista y el Interventor o Supervisor y Ordenador del gasto, y demás tramites administrativos a que haya lugar. **NOTA:** Los pagos parciales podrán ser mensuales, bimestrales o trimestrales. En todo caso, los pagos deberán ser evaluados por la interventoría, quien de acuerdo con rendimiento de obra podrá definir en que momento de la vigencia se efectuará un pago parcial. b. Pago saldo del contrato: Los recursos que no se hayan comprometido dentro de los pagos parciales efectuados, corresponderán al saldo del contrato y se cancelarán con cargo al PAC del segundo trimestre de 2026, previos trámites administrativos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	7/03/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 6.614.315.008
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se prorroga el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026, en concordancia con la modificación del contrato de obra, se modifican garantías.
FORMA DE PAGO	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	31/03/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 6.614.315.008
MODIFICATORIO No.3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica forma de pago en pagos parciales y saldo en el segundo trimestre de 2026. Se prorroga plazo de ejecución hasta el 20 de abril de 2026. Se hace acuerdo de cesión de derechos económicos, se incluyen actividades no previstas y se modifican las garantías.
FORMA DE PAGO	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	20/04/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 6.614.315.008
SUSPENSION No.4	
FECHA DE SUSPENSIÓN	17/04/2026
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	Por desbalance de obra frente a lo reportado por el contratista de obra y a la información de interventoría, se solicita suspender el contrato mientras se hacen las correcciones respectivas, en cantidades y medidas.
FECHA DE REINICIO	20/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	20/05/2026
MODIFICATORIO No.5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica forma de pago en pagos parciales y saldo en el tercer trimestre de 2026. Se prorroga plazo de ejecución hasta el 16 de junio de 2026. Se hace acuerdo de cesión de derechos económicos, se incluyen actividades no previstas y se modifican las garantías.
FORMA DE PAGO	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	16/06/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 6.614.315.008

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						DIRECTOR DE OBRA	1	50	100	SI	
						RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	
						INSPECTOR SISOMA	1	100	100	SI	
						GERENTE DE PROYECTOS	1	100	100	SI	
						CONTRATISTA ELÉCTRICO	4				
						SST CONTRATISTA ELÉCTRICO	1				
						SST CONTRATISTA HVAC	1				
						OPERARIOS CONTRATISTA HVAC	11				
						CONTRATISTA BRITO	4				
						CONTRATISTA BETÓN	1				
						TOTAL	26				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	95,82%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 36 (Junio 06/2026)	2,37%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 37 (Junio 16/2026)	1,81%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO






















































GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7, INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. INSTALACIONES MECANICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11, CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
12, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
15. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
25, VIAS - PAVIMENTOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
27. EQUIPOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
RETIRO DE TUBERÍA PVC-S EXISTENTE, INCLUYE CORTE DE TUBERÍA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
DEMOLICIÓN DE CAJA DE REGISTRO EXISTENTE EN CONCRETO DE 1,40M X 1,60M, H= 1,20 M, E=0,25M, INCLUYE DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RCI PVC-Ø 4". INCLUYE UNIÓN DE REPARACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI LLENOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA PVC-S Ø 6". NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI LLENOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 60CM X 60CM EN CONCRETO DE 21 MPA, H= 0,40M A 1,0 M, E=15 CM, INCLUYE CAÑUELA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 1", INCLUYE 2 UNIONES PVC-P DE Ø1", 3 CODOS PVC-P DE 90°	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-S DE Ø 8", NO INCLUYE EXCAVACION, LLENOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO ENTERRADAS EN PAVIMENTOS, INCLUYE EQUIPO DE DEMOLICIÓN.	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
CONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 28 MPA, ESPESOR DE 0,10 M. LLANEADO, INCLUYE FIBRA MACROSINTETICA, FIBRA MICROSINTETICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE 40CM X 40CM EN CONCRETO DE 21 MPA, H= 0,30M A 0,60 M, E=15 CM, INCLUYE CAÑUELA, TAPA Y MARCO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 1,65 M X 0,90 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 1,45 M X 0,90 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 0,70 M X 0,90 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO Y APLICACION DE POLIUREA PURA RESISTENTE A RAYOS UV	PROGRAMADO		100,00%

CON ESPESOR PROMEDIO DE 60 MILLS, INCLUYE LA PREPARACIÓN PREVIA DE	EJECUTADO		100,00%
NIVELACIÓN DE ROCEADORES PARA EL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS, INCLUYE RETIRO DE ROCEADORES, RETIRO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
REUBICACIÓN DE GABINETE CONTRAINCENDIOS, INCLUYE TUBERIA ASTM A 795 2" RCI C-900, 3 CODO 90° C-900, 6 UNIONES RIGIDA	PROGRAMADO		100,00%
RANURADAS DE 2" UL	EJECUTADO		100,00%
REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA-SIRENA, INCLUYE DESCONEXIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y CONEXIÓN DE ELEMENTOS	PROGRAMADO		100,00%
EXISTENTES SOBRE PANEL	EJECUTADO		100,00%
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS ESCARIFICACIÓN, RETIRANDO EL SISTEMA DE SUPERFICIE ADHERENTE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE EPOXICO SIKADUR 32 PRIMER SOBRE CONCRETO EXISTENTE PARA GARANTIZAR	PROGRAMADO		100,00%
ADHERENCIA ENTRE LOS DOS	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASES PARA SOPORTES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PERFIL	PROGRAMADO		100,00%
IPE Y TUBERÍA	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE REMARCOS EN PERFIL DE 50X30X 2 MM, PARA SALIDAS DE DUCTOS DE AIRE	PROGRAMADO		100,00%
ACONDICIONADO EN CIELOS	EJECUTADO		100,00%
REUBICACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO EXISTENTE SOBRE PASARELA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE GABINETE, REINSTALACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
PASMEN EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 0,60 M X 0,30 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL	PROGRAMADO		100,00%
PUNTO DE ACOPIO	EJECUTADO		100,00%
TRASLADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS, LOCALIZADAS FUERA DE LA LINEA DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISOS,	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 1/0, INCLUYE SOLDADURA COBRE Y DEMAS ELEMENTOS	PROGRAMADO		100,00%
NECESARIOS PARA SU	EJECUTADO		100,00%
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, INCLUYE CORTE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE GRANIPLAS PARA ANTEPECHOS, INCLUYE PREPARACION DE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA RESANES DE MURO FACHADA, INCLUYE RETIRO DE PIEZAS	PROGRAMADO		100,00%
AFECTADAS, INSTALACIÓN	EJECUTADO		100,00%
CONSTRUCCIÓN DE ABERTURA DE Ø 4" PARA PASE DE DUCTO ELECTRICO ACOMETIDA TRANSFORMADOR, INCLUYE	PROGRAMADO		100,00%
RESANE, PINTURA Y	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1/2" PVC PARA CONEXIÓN DE RED DE AGUA HELADA, LLAVE	PROGRAMADO		100,00%
REGULADORA 1/2 TEE	EJECUTADO		100,00%
RETIRO DE CANALETA ELECTRICA EN CUBIERTA, PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIONES MECÁNICAS	PROGRAMADO		100,00%
E HIDRAULICAS	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA SALIDAS DE ASPERSORES DE RCI EN CIELOS, INCLUYE	PROGRAMADO		100,00%
ANDAMOS, ESCUDOS EN	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONTRUCCIÓN DE MURO EN SUPERBOARD UNA CARA PARA CERRAMIENTO DE VANOS DE PUERTA	PROGRAMADO		100,00%
MEDIDAS 1.65 X 2.0	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE EN CONCRETO DE 21 MPA PARA TUBERÍA EN PVC-S DE Ø 6", INCLUYE	PROGRAMADO		100,00%
FORMALETA	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S DE Ø 2", INCLUYE 2 CODO PVC-S Ø 2	PROGRAMADO		100,00%
" DE 45°, 1 UNIÓN PVC-S Ø 2"	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE BASE GRANULAR	PROGRAMADO		100,00%
ESPESOR 10 CM	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PREFABRICADO EN POLIETILENO ACABADO EN REJILLA EN ACERO	PROGRAMADO		100,00%
GALVANIZADO, INCLUYE	EJECUTADO		100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE BASE GRANULAR ESPESOR 10 CM.	PROGRAMADO		100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL	EJECUTADO		100,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



Contractual	289	289	0





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

•Se realizaron trabajos de conexión de tableros eléctricos y pruebas unidades chillers
•Pruebas de programación.
•Organización de los sensores en tableros.
•Remates poliuretano y sellado.
•Pruebas al sistema de detección nivel 1 y 2 zona de cubierta.
•Realización de ponchado en cable de datos en rack y punto de monitoreo.
•Realización de prueba a la planta eléctrica y sistema HVAC.
•Instalación de pathcord de administración y en laboratorio.
•Reparación de panales que se encontraban con detalles visuales.
•Instalación de puntos energizados en piso con punto regulado y normal.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
No aplica	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES:
Al finalizar el periodo de control registra un adelanto 1,20%, y se requiere para terminar dentro del plazo contractual, garantizar las pruebas y calibración del sistema HVAC, definir certificador de puntos de datos, instalar tomas reguladas en tableros eléctricos, y demas entregas de la obra civil.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 6.614.315.008,00	$ 6.614.315.008,00	$ 6.614.315.008,00	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 6.614.315.008,00	$ 6.614.315.008,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 6.614.315.008,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 6.614.315.008,00	
ANTICIPO	$ 3.307.157.504,00	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2025	$ 12.228.366,50	AMORTIZA 50% FACTURA DE OBRA CIVIL
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE 2025 CXP 2026	$ 866.426.658,00	AMORTIZA 50% FACTURA DE OBRA CIVIL
TERCER PAGO PAC FEBRERO 2026	$ 566.124.564,86	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 1.444.779.589,36	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	APROBADA LA PROGRAMACION INICIAL (5/9/2025)
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI		SI	SI	SI	APROBADO PLAN AJUSTADO VERSION 3 (10/9/2025)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		SI	SI	SI	
ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	SI		SI	SI	SI	APROBADO Y COMPLETO
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL	SI		SI	SI	SI	
MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS	SI		SI	SI	SI	APROBADO
VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	APROBADOS LOS PROFESIONALES DE OBRA Y LOS ASESORES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI		SI	SI	SI	APROBADO, PENDIENTE AJUSTARLO AL DE EMAVI
ACTAS DE VECINDAD	SI		SI	NO	NO	REQUIERE MEJOR DESCRIPCION AL DETALLE POR PARTE DEL CONTRATISTA
DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SI		SI	SI	SI	
PLAN DE CALIDAD	SI		SI	SI	SI	
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS	SI		SI	SI	SI	
REVISION PRELIMINAR PROYECTO	SI		SI	SI	SI	
VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	SI		SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se encuentra en proceso de revisión y conciliación del corte N°4 de obra

SE RECIBEN FACTOR PONDERABLE TECNICO BICILCETERO

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SECO Y NUBLADO

ELABORO:	**REVISO:**
Residente de Interventoria/Supervisor Firma y Posfirma	Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)




Laboratorio en la zona interna



Control del sistema encendido de aires acondicionado



Vía de acceso al laboratorio con sus respectivos andenes

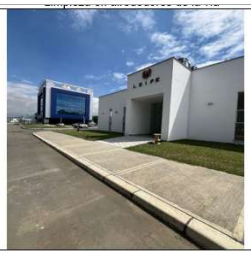

Fachada externa del laboratorio EMAVI



Ductos en azotea



Limpieza en alrededores de la vía



Realización de prueba a la plata eléctrica



Transformador eléctrico



Chillers y equipos mecánicos instalados



Sistema HVAC



INFORME TÉCNICO Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N.°10

OBJETO: "CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°044-00-A-COFAC-DIFRA-2025. EL CUAL TIENE POR OBJETO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA"

JBG GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Periodo del 01 de Junio 2026 a 16 de Junio de 2026

<table>
<tr><th>ELABORÓ</th><th>APROBÓ</th></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">
ING. YOLIMA RUIZ SILVA
DIRECTOR INTERVENTORÍA</td></tr>
<tr><td>ING. ALEXANDER VASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA</td></tr>
<tr><td>ELABORÓ</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>YAJAIRA VASQUEZ MERCADO
INSPECTOR SISOMA</td></tr>
</table>

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVO 6
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. GENERALIDADES 9
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
4.2. DIRECTORIO TELEFÓNICO DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO. 10
4.3. CONDICIONES CONTRACTUALES 12
4.3.1. Condiciones Contractuales del Contrato de Obra. 12
4.3.2. Control de Pólizas del Contratista. 13
4.3.3. Condiciones Contractuales del Contrato de Interventoría 14
4.3.4. Control de Pólizas de la Interventoría. 14
4.3.5. Modificaciones en el Tiempo: Prórroga y/o Suspensiones 15
5. INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 19
6. ESTUDIOS Y DISEÑOS 21
7. SEGUIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. 21
7.1. AVANCE GENERAL DE LA OBRA. 21
7.2. INFORMES DIARIOS 31
7.3. INFORMES SEMANALES 31
7.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO 32
7.5. ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA DE OBRA. 33
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS. 35
7.7. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 36
7.8. SEGUIMIENTO CONTABLE 38
7.9. REGISTRO AL COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO 39
7.10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 39
7.11. BITÁCORA DE OBRA 42
8. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 42
8.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 42
8.2 ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA 43
8.3 CONTROL A LA CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 43
8.4 APOYO DE ASESORES INTERVENTORÍA. 43
9. SEGUIMIENTO AL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 45

9.1. CONTROL DE INVERSIÓN Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 45
9.2. PROYECCION DE LA OBRA 47
10. INFORME DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 47
10.1 REQUERIMIENTOS SST 47
10.2 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST 47
10.3 LISTA DE VERIFICACIÓN ACTIVIDADES 48
10.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SST 49
10.5 INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA 53
10.6 PLAN DE CONTINGENCIA 53
10.7 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERIODO 54
10.8 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 54
10.9 PREOPERACIONALES Y PERMISOS DE TRABAJO 54
10.10 AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 55
10.11 CONTROL DEL PERSONAL 55
10.12 INDUCCIONES 59
10.13 CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 59
10.14 INSPECCIONES SISOMA CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 59
10.15 ESTUDIO DE SEGURIDAD 60
11. COMPONENTE AMBIENTAL 61
11.1 Manejo integral de residuos 61
11.2 Manejo de residuos peligrosos 62
11.3 Manejo y control de emisiones atmosféricas 62
11.4 Manejo y gestión del agua 62
11.5 Control del ruido 63
11.6 Manejo ambiental de RCD en obra 63
12. MÁQUINARIA Y EQUIPOS 63
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 65

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No.01: Contratos, Acta de inicio y Modificatorios
Anexo No.02: Control de Pólizas
Anexo No.03: Documentos de Seguimiento Contractual
Anexo No.04: Informes de Trámites Administrativos
Anexo No.05: Informes técnicos por componentes trámites administrativos
Anexo No.06: Informes Diarios
Anexo No.07: Informes Semanales
Anexo No.08: Registro al comportamiento climático
Anexo No.09: Bitácora de Obra
Anexo No.10: Actas de Comité – Obra y DIFRA
Anexo No.11: Correspondencia Enviada y Recibida
Anexo No.12: Control de planos
Anexo No.13: Programación de obra.
Anexo No.14: Informe mensual del contratista.
Anexo No.15: Plan de contingencia de obra
Anexo No.16: Preoperacionales
Anexo No.17: Pago de seguridad social del contratista
Anexo No.18: Pago de seguridad social interventoría
Anexo No.19: Control de personal en obra
Anexo No.20: Inducciones personal contratista
Anexo No.21: Capacitaciones y charlas a trabajadores interventoría y contratista
Anexo No.22: Inspecciones sisoma contratista e interventoría
Anexo No.23: Dotación contratista
Anexo No.24: Plan de manejo ambiental
Anexo No.25: Técnico-mecánica documentación vehículos
Anexo No.26: ATS
Anexo No.27: Informe mensual asesores interventoría
Anexo No.28: Formatos de seguimiento
Anexo No.29: Permisos de trabajo
Anexo No.30: Certificado ARL accidentabilidad contratista e interventoría

Anexo No.31: Pagos FIC

Anexo No.32: Documentación manejo de residuos

Anexo No.33: Paz y salvos

CONTENIDO ILUSTRACIONES

Ilustración 1.*Mapa de la ciudad de Santiago de Cali. Fuente: Atlas General de Cali – Gobernación de Valle del Cauca.* 7
Ilustración 2. *Ubicación zona de estudio de la escuela de aviación Marco Fidel Suarez. Fuente: Google Maps.* 8
Ilustración 3*.Estado de sitio del proyecto antes de la intervención. Fuente: Fotografías tomadas por autoría propia.* 9
Ilustración 4.*Diseños arquitectónicos. Fuente: Planos entregados por la entidad.* 10
Ilustración 5. *Verificación de proceso en SECOP II. Tomado del Secop II.* 20
Ilustración 6. *Reporte de personal en obra del contratista. Elaboración propia.* 57
Ilustración 7. *Reporte de personal en obra interventoría. Elaboración propia.* 58

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1*.Directorio de Participantes. Elaboración propia.* 10
Tabla 2*.Asesores de interventoría. Elaboración propia.* 11
Tabla 3. *Asesores contratista de obra. Elaboración propia.* 11
Tabla 4. *Actividades de obra. Elaboración propia* 12
Tabla 5. *Ficha técnica Contrato de Obra. Elaboración propia.* 12
Tabla 6. *Ficha técnica del contrato de interventoría. Elaboración propia.* 14
Tabla 7. *Curva S del proyecto (Programación Modificatorio 2). Elaboración propia.* 29
Tabla 8. *Curva S del proyecto (Programación Modificatorio 3). Elaboración propia.* 30
Tabla 9. *Informes Semanales. Elaboración propia.* 31
Tabla 10: *Avance programado semanal acumulado. Elaboración propia* 33
Tabla 11. *Relación de la realización de comités de obra y DIFRA. Elaboración propia.* 43
Tabla 12.*Informes técnicos realizados por asesores de interventoría. Elaboración propia.* 44
Tabla 13. *Presupuesto de obra. Elaboración propia.* 45
Tabla 14*. Valores de corte de obra. Elaboración propia* 46
Tabla 15.*Relación de verificación actividades de la interventoría en obra. Elaboración propia.* 48
Tabla 16. *Equipos de emergencia contratista. Elaboración propia.* 53
Tabla 17. *Equipos de emergencia interventoría- Elaboración propia.* 53
Tabla 18. *Registro de accidentabilidad. Elaboración propia.* 54
Tabla 19. *Relación de personal de obra del contratista. Elaboración propia.* 56
Tabla 20.*Relación de personal de obra de la interventoría. Elaboración propia* 58
Tabla 21.*Relación de personal que radica el estudio de seguridad en el periodo. Elaboración propia.* 60
Tabla 22.*Listado de principales vehículos usados en obra mes de MAYO DEL 2026. Elaboración propia* 63
Tabla 24*.Relación equipos utilizados y plan de mantenimiento. Elaboración propia.* 64

1. INTRODUCCIÓN

El 01 de septiembre del 2025, se firmó el acta de inicio correspondiente al contrato 013-00-A-COFAC-DIFRA-2025 - OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI – VALLE DEL CAUCA, adjudicado al CONSORCIO S2A 2025, como la empresa contratista del proyecto. Este documento contiene la información correspondiente al informe de interventoría comprendido entre el 01 de junio de 2026 al 16 de junio del 2026, para las actividades de la etapa de construcción por parte del contratista de obra y de la interventoría, de conformidad con lo estipulado en el contrato de interventoría **044-00-A-COFAC-DIFRA-2025**, y de acuerdo con el anexo técnico y demás documentos contractuales establecidos.

2. OBJETIVO

Presentar a la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, el informe final correspondiente al periodo del 01 de junio 2026 al 16 de junio de 2026, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025 que tiene por objeto “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA en el presente documento, con respecto al desarrollo y seguimiento del objeto contractual, así como el respectivo seguimiento a las actividades técnico-administrativas, ambientales, SST, sociales, eventos y novedades presentadas en el desarrollo del contrato, acorde con los lineamientos establecidos bajo el documento anexo técnico y demás especificaciones técnicas que rigen el proceso ejecutado por JBG GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La ciudad de Cali se encuentra ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el departamento del Valle del Cauca, la segunda ciudad en importancia del país. Cali tiene un ancho de 35 km y la zona urbana se extiende sobre el costado occidental del río.

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y La Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria; al sur se encuentran el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura y Dagua, al suroccidente y al noroccidente, respectivamente.

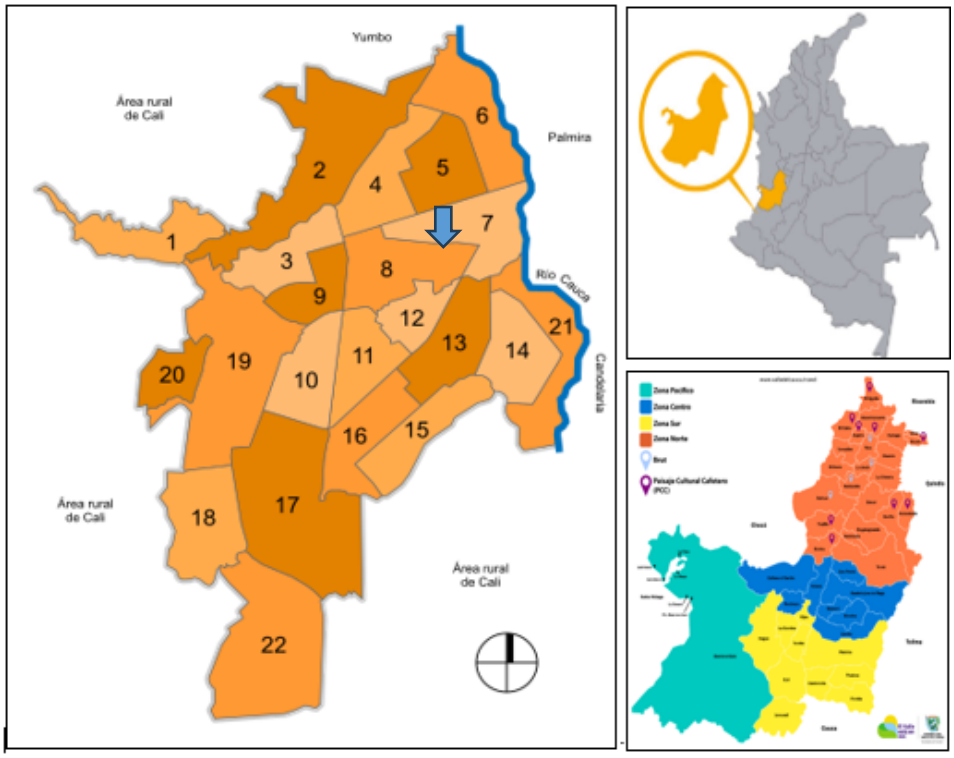


Ilustración 1.*Mapa de la ciudad de Santiago de Cali. Fuente: Atlas General de Cali – Gobernación de Valle del Cauca.*

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, en la Carrera 8 #58-67, Cali, Valle del Cauca, en la comuna 7, al interior de las instalaciones de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”, bajo las coordenadas 3°27'20"N 76°29'37"W - Google Maps.

A continuación, se muestra la localización del predio ubicado en la parte interna de las instalaciones de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.



Ilustración 2. *Ubicación zona de estudio de la escuela de aviación Marco Fidel Suarez. Fuente: Google Maps.*







***Ilustración 3**.Estado de sitio del proyecto antes de la intervención. Fuente: Fotografías tomadas por autoría propia.*

4. GENERALIDADES

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del presente contrato consiste en la ejecución de las obras civiles mediante la modalidad de contrato de obra pública.

La construcción de los laboratorios del Edificio del Espacio Fase III en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, Cali - Valle del Cauca, permitirá que los laboratorios estén funcionales en las áreas de soporte y facilidades, y que se instale el sistema mecánico del área de laboratorios de integración de satélites. Esto conllevará a acondicionar ambientalmente los laboratorios, en particular las áreas de integración ISO-7 y ISO-8. Además, se incluye infraestructura, equipos (mecánicos, eléctricos e hidrosanitarios), entre otras consideraciones.



Ilustración 4.*Diseños arquitectónicos. Fuente: Planos entregados por la entidad.*

4.2. DIRECTORIO TELEFÓNICO DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO.

Tabla 1*.Directorio de Participantes. Elaboración propia.*

PARTICIPANTES	RAZON SOCIAL	NOMBRE DE CONTACTO	E-MAIL	TELÉFONO
Supervisor	Fuerza Aeroespacial Colombiana	ST Jeffery Chiquillo	jeffery.chiquillo@fac.mil.co	3155290097
Director de Interventoría	JBG Gestión de Construcción S.A.S	Ing. Yolima Ruiz	Director.interventoriafac@outlook.com	3013666967
Residente de Interventoría	JBG Gestión de Construcción S.A.S	Ing. Alexander Vásquez	avasquez@juanbgomez.com	3004681453
Gestor SISOMA de Interventoría	JBG Gestión de Construcción S.A.S	Yajaira Vásquez Mercado	Coordinacionsst@jbgsas.co	3004364302
Director de Obra	Consorcio S2A 2025	Ing. Wilmar Arturo Cardona	Wilmar.cardona@abile.co	3122911103
Residente de Obra	Consorcio S2A 2025	Ing. Diego Escobar	Diego.escobar@abile.co	3144779879
Gerente de Proyecto	Consorcio S2A 2025	Ing. Julián Ante	Julian.ante@abile.co	3053450858
Inspector SISOMA de Obra	Consorcio S2A 2025	Diana Quiñonez	diana.quinonez@abile.co	3156669238

De parte de la interventoría, se indicó que los profesionales previamente relacionados fuero acordes con el personal administrativo del proyecto, lo cual fue consonante con los costos indirectos de la obra (ADMINISTRACIÓN). A continuación, se relacionan los profesionales asesores aprobados para el contrato de obra 013-00-A-COFAC-DIFRA-2025 y de interventoría 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025.

La interventoría presentó a la supervisión del contrato el balance proyectado hasta el 16 de junio de 2026, para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025, incluyendo su anexo técnico. En el balance se priorizaron los recursos destinados al acompañamiento de los componentes programados a ser ejecutados desde el 01 de junio hasta el 16 de junio 2026 por parte de los asesores técnicos de interventoría.

***Tabla 2**.Asesores de interventoría. Elaboración propia.*

NOMBRE	CARGO	Email	TELEFONO
Edwin Oñoro	Asesor Ing. eléctrico	edwinonorosalgado@gmail.com	3017889536
Erick Torres	Asesor Ing. Mecánico	asesor.mecanicoemavi@jbgsas.co	3153477882
Elizabeth Luengas	Asesor Hidrosanitario	asesor.hidrosanitarioemavi@jbgsas.co	3175197705
Julio Barranco	Asesor Estructural	jbarranco@juanbgomez.com	3006242438
Rosa Cerro	Asesor Vías	rcerro@juanbgomez.com	3122256483
Oscar Sánchez	Asesor Ing. Topográfico	asesor.topograficoemavi@jbgsas.co	3126603310
María Teresa Argote	Asesor Jurídico	juridica@jbgsas.co	3017115803
Luis Rodríguez	Asesor Contable	contabilidad@juanbgomez.com	3204586563
Andrés Giraldo	Asesor TIC	anmagime@hotmail.com	3174418804

***Tabla 3.** Asesores contratista de obra. Elaboración propia.*

NOMBRE	CARGO	Email	TELEFONO
Christian Sánchez Manzuera	Ing. Electrónico y TIC	cristsanz@gmail.com	3162910323
Alejandro Ceballos	Ing. Electricista	Alejo.04@hotmail.com	3185146813
Susan Morán	Ing. Sanitaria y ambiental	ingsmoranm@gmail.com	3014357956
Lily Cecilia Castrillón	Especialista en pavimentos	inglilycastrillon@gmail.com	3008737063
Juan David Carvajal	Especialista en estructuras	juanda_carva@hotmail.com	3205428194

Ronald Mauricio Restrepo	Ingeniero Mecánico	ronaldrestrepo@yahoo.com	3166176072

En lo que respecta al personal operativo del proyecto, este fue revisado, controlado, relacionado y aprobado diariamente por la firma interventora en el INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

A continuación, se presentan las actividades asociadas a la etapa de construcción, la cual incluyeron los siguientes capítulos:

Tabla 4. *Actividades de obra. Elaboración propia.*

CAPITULO	DESCRIPCIÓN
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS
4	ESTRUCTURA
5	MAMPOSTERÌA
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS
9	INSTALACIONES MECANICAS
11	CIELO RASO
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
15	CARPINTERIA METÁLICA
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS
25	VIAS-PAVIMENTOS
27	EQUIPOS

4.3. CONDICIONES CONTRACTUALES

4.3.1. Condiciones Contractuales del Contrato de Obra.

Tabla 5. *Ficha técnica Contrato de Obra. Elaboración propia.*

CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	Fuerza Aeroespacial Colombiana NIT: 899.999.102-2
CONTRATO N.º	013-00-A-COFAC-DIFRA-2025
FECHA DEL CONTRATO:	01 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	La Obra Pública Para La Construcción De Los Laboratorios Del Edificio Del Espacio Fase III En La Escuela Militar De Aviación Marco Fidel Suárez Cali – Valle Del Cauca
CONTRATISTA DE LA OBRA:	Consorcio S2A 2025 NIT: 901.976.363-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Andrés Felipe Moreno Monsalve C.C. 1.128.266.544 expedida en Medellín,
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$6.614.315.008

PLAZO INICIAL CONTRATO:	4 meses calendario.
FECHA ACTA DE INICIO:	1 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de diciembre de 2025

Ver Anexo No.01: *Contratos*

4.3.2. Control de Pólizas del Contratista.

COMPAÑÍA ASEGURADORA		*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*	
No. Póliza de Cumplimiento		*65-44-101242267 Anexo No.14*	
Fecha de Expedición		*26-06-2026*	
VERIFICACIÓN DE AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Inicial	***Final***	
Cumplimiento del contrato	01-09-2025	31-01-2027	$ 1.322.863.001,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	01-09-2025	31-01-2027	$ 3.307.157.504,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	01-09-2025	16-06-2029	$330.715.750,40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Se ampara por 5 años		$ 1.984.294.502,40
Estabilidad y calidad de la obra.	Se ampara por 5 años		$ 3.307.157.504,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA		*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*	
No. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		*65-40-101083513 Anexo No.13*	
Fecha de Expedición		*26-06-2026*	
VERIFICACIÓN DE AMPAROS			
AMPAROS	***VIGENCIA***		**VALOR ASEGURADO**
	Inicial	***Final***	
Responsabilidad Civil Patronal	01-09-2025	16-06-2026	$ 700.362.000,00
Daño emergente y lucro cesante	01-09-2025	16-06-2026	$ 700.362.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	01-09-2025	16-06-2026	$ 700.362.000,00
Responsabilidad civil Cruzada	01-09-2025	16-06-2026	$ 700.362.000,00

Ver Anexo No.02: *Control de Pólizas*

4.3.3. Condiciones Contractuales del Contrato de Interventoría

Tabla 6. *Ficha técnica del contrato de interventoría. Elaboración propia.*

CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	Fuerza Aeroespacial Colombiana NIT: 899.999.102-2
CONTRATO No.:	044-00-A-COFAC-DIFRA-2025
FECHA DEL CONTRATO:	21 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar En Nombre De La Nación – Ministerio De Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, La Interventoría Técnica, Económica, Jurídica, Financiera, Administrativa Y Contable De La Construcción De Los Laboratorios Del Edificio Del Espacio Fase III En La Escuela Militar De Aviación Marco Fidel Suárez Cali - Valle Del Cauca
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	JBG Gestión De Construcción S.A.S. NIT. 860.505.280-4
REPRESENTANTE LEGAL:	Diana María Pertuz Villafañe C.C. 22.550.658 expedida en Bogotá
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 276.736.123,54.
PLAZO INICIAL CONTRATO:	4 meses calendario.
FECHA ACTA DE INICIO:	1 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	22 de diciembre de 2025.

Ver Anexo No.01: *Contratos y Acta de inicio*

4.3.4. Control de Pólizas de la Interventoría.

COMPAÑÍA ASEGURADORA		*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*	
No. Póliza de Cumplimiento		85-44-101139958 Anexo No.21	
Fecha de Expedición		29-05-2026	
VERIFICACIÓN DE AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Inicial	**Final**	
Cumplimiento	01-09-2025	31-01-2027	$ 119.056.417,06
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	01-09-2025	16-06-2029	$ 19.842.736,18
Calidad del servicio.	02-01-2026	07-03-2031	$ 198.427.361,77

Ver Anexo No.02: *Control de Pólizas*

4.3.5. Modificaciones en el Tiempo: Prórroga y/o Suspensiones

SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
MODIFICATORIO Nº01	Se adicionaron 14 ítems no previsto conforme al balance de obra, se cambia especificación técnica del transformador de 150 KVA, se constituye en reserva la suma de $2.428.502.479,50 y se establecen 2 pagos, parciales en el primer trimestre de 2026 y saldo en el segundo trimestre de 2026. Se modifica plazo de ejecución hasta el 07 de marzo de 2026 y se modifican las garantías, las cuales el contratista una vez se establezca el valor del SMMLV del año 2026, deberá ajustar la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.	19/12/2025	75 días	07/03/2026
MODIFICATORIO Nº02	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026, en concordancia con la modificación del contrato de obra, se modifican garantías.	06/03/2026	25 días	31/03/2026
MODIFICATORIO Nº03	Se modificó la forma de pago en pagos parciales y saldo en el segundo trimestre de 2026. Se prorroga plazo de ejecución hasta el 20 de abril de 2026. Se hace acuerdo de cesión de derechos económicos, se incluyen actividades no previstas y se modifican las garantías.	31/3/2026	20 días	20/04/2026

SUSPENSIÓN N°1	Se suspendió el contrato el día 17 de abril de 2026, y ha presentaron tres ampliaciones a la misma, debido a diferencias de criterios entre contratista e interventoría con respecto al saldo del contrato. Por lo cual, se han ejecutado mesas de trabajo desde esta fecha con el acompañamiento de la entidad.	17/04/2026	33 días	19/05/2026
MODIFICATORIO Nº03	Se modificó la forma en pagos parciales y saldo en el tercer trimestre de 2026. Se prorrogó plazo de ejecución hasta el 16 de junio de 2026. Se realizó acuerdo de cesión de derechos económicos, se incluyeron actividades no previstas y se modificaron las garantías.	23/05/2026	25 días	16/06/2026
SUSPENSIÓN N°1	Se suspendió el contrato el día 17 de abril de 2026, y ha presentaron tres ampliaciones a la misma, debido a diferencias de criterios entre contratista e interventoría con respecto al saldo del contrato. Por lo cual, se han ejecutado mesas de trabajo desde esta fecha con el acompañamiento de la entidad.	17/04/2026	33 días	19/05/2026
MODIFICATORIO Nº05	Se modificó la forma de pago, de los recursos 2025 constituidos en reserva presupuestal, en pagos parciales y saldo en el tercer trimestre de 2026. Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 16 de junio de 2026. Se hizo acuerdo de cesión de derechos económicos y se modificaron las garantías.	23/05/2026	25 días	16/06/2026

Se llevaron a cabo durante la ejecución de (5) modificatorios al contrato de interventoría.

SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
MODIFICATORIO Nº02	Adicionar al contrato la suma de $120.118.600,00, (Recurso 10 $74.076.716,00 y Recurso 11 $46.041.884,00), quedando el valor total del contrato en la suma de ($396.854.723,54). Se Modificó la forma de pago del saldo del contrato constituyendo en reserva presupuestal la suma de $316.280.380,22, el cual se pagará así: PAGOS PARCIALES: Proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de obra y constituidos en la reserva presupuestal con cargo al PAC del PRIMER TRIMESTRE 2026. El saldo del contrato se cancelará con cargo al PAC del segundo trimestre de 2026. Modifica plazo de ejecución hasta el 07 de marzo de 2026. Se modifican las garantías.	19/12/2025	75 días	07/03/2026
MODIFICATORIO Nº03	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026, en concordancia con la modificación del contrato de obra, se modificaron las garantías.	06/03/2026	25 días	31/03/2026
MODIFICATORIO Nº04	Se modificó la forma de pago, los recursos 2025 constituidos en reserva presupuestal, en pagos parciales y saldo en el segundo trimestre de 2026.	31/3/2026	20 días	20/04/2026

	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 20 de abril de 2026. Se hizo acuerdo de cesión de derechos económicos y se modificaron las garantías.			
SUSPENSIÓN N°1	Se suspendió el contrato el día 17 de abril de 2026, y ha presentaron tres ampliaciones a la misma, debido a diferencias de criterios entre contratista e interventoría con respecto al saldo del contrato. Por lo cual, se han ejecutado mesas de trabajo desde esta fecha con el acompañamiento de la entidad.	17/04/2026	33 días	19/05/2026
MODIFICATORIO Nº05	Se modificó la forma de pago, los recursos 2025 constituidos en reserva presupuestal, en pagos parciales y saldo en el tercer trimestre de 2026. Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 16 de junio de 2026. Se hizo acuerdo de cesión de derechos económicos y se modificaron las garantías.	23/05/2026	25 días	16/06/2026

NOTA: El día 17 de abril de 2026 se suscribió el acta de suspensión N°1 del contrato de interventoría N°044-00-A-COFAC-DIFRA-2025, correspondiente a la interventoría técnica, económica, jurídica, financiera, administrativa y contable del contrato de obra No. 013-00-ACOFAC-DIFRA-2025 cuyo plazo se pactó hasta el día 19 de mayo de 2026, posterior a tres ampliaciones requeridas para la finalización del motivo de la suspensión, de la siguiente manera:

Suspensión	Fechas	Días calendarios
Suspensión inicial	17 abril 2026 a 27 abril 2026	11
Ampliación No. 1	28 abril 2026 a 06 mayo 2026	9
Ampliación No. 2	07 mayo 2026 a 12 mayo 2026	6
Ampliación No. 3	13 mayo 2026 a 19 mayo 2026	7

Durante el desarrollo de la suspensión y ampliación, se complementaron las actividades de medición físicas en campo, con el proceso de revision administrativa, técnica, documental y presupuestal del proyecto, adelantándose para tal efecto, mesas de trabajo, entre la comisión técnica designada por la Dirección de Infraestructura- DIFRA, la supervisión, la interventoría y el contratista de obra con el propósito de efectuar la revisión integral de los cortes de obra, memorias de obra, balances contractual y demás soportes contractuales de la ejecución del proyecto, logrando como resultado la confrontación y depuración de la casi totalidad de los ítems que integran el presupuesto contractual, así como la consolidación de una cifra preliminar del saldo contractual.

La interventoría en desarrollo del objeto contractual N°044-00-A-COFAC-DIFRA-2025, ejerció las actividades de seguimiento, control, verificación y validación integral sobre la ejecución física, presupuestal y documental del proyecto, finalizando el proceso de revisión requerido por la entidad.

En consecuencia, una vez atendidas las circunstancias que motivaron la suspensión contractual y finalizadas las actividades de validación, revisión y conciliación técnica, administrativa y presupuestal, las partes acuerdan reiniciar el contrato de interventoría No. 044-00-A-COFACDIFRA-2025 a partir del día 20 de mayo de 2026.


En la carpeta correspondiente a Anexo 01, se adjuntan las actas de suspensión y reinicio tanto de los contratos de obra e interventoría.

Asimismo, el día 23 de mayo de 2026 se firmó el modificatorio N°4 del contrato de obra y N°5 del contrato de interventoría, en atención a la solicitud presentada por el contratista de obra de ampliación de 25 días calendarios para poder realizar las entregas del proyecto, así como también, la inclusión de ítems no previstos necesarios para las entregas. El nuevo plazo final de ejecución correspondió al 16 de junio de 2026.

Ver Anexo No.01: Contratos, actas de inicio y modificatorios

5. INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Se consultó en el SECOP II el proceso 013-00-A-COFAC-DIFRA-2025, correspondiente al proyecto OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI – VALLE DEL CAUCA, con el objetivo de revisar los documentos presentados por el CONSORCIO S2A 2025.

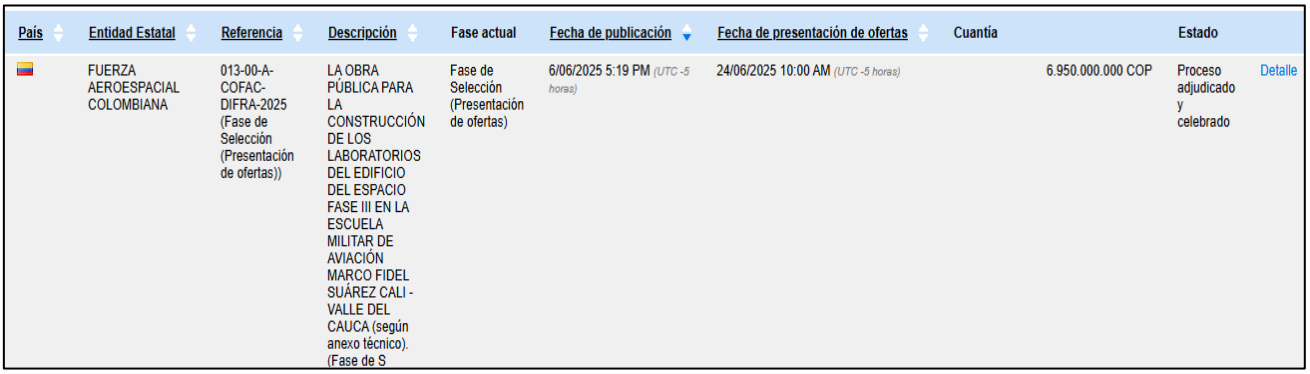

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado	
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	013-00-A-COFAC-DIFRA-2025 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA (según anexo técnico). (Fase de S	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	6/06/2025 5:19 PM (UTC -5 horas)	24/06/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	6.950.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

Ilustración 5. *Verificación de proceso en SECOP II. Tomado del Secop II.*

Se relacionan todas las actuaciones ejecutadas por la interventoría, emanadas del Contrato de Interventoría No. 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025, en las áreas técnica, administrativa, financiera y ambiental; así como el avance y las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el período del 1 de septiembre al 15 de septiembre de 2025, correspondiente al período de revisión de documentación, presentado en el informe de trámites administrativos.

La interventoría revisó los documentos requeridos al CONSORCIO S2A 2025, en el clausulado 5, Obligaciones Generales del Contratista, del Clausulado Adicional al Contrato, en el período informado, dando cumplimiento a los requisitos. El resultado de la revisión permitió dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.2, Trámites administrativos de las Condiciones Generales; logrando la presentación de los siguientes productos:

- ✓ Programación de obra en Project
- ✓ Análisis de Precios Unitarios revisado
- ✓ Plan de inversión del anticipo
- ✓ Flujo de Inversión (Curva S)
- ✓ Asignación de Recursos
- ✓ CURVA S programado vs ejecutado

Ver Anexo No.03: *Documentos de Seguimiento Contractual*

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS

Como parte de la etapa preliminar del proyecto, se asignó tiempo para la revisión de la documentación técnica, correspondiente a los planos, especificaciones técnicas, entre otros, lo cual conllevó la elaboración de informes de revisión por cada uno de los componentes técnicos a cargo de los asesores de interventoría, descritos en la Tabla 2. Además, se recopiló la información contenida en el informe mensual Nº1 del proyecto.

En términos generales, se revisaron los planos de todos los componentes de diseño y se emitieron observaciones que requirieron ser atendidas antes de iniciar actividades, correspondientes a los siguientes componentes:

- ✓ Estructural
- ✓ Vías - Topográfico
- ✓ Mecánico
- ✓ Voz y datos
- ✓ Eléctrico
- ✓ Hidrosanitario

Desde el inicio del proyecto se evidenció la necesidad de llevar a cabo mesas técnicas de trabajo con los diseñadores del proyecto en desarrollo, con el fin de esclarecer diferentes aspectos técnicos, que permitieran la adecuada ejecución, finalización y funcionamiento del proyecto.

La interventoría, mediante las revisiones realizadas por los asesores técnicos, logró aprobar algunas especificaciones técnicas de equipos especializados e identificar aspectos a considerar durante la ejecución de las obras contratadas.

Asimismo, el día 05 de diciembre de 2025, se recibió un nuevo plano denominado como FASE III-REQUERIMIENTO DE OBRA PLACA DE PISO LABORATORIO, por parte del departamento DIFRA, el cual quedó registrado en el control de planos. Esta información corresponde a la necesidad del ítem no previsto del modificatorio NP-09.

Ver Anexo No.04: *Informes de Trámites Administrativos*

Ver Anexo No.05: *Informes técnicos por componentes*

Ver Anexo No.12: *Control de planos*

7. SEGUIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

7.1. AVANCE GENERAL DE LA OBRA.

El 8 de septiembre de 2025, la supervisión del contrato informó a la Interventoría sobre los lineamientos para la programación de la ejecución de la obra definidos por DIFRA, los cuales fueron requeridos al contratista el día 9 de septiembre de 2025. Estos lineamientos establecen pautas para la elaboración de los cronogramas contractuales mediante hitos de control de las actividades clasificadas como fabricables. A estos hitos de control se les asignó un porcentaje de avance que podrá reconocerse durante la ejecución

del contrato. Estos porcentajes son aplicables únicamente para efectos de seguimiento y control del avance; este se definirá en el presente informe como AVANCE RECONOCIDO. Los porcentajes de avance físico de la obra y que constituyen la base para la liquidación de pagos, se definieron como AVANCE EJECUTADO.

Para las semanas comprendidas entre el 5 y 12 de octubre, se realizó el seguimiento del avance de la obra mediante un cronograma que se ajustó estrictamente a los lineamientos del documento publicado por DIFRA, únicamente para las actividades relacionadas con el suministro de equipos eléctricos y de aire acondicionado. Los datos de esta programación mostraban avances que no se correspondían con la realidad del proyecto. Se evidenció que la interpretación del documento de DIFRA y la estructura de la programación del contratista dificultaban la correcta implementación de los hitos de control. La supervisión recomendó ajustar la programación y señaló que la instrucción de DIFRA es solo un ejemplo de referencia, en la que los hitos de control se asignan a las actividades más importantes del contrato y se les asignaría un porcentaje de avance acordado.

El 15 de octubre de 2025, el CONSORCIO S2A 2025 presentó la programación ajustada a los lineamientos emitidos por DIFRA, pero sin considerar las fechas de entrega de los equipos importados y el plan de inversiones. Con esta programación, se evaluó el avance de obra al 19 de octubre 2026. En la semana del 20 al 26 de octubre, se encontraron errores en la programación, por lo tanto, se solicitó al contratista revisar y ajustar. El contratista presentó la programación ajustada y corregida el 31 de octubre de 2025.

El 4 de noviembre de 2025 se aprobó una nueva versión de programación propuesta por el CONSORCIO S2A 2025 con finalización de actividades para el 15 de marzo de 2026, esta reprogramación se dio de acuerdo con la fecha de llegada de los equipos que requirieron ser fabricados e importados del exterior, equipos como el transformador y el grupo electrógeno presentan atrasos ocasionados por verificaciones y ajustes en las especificaciones técnicas y su aprobación por parte del estructurador.

Con base en múltiples reuniones realizadas con los asesores estructurales, visitas realizadas por técnicos especializados en pisos industriales, se concluyó que las especificaciones contractuales para la aplicación del piso epóxico y el sustrato existente en la obra, no son compatibles, por lo que requieren ser revisadas y ajustadas por parte del estructurador. El atraso ocasionado a esta actividad afectaba el normal desarrollo de la programación. El 18 de noviembre de 2025 se realizó mesa de trabajo presencial entre la interventoría, la dirección de obra, la gerencia del proyecto y el comité estructurador, con el objetivo de resolver técnica, económica y jurídicamente las actividades para el recubrimiento del piso, así como la aprobación de actividades no previstas y especificaciones pendiente. Como resultado, la gerencia del proyecto se comprometió a dar respuesta a los requerimientos.

Por solicitud del DIFRA se presentó la reserva presupuestal para el 2026 y así garantizar los recursos para terminar el contrato, planteando una ejecución presupuestal para el 2025 del 26.57%, y del 73.43% para el 2026. Con base en esa propuesta, el contratista presenta una solicitud de reserva del PAC para el 2025 de $ 866.426.658 donde consideró el cobro parcial de obra civil, el grupo electrógeno y de extractor centrifugo.

La interventoría realizó la revisión de los Análisis Unitarios de las actividades no previstas presentadas por el contratista desde 16 de octubre de 2025. Los APU fueron conciliados y aprobados desde el 19 de diciembre de 2025 en el modificatorio 01.

ITEM	ACTIVIDAD	UM	CANT
NP-01	RETIRO DE TUBERÍA PVC-S EXISTENTE, INCLUYE CORTE DE TUBERÍA	UND	5
NP-02	DEMOLICIÓN DE CAJA DE REGISTRO EXISTENTE EN CONCRETO DE 1,40M X 1,60M, H= 1,20 M, E=0,25M, INCLUYE DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.	UND	2,0
NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RCI PVC-Ø 4". INCLUYE UNIÓN DE REPARACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI LLENOS	ML	7,00
NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA PVC-S Ø 6". NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI LLENOS	ML	24,00
NP-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 60CM X 60CM EN CONCRETO DE 21 MPA, H= 0,40M A 1,0 M, E=15 CM, INCLUYE CAÑUELA, TAPA Y MARCO METÁLICO.	UND	2,00
NP-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 1", INCLUYE 2 UNIONES PVC-P DE Ø1", 3 CODOS PVC-P DE 90°	ML	4,80
NP-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-S DE Ø 8", NO INCLUYE EXCAVACION Y LLENOS	ML	5,00
NP-08	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO ENTERRADAS EN PAVIMENTOS, INCLUYE EQUIPO DE DEMOLICIÓN.	M3	0,60
NP-09	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 28 MPA, ESPESOR DE 0,10 M. LLANEADO, INCLUYE FIBRA MACROSINTETICA, FIBRA MICROSINTETICA CORTES CON PULIDORA Y SELLADO DE JUNTAS. NO INCLUYE SELLO DE JUNTAS ENTRE PANEL Y EL CONCRETO, LA BOTADA DE MATERIAL SE REALIZARÁ EN EL ITEM REPECTIVO, NO INCLUYE PROTECCIÓN CONTRA PANELES	M2	625,00
NP-10	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 40CM X 40CM EN CONCRETO DE 21 MPA, H= 0,30M A 0,60 M, E=15 CM, INCLUYE CAÑUELA, TAPA Y MARCO METÁLICO.	UN	1,00
NP-11	PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 1,65 M X 0,90 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	UN	2,00
NP-12	PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 1,45 M X 0,90 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	UN	3,00
NP-13	PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 0,70 M X 0,90 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	UN	3,00
NP-14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA PURA RESISTENTE A RAYOS UV CON ESPESOR PROMEDIO DE 60 MILLS, INCLUYE LA PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN EPÓXICA BICOMPONENTE MONOCAPA, ACCESORIOS, EQUIPO ESPECIALIZADO (REACTOR) Y MANO DE OBRA CERTIFICADA. EL ACABADO FINAL PRESENTA UN CAMBIO DE COLOR DE GRIS A VERDE OLIVA POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV. LA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A LA ESTABILIDAD DE LA BASE; EN CASO DE PRESENTARSE ROTURA O FALLA DEL SUSTRATO, LA GARANTÍA DEL SISTEMA SE INVALIDARÁ.	M2	395,00

Adicionalmente, como resultado de la mesa de trabajo realizada el 30 de octubre de 2025 entre el estructurador, los asesores eléctricos de la Interventoría y del contratista, en compañía del supervisor del contrato, se aprobó el cambio de especificación del transformador de 150 KVA para los Chillers pasando a una salida de 460 voltios y factor K equivalente a 13. Pese al aumento de especificaciones esto no representó un aumento en su valor presupuestal.

El 24 de marzo de 2026 el CONSORCIO S2A 2025 presentó la solicitud formal de ampliación del plazo contractual, correspondiente a Modificatorio N°3, acuerdo de cesión de derechos económicos, y se incluyeron las siguientes actividades no previstas, los correspondientes APU fueron conciliados y aprobados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
NP-15	NIVELACIÓN DE ROCEADORES PARA EL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS, INCLUYE RETIRO DE ROCEADORES, RETIRO TUBERIA RCI DE 1/2", SUMINISTRO DE TUBERÍA RCI DE 1/2", REINSTALACIÓN DE ROCEADORES, PRUEBAS DE PRESIÓN EN REDES, ANDAMIOS PARA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UN	22,00
NP-16	REUBICACIÓN DE GABINETE CONTRAINCENDIOS, INCLUYE TUBERIA ASTM A 795 2" RCI C-900, 3 CODO 90° C-900, 6 UNIONES RIGIDA RANURADAS DE 2" UL.	UN	1,00
NP-17	REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA-SIRENA, INCLUYE DESCONEXIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y CONEXIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES SOBRE PANEL AISLANTE	UN	1,00
NP-18	PREPARACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS ESCARIFICACIÓN, RETIRANDO EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE EN DONDE SE REQUIERA, PARA GARANTIZAR ADHERENCIA DEL NUEVO SISTEMA. NO CONTEMPLA REPARACION DE CONCRETOS, INCUYE PROTECCIÓN DIARIA EN POLIETILENO SOBRE LOSA Y DEMAS ELEMENTOS	M2	390,00
NP-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE EPOXICO SIKADUR 32 PRIMER SOBRE CONCRETO EXISTENTE PARA GARANTIZAR AHERENCIA ENTRE LOS DOS CONCRETOS	M2	13,00
NP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASES PARA SOPORTES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PERFIL IPE Y TUBERÍA ESTRUCTURAL, INCLUYE IZAJE, ANCLAJES, TORNILLERÍA Y CONEXIONES, EPÓXICO PARA ANCLAJES	UN	1,00
NP-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE REMARCOS EN PERFIL DE 50X30X 2 MM, PARA SALIDAS DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CIELOS A UNA ALTURA DE 8.0 M, PARA SALIDAS MAYORES A 40X40 CM, INCLUYE TORNILLERÍA, ANCLAJES, ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	65,00
NP-22	REUBICACIÓN DEL GABINETE ELÉCTRICO EXISTENTE SOBRE PASARELA DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE DE GABINETE, REINSTALACIÓN EN EL LUGAR INDICADO, INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4", CURVAS, UNIONES 3/4", CHAZOS, ABRAZADERAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	3,00
NP-23	PASAMURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 0,60 M X 0,30 M ESPESOR 10 A 15 CM, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE AL PUNTO DE ACOPIO	UN	5,00
NP-24	TRASLADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS, LOCALIZADAS FUERA DE LA LINEA DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISOS, CORRECCIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4", ASEO Y LIMPIEZA	UN	45,00

NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 1/0, INCLUYE SOLDADURA COBRE Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	11,00
NP-26	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, INCLUYE CORTE	M2	3,00
NP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE GRANIPLAS PARA ANTEPECHOS, INCLUYE PREPARACION DE SUERFICIE	M2	64,76
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA RESANES DE MURO FACHADA, INCLUYE RETIRO DE PIEZAS AFECTADAS, INSTALACIÓN ENCHAPE COLOR GRIS, EMBOQUILLADO	UN	15,00
NP-29	CONSTRUCCIÓN DE ABERTURA DE Ø 4" PARA PASE DE DUCTO ELECTRICO ACOMETIDA TRANSFORMADOR, INCLUYE RESANE, PINTURA Y ACABADOS	UN	2,00
NP-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1/2" PVC PARA CONEXIÓN DE RED DE AGUA HELADA, LLAVE BOCAMANGUERA 1/2, TEE DE 1/2", CODO PVC-P DE 1/2", PEGANTE, LIMPIADOR, ACCESORIOS, REGATA Y SELLADA CON REVOQUE	UN	1,00
NP-31	RETIRO DE CANALETA ELECTRICA EN CUBIERTA, PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRAULICAS	ML	18,00
NP-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA SALIDAS DE ASPERSORES DE RCI EN CIELOS, INCLUYE ANDAMIOS, ESCUDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 2", ANDAMIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	22,00
NP-33	SUMINISTRO TRANSPORTE Y CONTRUCCIÓN DE MURO EN SUPERBOARD UNA CARA PARA CERRAMIENTO DE VANOS DE PUERTA MEDIDAS 4,65 X 5,0	M2	25,65
NP-34	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE EN CONCRETO DE 21 MPA PARA TUBERÍA EN PVC-S DE Ø 6", INCLUYE FORMALETA.	ML	1,00
NP-35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S DE Ø 2", INCLUYE 2 CODO PVC-S Ø 2 " DE 45°, 1 UNIÓN PVC-S Ø 2"	ML	1,00
NP-36	SMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE BASE GRANULAR ESPESOR 20 CM. EXCAVACIÓN MANUAL, MALLA ELECTROSOLDADA D-84, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y BOTADA DE ESCOMBROS	M2	7,83
NP-37	SMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PREFABRICADO EN POLIETILENO ACABADO EN REJILLA EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYE CORTE DE ANDEN, DEMOLICIÓN DE PISOS EN ANDEN, CONCRETO DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	2,91
NP-38	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE BASE GRANULAR ESPESOR 10 CM. EXCAVACIÓN MANUAL, MALLA ELECTROSOLDADA D-84, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y BOTADA DE SOBRANTES	M2	1,00

En el modificatorio N°3 de obra, correspondiente a la ejecución en plazo adicional de 20 días, comprendidos entre el 01 de abril a 20 de abril 2026 se ejecutaron actividades requeridas para la finalización del contrato. Para ello se tuvo en consideración acta de acuerdo y contrato de cesión de derechos económicos N°1 para el contrato de interventoría. No obstante, debido a discrepancias en el balance de obra entre las partes se decidió suspender el proyecto el día 17 de abril de 2026, con el fin de efectuar las validaciones de rectificación de medidas y revisión de cada uno de los ítems del presupuesto, con el fin de establecer una cifra preliminar del saldo del contrato. Todo este proceso con aras de la liquidación del proyecto, el periodo de suspensión correspondió a 33 días calendarios desde el 17 de abril de 2026 al 19 de mayo de 2026, con acta de reinicio del día 20 de mayo de 2026. Asimismo, se tramitó solicitud del contratista de obra correspondiente al

modificatorio N°4 asociado a la ampliación de tiempo de ejecución por 25 días calendarios para finalizar la puesta a punto y entrega del sistema HVAC y finalización de actividades eléctricas de instalaciones que se encuentran pendientes, así como también la inclusión de ítems no previstos que debían ejecutarse. Para esta nueva solicitud se planteó bajo la figura de acta de acuerdo directo y contrato de cesión de derechos económicos para el contrato de interventoría N°2.

Durante los 17 días contractuales del mes de abril 2026 se ejecutaron actividades correspondientes a fundida de andenes laterales a vía de acceso al laboratorio, construcción de rampa de oficinas administrativas, adecuación de pendientes de mejoramiento de la instalación de los muros de paneles aislante, instalación de ductos en lámina galvanizada en fachada, instalaciones de rejillas y difusores, instalaciones de luminarias, instalación de flecha en juntas de dilatación, tendido de cable de datos, eléctrico para tomacorrientes, instalación de bandejas para cableado, reubicación de tableros eléctricos, Instalación de tableros de control de equipos HVAC, Instalación de tablero eléctrico 420v, Instalación de cerramiento provisional para puerta de emergencia, Instalación de cerramiento provisional para puerta de carga, Aplicación de graniplast en antepecho, Instalación de válvulas, Conexión de ductos a UMAs, Instalación de tanques de expansión, Instalación de tanques separadores, Instalación de ductos el polietileno e Instalación de extractor centrifugo.

En el modificatorio N°4 de obra, correspondiente a la ejecución en plazo adicional de 25 días, comprendidos entre el 23 de mayo a 16 de junio 2026, se aprobó por parte de la ordenación del gasto la inclusión de ítems no previstos necesarios para la terminación del proyecto. Asimismo, se tuvo en consideración acta de acuerdo y contrato de cesión de derechos económicos N°2 para el contrato de interventoría. A continuación, se describen los ítems no previstos ejecutados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
NP 39	CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS 600V 90°C: 6 No. 4/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 4/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT INCLUYE BORNAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	24
NP 40	CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS 600V 90°C: 6 No. 2/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 2/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT INCLUYE BORNAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	50
NP 41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO MULTIPOLAR 4X10 AWG CU (3F+N), CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS 600V 90°C, INCLUYE BORNAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	40
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO MULTIPOLAR 4X4 AWG CU (3F+N), CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS 600V 90°C, INCLUYE BORNAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	132

NP 43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO MULTIPOLAR 4X12 AWG CU (3F+N), CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS 600V 90°C, INCLUYE BORNAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	160
NP 44	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL 460V, GRADO DE PROTECCIÓN IP 55, IK 10, PARA ALOJAR PROTECCIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFORMADOR DE 150KVA, 3F/60 HZ, 208V/460V-220V, INCLUYE MONTAJE, CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Unidad	1
NP 45	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PLATINAS COBRE FLEXIBLE 1100 AMP PARA CONEXIÓN SISTEMA ELECTROGENO	ML	12,8
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO Y APANTALLADO 4X18 AWG, INCLUYE TENDIDO, FIJACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS	ML	1200
NP 47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO Y APANTALLADO 2x18 AWG, INCLUYE TENDIDO, FIJACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS	ML	600
NP 48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO MULTIPOLAR 4X14 AWG CU (3F+N), CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS 600V 90°C, INCLUYE BORNAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	90
NP 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC DE 1”, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, CORTES, ROSCADO, FIJACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	ML	196
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC DE 3/4”, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, CORTES, ROSCADO, FIJACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	ML	159
NP 51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, CORTES, ROSCADO, FIJACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	ML	138
NP 52	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 2 VIAS PICV 1 1/2", INCLUYE REDUCCIÓN DE 2" A 1 1/2" Y CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	2
NP 53	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 3 VIAS Ø 3/4" CON ACTUADORES ELECTROMECANICO ON-OFF Y PROPORCIONAL 24 V, CERRADOS SIN CORRIENTE, M30 X 1,5 ON OFF, INCLUYE ADACTADOR HEMBRA ROSCADA EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	2
NP 54	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MANOMETROS, INCLUYE ACCESORIOS	UNIDADES	6
NP 55	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL, INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	1
NP 56	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SUICHE DE FLUJO,INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	6
NP 57	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE TERMOMETRO, INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	10
NP 58	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AISLAMIENTO ON-OFF, INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN Y RELLENO EN POLIURETANO ENCHAQUETADO EN ALUMINIO	UNIDADES	5
NP 59	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL DE PRESIÓN, INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	1
NP 60	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA, INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	2
NP 61	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO EN Y Ø 2 1/2", INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	4

NP 62	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DRENAJE Ø 1", INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	1
NP 63	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 2 VIAS PICV Ø 2 1/2" PROPORCIONAL, INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	2
NP 64	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN VALVULA 3 VIAS Ø 2" PROPORCIONAL, INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	2
NP 65	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN PARA FILTROS, INCLUYE CONEXIONES.	UNIDADES	8
NP 66	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR, INCLUYE PERNOS Y ANCLAJES	UNIDADES	1
NP 67	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MEDIDOR DE CAUDAL DE AIRE, INCLUYE CONEXIONES	UNIDADES	2
NP 68	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR DE CHEQUE DE Ø 3/4", INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	2
NP 69	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA Ø 3/4", INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	4
NP 70	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA Ø 2", INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	8
NP 71	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA Ø 1 1/2", INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	4
NP 72	SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BY-PASS DE 2 VÍAS DE 2" (PROPORCIONAL), INCLUYE CONEXIONES EN TERMOFUSIÓN	UNIDADES	2

En el mes de mayo 2026 aunque los primeros 19 días del mes se encontraba el contrato suspendido, se adelantaron labores administrativas con el fin de revisar el balance de obra, y establecer el recurso posible para ser liberado a la entidad. Asimismo, se realizaron reuniones de mesas de trabajo del componente eléctrico y mecánico. A partir del 20 de mayo 2026 se reinicia el contrato hasta el 22 de mayo de 2026, y el día 23 de mayo 2026 se firma el modificatorio N°4 del contrato de obra, y N°5 de contrato de interventoría, con un plazo adicional de 25 días calendarios, siendo la fecha de terminación del contrato el día 16 de junio de 2026.

Entre los días 20 y 31 de mayo de 2026 se ejecutaron actividades en el laboratorio asociadas a trabajos en conexión de instrumentación, cableado , conexión de tablero eléctrico y pruebas de marcación, cableado en manejadoras con sensores de temperatura, conexión de barra en cobre planta eléctrica, resane en fachada correspondiente a la zona de los ductos (Rejillas), pruebas de calibración de difusores en área de integración, instalación de detectores de humo, sirenas, estación manual, e instalación de tablero de control.

Entre los días del 1 al 16 de junio de 2026 se ejecutaron actividades correspondientes a conexiones de los tableros eléctricos y pruebas en unidades de chillers, pruebas al sistema de detección, reparaciones en zona de andenes y carpeta asfáltica, realización de encendido y prueba a la planta eléctrica, instalación de los pathcord de usuario y administración.

A continuación, se muestra el comportamiento de las actividades ejecutadas por el proyecto desde el inicio de sus trabajos de obra civil hasta la fecha del presente informe, estos se contrastan con la programación propuesta por el CONSORCIO S2A 2025 para el modificatorio 2, y con la nueva programación presentada en el tercer modificatorio al contrato 013-00-A-COFAC-DIFRA-2025.

Tabla 7. *Curva S del proyecto (Programación Modificatorio 2). Elaboración propia.*

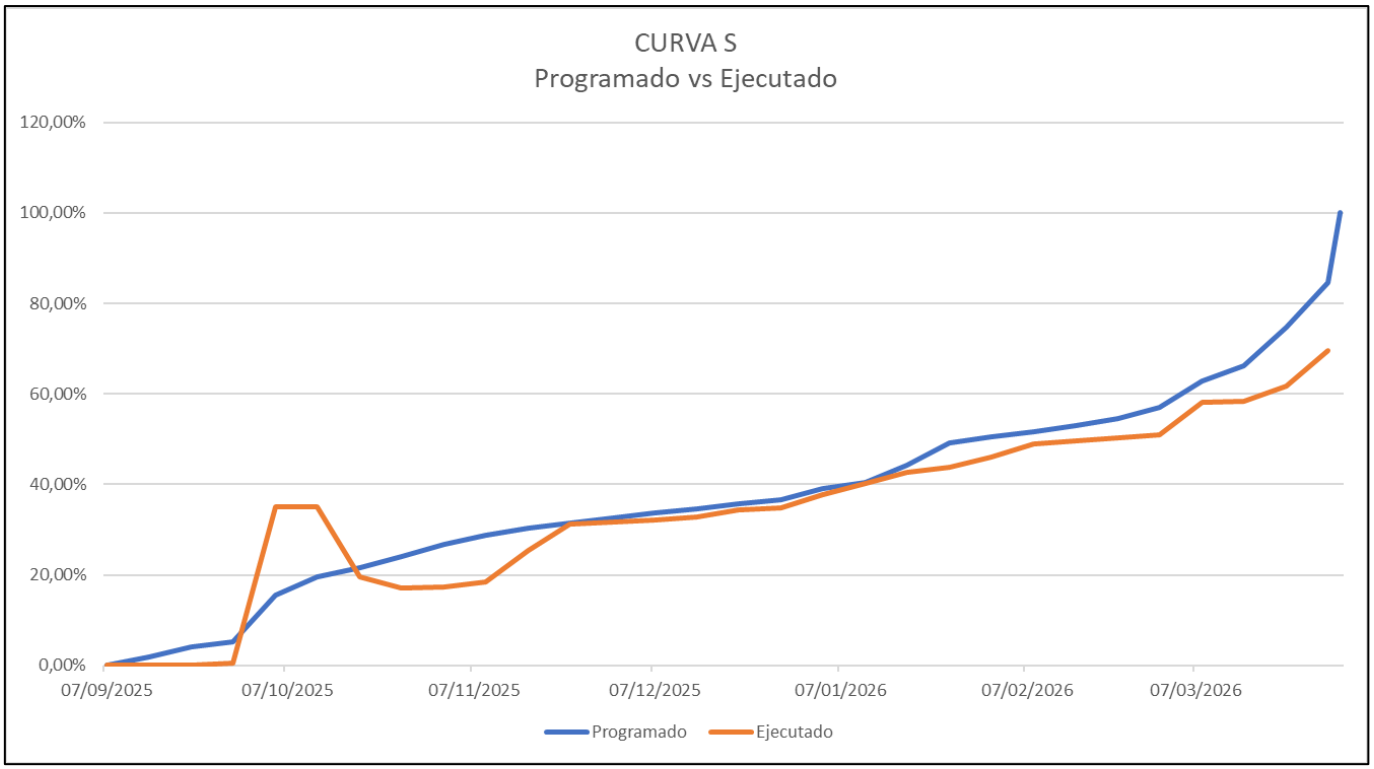


Tabla 8. *Curva S del proyecto (Programación Modificatorio 3). Elaboración propia.*


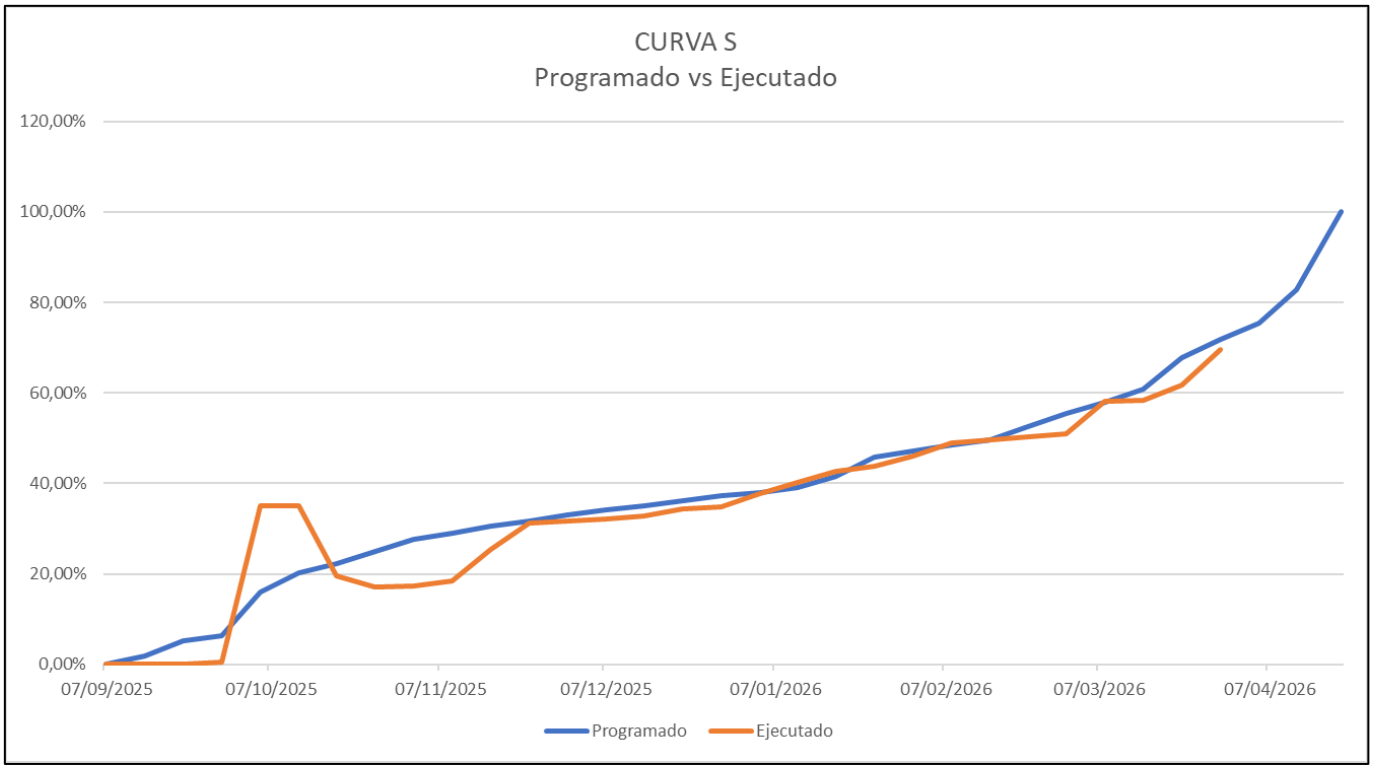


Tabla 9. Curva S del proyecto (Programación Modificatorio 4). Elaboración propia

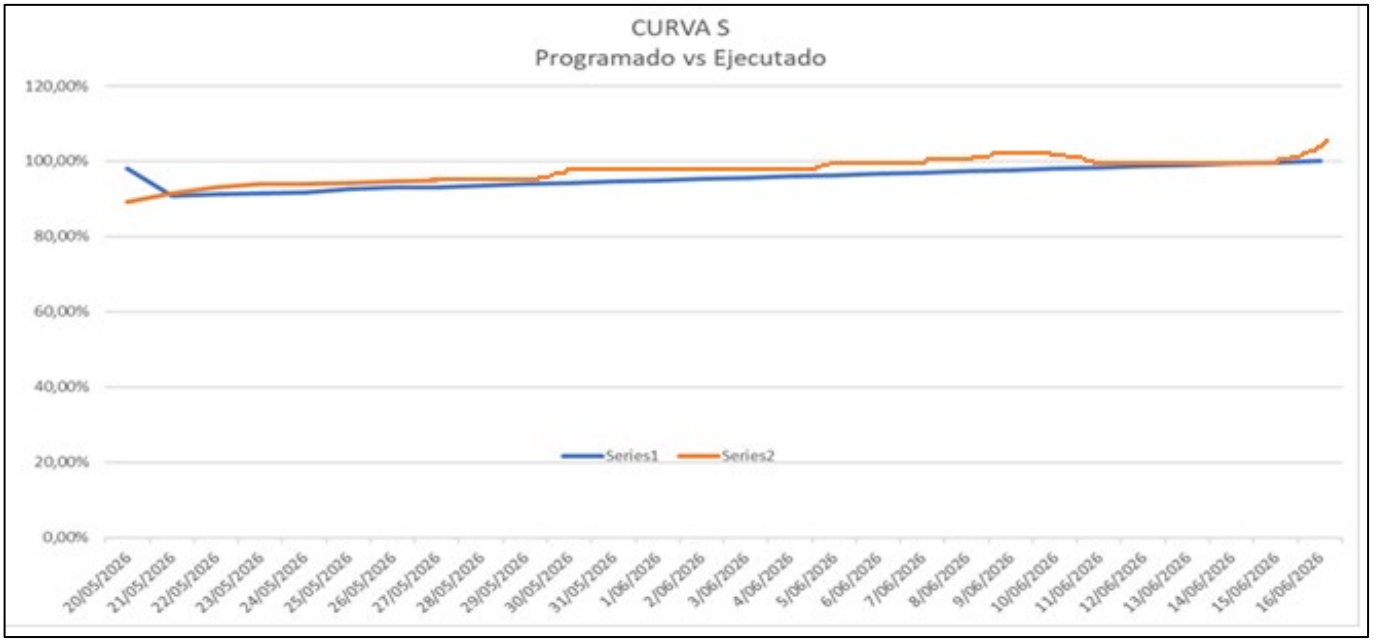

LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ, CALI – VALLE DEL CAUCA – 123-00-A-COFAC-DIFRA-2023, para el mes de junio de 2026, presentó el siguiente estado de ejecución reconocido.

% Programado	% Ejecutado	Diferencia
100%	100%	0%

El avance de la obra en el mes de junio de 2026 fue del 4.19%.

Ver Anexo No.13: *Programación de obra*

Ver Anexo No.11 *Correspondencia Enviada y Recibida*

7.2. INFORMES DIARIOS

El 18 de septiembre de 2025, la supervisión del contrato solicitó a la interventoría que comenzara a entregar informes diarios a partir del 22 de septiembre de 2025, en los que se detallara el personal y las actividades realizadas durante cada jornada. En el periodo en mención se realizaron 13 informes diarios.

Ver Anexo No.06: *Informes Diarios*

7.3. INFORMES SEMANALES

Durante este período, la interventoría entregó dos (2) informes semanales. Estos informes contienen toda la información del contrato de la obra, incluyendo aspectos técnicos, de ejecución, evaluación financiera, observaciones administrativas y lo correspondiente a las actividades SST. Así como también, anotaciones, recomendaciones y observaciones relevantes del proyecto.

De igual manera, estos informes semanales incluyeron alertas sobre factores que podrían afectar la culminación del proyecto dentro de los plazos inicialmente establecidos por la FAC, como rendimientos, decisiones técnicas o administrativas, condiciones naturales o imprevistos.

Tabla 9. *Informes Semanales. Elaboración propia.*

SEMANAL NO.	PERIODO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% ATRASO / AVANCE
Semana No.15	Del 08 al 14 de diciembre de 2025	55.19%	32.72%	(-) 22.47%
Semana No.16	Del 15 al 21 de diciembre de 2025	65.69%	34.33%	(-) 31.36%
Semana No.17	Del 22 al 28 de diciembre de 2025	40.88%	34.79%	(-) 6.09%
Semana No.18	Del 29 de diciembre de 2025 al 04	48.03%	37.70%	(-) 10.33%

	de enero de 2026			
Semana No.19	Del 05 al 11 de enero de 2026	51.74%	40.31%	(-) 11.43%
Semana No.20	Del 12 al 18 de enero de 2026	54.00%	42.75%	(-) 11.25%
Semana No.21	Del 19 al 25 de enero de 2026	57.40%	43.83%	(-) 13.57%
Semana No.22	Del 26 de enero al 1 de febrero de 2026	61.00%	46.01%	(-) 14.99%
Semana No.23	Del 2 al 8 de febrero de 2026	64.64%	48.89%	(-) 15.75%
Semana No.24	Del 9 al 15 de febrero de 2026	70.06%	49.54%	(-) 20.52%
Semana No.25	Del 16 al 22 de febrero de 2026	71.77%	50.26%	(-) 21.51%
Semana No.26	Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026	74.62%	51.24%	(-) 23.57%
Semana No.27	Del 2 al 8 de marzo de 2026	62.75%	58.10%	(-) 4.65%
Semana No.28	Del 9 al 15 de marzo de 2026	66.12%	58.32%	(-) 7.80%
Semana No.29	Del 16 al 22 de marzo de 2026	74.67%	61.65%	(-) 13.02%
Semana No.30	Del 23 al 29 de marzo de 2026	86.40%	69.56%	(-) 15.04%
Semana No.31	Del 01 al 05 de abril de 2026	75.89%	79.11%	(+) 3.22%
Semana No.32	Del 06 al 12 de abril de 2026	83,14%	86,44%	(+) 3.30%
Semana No.33	Del 20 al 23 de mayo de 2026	91.78%	94.00%	(+) 2.22%
Semana No.34	Del 24 al 31 de mayo de 2026	94.62%	95.81%	(+) 1.19%
Semana No.35	Del 01 al 06 de junio de 2026	95.64%	96.89%	(+) 1.25%
Semana No.36	Del 08 al 16 de junio de 2026	98.02%	100%	-

Ver Anexo No.07: *Informes Semanales*

7.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

Para el presente periodo se evidenció la ejecución de las siguientes actividades:

- Se realizaron trabajos de conexión de tableros eléctricos y pruebas unidades chillers
- Pruebas de programación.

- Organización de los sensores en tableros.
- Remates poliuretano y sellado.
- Pruebas al sistema de detección nivel 1 y 2 zona de cubierta.
- Realización de ponchado en cable de datos en rack y punto de monitoreo.
- Realización de prueba a la planta eléctrica y sistema HVAC.
- Instalación de pathcord de administración y en laboratorio.
- Reparación de panales que se encontraban con detalles visuales.
- Instalación de puntos energizados en piso con punto regulado y normal.

7.5. ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

Como requisito del modificatorio Nº 04 aprobado el 23 de mayo de 2026, el contratista entregó un nuevo cronograma obra, el cual fue revisado por la interventoría. En cuanto a la programación, se hizo el seguimiento y control del avance del proyecto, y hasta la fecha de la elaboración de este informe se presenta la siguiente información:

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ADELANTO
100%	100%	NA

En junio 2026, se registró un adelanto del 4.19%, respecto a lo planeado.

Tabla 10: *Avance programado semanal acumulado. Elaboración propia.*

SEMANA Nº	PERIODO	AVANCE PROGRAMADO
01	01 al 07 de septiembre de 2025	0.00%
02	08 al 14 de septiembre de 2025	0.08%
03	15 al 21 de septiembre de 2025	0.56%
04	22 al 28 de septiembre de 2025	0.77%
05	29 septiembre al 5 de octubre de 2025	12.13%
06	6 al 12 de octubre de 2025	15.58%
07	13 al 19 de octubre de 2025	22.80%

08	20 al 26 de octubre de 2025	18.10%
09	27 octubre al 2 de noviembre de 2025	20.89%
10	03 noviembre al 09 de noviembre de 2025	24.77%
11	10 noviembre al 16 de noviembre de 2025	29.77%
12	17 noviembre al 23 de noviembre de 2025	33.92%
13	24 noviembre al 30 de noviembre de 2025	39.53%
14	Del 01 diciembre al 07 de diciembre de 2025	47.30%
15	Del 08 diciembre al 14 de diciembre de 2025	55.19%
16	Del 15 diciembre al 21 de diciembre de 2025	65.69%
17	Del 22 diciembre al 28 de diciembre de 2025	40.88%
18	Del 29 de diciembre de 2025 al 04 de enero de 2026	48.03%
19	Del 05 al 11 de enero de 2026	51.74%
20	Del 12 al 18 de enero de 2026	54.00%
21	Del 19 al 25 de enero de 2026	57.40%
22	Del 26 de enero al 1 de febrero de 2026	61.00%
23	Del 2 al 8 de febrero de 2026	64.64%
24	Del 9 al 15 de febrero de 2026	70.06%
25	Del 16 al 22 de febrero de 2026	71.77%
26	Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026	74.62%
27	Del 2 al 8 de marzo de 2026	62.75%
28	Del 9 al 15 de marzo de 2026	66.12%
29	Del 16 al 22 de marzo de 2026	74.67%

30	Del 23 al 29 de marzo de 2026	86.40%
31	Del 01 al 05 de abril de 2026	75.89%
32	Del 06 al 12 de abril de 2026	83,14%
33	Del 13 al 19 de abril de 2026	98,04%
34	Del 20 al 23 de mayo de 2026	91.78%
35	Del 24 al 31 de mayo de 2026	94.62%
36	Del 01 al 06 de junio de 2026	96.89%
37	Del 08 al 16 de junio de 2026	100%

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS.

Durante este mes, para realizar los diversos trabajos listados anteriormente, fue necesario utilizar maquinaria como andamios. Además, se usaron herramientas menores.

Para la comisión topográfica del proyecto, se utilizaron equipos topográficos, los cuales incluyeron estación total y nivel automático. Los ingenieros asesores de vías y topografía de la interventoría solicitaron al contratista presentar los certificados de calibración, los cuales fueron entregados a conformidad. No obstante, durante visitas de obra realizadas en el mes de noviembre 2025, se inspeccionó el certificado del nivel automático entregado con el equipo de mediciones de sitio, lo cual no era consistente. El equipo utilizado en obra no contaba con las calibraciones vigentes. Por lo anterior, se realizaron las notificaciones pertinentes a esta situación mediante los oficios 87, 103 y 120, así como las notificaciones pertinentes mediante bitácora de obra.

En el mes de diciembre 2025 y enero 2026, el contratista no contó con equipo topográfico en sitio, por lo cual, no se pudo realizar inspecciones de calidad y tampoco verificar con precisión el nivel del contrapiso. La interventoría ha contratado equipo topográfico para realizar sus propias verificaciones, en lo concerniente a la vía de acceso del laboratorio.

En el mes de febrero 2026, se recibieron certificados correspondientes a los equipos de ensayo de laboratorios utilizados para el ensayo a la compresión de los cilindros de concreto tomados en la construcción de la losa de contrapiso del laboratorio EMAVI, así como el certificado de calidad del laboratorio externo empleado para el ensayo (INGEOMAC).

En el mes de marzo y abril 2026, se siguió con los controles de calidad requeridos por la interventoría, se requirió información correspondiente al laboratorio quien ensayaría los cilindros de concreto para validación de resistencia a la compresión de los andenes, sin embargo, el contratista no ha emitido respuesta a los requerimientos de los oficios N°349 y N°360 dados por la interventoría. Se recibieron los

resultados de concreto correspondiente a la edad de 7 días. No obstante, se encuentra pendiente a la edad de 28 días.

Anexo No.28: *Formatos de seguimiento (control de calibración de equipos).*

Anexo No.11 *Correspondencia Enviada y Recibida*

7.7 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

En el mes de octubre 2025 se recibieron las certificaciones de la cantera autorizada para explotar estos materiales, así como los certificados de calibración de los equipos de laboratorio de suelos, informe digital de la compactación de la subrasante y subbase granular, requeridos mediante oficios por la interventoría, con los consecutivos Nº33, 42, 47, 60 y 76. En respuesta, el contratista envió la documentación a través del oficio (C07-078).

En el mes de noviembre 2025 se recibió el informe de toma de densidades de base granular clase A, capa que conforman la estructura de pavimentos. Así como también el certificado de calibración del densímetro nuclear utilizado. A la fecha se encuentran pendiente por entregar los certificados de calibración de los equipos de laboratorio de suelos (Certificados de tamices y pie de rey), requerido mediante los oficios Nº 96, 110, 120, y 139.

En el mes de diciembre 2025 se recibió el informe de las actividades previstas para la preparación de la base granular, aplicación de la imprimación, transporte, extendido y compactación de la mezcla, así como los controles de calidad a implementar durante la ejecución en obra, conforme a lo establecido en el Manual de Especificaciones INVIAS – Sección 450 y a las condiciones particulares del proyecto, que a la fecha no ha sido ejecutado.

Para el componente de estructura no se ha suministrado los ensayos de tinta penetrante correspondientes a la soldadura, ensayo de calidad de los elementos, ensayos de calidad del material termoacústico, requeridos mediante el oficio 137 y 113.

Para el mes de enero 2026 se recibió información de fichas técnicas de varios componentes, así mismo, se encuentra pendiente la entrega de ensayos de laboratorio correspondiente al componente de vías, donde, se solicitó ensayar briquetas para verificar el diseño Marshall utilizado en el concreto asfaltico instalado en la estructura de pavimento. También, con el inicio de las fundidas de la losa de contrapiso del laboratorio se tomaron cilindros de concreto para validar la resistencia a la compresión, se espera el cumplimiento de las edades de ensayo para la emisión de los resultados. No obstante, también se ejecutó la fundida del cárcamo de la vía, y se tomaron cilindros de concreto para validar la especificación de la resistencia del concreto, se requirieron los resultados tempranos para llevar un correcto seguimiento.

En el mes de enero 2026 no se ha tenido respuesta a las solicitudes presentadas de la realización de ensayos de tinta penetrante a la estructura metálica, y los respectivos certificados de calidad de los paneles, por lo cual se envió el presunto incumplimiento al supervisor del contrato mediante el consecutivo Nº238.

En el mes de febrero 2026, se recibieron resultados de resistencias tempranas de las muestras de concreto (1, 2 y 3), tomadas para la comprobación de la resistencia de diseño requerida en la construcción de la losa de contrapiso del laboratorio EMAVI. A la fecha se encuentra pendiente el cumplimiento de la edad del diseño del concreto (28 días) para ser ensayadas.

También, se recibieron los resultados de los ensayos solicitados para las briquetas de concreto asfaltico, requeridas para la comprobación del diseño Marshall de la mezcla dispuesta en la vía, a conformidad.

En el mes de marzo 2026 se recibieron los resultados de los cilindros tomados para la comprobación de la resistencia de diseño del concreto utilizado en la construcción del cárcamo, a conformidad.

Se ha requerido la entrega formal de la estructura metálica del proyecto, recalcando la necesidad de la realización de los ensayos de tinta penetrante a las soldaduras. En el mes de febrero 2026 se realizaron verificaciones por I-TECH Inspecciones Técnicas en Soldadura, el cual ha mencionado que hay varios puntos por corrección, se están ejecutando las subsanaciones realizadas. No obstante, ya se inició la instalación de los muros de panel aislante sobre esta estructura, y a la fecha no se ha recibido los certificados de calidad y ensayos requeridos para este producto. El contratista de obra no ha emitido una respuesta a las observaciones presentadas por la interventoría con respecto a este tema.

En el mes de abril 2026 se ejecutaron la construcción de andenes perimetrales a la vía de acceso al laboratorio y rampa para las oficinas administrativas, se realizó requerimiento mediante los oficios N°349 y N°360 de la entrega de la documentación de calidad y ensayos a la fecha no se ha emitido una respuesta al requerimiento dado por la interventoría.

El día 28 de mayo de 2026, se realizó mesa de trabajo N°17 con el fin de poner fecha límite de entrega de toda la documentación pendiente del proyecto. A la fecha no se ha recibido la resistencia de concreto a los 28 días de las muestras para los cilindros de concreto utilizado en la fundida de los andenes y rampa de acceso.

En el mes de junio 2026 se recibió el informe de corrección de los puntos de soldadura del proyecto, el cual presenta observaciones para ser subsanadas.

Anexo No.11 *Correspondencia Enviada y Recibida*

Anexo No.28 *Formatos de seguimiento (Control de calibración de equipos)*

Anexo No.28 *Formatos de seguimiento (Control de resultado de densidades)*

7.8 SEGUIMIENTO CONTABLE

La interventoría, junto con su equipo de trabajo, llevó a cabo el control y seguimiento contable de la ejecución del contrato de obra Nº 013-00-A-COFAC-DIFRA-2025, incluyendo las siguientes actividades:

- ✓ Revisión de pagos parafiscales, tanto de los realizados por la interventoría a su personal como los efectuados por el contratista de obra, asegurando que cumplen con los requisitos del ente contratante — FAC.
- ✓ Pagos de salarios al personal de la interventoría, responsable del área contable, quien realiza las liquidaciones y cancela las nóminas de cada profesional o trabajador del equipo interventor encargado del proyecto.
- ✓ A la fecha, los pagos del personal de la interventoría y las demás obligaciones contraídas para la correcta ejecución del presente contrato se encuentran al día.
- ✓ Revisión continua del Plan de Inversión de Anticipo y su ejecución, asegurando que las solicitudes de desembolso se ajusten a los rubros autorizados. Esto se realiza hasta la liquidación final del contrato y la amortización total en los controles parciales del avance de obra.

Ver Anexo No.03: *Documentos de Seguimiento Contractual.*

Se emitió el oficio Nº049 por parte de la interventoría solicitado al contratista, los soportes de pago del FIC – Fondo de la Industria de la Construcción. Sin embargo, en el mes de octubre 2025 no recibió respuesta correspondiente a septiembre y octubre de 2025. El día 01 de noviembre 2025 se emitió el consecutivo Nº088 reiterando la solicitud presentada, ante la no respuesta se realizó un presunto incumplimiento el día 10 de noviembre 2026, por lo cual, se emitió el consecutivo Nº107. El día 19 de noviembre de 2025 se recibió la documentación requerida, y se realizó la validación correspondiente. Se recibió la documentación correspondiente al mes de noviembre 2025 a conformidad. En el mes de enero 2026 se recibieron los soportes correspondientes al mes de diciembre 2025. A la fecha del presente informe se encuentra a la espera de la entrega de los soportes correspondientes a enero 2026, los cuales deben ser entregados los 10 primeros días hábiles del mes de febrero 2026.

En el mes de febrero 2026, se recibieron los soportes del pago FIC correspondiente al mes de enero 2026, y se realizó la solicitud de ir gestionando los correspondientes al mes de febrero 2026, el cual tiene plazo de entrega correspondiente a los 10 primeros días hábiles del mes de marzo 2026.

En el mes de marzo 2026. Se recibieron los soportes del pago FIC correspondiente al mes de febrero 2026. Se realizó la solicitud de la entrega correspondiente al mes de marzo 2026, la cual tiene plazo de entrega los 10 primeros días hábiles del mes de abril 2026.

En el mes de abril 2026 se recibieron los soportes del pago FIC correspondiente al mes de marzo 2026. Se recibieron los soportes asociados a los meses de marzo y abril 2026, se encuentra pendiente la entrega correspondiente al mes de mayo 2026.

Adicionalmente, se ha reiterado la solicitud de la entrega de los soportes del pago del impuesto retención en la fuente que debió efectuarse en el mes de diciembre 2025. Se recibió el pago del impuesto FIC hasta

el mes de mayo 2026. Pendiente el correspondiente al mes de junio 2026. Se recibió el extracto fiduciario del mes de mayo 2026, sin embargo, se tiene pendiente los correspondiente a diciembre 2025, enero, febrero, y abril 2026.

Anexo No.11 *Correspondencia Enviada y Recibida*


7.9 REGISTRO AL COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO

Durante el período de este informe, predominan días soleados y secos.


Ver Anexo No.08: *Registro al comportamiento climático*

7.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se muestra el registro fotográfico que evidencia la realización de los diversos trabajos mencionados anteriormente en la obra.

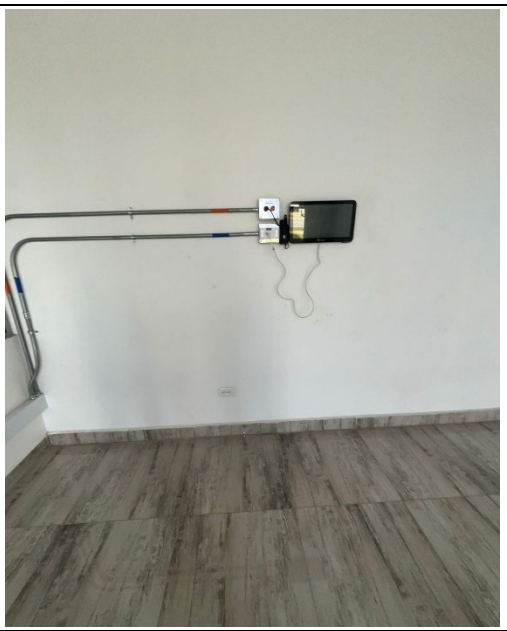	
Laboratorio en la zona interna	Control del sistema encendido de aires acondicionado

	
Ductos en azotea	Limpieza en alrededores de la vía
	
Vía de acceso al laboratorio con sus respectivos andenes	Fachada externa del laboratorio EMAVI

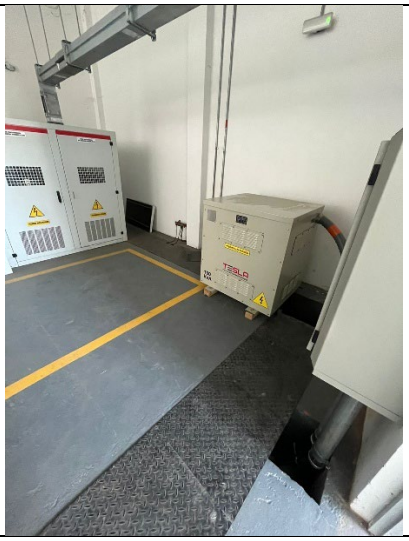	
Realización de prueba a la plata eléctrica	Transformador eléctrico
	
Chillers y equipos mecánicos instalados	Sistema HVAC

Anexo No.28 *Formatos de seguimiento (Control de registro fotográfico)*

7.11 BITÁCORA DE OBRA

Durante este período, se utilizó la bitácora de la obra como una herramienta clave para registrar todos los aspectos relevantes del proyecto, incluyendo observaciones, recomendaciones, requerimientos, ajustes y conciliaciones de cuestiones técnicas; esto con el fin de asegurar la correcta ejecución de las tareas y garantizar que las actividades se realicen siguiendo los diseños, especificaciones y normativas.

Ver Anexo No.09: *Bitácora de Obra*

8. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

8.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Se realizó el seguimiento y control de las actividades llevadas a cabo por el CONSORCIO S2A 2025 y de sus obligaciones contractuales con el FAC.

- ✓ Revisión de planos.
- ✓ Revisión de APU's.
- ✓ Revisión de hojas de vida y su valoración.
- ✓ Revisión de seguridad social integral.
- ✓ Revisión de planes y programas ambientales y SST.
- ✓ Aprobación de planes y programas relacionados con el medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Revisión de la programación de la obra.
- ✓ Participación en comités de técnicos y administrativos, como mesas de trabajo especializadas.
- ✓ Elaboración de actas de reuniones.
- ✓ Revisión de los registros de vecindad.
- ✓ Inspección de medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo. Revisión del Plan de Inversión del Anticipo.
- ✓ Emisión de comunicados al contratista de obra sobre el cumplimiento de las normas ambientales, SST, técnicas y administrativas.
- ✓ Hacer cumplir las obligaciones contractuales del contratista, considerando los factores de tiempo, costo y calidad.
- ✓ Registro fotográfico completo de cada actividad o novedad que sucede en el proyecto.
- ✓ Revisión de las pólizas.

8.2 ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA

En el mes de junio 2026, se ejecutaron 4 comités de supervisión (DIFRA).

Tabla 11. *Relación de la realización de comités de obra y DIFRA. Elaboración propia.*

COMITÉ	MEDIO	FECHA	TEMAS
Comité DIFRA - Acta Nº33	Virtual	31/05/2026	1. Revisión de compromisos. 2. Estado del proyecto: programado vs. ejecutado. 3. Temas administrativos y financieros 4. Temas técnicos de ejecución de obra
Comité DIFRA - Acta Nº34	Virtual	04/06/2026	1. Revisión de compromisos. 2. Estado del proyecto: programado vs. ejecutado. 3. Temas administrativos y financieros 4. Temas técnicos de ejecución de obra
Comité DIFRA - Acta Nº35	Virtual	09/06/2026	1. Revisión de compromisos. 2. Estado del proyecto: programado vs. ejecutado. 3. Temas administrativos y financieros 4. Temas técnicos de ejecución de obra
Comité DIFRA - Acta Nº36	Virtual	10/06/2026	1. Revisión de compromisos. 2. Estado del proyecto: programado vs. ejecutado. 3.Temas administrativos y financieros 4.Temas técnicos de ejecución de obra

Ver Anexo No.10: *Actas de Comité Obra*

8.3 CONTROL A LA CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Este informe incluye la correspondencia enviada y recibida entre el contratante (FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC-), el contratista (CONSORCIO S2A 2025), la interventoría (JBG GESTION DE CONSTRUCCIÓN) y otros actores involucrados en el proyecto "LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO, FASE III, EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ, CALI – VALLE DEL CAUCA".

Ver Anexo No.11: *Correspondencia Enviada y Recibida*

8.4 APOYO DE ASESORES INTERVENTORÍA.

La interventoría cuenta con un equipo de profesionales con experiencia en diferentes áreas de ingeniería, quienes actúan como asesores técnicos especializados. Durante junio de 2026, han brindado apoyo al equipo de supervisión e interventoría y a la constructora, realizando inspecciones y evaluando las especificaciones técnicas de los componentes del proyecto "LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI – VALLE DEL CAUCA".

Tabla 12.*Informes técnicos realizados por asesores de interventoría. Elaboración propia.*

NOMBRE	CARGO	INFORME	FECHA
Erick Torres	Asesor Mecánico	CONSECUTIVO N°404- 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025- Respuesta al consecutivo C07-344 (SOLICITUD DE P&ID MECÁNICO DEL SISTEMA HVAC)	02/06/2026
		CONSECUTIVO Nº409- 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025-Respuesta al Envío planos preliminares HVAC – Planta y vista 3D	04/06/2026
Andrés Giraldo	Asesor TICS	CONSECUTIVO Nº412- 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025-INFORME PROTECCIÓN CABLE COMPONENTE TICS	05/06/2026
Edwin Oñoro	Asesor eléctrico	CONSECUTIVO Nº405- 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025-Reiteración a documentación (Sistema de respaldo eléctrico Grupo electrógeno y transf automática	03/06/2026
María Teresa Argote	Asesor Jurídico	CONSECUTIVO Nº400 - 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025- Presunto incumplimiento a la dedicación del personal contractual-Residente de obra	01/06/2026
		CONSECUTIVO Nº414 - 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025- Respuesta al requerimiento FAC-S-2026-020895-CE	10/06/2026
		CONSECUTIVO N°418 - 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025- Presunto incumplimiento ante solicitud de disposición final de materiales de obra	14/06/2026
Luis Rodríguez	Asesor Contable	CONSECUTIVO N°407- 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025-Solicitud de soportes de pago del FIC – Fondo de la Industria de la Construcción mes ABRIL-MAYO 2026	04/06/2026

Además de los oficios enviados, los cuales se mencionan en la correspondencia, se elaboró un informe mensual para cada componente correspondiente a junio de 2026. Este reporte refleja con claridad las tareas realizadas por los asesores de la interventoría, incluyendo revisiones, mesas de trabajo, solicitudes, requerimientos y recomendaciones.

Ver Anexo No.11: *Correspondencia Enviada y Recibida*

Ver Anexo No.27: *Informes mensuales asesores interventoría*

9. SEGUIMIENTO AL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

9.1. CONTROL DE INVERSIÓN Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Cada semana, se llevaron a cabo revisiones en la programación y el presupuesto para detectar posibles cambios en el alcance y los plazos de ejecución. En el área financiera, el proyecto actualmente presenta el siguiente estado:

Tabla 13. *Presupuesto de obra. Elaboración propia.*

VALOR INICIAL	**$ 6.614.315.008**	**100%**
ANTICIPO	$ 3.307.157.504	50%
ADICIÓN	$ 0,00	0,0%
VALOR FINAL	$ 6.614.315.008	100%

PERIODO DEL 01 AL 16 JUNIO 2026		
Valor Programado	$ 6.614.315.008	100%
Valor Ejecutado	Revisión	

En el mes de marzo 2026 se efectuó la entrega del corte de obra Nº3 tanto para el contratista de obra como para la interventoría discriminado de la siguiente manera:

Los siguientes valores cobrados por el contratista de obra corresponden a valores amortizados del 50 %

***Tabla 14**. Valores de corte de obra. Elaboración propia*

	CORTES DE OBRA			
Consorcio S2A 2025	*Fecha*	*Valor Neto*	*Valor amortizado (50 %)*	*Estado*
Corte de obra Nº1	02/12/2025	$24.456.733,26	$12.228.366,63	Pagado
Corte de obra Nº2	26/12/2025	$1.732.853.316,00	$ 866.426.658,00	Pagado
Corte de obra Nº3	27/02/2026	$1.132.249.129,86	$ 566.124.564.86	Pagado
SUBTOTAL		$2.889.559.179,12	$1.444.779.589,56	

Ejecutado Financiero	%	Valor
	43.69	$2.889.559.179,12

	CORTES DE INTERVENTORIA		
JBG Gestión de Construcción SAS	*Fecha*	*Valor Neto*	*Estado*
Corte de obra Nº1	09/10/2025	$9.594.927,54	Correspondiente a informe de trámites administrativos ITEM.3.2
Corte de obra Nº2	17/12/2025	$ 70.979.415,78	Pagado
Corte de obra Nº3	27/03/2026	$ 98.214.389,09	Pagado
SUBTOTAL		$178.788.732,41	

9.2. PROYECCION DE LA OBRA

En colaboración con el contratista, se revisó el cronograma del proyecto y sus requerimientos, considerando las condiciones reales del trabajo. Se detectó la necesidad de actualizar las cantidades de los ítems contractuales, tanto mayores como menores. Además, con la solicitud para las mesas de trabajo técnicas con los diseñadores, se encuentra en revisión el modificatorio correspondiente a las actividades no previstas.

10. INFORME DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

10.1 REQUERIMIENTOS SST

Durante el mes de junio 2026 se realizaron varios requerimientos al contratista de obra relacionados con el área SST, los cuales se especifican a continuación:

- CONSECUTIVO N°403- 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025-Solicitud de entrega de informe mensual N°9
- CONSECUTIVO N°407 - 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025-Solicitud de soportes de pago del FIC– Fondo de la Industria de la Construcción mes MAYO 2026.

- CONSECUTIVO N°408- 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025-Reiteracion ante solicitud de disposición final de materiales en obra.

- CONSECUTIVO N°418- 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025- Presunto incumplimiento ante solicitud de disposición final de materiales en obra.

10.2 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio a 16 de junio 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Verificación de afiliación al Sistema de seguridad social (A que entidades se encuentran afiliados EPS, ARL, Caja de Compensación, Pensión).
- Verificación del cumplimiento del programa de inducciones a los trabajadores que ingresan nuevos al proyecto.
- Supervisión del uso obligatorio y permanente de elementos de protección personal.
- Recorridos de obra de manera diaria.
- Preoperacionales de taladro.
- Preoperacionales de pulidora.
- Preoperacionales de herramientas manuales.
- Preoperacionales de Plataforma Elevadora.
- Orden y aseo de obra.

10.3 LISTA DE VERIFICACIÓN ACTIVIDADES

En cuanto a las actividades de verificación realizadas por parte de la interventoría, se presenta la siguiente tabla.

Tabla 15.*Relación de verificación actividades de la interventoría en obra. Elaboración propia.*

Ítem	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
1	Verificación de cerramientos de obra	X		Cumple
2	Verificación de uso de EPP acorde con la actividad	X		Cumple
3	Verificación de instalación de baños o USM	X		Cumple
4	Verificación de punto de emergencia (camilla, extintor, botiquín dotado)	X		Cumple, ver observación 1
5	Punto de acopio	X		Cumple, ver observación 2
6	Verificación de SSI del personal de mano de obra no calificada	X		Se entrega pagos de SSI del periodo de junio 2026, ver observación 3
7	Verificación de SSI del personal de mano de obra Calificada	X		Se entrega pagos de SSI del periodo de junio 2026, ver observación 4
8	Verificación de realización de preoperacionales	X		Cumple
9	Verificación de realización de inducciones	X		Cumple
10	Señalización interna de campamentos	X		Cumple
11	Señalización de rutas de evacuación y punto de Encuentro	X		Cumple, ver observación 5
12	Se aíslan áreas de trabajo	X		Cumple
13	Instalación de campamento	X		Cumple
14	Verificación de hidratación de trabajadores	X		Cumple
15	Instalación de Vestier para trabajadores	X		Cumple
16	Instalación de lavamanos	X		Cumple

Observaciones:

Observación 1: El punto de emergencia cuenta con los elementos básicos: camilla, extintor y botiquín. Se recomienda verificar periódicamente su estado, accesibilidad, adquisición y reposición de insumos médicos, asegurando su operatividad ante cualquier eventualidad, es importante que el punto de emergencia se encuentre señalizado y en lugar seco libre de lluvias y exposición directa al sol.


Observación 2: El punto de acopio debe mantener ordenado y limpio.

Observación 3: Se recibió documentación correspondiente al pago del Sistema de Seguridad Integral (SSI) para el personal de mano de obra no calificada, correspondiente al mes de junio 2026. Se recomienda mantener actualizado este registro y garantizar su presentación mensual de todos los trabajadores contratistas, subcontratistas.


Observación 4: Se recibió documentación correspondiente al pago del Sistema de Seguridad Integral (SSI) para el personal de mano de obra calificada, correspondiente al mes de junio 2026. Al igual que con el personal no calificado, se debe asegurar la continuidad y registro de estos pagos mensuales de todos los trabajadores contratistas, subcontratistas.

Observación 5: No se identificó señalización de rutas de evacuación dentro de la obra, en el área donde se encuentra la obra si se cuenta con punto de encuentro para el personal del SPOC y laboratorios del espacio (fase III – obra).

10.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SST

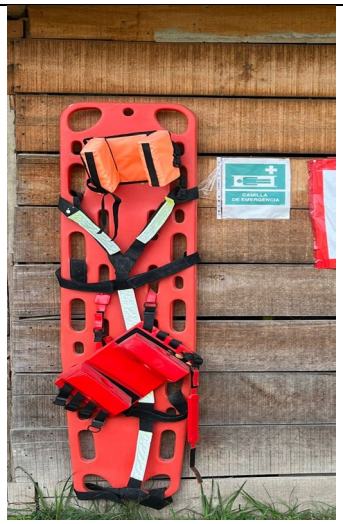
	
Camilla de emergencia en el frente de obra.	Extintor en el frente de obra.

	
Diligenciamiento de permisos	Vestier de los trabajadores.
	
Uso de EPP y dotación	Señalización

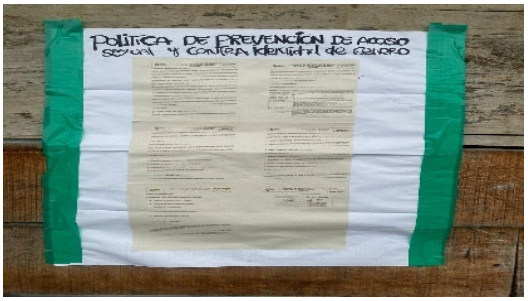	
Pausas activas	Pausas activas
	 
Diligenciamiento permisos	Publicación de reglamentos y políticas SST Obra.

	
KITS antiderrames.	Aseo en obra

	
Extintor contenedor interventoría.	Botiquín contenedor interventoría.

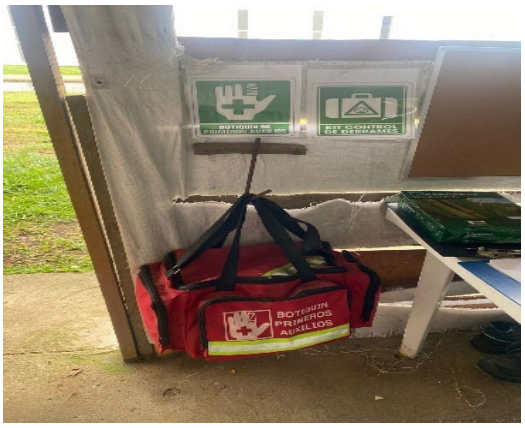	
Punto de encuentro del área FAC – Obra.	Botiquín de obra – contratista.

10.5 INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

El siguiente inventario relaciona los equipos de emergencia presentes en la obra del periodo.

Tabla 16. *Equipos de emergencia contratista. Elaboración propia.*

EQUIPO	UBICACIÓN	CANTIDAD
EXTINTOR MULTIPROPOSITO	Campamento obra	1
CAMILLA RÍGIDA	Exteriores de Vestier de trabajadores	1
BOTIQUIN BASICO TIPO A	Exteriores de Vestier de trabajadores	1

Tabla 17. *Equipos de emergencia interventoría- Elaboración propia.*

EQUIPO	UBICACIÓN	CANTIDAD
EXTINTOR MULTIPROPOSITO	Entrada contenedor	1
BOTIQUIN BASICO	Contenedor	1

10.6 PLAN DE CONTINGENCIA

El contratista Consorcio S2A 2025 desarrolló el Plan de Contingencia para la obra, estableciendo los procedimientos necesarios de actuación en caso de sismo, incendio, entre otras emergencias.

Ver <u>Anexo No. 15</u> <u>Plan de contingencia de obra</u>

10.7 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERIODO

Durante el periodo de junio 2026, no ocurrieron accidentes de trabajo ni por parte del contratista de obra *Consorcio S2A 2025* ni por parte de interventoría *JBG SAS.*

Tabla 18. *Registro de accidentabilidad. Elaboración propia.*

EMPRESA	PERIODO	ACCIDENTES PRESENTADOS	INCIDENTES REPORTADOS	ACCIDENTES REPORTADOS
JBG SAS	JUNIO de 2026	0	0	0

EMPRESA	PERIODO	ACCIDENTES PRESENTADOS	INCIDENTES REPORTADOS	ACCIDENTES REPORTADOS
CONSORCIO S2A 2026	JUNIO de 2026	0	0	0

Ver Anexo No. 30 *Certificado accidentalidad ARL*

10.8 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Los ATS se realizaron de manera semanal, teniendo en cuenta que no existan modificaciones y el personal sea el mismo. En el evento que cambie alguno de estos aspectos, se deberá generar un ATS nuevo.

ATS trabajos en alturas: 1
ATS trabajos en caliente:3

Ver Anexo No. 26 *ATS*

10.9 PREOPERACIONALES Y PERMISOS DE TRABAJO

Se recibió por parte del Contratista Consorcio S2A 2025 preoperacionales asociados a las siguientes herramientas:

- Pulidora.
- Taladro.
- Herramientas manuales (barra, martillo, destornillador, metro, regla).
- Andamio.
- Taladro de lámina.
- Taladro magnético.
- Oxicorte.

- Equipo de soldadura.
- Tronzadora.
- Plataforma elevadora.
- Sierra.
- Sistema de acceso.

***Ver Anexo No. 16** Preoperacionales*

Los permisos de trabajo se realizaron de manera diaria, se recibieron por parte del contratista de obra los siguientes permisos de trabajo:

- Trabajo en alturas: 1
- Trabajos en caliente:3

***Ver Anexo No. 29** Permisos de trabajo*

10.10 AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

✓ **SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CONTRATISTA DE OBRA**

En la planilla de pago y anexos se evidencian los soportes a las afiliaciones a la seguridad social integral por ARL, EPS, fondo de pensiones y caja de compensación familiar del personal listado a continuación.

***Ver Anexo No. 17** Pagos de seguridad social contratista*

✓ **SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL INTERVENTORÍA**

En la planilla de pago y anexos se evidencian los soportes a las afiliaciones a la seguridad social integral por ARL, EPS, fondo de pensiones y caja de compensación familiar del personal listado a continuación.

***Ver Anexo No. 18** Pagos de seguridad social interventoría*

10.11 CONTROL DEL PERSONAL

En el mes de junio 2026, se contó con el siguiente personal en obra, entre personal administrativo de la Interventoría, Contratista y operativo de obra. Así mismo se anexan los paz y salvo del personal que terminó su vínculo laboral en el proyecto durante o antes del periodo reportado, por terminación contractual o traslado a otros proyectos de la empresa subcontratista.

Tabla 19. *Relación de personal de obra del contratista. Elaboración propia.*

N.º	NOMBRE	EMPRESA	CARGO
1	WILMAR CARDONA	CONSORCIO S2A 2025	DIRECTOR DE OBRA
2	DIANA GISELA QUIÑONEZ	CONSORCIO S2A 2025	GESTORA SISOMA
3	JULIAN DARIO ANTE PUERTA	CONSORCIO SA2 2026	GERENTE DE PROYECTO
4	DAVID VASQUEZ CADAVID	CONSORCIO SA2 2026	DIRECTOR DE PROYECTOS CONSORCIO
5	ELIZABETH POMAR	TELCOM	INSPECTORA SST
6	ALEXIS PEREZ ESCUDERO	TELCOM	TECNICO ELECTRICISTA
8	NLSON FERNANDO URIBE	TELCOM	TECNICO ELECTRICISTA
9	JOSE LUIS RODRIGUEZ	TELCOM	AUX ELECTRICISTA
10	LUIS FERNANDO PEREZ	TELCOM	TECNICO ELECTRICISTA
11	GONZALO CAICEDO ZAPATA	O3 INGENIERIA	TECNICO
12	FABIO ALZATE ROJAS	O3 INGENIERIA	TECNICO
13	RODRIGO CANO PERSIGA	O3 INGENIERIA	TECNICO
14	ANDRES FELIPE CANO	O3 INGENIERIA	TECNICO
15	SERGIO CORREA HOYOS	O3 INGENIERIA	AUXILIAR
16	EMERSON CANO JARAMILLO	O3 INGENIERIA	AUXILIAR
17	WALTER RIVERA VERGARA	O3 INGENIERIA	AUXILIAR
18	JUAN FELIPE MUÑOZ	O3 INGENIERIA	TECNICO
19	JOAN SEBASTIAN GALVIZ	O3 INGENIERIA	INGENIERO
20	VERONICA ARANGO ZEA	O3 INGENIERIA	INSPECTORA SST
21	NORBEY DE JESUS ALVAREZ	O3 INGENIERIA	AUXULIAR
22	YARLE ACOSTA FLOTREZ	BETON	OFICIAL
23	ADRIAN ROJAS	BRITO	OFICIAL
24	NELSON URBANO NOQUERA	BRITO	OFICIAL
25	ELVER PAZ MAMIAN	BRITO	OFICIAL
26	NOLASCO NINO NAVARRO	BRITO	OFICIAL

JBG Interventoría & Construcción	CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA	Versión: 01 Fecha: Nov - 2022

Proyecto:EMAVI- LABORATORIOS FASE III — **Revisado por:Ing. Alexander vasquez**

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	CARGO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
CONSORCIO S2A 2025		GERENTE DE PROYECTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		DIRECTOR DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		SSTMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		OFICIAL O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		OFICIAL O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		OFICIAL O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		OFICIAL O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		OFICIAL O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		OFICIAL O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		INGENIERO O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		OFICIAL O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		OFICIAL O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		OFICIAL O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		SST O3 INGENIERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		SST TELCOM	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
		TECNICO TELCOM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		TECNICO TELCOM	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		TECNICO TELCOM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		AUXILIAR TELCOM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		BETON				1		1	1		1	1			1	1		1	
		OFICIAL BRITO			1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		AYUDANTE BRITO			1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	
		OFICIAL BRITO			1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
TOTALES DIARIO			20	20	23	23	20	23	24	22	24	23	23	22	24	23	23	24	
TOTAL POR SEMANA (UND)			153							208									
TOTAL PERSONAL POR MES (UND)																			

Página 1

Ilustración 6. *Reporte de personal en obra del contratista. Elaboración propia.*

Tabla 20.*Relación de personal de obra de la interventoría. Elaboración propia.*

N.º	NOMBRE	EMPRESA	CARGO
1	YOLIMA RUIZ	JBG SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	ALEXANDER VASQUEZ	JBG SAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	YAJAIRA VASQUEZ	JBG SAS	INSPECTORA SSTMA
4	ROSA CERRO	JBG SAS	COORDINACION PROYECTOS
5	EDWIN OÑORO	JBG SAS	ASESOR ELÉCTRICO
6	ERICK TORRES	JBG SAS	ASESOR MECÁNICO
7	ANDRES GIRALDO	JBG SAS	ASESOR TICS
8	LUIS RODRIGUEZ	JBG SAS	ASESOR CONTABLE
9	MARIA TERESA ARGOTE	JBG SAS	ASESOR JURIDICO

	CONTROL DIARIO DE PERSONAL INTERVENTORIA EN OBRA																			Versión: 01 Fecha: Nov - 2022
Proyecto:EMAVI- LABORATORIOS FASE III									Revisado por: Ing. Alexander vasquez											
INTERVENTORIA	ACTIVIDAD	CARGO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
		DIRECTOR DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
		RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
		SSTMA	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
		ASESOR ELECTRICO	1	1	1	1	1	1	1		1				1					
		ASESOR TICS	1						1				1		1			1		
		ASESOR MECANICO		1		1				1		1			1			1		
		ASESOR VIAS	1					1			1						1	1		
		ASESOR JURIDICO		1			1							1			1			
		ASESOR CONTABLE			1			1				1						1		
TOTALES DIARIO			6	6	5	5	5	6	5	1	5	5	4	4	6	3	2	7	3	
TOTAL POR SEMANA (UND)			38							40										
TOTAL PERSONAL POR MES (UND)																				

Ilustración 7. Reporte de personal en obra interventoría. Elaboración propia.

Ver <u>Anexo No. 19</u> Control de personal en obra

10.12 INDUCCIONES

Durante el periodo reportado el contratista de obra realizó las inducciones de SST al personal nuevo que ingreso a la obra.

NUM	NOMBRE	SUBCONTRATISTA	CARGO
1	DIEGO ALFONSO ESCOBAR	ABILE	RESIDENTE DE OBRA
2	CARLOS CRUZ	BRITO	OFICIAL
3	CARLOS ARDILA ARIAS	BRITO	OFICIAL

***Ver Anexo No. 20** Inducciones al personal en obra*

10.13 CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el mes de junio de 2026, se ejecutaron capacitaciones y charlas, por parte del contratista, a continuación, se mencionan los temas tratados.

Capacitaciones realizadas por el contratista de obra:

- Caídas mismo nivel.
- Uso epp.
- Uso correcto de máquinas y equipos.
- Higiene postural.
- Riesgo biomecánico.
- Orden y aseo.
- Divulgación ATS trabajo alturas.
- Autocuidado.
- Identificación de peligros.

Capacitaciones realizadas por la interventoría:

- Capacitación riesgo cardiovascular y estilo de vida saludable.

***Ver Anexo No. 21** Capacitaciones y charlas a trabajadores interventoría y contratista*

10.14 INSPECCIONES SISOMA CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

El contratista realizó las siguientes inspecciones SST durante el mes de junio de 2026.

- Inspección de andamios.
- Lista de chequeo para trabajos en altura.
- Inspección de EPP.
- Inspección herramientas manuales.

- Listas de verificación para trabajos en alturas

La interventoría realizó las siguientes inspecciones SST durante el mes de junio 2026.

- Inspección de extintor.
- Inspección botiquín.
- Inspección de obra.

Ver Anexo No.22. *Inspecciones sisoma contratista e interventoría*
Ver Anexo No.23. *Dotación contratista*

10.15 ESTUDIO DE SEGURIDAD

La entrega y gestión de los estudios de seguridad estuvieron en proceso de realización por parte del profesional SST del contratista de obra e interventoría, los cuales se entregaron de manera física y con oficio remisorio en las oficinas administrativas de la Base de Aviación Militar en el mes de septiembre 2025.

El día 28 de octubre del 2025, se realizó seguimiento al estado actual de los estudios de seguridad, con el propósito de verificar el estado de los mismos ante el mayor Caro, la cual informó que se debía consultar con el señor Leonardo Rojo (personal administrativo encargado de esta labor - orgánico EMAVI) e informó que a las personas que ya habían sido visitadas por la entidad a sus domicilios se encuentran aprobadas, sin embargo, no han emitido comunicado oficial por parte de FAC de la aprobación de los mismos, como se requirió por la interventoría en el oficio Nº091.
Se encuentra pendiente la realización de autorización biométrica al personal que cuenta con estudio de seguridad aprobado.

Tabla 21.*Relación de personal que radica el estudio de seguridad en el periodo. Elaboración propia.*

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA	ESTADO ESTUIDIO PERSONAL DE SEGURIDAD	BIOMÉTRICO
1	WILMAR CARDONA	71758388	DIRECTOR	CONSORCIO S2A 2026	AUTORIZADO	PENDIENTE
2	ARLEY LANDAZURY	75105698	RESIDENTE	CONSORCIO S2A 2026	AUTORIZADO	PENDIENTE
3	JULIAN ANTE PUERTA	10297182	GERENTE DE PROYECTOS	CONSORCIO S2A 2026	AUTORIZADO	PENDIENTE
4	DIANA GISELA QUIÑONEZ	1076817177	GESTOR SST	CONSORCIO S2A 2026	PENDIENTE	PENDIENTE
Nº	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**INTERVENTORIA**	**ESTADO**	**BIOMÉTRICO**
1	YOLIMA RUIZ	22563536	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	JBG SAS	AUTORIZADO	PENDIENTE
2	ROSA CERRO	1099965666	COORDINADOR DE PROYECTOS	JBG SAS	AUTORIZADO	PENDIENTE

3	YAJAIRA VASQUEZ	1043021143	INSPECTOR SSTMA	JBG SAS	PENDIENTE	PENDIENTE
4	ALEXANDER VASQUEZ	79664864	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JBG SAS	AUTORIZADO	PENDIENTE
5	ERICK FAIO TORRES	16780762	ASESOR MECÁNICO	JBG SAS	AUTORIZADO	PENDIENTE
7	ALEXANDER VALENZUELA	94400866	ASESOR ELÉCTRICO	JBG SAS	AUTORIZADO	PENDIENTE
8	ANDRES MAURICIO GIRALDO	94501789	ASESOR TIC	JBG SAS	AUTORIZADO	PENDIENTE

11. COMPONENTE AMBIENTAL

El contratista debe garantizar la ejecución de las actividades conforme a la normatividad ambiental vigente, incluyendo la obtención y actualización de los permisos, autorizaciones y demás requisitos exigidos por la autoridad ambiental competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, según la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y todas las disposiciones del manejo ambiental en el país con sus decretos reglamentarios. Durante la ejecución del contrato el contratista, está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, Decreto1220/95 y Decreto 500/96, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Ver Anexo No.24. Plan de manejo ambiental

11.1 Manejo integral de residuos

En el periodo del presente informe se generaron residuos ordinarios que fueron recogidos y dispuestos en el punto de acopio de residuos ordinarios de la Base, de acuerdo con la información otorgada por el Mayor Apraez, Importante mantener esta área ordenada y limpia. Las actividades relacionadas con este ítem consisten en el establecimiento del punto ecológico.



Punto ecológico

11.2 Manejo de residuos peligrosos

En el periodo del presente informe no se generaron residuos peligrosos, teniendo en cuenta la ficha de manejo de residuos peligrosos (Resolución 01164 de 2002).

11.3 Manejo y control de emisiones atmosféricas

En el periodo del presente informe, se realizó el control del manejo de emisiones atmosféricas, se verificó las respectivas revisiones técnico-mecánicas de los vehículos (camión cubierto).

11.4 Manejo y gestión del agua

En el periodo del presente informe, la obra contó con servicio de agua potable, la cual es destinada para el uso de baños y lavamanos.



Baño mujeres



Baño hombres



Lavamanos

11.5 Control del ruido

En el periodo del presente informe, las actividades desarrolladas en obra no generaron niveles de ruido que representaran impacto ambiental o riesgo para el personal.

11.6 Manejo ambiental de RCD en obra

En el periodo del mes de abril se generaron material de excavación provenientes de andenes y rampa en puerta principal de acceso al laboratorio, dicho material fue reutilizado para el relleno y nivelación del terreno en el aérea de los baños, con el fin de corregir desniveles y oquedades existentes, Se requiere continuar con las jornadas de orden y aseo para mantener los residuos en sus lugares de disposición final.

Así mismo, se precisa que durante el mes de mayo se remitió comunicación de reiteración identificada con el consecutivo N°408, mediante la cual se solicitó nuevamente la gestión correspondiente para la disposición final del material, dejando constancia del seguimiento efectuado frente a esta necesidad.

***Ver Anexo No 32** Manejo de residuos*

12. MÁQUINARIA Y EQUIPOS

LISTADO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL MES PARA LA OBRA

A continuación, se presentan los vehículos autorizados por la interventoría para el ingreso en el mes de junio de 2026, previamente se revisaron los documentos de licencia de tránsito, vigencia de SOAT, técnico-mecánica mediante la plataforma del RUNT.

Tabla 22.*Listado de principales vehículos usados en obra mes de JUNIO DEL 2026. Elaboración propia*

PLACA	TIPO DE VEHICULO	SOAT	TECNOMECANICA
581AFY	MOTOCARRO	22/09/2026	27/10/2026
PSX855	CAMIONETA	24/12/2026	24/12/2026
FHR	FURGON	26/08/2026	29/08/2026
GDY521	FURGON	10/08/2026	23/07/2026
KLP116	CAMIONETA	21/07/2026	21/10/2026

***Ver Anexo No 25** Documentación de vehículos*

✓ RELACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIA

A la fecha el contratista no hace reporte de mantenimientos de vehículos, equipos o maquinaria. Sin embargo, y acorde con el seguimiento y control realizado por parte de la interventoría, no hubo durante el periodo reportes de daños en campo.

Ver Anexo No.16 – Preoperacionales

***Tabla 23**.Relación equipos utilizados y plan de mantenimiento. Elaboración propia.*

Nº	EQUIPO	REPORTE DE DAÑOS EN CAMPO MES FEBRERO 2026
0	EQUIPOS	No se presentaron reportes de daños

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el periodo de junio de 2026, las condiciones climáticas fueron óptimas para el proyecto, teniendo en cuenta que en su mayoría se presentaron días soleados; existieron jornadas en la tarde con presencia de lluvias moderadas.
- Se aprobó por parte de la entidad el modificatorio N°1 del contrato de obra en adición de plazo, y para interventoría en plazo y recursos por un valor de $120.123.931,20, con fecha fin del contrato el 07 de marzo 2026. El 30 de marzo 2026 se aprobó el modificatorio N°3 del contrato de obra en adición en plazo hasta el 20 de abril 2026, así como también, se realizó cesión de derechos económicos por parte del contratista de obra para asumir el valor correspondiente a la interventoría (modificatorio N°4). Lo anterior, en atención a la necesidad de tiempo adicional para la realización de la calibración de los equipos de aire acondicionado y la ejecución de ítems no previstos adicionales. El día 23 de mayo de 2026 se aprobó el modificatorio N°4 del contrato de obra y N°5 del contrato de interventoría, con fecha de finalización del contrato del 16 de junio de 2026.
- El día 17 de abril 2026 se realizó suspensión parcial a los contratos de obra e interventoría N°013-00-A-COFAC-DIFRA-2025 y N°044-00-A-COFAC-DIFRA-2025 debido a las discrepancias detectadas entre la información presentada por el contratista y la verificación realizada por la interventoría, correspondiente a las cifras del saldo del contrato han resultado variables y poco consistentes. Esta situación generó incertidumbre y dificultad para la toma de decisiones sobre la ordenación del gasto, de la posible adición de recursos y la definición de actividades futuras. Por ello, la suspensión se adoptó como medida necesaria para realizar una revisión detallada, conciliación técnica y verificación integral que permitiera establecer un balance real, objetivo y confiable, acorde con las exigencias de la entidad contratante. Asimismo, que la suspensión del contrato de interventoría obedeció directamente a la suspensión del contrato de obra, en tanto las funciones de seguimiento, verificación y control ejercidas por la interventoría dependen de la ejecución efectiva de las actividades constructivas. El día 20 de mayo de 2026 se reinició el contrato una vez se subsanaron todas las condiciones que habían generado la suspensión del contrato.
- Se recibieron por parte del contratista de obra CONSORCIO S2A 2025 la actualización de las pólizas de acuerdo al modificatorio N°4 de obra, las cuales presentaron observaciones en las fechas según requerimiento de la entidad, y fueron cargadas nuevamente, y se encuentran en proceso de validación.
- De acuerdo a la programación aprobada en el modificatorio 4, y con fecha de culminación del plazo contractual, correspondiente al 16 junio 2026, el avance programado se cerró en el 100%, ejecutándose la totalidad de las actividades previstas para este plazo de terminación. El valor ejecutado real de avance de obra en este periodo correspondió a un 4.19%. A pesar de haber culminados las actividades contractuales, se debe continuar con el proceso documental correspondiente a la liquidación del proyecto y pendientes documentales para el cierre del mismo. Así como la revisión y conciliación del corte final del proyecto, para definir el valor final ejecutado.

- Los días 24, 25 y 26 de marzo 2026 se recibió visita por parte de la contraloría al proyecto. De lo cual, se recibió un hallazgo correspondiente al componente de seguridad y salud en el trabajo, por ende, la interventoría dio respuesta mediante el oficio N°355, dando cumplimiento dentro de sus obligaciones y tomando las acciones pertinentes a lugar.
- Se emitió el oficio N°284 dirigido al ordenador del gasto, de acuerdo a la solicitud de entrega del informe de manejo del anticipo del proyecto, donde, se estableció lo ejecutado a la fecha. Este documento se encuentra en anexo 11.
- No se ha aprobado a la fecha por parte de la interventoría y el comité estructurador, las modificaciones de los ductos de aire acondicionado realizado por el contratista. El contratista no ha realizado las entregas de la documentación (memorias de cálculo, memoria de cantidades, planos actualizados) para las respectivas revisiones.
- Por solicitud del DIFRA se presenta la reserva presupuestal para el 2026 y así garantizar los recursos para terminar el contrato, planteando una ejecución presupuestal para el 2025 del 27.58% y del 72.42% para el 2026. Con base en esa propuesta, el contratista presenta una solicitud de reserva del PAC para el 2026 de $ 906.020.438 donde considera el cobro parcial de obra civil, el grupo electrógeno y de extractor centrifugo.
- El 18 de noviembre de 2025, se realizó una mesa de trabajo presencial entre la interventoría, la dirección de obra, la gerencia del proyecto y el comité estructurador, con el objetivo de resolver técnica, económica y jurídicamente las actividades para el recubrimiento del piso, así como la aprobación de actividades no previstas y especificaciones pendiente, como resultado, la gerencia del proyecto se compromete a dar respuesta a los requerimientos. El proceso de la revisión y conciliación de APU se encuentra en proceso. Se requirió la entrega del balance asociado a las actividades no previstas para la correcta evaluación de la información.
- Se requieren las memorias de cálculo y estudios técnicos empleados para los diseños del proyecto, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones técnicas al equipo de asesores del contratista, y las validaciones correspondientes a los asesores de la interventoría.
- Se evidenciaron falencias en los planos suministrados por la institución, donde, se evidencia información incompleta, por ende, deben ser ajustadas mediante un registro detallado de control de cambios.
- Se requirió al contratista ajustar la programación al plan de compras y al plan de inversión del anticipo.
- Se realizaron las inspecciones a las actividades ejecutadas desde el componente SST.
- Se requiere el diligenciamiento de los formatos ATS de manera diaria - semanal para las actividades críticas a realizar en obra o semanal teniendo en cuenta que no cambie la actividad, las personas, área de trabajo.
- Se realizo jornadas de orden y aseo en el proyecto con el fin de evitar accidentes de trabajos.

- Durante el mes de junio 2026 se realizó la disposición final de los residuos generados en la obra que se encontraban pendientes de subsanación, dando cumplimiento a las acciones correctivas establecidas.
- Se requirió la entrega de la paz y salvo pendientes correspondientes al proceso de liquidación. Se recibió a la fecha la mayoría de esta información, pero se encuentran pendientes correspondiente a subcontratistas.
- Se requirió la entrega de informe ambiental final.
- Se evidenciaron falencias en los planos suministrados por la institución, donde, se evidencia información incompleta, por ende, deben ser ajustadas mediante un registro detallado de control de cambios.

Cali, 22 de junio de 2026

Ingeniera
YOLIMA RUIZ SILVA
Directora de Interventoría
JBG GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.
La Ciudad

Referencia : Contrato de Obra Pública No. 013-00-A-COFAC-DIFRA-2025.

Asunto : Entrega de bicicletero contractual de 10 puestos

Respetada ingeniera Yolima, cordial saludo.

En atención a las obligaciones contractuales del proyecto y a lo reiterado por la interventoría mediante el oficio No. 345, nos permitimos informar que el Consorcio S2A 2025 realizó la entrega del bicicletero de 10 puestos contemplado dentro del alcance del contrato.

El elemento se encuentra actualmente instalado dentro de las instalaciones del proyecto y disponible para su uso, conforme a la función prevista para este tipo de mobiliario.

Con lo anterior, dejamos constancia del cumplimiento de esta actividad y solicitamos sea tenida en cuenta dentro del cierre documental y proceso de recibo del contrato.

Cordialmente,

Julián Ante Puerta
Gerente de Proyecto
Consorcio S2A 2025

Anexo: registro fotográfico del bicicletero instalado.



