

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA-	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECU	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles

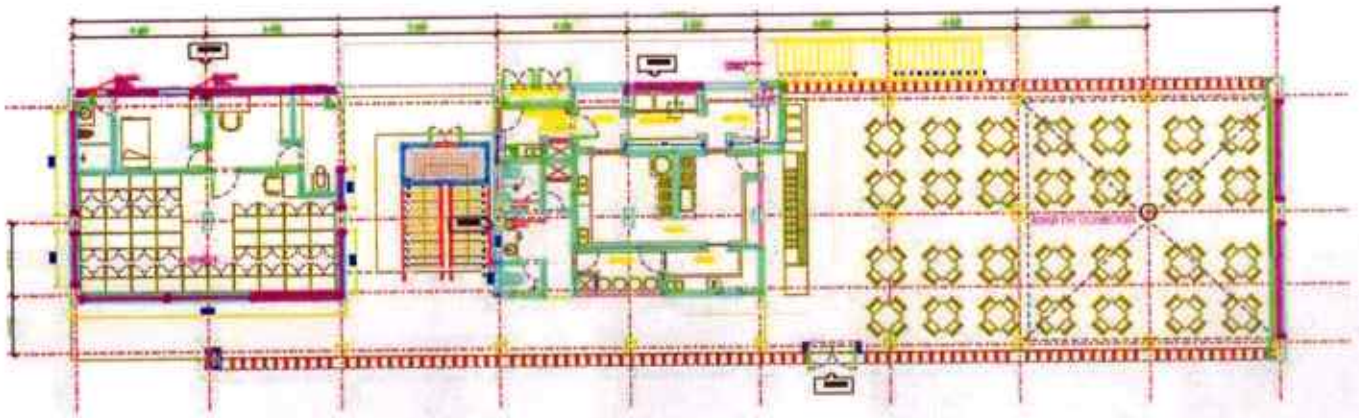

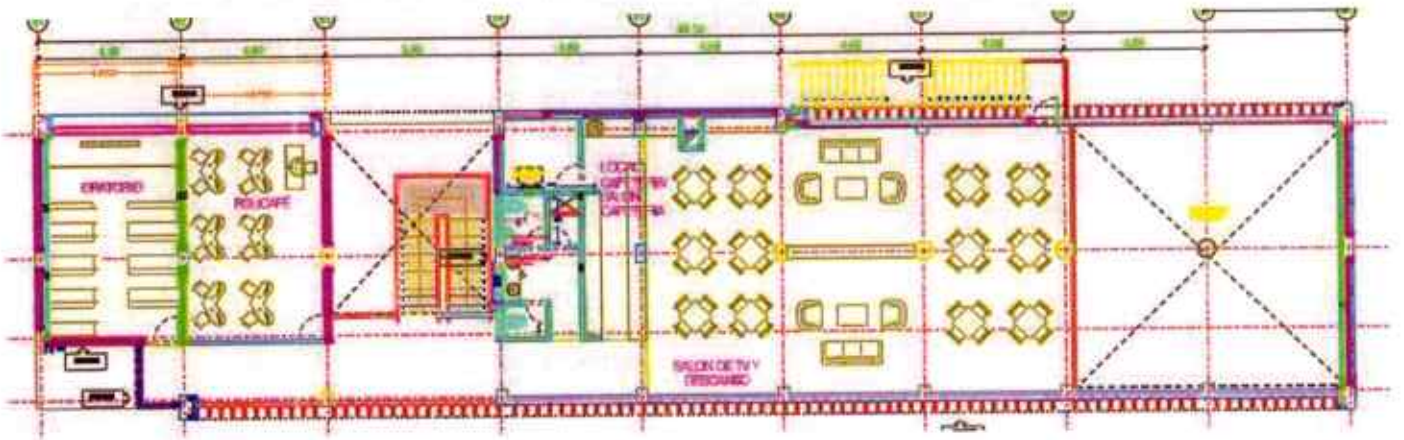

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP' EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA. ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC(EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B PRIMER PISO					**Subtotal**		**153,56**
BASURAS							
NORTE	1,00		3,17	3,15			9,99
SUR-INTERNO	1,00		3,15	3,15			9,92
Ventana V5	-1,00		3,13	0,80			-2,50
LAVADO							
NORTE	1,00		2,59	3,15			8,16
SUR	1,00		3,53	3,15			11,12
Ventana 23	-1,00		0,60	1,00			-0,60
BASURAS - LAVADO							
SUR - Exterior	1,00		8,82	3,15			27,78
Ventana V5	-1,00		3,13	0,80			-2,50
Ventana 23	-1,00		0,60	1,00			-0,60
COCINA							
SUR	1,00		5,84	3,15			18,40
OESTE	1,00		3,50	3,15			11,03
ESTE - Exterior	1,00		14,65	3,15			46,15
Puerta 4	-1,00		0,90	2,65			-2,39
Ventana 6	-1,00		1,07	1,20			-1,28
Ventana 7	-1,00		0,82	1,50			-1,23
Área de comedor							
ESTE	1,00		10,05	2,20			22,11

Esquema

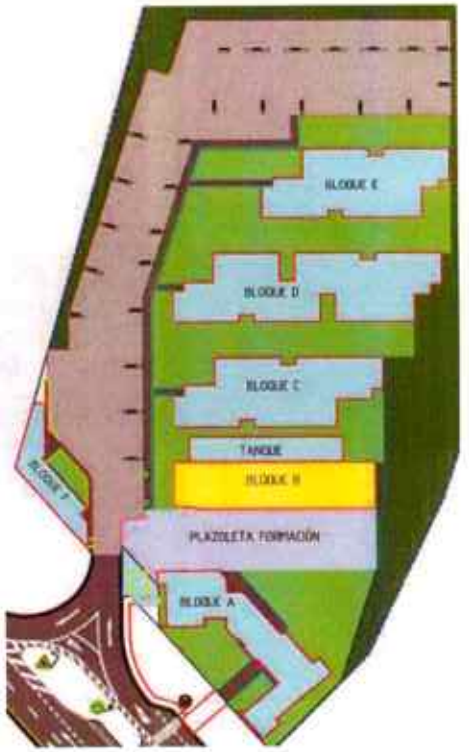


Ítem:	2.4.4	Unidad:	m²	Magnitud total:	153,56

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m^2

Planos y Detalles

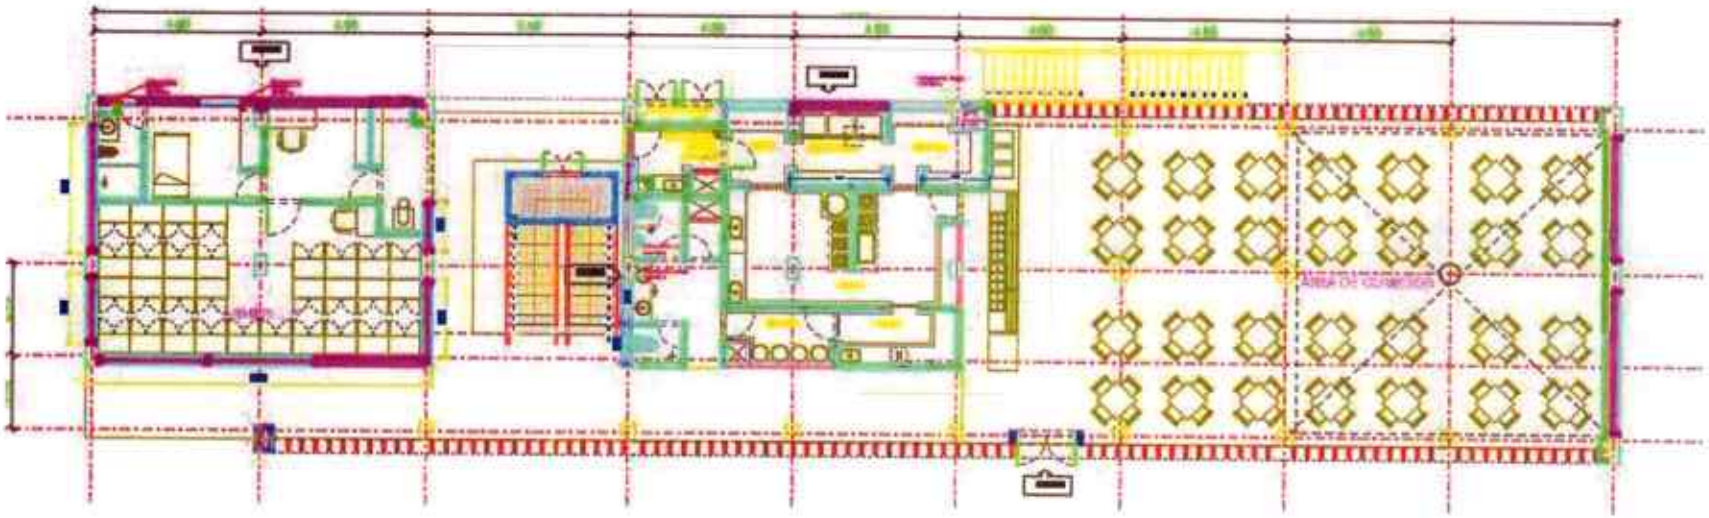

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TI EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA-.-)NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC(EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.5	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B PRIMER PISO					Subtotal		12,60
ESCALERA							
Columneta	5,00		1,80	0,20	0,10		9,00
LATERALES 1							
Columneta	2,00		1,80	0,20	0,10		3,60

Esquema

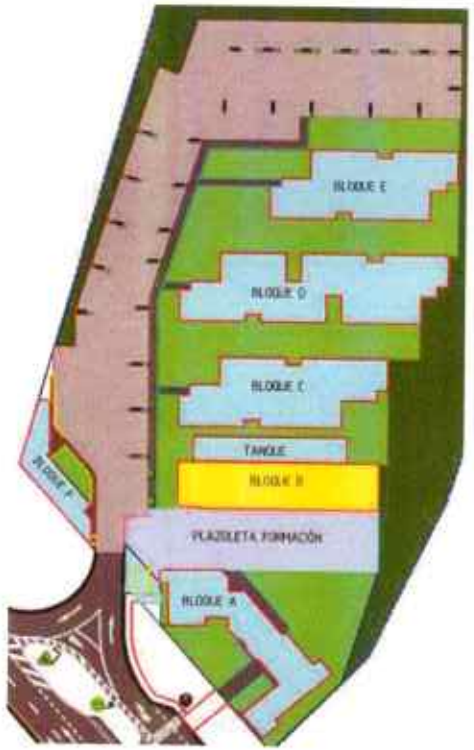


Ítem:	2.4.5	Unidad:	m	Magnitud total:	12,60

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.5	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Planos y Detalles

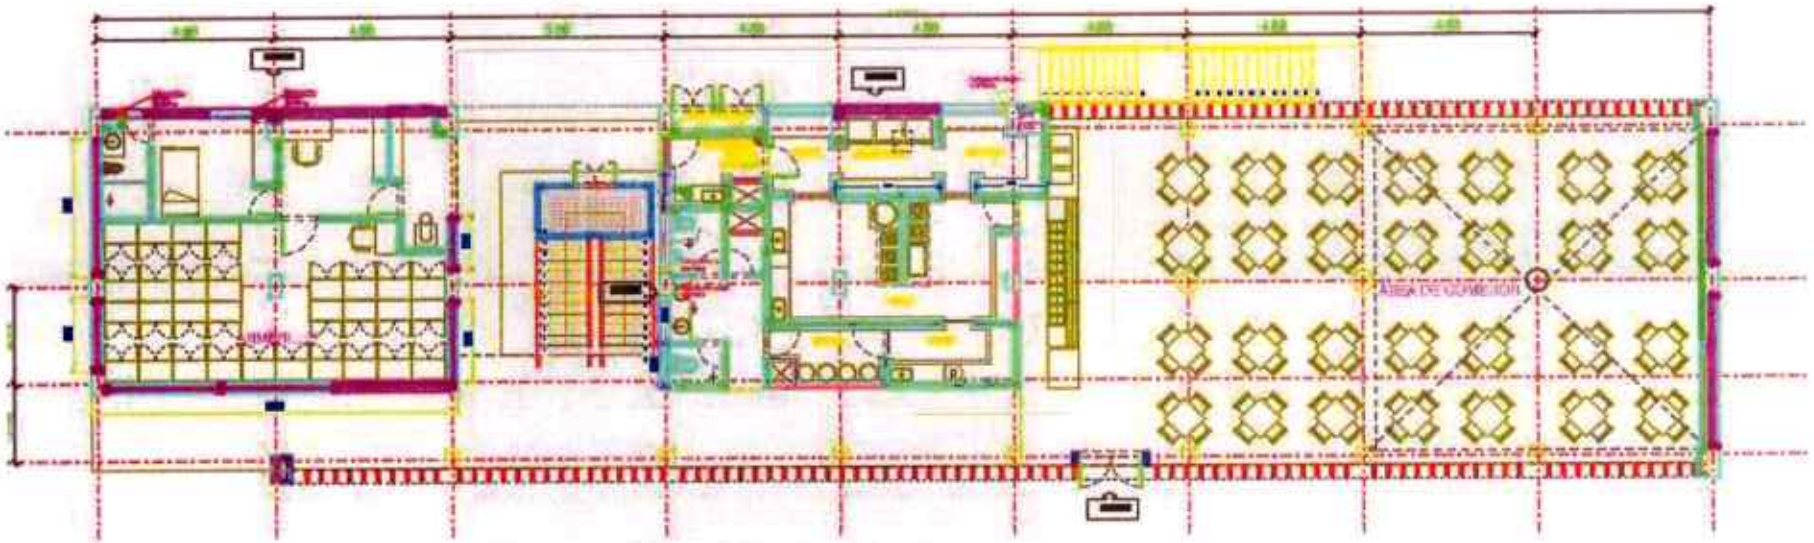

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.5	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIF .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR' SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA.ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC. / EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item:	Descripción	Unidad
3.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		154,86
Zona 1	1,00		8,31	7,97			66,19
Media caña y muro	1,00		7,23	0,50			3,62
Zona 2	1,00		6,29	13,50			84,90
Media caña y muro	1,00		0,29	0,50			0,15

Esquema



Ítem:	3.1.4	Unidad:	m²	Magnitud total:	154,86

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²

Planos y Detalles




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA . ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR' / EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²

Registro Fotográfico

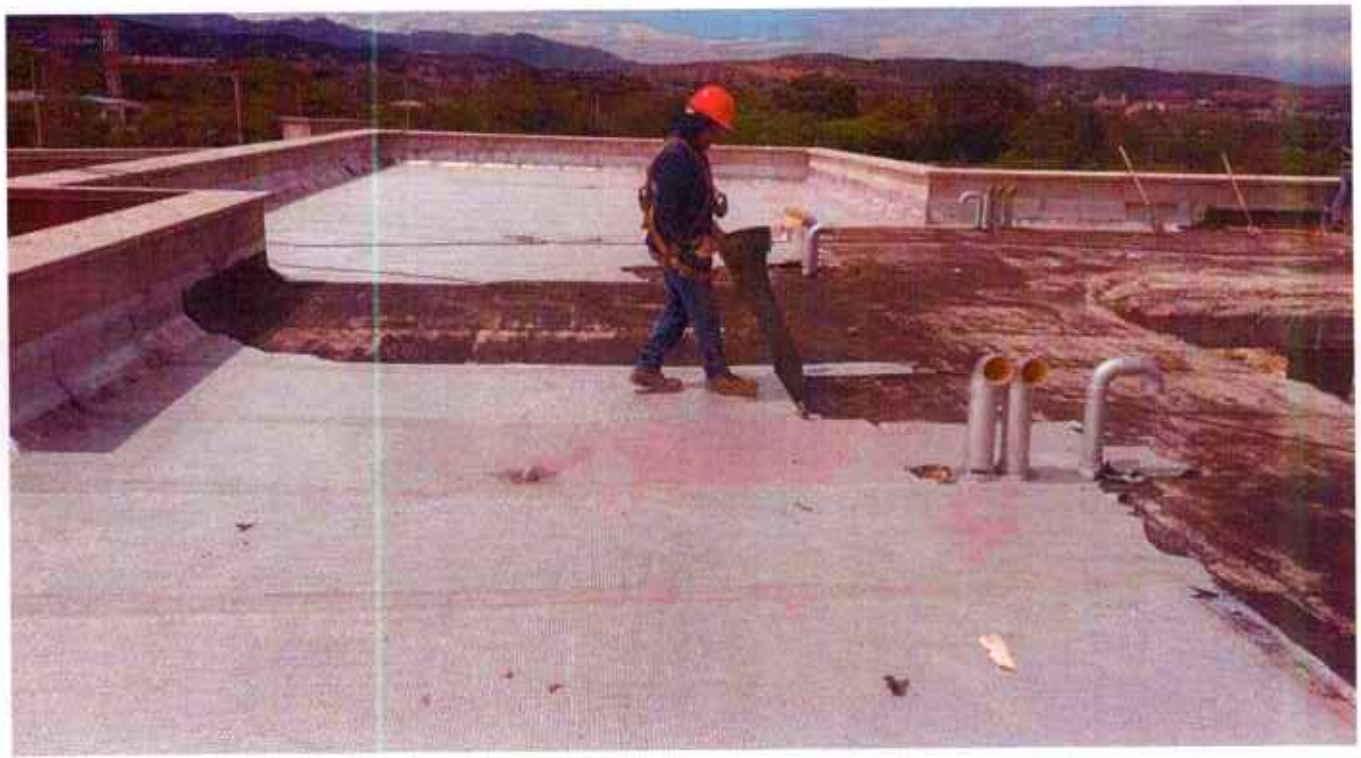

R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría R/L. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C PRIMER PISO						Subtotal		**0,50**
ZONA 1								
C4-C6 (NORTE)	C4-C6 (CA)							
Columneta 2	C4-C6 (CA)	1,00		3,45	0,30	0,24		0,25
C6-C9 (NORTE)	C6-C9 (CA)							
Columneta 2	C6-C9 (CA)	1,00		3,45	0,30	0,24		0,25
BLOQUE C ANTEPECHO						**Subtotal**		**0,05**
CA-CC (ESTE)	CA-CC (C22)							
Columneta 2	CA-CC (C22)	1,00		0,80	0,24	0,24		0,05

Esquema




Item:	3.2.3	Unidad:	m³	Magnitud total:	0,55

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAC ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC / EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Planos y Detalles

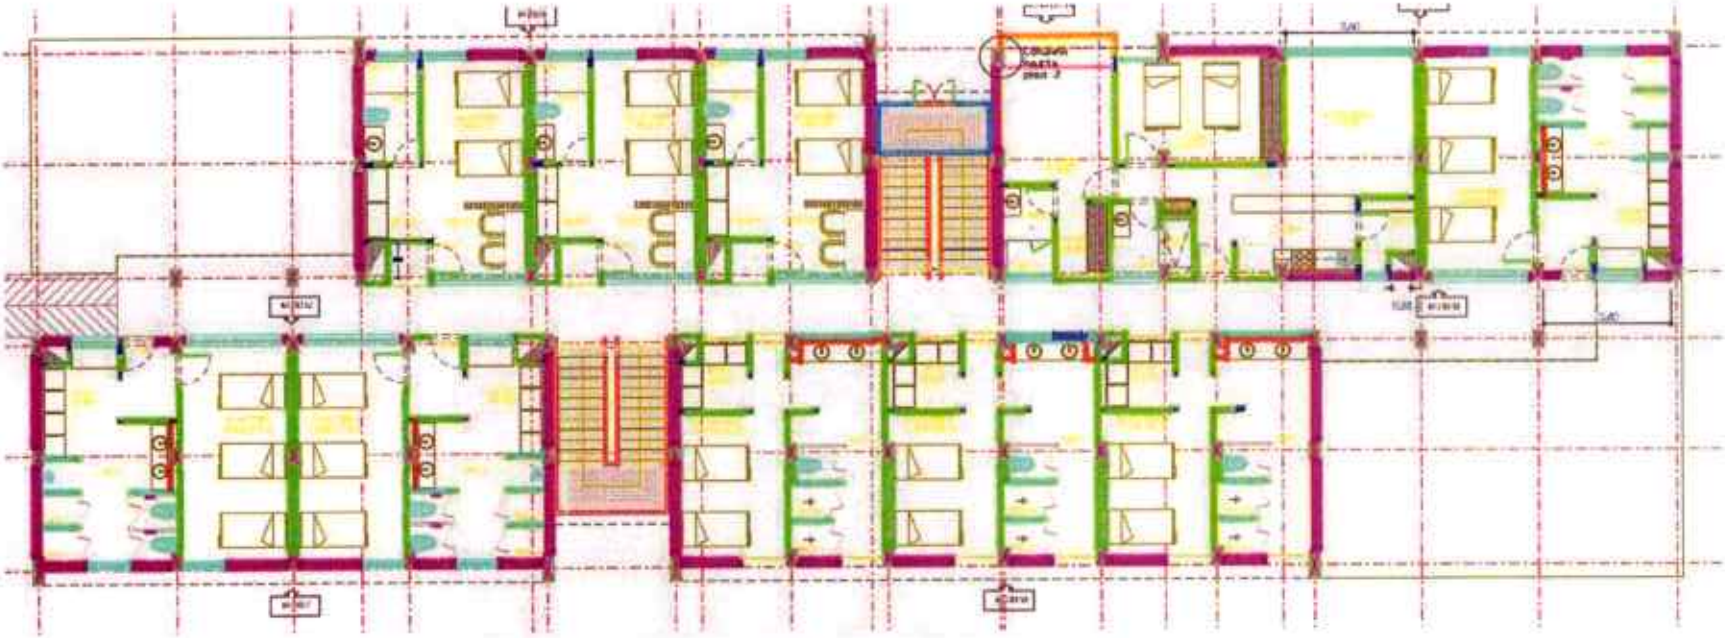

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA. ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC(EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
COLUMNETAS							
BLOQUE C							
COL 0.10 x 0.20 x 3.45 Son 89					**Subtotal**		**410,86**
Longitudinal	356,00	1,00	1,20			1/2	427,20
Longitudinal	178,00	1,00	3,00			1/2	534,00
Estribos	2136,00	0,56	0,31			3/8	370,81
Descuento	-89,00	3,00	3,45				-921,15
COL 0.10 x 0.20 x 2.00 Son 12					**Subtotal**		**16,85**
Longitudinal	48,00	1,00	1,20			1/2	57,60
Estribos	180,00	0,56	0,31			3/8	31,25
Descuento	-12,00	3,00	2,00				-72,00
COL 0.10 x 0.20 x 3.78 Son 62					**Subtotal**		**264,57**
Longitudinal	124,00	1,00	1,20			1/2	148,80
Longitudinal	124,00	1,00	1,08			1/2	133,92
Longitudinal	124,00	1,00	3,18			1/2	394,32
Estribos	1674,00	0,56	0,31			3/8	290,61
Descuento	-62,00	3,00	3,78				-703,08
COL 0.10 x 0.20 x 1.90 Son 32					**Subtotal**		**99,33**
Longitudinal	64,00	1,00	1,20			1/2	76,80
Longitudinal	64,00	1,00	1,90			1/2	121,60
Estribos	480,00	0,56	0,31			3/8	83,33
Descuento	-32,00	3,00	1,90				-182,40
COL 0.10 x 0.20 x 2.90 Son 3					**Subtotal**		**10,56**
Longitudinal	6,00	1,00	1,20			1/2	7,20
Longitudinal	6,00	1,00	3,00			1/2	18,00
Estribos	66,00	0,56	0,31			3/8	11,46
Descuento	-3,00	3,00	2,90				-26,10
COL 0.10 x 0.20 x 0.95 Son 16					**Subtotal**		**27,40**
Longitudinal	32,00	1,00	1,50			1/2	48,00
Estribos	144,00	0,56	0,31			3/8	25,00

Esquema



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP' LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA .	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Descuento	-16,00	3,00	0,95				-45,60
COL 0.10 x 0.20 x 2.65 Son 2					Subtotal		**8,54**
Longitudinal	4,00	1,00	1,20			1/2	4,80
Longitudinal	4,00	1,00	3,00			1/2	12,00
Estribos	44,00	0,56	0,31			3/8	7,64
Descuento	-2,00	3,00	2,65				-15,90
COL 0.12 x 0.24 x 3.45 Son 54					Subtotal		**604,91**
Longitudinal	216,00	1,56	1,20			5/8	404,35
Longitudinal	108,00	1,56	3,00			5/8	505,44
Estribos	1296,00	0,56	0,35			3/8	254,02
Descuento	-54,00	3,00	3,45				-558,90
COL 0.10 x 0.24 x 3.45 Son 2					**Subtotal**		**10,31**
Longitudinal	8,00	1,00	1,20			1/2	9,60
Longitudinal	4,00	1,00	3,00			1/2	12,00
Estribos	48,00	0,56	0,35			3/8	9,41
Descuento	-2,00	3,00	3,45				-20,70
COL 0.12 x 0.24 x 3.45 Son 19					**Subtotal**		**212,84**
Longitudinal	76,00	1,56	1,20			5/8	142,27
Longitudinal	38,00	1,56	3,00			5/8	177,84
Estribos	456,00	0,56	0,35			3/8	89,38
Descuento	-19,00	3,00	3,45				-196,65
COL 0.12x 0.28 x 3.45 Son 6					**Subtotal**		**96,25**
Longitudinal	24,00	1,00	1,20			1/2	28,80
Longitudinal	12,00	1,00	3,00			1/2	36,00
Estribos	144,00	0,56	0,39			3/8	31,45
COL 0.10x 0.46 x 3.78 Son 1					**Subtotal**		**22,28**
Longitudinal	3,00	1,00	1,20			1/2	3,60
Longitudinal	3,00	1,00	1,08			1/2	3,24
Longitudinal	3,00	1,00	3,18			1/2	9,54
Estribos	27,00	0,56	0,39			3/8	5 90

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Planos y Detalles

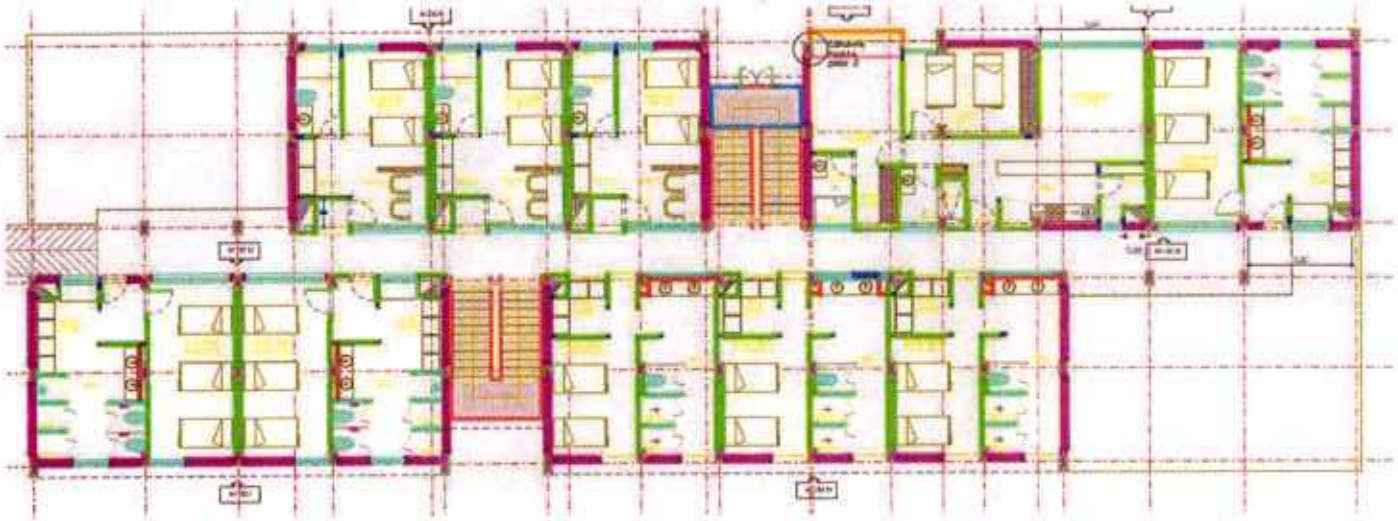


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Registro Fotográfico

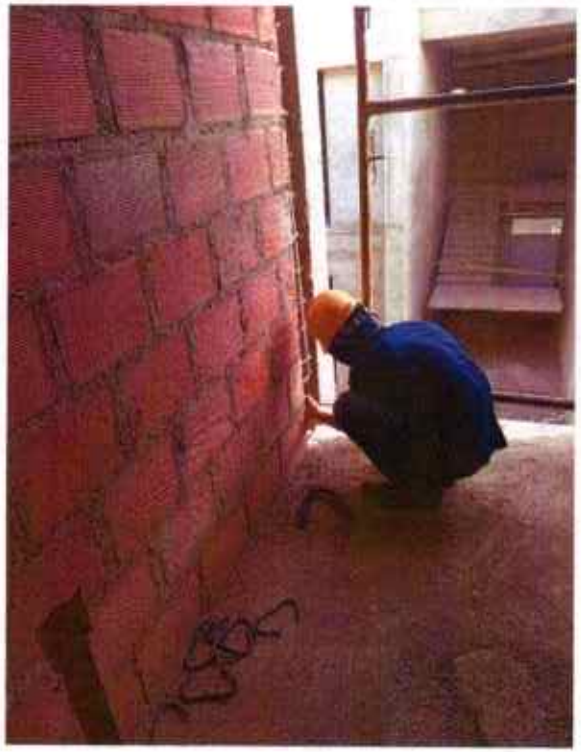

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
COL 0.10x 0.43 x 3.45 Son 1					Subtotal		**21,44**
Longitudinal	6,00	1,00	1,20			1/2	7,20
Longitudinal	3,00	1,00	3,00			1/2	9,00
Estribos	24,00	0,56	0,39			3/8	5,24
COL 0.24x 0.30 x 3.45 Son 2					Subtotal		**95,35**
Longitudinal	16,00	1,56	1,20			5/8	29,95
Longitudinal	8,00	1,56	3,00			5/8	37,44
Estribos	48,00	0,56	1,04			3/8	27,96
COL 0.24x 0.43 x 3.45 Son 3					**Subtotal**		**204,05**
Longitudinal	36,00	1,56	1,20			5/8	67,39
Longitudinal	18,00	1,56	3,00			5/8	84,24
Estribos	72,00	0,56	1,30			3/8	52,42
COL 0.24x 0.28 x 3.45 Son 3					**Subtotal**		**141,41**
Longitudinal	24,00	1,56	1,20			5/8	44,93
Longitudinal	12,00	1,56	3,00			5/8	56,16
Estribos	72,00	0,56	1,00			3/8	40,32

Esquema




Ítem:	3.2.4	Unidad:	kg	Magnitud total:	2.246,95

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Planos y Detalles

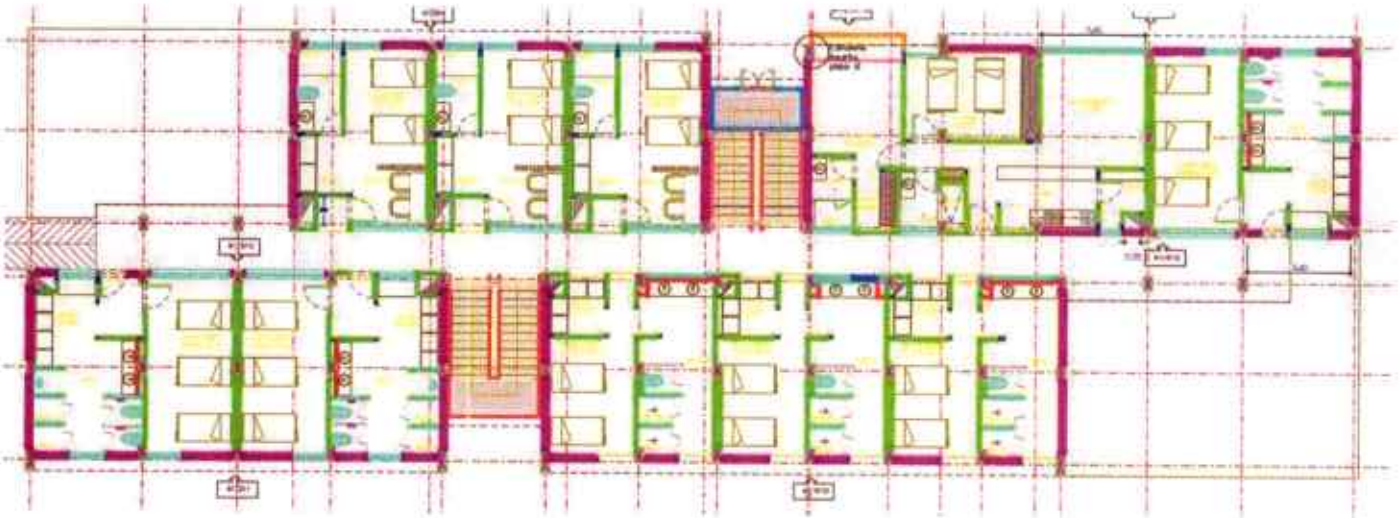

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(V EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA(ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C PRIMER PISO					Subtotal		**0,71**
DORMITORIO OFICIALES 1							
ESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
DORMITORIO OFICIALES 2							
ESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
OESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
OESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
NORESTE ZONA 2							
APARTAMENTO FISCAL							
ESTE							
Viga corona	1,00		2,05	0,25	0,10		0,05
ROPAS							
ESTE							
Viga corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
DORMITORIO PATRULLEROS 1							
OESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
BLOQUE C SEGUNDO PISO					**Subtotal**		**0,68**
DORMITORIO 4							
ESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
DORMITORIO 5							
ESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA.	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Planos y Detalles

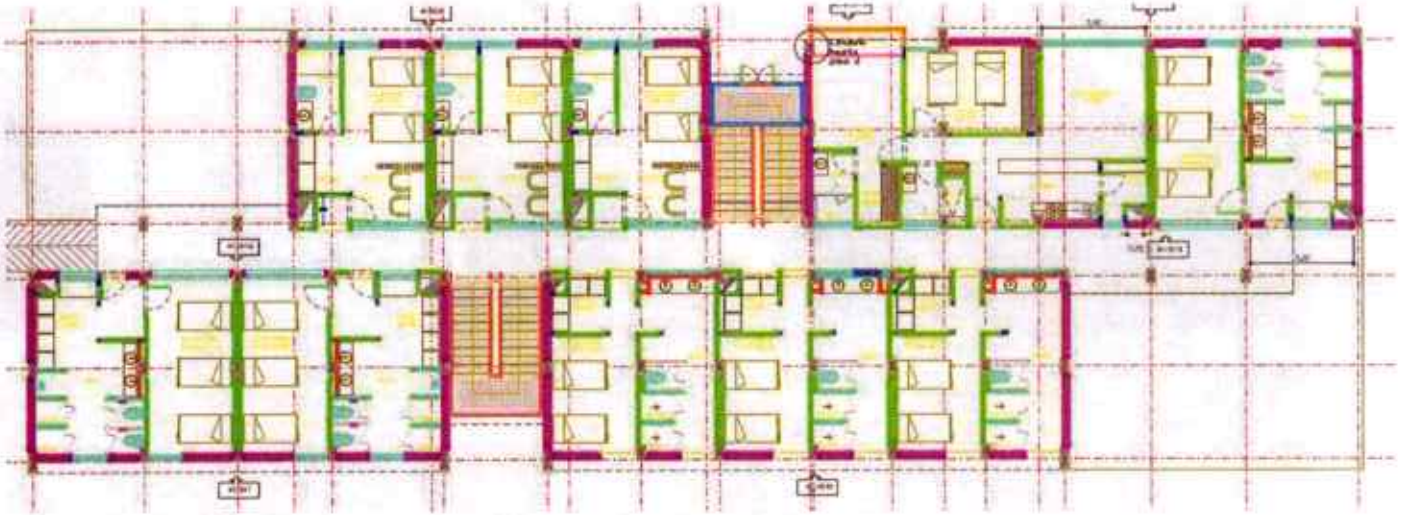

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECC / EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
OESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
Division Interna							
ESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
DORMITORIO PATRULLEROS 5							
OESTE							
Viga Corona	1,00		4,45	0,25	0,10		0,11
DORMITORIOS SUBOFICIALES 6							
Division interna closet							
Viga corona	1,00		0,88	0,25	0,10		0,02

Esquema



Ítem:	3.2.7	Unidad:	m³	Magnitud total:	1,39

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Planos y Detalles




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC(	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Registro Fotográfico

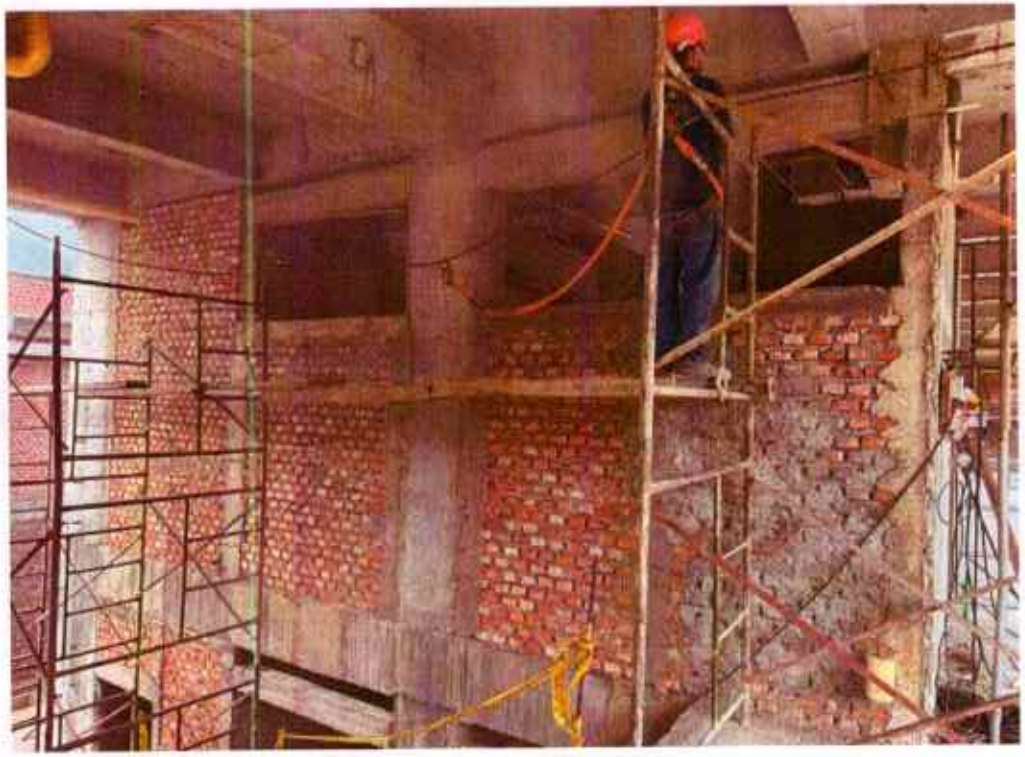

R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C PRIMER PISO						Subtotal		118,03
NOROESTE ZONA 1								
DORMITORIO OFICIALES 1								
Buitron		1,00		2,96	3,78			11,19
Columneta 2	CT1	-2,00		0,20	3,78			-1,51
Viga Corona		-1,00		2,56	0,25			-0,64
Vano cielo raso		-1,00		2,56	0,63			-1,61
Puerta 1		1,00		0,94	3,15			2,96
Puerta 1		-1,00		0,90	2,65			-2,39
Dintel superior		-1,00		0,94	0,50			-0,47
DORMITORIO OFICIALES 2								
SUR								
Buitron		1,00		2,96	3,78			11,19
Columneta 2	CT1	-2,00		0,20	3,78			-1,51
Viga Corona		-1,00		2,56	0,25			-0,64
Vano cielo raso		-1,00		2,56	0,63			-1,61
Puerta 1		1,00		0,94	3,15			2,96
Puerta 1		-1,00		0,90	2,65			-2,39
Dintel superior		-1,00		0,94	0,50			-0,47
DORMITORIO OFICIALES 3								
Buitron		1,00		2,96	3,78			11,19
Columneta 2	CT1	-2,00		0,20	3,78			-1,51
Viga Corona		-1,00		2,56	0,25			-0,64
Vano cielo raso		-1,00		2,56	0,63			-1,61
Puerta 1		1,00		0,94	3,15			2,96
Puerta 1		-1,00		0,90	2,65			-2,39
Dintel superior		-1,00		0,94	0,50			-0,47

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles

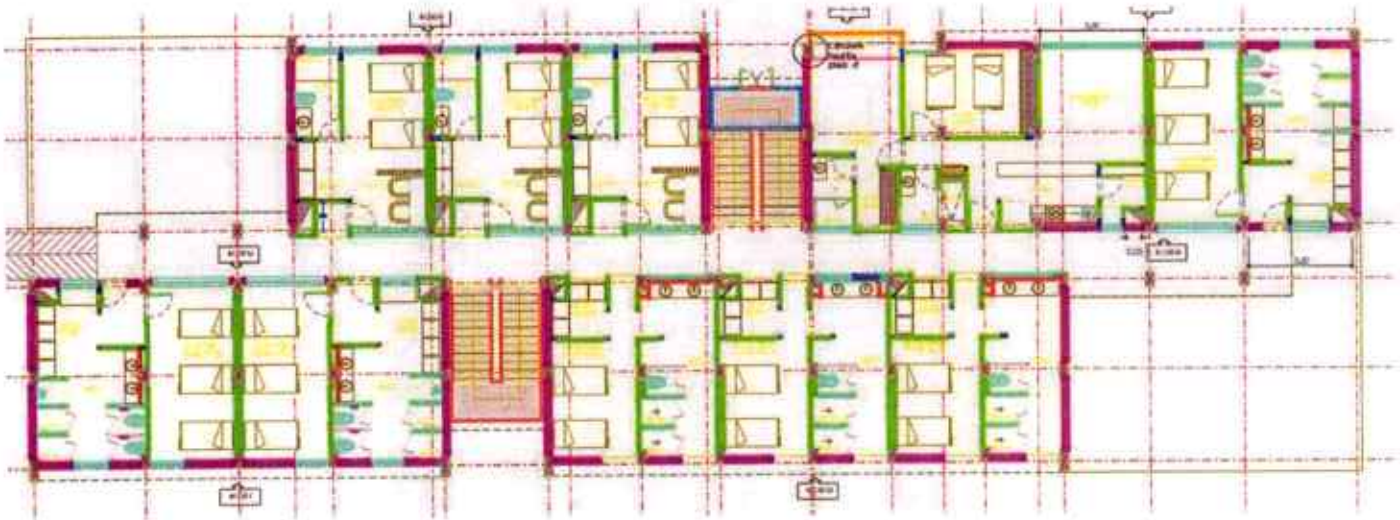


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico

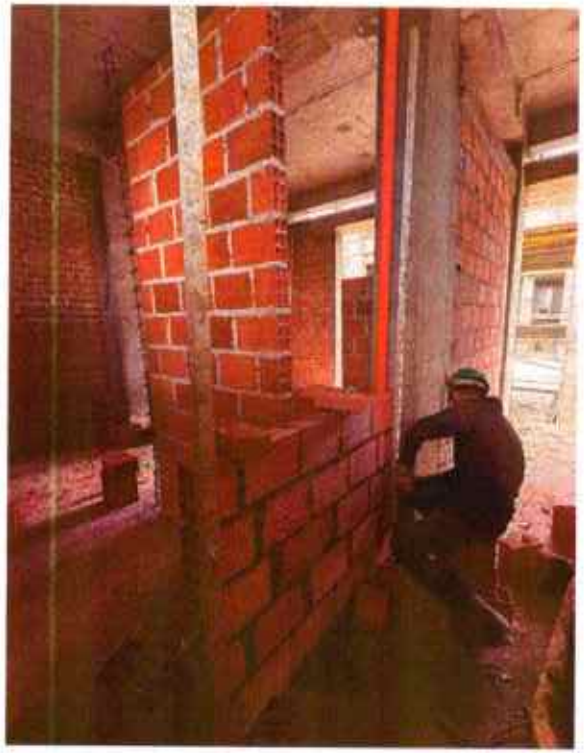

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA. ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
OESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Viga Corona		-1,00		4,45	0,25			-1,11
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45			-2,76
Vano cielo raso		-1,00		4,45	0,30			-1,34
NORESTE ZONA 2								
APARTAMENTO FISCAL								
ALCOBA AUXILIAR								
ESTE		1,00		2,45	3,45			8,45
Viga corona		-1,00		2,05	0,25			-0,51
Columneta 1	CT1	-2,00		0,20	3,45			-1,38
Vano cielo raso		-1,00		2,05	0,30			-0,62
COCINA								
ESTE		1,00		2,20	3,78			8,32
Viga corona		-1,00		0,81	0,25			-0,20
Columneta 2	CT2	-1,00		0,46	3,78			-1,74
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Puerta 4	P4	-1,00		0,70	2,60			-1,82
Dintel superior		-1,00		0,74	0,50			-0,37
Vano cielo raso		-1,00		1,54	0,63			-0,97
ROPAS								
ESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Viga corona		-1,00		4,45	0,25			-1,11
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45			-2,76
Vano cielo raso		-1,00		4,45	0,30			-1,34
SUR (buitron)		1,00		1,34	3,78			5,07
Viga corona		-1,00		0,94	0,25			-0,24
Columneta 2	CT2	-2,00		0,20	3,78			-1,51
Vano cielo raso		-1,00		0,94	0,63			-0,59

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles

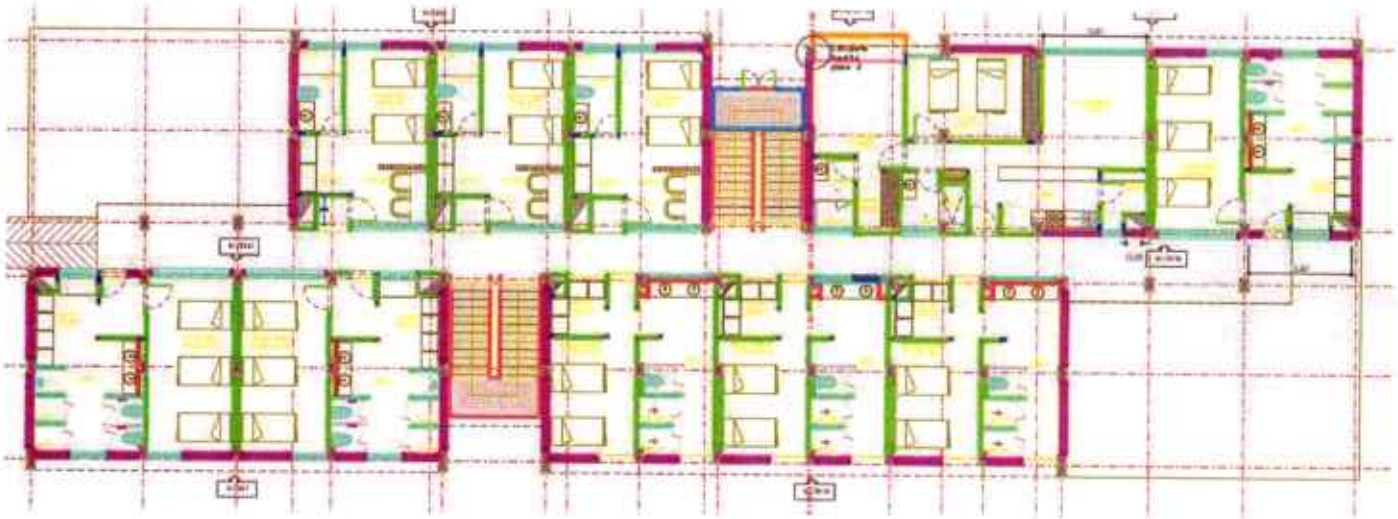

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP: EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAL ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECC . EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
NORTE		1,00		1,54	3,78			5,82
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Viga corona		-1,00		1,34	0,25			-0,34
Vano cielo raso		-1,00		1,34	0,63			-0,84
DORMITORIO PATRULLEROS 1								
ESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Viga Corona		-1,00		3,52	0,25			-0,88
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45			-2,76
Puerta P2		-1,00		0,90	2,65			-2,39
Dintel		-1,00		0,90	0,50			-0,45
Vano cielo raso		-1,00		3,52	0,30			-1,06
OESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Viga Corona		-1,00		4,45	0,25			-1,11
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45			-2,76
Vano cielo raso		-1,00		4,45	0,30			-1,34
Baño 1								
ESTE								
Division Interna		1,00		1,10	2,15			2,37
Columneta 4	CT1A	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Columneta 4	CT1A	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Viga Corona		-1,00		1,10	0,25			-0,28
Division Interna		1,00		1,10	2,15			2,37
Columneta 4	CT4	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Columneta 4	CT4	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Viga Corona		-1,00		1,10	0,25			-0,28

Esquema



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA...	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ...NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECU	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TI... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT... SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA-... ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO... EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Division Interna		1,00		1,04	2,15			2,24
Columneta 4	CT4	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Columneta 4	CT4	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Viga Corona		-1,00		1,04	0,25			-0,26
SUR								
Buitrón		1,00		1,37	3,78			5,18
Columneta 2	CT2	-2,00		0,20	3,78			-1,51
Viga Corona		-1,00		0,97	0,25			-0,24
Vano cielo raso		-1,00		0,97	0,30			-0,29
Division Interna		1,00		0,99	3,78			3,74
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Viga Corona		-1,00		0,79	0,25			-0,20
Vano cielo raso		-1,00		0,79	0,63			-0,50
OESTE								
Division Interna		1,00		1,38	2,15			2,97
Columneta 4	CT1	-2,00		0,20	1,90			-0,76
Viga Corona		-1,00		0,98	0,25			-0,25
Division Interna		1,00		1,68	3,78			6,35
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Columneta 5	CT5	-1,00		0,20	2,90			-0,58
Viga Corona		-1,00		1,47	0,25			-0,37
Vano cielo raso		-1,00		1,47	0,63			-0,93
Muro debajo Mesón		1,00		1,97	0,95			1,87

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m^2

Planos y Detalles

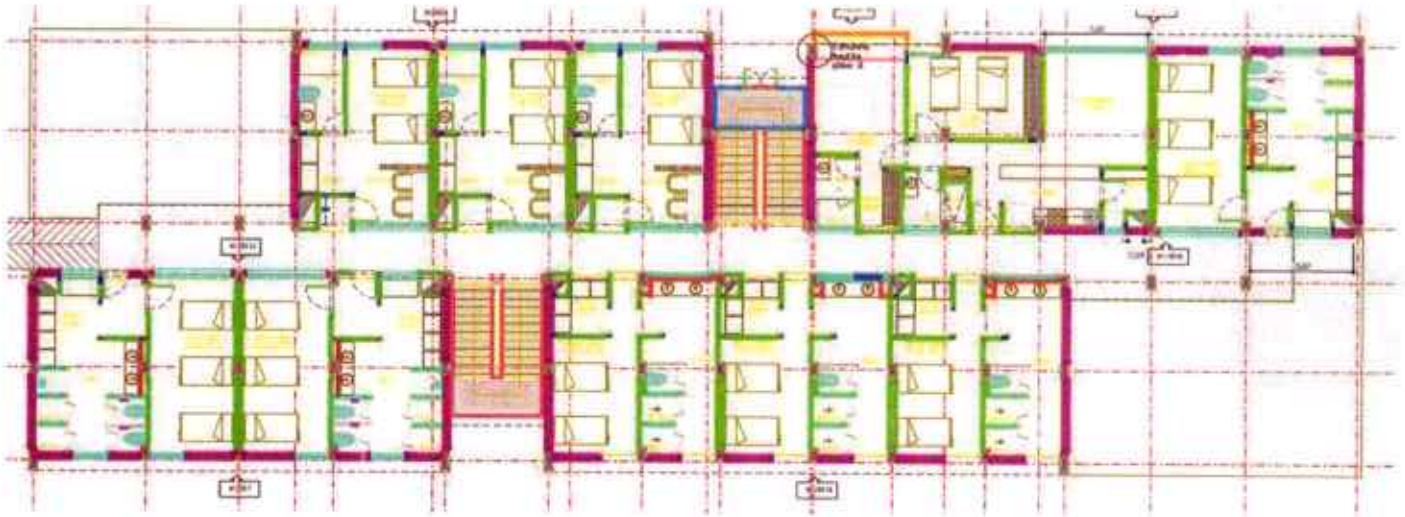

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA.	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECU.	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE r EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
DORMITORIOS SUBOFICIALES 1								
NORTE		1,00		2,45	3,45			8,45
Columneta 9	CT9	-2,00		0,20	2,00			-0,80
Ventana 7	VT7	-1,00		2,43	0,50			-1,22
Dintel Superior		-1,00		2,43	0,50			-1,22
Dintel Inferior		-1,00		2,43	0,15			-0,36
Muro bajo mesón		1,00		3,22	0,95			3,06
Columneta		-1,00		0,20	0,95			-0,19
SUROESTE ZONA 4								
DORMITORIO PATRULLEROS 2								
BAÑO								
NORTE		1,00		3,60	3,45			12,42
Columneta 3	CT3	-2,00		0,10	2,65			-0,53
Columneta 1	CT1	-1,00		0,20	3,45			-0,69
Columneta 6	CT6	-1,00		0,43	3,45			-1,48
Ventana 3	VT3	-1,00		1,30	0,50			-0,65
Dintel superior		-1,00		2,28	0,50			-1,14
Dintel infeior		-1,00		1,30	0,15			-0,20
Puerta	P1	-1,00		0,90	2,65			-2,39
Viga Corona		-1,00		0,51	0,25			-0,13
Vano cielo raso		-1,00		2,79	0,30			-0,84
Division Interna		1,00		0,97	3,78			3,67
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Viga Corona		-1,00		0,77	0,25			-0,19
Vano cielo raso		-1,00		0,77	0,63			-0,49

Esquema

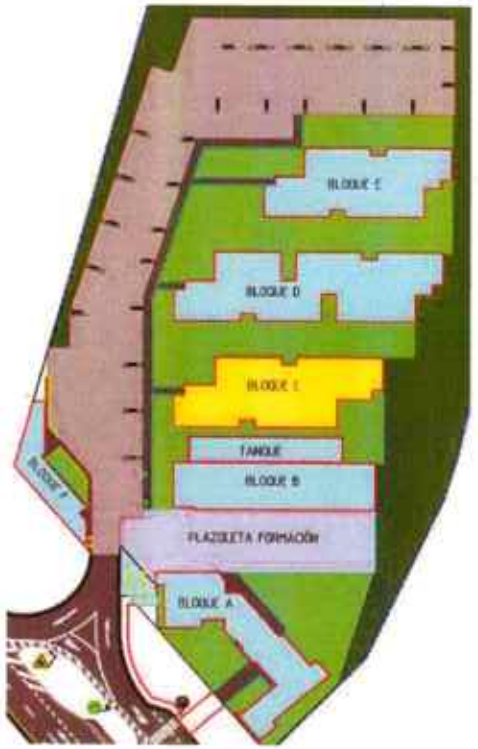


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT	ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE
LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA	ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO	EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles

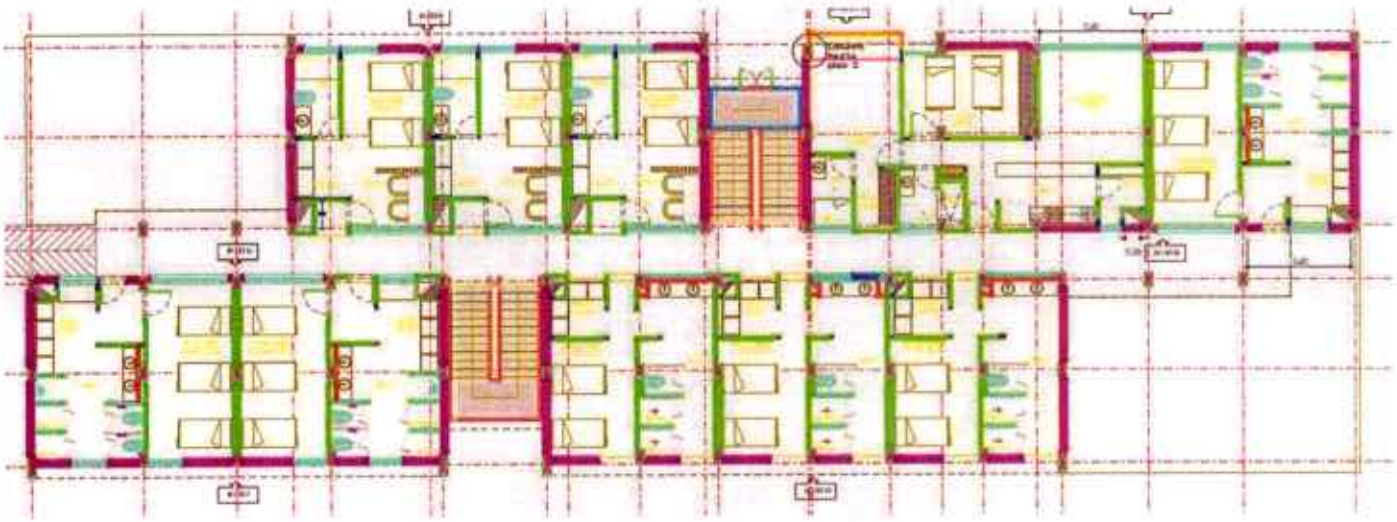

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m^2

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ;ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA. JNAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO . EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C SEGUNDO PISO						Subtotal		110,21
DORMITORIO 4								
ESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Viga Corona		-1,00		4,45	0,25	0,10		-1,11
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45	0,10		-2,76
Vano cielo raso		-1,00		4,45	0,30			-1,34
DORMITORIO 5								
ESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Viga Corona		-1,00		4,45	0,25			-1,11
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45			-2,76
Vano cielo raso		-1,00		4,45	0,30			-1,34
Buitron		1,00		2,96	3,78			11,19
Columneta 2	CT1	-2,00		0,20	3,78			-1,51
Viga Corona		-1,00		2,56	0,25			-0,64
Vano cielo raso		-1,00		2,56	0,63			-1,61
Puerta 1		1,00		0,94	3,15			2,96
Puerta 1		-1,00		0,94	2,65			-2,49
Dintel superior		-1,00		0,94	0,50			-0,47
OESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Viga Corona		-1,00		4,45	0,25			-1,11
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45			-2,76
Vano cielo raso		-1,00		4,45	0,30			-1,34

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles

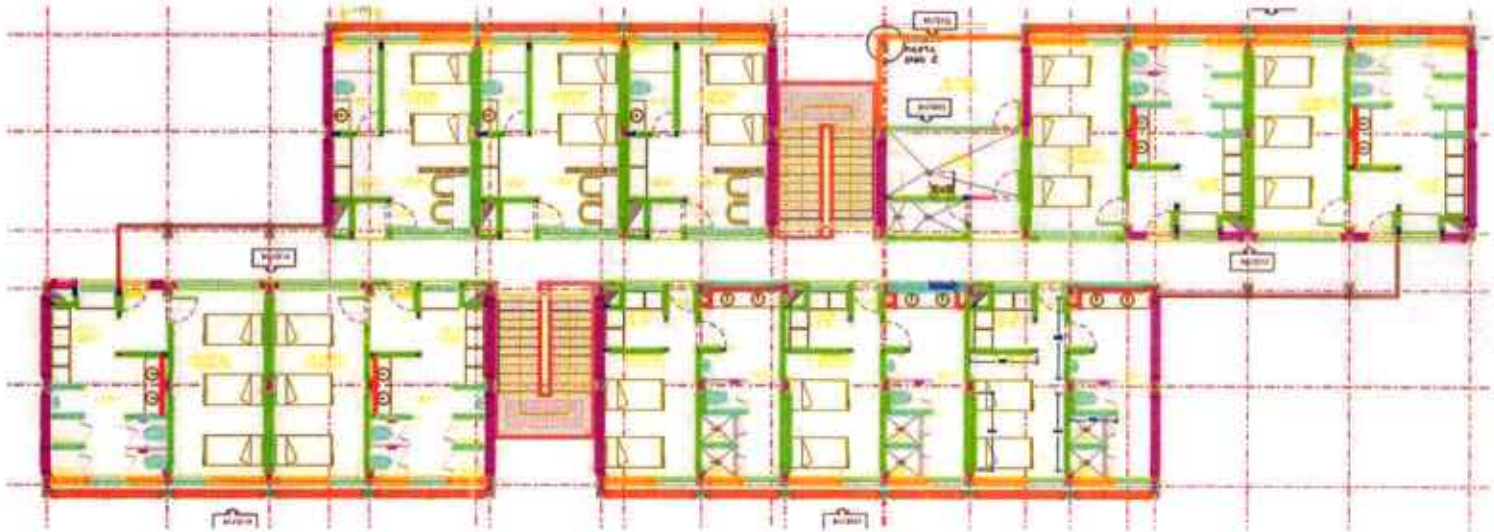

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA.	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT)NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO	'ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
DORMITORIO OFICIALES 6 Z5								
Buitron		1,00		2,96	3,78			11,19
Columneta 2	CT1	-2,00		0,20	3,78			-1,51
Viga Corona		-1,00		2,56	0,25			-0,64
Vano cielo raso		-1,00		2,56	0,63			-1,61
Puerta 1		1,00		0,94	3,15			2,96
Puerta 1		-1,00		0,94	2,65			-2,49
Dintel superior		-1,00		0,94	0,50			-0,47
OESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Viga Corona		-1,00		4,45	0,25			-1,11
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45			-2,76
Vano cielo raso		-1,00		4,45	0,30			-1,34
BAÑO 4								
ESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45			-2,76
Viga Corona		-1,00		4,45	0,25			-1,11
Vano cielo raso		-1,00		4,45	0,30			-1,34
OESTE								
Division Interna		1,00		1,38	2,15			2,97
Columneta 4	CT1	-2,00		0,20	1,90			-0,76
Viga Corona		-1,00		0,98	0,25			-0,25
Division Interna		1,00		1,68	3,78			6,35
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Columneta 5	CT5	-1,00		0,20	2,90			-0,58
Viga Corona		-1,00		1,47	0,25			-0,37
Vano cielo raso		-1,00		1,47	0,63			-0,93

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA. ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECC EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles

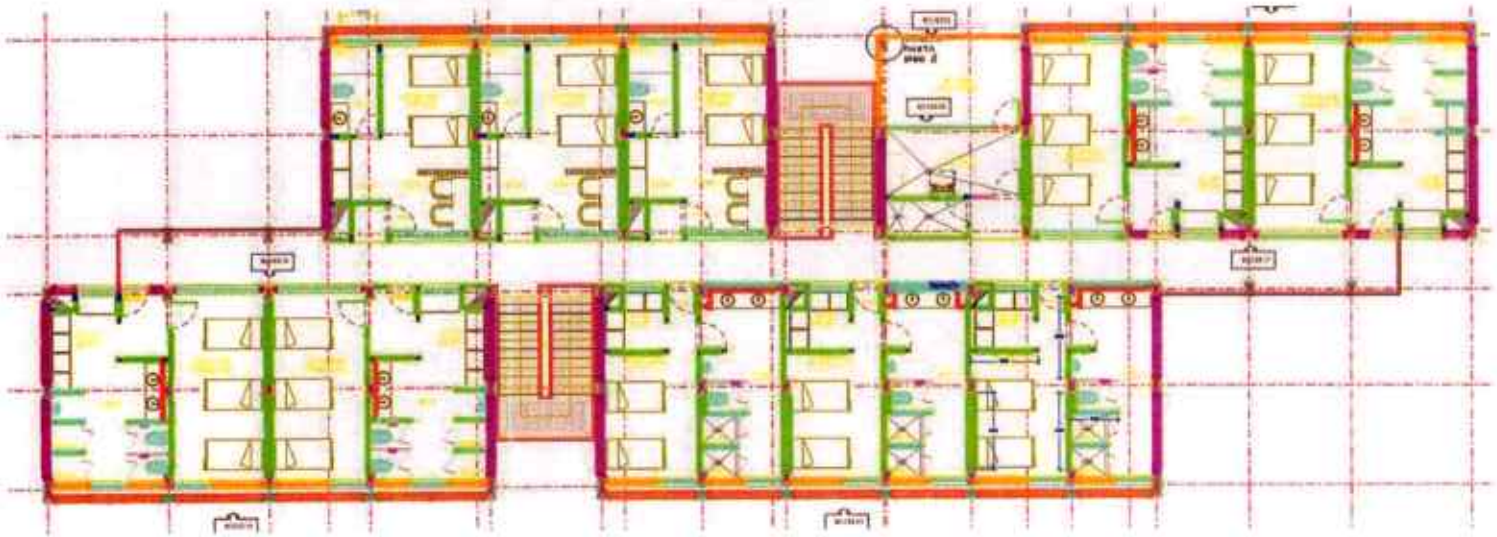


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico

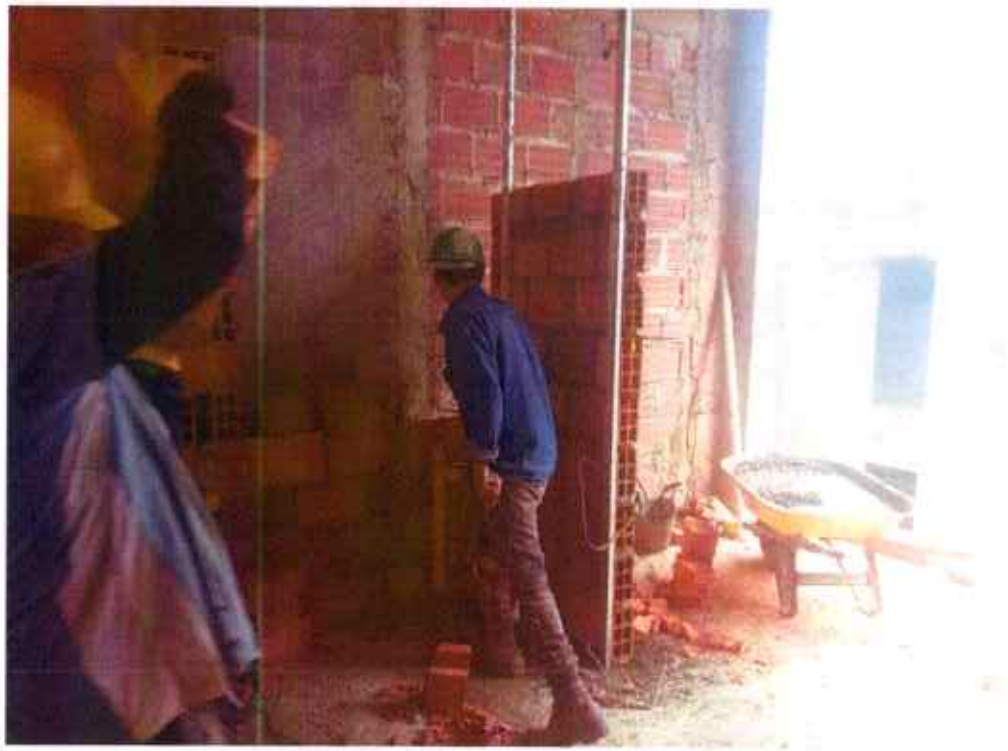

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA. ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC . EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item:	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Muro debajo Mesón		1,00		1,97	0,95			1,87
DORMITORIO PATRULLEROS 5								
OESTE		1,00		5,25	3,45			18,11
Viga Corona		-1,00		4,45	0,25			-1,11
Columneta 1	CT1	-4,00		0,20	3,45			-2,76
Vano cielo raso		-1,00		4,45	0,30			-1,34
BAÑO 5								
OESTE								
Division Interna		1,00		1,38	2,15			2,97
Columneta 4	CT1	-2,00		0,20	1,90			-0,76
Viga Corona		-1,00		0,98	0,25			-0,25
Division Interna		1,00		1,68	3,78			6,35
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Columneta 5	CT5	-1,00		0,20	2,90			-0,58
Viga Corona		-1,00		1,48	0,25			-0,37
Vano cielo raso		-1,00		1,48	0,63			-0,93
Muro debajo Mesón		1,00		1,97	0,95			1,87
DORMITORIOS SUBOFICIALES 6								
NORTE								
Muro bajo mesón		1,00		3,22	0,95			3,06
Columneta		-1,00		0,20	0,95			-0,19

Esquema




Ítem:	3.4.1	Unidad:	m³	Magnitud total:	228,24

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m^2

Planos y Detalles

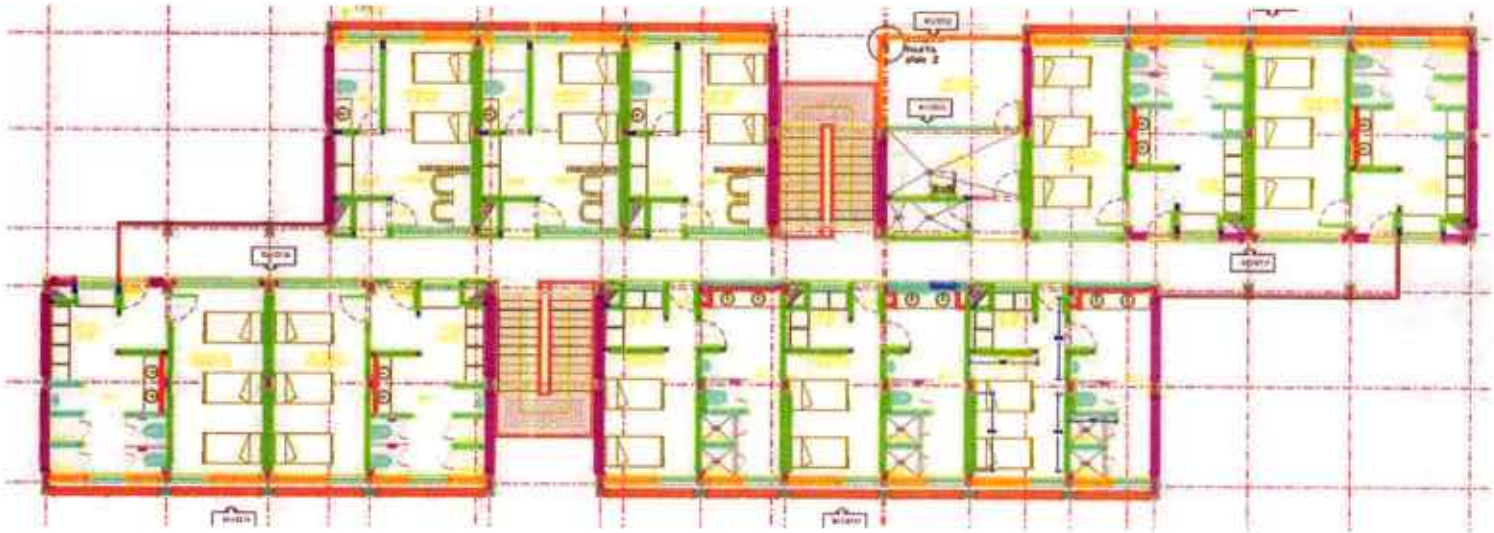

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría R/L. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
FACHADA								
BLOQUE C PRIMER PISO						Subtotal		98,96
ZONA 1								
C4-C6 (NORTE)	C4-C6 (CA)	1,00		4,50	3,45			15,53
Columneta 1	C4-C6 (CA)	-3,00		0,12	3,45			-1,24
Columneta 2	C4-C6 (CA)	-1,00		0,30	3,45			-1,04
Ventana V4	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,45			-0,54
Dintel superior	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Bloque Sup	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,25			-0,30
Dintel inferior	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Ventana V2	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	2,87			-3,44
Dintel superior	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Bloque Sup	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,25			-0,30
Poyo	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
C6-C9 (NORTE)	C6-C9 (CA)	1,00		4,50	3,45			15,53
Columneta 1	C6-C9 (CA)	-3,00		0,12	3,45			-1,24
Columneta 2	C6-C9 (CA)	-1,00		0,30	3,45			-1,04
Ventana V4	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,45			-0,54
Dintel superior	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Bloque Sup	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,25			-0,30
Dintel inferior	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Ventana V2	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	2,87			-3,44
Dintel superior	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Bloque Sup	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,25			-0,30
Poyo	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC(	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Planos y Detalles

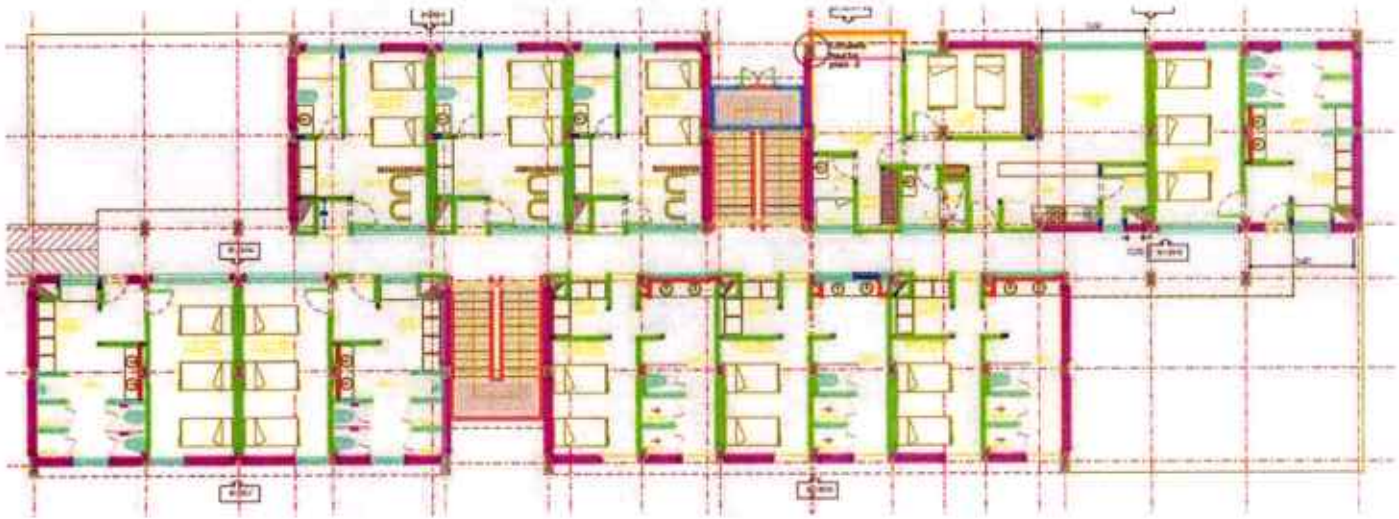


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item:	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Registro Fotográfico

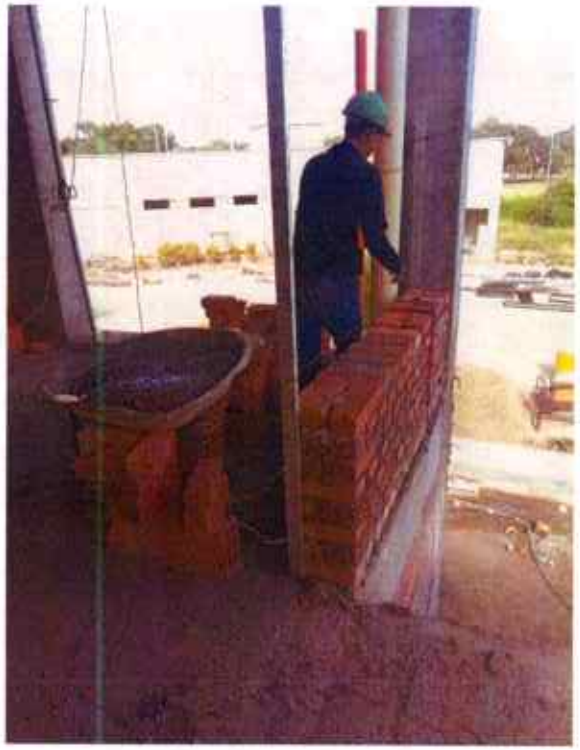

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA. EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR)NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC(SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
C9-C11 (NORTE)	C9-C11 (CA)	1,00		4,50	3,45			15,53
Columneta 1	C9-C11 (CA)	-3,00		0,12	3,45			-1,24
Columneta 2	C9-C11 (CA)	-1,00		0,30	3,45			-1,04
Ventana V4	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,45			-0,54
Dintel superior	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Bloque Sup	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,25			-0,30
Dintel inferior	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Ventana V2	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	2,87			-3,44
Dintel superior	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Bloque Sup	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,25			-0,30
Poyo	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
CA-CC (OESTE)	CA-CC (C4)	1,00		5,35	3,45			18,46
Columneta 1	CA-CC (C4)	-4,00		0,12	3,45			-1,66
ZONA 2								
C20-C21 (NORTE)	C20-C21 (CA)	1,00		3,00	3,45			10,35
Columneta 1	C20-C21 (CA)	-2,00		0,12	3,45			-0,83
Ventana V2	C20-C21 (CA)	-1,00		1,20	2,90			-3,48
Dintel superior	C20-C21 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Bloque Sup	C20-C21 (CA)	-1,00		1,20	0,25			-0,30
Poyo	C20-C21 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
C21-C22 (NORTE)	C21-C22 (CA)	1,00		3,60	3,45			12,42
Columneta 1	C21-C22 (CA)	-4,00		0,12	3,45			-1,66
Ventana V1	C21-C22 (CA)	-1,00		1,20	2,90			-3,48
Dintel superior	C21-C22 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Bloque Sup	C21-C22 (CA)	-1,00		1,20	0,25			-0,30
Poyo	C21-C22 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18

Esquema

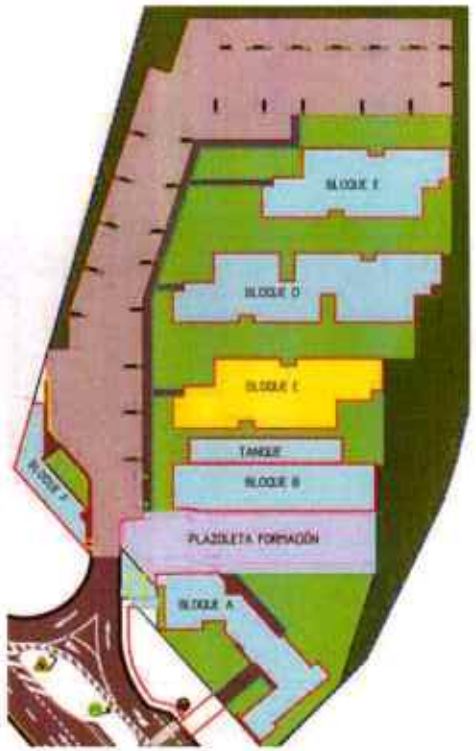

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO N/	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECU	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m^2

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
CA-CC (OESTE)	CA-CC (C13)	1,00		5,35	3,45			18,46
Columneta 1	CA-CC (C13)	-4,00		0,12	3,45			-1,66
CA-CC (ESTE)	CA-CC (C22)	1,00		5,35	3,45			18,46
Columneta 1	CA-CC (C22)	-4,00		0,12	3,45			-1,66
C20-C21 (SUR)	C20-C21 (CC)	1,00		3,00	3,45			10,35
Vacio	C20-C21 (CC)	-1,00		2,76	0,30			-0,83
Ventana V10	C20-C21 (CC)	-1,00		2,60	0,50			-1,30
Dintel superior	C20-C21 (CC)	-1,00		2,60	0,50			-1,30
Dintel inferior	C20-C21 (CC)	-1,00		2,60	0,15			-0,39
Columneta 1	C20-C21 (CC)	-2,00		0,12	3,45			-0,83
C21-C22 (SUR)	C21-C22 (CC)	1,00		3,60	3,45			12,42
Vacio	C21-C22 (CC)	-1,00		0,90	0,30			-0,27
Puerta P1	C21-C22 (CC)	-1,00		0,90	2,60			-2,34
Dintel superior	C21-C22 (CC)	-1,00		0,90	0,50			-0,45
Ventana V9	C21-C22 (CC)	-1,00		1,30	0,50			-0,65
Dintel superior	C21-C22 (CC)	-1,00		1,30	0,15			-0,20
Bloque Sup	C21-C22 (CC)	-1,00		1,30	0,25			-0,33
Dintel inferior	C21-C22 (CC)	-1,00		1,30	0,15			-0,20
Columneta 1	C21-C22 (CC)	-2,00		0,12	3,45			-0,83
Columneta 2	C21-C22 (CC)	-1,00		0,10	3,45			-0,35
Columneta 3	C21-C22 (CC)	-1,00		0,43	3,45			-1,48
C18-C20 (SUR)	C18-C20 (CC)	1,00		0,69	3,45			2,38
Columneta	C18-C20 (CC)	-1,00		0,20	3,45			-0,69

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC(	ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m^2

Planos y Detalles

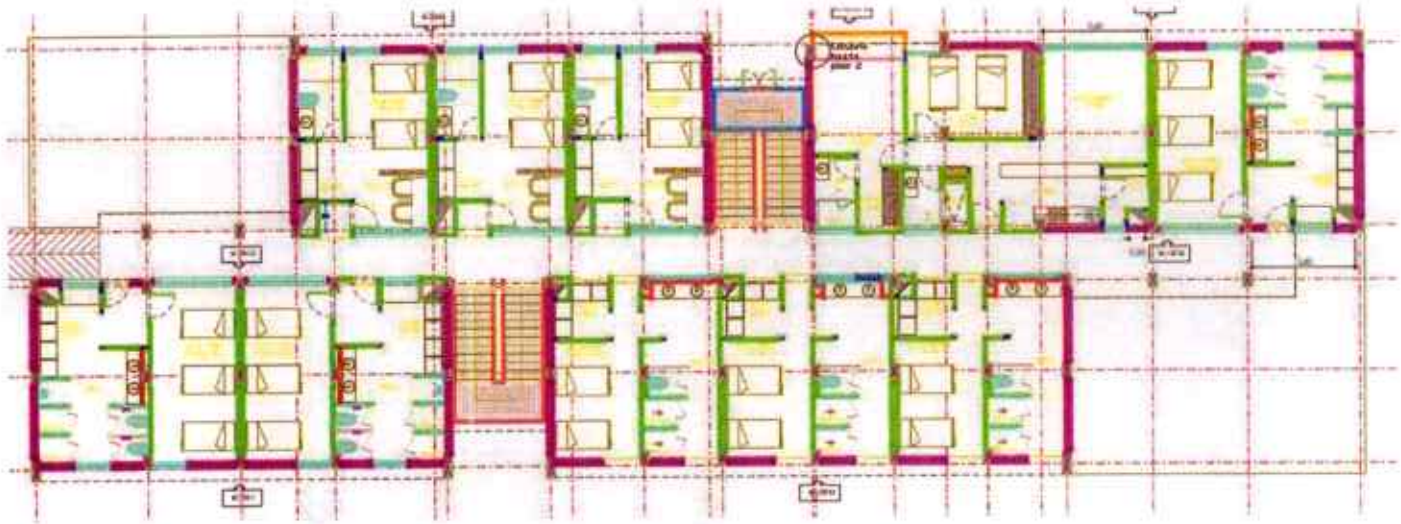


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m^2

Registro Fotográfico

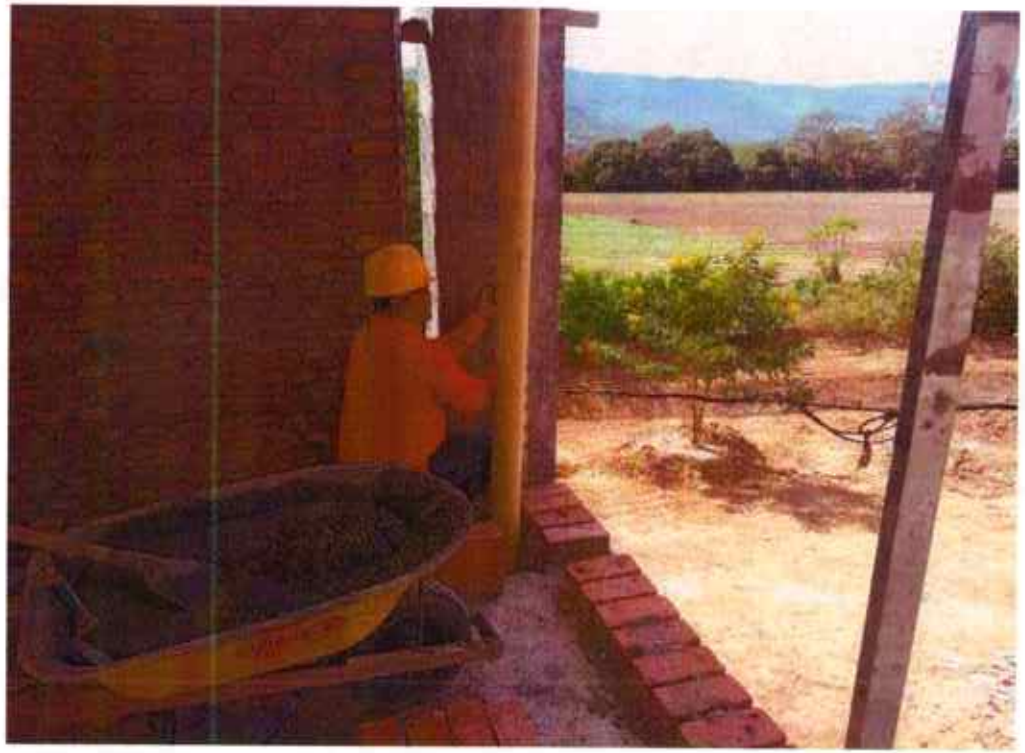

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT °ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA. ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECL . EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C SEGUNDO PISO								
ZONA 1						Subtotal		76,84
C4-C6 (NORTE)	C4-C6 (CA)	1,00		4,50	3,45			15,53
Vacio	C4-C6 (CA)	-1,00		4,50	0,15			-0,68
Columneta 1	C4-C6 (CA)	-3,00		0,12	3,30	0,24		-1,19
Columneta 2	C4-C6 (CA)	-1,00		0,28	3,30	0,24		-0,92
Ventana V4	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,45			-0,54
Dintel inferior	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,15	0,24		-0,18
Ventana V2	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	2,90			-3,48
Poyo	C4-C6 (CA)	-1,00		1,20	0,15	0,12		-0,18
Placa dintel	C4-C6 (CA)	-1,00		3,86	0,25	0,24		-0,97
C6-C9 (NORTE)	C6-C9 (CA)	1,00		4,50	3,45			15,53
Vacio	C6-C9 (CA)	-1,00		4,50	0,15			-0,68
Columneta 1	C6-C9 (CA)	-3,00		0,12	3,30	0,24		-1,19
Columneta 2	C6-C9 (CA)	-1,00		0,28	3,30	0,24		-0,92
Ventana V4	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,45			-0,54
Dintel inferior	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,15	0,24		-0,18
Ventana V2	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	2,90			-3,48
Poyo	C6-C9 (CA)	-1,00		1,20	0,15	0,12		-0,18
Placa dintel	C6-C9 (CA)	-1,00		3,86	0,25	0,24		-0,97
C9-C11 (NORTE)	C9-C11 (CA)	1,00		4,50	3,45			15,53
Vacio	C9-C11 (CA)	-1,00		4,50	0,15			-0,68
Columneta 1	C9-C11 (CA)	-3,00		0,12	3,30	0,24		-1,19
Columneta 2	C9-C11 (CA)	-1,00		0,28	3,30	0,24		-0,92
Ventana V4	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,45			-0,54

Esquema

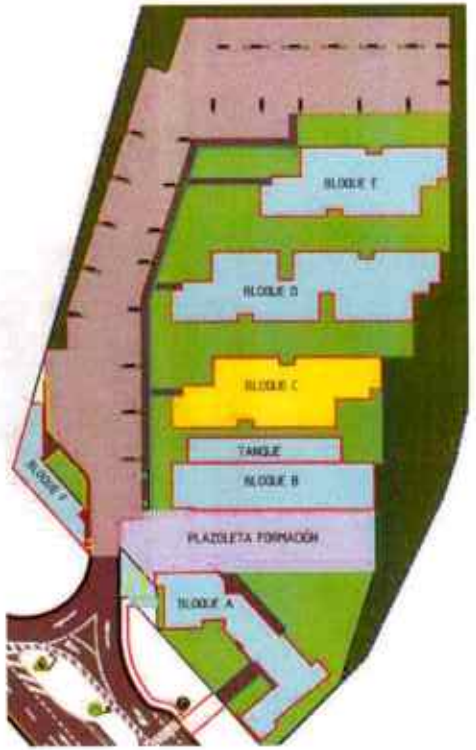


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Planos y Detalles

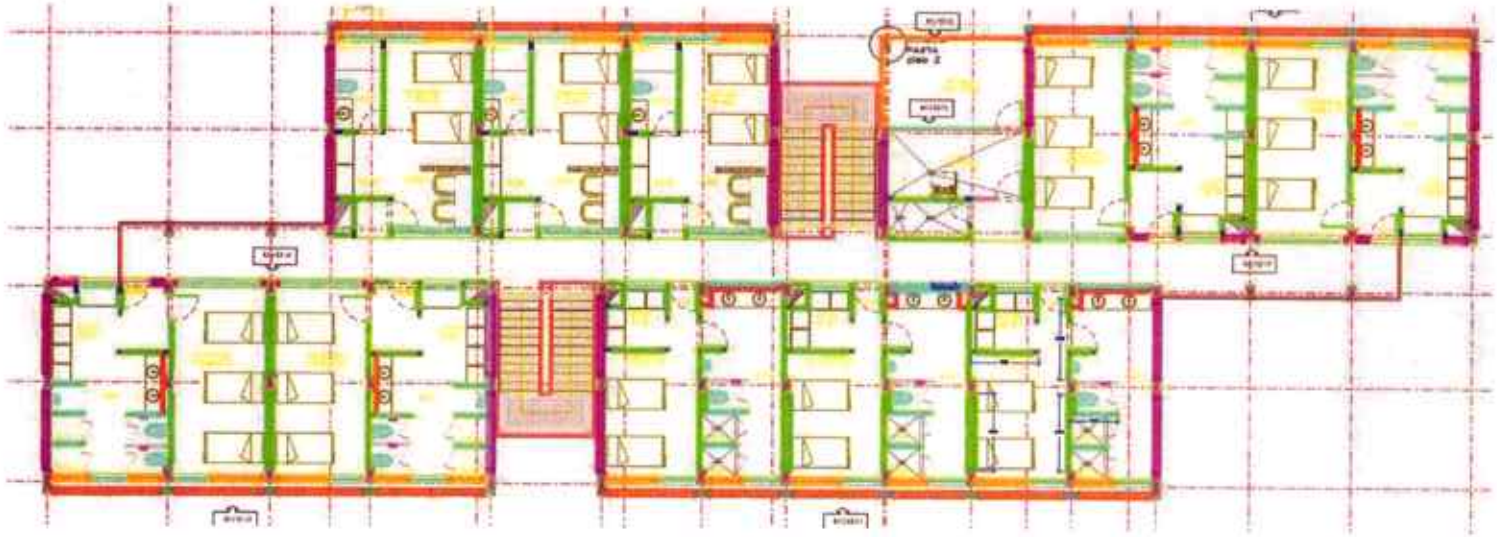


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT °ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA-. ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECU . EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Registro Fotográfico

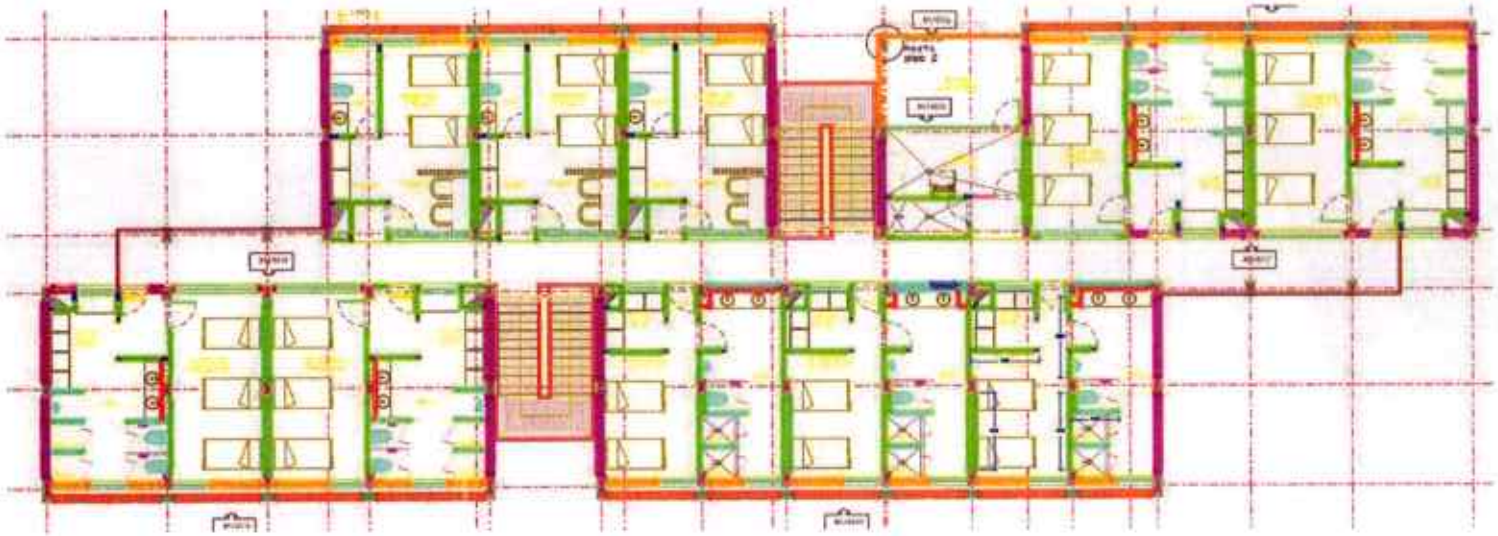

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Dintel inferior	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Ventana V2	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	2,90			-3,48
Poyo	C9-C11 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Placa dintel	C9-C11 (CA)	-1,00		3,86	0,25			-0,97
CA-CC (OESTE)	CA-CC (C4)	1,00		5,35	3,45			18,46
Columneta 1	CA-CC (C4)	-4,00		0,12	3,45			-1,66
ZONA 2								
C20-C21 (NORTE)	C20-C21 (CA)	1,00		3,00	3,45			10,35
Vacio	C20-C21 (CA)	-1,00		3,00	0,15			-0,45
Columneta 1	C20-C21 (CA)	-2,00		0,12	3,30			-0,79
Ventana V2	C20-C21 (CA)	-1,00		1,20	2,90			-3,48
Poyo	C20-C21 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Placa dintel	C20-C21 (CA)	-1,00		2,76	0,25			-0,69
C21-C22 (NORTE)	C21-C22 (CA)	1,00		3,60	3,45			12,42
Vacio	C21-C22 (CA)	-1,00		3,60	0,15			-0,54
Columneta 1	C21-C22 (CA)	-4,00		0,12	3,30			-1,58
Ventana V1	C21-C22 (CA)	-1,00		1,20	2,90			-3,48
Poyo	C21-C22 (CA)	-1,00		1,20	0,15			-0,18
Placa dintel	C21-C22 (CA)	-1,00		3,12	0,25			-0,78
CA-CC (ESTE)	CA-CC (C22)	1,00		5,35	3,45			18,46
Columneta 1	CA-CC (C22)	-4,00		0,12	3,45			-1,66

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE
LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA	ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC	EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Planos y Detalles

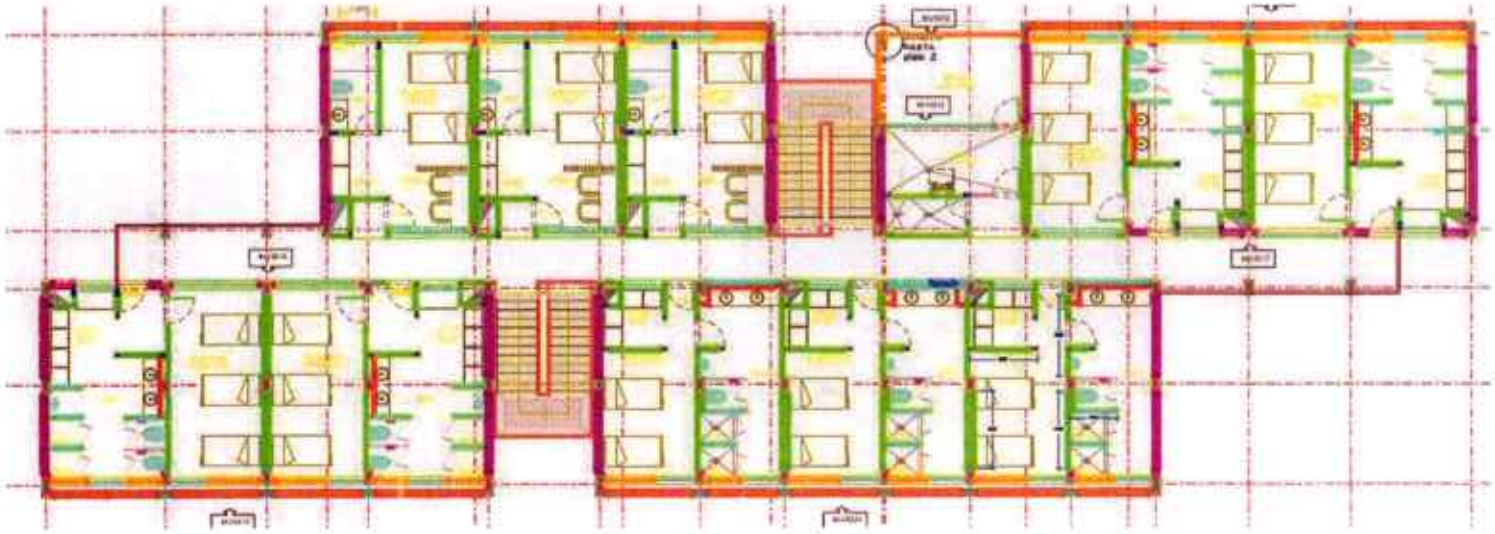


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Registro Fotográfico

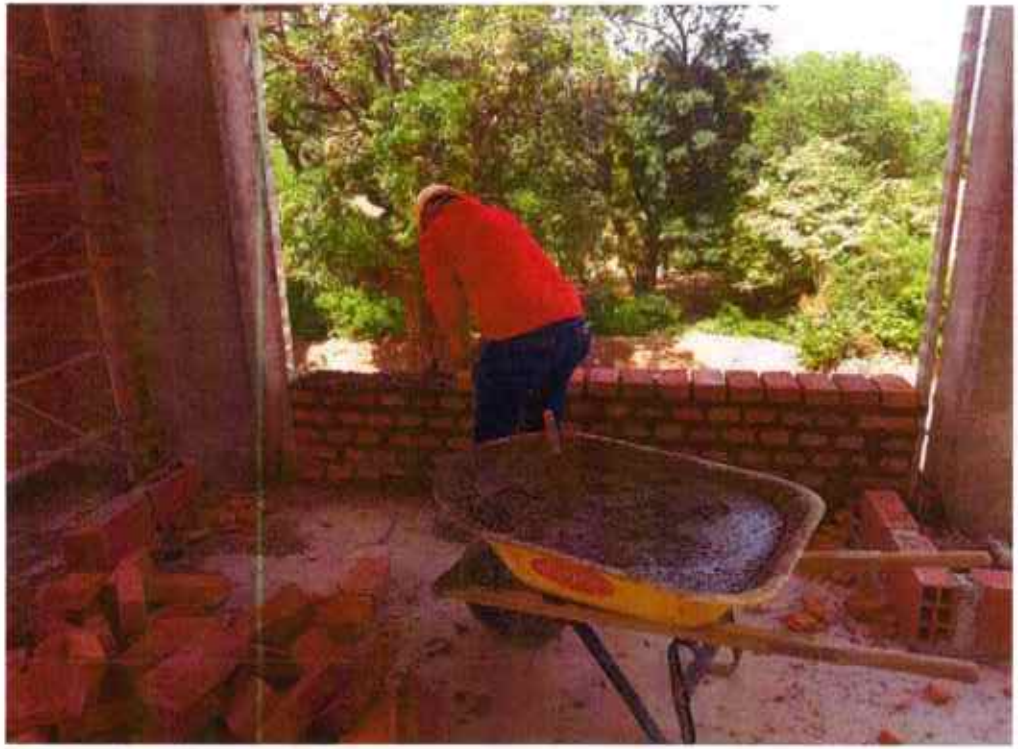

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TI EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA..)NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECL EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
C20-C21 (SUR)	C20-C21 (CC)	1,00		3,00	3,45			10,35
Vacio	C20-C21 (CC)	-1,00		2,76	0,30			-0,83
Columneta 1	C20-C21 (CC)	-2,00		0,12	3,45			-0,83
Ventana 10	C20-C21 (CC)	-1,00		2,60	0,50			-1,30
Dintel superior	C20-C21 (CC)	-1,00		2,60	0,50			-1,30
Dintel inferior	C20-C21 (CC)	-1,00		2,60	0,15			-0,39
C21-C22 (SUR)	C21-C22 (CC)	1,00		3,60	3,45			12,42
Vacio	C21-C22 (CC)	-1,00		0,90	0,30			-0,27
Columenta 1	C21-C22 (CC)	-2,00		0,12	3,45			-0,83
Columenta 2	C21-C22 (CC)	-1,00		0,10	3,45			-0,35
Columenta 3	C21-C22 (CC)	-1,00		0,43	3,45			-1,48
Puerta 1	C21-C22 (CC)	-1,00		0,90	2,65			-2,39
Dintel superior	C21-C22 (CC)	-1,00		0,90	0,50			-0,45
Ventana 9	C21-C22 (CC)	-1,00		1,30	0,50			-0,65
Dintel superior	C21-C22 (CC)	-1,00		1,30	0,15			-0,20
Bloque Sup	C21-C22 (CC)	-1,00		1,30	0,65			-0,85
Dintel inferior	C21-C22 (CC)	-1,00		1,30	0,15			-0,20

Esquema

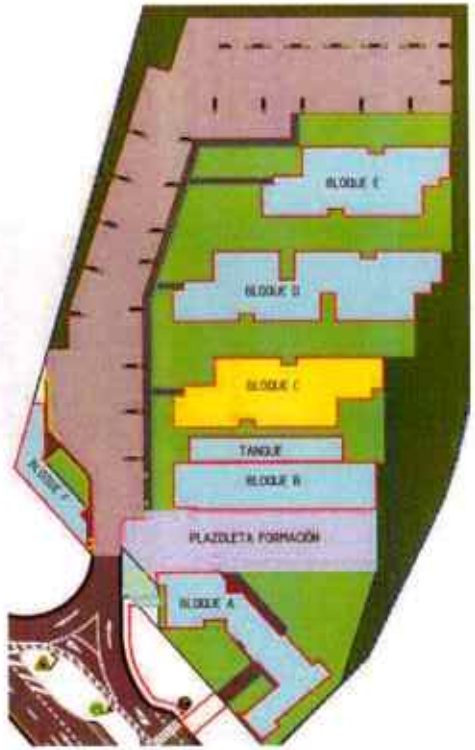


Ítem:	3.4.2	Unidad:	m²	Magnitud total:	175,80

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Planos y Detalles

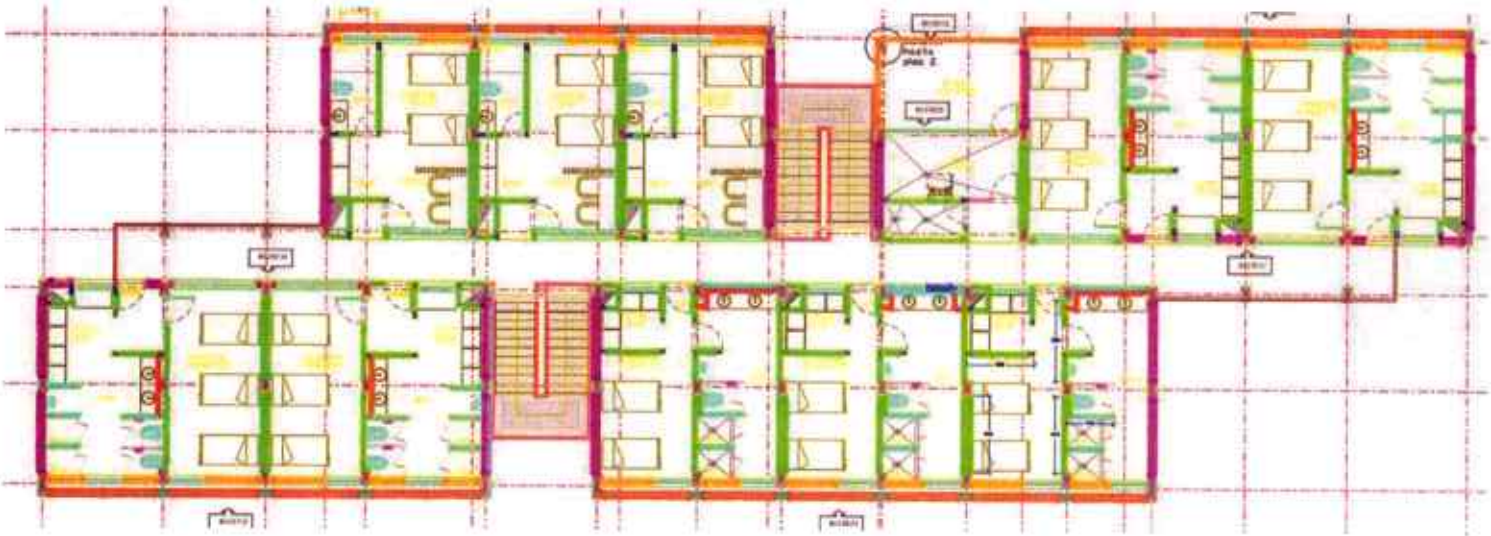

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA , ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.3	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
DINTELES INTERNO								
BLOQUE C PRIMER PISO						**Subtotal**		**7,80**
NOROESTE ZONA 1								
DORMITORIO OFICIALES 1								
SUR								
Dintel Inferior		1,00		2,60	0,15	0,10		2,60
DORMITORIO OFICIALES 2								
SUR								
Dintel Inferior		1,00		2,60	0,15	0,10		2,60
DORMITORIO OFICIALES 3								
SUR								
Dintel Inferior		1,00		2,60	0,15	0,10		2,60
FACHADA								
BLOQUE C PRIMER PISO						**Subtotal**		**12,00**
ZONA 1								
C4-C6 (NORTE)	C4-C6 (CA)							
Dintel superior	C4-C6 (CA)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20
Dintel superior	C4-C6 (CA)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20
C6-C9 (NORTE)	C6-C9 (CA)							
Dintel superior	C6-C9 (CA)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20
Dintel superior	C6-C9 (CA)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20
C9-C11 (NORTE)	C9-C11 (CA)							
Dintel superior	C9-C11 (CA)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20
Dintel superior	C9-C11 (CA)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20
Dintel superior	C18-C20 (CA)	1,00		3,60	0,15	0,12		3,60
Dintel superior	C20-C21 (CA)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20
Item:	3.4.3		**Unidad:**	m		**Magnitud total:**		19,80

Esquema

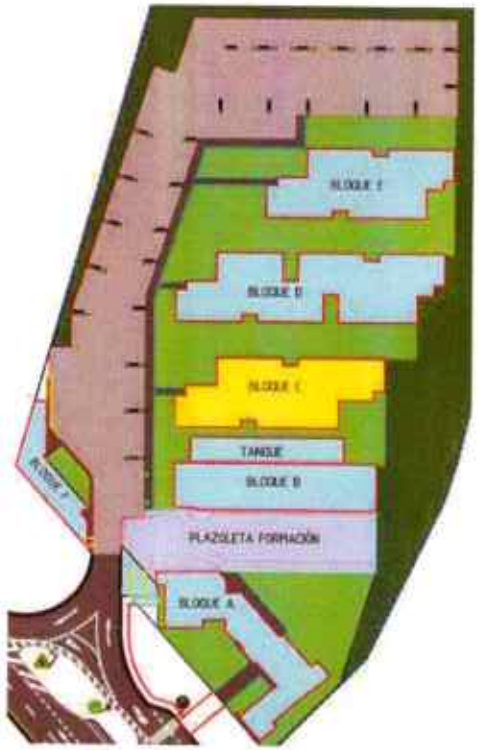


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP! LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA.	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECL	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.3	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Planos y Detalles

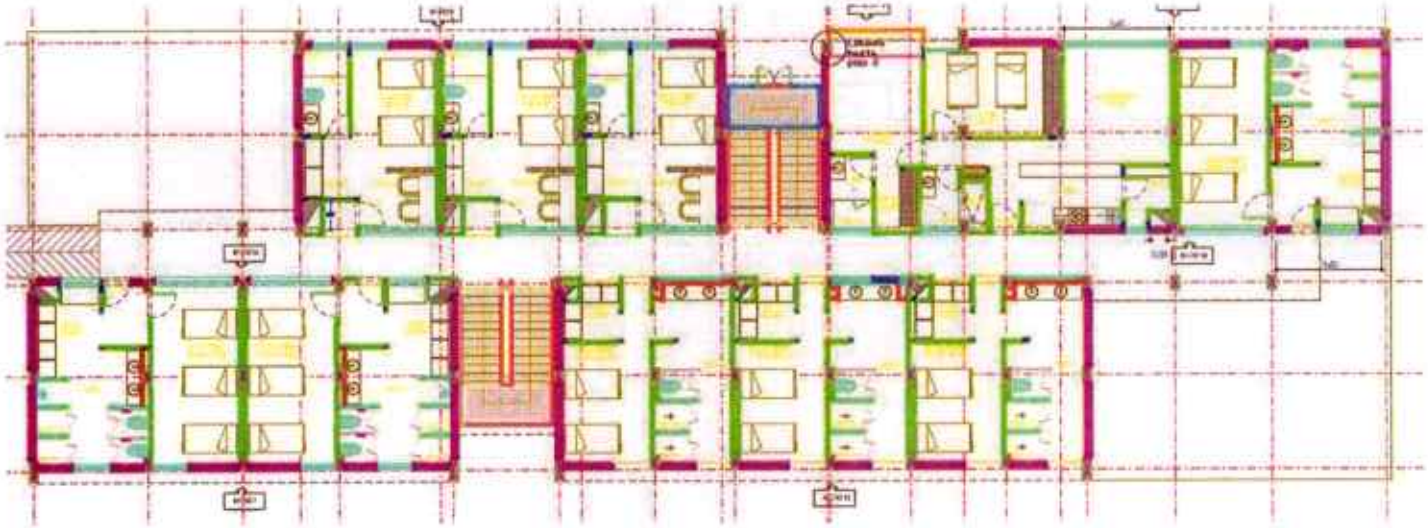

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.3	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO N. ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSEC EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
COLUMNETA								
BLOQUE C PRIMER PISO						Subtotal		**139,86**
NOROESTE ZONA 1								
DORMITORIO OFICIALES 1								
ESTE								
Columneta 1	CT1	4,00		3,45	0,20	0,10		13,80
SUR								
Columneta 9	CT9	1,00		2,00	0,20	0,10		2,00
OESTE								
Columneta 2	CT2	4,00		3,78	0,20	0,10		15,12
DORMITORIO OFICIALES 2	Z1							
ESTE								
Columneta	CT1	4,00		3,15	0,20	0,10		12,60
SUR								
Columneta 9	CT9	1,00		2,00	0,20	0,10		2,00
OESTE								
Columneta 2	CT2	4,00		3,78	0,20	0,10		15,12
OESTE								
Columneta 1	CT1	4,00		3,45	0,20	0,10		13,80
DORMITORIO 3								
Columneta 9	CT9	1,00		2,00	0,20	0,10		2,00
OESTE								
Columneta 2	CT2	4,00		3,78	0,20	0,10		15,12
OESTE								
Columneta 1	CT1	4,00		3,45	0,20	0,10		13,80
NORESTE ZONA 2								
APARTAMENTO FISCAL								
ESTE								
Columneta 1	CT1	2,00		3,45	0,20	0,10		6,90

Esquema

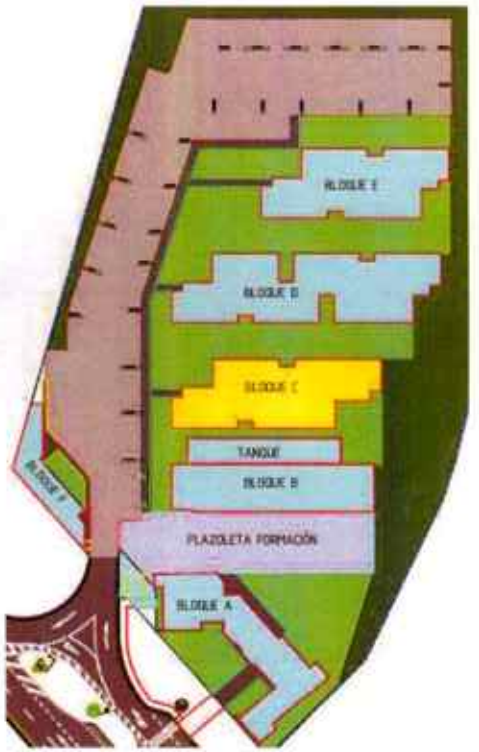


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	m

Planos y Detalles

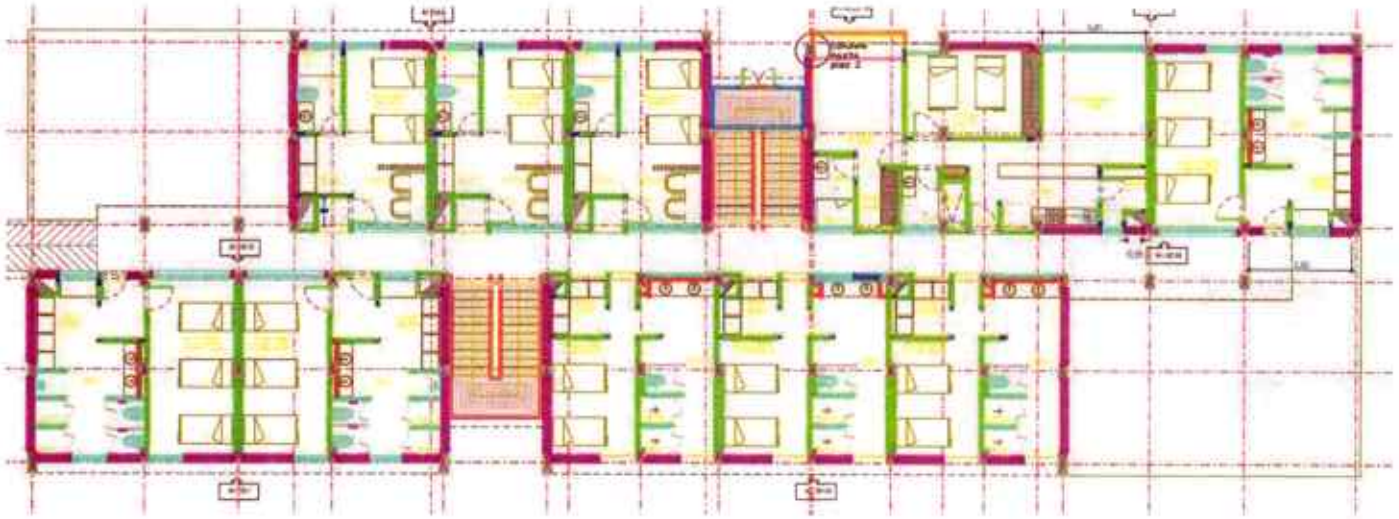


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item:	Descripción	Unidad
3.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Registro Fotográfico

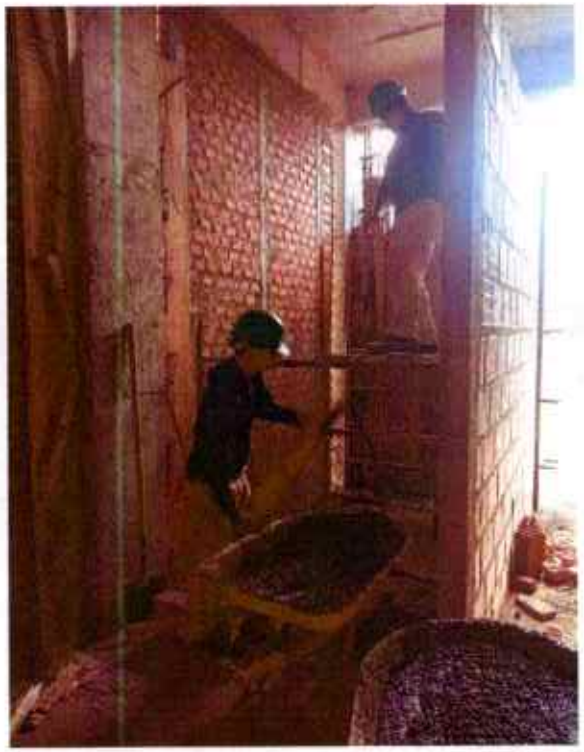

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa, incluye acero de refuerzo.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
ROPAS								
ESTE								
Columneta 1	CT1	4,00		3,45	0,20	0,10		13,80
DORMITORIO PATRULLEROS 1								
OESTE								
Columneta 1	CT1	4,00		3,45	0,20	0,10		13,80
BLOQUE C SEGUNDO PISO						Subtotal		**55,20**
NOROESTE ZONA 5								
ESTE								
Columneta 1	CT1	4,00		3,45	0,20	0,10		13,80
DORMITORIO 5								
ESTE								
Columneta 1	CT1	4,00		3,45	0,20	0,10		13,80
OESTE								
Columneta 1	CT1	4,00		3,45	0,20	0,10		13,80
DORMITORIO 6								
OESTE								
Columneta 1	CT1	4,00		3,45	0,20	0,10		13,80
FACHADA								
BLOQUE C PRIMER PISO						**Subtotal**		**17,25**
C4-C6 (NORTE)	C4-C6 (CA)							
Columneta 1	C4-C6 (CA)	3,00		3,45	0,12	0,24		10,35
ZONA 2								
C20-C21 (NORTE)	C20-C21 (CA)							
Columneta 1	C20-C21 (CA)	2,00		3,45	0,12	0,24		6,90
BLOQUE C SEGUNDO PISO						**Subtotal**		**9,90**
Columneta 1	C6-C9 (CA)	3,00		3,30	0,12	0,24		9,90
Ítem:	3.4.7	**Unidad:**		m		**Magnitud total:**		222,21

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA. ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO. / EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Planos y Detalles

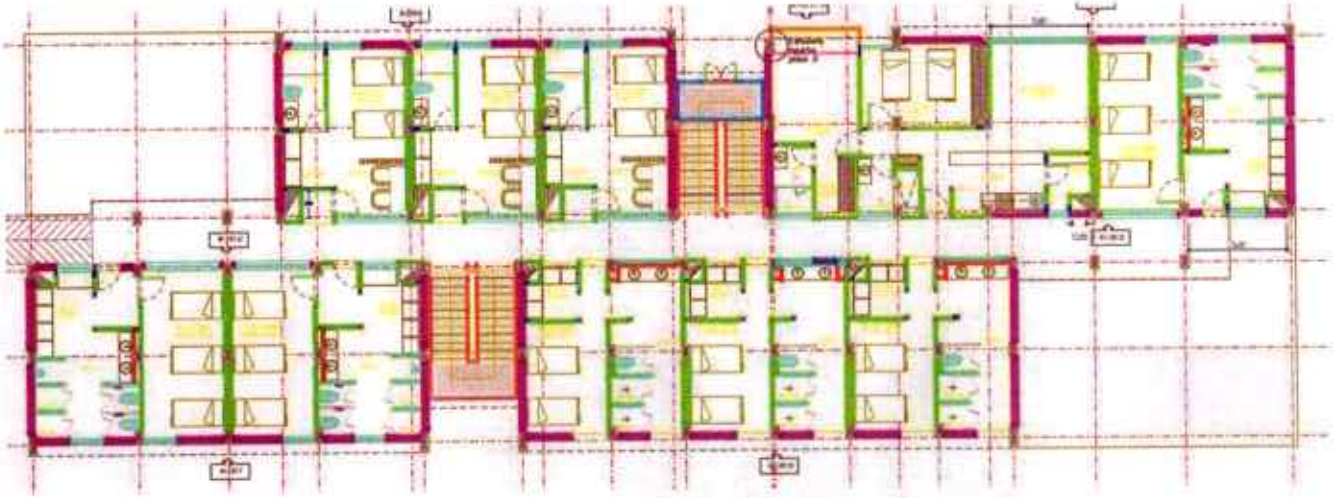



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.7	Columnetes en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [redacted] EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


Item:	Descripción	Unidad
3.4.8	Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C ANTEPECHO						Subtotal		48,30
C4-C11 (NORTE)	C4-C11 (CA)							
Viga antepecho	C4-C11 (CA)	1,00		14,70	0,10	0,24		14,70
C16-C22 (NORTE)	C16-C22 (CA)							
Viga antepecho	C16-C22 (CA)	1,00		14,70	0,10	0,24		14,70
CA-CC (ESTE)	CA-CC (C22)							
Viga antepecho	CA-CC (C22)	1,00		6,91	0,10	0,24		6,91
C21-C22 (SUR)	C21-C22 (CC)							
Viga antepecho	C21-C22 (CC)	1,00		2,16	0,10	0,24		2,16
CC-CD (ESTE)	CC-CD (C21-C22)							
Viga antepecho	CC-CD (C21-C22)	1,00		2,22	0,10	0,24		2,22
C1-C4 (NORTE)	C1-C4 (NORTE)							
Viga antepecho	C1-C4 (NORTE)	1,00		1,50	0,10	0,24		1,50
CA-CC (OESTE)	CA-CC (C4)							
Viga antepecho	CA-CC (C4)	1,00		6,11	0,10	0,24		6,11

Ítem:	3.4.8	Unidad:	m	Magnitud total:	48,30

Esquema

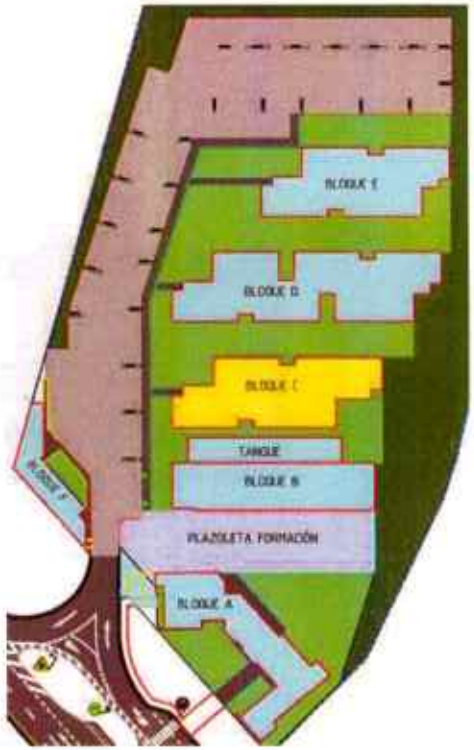

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.8	Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR. . ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAC ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.4.8	Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/ítem	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		348,89
Zona 1	1,00		9,78	7,97			77,90
Media caña y muro	1,00		29,06	0,50			14,53
Zona 2	1,00		17,30	13,50			233,52
Media caña y muro	1,00		45,88	0,50			22,94

Esquema



Ítem:	3.5.3	Unidad:	m²	Magnitud total:	348,89

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT .ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAL /NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAL NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.1	Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		13,00
C21-C22 (CA-CC)	Desagüe aires	1,00		4,00				4,00
C4-C6 (CA-CC)	Válvula de corte	1,00		3,00				3,00
C6-C9 (CA-CC)	Válvula de corte	1,00		3,00				3,00
C9-C11 (CA-CC)	Válvula de corte	1,00		3,00				3,00

Esquema

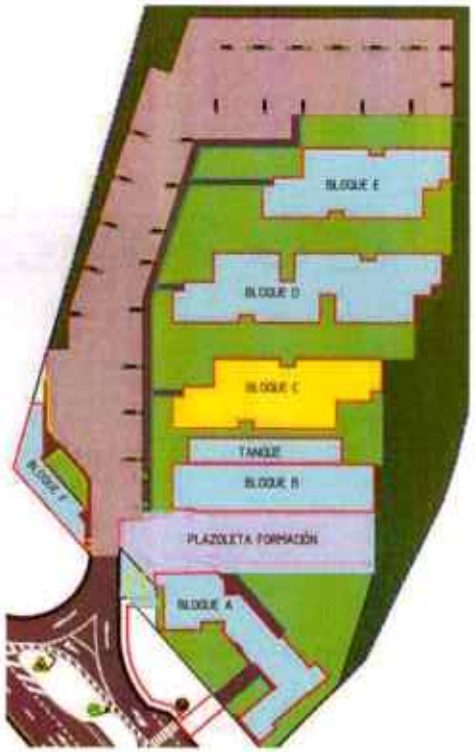


Ítem:	3.6.1	Unidad:	m	Magnitud total:	13,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.1	Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Planos y Detalles

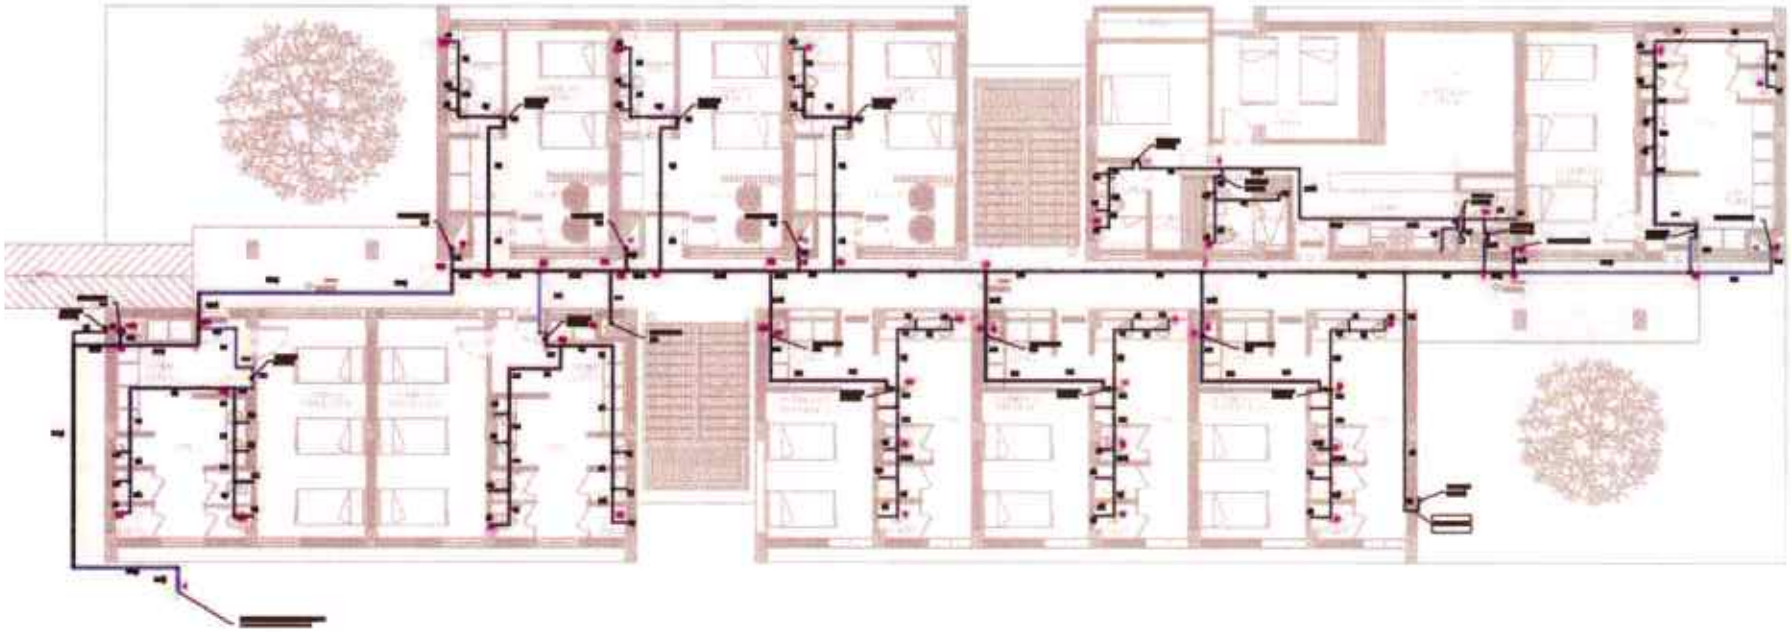

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.1	Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.2 NP	Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		3,00
C19-C20 (CB-CC)	Válvula de corte	1,00		3,00				3,00

Esquema

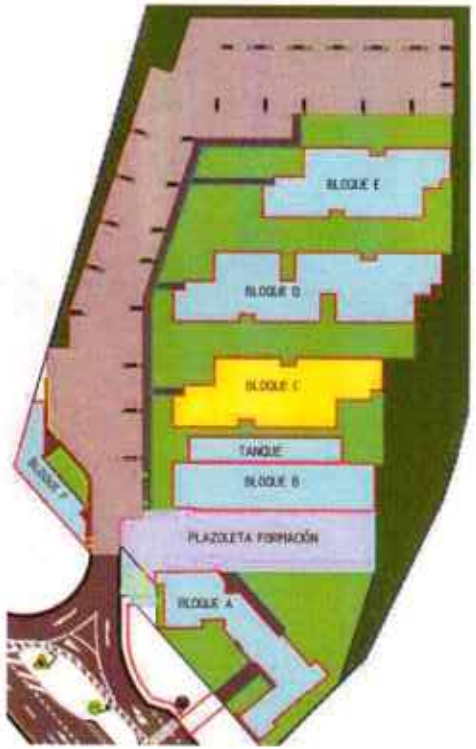


Ítem:	3.6.2 NP	Unidad:	m	Magnitud total:	3,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAL .NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.2 NP	Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Planos y Detalles

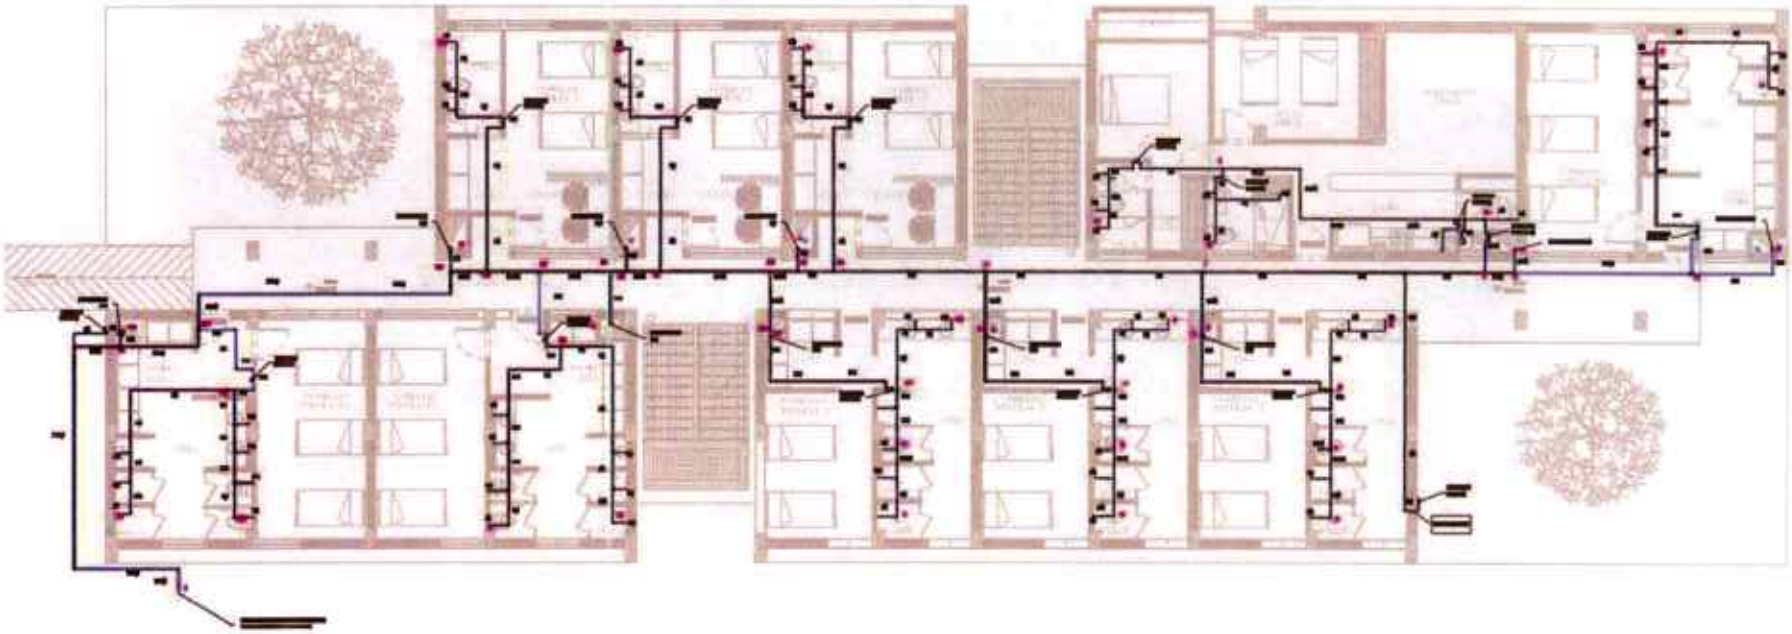


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.2 NP	Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Registro Fotográfico

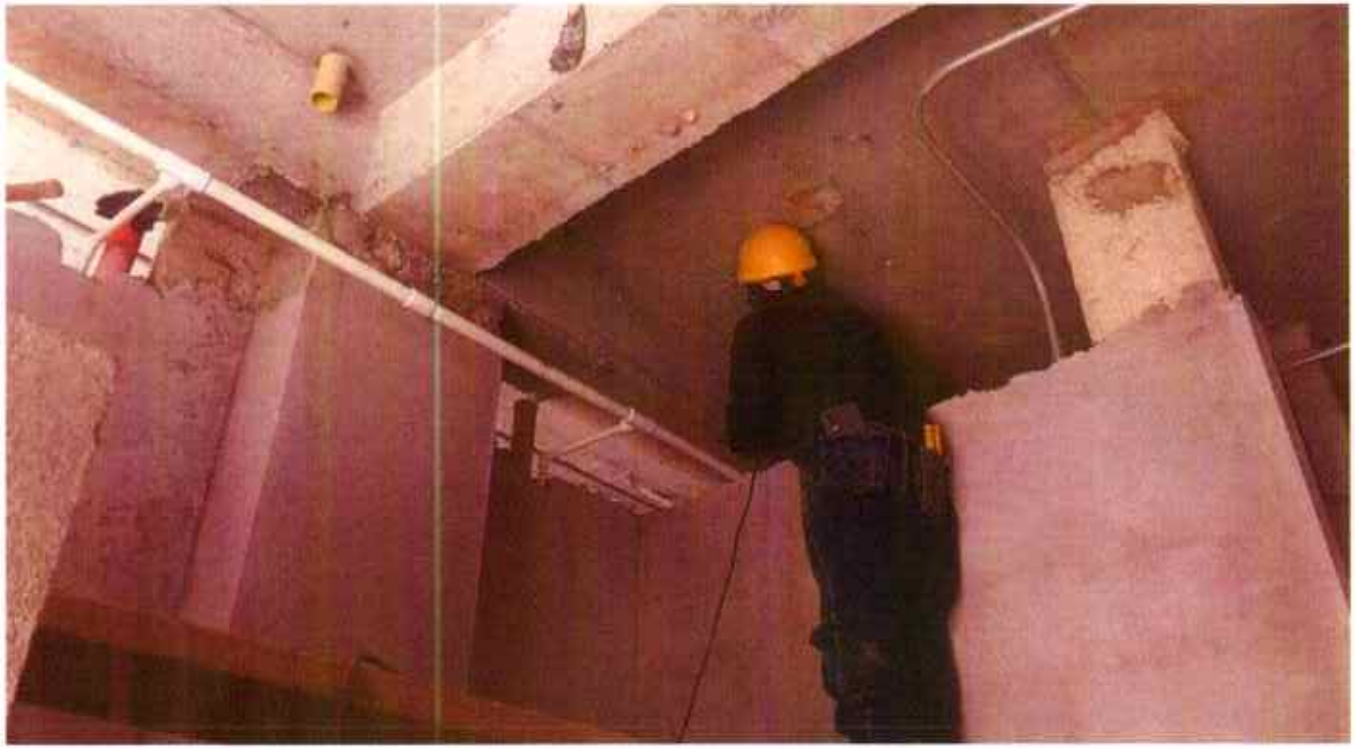

R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAL NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.3 NP	Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		**69,00**
C19-C20 (CB-CC)	Válvula de corte	2,00		3,00				6,00
C19-C20 (CB-CC)	Lavadora	1,00		3,00				3,00
C21-C22 (CB-CC)	Lavamanos	2,00		4,00				8,00
C21-C22 (CB-CC)	Sanitario	2,00		4,00				8,00
C21-C22 (CB-CC)	Ducha	2,00		4,00				8,00
C4-C6 (CA-CC)	Lavamanos	1,00		4,00				4,00
C4-C6 (CA-CC)	Sanitario	1,00		4,00				4,00
C4-C6 (CA-CC)	Ducha	1,00		4,00				4,00
C6-C9 (CA-CC)	Lavamanos	1,00		4,00				4,00
C6-C9 (CA-CC)	Sanitario	1,00		4,00				4,00
C6-C9 (CA-CC)	Ducha	1,00		4,00				4,00
C9-C11 (CA-CC)	Lavamanos	1,00		4,00				4,00
C9-C11 (CA-CC)	Sanitario	1,00		4,00				4,00
C9-C11 (CA-CC)	Ducha	1,00		4,00				4,00

Esquema

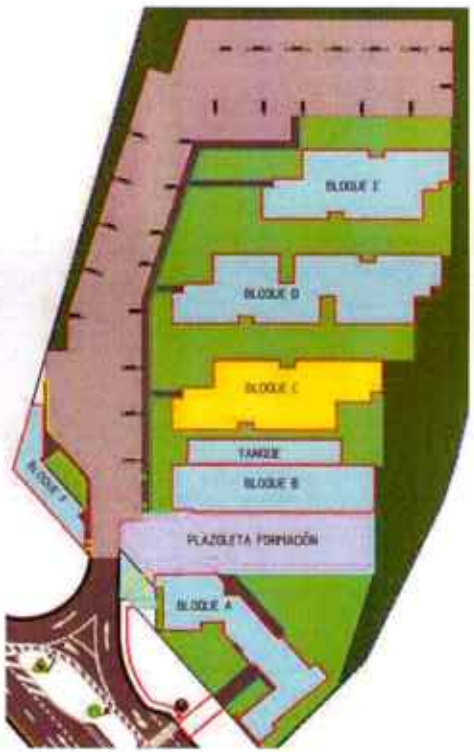

Ítem:	3.6.3 NP	Unidad:	m	Magnitud total:	69,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.3 NP	Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Planos y Detalles




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR. ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAC NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item:	Descripción	Unidad
3.6.3 NP	Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Registro Fotográfico

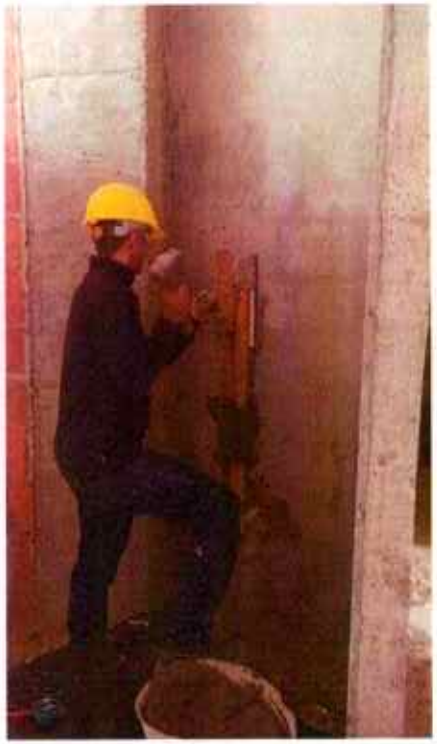

R/L. NELSON JOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.4 NP	Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		3,00
C21-C22 (CB-CC)	Válvula de corte	1,00		3,00				3,00

Esquema




Ítem:	3.6.4 NP	Unidad:	m	Magnitud total:	3,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA( )NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO. . EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.4 NP	Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Planos y Detalles

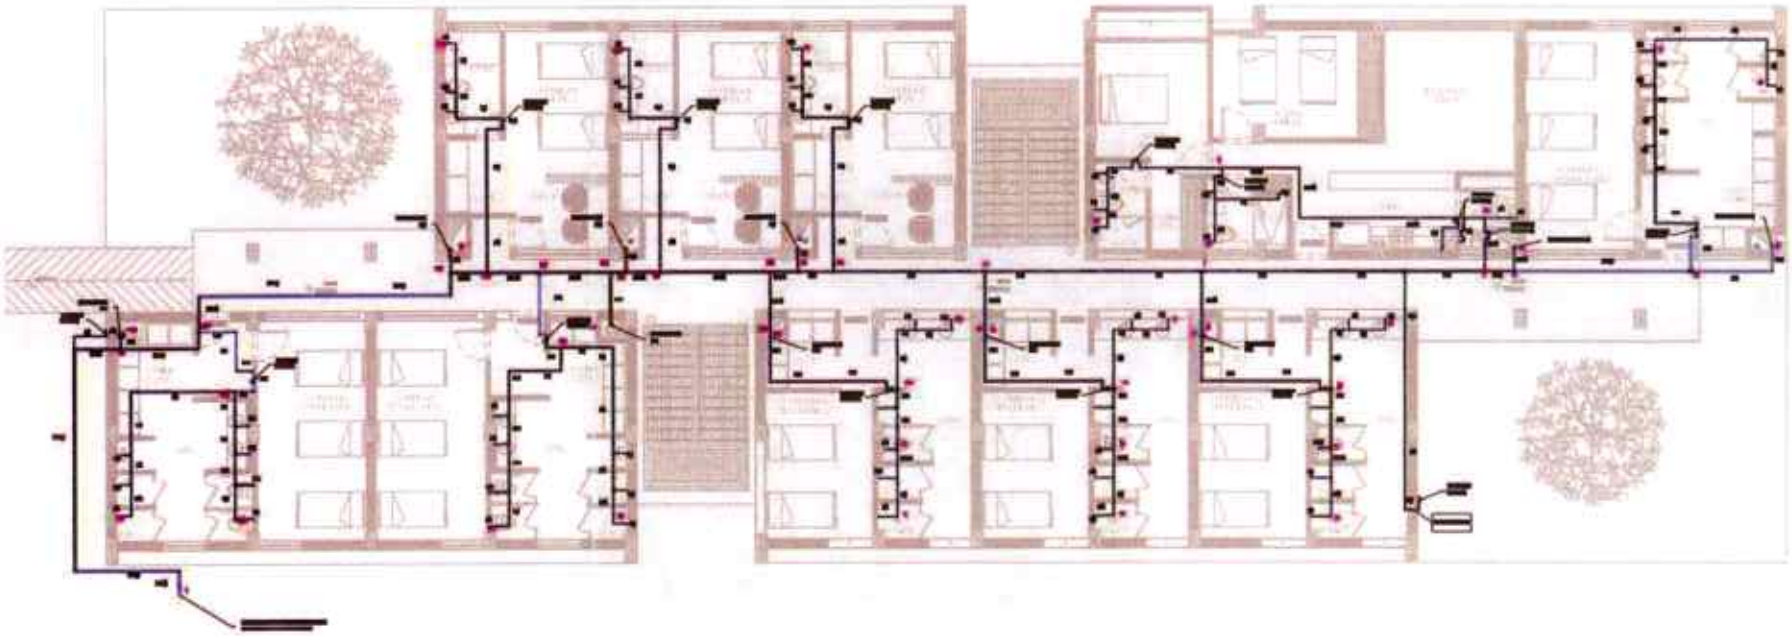

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.4 NP	Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON / EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.5 NP	Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		**15,00**
C21-C22 (CB-CC)	Lavamanos	2,00						2,00
C21-C22 (CB-CC)	Sanitario	2,00						2,00
C21-C22 (CB-CC)	Ducha	2,00						2,00
C4-C6 (CA-CC)	Lavamanos	1,00						1,00
C4-C6 (CA-CC)	Sanitario	1,00						1,00
C4-C6 (CA-CC)	Ducha	1,00						1,00
C6-C9 (CA-CC)	Lavamanos	1,00						1,00
C6-C9 (CA-CC)	Sanitario	1,00						1,00
C6-C9 (CA-CC)	Ducha	1,00						1,00
C9-C11 (CA-CC)	Lavamanos	1,00						1,00
C9-C11 (CA-CC)	Sanitario	1,00						1,00
C9-C11 (CA-CC)	Ducha	1,00						1,00

Esquema

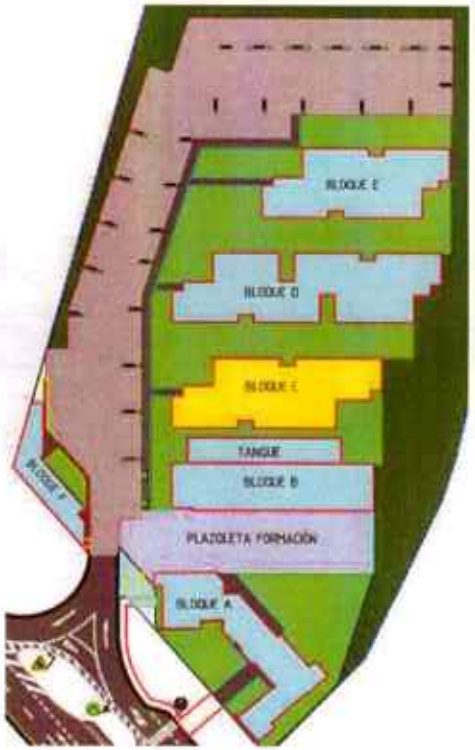

Item:	3.6.5 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	15,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.5 NP	Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg.	und

Planos y Detalles



MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.5 NP	Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.8 NP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		1,00
C21-C22 (CB-CC)	Válvula de corte	1,00						1,00

Esquema

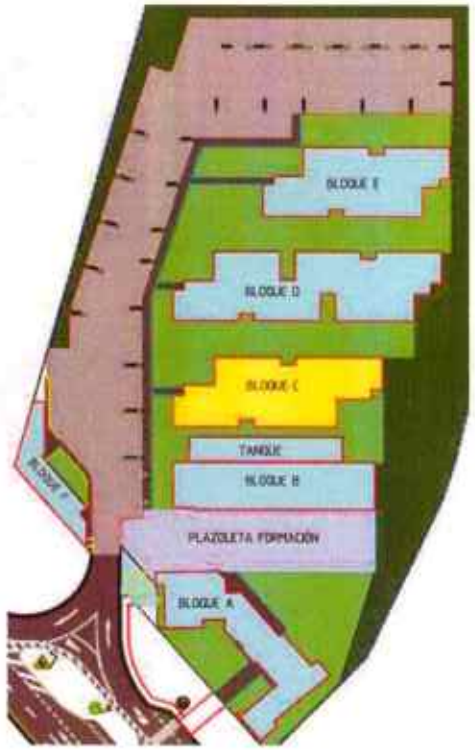

Item:	3.6.8 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	1,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE
LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAC NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.8 NP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.8 NP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ...NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO... ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.9 NP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		**3,00**
C4-C6 (CA-CC)	Válvula de corte	1,00						1,00
C6-C9 (CA-CC)	Válvula de corte	1,00						1,00
C9-C11 (CA-CC)	Válvula de corte	1,00						1,00

Esquema

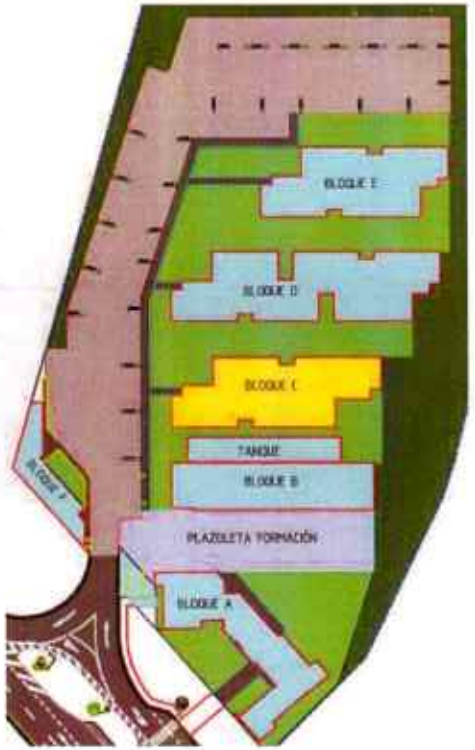


Ítem:	3.6.9 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	3,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.9 NP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und

Planos y Detalles

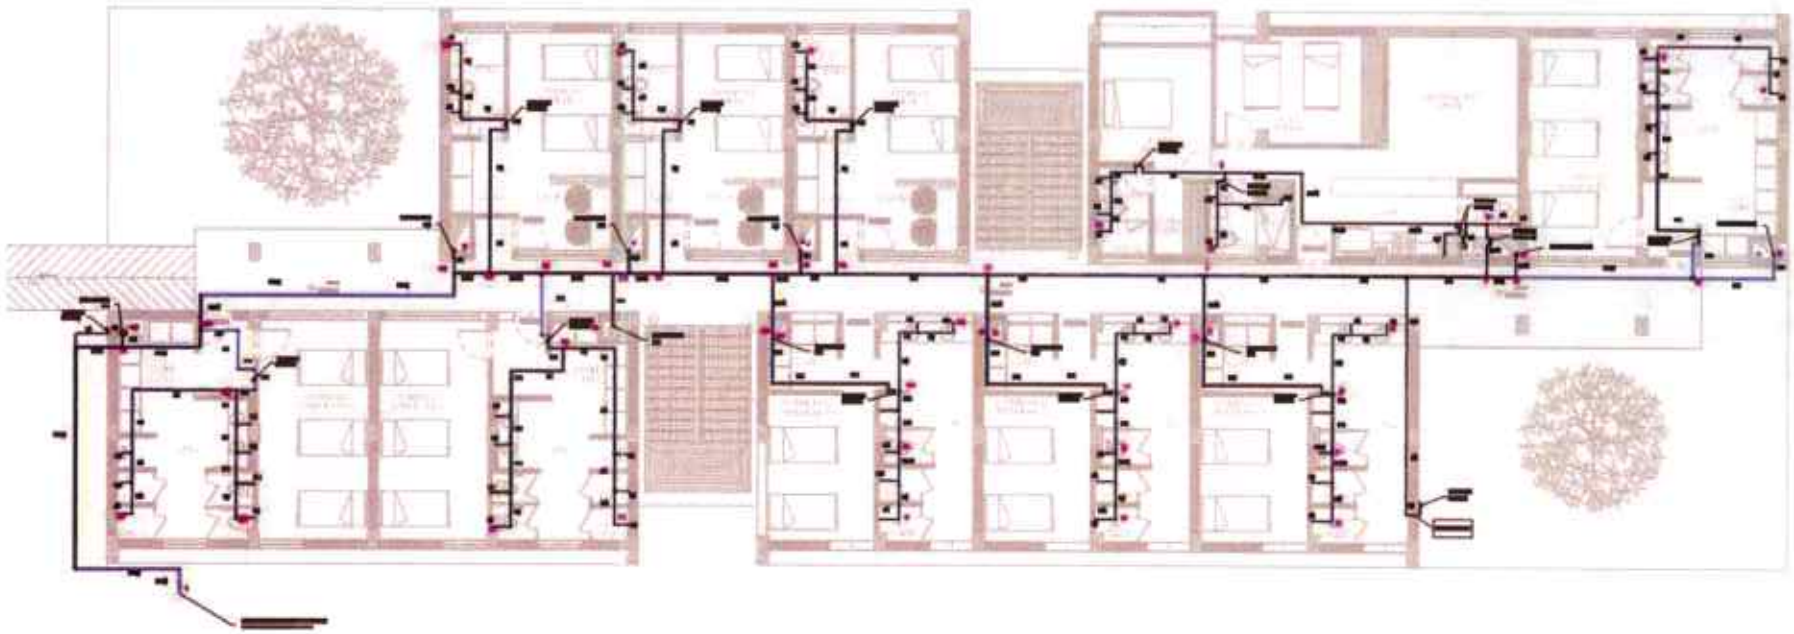

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT .ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA( )NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.6.9 NP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.3	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		6,00
C21-C22 (CA-CC)	Lavamanos	2,00						2,00
C4-C6 (CA-CC)	Lavamanos	1,00						1,00
C6-C9 (CA-CC)	Lavamanos	1,00						1,00
C9-C11 (CA-CC)	Lavamanos	1,00						1,00
C19-C20 (CB-CC)	Caja lavadora	1,00						1,00

Esquema

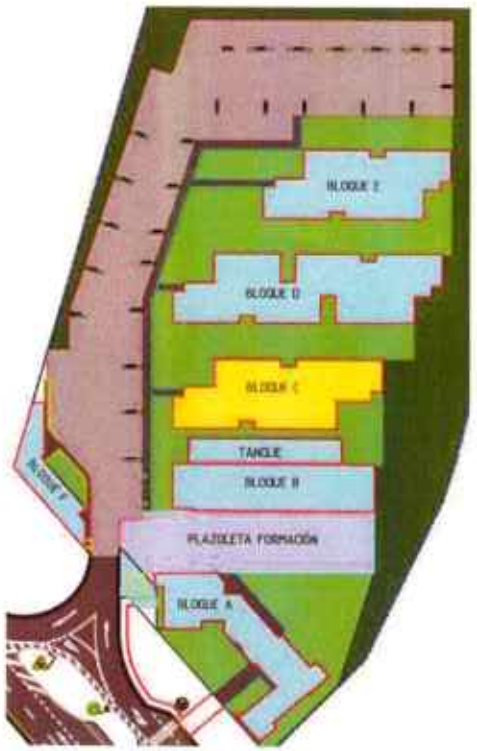


Ítem:	3.7.3	Unidad:	und	Magnitud total:	6,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA...	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ...NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO	SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.3	Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.	und

Planos y Detalles

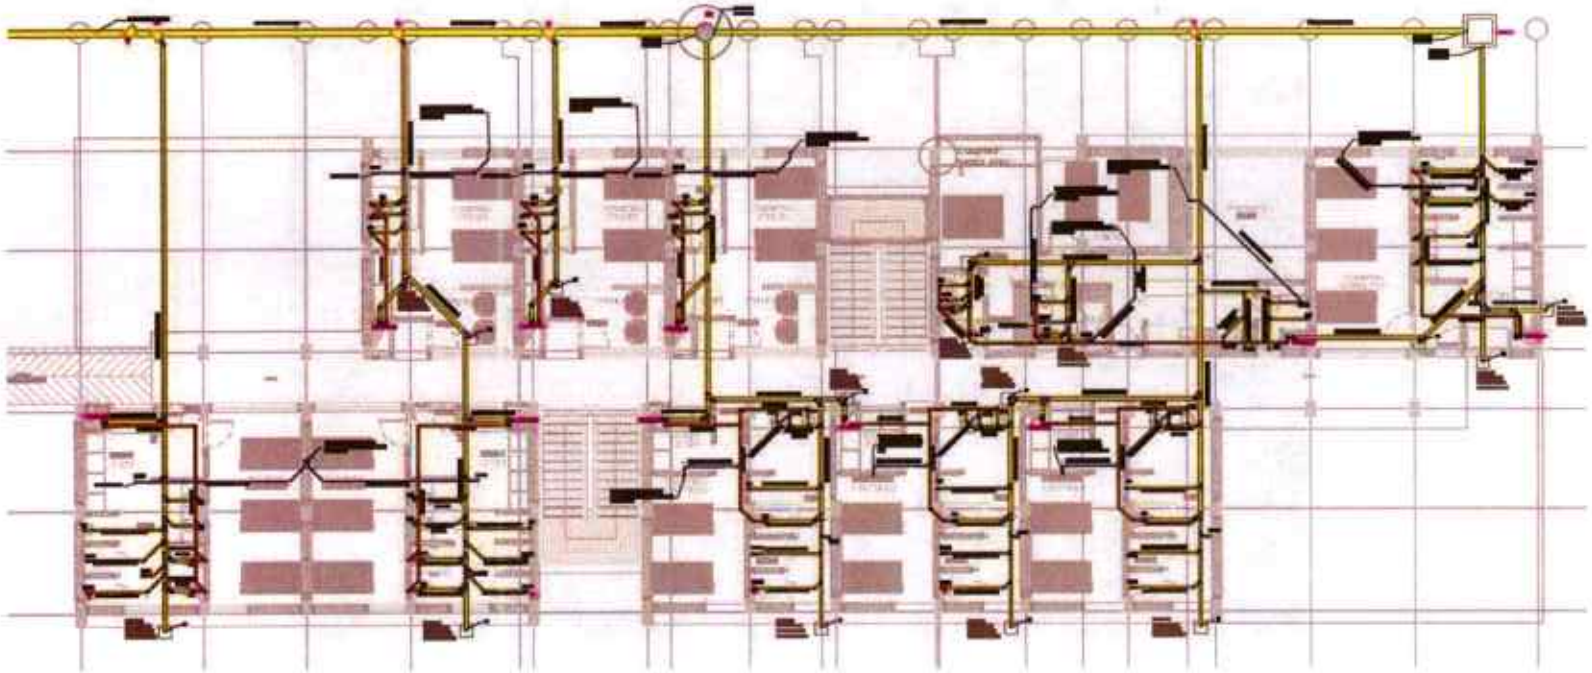

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.3	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA.. .NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO. EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item:	Descripción	Unidad
3.7.4	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
CUBIERTA						Subtotal		1,00
C9 (CC)	Tapón inspección	1,00						1,00

Esquema

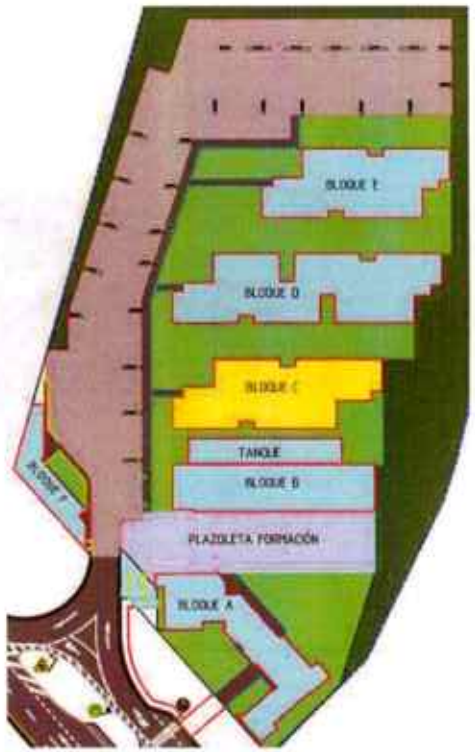


Ítem:	3.7.4	Unidad:	und	Magnitud total:	1,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.4	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Planos y Detalles

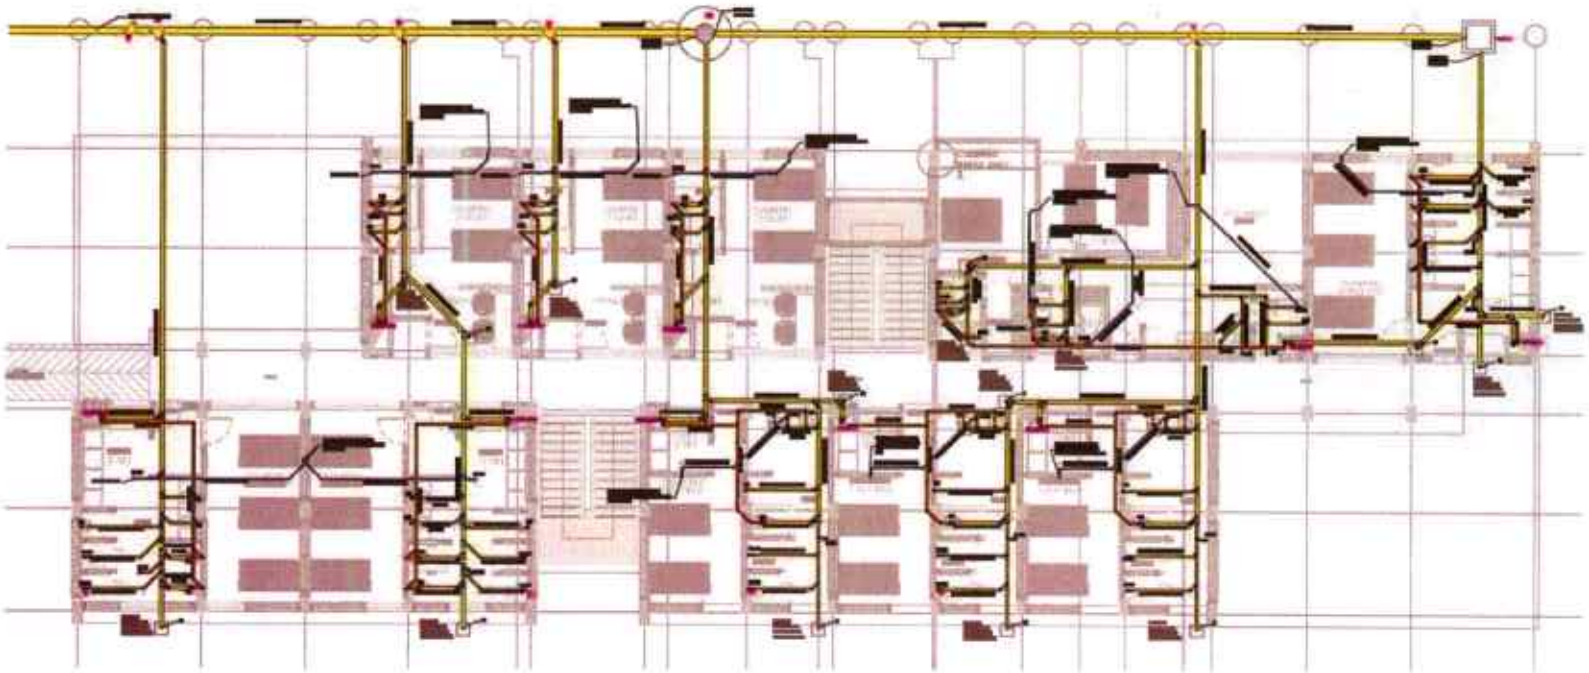

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ...NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO... ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.4	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.8.1	Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
CUBIERTA					Subtotal		31,00
C22 (CC)	1,00		7,00				7,00
C12 (CC)	1,00		1,00				1,00
C15 (CC)	1,00		1,00				1,00
C4-C6 (CB-CC)	1,00		5,50				5,50
C9-C11 (CB-CC)	1,00		4,20				4,20
C5-C9 (CC-CD)	1,00		7,30				7,30
C4-C7 (CD-CE)	1,00		2,00				2,00
C8-C9 (CD-CE)	1,00		3,00				3,00

Esquema




Ítem:	3.8.1	Unidad:	m	Magnitud total:	31,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA... ...NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT... ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.8.1	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	m

Planos y Detalles

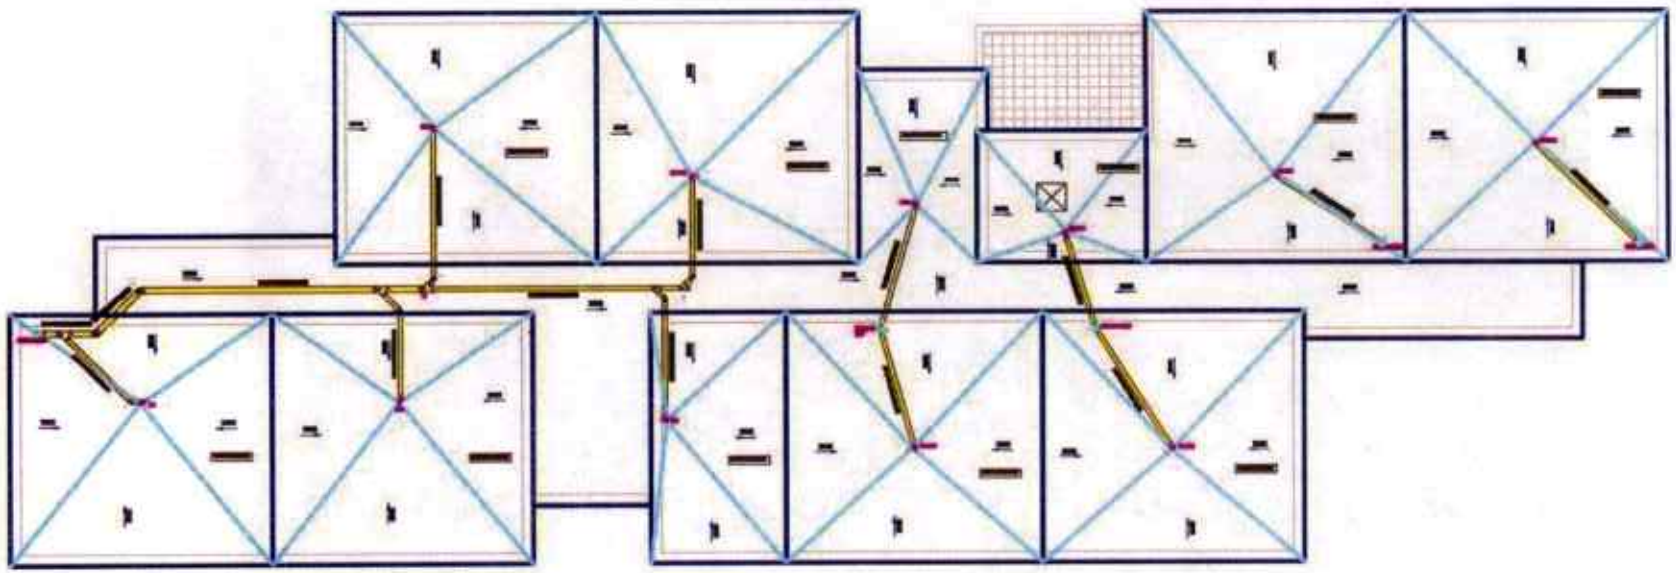

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.8.1	Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.8.2	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
CUBIERTA					Subtotal		1,50
C5-C7 (CC)	1,00		1,50				1,50

Esquema




Ítem:	3.8.2	Unidad:	m	Magnitud total:	1,50

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.8.2	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg.	m

Planos y Detalles

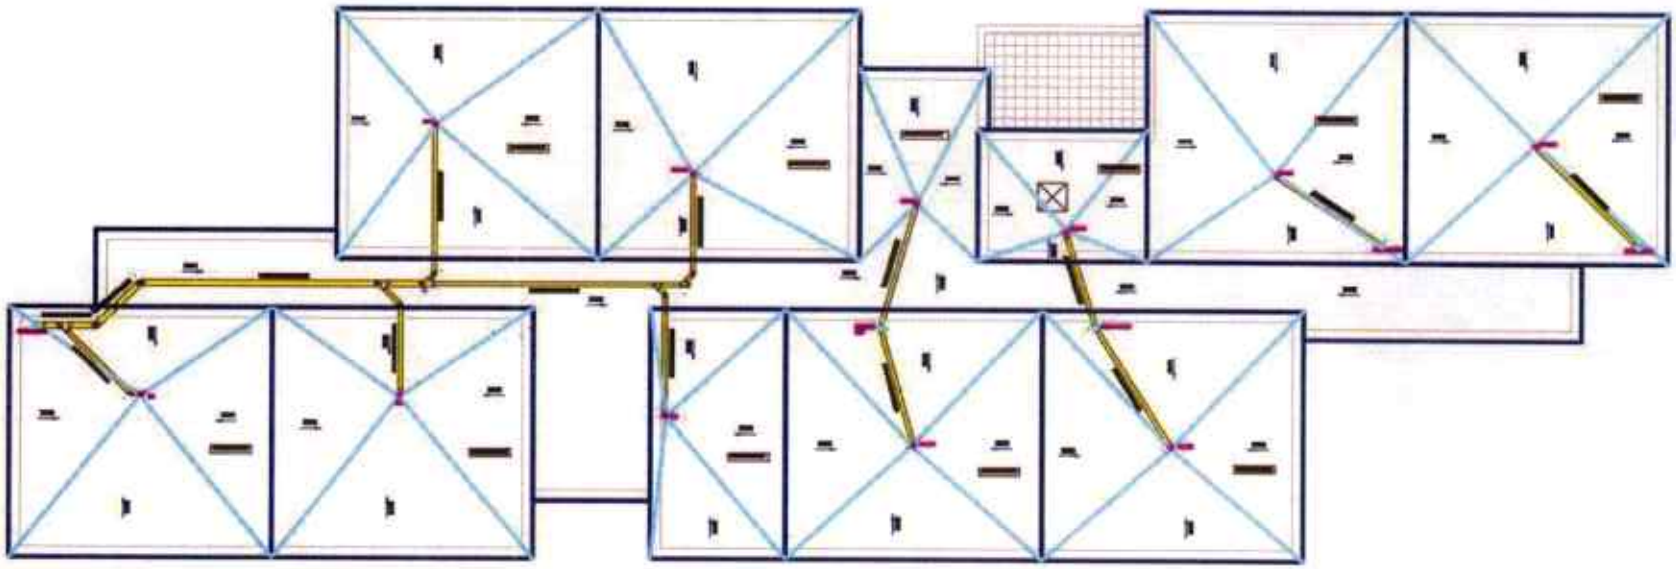

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA ./NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO. / EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item:	Descripción	Unidad
3.8.2	Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra García
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.8.3	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
CUBIERTA					Subtotal		4,00
C20 (CC)	1,00						1,00
C22 (CC)	1,00						1,00
C12 (CC)	1,00						1,00
C15 (CC)	1,00						1,00

Esquema




Ítem:	3.8.3	Unidad:	und	Magnitud total:	4,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE NTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAC IAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.8.3	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	und

Planos y Detalles

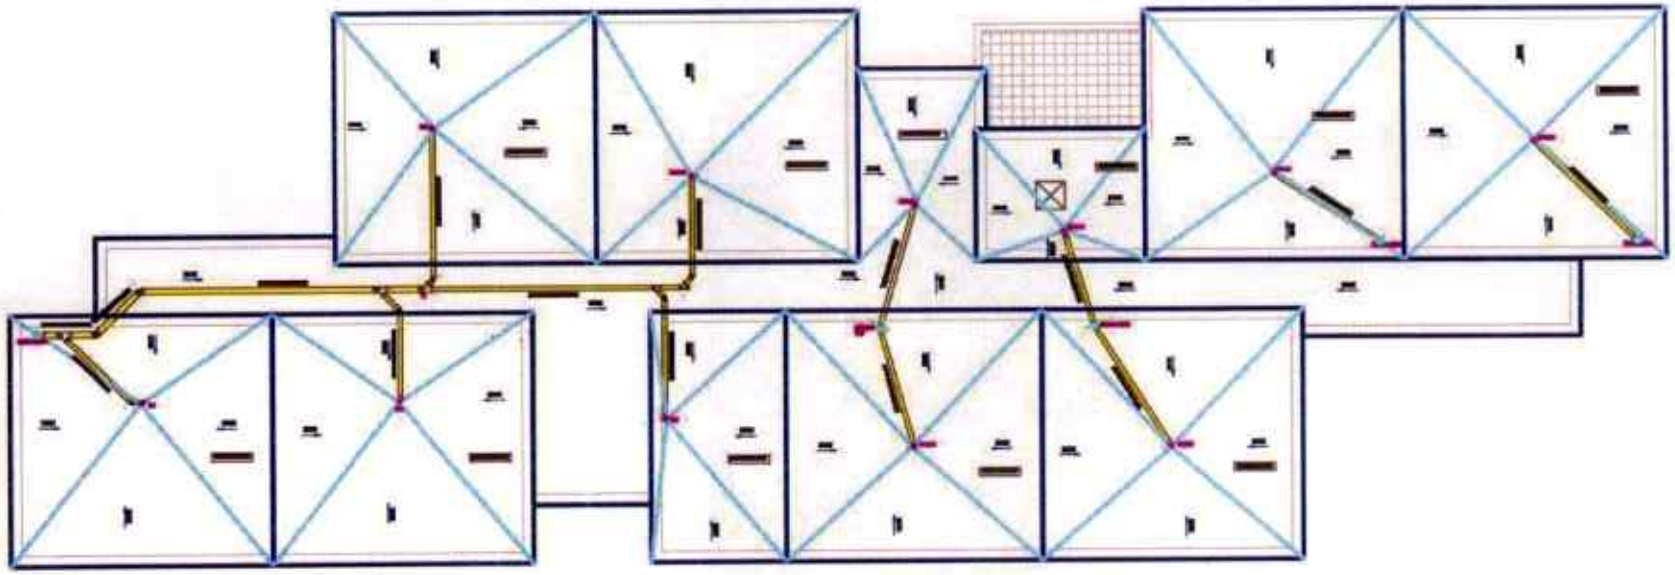

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.8.3	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ...NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO ...NTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.4.2	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
INTERNO BLOQUE D SEGUNDO PISO					Subtotal		2,00
DORMITORIO PATRULLEROS 15							
Muro fachada	1,00		0,67	3,00	0,15		2,00

Esquema




Ítem:	4.4.2	Unidad:	m²	Magnitud total:	2,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.4.2	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4.	m^2

Planos y Detalles

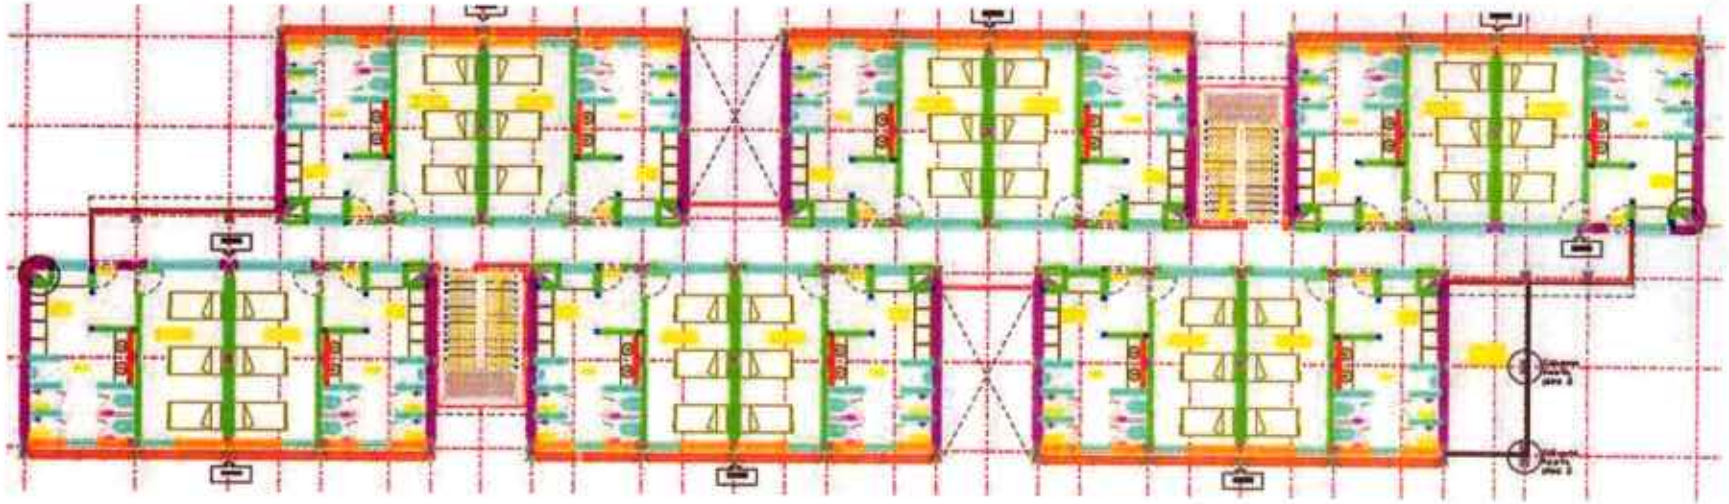


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO- EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.4.2	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4.	m²

Registro Fotográfico

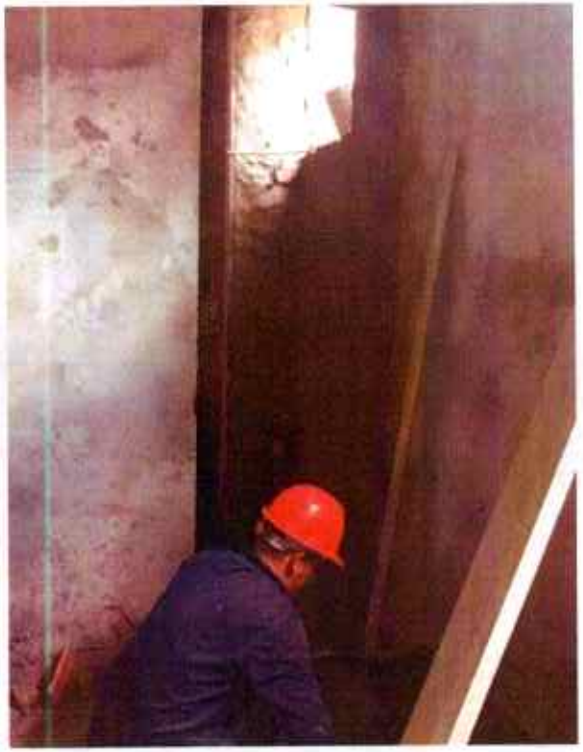

R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					Subtotal		5,45
Vigas de Cubierta							
V_dintel	1,00		1,15	0,66	0,25		1,15
Columnas PP							
EE_EP	1,00		4,30	0,50	0,30		4,30

Esquema




Ítem: 5.1.7 Unidad: m Magnitud total: 5,45

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT NTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAL .NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m

Planos y Detalles

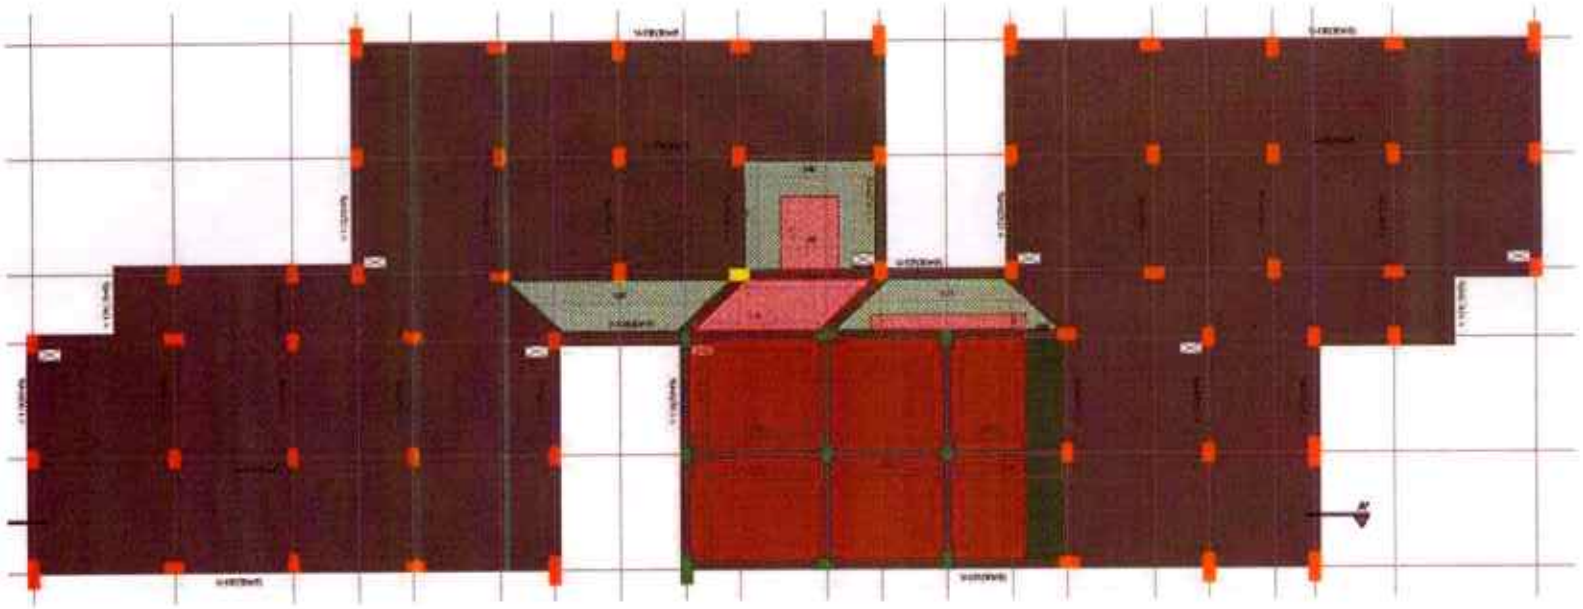

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m

Registro Fotográfico

R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA .)NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO / EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E PRIMER PISO						Subtotal		2,34
BAÑO 2								
ESTE								
Division Interna		1,00		1,04	1,00			1,04
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Vano cielo raso		-1,00		1,17	0,63			-0,74
BAÑO 4								
ESTE								
Division Interna		1,00		1,04	1,00			1,04
Division Interna		1,00		0,97	3,78			3,67
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Viga Corona		-1,00		0,78	0,25			-0,20
Vano cielo raso		-1,00		0,78	0,63			-0,49
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Vano cielo raso		-1,00		1,17	0,63			-0,74
DORMITORIO 7								
BAÑO 7								
		1,00		1,04	1,00			1,04
BLOQUE E SEGUNDO PISO						**Subtotal**		**-0,12**
DORMITORIO PATRULLEROS (NOROESTE) - Z6								
BAÑO 9								
Columneta 2	CT2	-1,00		0,20	3,78			-0,76
Viga Corona		-1,00		0,77	0,25			-0,19
Vano cielo raso		-1,00		0,77	0,63			-0,49

Esquema

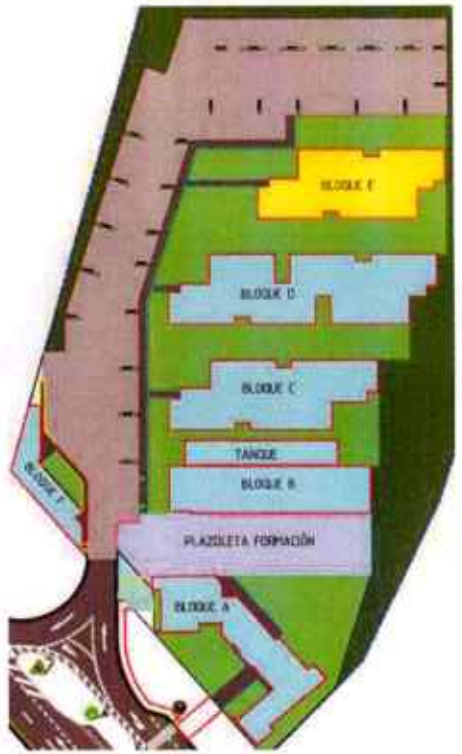



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m^2

Planos y Detalles

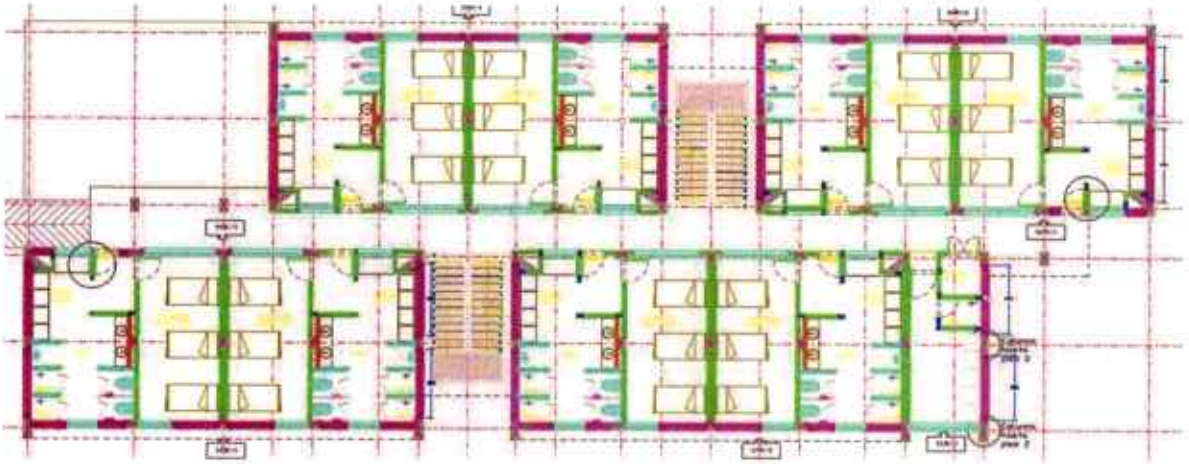

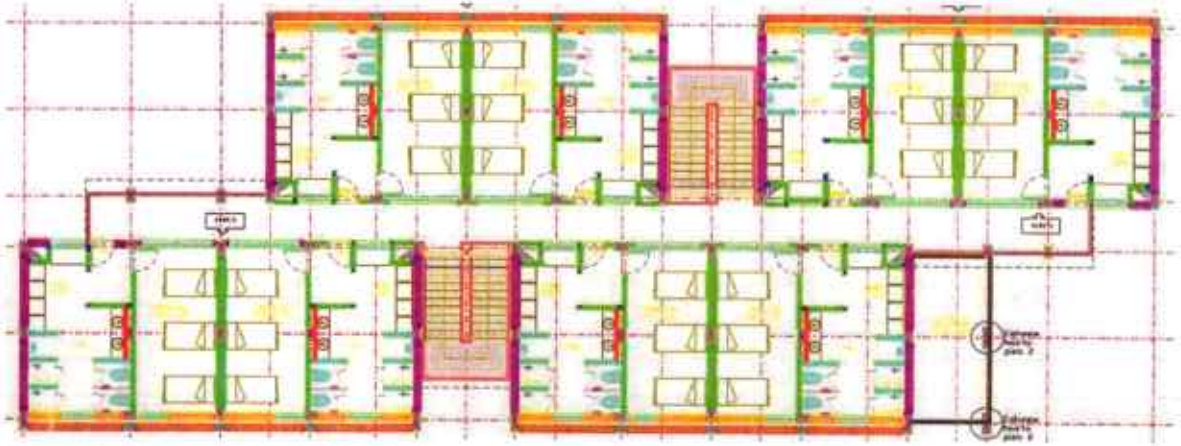

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAL NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item:	Descripción	Unidad
5.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BAÑO 10								
ESTE								
Columneta 4	CT1A	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Columneta 4	CT1A	-1,00		0,20	1,90			-0,38
Division Interna		1,00		1,04	1,00			1,04
BAÑO 15								
ESTE								
Division Interna		1,00		1,04	1,00			1,04

Esquema




Ítem:	5.4.1	Unidad:	m²	Magnitud total:	2,22

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT NTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAL NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles

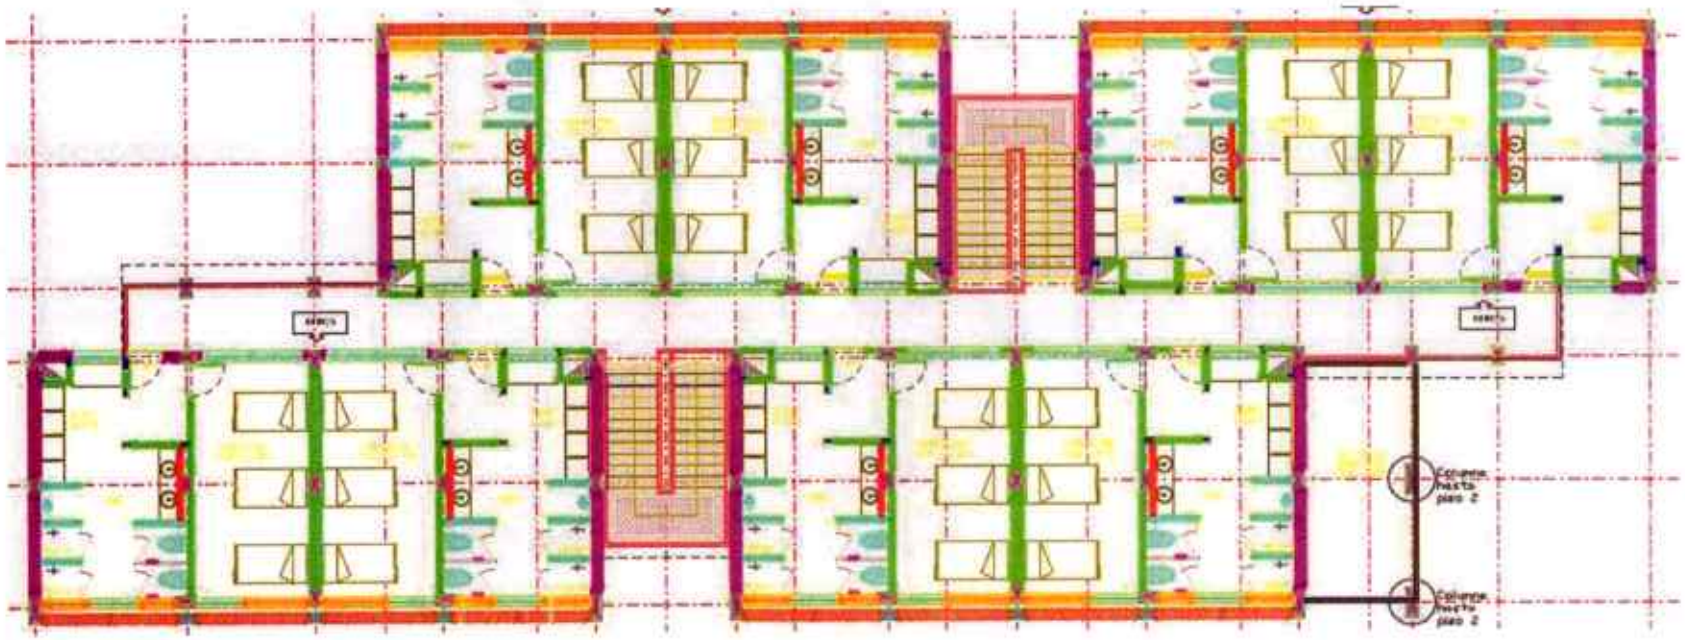


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m^2

Registro Fotográfico

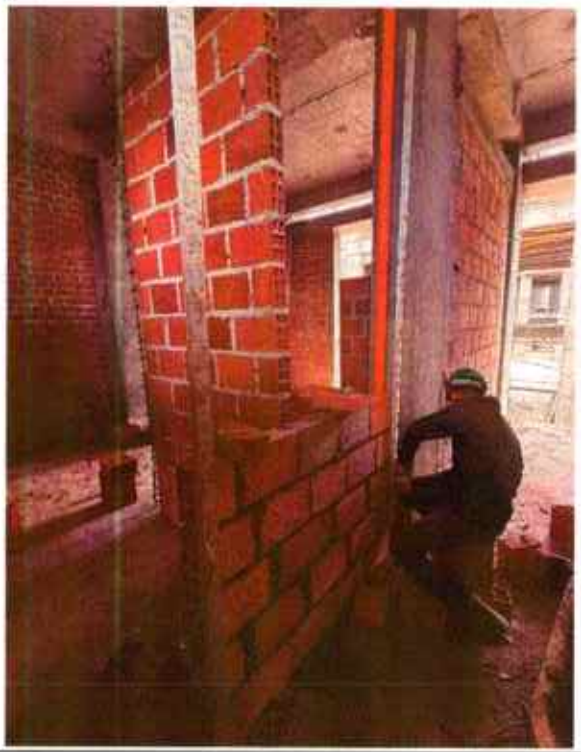

R/L. NELSON YDEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.6	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E PRIMER PISO						Subtotal		3,60
ZONA 4								
E9-E13SURESTE	E9-E13 (EF)							
Poyo	E9-E13 (EF)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20
Poyo	E9-E13 (EF)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20
E13-E17 SURESTE	E13-E17 (EF)							
Poyo	E13-E17 (EF)	1,00		1,20	0,15	0,12		1,20

Esquema

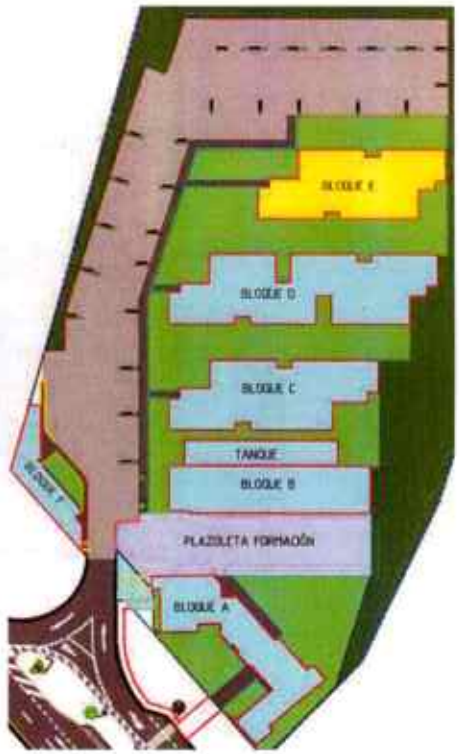


Ítem:	5.4.6	Unidad:	m	Magnitud total:	3,60

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.6	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo.	m

Planos y Detalles

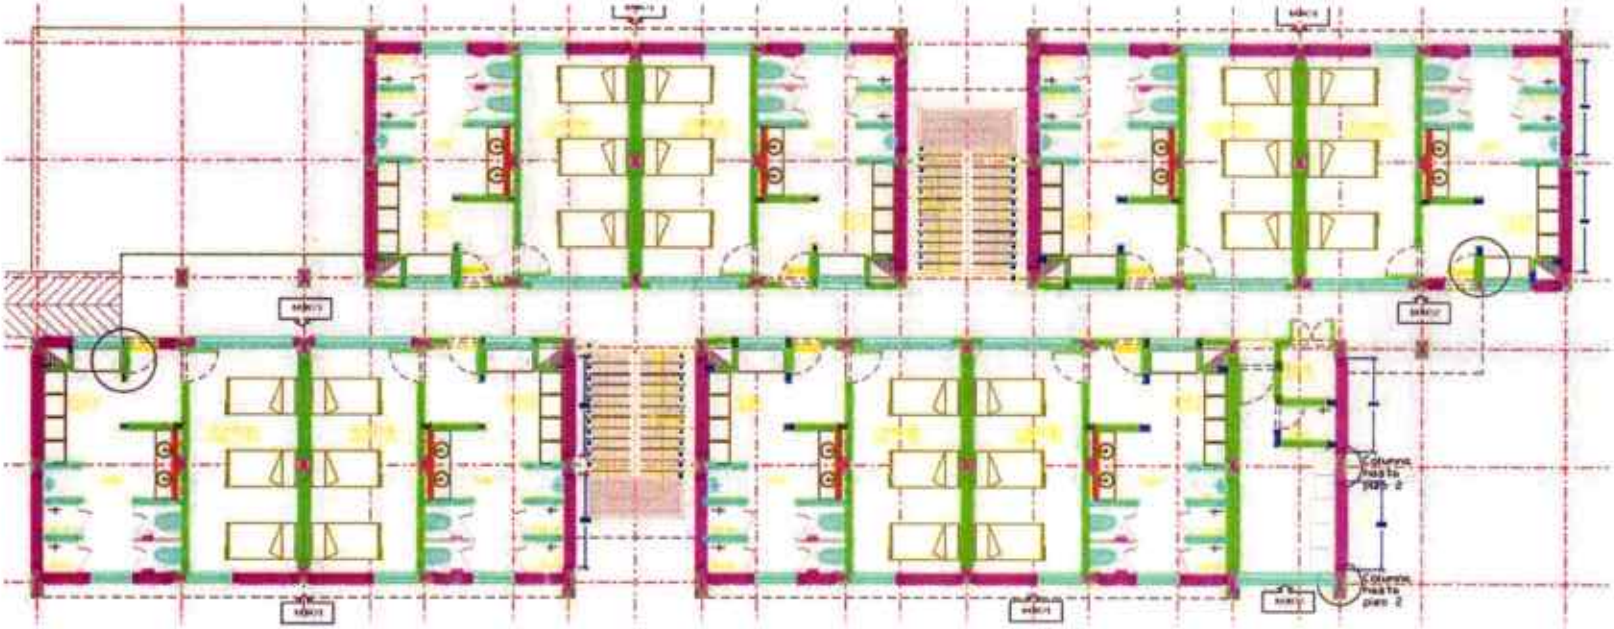

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO - EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.4.6	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		255,04
Cubierta	1,00		16,74	14,04			235,00
Perimetro	1,00		40,08	0,50			20,04

Esquema

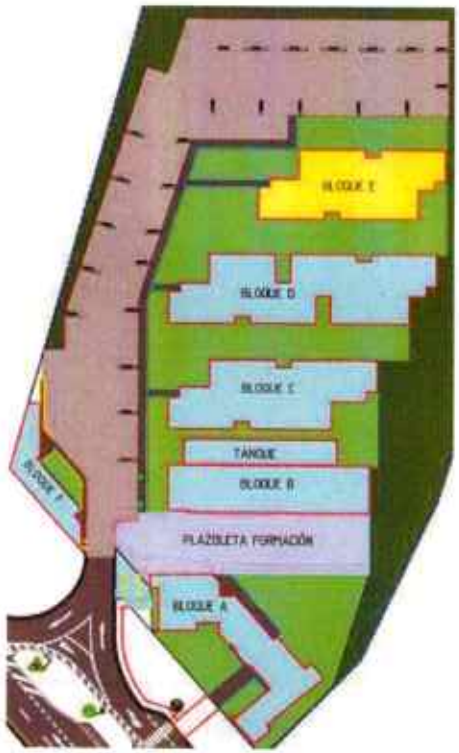


Ítem: 5.5.3 Unidad: m² Magnitud total: 255,04

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²

Planos y Detalles

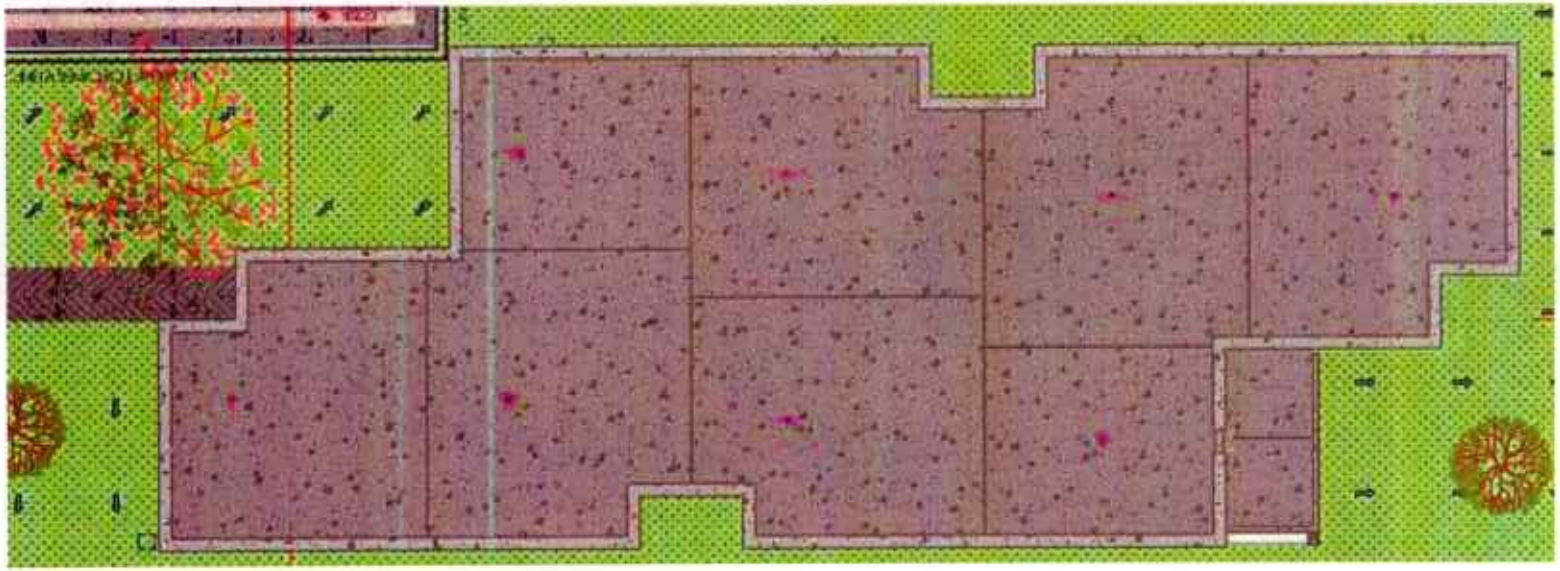


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m^2

Registro Fotográfico

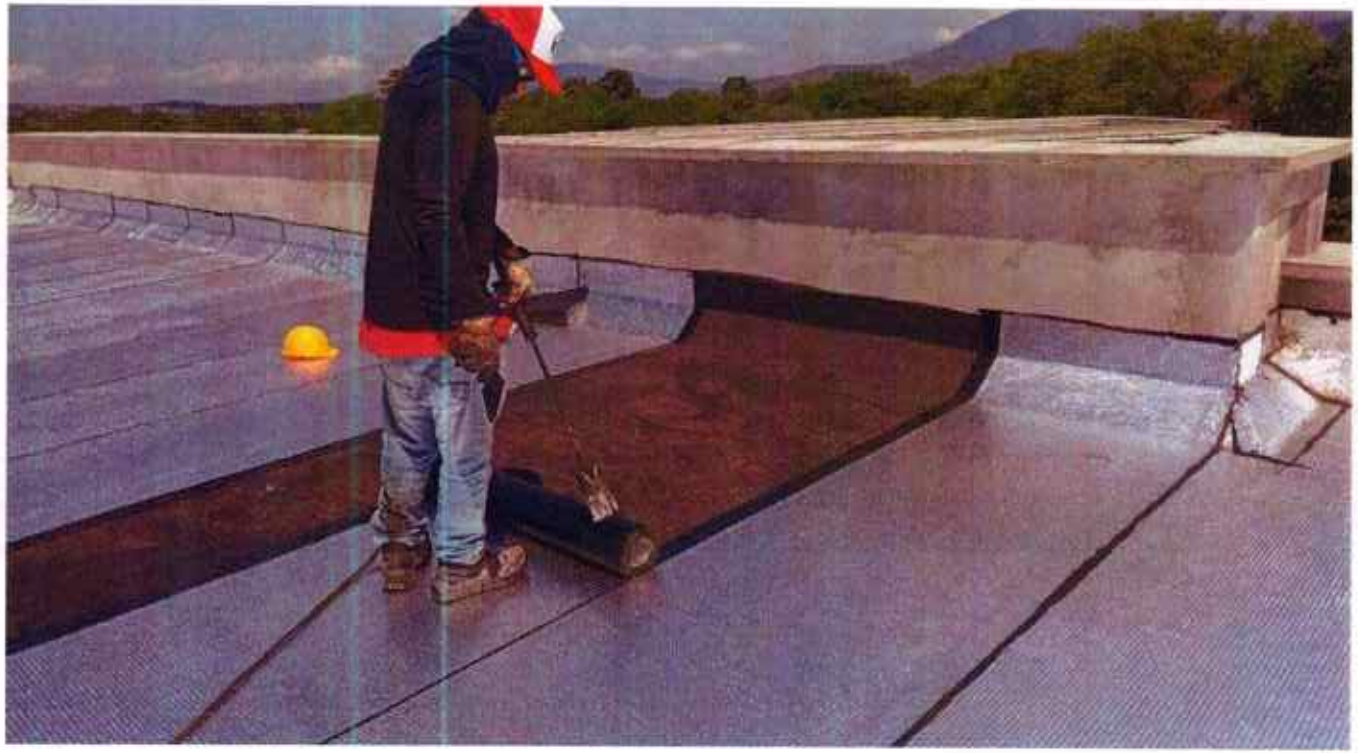

R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NAC /NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.2	Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		**10,00**
Tuberia electrica	1,00		10,00				10,00

Esquema

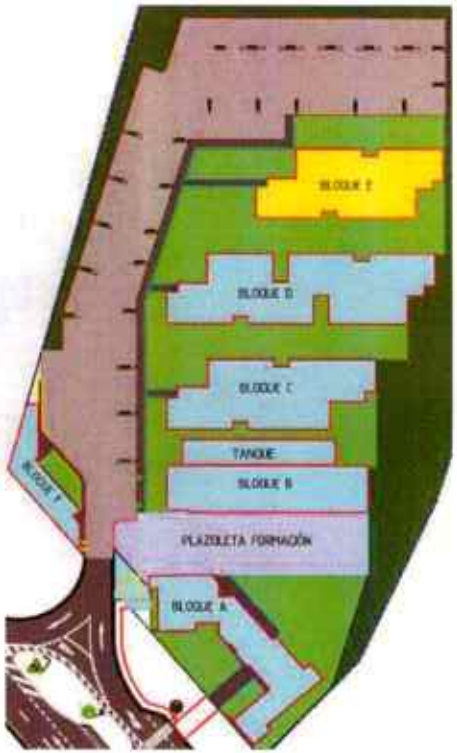


Ítem:	5.9.2	Unidad:	m	Magnitud total:	10,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.2	Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.	m

Planos y Detalles

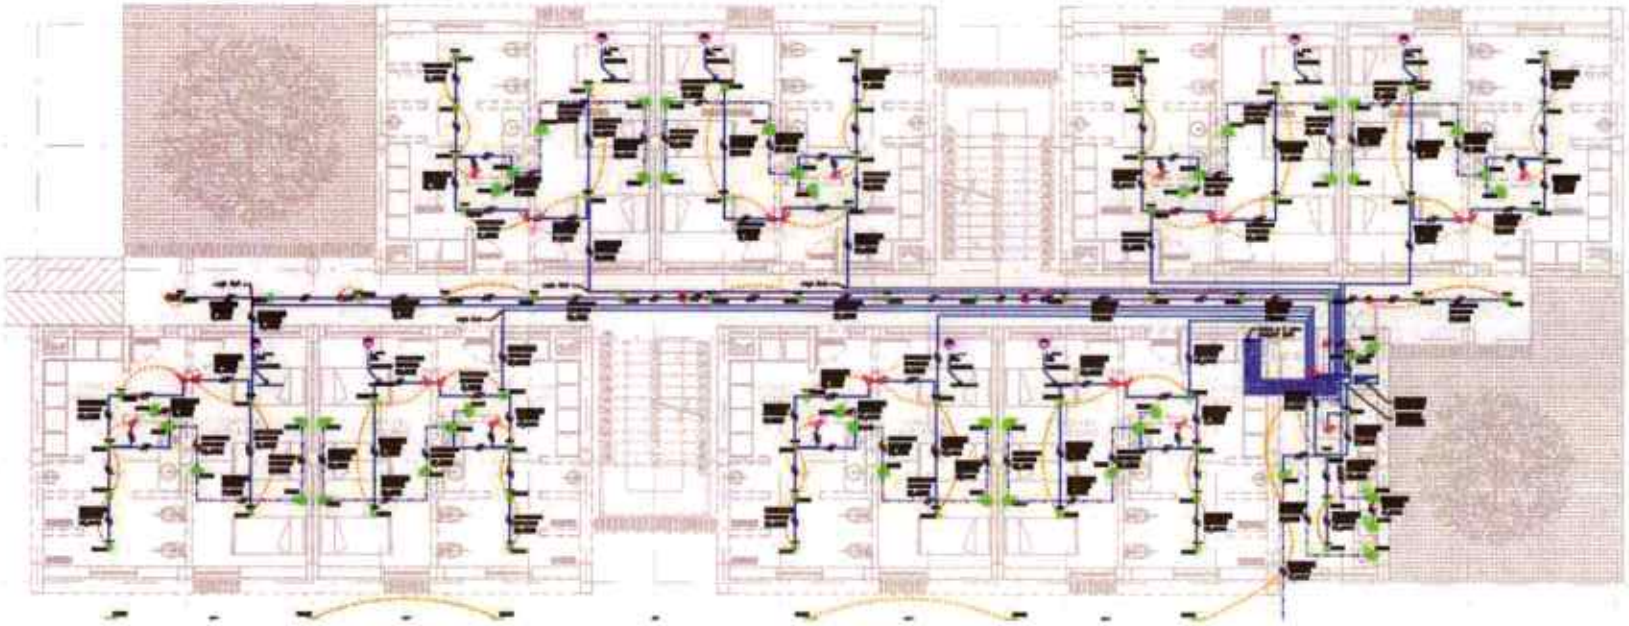

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT [illegible] NTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA[illegible]NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO [illegible]L DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.9.2	Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
6,100	Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Tanque					Subtotal		**88,61**
RCI	1,00		24,41				24,41
Hidraulico	2,00		32,10				64,20

Esquema

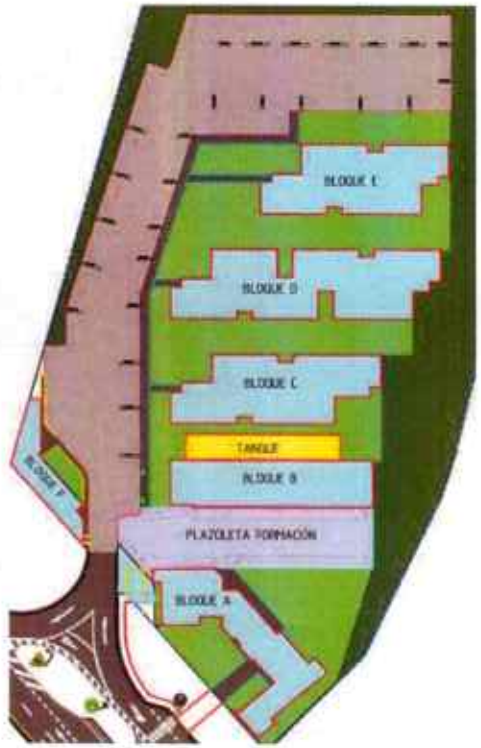


Ítem:	6,100	Unidad:	m	Magnitud total:	88,61

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP(LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA.	EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT ONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO .	ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
6,100	Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción	m

Planos y Detalles

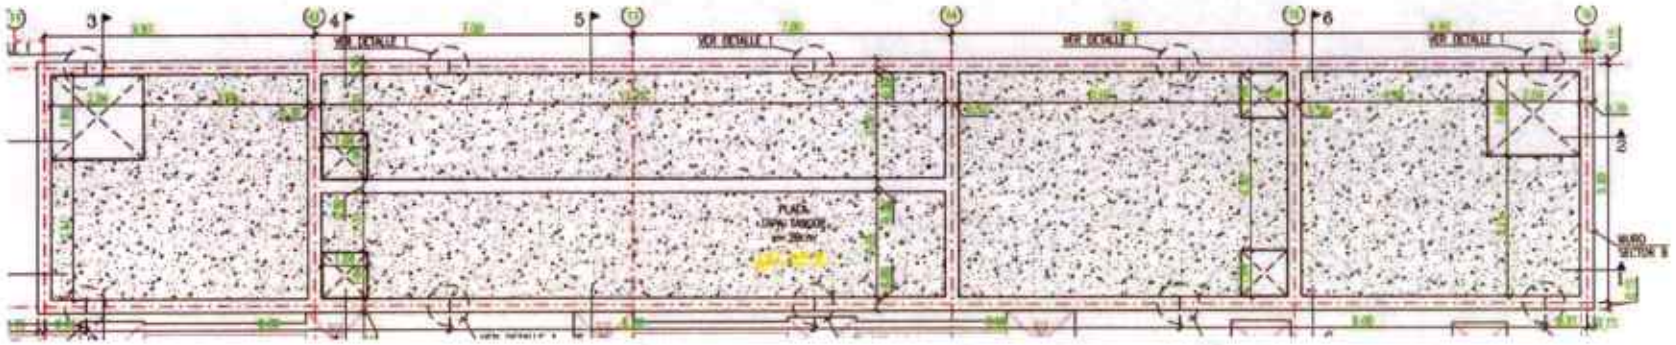


Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
6.100	Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción	m

Registro Fotográfico

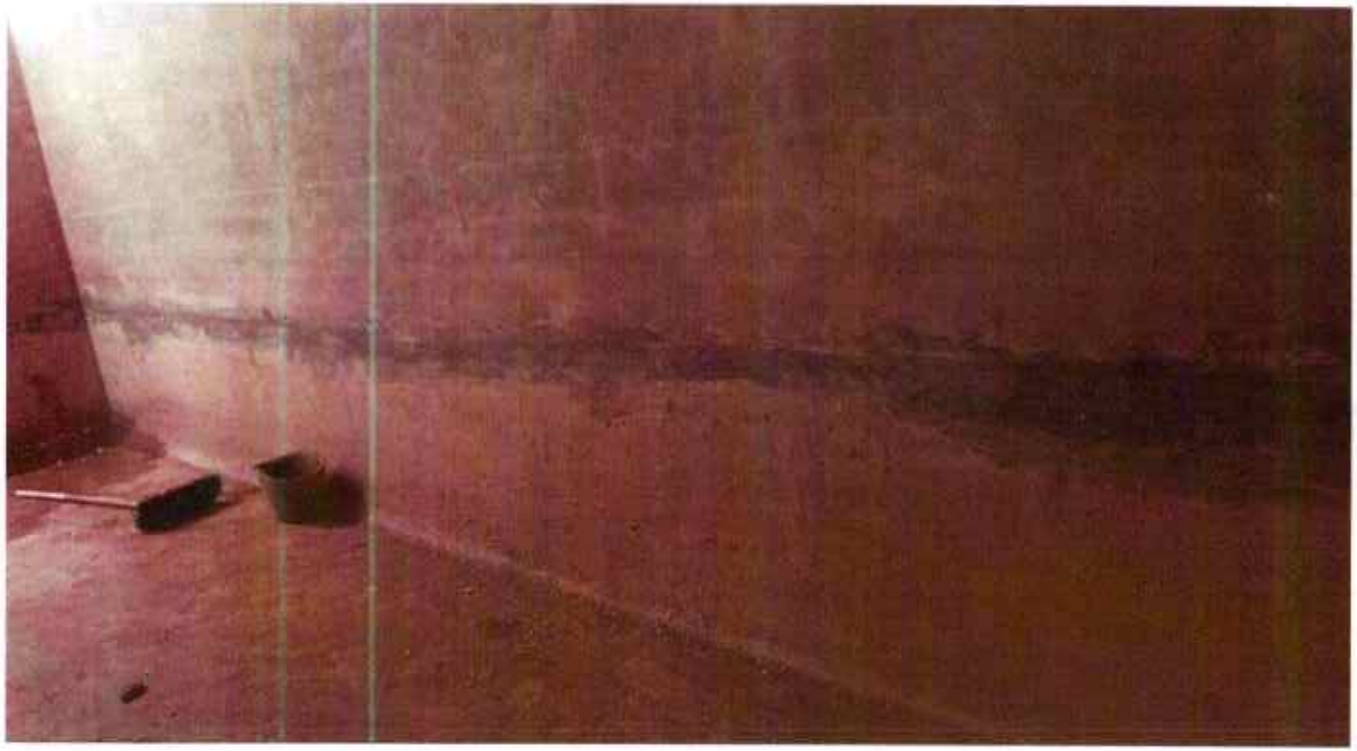

R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NA... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR... ...NAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECO ...NTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
7.1 NP	Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA	und

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE F					Subtotal		2,00
Planta de emergencia	2,00						2,00

Esquema

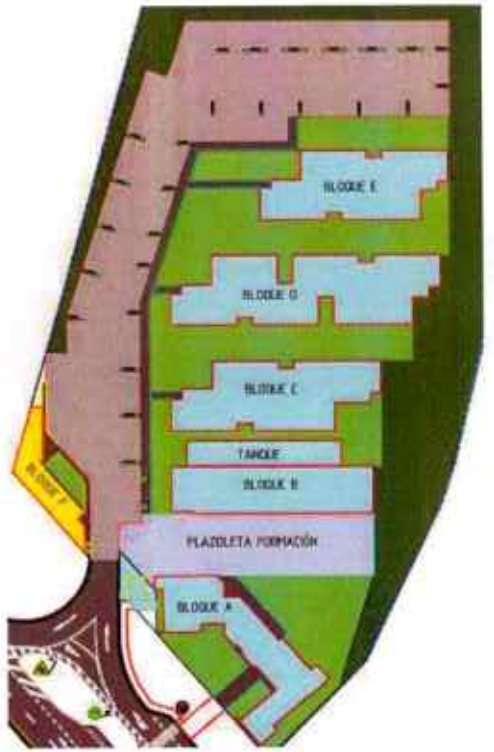

Ítem:	7.1 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	2,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
7.1 NP	Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP[illegible]EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR[illegible]E SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
7.1 NP	Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

COPIA POLIZAS Y APROBACIONES

SEGÚN CONTRATO INICIAL

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

GENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:	LP-SG-01362-2021 DE 10 DE JUNIO DEL 2021			
VALOR INICIAL (En números):	**$22.982.010.588.**			
PLAZO:	**17 MESES**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2246 DEL 06 DE JULIO DEL 2021 2247 DEL 06 DE JULIO DEL 2021			
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad de los bienes y equipos suministrados.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato.				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	5		
Otros amparos.				
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES(si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)				
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)				
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)				
VALOR TOTAL(En números):	**$22.982.010.588.**			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL			
POLIZA DE GARANTIA Nº:	No. NB-100176880 DEL 08/09/2021			
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Nº:	No. NB-100037857 DEL 08/09/2021			
VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	CUMPLIMIENTO 08/09/2021 AL 08/05/2023 PRESTACIONES SOCIALES 08/09/2021 AL 30/12/2025 ESTABILIDAD DE LA OBRA 30/12/2022 AL 30/12/2027	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	08/09/2021 AL 30/12/2022	

En San José de Cúcuta, a los 10 días del mes de septiembre del año 2021, en LA SECRETARIA DE GOBIERNO, se reunieron Los suscritos: La Doctora **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES**, Secretaria de Gobierno, y **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA** OCO. CCC. / Representante Legal **FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA**, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

Secretaria De Gobierno

Firma De Contratista

Reviso

1090407083

C.C

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71082926	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	08/09/2021	24:00 Horas del	30/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	TELÉFONO	3114568231
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	TELÉFONO	3114568231

OBJETO DE CONTRATO

'ARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA .LICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA _L ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 08/09/2021	24:00 Horas del 08/05/2023	2,298,201,059.00	6,879,492.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 08/09/2021	24:00 Horas del 30/12/2025	3,447,301,588.00	22,296,847.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 30/12/2022	24:00 Horas del 30/12/2027	6,894,603,176.00	58,636,239.00
		TOTAL ASEGURADO	12,640,105,823.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100.00

PRIMA BRUTA	$	87,814,577.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	87,814,577.00
GASTOS EXP.	$	7,800.00
IVA	$	16,686,252.00
TOTAL A PAGAR	$	104,508,629.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 08/09/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71082922	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	08/09/2021	24:00 Horas del	30/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR

ACLARACIONES:LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES. LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574,550,265.00	1,149,100,529.00	1,149,100,529.00	2,708,729.00
PATRONAL	344,730,158.00	344,730,158.00	344,730,158.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344,730,158.00	344,730,158.00	344,730,158.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344,730,158.00	344,730,158.00	344,730,158.00	0.00
		TOTAL ASEGURADO	1,149,100,529.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100.0

PRIMA BRUTA	$	2,708,729.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2,708,729.00
GASTOS EXP.	$	5,000.00
IVA	$	515,609.00
TOTAL A PAGAR	$	3,229,338.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 08/09/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y HASTA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71082922	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	08/09/2021	24:00 Horas del	30/12/2022					

CONDICIONES PARTICULARES

VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLE
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y ANSA - AFF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

SEGÚN ACTA DE INICIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2021.11.03 10:43:05 -05:00

Código de Seguridad: +eE3yOOFbQPNI9TU05263g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 00-04-2021-1217-P-05-PPSU5280000000059-ONNI

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121360	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	TELÉFONO	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	TELÉFONO	5755656

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2021, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

'OS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.
ARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 18/06/2023	2.298.201.059,00	6.879.491,72
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 09/02/2026	3.447.301.588,00	22.298.846,71
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/02/2023	24:00 Horas Del 09/02/2028	6.894.603.176,00	58.636.238,85
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.640.105.823,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	87.814.577,28
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	87.814.577,28
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	16.686.251,68
TOTAL A PAGAR	$	104.508.628,96

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/11/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121360	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PICA - AIP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2021.11.03 10:45:17 -05:00

Código de Seguridad: nK55dHb7uc2b5p5s8p36XQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100037857	**No. ANEXO**	4	**No. CERTIFICADO**	71121362	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	03/11/2021	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2021, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574,550,265.00	1,149,100,529.00	1.149.100.529,00	2.708.729,03
PATRONAL	344,730,158.00	344,730,158.00	344.730.158,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344,730,158.00	344,730,158.00	344.730.158,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344,730,158.00	344,730,158.00	344.730.158,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.149.100.529,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	2.708.729,03
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.708.729,03
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	515.608,52
TOTAL A PAGAR	$	3.229.337,55

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/11/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - 4PX

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121362	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIF

SEGÚN OTROSI Nº1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.027.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.24 15:43:32 -05:00

Código de Seguridad: KoX0C4IBP08e9XSQ6A58Jw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 08-04-2021-1317-P-05-PPSUS1R0000000959-D001

No. PÓLIZA	NB-100176888	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799630	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 # 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	**TELÉFONO**	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	**TELÉFONO**	5755656

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA POR (17) MESES MÁS ES DECIR HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL OTROSI ADICIONAL N 01 RECONOCIDO POR LA ENTIDAD ASEGURADA VIA SECOP EL 29/12/2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2022	24:00 Horas Del 01/10/2024	2.298.201.058,80	5.338.122,90
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2022	24:00 Horas Del 31/05/2027	3.447.301.588,20	6.743.488,59
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2024	24:00 Horas Del 31/05/2029	6.894.603.176,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.640.105.823,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	12.081.611,49
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	12.081.611,49
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	2.295.586,18
TOTAL A PAGAR	$	14.377.117,67

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799630	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.24 15:58:44 -05:00

Código de Seguridad: x3inXhSzYBr1h1HUzicovg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855680 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU5880000000027-2001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799634	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA POR (17) MESES MÁS ES DECIR HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL OTROSI ADICIONAL N 01 RECONOCIDO POR LA ENTIDAD ASEGURADA VIA SECOP EL 29/12/2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574.550.265,00	1.149.100.529,00	1.149.100.529,48	2.703.062,23
PATRONAL	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.149.100.529,48	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	2.703.062,23
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.703.062,23
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	513.581,82
TOTAL A PAGAR	$	3.216.644,05

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799634	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA AFF

SEGÚN REINICIO 1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.28 09:09:00 -05:00

Código de Seguridad: SbHOdeQZK60sdj0r3oe0VA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS20000000059-20001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71881968	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	TELÉFONO	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	TELÉFONO	5755656

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 14/02/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 03/11/2023

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (14/02/2023) HASTA (03/11/2023).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 17/06/2025	2.298.201.058,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 17/02/2028	3.447.301.588,20	3.711.752,12
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/02/2025	24:00 Horas Del 17/02/2030	6.894.603.176,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.640.105.823,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	3.711.752,12
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.711.752,12
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	785.232,90
TOTAL A PAGAR	$	4.416.985,02

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISCA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71001968	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA AIF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.28 09:09:51 -05:00

Código de Seguridad: 11+vWwnbxC8OTzrKLrRv0w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR0000000037-0001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71801969	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 14/02/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 03/11/2023

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (14/02/2023) HASTA (03/11/2023).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574.550.265,00	1.149.100.529,00	1.149.100.529,40	1.484.700,85
PATRONAL	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.149.100.529,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.484.700,85
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.484.700,85
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	282.093,16
TOTAL A PAGAR	$	1.766.794,01

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUJNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y ASA - AFV

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71801969	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

SEGÚN ADICIONAL Nº2

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

VaGENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO N° Y FECHA:	**LP-SG-01362-2021 del 10 de JUNIO del 2021**			
VALOR INICIAL (En números):	**$22.982.010.588**			
PLAZO:	**17 meses**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2246 del 06 de julio del 2021 2247 del 06 de julio del 2021			
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad de los bienes y equipos suministrados.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato.				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	5		
Otros amparos.				

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	ADICIONAL Y PRORROGA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	1371 DEL 12 DE ABRIL DEL 2024
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	**$11.490.240.893.09**
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	**12 MESES**
VALOR TOTAL (En números):	**$34.472.251.481.09**
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA DE GARANTIA N°:	NB-100176880 DEL 16 abril de 2024
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°:	NB-100037857 DEL 16 abril de 2024

VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	CUMPLIENTO 16/04/2024 AL 30/09/2025 PRESTACIONES SOCIALES 16/04/2024 AL 31/05/2028 ESTABILIDAD DE LA OBRA 31/05/2025 AL 31/05/2030	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	19/10/2021 AL 31/05/2025

En San José de Cúcuta, el 16 de abril del 2024, en LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CUIDADANA, se reunieron Los suscritos: **CR (RP) GORGE QUINTERO MEDINA,** secretario de Seguridad Ciudadana, y **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO – CCC/** Representante Legal **FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA**, actuando como contratista, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

Secretaria De Seguridad Ciudadana

Firma De Contratista

Reviso

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.16 11:53:45 -05:00

Código de Seguridad: /9fO8WaY+x/1QnjpzFUI8w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS20000000059-0001

No. PÓLIZA	NB-100176888	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930771	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5755656

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL OTRO SI ADICIONAL N°2 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS Y VALOR ASEGURADO.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/04/2024	24:00 Horas Del 30/09/2025	3.447.225.148,18	4.204.563,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 16/04/2024	24:00 Horas Del 31/05/2028	5.170.837.722,15	12.148.483,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2025	24:00 Horas Del 31/05/2030	10.341.675.444,38	32.623.690,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	48.968.656,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	48.968.656,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.304.044,64
TOTAL A PAGAR	$	58.272.700,64

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - ASFI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930771	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.16 11:51:21 -05:00

Código de Seguridad: Vp/WTc8F27ID8Eb1Pgg74w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-DNRI

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930786	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL OTRO SI ADICIONAL N°2 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS Y VALOR ASEGURADO.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	1.745.296,24
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.745.296,24
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.745.296,24
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	331.606,29
TOTAL A PAGAR	$	2.076.902,53

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - AFIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930786	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIF

SEGÚN SUSPENSION 2

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS

GENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:	CONTRATO OBRA PÚBLICA No LP-SG-01362-2021 (DE 31-08-2021)			
VALOR INICIAL (En números):	$22.982.010.588,00			
PLAZO:	17 MESES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	002246 DE 06-07-2021 002247 DE 06-07-2021			
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato.				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	5		
Otros amparos.				

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	MODIFICATORIO Y PRORROGA		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)	1371 DEL 12 DE ABRIL DEL 2024		
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	$11.490.240.893.09		
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	OTROSÍ No. 1 ADICIONA 17 MESES, HASTA 31 DE MAYO DE 2024 OTROSÍ No. 2 ADICIONA 12 MESES, HASTA 31 DE MAYO DE 2025 **MODIFICACIÓN DE 07-01-2022 MODIFICA FECHA TERMINACIÓN A 12-06-2025**		
VALOR TOTAL(En números):	$34.472.251.481 .09		
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL		
POLIZA DE GARANTIA Nº:	NB-100176880 - – ANEXO No 9, DE 16-01-2025		
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Nº:	NB-100037857 – ANEXO No 9, DE 16-01-2025		
VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	**CUMPLIMIENTO:** DE 26-12-2024 AL 12-10-2025 **SALARIOS Y P.S.:** DE 26-12-2024 AL 12-06-2028 **ESTAB. OBRA:** DE 12-06-2025 AL 12-06-2030	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	DE 19-10-2021 AL 12-06-2025

En San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de enero de 2025, en la SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, se reunieron Los suscritos: El Doctor **GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA,** Secretario de Seguridad Ciudadana del Departamento; El Sr. **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA,** en condición de R/L. de la **U.T. ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC,** actuando como contratista, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA
Secretario de Seguridad ciudadana de Norte de Santander

FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
R.L. U.T. Estación La Parada OCO - CCC

CARLOS ALBERTO BRAHÍM CASTRO
Supervisor

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 17:43:51 -05:00

Código de Seguridad: Z3IgGRHqYX0xLagk951FVQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS1R0000000S9-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246974	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA DCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # 8 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION SE DA CONOCIMIENTO AL PRESENTE DOCUMENTO DE FECHA 26/12/2024 Y FECHA REINICIO 07/01/2025.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 30/09/2025	3.447.225.148,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 31/05/2028	5.170.837.722,15	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2025	24:00 Horas Del 31/05/2030	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIGILADA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246974	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **8** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **30/12/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 17:44:22 -05:00

Código de Seguridad: 65XpnUWtISBHhS+DbyXqQw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSU5R0000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	**No. ANEXO**	8	**No. CERTIFICADO**	72246951	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30/12/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION SE DA CONOCIMIENTO AL PRESENTE DOCUMENTO DE FECHA 26/12/2024 Y FECHA DE REINICIO 07/01/2025.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.81362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	0,00
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246951	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE 723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
VIGILADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

SEGÚN REINICIO 2

seguros mundial®
. tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.16 09:40:45 -05:00

Código de Seguridad: cIc85/07qu4uGURut9PyWQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS3000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263473	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE REINICIO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE FECHA DE FIRMA 26/12/2024.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 12/06/2025

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 12/10/2025	3.447.225.148,18	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 12/06/2028	5.170.837.722,15	255.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/06/2025	24:00 Horas Del 12/06/2030	10.341.675.444,38	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	255.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	255.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	48.450,00
TOTAL A PAGAR	$	303.450,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARLA A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 1744A - 2PF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263473	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176888** y endoso, **9** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **16/01/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **16** días del mes **ENERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.16 09:35:56 -05:00

Código de Seguridad: AQ1d9NoTgBKB8KR1pUGwUw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSU5000000027-0001

No. PÓLIZA	RB-100037857	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263476	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE REINICIO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE FECHA DE FIRMA 26/12/2024.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 12/06/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	102.000,09
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	102.000,09
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	102.000,09
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	19.380,02
TOTAL A PAGAR	$	121.380,11

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Tomador

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO
APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FOLSA - APE

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263476	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA DCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VINCULADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVIA - AMP

SEGÚN SUSPENSION 3

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RECIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: mRLJGQGTYzUGSuo3s8ihyg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSU52N0000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176888	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72324349	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION N°3 SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE EL DOCUMENTO DE FECHA 24/02/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONE NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/02/2025	24:00 Horas Del 12/10/2025	3.447.225.148,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/02/2025	24:00 Horas Del 12/06/2028	5.170.837.722,15	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/06/2025	24:00 Horas Del 12/06/2030	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y ASIA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72324349	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **10** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **27/02/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **27** días del mes **FEBRERO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 2AWnfhJwAFqV4MCgQvIq6A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855602 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSU5880000000027-DW02

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72324338	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION N°3 SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE EL DOCUMENTO DE FECHA 24/02/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONE NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	0,00
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSAUTOMENSEGUROSMUNDIAL.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - 6/F

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	18	No. CERTIFICADO	72324338	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

SEGÚN REINICIO 3

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-09	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACIÓN	FECHA: 12/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	PÁGINA 1 DE 1	

CONTRATO / CONVENIO N.° Y FECHA:	**LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021**			
VALOR INICIAL (En números):	**($22.982.010.588)**			
PLAZO:	**17 MESES**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**2246 del 06 de junio del 2021** **2247 del 06 de julio de 2021**			
GARANTÍAS:	**INICIALES**	**(%)**	**NUEVAS (Si aplica)**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes para fiscales	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria				
Responsabilidad civil extracontractual	X	5		
Otros amparos.				
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si aplica y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	REINICIO			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A			
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A			
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A			
VALOR TOTAL (En números):	**34.472.251.481,09**			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL.			
POLIZA DE GARANTIA N.°:	**NB-100176800**	**P. RESPONSABILIDAD CIVIL N°:**	**NB-100037857**	
VIGENCIA G. (21/10/2025):	10/10/2025 al 26/01/2026 10/10/2025 al 26/05/2029 10/10/2025 al 26/01/2031	**VIGENCIA RC. (21/10/2025):**	19/10/2021 al 26/01/2026	

En San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de octubre de 2025, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reunieron, **CR (RP) GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA** secretario de despacho, en calidad de ordenador del gasto y **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** representada legalmente por **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA,** actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

CR GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA
SECRETARIO DE DESPACHO
Secretaría de Seguridad Ciudadana

FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C 1.090.407.083
CONTRATISTA

Tracabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó	María Carolina Flórez Montaja	Profesional Contratista Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Revisión técnica	Diana Isabel Bello Villamizar	Profesional Contratista Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Revisión jurídica	Mirella Arciniegas	Profesional Contratista Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Aprobó	Diana Patricia Contreras Contreras	Profesional Especializado Secretaría de Seguridad Ciudadana	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.22 09:03:04 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
(IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES)

Código de Seguridad: iF7VtBaFxgrwaX2GM8DoDQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 66-04-2021-1317-P-45-FPSU529000000055-0001

No. PÓLIZA NB-100176880	**No. ANEXO** 11		**No. CERTIFICADO** 72629715		**No. RIESGO**		
TIPO DE DOCUMENTO			**FECHA DE EXPEDICIÓN** 21/10/2025		**SUC. EXPEDIDORA** BOGOTA		
VIGENCIA DESDE		**VIGENCIA HASTA**		**DÍAS**	**VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE**		**VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA**
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	26/01/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 8 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549484
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	**TELÉFONO**	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	**TELÉFONO**	5956200

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LOS PRESENTES DOCUMENTOS SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE LOS SIGUEINTE DOCUMENTOS Y ASI MISMO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS:

** ACTA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 24/06/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 2 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/08/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/09/2025
**ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS N° 03 SE AJUSTA LA VIGENCIA COMO NUEVA DE TERMINACION 26/01/2026 DE FECHA DE REINICIO 10/10/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 26/01/2026	3.447.225.148,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 26/05/2029	5.170.837.722,15	4.845.004,11
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 26/01/2031	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	4.845.004,11
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	4.845.004,11
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	920.550,78
TOTAL A PAGAR	$	5.765.554,89

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

APARTADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA REASEGUROS Y VIDA - AMP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	72629755	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	26/01/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APP

seguros mundial®

Aliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **11** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **21/10/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **22** días del mes **OCTUBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.21 18:05:48 -05:00

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: VFLRnVr9z+zT9ALrzUUdZA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-96-PPSUS00000000027-DMRI

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	72629761	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	26/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BAR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LOS PRESENTES DOCUMENTOS SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE LOS SIGUEINTE DOCUMENTOS Y ASI MISMO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS:

** ACTA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 24/06/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 2 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/08/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/09/2025
**ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS N° 03 SE AJUSTA LA VIGENCIA COMO NUEVA DE TERMINACION 26/01/2026 DE FECHA DE REINICIO 10/10/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	1.938.881,64
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.938.881,64
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.938.881,64
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	368.220,31
TOTAL A PAGAR	$	2.306.221,95

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	72629761	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	26/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA A/F

ADICIONAL #2 Y PRORROGA #3

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-09	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACIÓN	FECHA: 12/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	PÁGINA 1 DE 1	

CONTRATO / CONVENIO N.° Y FECHA:	**LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021**			
VALOR INICIAL (En números):	**($34.472.251.481,09)**			
PLAZO:	**1.096 DIAS**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**2246 del 06 de junio del 2021 2247 del 06 de julio de 2021 1371 del 12 de abril de 2024**			
GARANTÍAS:	**INICIALES**	**(%)**	**NUEVAS (Si aplica)**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes para fiscales	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria				
Responsabilidad civil extracontractual.	X	5		
Otros amparos.				
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si aplica y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	ADICIONAL EN DINERO y EN TIEMPO			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N° 00 005031del 15/10/2025			
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	$2.583.294.926			
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	HASTA EL 31/03/2026			
VALOR TOTAL (En números):	**$37.055.546.407,09**			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL			
POLIZA DE GARANTIA N.°:	**NB-100176880**	**P. RESPONSABILIDAD CIVIL N°:**	**NB-100037857**	
VIGENCIA G. (31/03/2026):	10/10/2025 al 31/03/2026 10/10/2025 al 31/03/2026 10/10/2025 al 31/03/2031	**VIGENCIA RC. (31/03/2026):**	19/10/2021 al 31/06/2026	

En San José de Cúcuta, a los 18 días del mes de noviembre de 2025, en la Secretaria de Seguridad Ciudadana, se reunieron, **CR (RP) GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA** secretario de despacho, en calidad de ordenador del gasto y **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** representada legalmente por **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA**, actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

Cr ®GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA
SECRETARIO DE DESPACHO
Secretaria de Seguridad Ciudadana

FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C 1.090.407.083
CONTRATISTA

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó	María Carolina Pérez Montejo	Profesional Contratista Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Aprobó	Diana Patricia Colmenares Colmenares	Profesional Especializado Secretaría de Seguridad Ciudadana	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: YEh1q/52m8+VFTO+wD/myQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	72663210	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/10/2025	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL OTRO SI NO 3 AL PROCESO LICITACION PUBLICA LP-SG-01362-2021, SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA:

CUMPLIMIENTO 10/10/2025 31/03/2026
-PRESTACIONES 10/10/2025 31/07/2029
-ESTABILIDAD 31/03/2026 31/03/2031

-LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 31/03/2026	3.705.554.640,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 31/07/2029	5.558.331.961,05	1.587.682,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/03/2026	24:00 Horas Del 31/03/2031	11.116.663.922,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 20.380.550.523,85	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.587.682,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.587.682,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	286.444,38
TOTAL A PAGAR	$	1.794.046,38

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 660.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	72663210	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAOA AFF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

Asociación Panamericana de Factoring

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **13** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **13/11/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **13** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: LD05PUhJbhTVe9n7x23mdQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2835600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUSBR000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	12	No. CERTIFICADO	72653216	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LOS PRESENTES DOCUMENTOS SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE EL OTRO SI NO 3 AL PROCESO LICITACION PUBLICA LP SG 01362 2021 EL CUAL ADICIONAL AL VALOR DE CONTRATO $ 2.583.294.926 MODIFICA EL VALOR DE CONTRATO A $37.055.546.407, ASI MISMO MODIFICA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA 31/03/2026
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.886.287,00	1.852.777.320,00	1.852.777.320,35	653.560,48
PATRONAL	517.883.772,00	926.388.660,00	926.388.660,18	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.883.772,00	926.388.660,00	926.388.660,18	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.883.772,00	926.388.660,00	926.388.660,18	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.852.777.320,35	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	653.560,48
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	653.560,48
GASTOS EXP	$	0,00
IVA	$	124.176,49
TOTAL A PAGAR	$	777.736,97

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 660.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	12	No. CERTIFICADO	72653216	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ADICIONAL #3 Y PRORROGA #4

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: IKU1B7AUmFBeZ4wQOThQPw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS20000000059-0001

No. PÓLIZA	NB-100176888	No. ANEXO	14	No. CERTIFICADO	72810973	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA SE *JUSTA EL VALOR DEL CONTRATO COMO NUEVO VALOR $39.894.452.272 Y ASI MISMA LAS VIGENCIAS QUEDANDO CON FECHA DE TERMINACION 31/05/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 30/09/2026	3.989.445.227,20	5.873.951,29
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 31/05/2029	5.984.167.840,80	6.260.169,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2026	24:00 Horas Del 31/05/2031	11.968.335.681,60	7.243.176,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 21.941.948.749,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	19.377.296,29
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	19.377.296,29
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.681.686,30
TOTAL A PAGAR	$	23.058.982,59

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/02/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	14	No. CERTIFICADO	72810973	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/02/2026	SUC EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

---

*Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA: APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **14** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **18/02/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **18** días del mes **FEBRERO** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 7qrzKs3a+xham6YCpsH89A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPS0580000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	72818959	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO COMO NUEVO VALOR $39.894.452.272 Y ASI MISMA LAS VIGENCIAS QUEDANDO CON FECHA DE TERMINACION 31/05/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1.994.722.613,60	1.994.722.613,60	1.994.722.613,60	1.736.863,08
PATRONAL	997.361.306,80	997.361.306,80	997.361.306,80	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	997.361.306,80	997.361.306,80	997.361.306,80	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	997.361.306,80	997.361.306,80	997.361.306,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.994.722.613,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.736.863,08
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.736.863,08
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	330.003,99
TOTAL A PAGAR	$	2.066.867,07

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/02/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	72810959	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIP

PRORROGA #5

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Codigo de Seguridad: kC/z3NA/+ae3kxswXz5u2w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO: 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2000000019-0001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	15	No. CERTIFICADO	72969695	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/07/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD OTRO SI N°5 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L NELSON YOEL PARADA REYES SE AJUSTA LA VIGENCIAS COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION 31/07/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/05/2025	24:00 Horas Del 30/11/2026	3.989.445.227,20	1.200.112,56
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/05/2026	24:00 Horas Del 31/07/2029	5.984.167.840,80	1.500.140,71
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/07/2026	24:00 Horas Del 31/07/2031	11.968.335.681,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 21.941.948.749,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	2.700.253,27
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.700.253,27
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	513.048,12
TOTAL A PAGAR	$	3.213.301,39

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/06/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - AFP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	15	No. CERTIFICADO	72969695	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/07/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: B24006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **15** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **09/06/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **09** días del mes **JUNIO** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: El2bJU+D/urZMFmNuOr9yA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU0800000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	14	No. CERTIFICADO	72969697	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/07/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD OTRO SI N°5 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L NELSON YOEL PARADA REYES SE AJUSTA LA VIGENCIAS COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION 31/07/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1.994.722.613,60	1.994.722.613,60	1.994.722.613,60	600.056,28
PATRONAL	997.361.306,80	997.361.306,80	997.361.306,80	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	997.361.306,80	997.361.306,80	997.361.306,80	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	997.361.306,80	997.361.306,80	997.361.306,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.994.722.613,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	600.056,28
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	600.056,28
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	114.010,69
TOTAL A PAGAR	$	714.066,97

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/06/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA - AIPI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	14	No. CERTIFICADO	72969697	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/07/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA AIP

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

COPIA RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 21 B Y 22 AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

42. Correo electrónico utestacionlaparada@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 5 4 9 4 0 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 1 0 8 2 3	7 1 1 2	2 0 2 2 0 1 3 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código 7	1	4	1	6	4	8	5	2	5	5															

Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2026-03-24 / 02:56:19PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TRUJILLO AMAYA FELIX ANDRES

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-07-2026 05:09:19PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta	7

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 7 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 3 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 7 3 0	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta	7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 7 3 0			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 9 0 4 0 7 0 8 3	1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
RUJILLO	AMAYA	FELIX	ANDRES	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 1 3 1			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 2 7 3 2 5 6			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
PARADA	REYES	NELSON	YOEL	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 6 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta	7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 3 7 2 6	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CCC S.A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 7 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 2 1 3 8 6	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 9	2 0 2 1 0 7 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 4 5 1 4 3	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PEDELTA COLOMBIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 2 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	7 1 1 8 5 X 4 7	5	COLOMBIA 1 6

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GALAN	VILLAMIZAR	JAIME	ALBERTO

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 7 3 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 4 5 1 1 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8	2 0 2 1 0 7 3 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 5 de 6 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 3 4 5 8 4 8 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BERBESI	BARROSO	GERMAN	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 2 0 2 1 0 7 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242595843

(415)7707212489984(8020) 000014124259584 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	Impuestos de Cúcuta	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 1 0 6 0 3 6 0		2 7 4 1 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MOGOLLON	BAUTISTA	DAYVEL	DARILIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 6 3 9 3 2	8	LUNA ASESORES & CONSULTORES S.A.S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 8 3 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DEL CONTRATISTA MANIFESTANDO QUE NO TIENE INHABILIDAD

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

San José de Cúcuta, 28 de julio de 2026

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

PERSONA JURÍDICA

NELSON YOEL PARADA REYES, identificado con cedula de ciudadanía N° **88.273.256** y **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA**, identificada con cedula de ciudadanía N° **1.091.060.360** de **CHITAGA**, con tarjeta profesional N° **274197-T** de la Junta de Central de Contadores, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** y **CONTADOR PUBLICO** respectivamente de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6**, **CERTIFICAMOS** que la **UNIÓN TEMPORAL NO TIENE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE TIPO TRIBUTARIA**, para contratar con las entidades estatales de conformidad con lo establecido en la constitución nacional, así como en el artículo 8 de la ley 80 de 1993. Adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007, los artículos 1, 2 y 4 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes de las sanciones por transgresión a la misma, establecida en el artículo 26 numeral 7 y 52 de la ley 80 de 1993, así como los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral 1 de la norma precitada y declaro bajo la gravedad de juramento que la UNIÓN TEMPORAL NO se encuentra incursos en ninguna de ellas.

Cordialmente:

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256 de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.091.060.360
MOGOLLON BAUTISTA
APELLIDOS
DAYVEL DARILIANA
NOMBRES
Dayvel Mogollón
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997
CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-2503100-00756956-F-1091060360-20151021
0047102716G 2
44177949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274197-T



DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296337 308328

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A955563618E92939

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-06
FECHA DE PAGO:	2026-07-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37946426
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37946426
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	2	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 158.000	$ 160.500
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 526.900	$ 535.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	-$ 12.300	$ 798.100	$ 810.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 396.000	$ 402.100
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	$ 0	$ 0	$ 9.000	$ 584.700	$ 593.700
Subtotal Salud		5	31	$ 0	$ 0	$ 38.000	$ 2.463.700	$ 2.501.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 9.800	$ 633.600	$ 643.400
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 0	$ 0	$ 102.600	$ 6.671.000	$ 6.773.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 0	$ 42.100	$ 2.736.000	$ 2.778.100
[illegible]ensión		3	31	$ 0	$ 0	$ 154.500	$ 10.040.600	$ 10.195.100
	890903790	ARL SURA	31	$ 0	$ 0	$ 65.900	$ 4.286.500	$ 4.352.400
Subtotal ARL		1	31	$ 0	$ 0	$ 65.900	$ 4.286.500	$ 4.352.400
CCF37	890500516	COMFANORTE	31	$ 0	$ 0	$ 37.900	$ 2.463.700	$ 2.501.600
Subtotal CCF		1	31	$ 0	$ 0	$ 37.900	$ 2.463.700	$ 2.501.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 296.300	$ 19.254.500	$ 19.550.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2026


RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNI-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO DE SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Total
No.	ID	Nombre	Salario													
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		DESCTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		[illegible]							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
62.744.414	62.744.414	62.744.414	62.744.414	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				31	10.040.800	0	134.500	0	10.196.100
COLPENSIONES	05-14	900336004	7	19	2.700.000	0	42.100	0	2.778.100
PORVENIR	230301	800224808	8	19	6.617.000	0	100.600	0	6.773.600
PROTECCION	230201	800138739	3	3	650.800	0	9.800	0	943.400
EPS(Administradoras: 8)				31	2.483.700	0	38.000	0	2.501.700
SANITAS	EPS005	800251440	8	8	520.400	0	8.100	0	535.000
EPS-S CODSALUD	EGSC24	900226715	3	8	584.700	0	9.000	0	593.700
COMFAMBIENTE	CCFC90	890300575	6	2	180.000	0	2.500	0	182.800
NUEVA E.P.S. S.A	EPS037	900156264	2	10	790.100	0	12.300	0	810.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	8	390.200	0	6.100	0	403.100
ARP(Administradoras: 1)				31	4.286.500	0	65.900	0	4.352.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	31	4.286.500	0	65.900	0	4.352.400
CCF(Administradoras: 1)				31	2.483.700	0	57.900	0	2.501.600
COMFAMORTE	CCF37	890300518	3	31	2.483.700	0	37.900	0	2.501.600
Gran Total					19.294.500	0	296.300	0	19.550.800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	I001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ESPECIALISTAS I
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-06
FECHA DE PAGO:	2026-07-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37726282
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37726282
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-11	860802780	ARL SURA	3	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 365.700	$ 371.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 365.700	$ 371.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Y	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.400	5.700	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO PILA	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS
#	ID	NOMBRE	SALARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Y	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.400	5.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO PILA	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	[illegible]	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	365.700	0	5.700	0	371.400
ARL SURA	14-11	[illegible]	[illegible]	3	365.700	0	5.700	0	371.400
Gran Total					365.700	0	5.700	0	371.400

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSTRUCTORA MALLTRU SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900674003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	006
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PROFESIONALES CONTRATISTAS
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-02
FECHA DE PAGO:	2026-07-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37971919
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37971919
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	3	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 215.300	$ 219.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 299.300	$ 304.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	$ 0	$ 0	$ 10.100	$ 548.600	$ 558.700
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 79.200	$ 80.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 74.900	$ 76.300
Subtotal Salud		5	16	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 1.217.300	$ 1.239.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 11.600	$ 633.600	$ 645.200
230301	800224808	PORVENIR	11	$ 0	$ 0	$ 60.700	$ 3.313.200	$ 3.373.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 17.300	$ 940.100	$ 957.400
Pensión		3	16	$ 0	$ 0	$ 89.600	$ 4.886.900	$ 4.976.500
	890903790	ARL SURA	16	$ 0	$ 0	$ 38.600	$ 2.105.700	$ 2.144.300
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 38.600	$ 2.105.700	$ 2.144.300
CCF37	890500516	COMFANORTE	16	$ 0	$ 0	$ 22.200	$ 1.210.200	$ 1.232.400
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 22.200	$ 1.210.200	$ 1.232.400
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 172.900	$ 9.420.100	$ 9.593.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	CONSTRUCTORA [illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA [illegible]	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	AVENIDA [illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SG - R	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA
Nº APLICADOS	REF. DE PAGO (TN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA / PARAF / SENA / ICBF / ESAP / MEN	Total
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	111	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	1	[illegible]	3	196	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MEDIO DP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1	AVENIDA 3C 2-55 01 URBANIZACION EL ROS		[illegible]		[illegible]		0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	2026-07-27	TODOS LOS CENTROS	70000	70000	4,580,900	172,600	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (YYC)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15 de 15	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
30,838,345	30,838,345	30,838,845	30,841,754	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	OV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				15	4,806,900	0	68,600	0	4,875,500
PORVENIR	230301	800224808	8	11	3,313,200	0	60,700	0	3,373,900
COLPENSIONES	25-14	800306004	7	3	946,100	0	17,300	0	957,400
PROTECCION	230301	800138739	0	1	533,600	0	11,600	0	545,200
EPS(Administradores: 5)				15	1,317,300	0	23,500	0	1,230,800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	800230715	3	1	74,600	0	1,400	0	76,000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	800130264	3	1	548,600	0	10,100	0	558,700
COOSALUD	EPS042	800230715	3	1	79,200	0	1,500	0	80,700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800138264	2	4	299,300	0	5,300	0	304,600
COMFACRENTE	CCFC56	890500870	6	3	215,300	0	4,000	0	219,300
ARP(Administradores: 1)				15	2,105,700	0	38,600	0	2,144,300
ARL SURA	14-11	830031790	8	15	2,105,700	0	38,600	0	2,144,300
CCF(Administradores: 1)				15	1,210,200	0	22,200	0	1,232,400
COMFAMORTE	CCF37	890500816	3	15	1,210,200	0	22,200	0	1,232,400
Gran Total					8,420,100	0	172,600	0	8,592,200

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSTRUCTORA MALLTRU SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900674003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	005
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CUADRILLA MANUELITO
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-02
FECHA DE PAGO:	2026-07-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37952970
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37952970
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 126.400	$ 128.800
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 126.400	$ 128.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 9.900	$ 537.300	$ 547.200
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 9.900	$ 537.300	$ 547.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 219.800	$ 223.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 219.800	$ 223.900
CCF37	890500516	COMFANORTE	1	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 126.400	$ 128.800
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 126.400	$ 128.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 18.800	$ 1.009.900	$ 1.028.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	[illegible]	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAF	Total	Días de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PORVENIR [illegible]	NUEVA E.P.S. S.A. MOV. [illegible]	COMFANORTE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PORVENIR [illegible]	NUEVA E.P.S. S.A. MOV. [illegible]	COMFANORTE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	[illegible]	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.337.904	3.337.904	3.337.904	3.337.904	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	537.300	0	9.900	0	547.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	537.300	0	9.900	0	547.200
EPS(Administradoras: 1)				1	126.400	0	2.400	0	128.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	126.400	0	2.400	0	128.800
ARP(Administradoras: 1)				1	219.800	0	4.100	0	223.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	219.800	0	4.100	0	223.900
CCF(Administradoras: 1)				1	126.400	0	2.400	0	128.800
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	126.400	0	2.400	0	128.800
Gran Total					1.009.900	0	18.800	0	1.028.700


RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Total
N°	ID	EMPLEADO	SALARIO													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

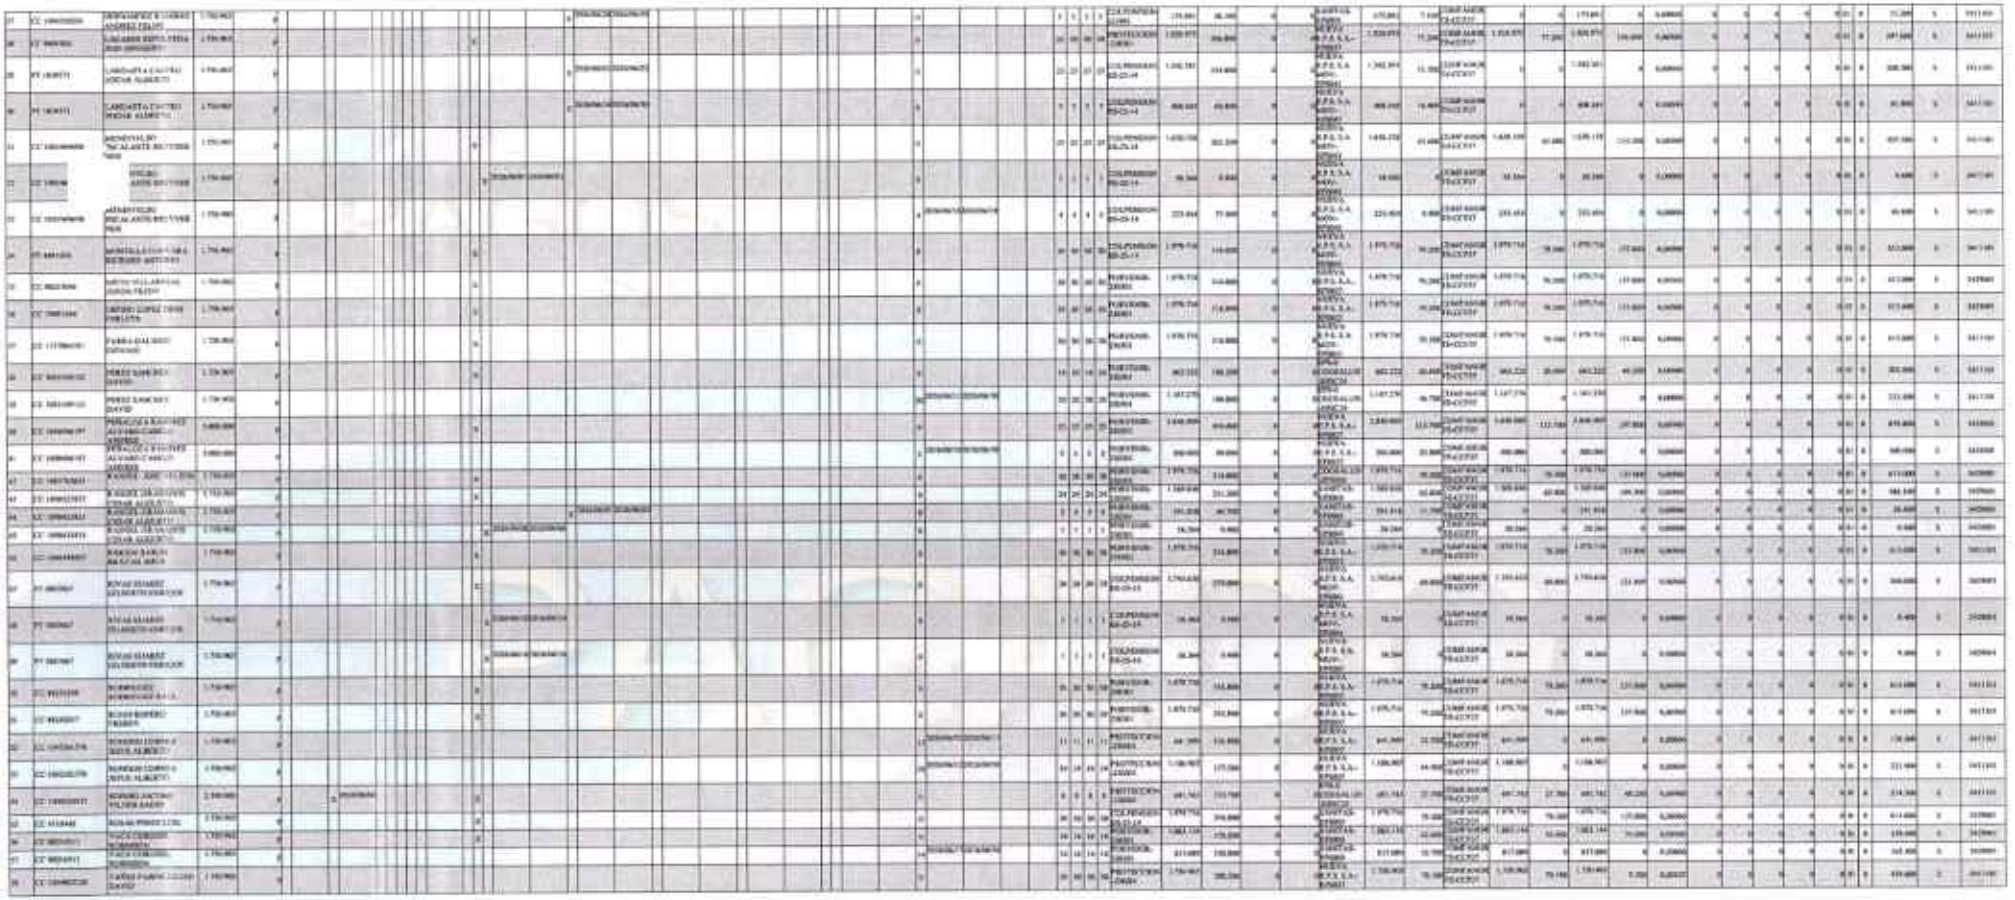

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37827013	E	2026-07-10	11000 LOS CEDITOS	11000	11001	22.313.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / TRX	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
37 de 37	37827013		Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
75.883.500	75.883.500	75.883.500	72.041.610	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				37	12.140.600	0	0	0	12.140.600
COLPENSIONES	05-14	900336004	7	9	2.754.300	0	0	0	2.754.300
PROTECCION	230301	800229739	0	9	3.798.100	0	0	0	3.798.100
PORVENIR	230301	800224808	8	18	6.344.800	0	0	0	6.344.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	283.400	0	0	0	283.400
EPS(Administradoras: 5)				37	3.023.600	0	0	0	3.023.600
SANITAS	EPS026	800251440	6	7	716.900	0	0	0	716.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800130907	2	15	1.306.700	0	0	0	1.306.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	9	669.400	0	0	0	669.400
EPS-S COOSALUD	ESSCH	900336715	3	6	253.600	0	0	0	253.600
COOSALUD	EPS047	900336715	3	2	158.400	0	0	0	158.400
ARP(Administradoras: 1)				37	4.493.600	0	0	0	4.493.600
ARL SURA	14-11	830039760	5	37	4.493.600	0	0	0	4.493.600
CCF(Administradoras: 1)				37	2.600.300	0	0	0	2.600.300
COMFANORTE	CCF37	890300518	3	37	2.600.300	0	0	0	2.600.300
Gran Total					22.313.300	0	0	0	22.313.300

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / PIN	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Total	Tipo	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO																
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	2.400.800	0	0	0	2.400.800
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.023.900	0	0	0	1.023.900
PROTECCION	230201	800227139	0	1	916.500	0	0	0	916.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	960.400	0	0	0	960.400
EPS(Administradoras: 3)				8	822.800	0	0	0	822.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800130907	2	4	356.300	0	0	0	356.300
EPS-S COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	158.400	0	0	0	158.400
COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	308.400	0	0	0	308.400
ARP(Administradoras: 1)				6	1.083.500	0	0	0	1.083.500
ARL SURA	14-11	800001700	5	6	1.083.500	0	0	0	1.083.500
CCF(Administradoras: 1)				6	822.800	0	0	0	822.800
COMFAMORTE	CCF57	890000518	3	6	822.800	0	0	0	822.800
Gran Total					4.810.900	0	0	0	4.810.900

PAGADO

RESUMEN PLANILLA ADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80348837	0	NELSON JAVIER DELY CALIXTO	1	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	23 3 URB BRISAS DEL NORTE		5865539		ILEANASEGURIDADSOCIAL@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37786288	1	2026-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	513.600	5.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37786288	2026-07-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIA	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDOL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Para/Rentas	Actividad Económica
1	CC 80348837	CALIXTO MELONCA JAVIER	1.750.905															0			30	30	30	30	COLPENSIONES 80-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	CCF-BINEST	0	0	1.750.905	9.200	0,00525	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1881201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80348837	0	NELSON JAVIER DELY CALIXTO	1	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7113	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	23 3 URB BRISAS DEL NORTE		5865539		ILEANASEGURIDADSOCIAL@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37786288	1	2026-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	513.600	5.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37786288	2026-07-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	2.900	0	283.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	2.900	0	283.100
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	2.300	0	221.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	2.300	0	221.200
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	100	0	9.300
ARL SURA	14-11	860903790	5	1	9.200	0	100	0	9.300
Gran Total					508.300	0	5.300	0	513.600

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ONEXIMO HENRY JAIMES PEREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-88234586
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-22
FECHA DE PAGO:	2026-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37726113
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37726113
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 218.900	$ 219.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 280.200	$ 281.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 499.100	$ 501.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÚNICA	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	CENTRO COMERCIAL VENTURA PLAZA [illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / PIN	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Total		
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NOMBRE	IBC	Cot.	[illegible]	[illegible]	NOMBRE	IBC	Cot.		NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total	[illegible]	[illegible]
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	COLPENSIONES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		NUEVA E.P.S. S.A. [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ÚNICA	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	CENTRO COMERCIAL VENTURA PLAZA [illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / PIN	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.300	0	281.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.300	0	1.300	0	281.600
EPS(Administradoras: 1)				1	218.800	0	1.000	0	219.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.800	0	1.000	0	219.800
Gran Total					499.100	0	2.300	0	501.400

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
901304394	3	[illegible]	6	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 8 # 4 39 APTO 202 BARRIO COMUNEROS		3112765665			INFORGOOSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37971697	E	2026-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4,449,500	20,000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	37971697	2026-07-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	ARPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	TRS DÍA	TRS VR	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 80196872	MENDOZA CACERES LUIS FERNANDO	1.750.905	F																		30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. (EX-A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	122.600	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	2711001
2	CC 88226549	ORGEDA URBINA YESID LEONARDO	1.750.905	F																		30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		EPS-S (ECOSALUD-EPSC24	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	122.600	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411201
3	CC 88210615	CHACON ANAYA EDWIN MAURICIO	1.750.905	F	X	X																2	2	2	2	PORVENIR-230501	116.727	16.700	0		NUEVA E.P.S. (EX-A. MOV-EPS043	116.727	6.700	COMFANORTE-CCF13	116.727	6.700	116.727	8.200	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	36.300	S	5411201
4	1007437869	GUEVARA MARQUEZ EUSTACIO	1.750.905	F																		30	30	30	30	PORVEDIR-230501	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	122.600	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411201
5	CC 1098176383	ORTIZ MARTINEZ CARLOS ALEJO	1.750.905	F																		30	30	30	30	COLPENSION-23-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. (EX-A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	122.600	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411201
6	CC 1094301784	BAUTISTA RODRIGUEZ EDWIN ANTONIO	1.750.905	F																		30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. (EX-A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	122.600	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	2711001
7	CC 1096393153	GARCIA CONTRERAS HIGN FREDDY	1.750.905	F	X																	23	23	23	23	PORVENIR-230501	1.225.634	196.300	0		EPS-S (ECOSALUD-EPSC24	1.225.634	49.100	COMFANORTE-CCF37	1.225.634	49.100	1.225.634	85.800	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	379.900	S	5411201
8	CC 1098[illegible]	GARCIA CONTRERAS CESAR EDUARDO	1.750.905	F	X																	23	23	23	23	PORVENIR-230501	1.225.634	196.300	0		NUEVA E.P.S. (EX-A.-EPS037	1.225.634	49.100	COMFANORTE-CCF37	1.225.634	49.100	1.225.634	85.800	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	379.900	S	5411201
9	CC 1091023641	ACEVEDO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1.750.905	F	X																	23	23	23	23	PORVENIR-230501	1.225.634	196.300	0		NUEVA E.P.S. (EX-A.-EPS037	1.225.634	49.100	COMFANORTE-CCF37	1.225.634	49.100	1.225.634	85.800	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	379.900	S	5411201
10	CC 1134454656	ORTIZ MARTINEZ PEDRO ENRIQ	1.750.905	F																		30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. (EX-A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	122.600	0,696964	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411201

PAGADO

RESUMEN PLANILLA A

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901394384	3	[illegible] SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 9 4 33 APTO 202 BARRIO COMUNEROS		3113765465		INFOBICOOSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37971897	E	2026-07-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.449.500	20.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	37971897	2026-07-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
14.299.059	14.299.059	14.299.059	14.299.059	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				10	2.288.500	0	10.200	0	2.298.700
PORVENIR	230301	800224808	8	9	2.008.300	0	8.900	0	2.017.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	1.300	0	281.500
EPS(Administradoras: 4)				10	572.600	0	2.800	0	575.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	119.200	0	600	0	119.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	4.700	0	100	0	4.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	378.800	0	1.700	0	380.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	400	0	70.500
ARP(Administradoras: 1)				10	995.800	0	4.400	0	1.000.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	995.800	0	4.400	0	1.000.200
CCF(Administradoras: 1)				10	572.600	0	2.600	0	575.200
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	10	572.600	0	2.600	0	575.200
Gran Total					4.429.500	0	20.000	0	4.449.500

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37875334
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOSE RAFAEL CACERES RUBIO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88251310	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 2 N 7E 07 LC 3 BR QUINTA ORIENTAL	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	LIBAR933@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3002900323
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE CONTRATISTA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		37875334

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88251310	59	No	No	No	54	1	5429001	Salario	CACERES RUBIO JOSE RAFAEL	$3.200.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88251310																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88251310	COLPENSIONES	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88251310	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.200.000	0.1250000	$400.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	1	0.0052200	$16.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88251310	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$512.000	$0	$0	$0	$0	3	$1.200	$0	$0	$513.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$400.000	$0	0	$0	0	$0	$400.000	3	$900	$0	$400.900	$0	0	$0	$0	$400.900	$0	$0	$400.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$16.800	0	$0	$0	$16.800	3	$100	$16.900	0	$0	$169	$16.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	3	$0	$0
SENA	0	$0	3	$0	$0
ICBF	0	$0	3	$0	$0
ESAP	0	$0	3	$0	$0
MinEdu	0	$0	3	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$400.900
PENSIONES	1	$513.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$16.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$931.000

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA MANIFESTANDO LA VERACIDAD DE LOS APORTES

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER".

CERTIFICA

Que, FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC** Nit. 901.514.217-6, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato de obra pública No. LP-SG-01362-2021 del 31 de agosto del 2021 para el pago de acta de recibo parcial No. 15, que presento pagos de pensión, salud y riesgos profesionales correspondientes al periodo establecido entre el 22 de junio del 2026 al 26 de julio del 2026; al igual se dio cumplimiento en las actividades establecidas en dicho periodo.

San José de Cúcuta, julio 27 del 2026.

Ing. Lidia Shirley Parra García
Representante Legal Interventoria
Unión Temporal Inter Seguridad

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DEL CONTADOR MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES, CON COPIA DE DOCUMENTOS DEL CONTADOR

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

San José de Cúcuta, 28 de julio de 2026

CON EL FIN DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 50 DE LA LEY 789 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002 Y LA LEY 228 DE 2003, SE INDICA LO SIGUIENTE:

CERTIFICAMOS LOS ABAJO FIRMANTES QUE:

El **ESTACIÓN LA PARADA LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6,** con Representación legal de **NELSON YOEL PARADA REYES,** identificado con C.C. **88.273.256** expedida en **CÚCUTA,** ha realizado el pagos de los aportes del personal en el periodo comprendido **22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2026**, dando así cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones que le corresponde respecto al Sistema de Seguridad Social, los correspondiente a SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES DE PENSIÓN y al momento de esta certificación se encuentra al dia y a paz y salvo con estas entidades.

Se expide la presente certificación con destino al **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - NIT 800.103.927-7**, para realizar el cobro del **ACTA PARCIAL N° 015** del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Atentamente,

DAYVEL DARILIANA MOGOLLON BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC **88.273.256** de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360

MOGOLLON BAUTISTA

APELLIDOS

DAYVEL DARILIANA

NOMBRES

Dayvel Mogollón

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503100-00756956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274197-T

DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295337 308328



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A955563618E92939

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

COPIA DE ACTAS DE SUSPENSION, REINICIO, APROBACION APU NO PREVISTOS, MODIFICACION DE CANTIDADES (SI APLICA)

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA DEL ACTA	FEBRERO 14 DEL 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE GOBIRNO
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO TOTAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	N/A.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

OBSERVACIONES:
Información soporte consignada en acta de reunión 14 de febrero del 2023 adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Especiales, se reunieron los suscritos a saber: **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES** – Secretaria De Gobierno Ordenadora del Gasto - **ING FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR**, Asesor de proyectos - Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de suspender el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **14 DE FEBRERO DEL 2023**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta, hasta superar las circunstancias que originaron la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
Supervisor
Asesor de Proyectos Especiales

TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES
Secretaria De Gobierno
Ordenadora del Gasto

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

PROYECTÓ: ING WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA – PROFESIONAL CONTRATADO

REVISÓ: VIVIAN CAMILA CHACÓN – ABOGADO EXTERNA SG

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

FECHA DEL ACTA	NOVIEMBRE 03 DE 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 AGOSTO 31 DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217 - 6
REPRESENTANTE	FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C. o N.I.T.	1.090.407.083 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	$22.982.010.588,00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DIESISIETE MESES (17) - PRÓRROGA
GARANTIAS	NB–100176880
FECHA DE APROBACIÓN	
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR** Enero 01 de 2022
INTERVENTOR **(Externo)**	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	FEBRERO 14 DE 2023

En San José de Cúcuta, en las oficinas de secretaria de gobierno, se reunieron los suscritos a saber **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES**, Ordenador del Gasto, **ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR**, Supervisor, **LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA** representante legal **UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD** Interventor (Externo) y **FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA** representante legal **UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato No. LP-SG-01362-2021 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA
OCO-CCC
Contratista

ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
Supervisor

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD
Interventoría

TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES
Ordenador del Gasto

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

Proyectó: ING. WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA – APOYO A LA SUPERVISIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

FECHA DEL ACTA	DICIEMBRE 26 DEL 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA -- MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

Y REINICIACIÓN	2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OBSERVACIONES:
Información soporte consignada en acta de reunión 26 de diciembre del 2024 adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Espaciales, se reunieron los suscritos a saber: **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de suspender el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **26 DE DICIEMBRE DEL 2023**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta, hasta superar las circunstancias que originaron la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que efecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

PROYECTÓ: ING WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA – PROFESIONAL CONTRATADO

Vo.Bo.: GEORGE QUINTERO – SECRETARIA SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 02

FECHA DEL ACTA	ENERO 07 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
GARANTIAS	NB-100176880
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Especiales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE QUINTERO,** ordenador del gasto. **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato **No. LP-SG-01362-2021** a partir de la fecha de suscripción de la

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 02

presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión el día 26 de diciembre de 2024.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

GEORGE QUINTERO
Ordenador del Gasto
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03

FECHA DEL ACTA	FEBRERO 24 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CUCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03

Y REINICIACIÓN	2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ACTA DE REINICIO No 2 DEL 07 DE ENERO DE 2025

OBSERVACIONES:
Información soporte consignada en acta de reunión 24 de febrero del 2025 adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Espaciales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE EDINSON QUINTERO MEDINA,** ordenador del gasto, **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de suspender por un termino de 4 meses el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **24 DE FEBRERO DEL 2025**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta, hasta superar las circunstancias que originaron la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

CR (RP) GEORGE EDINSON QUINTERO M
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03

FECHA DEL ACTA	JUNIO 24 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No 1	ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($11.490.149.893,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO ($34.472.251.481,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM

ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03

(Acto administrativo y fecha de designación)	
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ACTA DE REINICIO No 2 DEL 07 DE ENERO DE 2025 ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025

OBSERVACIONES:
La información de soporte se encuentra consignada en los oficios emitidos por el contratista de obra y la interventoría, dirigidos a la entidad contratante el 17 de junio de 2025.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Espaciales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE EDINSON QUINTERO MEDINA,** ordenador del gasto, **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de prorrogar la suspensión No 3 por un término de 2 meses el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **24 DE JUNIO DEL 2025**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

CR (RP) GEORGE EDINSON QUINTERO M
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: Toda suspensión y reinicialción que afecte al contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

ACTA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03

FECHA DEL ACTA	AGOSTO 25 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE

ACTA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03

Y REINICIACIÓN	2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ACTA DE REINICIO No 2 DEL 07 DE ENERO DE 2025 ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 ACTA DE PRORROGA No.01 A LA SUSPENSION No. 3 DEL 24 DE JUNIO DE 2025

OBSERVACIONES:
La información de soporte el acta de comité realizado con el ministerio del interior el día 01 de agosto de 2025, adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Espaciales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE EDINSON QUINTERO MEDINA,** ordenador del gasto, **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de prorrogar la suspensión No 3 por un término de 1 mes el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **24 DE AGOSTO DEL 2025**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

CR (RP) GEORGE EDINSON QUINTERO M
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

MUNICIPIO:	Departamento de Norte de Santander (Municipio de Villa del Rosario)	No. CONVENIO:	1546 de 2020
FECHA DE ACTA INICIO:	24 de febrero de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	30 de noviembre de 2025
ELABORÓ:	ARQ. GONZALO FLOREZ PEÑA	FECHA DE VISITA:	01/08/2025
TIPO DE PROYECTO: (CIC, Sacúdete CAMs, Estaciones de Policía)	ESTACION DE POLCIIA		

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1.	CARLOS BRAHIM	SUPERVISOR	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
2	DIANA BASTO	APOYO SECREATRIO DE SEGURIDAD	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
3	DIANA COLMENARES	JEFE ÁREA D EPLANEACIÓN	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
4.	VITERBO GÓMEZ	SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
5.	GONZALO FLOREZ PEÑA	APOYO SUPERVISIÓN	MINISTERIO DEL INTERIOR
6	MANUEL JOYA PEÑARANDA	APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO APTOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
7.	YOEL PARADA	DIRECTOR DE OBRA	UT. ESTACIÓN LA PARADA OCO CCC
8	ERIKA SANABRIA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	UT INTERSEGURIDAD
9.	ANDRÉS FELIPE PÉREZ	AUXILIAR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	UT INTERSEGURIDAD
10.	RAMON ANTONIO ARANGO	APOYO SUPERVISION	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio - Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar).
Autopista Internacional No. 9-190 sector La Parada

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Obra: LP-SG-01362-2021	UT. ESTACIÓN LA PARADA OCO CCC	19/07/2021	24/08//2025
Interventoría: SM-SG-1568-2021	U.T. INTERSEGURIDAD	19/07/2021	24-/08/2025

Powered by CamScanner

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO(adjuntar celdas si es necesario)	VALOR	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO
PAGO No. 2 SEGÚN FACTURA FE-2 DEL 17/04/2024 OTRO SI ADICIONAL No. 2 CONTRATO No. LP-SG 01362 DE 2021.CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	$ 2.148.830.293,49	1431	18/04/2024
PAGO SEGÚN FACTURA FE-6 DEL 15/10/2024 OTRO SI ADICIONAL No. 2 CONTRATO No. LP-SG 01362 DE 2021.CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.743.263.131,00	012565	25/10/2024

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	$ 0,00

DESARROLLO DE LA VISITA

Siendo las 2:45 pm se da inicio al comité presencial en el marco del convenio No. 1546 de 2020. Si bien el mismo se encuentra suspendido desde el 24 de febrero de 2025 de acuerdo con Acta de Suspensión 01 suscrita por parte del Ministerio del Interior, Departamento de Norte de Santander y Municipio de Villa del Rosario, por el atentado terrorista sucedido el 19 de febrero de 2025 que afecto el proyecto, el presente comité busca realizar seguimiento a las acciones que permitan dar continuidad a la ejecución del convenio y los contratos derivados.

Al presente comité asistieron los funcionarios del Ministerio del Interior, Departamento de Norte de Santander, Contratista de Estudios, diseños, obra e Interventoría, para lo cual se presentan cada uno de los asistentes y se solicita diligenciar el listado de asistencia anexo en el chat de la reunión. El Municipio de Villa del Rosario no asistió al comité incumpliendo las obligaciones del convenio.

Se realiza la presentación por parte de cada uno de los asistentes al comité.

ESTADO DEL CONVENIO

El Convenio No.1546 de 2020, se suspendió a partir del 24 de febrero de 2025, fecha de reinicio 25 de agosto de 2025 y vencimiento el 30 de noviembre de 2025. Durante este lapso de tiempo se adelantará el proceso licitatorio, contratación y se desarrollará el estudio patológico que permitirá conocer el estado actual de las estructuras del proyecto y definir las acciones para la continuidad de la obra y del convenio.

Powered by CamScanner

El Arquitecto GONZALO FLÓREZ PEÑA, informa que se avanza en el trámite para la ampliación No. 01 de la suspensión No.01, la cual se ampliará hasta el 24 de septiembre de 2025 y terminación del convenio el 30 de diciembre de 2025.

Con respecto a la póliza se remitió a la aprobación al Departamento de Norte de Santander, para lo pertinente.

ESTADO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

Los Contratos derivados fueron suspendidos con fecha del 24 de febrero de 2025, fecha de reinicio 23 de junio de 2025 y vencimiento el 24 de agosto de 2025. La Gobernación de Norte de Santander, manifiesta que la suspensión va hasta el 24 de agosto de 2025. La interventoría informa que se solicitará un mes más de suspensión para ir de manera paralela con el convenio macro.

El Arquitecto GONZALO FLÓREZ PEÑA apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, indica a los asistentes que de manera posterior a los hechos del 19 de febrero de 2025 se han realizado comités de seguimiento siendo el último el 25 de julio de 2025, con el objetivo de definir las acciones necesarias para el reinicio y continuidad del convenio y los contratos derivados.

De acuerdo con los compromisos tenemos:

1. **Estudio Patología estado de las obras:** El 1 de agosto de 2025, se realizó la socialización por parte del Contratista de la Patología y el Gobernador del Departamento de Norte de Santander. Dentro de los presentado el resultado indicó la necesidad de $2.761.932.475,00 para adelantar las labores de reforzamiento, reparaciones individuales. Se solicita por parte del Ministerio del Interior al Departamento de Norte de Santander él envió del drive con el resultado de la Patología. El Departamento de Norte de Santander, realizará la revisión del producto para el 8 de agosto de 2025 y definir acciones para la disponibilidad del recurso.
2. **Muro de Cerramiento:** El ingeniero CARLOS BRAHIM, indica que se entregó el presupuesto a la Secretaría de Seguridad. La Arquitecta DIANA BASTO, manifiesta que se avanza en los documentos de la etapa precontractual. Se deben presentar el viernes 8 de agosto de 2025.
3. **Carril de desaceleración y obras exteriores de urbanismo:** El ingeniero CARLOS BRAHIM, indica que se entregó el presupuesto a la Secretaría de Seguridad. Para adelantar los trámites precontractuales. Se deben presentar el viernes 8 de agosto de 2025.
4. **Cobertura de las Pólizas:** De acuerdo con lo indicado se exponen el tema de la cobertura de las pólizas y coberturas por parte de las entidades, ya se indicó que no se cuenta con cobertura.

El Arquitecto GONZALO FLÓREZ manifiesta que una vez se socialice los resultados de la patología se definirán con el Departamento de Norte de Santander y el Municipio de Villa del Rosario las acciones para continuar con la ejecución. El Departamento de Norte de Santander indica que se avanza en la revisión presupuestal del resultado de la patología.

Powered by CamScanner

El Ingeniero VITERBO GOMÉZ supervisor por parte del Ministerio del Interior, se adopten las acciones necesarias de carácter inmediato que permitan reiniciar el convenio y los contratos derivados, y avanzar para dar cumplimiento al objeto contractual.

DOCUMENTOS PENDIENTES

1. Documentos precontractuales MURO DE CERRAMIENTO.
2. Documentos precontractuales carril de desaceleración.
3. Minuta de prorroga 2 suspensión de los contratos derivados hasta el 24 de septiembre de 2025.
4. Revisión del producto de la patología.

Para realizar seguimiento a los compromisos, se realizará nuevo comité presencial el viernes 8 de agosto de 2025 a las 11:00 am

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1. Drive de los documentos de la patología

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Departamento de Norte de Santander	Documentos precontractuales carril de desaceleración-	08/08/2025
Departamento de Norte de Santander.	Comité de seguimiento compromisos	08/08/2025
Departamento de Norte de Santander	Documentos precontractuales muro de cerramiento	08/08/2025
Departamento de Norte de Santander	Revisión del producto de la patología	08/08/2025
Departamento de Norte de Santander	Minutas ampliación de la suspensión contratos derivadas	15/08/2025

FIRMA DE ASISTENTES

Por parte de: Ministerio del Interior.	*Por parte de:* Dpto Norte de Sder.
Nombre y firma:	**Nombre y firma:**
Cargo: Profesional especializado.	Cargo: Supervisor
Email: viterbo.gomez@mininterior.gov.co	Email: carlos.graham@ndsgov.co
Celular: 3125214954	Celular: 3214523981.

Powered by CamScanner

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	5 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Por parte de: Contratista Lyrgon Nombre y firma: Cargo: Apoyo Social Email: [illegible] Celular: [illegible]	Por parte de: Gobernacion SPPEE Nombre y firma: Cargo: Apoyo Patologia Email: ing.civil.ramon@gmail.com Celular: 3058127938
Por parte de: Interventoria Nombre y firma: Andres Felipe Perez Cruz Cargo: Apoyo Interventoria Email: Ing.AndresPerez.FP@Gmail.com Celular: 3219457632	Por parte de: Nombre y firma: Cargo: Apoyo Sec. Seguridad Email: olibasto1@hotmail.com Celular: 3134639393
Por parte de: Interventoria Nombre y firma: Erika M. Sanabria Cargo: Residente Interventoria Email: Sanabriaerika28@gmail.com Celular: 3125277774	Por parte de: Contratista Nombre y firma: Cargo: Director UT Estacion la Ponda Email: utestacionlaponda@gmail.com Celular: 3008955380
Por parte de: Interventoria. Nombre y firma: Manuel Julio Peñaranda Cargo: Apoyo supervision EPPEE Email: Ingmanueljaya@gmail.com Celular: 3136633710	Por parte de: Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:
Por parte de: Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:	Por parte de: Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:

Powered by CamScanner

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: Comité Seguimiento Convenio Nº 1546-2020 - Socialización Topologías

Responsable u organizador: Departamento de Norte Santander | Dependencia: Sec. Privadas

Ciudad: Cúcuta | Lugar y/o enlace: | ☒Presencial ☐Virtual | Fecha: Día 01, Mes 08, Año 2025 | Hora inicial | Hora final

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE):** Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Gerardo A. Flórez Parra	88420.013						X		Mintrabajo Apoyo	Apoyo	gerardoflorez@mininterior.gov.co	3136090614	
2	Diana P. Colmenares C	60346534						X		Sec. Seguridad	Prof. Especial.	dcortdeoriente.gov.co	3142289719	
3	Manuel Joya Pedraranda	1090402079						X		Gobernación SPPEE	Apoyo Patología	Ingmanuel.joya@gmail.com	3136633710	
4	Carlos Beatón	88222142						•		Gobernac	Supervis.	carlos.bratum@nds.gov.co	3214528984	
5	Diana Isabel Barb	1.193.518.47						X		Sec. Seguridad	Apoyo Sec. Seguridad	d.barbatch@hotmail.com	3134629393	
6	Vitelbo Gómez Carvajal	91.494.253						X		Ministerio del Interior.	Supervisor	vitelbo.gomezc@gmail.c	3125221034	
7	Andrés Felipe Pérez Ruiz	1093189216						X		Interventoría	Apoyo de Ingeniería	IngAndresperez44@Gmail.com	3219452632	
8	Ezra M. Sanabria	1030981537						X		Interventoría	Residente Interventoría	Sanabriaerezra@gmail.com	3125777774	
9	Joel Parada R	92732256						X		Contratista	Director	Utestecnicaparada@gmail.com	3004955380	
10	Ramon Antonio Arango R	1093799501						X		Gobernacion SPPEE	Apoyo Patología	ingramon.civil@gmail.com arangocargo938@gmail.com	3058129936	
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

ACTA DE PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 03

FECHA DEL ACTA	SEPTIEMBRE 25 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE

ACTA DE PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 03

Y REINICIACIÓN	2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ACTA DE REINICIO No 2 DEL 07 DE ENERO DE 2025 ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 ACTA DE PRORROGA No.01 A LA SUSPENSION No. 3 DEL 24 DE JUNIO DE 2025 ACTA DE PRORROGA No.02 A LA SUSPENSION No. 3 DEL 24 DE AGOSTO DE 2025

OBSERVACIONES:
Se están realizando los ajustes de BPIN y por lo que se debe hacer el reinicio con las actividades propias de la patología.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Espaciales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE EDINSON QUINTERO MEDINA,** ordenador del gasto, **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de prorrogar la suspensión No 3 por un término de 15 días el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta.
Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

CR (RP) GEORGE EDINSON QUINTERO M
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 03

FECHA DEL ACTA	OCTUBRE 10 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
GARANTIAS	NB-100176880
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ACTA DE REINICIO No 2 DEL 07 DE ENERO DE 2025. ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 03

	ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No 3 DEL 24 JUNIO DE 2025 ACTA DE PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 3 DE 25 AGOSTO DEL 2025 ACTA DE PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No 3 DE 25 SEPTIEMBRE DEL 2025

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Especiales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE QUINTERO,** ordenador del gasto. **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato **No. LP-SG-01362-2021** a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión el día 24 de febrero del 2025.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

GEORGE QUINTERO
Ordenador del Gasto
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA MANIFESTANDO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA EL COBRO DE ACTA PARCIAL

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER".

CERTIFICA

Que, **LA UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC** Nit. 901.514.217-6 cuyo representante legal es FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato de obra pública No. LP-SG-01362-2021 del 31 de agosto del 2021 y ha presentado la documentación de forma completa y veraz para el pago de Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 comprendido entre el periodo del 25 de mayo del 2026 al 21 de junio del 2026, según los lineamentos y requerimientos exigidos por la entidad contratante.

San José de Cúcuta, julio 27 del 2026.

Ing. Lidia Shirley Parra García
Representante Legal Interventoría
Unión Temporal Inter Seguridad

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA E INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LAPARADA OCO – CCC

INFORME DE OBRA PARA PARCIAL No.15

CONTRATO DE OBRA
LP-SG-01362-2021

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LAPARADA OCO-CCC
NIT: 901514217-6
NELSON YOEL PARADA REYES R/L.

INTERVENTOR
UNION TEMPORAL INTER-SEGURIDAD
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA R/L.

OBJETO DEL CONTRATO
"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)."

PERIODO
22 DE JUNIO DE 2026 AL 26 DE JULIO DEL 2026

CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 7
1.3 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 8
1.4 JUSTIFICACIÓN 8
2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL 9
2.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA 9
2.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 10
3 OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO 15
4 DESARROLLO DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO 20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Condiciones del Contrato de Obra 9
Tabla 2 Pólizas suscripción del contrato 10
Tabla 3 Pólizas acta de inicio 10
Tabla 4 Pólizas Otrosí prorroga No.1 11
Tabla 5 Pólizas suspensión No.1 y reinicio No. 1 11
Tabla 6 Pólizas Otrosí Adicional No. 1 y prorroga No.2 12
Tabla 7 Pólizas suspensión No.2 y reinicio No. 2 12
Tabla 8 Pólizas suspensión No.3 y reinicio No. 3 13
Tabla 9 Pólizas Otrosí adicional No.2 y prorroga No.3 13
Tabla 10 Pólizas Otrosí adicional No.3 y prorroga No.4 14
Tabla 10 Pólizas Otrosí prorroga No.5 14
Tabla 11. Obras ejecutadas durante el periodo de cobro 15

LISTA DE IMÁGENES

Ilustración 1 - Localización del proyecto. 6
Ilustración 2 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg....20
Ilustración 3 - Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.. 20
Ilustración 4 - Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad....21
Ilustración 5 - Filos y dilataciones. 21
Ilustración 6 - Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo. 22
Ilustración 7 - Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. 22
Ilustración 8 - Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m....23
Ilustración 9 - Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior....23
Ilustración 10 - Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco. 24
Ilustración 11 - Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco. ...24
Ilustración 12 - Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido. ..25
Ilustración 13 - Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. 25
Ilustración 14 - Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. 26
Ilustración 15 Tubería ASTM A-53, ERW, black Steel, SCH 40-4 plg....26
Ilustración 16 - Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada....27
Ilustración 17 - Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. 27
Ilustración 18 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. 28
Ilustración 19 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. 28
Ilustración 20 - Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. 29
Ilustración 21 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. 29
Ilustración 22 - Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. 30
Ilustración 23 - Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. 30
Ilustración 24 - Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. 31
Ilustración 25 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. 31
Ilustración 26 - Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria. 32
Ilustración 27 - Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. 32
Ilustración 28 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg. 33
Ilustración 29 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg. 33
Ilustración 30 -) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. 34
Ilustración 31 - Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. 34
Ilustración 32 - Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg....35
Ilustración 33 - Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg. 35
Ilustración 34 - Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. 36
Ilustración 35 - Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg. 36
Ilustración 36 - Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega. 37
Ilustración 37 - Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo. 37
Ilustración 38 - Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio. 38
Ilustración 39 - Rejillas para cunetas pluviales. 38
Ilustración 40 - PATOLOGIA_Puertas de ascensor....39
Ilustración 41 - PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural. 39
Ilustración 42 - PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural. 40
Ilustración 43 - PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. 40
Ilustración 44 - PATOLOGIA_ Pañete liso para muro en mortero 1:4....41
Ilustración 45 - PATOLOGIA_ Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa, incluye acero de refuerzo. 41

Ilustración 46 - PATOLOGIA_ Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 42
Ilustración 47 - PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 42
Ilustración 48 - PATOLOGIA_Acero de refuerzo. 43
Ilustración 49 - Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 43
Ilustración 50 - PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. 44
Ilustración 51 - PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. 44
Ilustración 52 - PATOLOGIA_Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 45
Ilustración 53 - PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 45
Ilustración 54 - PATOLOGIA_ Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta. 46
Ilustración 55 - PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. 46
Ilustración 56 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) 47
Ilustración 57 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC - presión RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) 47
Ilustración 58 - PATOLOGIA_ PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) 48
Ilustración 59 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) 48
Ilustración 60 - PATOLOGIA_Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg. 49
Ilustración 61 – PATOLOGIA_ Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación. 49
Ilustración 62 – PATOLOGIA_ Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Reparación. 50
Ilustración 63 – PATOLOGIA_ Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. 50
Ilustración 64 – PATOLOGIA_ Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. 51
Ilustración 65 – PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg. 51
Ilustración 66 – PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg. 52
Ilustración 67 – PATOLOGIA_ Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg. 52
Ilustración 68 – PATOLOGIA_ Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4 53
Ilustración 69 – PATOLOGIA_ Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. 53
Ilustración 70 – PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. 54
Ilustración 71 – PATOLOGIA_ Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo 54
Ilustración 72 – PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. 55
Ilustración 73 – PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg. 55
Ilustración 74 – PATOLOGIA_ Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados. 56
Ilustración 75 – PATOLOGIA_ Sum./Inst. Baterías de Planta de emergencia de 150 KVA 56

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto de ejecución denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)" Se encuentra localizado en el municipio de Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander en el nororiente de Colombia, en zona fronteriza con Venezuela, sobre la Ruta Nacional 7010, a 840 m del Puente Internacional Simón Bolívar, con coordenadas Geográficas 7°49'22.09"N y 72° 27'24.52"O.

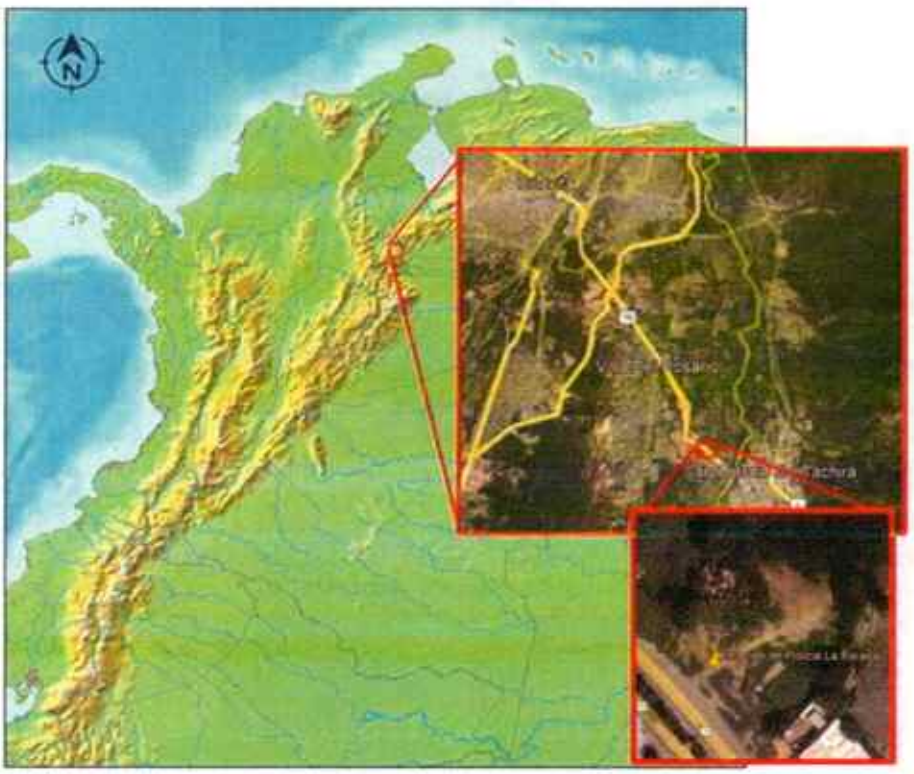


Ilustración 1 - Localización del proyecto.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Villa del Rosario es un municipio fronterizo del Departamento Norte de Santander, está ubicado en la subregión Oriental, con una población aproximada de 111.254 Habitantes (DANE,2020), de los cuales la población urbana es el 97.1%, y la gran mayoría de la población pertenece a los estratos I y II.

La seguridad ciudadana ha adquirido una importancia creciente en las capitales de los departamentos como respuesta al temor creciente de la población frente a los actuales niveles inéditos de delincuencia, el incremento constante de violencias en el ámbito privado y al impacto de temas de carácter social en la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos; violaciones de derechos humanos, amenazas al medio ambiente, problemas de convivencia, accesibilidad a los servicios básicos, ineficiente provisión de servicios sociales y demás inseguridades económicas y sociales que afectan el pleno desarrollo de los individuos. Es por lo tanto el principal tema del debate público y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, referenciando los siguientes datos estadísticos Secuestros 13 de personas a 2017, Tasa de homicidios 47.5, Tasa de hurtos 179 2017, Tasa de violencia intrafamiliar 124.1.

Durante el año 2015 la dirección general de la policía nacional de Colombia y el comando de policía metropolitana de Cúcuta, han ordenado el apoyo de manera temporal, permanente efectiva y de impacto jurisdicción del Municipio de Villa del Rosario que por alguna circunstancia se ha dificultado el cumplimiento de los objetivos trazados en su lucha

En el sector la parada municipio de villa del rosario, se exterioriza por la presencia de bandas criminales quienes por la situación de zona fronteriza del municipio con la república bolivariana de Venezuela y en su afán de controlar la actividad ilícita, del contrabando, transporte ilegal, extensión, el hurto en todas sus modalidades y el tráfico de estupefacientes, generan los homicidios y las lesiones personales, en esta zona de frontera se tiene injerencia y control de los grupos de delincuencia común organizada- GDCO y del bloque CARLOS GERMAN VELAZCO VILLAMIZAR del ELN.

Los hechos se estarían presentando por el control de los pasos no habilitados entre la zona de frontera de Colombia y Venezuela en las trochas conocidas como el Tomito, La Playita y Los Mangos, con el propósito de obtener un control que permita fortalecer las rentas criminales de las estructuras.

En las zona limítrofe o fronteriza, se encuentran ubicadas las trochas que comunican con el vecino país, las cuales son utilizadas para el transporte ilegal de mercancía e hidrocarburos, asimismo, esto es aprovechado por grupos al margen de la Ley para el cobro de cuotas extorsivas, en los 31 kilómetros de frontera, que están siendo disputados por grupos de delincuencia común organizada.

1.3 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

Por lo anterior, el Departamento Norte de Santander a través de la Secretaria de Gobierno, está interesada en contratar por el sistema de precios unitarios fijos, por medio del proceso de Licitación Pública, las obras para el proceso de ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

1.4 JUSTIFICACIÓN

En virtud de lo consagrado por el artículo 2 la ley 1150 de 2007 y lo adicionado por el numeral 1 del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, "(...) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo" No tratándose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el mercado, es conclusión que no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de selección de contratación directa señaladas en el artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007.

No siendo aplicable las causales establecidas en artículo 2, numeral 2, literal a, c, d, e, f, g, h, i, de la ley 1150 de 2007, por tratarse de un contrato con objeto complejo como lo es la obra pública, es consecuencia, que la escogencia del contratista debe efectuarse bien por la modalidad de selección a aplicar es la de LICITACIÓN PÚBLICA, de acuerdo con lo consagrado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, decreto 1082 de 2015 y la ley 1882 de 2018; de acuerdo con la cuantía del contrato y los parámetros legales para determinar la menor cuantía.

Teniendo como parámetro el monto del presupuesto LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER para la vigencia 2021, así como el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, el presupuesto oficial se establece en la suma de VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 23.057.009.317,00), en el cual se encuentran incluidos todos los costos de diseños y obras.

Que, el Gobernador del Departamento Norte de Santander, mediante decreto No. 00252 del 11 de febrero de 2020 del departamento, delegó a los secretarios de despacho de la administración Departamental la competencia de expedir los actos administrativos y en general, ejecutar la actividad precontractual, contractual y postcontractual desde la generación de la necesidad, elaboración estudios previos, convocatoria, suscripción de contratos y acta e inicio, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la normatividad contractual vigente y el Manual de Contratación.

2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC
C.C. o N.I.T.	901514217-6
REPRESENTANTE	NELSON YOEL PARADA REYES
CEDULA	1090407083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)"
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2246 del 06 de Julio del 2021 No. 00 2247 del 06 de Julio del 2021 No. 00 001371 del 12 de Abril del 2024 No. 00 005031 del 15 de Octubre del 2025 No. 00 001367 del 12 de Enero del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3572 del 31 de Agosto del 2021 No. 00 001232 del 15 de Abril del 2024 No. 00 005393 del 31 de Octubre del 2025 No. 00 002851 del 11 de Febrero del 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($22.982.010.588,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.1	($11.490.240.893,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.2	($2.583.294.926,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.3	($2.838.905.865,00) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO	($39.894.452.272,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	DIECISIETE (17) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL NORORIENTE DE COLOMBIA, EN ZONA FRONTERIZA CON VENEZUELA, SOBRE LA RUTA NACIONAL 7010, A 840 M DEL PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 7°49'22.09"N Y 72°27'24.52"O
FECHA DE INICIO	19/10/2021
PRORROGA	No.1 del 29 de Diciembre del 2022 (DIECISIETE (17) MESES) No.2 del 15 de Abril del 2024 (DOCE (12) MESES) No. 3 del 31 de Octubre del 2025 (DOS (2) MESES) No. 4 del 11 de Febrero 2026 (DOS (2) MESES) No. 5 de 28 de Mayo 2026 (DOS (2) MESES)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/06/2026
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD
REPRESENTANTE	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO BRAHIM

Tabla 1. Condiciones del Contrato de Obra

2.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 0 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 08/09/2021	Cumplimiento	$ 2,298,201,059.00	08/09/2021 a 08/05/2023
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.00	08/09/2021 a 30/12/2025
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.00	30/12/2022 a 30/12/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 0 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 08/09/2021	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.00	08/09/2021 a 30/12/2022
	Patronal	$ 344,730,158.00	08/09/2021 a 30/12/2022
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.00	08/09/2021 a 30/12/2022
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.00	08/09/2021 a 30/12/2022

Tabla 2 Pólizas suscripción del contrato

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 4 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 03/11/2021	Cumplimiento	$ 2,298,201,059.00	19/10/2021 a 18/06/2023
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.00	19/10/2021 a 09/02/2026
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.00	09/02/2023 a 09/02/2028
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 4 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 03/11/2021	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.00	19/10/2021 a 09/02/2023
	Patronal	$ 344,730,158.00	19/10/2021 a 09/02/2023
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.00	19/10/2021 a 09/02/2023
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.00	19/10/2021 a 09/02/2023

Tabla 3 Pólizas acta de inicio

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 5 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 24/11/2023	Cumplimiento	$ 2,298,201,058.80	29/12/2022 a 01/10/2024
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.20	29/12/2022 a 31/05/2027
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.40	31/05/2024 a 31/05/2029
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 5 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 24/11/2023	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.40	19/10/2021 a 31/05/2024
	Patronal	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 31/05/2024
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 31/05/2024
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 31/05/2024

Tabla 4 Pólizas Otrosí prorroga No.1

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 6 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 28/11/2023	Cumplimiento	$ 2,298,201,058.80	03/11/2023 a 17/06/2025
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.20	03/11/2023 a 17/02/2028
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.40	17/02/2025 a 17/02/2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 6 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 28/11/2023	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.40	19/10/2021 a 17/02/2025
	Patronal	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 17/02/2025
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 17/02/2025
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 17/02/2025

Tabla 5 Pólizas suspensión No.1 y reinicio No. 1

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 7 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/04/2024	Cumplimiento	$ 3,447,225,148.10	16/04/2024 a 30/09/2025
	Prestaciones Sociales	$ 5,170,837,722.15	16/04/2024 a 31/05/2028
	Estabilidad de la Obra	$ 10,341,675,444.30	31/05/2025 a 31/05/2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 7 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/04/2024	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 31/05/2025
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/05/2025
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/05/2025
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/05/2025

Tabla 6 Pólizas Otrosí Adicional No. 1 y prorroga No.2

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 9 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/01/2025	Cumplimiento	$ 3,447,225,148.10	26/12/2024 a 12/10/2025
	Prestaciones Sociales	$ 5,170,837,722.15	26/12/2024 a 12/06/2028
	Estabilidad de la Obra	$ 10,341,675,444.30	12/06/2025 a 12/06/2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 9 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/01/2025	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 12/06/2025
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 12/06/2025
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 12/06/2025
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 12/06/2025

Tabla 7 Pólizas suspensión No.2 y reinicio No. 2

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 11 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 21/10/2025	Cumplimiento	$ 3,447,225,148.10	10/10/2025 a 26/01/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,170,837,722.15	10/10/2025 a 26/05/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 10,341,675,444.30	26/01/2026 a 26/01/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 11 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 21/10/2025	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 26/01/2026
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 26/01/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 26/01/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 26/01/2026

Tabla 8 Pólizas suspensión No.3 y reinicio No. 3

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 13 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 13/11/2025	Cumplimiento	$ 3,705,554,640.70	10/10/2025 a 31/03/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,558,331,961.05	10/10/2025 a 31/07/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 11,116,663,922.10	31/03/2026 a 31/03/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 12 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 05/11/2025	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 31/03/2026
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/03/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/03/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/03/2026

Tabla 9 Pólizas Otrosí adicional No.2 y prorroga No.3

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 14 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 18/02/2026	Cumplimiento	$ 3,989,445,227.20	19/10/2021 a 30/09/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,984,167,840.80	19/10/2025 a 31/05/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 11,968,335,681.60	31/05/2026 a 31/05/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 12 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 18/02/2026	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,994,722,613.60	19/10/2021 a 31/05/2026
	Patronal	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/05/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/05/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/05/2026

Tabla 10 Pólizas Otrosi adicional No.3 y prorroga No.4

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 15 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 18/02/2026	Cumplimiento	$ 3,989,445,227.20	19/05/2025 a 30/11/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,984,167,840.80	19/05/2026 a 31/07/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 11,968,335,681.60	31/07/2026 a 31/07/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 14 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 18/02/2026	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,994,722,613.60	19/10/2021 a 31/07/2026
	Patronal	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/07/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/07/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/07/2026

Tabla 11 Pólizas Otrosi prorroga No.5

3 OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO

Tabla 12. Obras ejecutadas durante el periodo de cobro

4	***ESTRUCTURAS EN CONCRETO***				
4,005	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg.	m³	0,98	$ 1.153.307	$ 1.130.241
4,005AP	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg. Incremento de precios 2025	m³	0,98	$ 223.103	$ 218.641
7	***PISOS Y MAMPOSTERIA***				
7,001	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²	198,34	$ 97.675	$ 19.372.860
7,001AP	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m. Incremento de precios 2025	m²	198,34	$ 14.912	$ 2.957.646
7,003	Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad.	m	18,25	$ 18.456	$ 336.822
7,003AP	Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad. Incremento de precios 2025	m	18,25	$ 3.745	$ 68.346
7,004	Filos y dilataciones.	m	2554,00	$ 10.759	$ 27.478.486
7,004AP	Filos y dilataciones. Incremento de precios 2025	m	2554,00	$ 1.958	$ 5.000.732
7,007	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo.	m	393,85	$ 60.829	$ 23.957.502
7,007AP	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo. Incremento de precios 2025	m	393,85	$ 11.850	$ 4.667.123
7,008	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.	m	107,39	$ 58.094	$ 6.238.715
7,008AP	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. Incremento de precios 2025	m	107,39	$ 6.369	$ 683.967
7,009	Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m.	m²	92,00	$ 71.498	$ 6.577.816
7,009AP	Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m. Incremento de precios 2025	m²	92,00	$ 15.274	$ 1.405.208
8	***ENCHAPES Y ACABADOS***				
8,010	Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior.	m²	2514,37	$ 30.644	$ 77.050.354
8,010AP	Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior. Incremento de precios 2025	m²	2514,37	$ 5.247	$ 13.192.899
8,012	Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco.	m²	281,66	$ 99.864	$ 28.127.694
8,012AP	Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco. Incremento de precios 2025	m²	281,66	$ 8.548	$ 2.407.630
8,013	Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco.	m²	330,67	$ 110.501	$ 36.539.366
8,013AP	Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco. Incremento de precios 2025	m²	330,67	$ 9.231	$ 3.052.415
8,016	Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido.	m	43,60	$ 704.751	$ 30.727.144
8,016AP	Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido. Incremento de precios 2025	m	43,60	$ 153.573	$ 6.695.783
9	***CUBIERTA***				
9,001	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m²	33,05	$ 49.766	$ 1.644.766
9,001AP	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. Incremento de precios 2025	m²	33,05	$ 7.941	$ 262.450
9,002	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²	105,45	$ 74.805	$ 7.888.187

9,002AP	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. Incremento de precios 2025	m²	105,45	$	11.658	$	1.229.336
16	***SISTEMA HIDRÁULICO DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO***						
16,001	Tuberia ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg.	m	20,59	$	361.361	$	7.440.423
16,001AP	Tuberia ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg. Incremento de precios 2025	m	20,59	$	22.457	$	462.390
16,017	Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	1,89	$	196.568	$	371.514
16,017AP	Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. Incremento de precios 2025	und	1,89	$	12.590	$	23.795
16,018	Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	3,62	$	582.154	$	2.107.397
16,018AP	Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. Incremento de precios 2025	und	3,62	$	11.511	$	41.670
17	***SISTEMA DE ACUEDUCTO***						
17,003	Sum./inst. Tuberia PVC Presion RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	8,07	$	81.249	$	655.679
17,003AP	Sum./inst. Tuberia PVC Presion RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	8,07	$	8.057	$	65.020
20	***INSTALACIONES HIDRÁULICAS***						
20,002	Sum./inst. Tuberia PVC Presion RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	343,97	$	34.142	$	11.743.824
20,002AP	Sum./inst. Tuberia PVC Presion RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	343,97	$	4.685	$	1.611.499
20,003	Sum./inst. Tuberia PVC - Presion RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	153,77	$	28.698	$	4.412.891
20,003AP	Sum./inst. Tuberia PVC - Presion RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	153,77	$	4.685	$	720.412
20,004	Sum./inst. Tuberia PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	150,86	$	36.501	$	5.506.541
20,004AP	Sum./inst. Tuberia PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	150,86	$	4.685	$	706.779
20,006	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.	und	107,00	$	64.121	$	6.860.947
20,006AP	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. Incremento de precios 2025	und	107,00	$	7.460	$	798.220
20,011	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.	und	4,00	$	378.640	$	1.514.560
20,011AP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	4,00	$	40.289	$	161.156
20,012	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.	und	2,00	$	396.238	$	792.476
20,012AP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	2,00	$	40.289	$	80.578
21	***INSTALACIONES SANITARIAS***						
21,002	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg.	m	53,08	$	76.783	$	4.075.642
21,002AP	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg. Incremento de precios 2025	m	53,08	$	8.207	$	435.628
21,005	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und	61,00	$	156.852	$	9.567.972
21,005AP	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria. Incremento de precios 2025	und	61,00	$	15.653	$	954.833

21,006	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und	14,00	$	215.982	$	3.023.748
21,006AP	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria. Incremento de precios 2025	und	14,00	$	16.057	$	224.798
21,007	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg.	m	27,35	$	51.957	$	1.421.023
21,007AP	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg. Incremento de precios 2025	m	27,35	$	10.906	$	298.279
21,008	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg.	m	11,80	$	61.494	$	725.629
21,008AP	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg. Incremento de precios 2025	m	11,80	$	6.968	$	82.222
22	***INSTALACIONES PLUVIALES***						
22,001	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg.	m	8,41	$	42.137	$	354.372
22,001AP	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. Incremento de precios 2025	m	8,41	$	4.477	$	37.652
22,005	Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.	und	7,00	$	80.405	$	562.835
22,005AP	Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. Incremento de precios 2025	und	7,00	$	13.832	$	96.824
24	***ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN***						
24,006	Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg.	und	7,00	$	867.896	$	6.075.272
24,006AP	Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg. Incremento de precios 2025	und	7,00	$	35.090	$	245.630
26	***DUCTERÍA ELECTRICA***						
26,008	Sum./Inst. Tuberia EMT Ø 1plg.	m	11,56	$	64.842	$	749.574
26,008AP	Sum./Inst. Tuberia EMT Ø 1plg. Incremento de precios 2025	m	11,56	$	5.445	$	62.944
26,009	Sum./Inst. Tuberia EMT Ø 3/4plg.	m	312,12	$	49.593	$	15.478.967
26,009AP	Sum./Inst. Tuberia EMT Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	312,12	$	5.682	$	1.773.466
26,011	Sum./Inst. Tuberia SCH 40 Ø 3/4plg.	m	373,20	$	70.916	$	26.465.851
26,011AP	Sum./Inst. Tuberia SCH 40 Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	373,20	$	7.748	$	2.891.554
29	***REDES INTERNAS Y URBANISMO***						
29,018	Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega	und	22,00	$	62.672	$	1.378.784
29,018AP	Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega Incremento de precios 2025	und	22,00	$	7.748	$	170.456
32	***SISTEMA DE APANTALLAMIENTO***						
32,003	Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo.	m	20,99	$	139.564	$	2.929.448
32,003AP	Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo. Incremento de precios 2025	m	20,99	$	10.889	$	228.560
32,004	Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio.	m	97,85	$	48.150	$	4.711.478
32,004AP	Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio. Incremento de precios 2025	m	97,85	$	8.057	$	788.377
41	***ITEMS NO PREVISTOS***						
41,020	Rejillas para cunetas pluviales	m²	26,42	$	1.214.646	$	32.090.947
1,0	***BLOQUE A***						
1,1	***PRELIMINARES***						
1.1.4 NP	Puertas de ascensor	und	2,00	$	4.501.026	$	9.002.052
2,0	***BLOQUE B***						
2,2	***ESTRUCTURAS EN CONCRETO***						
2.2.4	Acero de refuerzo.	kg	18,41	$	9.983	$	183.787
2,3	***PUENTES DE ADHERENCIA***						
2.3.4	Reparacion estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural .	m	50,00	$	99.035	$	4.951.750
2,4	***MAMPOSTERIA Y PAÑETES***						

2.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²	15,61	$	133.510	$	2.084.091
2.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²	153,56	$	39.343	$	6.041.511
2.4.5	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	12,60	$	104.852	$	1.321.135
3,0	***BLOQUE C***						
3,1	***PRELIMINARES***						
3.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²	154,86	$	12.010	$	1.859.812
3,2	***ESTRUCTURAS EN CONCRETO***						
3.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	0,55	$	1.482.151	$	815.183
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg	2246,95	$	9.983	$	22.431.302
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	1,39	$	1.761.098	$	2.447.926
3,4	***MAMPOSTERIA Y PAÑETES***						
3.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²	228,24	$	133.510	$	30.472.322
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²	175,80	$	322.418	$	56.681.084
3.4.3	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	19,80	$	75.412	$	1.493.158
3.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	222,21	$	104.852	$	23.299.163
3.4.8	Alfaja en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta.	m	48,30	$	63.200	$	3.052.560
3,5	***IMPERMEABILIZACIONES***						
3.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²	348,89	$	81.595	$	28.467.680
3,6	***HIDRAULICO***						
3.6.1	Sum./inst. tuberia PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m	13,00	$	38.442	$	499.746
3.6.2 NP	Sum./inst. tuberia PVC - presion RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m	3,00	$	60.195	$	180.585
3.6.3 NP	Sum./inst. tuberia PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios.	m	69,00	$	30.798	$	2.125.062
3.6.4 NP	Sum./inst. tuberia PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios.	m	3,00	$	36.713	$	110.139
3.6.5 NP	Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg.	und	15,00	$	76.738	$	1.151.070
3.6.8 NP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und	1,00	$	406.979	$	406.979
3.6.9 NP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und	3,00	$	407.891	$	1.223.673
3,7	***SANITARIO***						
3.7.3	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und	6,00	$	156.887	$	941.322
3.7.4	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und	1,00	$	223.908	$	223.908
3,8	***PLUVIAL***						
3.8.1	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	m	31,00	$	57.470	$	1.781.570
3.8.2	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg.	m	1,50	$	131.567	$	197.351
3.8.3	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	und	4,00	$	82.171	$	328.684
4,0	***BLOQUE D***						
4,4	***MAMPOSTERIA Y PAÑETES***						
4.4.2	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4.	m²	2,00	$	50.736	$	101.472
5,0	***BLOQUE E***						
5,1	***PRELIMINARES***						
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m	5,45	$	153.560	$	836.902

5,4	***MAMPOSTERIA Y PAÑETES***				
5.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²	2,22	$ 133.510	$ 296.392
5.4.6	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo.	m	3,60	$ 58.258	$ 209.729
5,5	***IMPERMEABILIZACIONES***				
5.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²	255,04	$ 81.595	$ 20.809.989
5,9	***ELECTRICO***				
5.9.2	Sum./inst. tuberia EMT ø 3/4plg.	m	10,00	$ 53.975	$ 539.750
6,0	***TANQUE SUBTERRANEO***				
6,1	Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados.	m	88,61	$ 606.873	$ 53.775.017
7,0	***BLOQUE F***				
7.1 NP	Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA	und	2,00	$ 682.678	$ 1.365.356

De acuerdo con lo indicado en la tabla 11, las actividades ejecutadas en el acta parcial No.15 corresponden al 2.53%, lo cual es equivalente a la suma de **MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. $1.008.233.731** A la fecha de la presente acta se tiene un avance acumulado de 66.73% equivalente **VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. $26.623.518.469** Teniendo un tiempo de obra transcurrido al 26 de julio del 2026 de 99.67% del plazo contractual.

4 DESARROLLO DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026) hasta el día veintiséis (26) de julio del dos mil veintiséis (2026).

4.005 y 4.005AP) Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg. (0,98 m³). Se realizan actividades de Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg, conforme a las dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y documentos del proyecto, garantizando su correcta colocación, vibrado y acabado para asegurar el adecuado comportamiento estructural del elemento.



Ilustración 2 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg.

7.001 y 7.001AP) Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (198,34 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta modulación, alineación, plomo, nivelación y adecuada integración con los elementos estructurales, en cumplimiento de los requisitos de calidad y estabilidad previstos para el sistema constructivo.



Ilustración 3 - Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.

7.003 y 7.003AP) Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad. (18,25 m). Se realizan actividades de Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y documentos del proyecto, garantizando la continuidad del sistema de impermeabilización y la adecuada transición entre superficies.



Ilustración 4 - Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad

7.004 y 7.004AP) Filos y dilataciones. (2554,00 m). Se realizan actividades de filos y dilataciones, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y documentos del proyecto, garantizando la adecuada definición de los acabados y el correcto comportamiento de los elementos frente a los movimientos y variaciones propias de la estructura.



Ilustración 5 - Filos y dilataciones.

7.007 y 7.007AP) Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo. (393,85 m). Se realizan actividades de Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo, de conformidad con las dimensiones, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada transferencia de cargas sobre las aberturas y el correcto desempeño estructural de los elementos.



Ilustración 6 - Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo.

7.008 y 7.008AP) Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. (107,39 m). Se realizan actividades de Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo, con dimensiones de acuerdo con los planos de diseño, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado confinamiento, soporte y estabilidad de los elementos constructivos.



Ilustración 7 - Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa. a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.

7.009 y 7.009AP) Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m. (92,00 m). Se realizan actividades de Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m, se desarrollaron conforme a los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado soporte, nivelación y estabilidad de los elementos para los cuales fueron proyectadas.



Ilustración 8 - Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m.

8.010 y 8.010AP) Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior. (2514,37 m²). Se realizan actividades de Estuco plástico sobre superficies b>1m² Interior y exterior, de acuerdo con los detalles constructivos, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando un acabado uniforme, la adecuada preparación de las superficies y las condiciones requeridas para la aplicación de los acabados finales.



Ilustración 9 - Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior.

8.012 y 8.012AP) Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco. (281,66 m²). Se realizan actividades de Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta nivelación, alineación, fijación y calidad de los acabados finales.



Ilustración 10 - Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco.

8.013 y 8.013AP) Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco. (330,67 m²). Se realizan actividades de Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta nivelación, alineación, fijación y calidad de los acabados finales.



Ilustración 11 - Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco.

8.016 y 8.016AP) Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido. (43,60 m). Se realizan actividades de Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada resistencia, nivelación, uniformidad y calidad de los acabados requeridos.



Ilustración 12 - Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m. Incluye enchape en granito fundido y pulido.

9.001 y 9.001AP) Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. (33,05 m²). Se realizan actividades de Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m, de acuerdo con los detalles constructivos, cotas, espesores y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la elaboración de una superficie uniforme, con las pendientes de diseño, adecuada adherencia y las condiciones de impermeabilidad requeridas para la posterior ejecución de los acabados o elementos previstos.



Ilustración 13 - Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.

9.002 y 9.002AP) Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante, (105,45 m²). Se realizan actividades de Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante, de acuerdo con los detalles constructivos, procedimientos de instalación y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada adherencia del sistema, la continuidad de la membrana impermeabilizante y la protección de las superficies frente a la infiltración de agua y la acción de los agentes ambientales.



Ilustración 14 - Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.

16.001 y 16.001AP) Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg. (20,59 m). Se realizan actividades de Tubería ASTM A-53, ERW, black Steel, SCH 40-4 plg, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta unión, continuidad y estabilidad del sistema, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 15 Tubería ASTM A-53, ERW, black Steel, SCH 40-4 plg.

16.017 y 16.017AP) Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. (1.89 und). Se realizan actividades de Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada, de acuerdo con los detalles constructivos, especificaciones técnicas y ubicación establecida en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta conexión entre los tramos de tubería, la continuidad hidráulica del sistema y el cumplimiento de los requisitos de calidad, estanqueidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 16 - Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.

16.018 y 16.018AP) Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. (3,62 und). Se realizan actividades de Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada, de acuerdo con los detalles constructivos, especificaciones técnicas y ubicación establecida en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado cambio de dirección de la red, la correcta conexión entre los tramos de tubería y el cumplimiento de los requisitos de calidad, estanqueidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 17 - Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.

17.003 y 17.003AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (8,07 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento del sistema hidráulico.



Ilustración 18 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.002 y 20.002AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. (343,97 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento de la red hidráulica.



Ilustración 19 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.003 y 20.003AP) Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (153,77 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. y accesorios, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento de la red hidráulica.

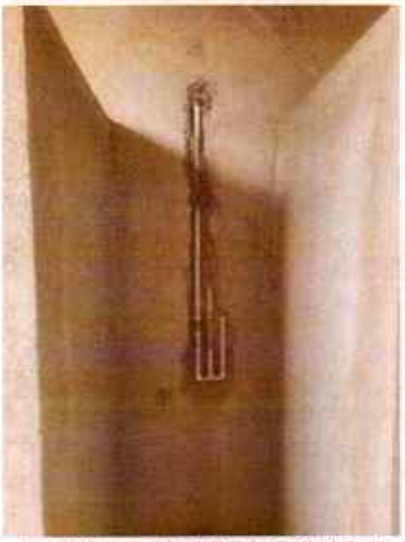


Ilustración 20 - Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.004 y 20.004AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. (150,86 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg. Incluye soporte y accesorios, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento de la red hidráulica.



Ilustración 21 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.006 y 20.006AP) Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. (107.00 und). Se realizan actividades de Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión, estanqueidad y funcionamiento del punto de suministro de la red hidráulica.



Ilustración 22 - Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.

20.011 y 20.011AP) Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. (4.00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado control, aislamiento y operación de la red hidráulica, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionamiento previstos.

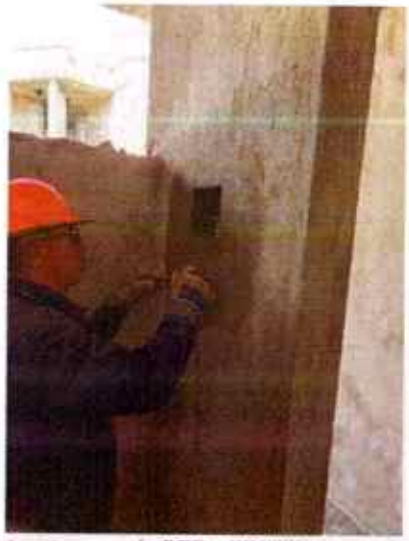


Ilustración 23 - Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.

20.012 y 20.012AP) Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. (2,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado control, aislamiento y operación de la red hidráulica, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 24 - Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.

21.002 y 21.002AP) Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. (53,08 m). Se realizan actividades Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada evacuación de las aguas residuales, la estanqueidad de las uniones y el correcto funcionamiento de la red sanitaria.



Ilustración 25 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.

21.005 y 21.005AP) Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria. (61,00 und). Se realizan actividades Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión a la red sanitaria, la hermeticidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales.



Ilustración 26 - Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.

21.006 y 21.006AP) Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. (14,00 und). Se realizan actividades Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión a la red sanitaria, la hermeticidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales.



Ilustración 27 - Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.

21.007 y 21.007AP) Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg. (27,35 m). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada ventilación de la red sanitaria, el equilibrio de presiones en el sistema, el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos.

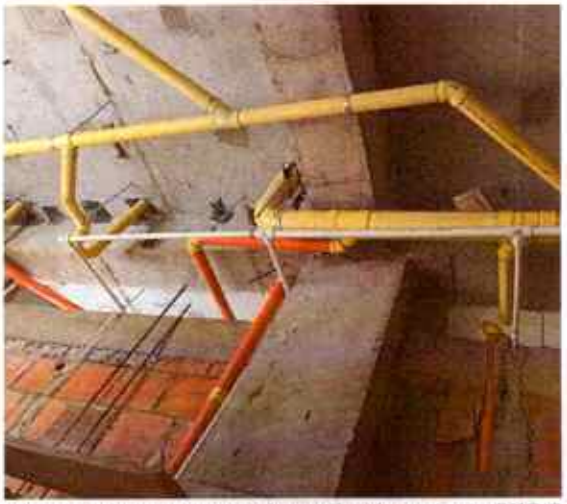


Ilustración 28 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg.

21.008 y 21.008AP) Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg. (11,80 m). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada ventilación de la red sanitaria, el equilibrio de presiones en el sistema, el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos.



Ilustración 29 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg.

22.001 y 22.001AP) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. (8.41 m). Se realizan Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada captación y conducción de las aguas lluvias, la hermeticidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.



Ilustración 30 -) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg.

22.005 y 22.005AP) Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. (7.00 und). Se realizan Bajantes de desagüe pluvial PVC Ø 4plg, de acuerdo con la ubicación, alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conducción de las aguas lluvias hacia el sistema de drenaje, la hermeticidad de las uniones, la correcta fijación de los elementos y el óptimo funcionamiento de la red de evacuación pluvial.



Ilustración 31 - Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.

24.006 y 24.006AP) Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg. (7,00 und). Se realizan Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg, de acuerdo con la ubicación, cotas, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado acceso para inspección y mantenimiento, la correcta ventilación de la estructura y el óptimo funcionamiento de las conexiones de la red.



Ilustración 32 - Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg.

26.008 y 26.008AP) Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg. (11,56 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg, de acuerdo con los trazados, alineamientos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada canalización y protección de las redes eléctricas, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad para el funcionamiento del sistema eléctrico.



Ilustración 33 - Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg.

26.009 y 26.009AP) Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. (312,12 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg, de acuerdo con los trazados, alineamientos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada canalización y protección de las redes eléctricas, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad para el óptimo funcionamiento del sistema eléctrico.



Ilustración 34 - Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.

26.011 y 26.011AP) Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg. (373,20 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg, de acuerdo con los trazados, alineamientos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada canalización y protección de las redes, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad para el óptimo funcionamiento del sistema.



Ilustración 35 - Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg.

29.018 y 29.018AP) Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega. (22,00 und). Se realizan actividades de Suministro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega, de acuerdo con la ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada protección de las conexiones eléctricas, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad para el funcionamiento del sistema eléctrico.



Ilustración 36 - Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega.

32.003 y 32.003AP) Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo. (20,99 m). Se realizan actividades de Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo, de acuerdo con los trazados, dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad eléctrica, la correcta conexión al sistema de puesta a tierra y el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad y funcionamiento previstos para la instalación eléctrica.

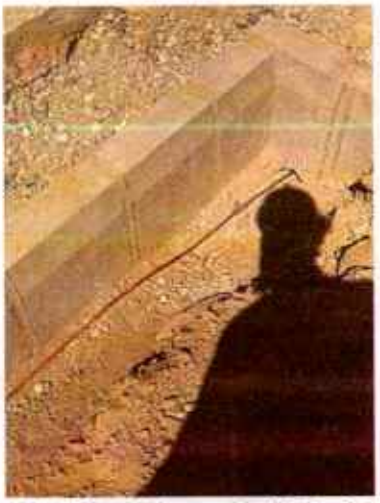


Ilustración 37 - Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo.

32.004 y 32.004AP) Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio. (97,85 m). Se realizan actividades de Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio, de acuerdo con los trazados, dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad eléctrica, la correcta conexión de los elementos del sistema y el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad y funcionamiento previstos para la instalación eléctrica.



Ilustración 38 - Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio.

41.020) Rejillas para cunetas pluviales. (26,42 m²). Se realizan actividades de Rejillas para cunetas pluviales, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, cotas y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada captación y conducción de las aguas lluvias hacia el sistema de drenaje, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, seguridad y funcionamiento previstos.



Ilustración 39 - Rejillas para cunetas pluviales.

-1.1.4 NP) PATOLOGIA_ Puertas de ascensor (2,00 und). Se realizan actividades de instalación de puertas de ascensor, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles, especificaciones técnicas y detalles establecidos en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando su correcta alineación, nivelación, fijación y funcionamiento, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad, resistencia, estanqueidad y operación previstos para el adecuado desempeño del sistema de transporte vertical.

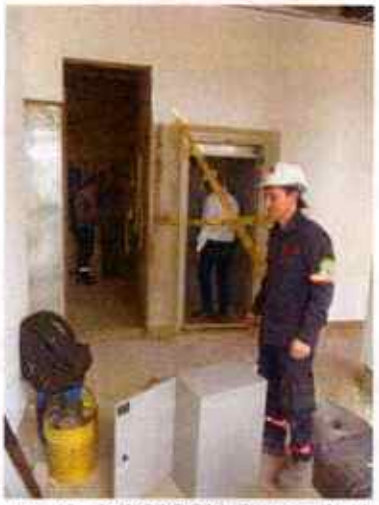


Ilustración 40 - PATOLOGIA_Puertas de ascensor.

-2.3.4 PATOLOGIA_ Acero de refuerzo (50,00 m). Se realizan actividades de Acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles de refuerzo y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patologia y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado desempeño estructural, la correcta disposición del refuerzo y el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos para la rehabilitación de los elementos intervenidos.



Ilustración 41 - PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural.

-2.3.4 PATOLOGIA Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural. (50,00 m). Se realizan actividades de reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural, de acuerdo con la ubicación, alcance de la intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos, estudios y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, el tratamiento de las fisuras, la correcta aplicación del mortero de reparación estructural y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, resistencia, durabilidad y desempeño estructural previstos.



Ilustración 42 - PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural.

-2.4.1 PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (15,61 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada integración con los elementos existentes, la correcta modulación, alineación, plomo y nivelación de los muros, así como el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 43 - PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.

-2.4.4 PATOLOGIA_ Pañete liso para muro en mortero 1:4. (153,56 m²). Se realizan actividades de pañete liso para muro en mortero de cemento y arena en proporción 1:4, de acuerdo con la ubicación, espesores, niveles, plomos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta dosificación y aplicación del mortero, la obtención de un acabado uniforme, liso y continuo, y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, resistencia, durabilidad y calidad previstos.



Ilustración 44 - PATOLOGIA_ Pañete liso para muro en mortero 1:4.

-2.4.5 PATOLOGIA_ Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (12,60 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural del elemento, su correcta integración con la mampostería existente y el cumplimiento de los criterios de calidad y estabilidad definidos para la intervención.



Ilustración 45 - PATOLOGIA_ Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-3.1.4 PATOLOGIA Retiro de manto asfaltico. (154,86 m²)). Se realizan actividades de retiro de manto asfáltico, de acuerdo con la ubicación, alcance de la intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando el desmontaje controlado del material existente, la adecuada limpieza de la superficie intervenida, la correcta disposición de los residuos generados y el cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección de los elementos adyacentes y condiciones necesarias para la ejecución de las actividades posteriores.

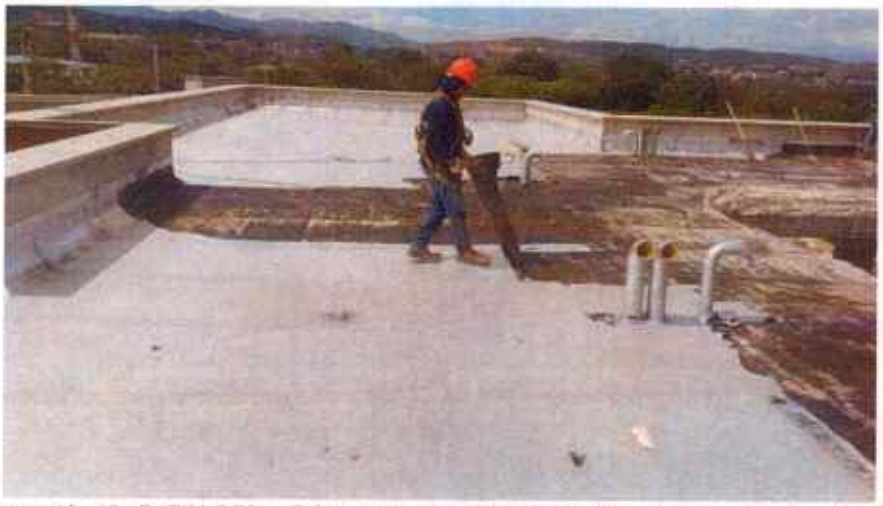


Ilustración 46 - PATOLOGIA_ Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-3.2.3 PATOLOGIA Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,55 m³). Se realizan actividades de Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg, de acuerdo con las dimensiones, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural, la correcta integración con los elementos existentes y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 47 - PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg

-3.2.4 PATOLOGIA Acero de refuerzo. (2246.95 kg). Se realizan actividades de Acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles de refuerzo y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado desempeño estructural, la correcta disposición del refuerzo y el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos para la rehabilitación de los elementos intervenidos.

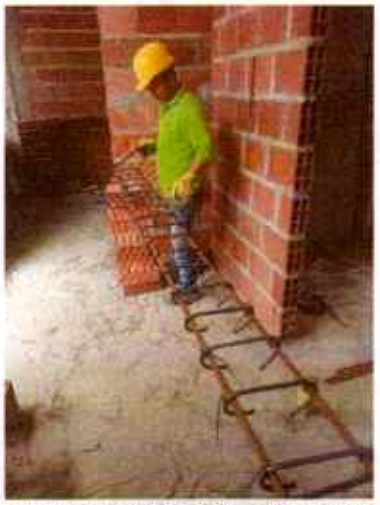


Ilustración 48 - PATOLOGIA_Acero de refuerzo

-3.2.7 PATOLOGIA Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (1,39 m³). Se realizan actividades de Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg, de acuerdo con las dimensiones, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural del elemento, su correcta integración con la estructura existente y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 49 - Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg

-3.4.1 PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (228,24 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada integración con los elementos existentes, la correcta modulación, alineación, plomo y nivelación de los muros, así como el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 50 - PATOLOGIA Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m

-3.4.2 PATOLOGIA Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. (175,80 m²). Se realizan actividades de Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada integración con la estructura existente, la correcta modulación, alineación, plomo y nivelación del elemento, así como el cumplimiento de los criterios de calidad y estabilidad definidos para la intervención.



Ilustración 51 - PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común

-3.4.3 PATOLOGIA Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (19,80 m). Se realizan actividades de Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad resistente del elemento, la correcta transferencia de cargas sobre las aberturas y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 52 - PATOLOGIA_Dintel 0.15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-3.4.7 PATOLOGIA Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (222,21 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural del elemento, su correcta integración con la mampostería existente y el cumplimiento de los criterios de calidad y estabilidad definidos para la intervención.



Ilustración 53 - PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-3.4.8 PATOLOGIA Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta. (48,30 m). Se realizan actividades de construcción de alfajía en concreto de f'c = 21 MPa para antepecho de cubierta, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta colocación, conformación y acabado del elemento, así como el cumplimiento de los requisitos de resistencia, durabilidad, estabilidad y funcionalidad previstos para la adecuada protección del antepecho y el control del escurrimiento de las aguas.



Ilustración 54 - PATOLOGIA_ Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta.

-3.5.3 PATOLOGIA Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante, (348,89 m²). Se realizan actividades de impermeabilización con manto asfáltico de 3 mm con acabado en foil de aluminio, aplicado sobre imprimante, de acuerdo con la ubicación, pendientes, traslapos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta aplicación del imprimante, la instalación continua del manto con los traslapos y sellos requeridos, y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, impermeabilidad, durabilidad, resistencia a la intemperie y correcto funcionamiento del sistema de impermeabilización.



Ilustración 55 - PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.

-3.6.1 PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios. (13,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 11 de Ø 3/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión de las tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.



Ilustración 56 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.)

-3.6.2 NP) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) incluye soporte y accesorios. (3,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de Ø 1 1/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión entre tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.



Ilustración 57 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC - presión RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.)

-3.6.3 NP) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios. (69,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de Ø 1 1/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión entre tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.

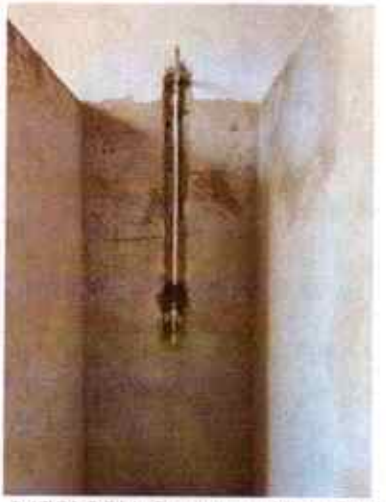


Ilustración 58 - PATOLOGIA_ PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.)

-3.6.4 NP) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios. (3,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de Ø 1 1/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión entre tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.



Ilustración 59 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13.5- f(ø: 1 plg.)

-3.6.5 NP) PATOLOGIA_Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg. (15,00 und). Se realizan actividades de Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión a la red hidráulica, la estanqueidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema intervenido.



Ilustración 60 - PATOLOGIA_Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg.

-3.6.8 NP) PATOLOGIA_Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación. (1,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de registro de cortina tipo pesado RED-WHITE o equivalente de Ø 1", incluyendo tapa de registro, reparación de la superficie intervenida y demás elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada fijación del conjunto, la estanqueidad de las conexiones, la correcta restitución de las áreas afectadas por la intervención y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, seguridad, durabilidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 61 – PATOLOGIA_ Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación.

-3.6.9 NP) PATOLOGIA_ Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Reparación. (3,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de registro de cortina tipo pesado RED-WHITE o equivalente de Ø 3/4", incluyendo tapa de registro, reparación de la superficie intervenida y demás elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada fijación del conjunto, la estanqueidad de las conexiones, la correcta restitución de las áreas afectadas por la intervención y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, seguridad, durabilidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 62 – PATOLOGIA_ Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Reparación.

-3.7.3 PATOLOGIA_ Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. (6,00 und). Se realizan actividades de construcción de punto sanitario de Ø 2" en tubería PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación de la tubería, accesorios y conexiones, la adecuada fijación del sistema, la estanqueidad de las uniones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, funcionalidad, evacuación y operación previstos.



Ilustración 63 – PATOLOGIA_ Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.

-3.7.4 PATOLOGIA_ Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria. (1,00 und). Se realizan actividades de construcción de punto sanitario de Ø 4" en tubería PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación de la tubería, accesorios y conexiones, la adecuada fijación del sistema, la estanqueidad de las uniones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, funcionalidad, evacuación y operación previstos.



Ilustración 64 – PATOLOGIA_ Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.

-3.8.1 PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg. (31,00 m). Esta actividad contempla la ejecución de la línea primaria de desagüe pluvial en tubería PVC de Ø 4", ejecutada conforme a los planos de diseño, las especificaciones técnicas y los niveles establecidos en el proyecto. La actividad incluye la instalación de la tubería y sus accesorios, la verificación de alineación y pendientes, la correcta conformación de las uniones para asegurar la estanqueidad del sistema y las pruebas necesarias para garantizar la adecuada evacuación de las aguas lluvias, cumpliendo con los requisitos de calidad, resistencia y funcionamiento.



Ilustración 65 – PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.

-3.8.2 PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg. (1.50 m). La actividad comprende la ejecución de la línea primaria de desagüe pluvial en tubería PVC de Ø 6", de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, pendientes y demás especificaciones definidas en los planos y documentos técnicos del proyecto. Incluye el suministro e instalación de la tubería y sus accesorios, la conformación de las uniones, los ajustes necesarios para garantizar la continuidad del sistema y la verificación de su correcto funcionamiento, asegurando una evacuación eficiente de las aguas lluvias y el cumplimiento de los criterios de calidad, resistencia y durabilidad establecidos.



Ilustración 66 – PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg.

-3.8.3 PATOLOGIA_ Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg. (4.00 und). Corresponde a la instalación del bajante de desagüe pluvial en tubería PVC de Ø 4", de acuerdo con la ubicación, recorrido, niveles y especificaciones técnicas definidas en los planos y demás documentos del proyecto. La actividad incluye el suministro e instalación de la tubería, accesorios, soportes y elementos de fijación requeridos, garantizando la correcta verticalidad, estabilidad, hermeticidad de las uniones y la adecuada conducción de las aguas lluvias hacia el sistema de drenaje, cumpliendo con los requisitos de calidad, resistencia y durabilidad establecidos.



Ilustración 67 – PATOLOGIA_ Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.

-4.4.2 PATOLOGIA_ Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4. (2,00 m²). Esta actividad contempla la ejecución de pañete liso impermeabilizado en mortero de cemento y arena en proporción 1:4, aplicado sobre las superficies indicadas en los planos y de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. Incluye la preparación del sustrato, la dosificación y aplicación del mortero con aditivo impermeabilizante cuando corresponda, el afinado de la superficie hasta obtener un acabado uniforme y el control de las condiciones de curado, garantizando la adherencia, impermeabilidad, resistencia, durabilidad y calidad del acabado final.



Ilustración 68 – PATOLOGIA_ Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4

-5.1.7 PATOLOGIA_ Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. (5,45 m). La actividad comprende la demolición de concreto en columnas y vigas de cimentación, conservando el acero de refuerzo existente para su reutilización, de acuerdo con el alcance definido en los planos, las especificaciones técnicas y las indicaciones de la interventoría. Incluye la remoción controlada del concreto mediante procedimientos que eviten daños al acero de refuerzo, su limpieza y acondicionamiento para permitir su posterior incorporación a la estructura, así como la disposición del material producto de la demolición, garantizando la seguridad de la intervención y la integridad de los elementos a conservar.



Ilustración 69 – PATOLOGIA_ Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.

-5.4.1 PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (2,22 m²). Se realizan actividades de mampostería en bloque No. 4 con espesor de 0,10 m, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles, alineación y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta colocación de las unidades de mampostería, la adecuada dosificación y aplicación del mortero de pega, el cumplimiento de los plomos y juntas especificadas, y los requisitos de resistencia, estabilidad, durabilidad y calidad previstos.



Ilustración 70 – PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.

-5.4.6 PATOLOGIA_ Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo. (3,60 m). Se realizan actividades de construcción de bordillo (poyo) de confinamiento en concreto de f'c = 21 MPa, con altura de 0,10 m, incluyendo acero de refuerzo, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación y amarre del acero de refuerzo, la adecuada colocación, vibrado y curado del concreto, y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, estabilidad, durabilidad y calidad previstos.



Ilustración 71 – PATOLOGIA_ Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo

-5.5.3 PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. (255,04 m²). Se realizan actividades de impermeabilización con manto asfáltico de 3 mm con acabado en foil de aluminio, aplicado sobre imprimante, de acuerdo con la ubicación, pendientes, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta aplicación del imprimante, la instalación del manto con los traslapos y sellos requeridos, y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, impermeabilidad, resistencia a la intemperie, durabilidad y desempeño del sistema.



Ilustración 72 – PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.

-5.9.2 PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg. (10,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería EMT de Ø 3/4", de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros y especificaciones técnicas establecidas en los planos eléctricos y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación de la tubería, soportes, accesorios y elementos de fijación, la adecuada continuidad del sistema de canalización y el cumplimiento de los requisitos de seguridad, resistencia mecánica, durabilidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 73 – PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.

-6.1 PATOLOGIA_ Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados. (88,61 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de cintas post-aplicadas adheridas con resina epóxica sobre la membrana impermeabilizante, de acuerdo con la ubicación de las juntas, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta aplicación de la resina epóxica, la instalación y adherencia continua de las cintas, y el cumplimiento de los requisitos de impermeabilidad, flexibilidad, resistencia, durabilidad y sellado de juntas de construcción, juntas de expansión y uniones de elementos prefabricados.



Ilustración 74 – PATOLOGIA_ Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados.

-7.1 PATOLOGIA_ Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA (2,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de baterías para planta de emergencia de 150 kVA, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, los planos del proyecto y demás documentos contractuales, garantizando la correcta ubicación, fijación y conexión de las baterías, la verificación de la polaridad y continuidad del sistema, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad, capacidad de arranque, confiabilidad, durabilidad y adecuado funcionamiento de la planta de emergencia.



Ilustración 75 – PATOLOGIA_ Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA

R/L NELSON YOEL PARADA REYES
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LAPARADA OCO – CCC

INFORME CONTROL DE CALIDAD

22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2026

CONTRATO No. LP-SG-01362-2021

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

UT. ESTACIÓN LAPARADA

PRESENTADO UT. ESTACIÓN LAPARADA

JULIO
2026

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
3. LOCALIZACIÓN 7
4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 8

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

Lista de fotografías

Ilustración 1 - Ubicación del proyecto. 6
Ilustración 2 - Localización del proyecto. 7
Ilustración 3 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg. 8
Ilustración 4 - Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. 8
Ilustración 5 - Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad. 9
Ilustración 6 - Filos y dilataciones. 9
Ilustración 7 - Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo. 10
Ilustración 8 - Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. 10
Ilustración 9 - Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m. 11
Ilustración 10 - Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior. 11
Ilustración 11 - Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco 12
Ilustración 12 - Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco. 12
Ilustración 13 - Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido. 13
Ilustración 14 - Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m 13
Ilustración 15 - Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. 14
Ilustración 16 - Tubería ASTM A-53, ERW, black Steel, SCH 40-4 plg 14
Ilustración 17 - Sum./inst. Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. Acero. 15
Ilustración 18 - Codo 90° - Ø: 4 plg. Acero. 15
Ilustración 19 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) 16
Ilustración 20 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg 16
Ilustración 21 - Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. 17
Ilustración 22 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg. Incluye soporte y accesorios 17
Ilustración 23 - Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg 18
Ilustración 24 - Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. 18
Ilustración 25 - Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. 19
Ilustración 26 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg 19
Ilustración 27 - Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria 20
Ilustración 28 - Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria 20
Ilustración 29 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg 21
Ilustración 30 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg 21
Ilustración 31 - Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. 22
Ilustración 32 - Bajantes de desagüe pluvial PVC Ø 4plg 22
Ilustración 33 - Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg. 23
Ilustración 34 - Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg 23
Ilustración 35 - Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg 24
Ilustración 36 - Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg 24
Ilustración 37 - Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega. 25
Ilustración 38 - Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo. 25
Ilustración 39 - Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio 26
Ilustración 40 - Rejillas para cunetas pluviales. 26
Ilustración 41 - PATOLOGIA_ Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 27
Ilustración 42 - PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural. 27
Ilustración 43 - PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural. 28
Ilustración 44 - PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. 28
Ilustración 45 - PATOLOGIA_ Pañete liso para muro en mortero 1:4. 29
Ilustración 46 - PATOLOGIA_ Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 29

Ilustración 47 - PATOLOGIA_ Retiro de manto asfaltico. 30
Ilustración 48 - PATOLOGIA_ Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg..... 30
Ilustración 49 - PATOLOGIA_ Acero de refuerzo. 31
Ilustración 50 - PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. 31
Ilustración 51 - PATOLOGIA_ Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m..... 32
Ilustración 52 - PATOLOGIA_ Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común 32
Ilustración 53 - PATOLOGIA_Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 33
Ilustración 54 - PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. 33
Ilustración 55 - PATOLOGIA_ Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta..... 34
Ilustración 56 - PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. 34
Ilustración 57 – PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios. 35
Ilustración 58 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC - presión RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.)..... 35
Ilustración 59 - PATOLOGIA_ PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.)..... 36
Ilustración 60 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC presión RDE 13,5- f(ø: 1 plg.)..... 36
Ilustración 61 – PATOLOGIA_Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg..... 37
Ilustración 62 – PATOLOGIA_ Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación. 37
Ilustración 63 – PATOLOGIA_ PATOLOGIA_Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Reparación..... 38
Ilustración 64 – PATOLOGIA_ Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. 38
Ilustración 65 – PATOLOGIA_ Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. 39
Ilustración 66 – PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg. 39
Ilustración 67 – PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg. 40
Ilustración 68 – PATOLOGIA_ Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg. 40
Ilustración 69 – PATOLOGIA_ Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4..... 41
Ilustración 70 – PATOLOGIA_ Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. 41
Ilustración 71 – PATOLOGIA_ Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m...... 42
Ilustración 72 – PATOLOGIA_ Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo..... 42
Ilustración 73 – PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. 43
Ilustración 74 – PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg...... 43
Ilustración 75 – PATOLOGIA_ Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados. 44
Ilustración 76 – PATOLOGIA_ Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA..... 44

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que ya se adelantan por parte del señor NELSON YOEL PARADA REYES quien actúa en función de contratista del contrato No. LP-SG-01362-2021 cuyo objeto es el "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

El presente informe describe las actividades ejecutadas durante el periodo del 22 de junio al 26 de julio de 2026

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto tiene un área total aproximada de 8000 m2 y consta de varias edificaciones de uno y dos pisos, en las que se prestarán diferentes servicios a la población de oficiales de la Policía Nacional que la habitarán. Estas edificaciones son complementadas por un patio de formación y una zona de maniobras y parqueo. Se proyectan cinco edificaciones: el Bloque 1, un edificio de un piso donde funcionarán la zona técnica y zona segura de la estación. El Bloque A, un edificio de dos pisos que prestará atención a la comunidad, por lo que tendrá oficinas, una sala de crisis y un salón múltiple. El bloque B, funcionará como edificio recreativo para los oficiales que habiten la estación de policía; este edificio también se desarrolla en dos niveles. Por último, los Bloques C, D y E, de dos pisos de altura, contendrán dormitorios y un apartamento fiscal para el personal de la Policía de la estación.



Ilustración 1 - Ubicación del proyecto.

3. LOCALIZACIÓN

La estación base tipo C de la policía queda ubicada en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander en el nororiente de Colombia, en zona fronteriza con Venezuela, sobre la Ruta Nacional 7010, a 840 m del Puente Internacional Simón Bolívar, con coordenadas Geográficas 7°49'22.09"N y 72° 27'24.52"O. En la Figura se presenta la localización general del proyecto.

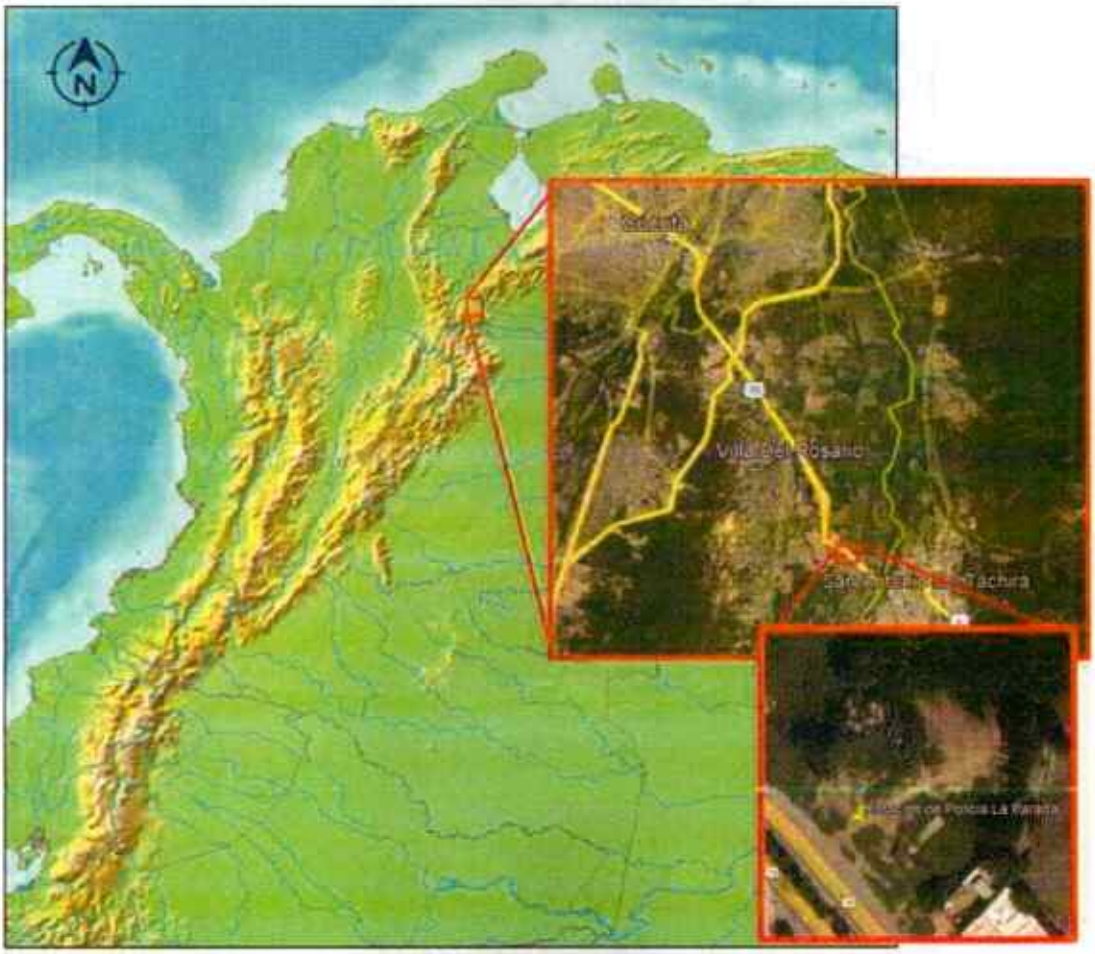


Ilustración 2 - Localización del proyecto.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

4.005 y 4.005AP) Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg. (0,98 m³). Se realizan actividades de Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg, conforme a las dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y documentos del proyecto, garantizando su correcta colocación, vibrado y acabado para asegurar el adecuado comportamiento estructural del elemento.



Ilustración 3 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg.

7.001 y 7.001AP) Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (198,34 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta modulación, alineación, plomo, nivelación y adecuada integración con los elementos estructurales, en cumplimiento de los requisitos de calidad y estabilidad previstos para el sistema constructivo.



Ilustración 4 - Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.

7.003 y 7.003AP) Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad. (18,25 m). Se realizan actividades de Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y documentos del proyecto, garantizando la continuidad del sistema de impermeabilización y la adecuada transición entre superficies.



Ilustración 5 - Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad.

7.004 y 7.004AP) Filos y dilataciones. (2554,00 m). Se realizan actividades de filos y dilataciones, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y documentos del proyecto, garantizando la adecuada definición de los acabados y el correcto comportamiento de los elementos frente a los movimientos y variaciones propias de la estructura.



Ilustración 6 - Filos y dilataciones.

7.007 y 7.007AP) Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo. (404,60 m). Se realizan actividades de Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo, de conformidad con las dimensiones, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada transferencia de cargas sobre las aberturas y el correcto desempeño estructural de los elementos.



Ilustración 7 - Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo.

7.008 y 7.008AP) Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. (107,39 m). Se realizan actividades de Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo, con dimensiones de acuerdo con los planos de diseño, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado confinamiento, soporte y estabilidad de los elementos constructivos.



Ilustración 8 - Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.

7.009 y 7.009AP) Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m. (92,00 m). Se realizan actividades de Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m, se desarrollaron conforme a los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado soporte, nivelación y estabilidad de los elementos para los cuales fueron proyectadas.



Ilustración 9 - Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m.

8.010 y 8.010AP) Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior. (2514,37 m²). Se realizan actividades de Estuco plástico sobre superficies b>1m² Interior y exterior, de acuerdo con los detalles constructivos, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando un acabado uniforme, la adecuada preparación de las superficies y las condiciones requeridas para la aplicación de los acabados finales.



Ilustración 10 - Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior.

8.012 y 8.012AP) Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco. (281,66 m²). Se realizan actividades de Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta nivelación, alineación, fijación y calidad de los acabados finales.



Ilustración 11 - Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco.

8.013 y 8.013AP) Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco. (330,67 m²). Se realizan actividades de Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta nivelación, alineación, fijación y calidad de los acabados finales.



Ilustración 12 - Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco.

8.016 y 8.016AP) Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido. (43,60 m). Se realizan actividades de Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada resistencia, nivelación, uniformidad y calidad de los acabados requeridos.

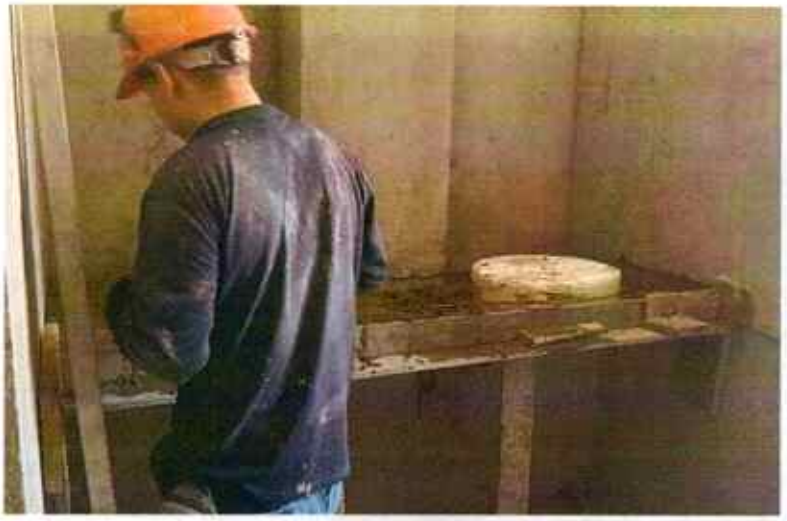


Ilustración 13 - Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido.

9.001 y 9.001AP) Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. (33,05 m²). Se realizan actividades de Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m, de acuerdo con los detalles constructivos, cotas, espesores y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la elaboración de una superficie uniforme, con las pendientes de diseño, adecuada adherencia y las condiciones de impermeabilidad requeridas para la posterior ejecución de los acabados o elementos previstos.



Ilustración 14 - Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.

9.002 y 9.002AP) Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. (105,45 m²). Se realizan actividades de Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante, de acuerdo con los detalles constructivos, procedimientos de instalación y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada adherencia del sistema, la continuidad de la membrana impermeabilizante y la protección de las superficies frente a la infiltración de agua y la acción de los agentes ambientales.



Ilustración 15 - Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.

16.001 y 16.001AP) Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg. (20,59 m). Se realizan actividades de Tubería ASTM A-53, ERW, black Steel, SCH 40-4 plg, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta unión, continuidad y estabilidad del sistema, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 16 - Tubería ASTM A-53, ERW, black Steel, SCH 40-4 plg.

16.017 y 16.017AP) Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. (1,89 und). Se realizan actividades de Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada, de acuerdo con los detalles constructivos, especificaciones técnicas y ubicación establecida en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta conexión entre los tramos de tubería, la continuidad hidráulica del sistema y el cumplimiento de los requisitos de calidad, estanqueidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 17 - Sum./inst. Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. Acero.

16.018 y 16.018AP) Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. (3,62 und). Se realizan actividades de Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada, de acuerdo con los detalles constructivos, especificaciones técnicas y ubicación establecida en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado cambio de dirección de la red, la correcta conexión entre los tramos de tubería y el cumplimiento de los requisitos de calidad, estanqueidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 18 - Codo 90° - Ø: 4 plg. Acero.

17.003 y 17.003AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (8.07 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento del sistema hidráulico.

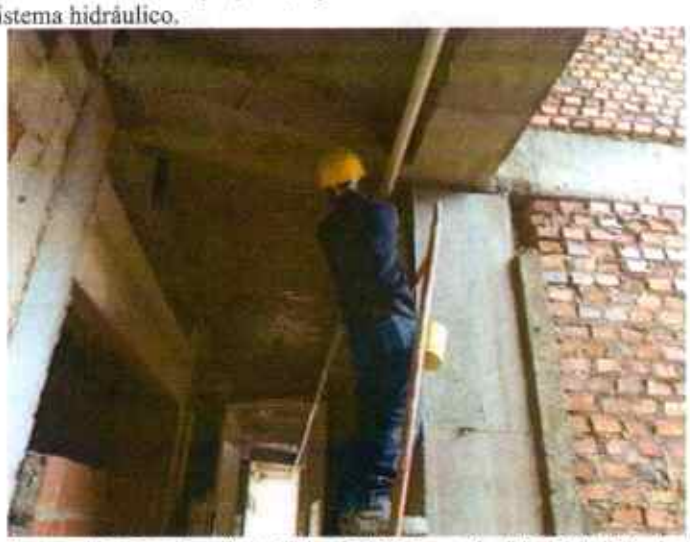


Ilustración 19 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.)

20.002 y 20.002AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. (343,97 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento de la red hidráulica.

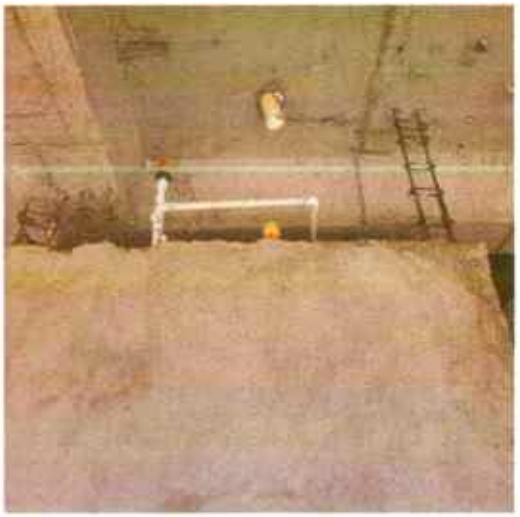


Ilustración 20 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg

20.003 y 20.003AP) Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (153,77 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. y accesorios, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento de la red hidráulica.



Ilustración 21 - Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.

20.004 y 20.004AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. (150,86 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg. Incluye soporte y accesorios, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento de la red hidráulica.



Ilustración 22 - Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg. Incluye soporte y accesorios

20.006 y 20.006AP) Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. (107,00 und). Se realizan actividades de Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión, estanqueidad y funcionamiento del punto de suministro de la red hidráulica.



Ilustración 233 - Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg

20.011 y 20.011AP) Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. (4,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado control, aislamiento y operación de la red hidráulica, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 24 - Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg.

20.012 y 20.012AP) Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. (2,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado control, aislamiento y operación de la red hidráulica, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 25 - Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg.

21.002 y 21.002AP) Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. (53,08 m). Se realizan actividades Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada evacuación de las aguas residuales, la estanqueidad de las uniones y el correcto funcionamiento de la red sanitaria.



Ilustración 26 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg

21.005 y 21.005AP) Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria. (61,00 und). Se realizan actividades Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión a la red sanitaria, la hermeticidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales.



Ilustración 27 - Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.

21.006 y 21.006AP) Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. (14,00 und). Se realizan actividades Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión a la red sanitaria, la hermeticidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales.



Ilustración 28 - Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria

21.007 y 21.007AP) Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg. (27,35 m). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada ventilación de la red sanitaria, el equilibrio de presiones en el sistema, el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos.



Ilustración 29 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg

21.008 y 21.008AP) Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg. (11,80 m). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada ventilación de la red sanitaria, el equilibrio de presiones en el sistema, el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos.



Ilustración 30 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg.

22.001 y 22.001AP) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. (8,41 m). Se realizan Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada captación y conducción de las aguas lluvias, la hermeticidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.



Ilustración 31 - Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg.

22.005 y 22.005AP) Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. (7,00 und). Se realizan Bajantes de desagüe pluvial PVC Ø 4plg, de acuerdo con la ubicación, alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conducción de las aguas lluvias hacia el sistema de drenaje, la hermeticidad de las uniones, la correcta fijación de los elementos y el óptimo funcionamiento de la red de evacuación pluvial.



Ilustración 32 - Bajantes de desagüe pluvial PVC Ø 4plg

24.006 y 24.006AP) Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg. (7,00 und). Se realizan Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg, de acuerdo con la ubicación, cotas, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado acceso para inspección y mantenimiento, la correcta ventilación de la estructura y el óptimo funcionamiento de las conexiones de la red.



Ilustración 33 - Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg.

26.008 y 26.008AP) Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg. (11,56 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg, de acuerdo con los trazados, alineamientos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada canalización y protección de las redes eléctricas, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad para el funcionamiento del sistema eléctrico.



Ilustración 34 - Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg.

26.009 y 26.009AP) Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. (312,12 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg, de acuerdo con los trazados, alineamientos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada canalización y protección de las redes eléctricas, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad para el óptimo funcionamiento del sistema eléctrico.



Ilustración 35 - Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg

26.011 y 26.011AP) Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg. (373,20 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg en los bloques A, D, y E de acuerdo con dimensiones y especificaciones indicadas en los planos de diseño.



Ilustración 36 - Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg

29.018 y 29.018AP) Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega. (22,00 und). Se realizan actividades de Suministro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega, de acuerdo con la ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada protección de las conexiones eléctricas, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad para el funcionamiento del sistema eléctrico.



Ilustración 37 - Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega.

32.003 y 32.003AP) Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo. (20,99 m). Se realizan actividades de Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo, de acuerdo con los trazados, dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad eléctrica, la correcta conexión al sistema de puesta a tierra y el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad y funcionamiento previstos para la instalación eléctrica.



Ilustración 38 - Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo.

32.004 y 32.004AP) Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio. (97,85 m). Se realizan actividades de Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio, de acuerdo con los trazados, dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad eléctrica, la correcta conexión de los elementos del sistema y el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad y funcionamiento previstos para la instalación eléctrica.



Ilustración 39 - Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio

41.020) Rejillas para cunetas pluviales. (26,42 m²). Se realizan actividades de Rejillas para cunetas pluviales, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, cotas y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada captación y conducción de las aguas lluvias hacia el sistema de drenaje, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, seguridad y funcionamiento previstos.

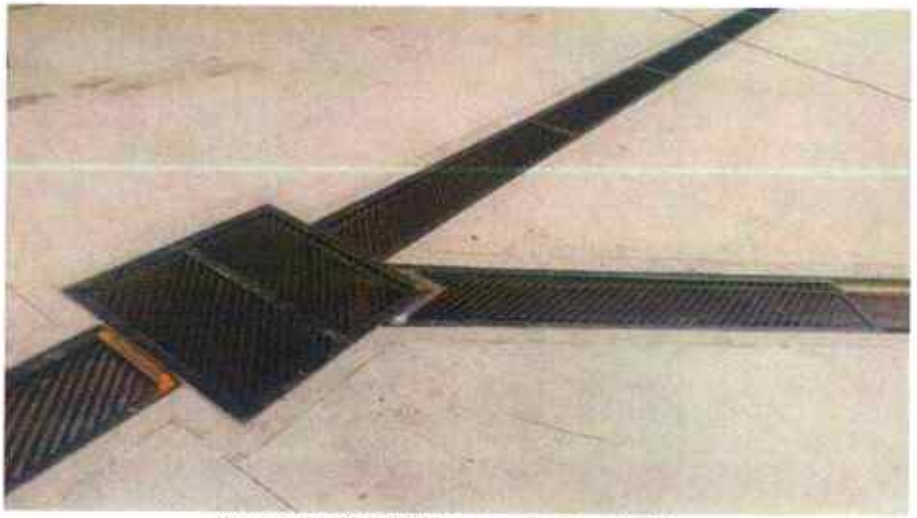


Ilustración 40 - Rejillas para cunetas pluviales.

-1.1.4 NP) PATOLOGIA Puertas de ascensor (2,00 und). Se realizan actividades de instalación de puertas de ascensor, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles, especificaciones técnicas y detalles establecidos en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando su correcta alineación, nivelación, fijación y funcionamiento, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad, resistencia, estanqueidad y operación previstos para el adecuado desempeño del sistema de transporte vertical.



Ilustración 41 - PATOLOGIA_ Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.

-2.3.4 PATOLOGIA Acero de refuerzo (50,00 m). Se realizan actividades de Acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles de refuerzo y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado desempeño estructural, la correcta disposición del refuerzo y el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos para la rehabilitación de los elementos intervenidos.



Ilustración 42 - PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural.

-2.3.4 PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural. (50,00 m). Se realizan actividades de reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural, de acuerdo con la ubicación, alcance de la intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos, estudios y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, el tratamiento de las fisuras, la correcta aplicación del mortero de reparación estructural y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, resistencia, durabilidad y desempeño estructural previstos.



Ilustración 43 - PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural.

-2.4.1 PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (15,61 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada integración con los elementos existentes, la correcta modulación, alineación, plomo y nivelación de los muros, así como el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 44 - PATOLOGIA_ Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.

-2.4.4 PATOLOGIA_ Pañete liso para muro en mortero 1:4. (153,56 m²). Se realizan actividades de pañete liso para muro en mortero de cemento y arena en proporción 1:4, de acuerdo con la ubicación, espesores, niveles, plomos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta dosificación y aplicación del mortero, la obtención de un acabado uniforme, liso y continuo, y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, resistencia, durabilidad y calidad previstos.



Ilustración 45 - PATOLOGIA_ Pañete liso para muro en mortero 1:4.

-2.4.5 PATOLOGIA_ Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (12,60 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural del elemento, su correcta integración con la mampostería existente y el cumplimiento de los criterios de calidad y estabilidad definidos para la intervención.



Ilustración 46 - PATOLOGIA_ Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-3.1.4 PATOLOGIA Retiro de manto asfaltico. (154,86 m²). Se realizan actividades de retiro de manto asfáltico, de acuerdo con la ubicación, alcance de la intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando el desmontaje controlado del material existente, la adecuada limpieza de la superficie intervenida, la correcta disposición de los residuos generados y el cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección de los elementos adyacentes y condiciones necesarias para la ejecución de las actividades posteriores.

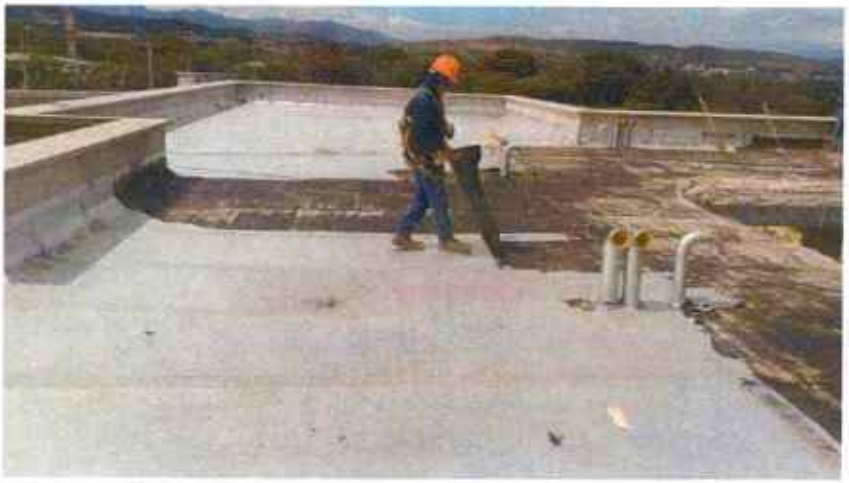


Ilustración 47 - PATOLOGIA_ Retiro de manto asfaltico.

-3.2.3 PATOLOGIA Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,55 m³). Se realizan actividades de Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg, de acuerdo con las dimensiones, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural, la correcta integración con los elementos existentes y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 48 - PATOLOGIA_ Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.

-3.2.4 PATOLOGIA Acero de refuerzo. (2246,95 kg). Se realizan actividades de Acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles de refuerzo y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado desempeño estructural, la correcta disposición del refuerzo y el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos para la rehabilitación de los elementos intervenidos.



Ilustración 49 - PATOLOGIA_ Acero de refuerzo.

-3.2.7 PATOLOGIA Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (1,39 m³). Se realizan actividades de Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg, de acuerdo con las dimensiones, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural del elemento, su correcta integración con la estructura existente y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 50 - PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.

-3.4.1 PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (87,54 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada integración con los elementos existentes, la correcta modulación, alineación, plomo y nivelación de los muros, así como el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 51 - PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m

-3.4.2 PATOLOGIA Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. (16,80 m²). Se realizan actividades de Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada integración con la estructura existente, la correcta modulación, alineación, plomo y nivelación del elemento, así como el cumplimiento de los criterios de calidad y estabilidad definidos para la intervención.



Ilustración 52 - PATOLOGIA_ Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común

-3.4.3 PATOLOGIA Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (19,80 m). Se realizan actividades de Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad resistente del elemento, la correcta transferencia de cargas sobre las aberturas y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.



Ilustración 53 - PATOLOGIA_Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-3.4.7 PATOLOGIA Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (222,21 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural del elemento, su correcta integración con la mampostería existente y el cumplimiento de los criterios de calidad y estabilidad definidos para la intervención.



Ilustración 54 - PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.

-3.4.8 PATOLOGIA Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta. (48,30 m). Se realizan actividades de construcción de alfajia en concreto de f'c = 21 MPa para antepecho de cubierta, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta colocación, conformación y acabado del elemento, así como el cumplimiento de los requisitos de resistencia, durabilidad, estabilidad y funcionalidad previstos para la adecuada protección del antepecho y el control del escurrimiento de las aguas.

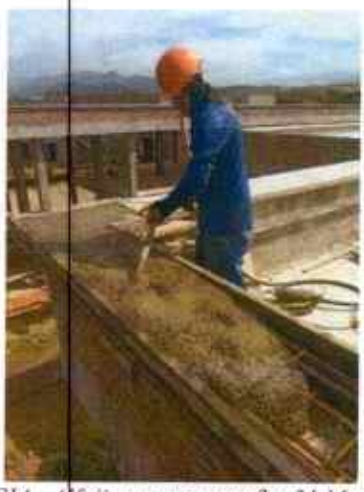


Ilustración 55 - PATOLOGIA_ Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta.

-3.5.3 PATOLOGIA Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. (348,89 m²). Se realizan actividades de impermeabilización con manto asfáltico de 3 mm con acabado en foil de aluminio, aplicado sobre imprimante, de acuerdo con la ubicación, pendientes, traslapos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta aplicación del imprimante, la instalación continua del manto con los traslapos y sellos requeridos, y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, impermeabilidad, durabilidad, resistencia a la intemperie y correcto funcionamiento del sistema de impermeabilización.



Ilustración 56 - PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.

-3.6.1 PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios. (13,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 11 de Ø 3/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión de las tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.



Ilustración 57 – PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios.

-3.6.2 NP) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) incluye soporte y accesorios. (3,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de Ø 1 1/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión entre tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.



Ilustración 58 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC - presión RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.)

-3.6.3 NP) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios. (69,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de Ø 1 1/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión entre tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.

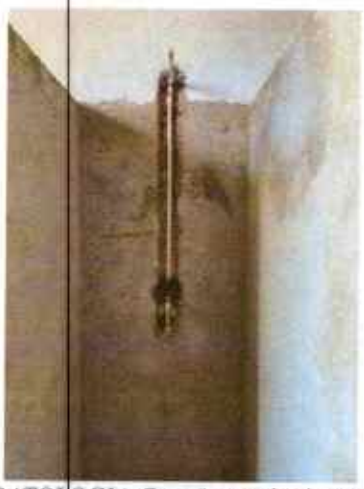


Ilustración 59 - PATOLOGIA_ PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.)

-3.6.4 NP) PATOLOGIA Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios. (3,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de Ø 1 1/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión entre tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.



Ilustración 60 - PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería PVC presión RDE 13,5- f(ø: 1 plg.)

-3.6.5 NP) PATOLOGIA Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg. (15,00 und). Se realizan actividades de Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión a la red hidráulica, la estanqueidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema intervenido.



Ilustración 61 – PATOLOGIA_Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg.

-3.6.8 NP) PATOLOGIA Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación. (1,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de registro de cortina tipo pesado RED-WHITE o equivalente de Ø 1", incluyendo tapa de registro, reparación de la superficie intervenida y demás elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada fijación del conjunto, la estanqueidad de las conexiones, la correcta restitución de las áreas afectadas por la intervención y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, seguridad, durabilidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 62 – PATOLOGIA_ Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación.

-3.6.9 NP) PATOLOGIA Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Reparación. (3,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de registro de cortina tipo pesado RED-WHITE o equivalente de Ø 3/4", incluyendo tapa de registro, reparación de la superficie intervenida y demás elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada fijación del conjunto, la estanqueidad de las conexiones, la correcta restitución de las áreas afectadas por la intervención y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, seguridad, durabilidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 63 – PATOLOGIA_ PATOLOGIA_Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Reparación.

-3.7.3 PATOLOGIA Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. (6,00 und). Se realizan actividades de construcción de punto sanitario de Ø 2" en tubería PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación de la tubería, accesorios y conexiones, la adecuada fijación del sistema, la estanqueidad de las uniones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, funcionalidad, evacuación y operación previstos.



Ilustración 64 – PATOLOGIA_ Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.

-3.7.4 PATOLOGIA_ Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria. (1,00 und). Se realizan actividades de construcción de punto sanitario de Ø 4" en tubería PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación de la tubería, accesorios y conexiones, la adecuada fijación del sistema, la estanqueidad de las uniones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, funcionalidad, evacuación y operación previstos.



Ilustración 65 – PATOLOGIA_ Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.

-3.8.1 PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg. (31,00 m). Esta actividad contempla la ejecución de la línea primaria de desagüe pluvial en tubería PVC de Ø 4", ejecutada conforme a los planos de diseño, las especificaciones técnicas y los niveles establecidos en el proyecto. La actividad incluye la instalación de la tubería y sus accesorios, la verificación de alineación y pendientes, la correcta conformación de las uniones para asegurar la estanqueidad del sistema y las pruebas necesarias para garantizar la adecuada evacuación de las aguas lluvias, cumpliendo con los requisitos de calidad, resistencia y funcionamiento.



Ilustración 66 – PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.

-3.8.2 PATOLOGIA Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg. (1,50 m). La actividad comprende la ejecución de la línea primaria de desagüe pluvial en tubería PVC de Ø 6", de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, pendientes y demás especificaciones definidas en los planos y documentos técnicos del proyecto. Incluye el suministro e instalación de la tubería y sus accesorios, la conformación de las uniones, los ajustes necesarios para garantizar la continuidad del sistema y la verificación de su correcto funcionamiento, asegurando una evacuación eficiente de las aguas lluvias y el cumplimiento de los criterios de calidad, resistencia y durabilidad establecidos.



Ilustración 677 – PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg.

-3.8.3 PATOLOGIA Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg. (4,00 und). Corresponde a la instalación del bajante de desagüe pluvial en tubería PVC de Ø 4", de acuerdo con la ubicación, recorrido, niveles y especificaciones técnicas definidas en los planos y demás documentos del proyecto. La actividad incluye el suministro e instalación de la tubería, accesorios, soportes y elementos de fijación requeridos, garantizando la correcta verticalidad, estabilidad, hermeticidad de las uniones y la adecuada conducción de las aguas lluvias hacia el sistema de drenaje, cumpliendo con los requisitos de calidad, resistencia y durabilidad establecidos.



Ilustración 68 – PATOLOGIA_ Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.

-4.4.2 PATOLOGIA_ Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4. (2,00 m²). Esta actividad contempla la ejecución de pañete liso impermeabilizado en mortero de cemento y arena en proporción 1:4, aplicado sobre las superficies indicadas en los planos y de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. Incluye la preparación del sustrato, la dosificación y aplicación del mortero con aditivo impermeabilizante cuando corresponda, el afinado de la superficie hasta obtener un acabado uniforme y el control de las condiciones de curado, garantizando la adherencia, impermeabilidad, resistencia, durabilidad y calidad del acabado final.



Ilustración 69 – PATOLOGIA_ Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4

-5.1.7 PATOLOGIA_ Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. (5,45 m). La actividad comprende la demolición de concreto en columnas y vigas de cimentación, conservando el acero de refuerzo existente para su reutilización, de acuerdo con el alcance definido en los planos, las especificaciones técnicas y las indicaciones de la interventoría. Incluye la remoción controlada del concreto mediante procedimientos que eviten daños al acero de refuerzo, su limpieza y acondicionamiento para permitir su posterior incorporación a la estructura, así como la disposición del material producto de la demolición, garantizando la seguridad de la intervención y la integridad de los elementos a conservar.



Ilustración 70 – PATOLOGIA_ Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.

-5.4.1 PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (2,22 m²). Se realizan actividades de mampostería en bloque No. 4 con espesor de 0,10 m, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles, alineación y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta colocación de las unidades de mampostería, la adecuada dosificación y aplicación del mortero de pega, el cumplimiento de los plomos y juntas especificadas, y los requisitos de resistencia, estabilidad, durabilidad y calidad previstos.



Ilustración 71 – PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.

-5.4.6 PATOLOGIA Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo. (3,60 m). Se realizan actividades de construcción de bordillo (poyo) de confinamiento en concreto de f'c = 21 MPa, con altura de 0,10 m, incluyendo acero de refuerzo, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación y amarre del acero de refuerzo, la adecuada colocación, vibrado y curado del concreto, y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, estabilidad, durabilidad y calidad previstos.



Ilustración 72 – PATOLOGIA_ Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo

-5.5.3 PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. (255,04 m²). Se realizan actividades de impermeabilización con manto asfáltico de 3 mm con acabado en foil de aluminio, aplicado sobre imprimante, de acuerdo con la ubicación, pendientes, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta aplicación del imprimante, la instalación del manto con los traslapos y sellos requeridos, y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, impermeabilidad, resistencia a la intemperie, durabilidad y desempeño del sistema.



Ilustración 73 – PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.

-5.9.2 PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg. (10,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería EMT de Ø 3/4", de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros y especificaciones técnicas establecidas en los planos eléctricos y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación de la tubería, soportes, accesorios y elementos de fijación, la adecuada continuidad del sistema de canalización y el cumplimiento de los requisitos de seguridad, resistencia mecánica, durabilidad y funcionamiento previstos.



Ilustración 74 – PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg.

-6.1 PATOLOGIA_ Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados. (88,61 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de cintas post-aplicadas adheridas con resina epóxica sobre la membrana impermeabilizante, de acuerdo con la ubicación de las juntas, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta aplicación de la resina epóxica, la instalación y adherencia continua de las cintas, y el cumplimiento de los requisitos de impermeabilidad, flexibilidad, resistencia, durabilidad y sellado de juntas de construcción, juntas de expansión y uniones de elementos prefabricados.



Ilustración 75 – PATOLOGIA_ Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados.

-7.1 PATOLOGIA_ Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA (2,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de baterías para planta de emergencia de 150 kVA, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, los planos del proyecto y demás documentos contractuales, garantizando la correcta ubicación, fijación y conexión de las baterías, la verificación de la polaridad y continuidad del sistema, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad, capacidad de arranque, confiabilidad, durabilidad y adecuado funcionamiento de la planta de emergencia.



Ilustración 76 – PATOLOGIA_ Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA

ANEXOS

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

ACERO

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15508**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187020260**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**1 de 2**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.28	0.005	0.023	0.001	0.49	0.050	0.030	0.04

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.010

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF ST
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71376.0	95239.0	15.800	SinGrieta	1.33

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15508**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187020260**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 2**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
					Kg/m	mm	mm	mm
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/360	BOK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.002	0.690	2.510	8.500

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15509**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187021757** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 4**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013664	A011279718	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.10	0.20	0.017	0.014	0.000	0.49	0.225	0.055	0.130
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	100013664	BHP0102622	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.08	0.24	0.018	0.015	0.004	0.47	0.022	0.010	0.02
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJO0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.10	0.17	0.018	0.013	0.001	0.46	0.011	0.013	0.01
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJO010204U	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.016	0.014	0.002	0.46	0.015	0.011	0.01
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15509**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021757**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013664	A011279718	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.032
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	100013664	BHP0102822	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.004
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJO0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJO010204U	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.001
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15509**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187021757** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **3 de 4**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013664	A011279718	NTC 2289 GR60	Ternium	70042	95157	18	SinGrieta	1.36
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	100013664	BHP0102822	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68444	96333	15	SinGrieta	1.41
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJC0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71073	103288	15	SinGrieta	1.45
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJC010204U	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68858	99696	15	SinGrieta	1.45
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15509**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021757**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013664	A011279718	NTC 2289 GR60	Ternium	3.051	2.01	5.6	15.3
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	100013664	BHP0102822	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.957	0.60	1.9	8.2
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJO0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.560	0.88	3.7	10.5
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJO010204U	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.573	0.55	1.9	5.9
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15510**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187021758** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 4**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.97	0.16	0.020	0.009	0.001	0.46	0.131	0.059	0.135
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.96	0.18	0.030	0.009	0.001	0.45	0.174	0.055	0.132
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	0.29	0.95	0.15	0.024	0.009	0.001	0.47	0.161	0.060	0.144
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP009431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.19	0.019	0.009	0.002	0.44	0.017	0.013	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.24	0.012	0.010	0.003	0.45	0.011	0.008	0.02
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.24	0.012	0.010	0.003	0.45	0.011	0.008	0.02
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011288107	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.93	0.19	0.023	0.015	0.000	0.45	0.153	0.064	0.188
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	0.26	0.99	0.19	0.020	0.020	0.001	0.45	0.195	0.053	0.155

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15510**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021758**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.030
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.028
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.001
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.001
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011288107	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.029
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.023

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15510**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021758**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	72723	93873	17	SinGrieta	1.29
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	69691	90035	17	SinGrieta	1.29
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	69653	91046	19	SinGrieta	1.31
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP009431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	70088	100496	17	SinGrieta	1.43
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71304	103365	16	SinGrieta	1.45
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71304	103365	16	SinGrieta	1.45
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011268107	NTC 2289 GR60	Ternium	70633	91456	18	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	70307	93475	18	SinGrieta	1.33

Los datos del presente Informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este Informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15510**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021758**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	3.070	1.97	5.9	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	3.042	2.02	5.7	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	2.989	1.82	6.2	14.7
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP009431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.556	0.57	1.7	6.2
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.586	0.60	2.2	6.0
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.586	0.60	2.2	6.0
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011288107	NTC 2289 GR60	Ternium	2.256	1.53	4.2	12.5
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	2.238	1.17	4.8	12.5

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **BODEGA BARRIO SEVILLA**
Dirección: **AV 7A 15N 66 CUCUTA**
Teléfono: **5888777**

Fecha Impresión **24/06/25**
No. Remisión: **187022362**
Página: **1 de 5**

Informe N°: **14217**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178838	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% Nb	% CE
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**BODEGA BARRIO SEVILLA**	Fecha Impresión	**24/06/25**	Informe N°:	**14217**
Dirección:	**AV 7A 15N 66 CUCUTA**	No. Remisión:	**187022362**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 5**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% Nb	% CE
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal	Carga Fluencia	Carga Tracción
					PSI	PSI	%			Pulg.2	lbf	lbf
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de l editación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**BODEGA BARRIO SEVILLA**	Fecha Impresión	**24/06/25**	Informe N°:	**14217**
Dirección:	**AV 7A 15N 66 CUCUTA**	No. Remisión:	**187022362**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 5**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **BODEGA BARRIO SEVILLA**
Dirección: **AV 7A 15N 66 CUCUTA**
Teléfono: **5888777**

Fecha Impresión **24/06/25**
No. Remisión: **187022362**
Página: **4 de 5**

Informe N°: **14217**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620

DATOS GENERALES / PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.575	0.48	2.1

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de [illegible]litación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**BODEGA BARRIO SEVILLA**	Fecha Impresión	**24/06/25**	Informe N°:	**14217**
Dirección:	**AV 7A 15N 66 CUCUTA**	No. Remisión:	**187022362**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**5 de 5**		

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2022

* Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 477.4psi / ± 3.292 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 477.4psi / ± 3.292 Mpa
Alargamiento	± 0.486651 %
Altura Resalte	± 0.014965 mm
Separación entre extremos	± 0.028704 mm
Espaciamiento	± 0.020434 mm
Angulo de Resalte	± 0.285355 °
Peso metro (masa)	± 0.004056 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15571**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187023392** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 2**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.015	0.015	0.003	0.45	0.018	0.013	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.21	0.012	0.014	0.002	0.46	0.022	0.018	0.03

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71974	103121	16	SinGrieta	1.43
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69980	102899	18	SinGrieta	1.47

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15571**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023392**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 2**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.580	0.59	2.2	5.8
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.582	0.67	2.2	5.9

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15572**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187023547** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 3**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.014	0.013	0.002	0.45	0.010	0.010	0.01
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0098669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.20	0.017	0.017	0.002	0.46	0.013	0.013	0.01
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.015	0.015	0.003	0.45	0.018	0.013	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.015	0.015	0.003	0.45	0.018	0.013	0.03

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.007	0.001
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0098669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.002

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15572**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023547**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 3**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	70398	100327	15	SinGrieta	1.43
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0098669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	73283	105860	15	SinGrieta	1.44
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71974	103121	16	SinGrieta	1.43
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71974	103121	16	SinGrieta	1.43

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15572**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023547**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 3**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.557	0.82	3.0	10.6
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJO0098669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.656	0.92	3.8	10.6
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.580	0.59	2.2	5.8
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.580	0.59	2.2	5.8

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15574**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187023943** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 4**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.21	0.012	0.014	0.002	0.46	0.022	0.018	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.016	0.014	0.002	0.46	0.015	0.011	0.01
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.016	0.014	0.002	0.46	0.015	0.011	0.01
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.10	0.17	0.018	0.013	0.001	0.46	0.011	0.013	0.01
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.10	0.17	0.018	0.013	0.001	0.46	0.011	0.013	0.01

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.001
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.001
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.002
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.002

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5868777**	Página:	**3 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69980	102899	18	SinGrieta	1.47
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68858	99696	15	SinGrieta	1.45
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68858	99696	15	SinGrieta	1.45
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71073	103288	15	SinGrieta	1.45
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71073	103288	15	SinGrieta	1.45

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.582	0.67	2.2	5.9
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.573	0.55	1.9	5.9
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO010203T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.573	0.55	1.9	5.9
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.560	0.89	3.7	10.5
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.560	0.89	3.7	10.5

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

CONCRETO

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: JUNIO 2026

CILINDRO Laboratorio	CILINDRO Obra	ESTRUCTURA	FECHA Elaborado	FECHA Ensayo	EDAD (Días)	ASENTAMIENTO (PULG)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	PESO (grs)	DENSIDAD (kgs/cm3)	CARGA ROTURA (kgs)	RESISTENCIA Mpa	RESISTENCIA psi	% Resis. Especif.	Tipo Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
649	94A	BLOQUE A: FACHADA SALIDA DE EMERGENCIA. BLOQUE B: W.C. CAFETERÍA. CONCRETO EN OBRA	22.06.26	29.06.26	7		15,0	8,2	1630	2,058	10620	20,1	2860	114,4	Normal
650	94A		22.06.26	29.06.26	7		15,3	8,0	1620	2,106	9450	18,8	2674	107,0	Normal
651	94A		22.06.26	29.06.26	7		14,9	8,1	1620	2,110	11320	22,0	3124	125,0	Normal








652	94A	BLOQUE A: FACHADA SALIDA DE EMERGENCIA. BLOQUE B: W.C. CAFETERÍA. CONCRETO EN OBRA	22.06.26	20.07.26	28		14,9	7,7	1460	2,104	11750	25,2	3589	143,6	Normal
653	94A		22.06.26	20.07.26	28		15,0	8,0	1580	2,109	11430	22,7	3234	129,4	Normal
654	94A		22.06.26	20.07.26	28		15,1	8,1	1630	2,095	12310	23,9	3398	135,9	Normal








OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901370067-9

FECHA: JUNIO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
655	391	ÁREA COMEDOR, MOCHETAS CFICINA ABIERTA 14 PUESTOS, MOCHETAS CCTV. BLOQUE A Y B RES 3000Psi CONCRETO EN OBRA	23,06,26	30,06,26	7	6"	30,7	15,5	13130	2,267	54510	28,9	4109	137,0	Normal
656	391		23,06,26	30,06,26	7	6"	30,6	15,5	13130	2,274	52560	27,9	3962	132,1	Normal






657	391	ÁREA COMEDOR, MOCHETAS CFICINA ABIERTA 14 PUESTOS, MOCHETAS CCTV. BLOQUE A Y B RES 3000Psi CONCRETO EN OBRA	23,06,26	21,07,26	28	6"	30,8	15,2	12680	2,269	55840	30,8	4377	145,9	Normal
658	391		23,06,26	21,07,26	28	6"	31,0	15,1	12740	2,295	55010	30,7	4369	145,6	Normal






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: JUNIO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Días)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
659	95A	BLOQUE A: FACHADA OFICINA COMANDANTE DISTRITO. BLOQUE B: W.C. CAFETERÍA. CONCRETO EN OBRA	25,06,26	02,07,26	7		15,2	8,1	1630	2,081	11390	22,1	3144	125,8	Normal
660	95A		25,06,26	02,07,26	7		15,2	8,0	1610	2,107	11130	22,1	3149	126,0	Normal
661	95A		25,06,26	02,07,26	7		15,1	8,2	1640	2,057	11580	21,9	3119	124,8	Normal








662	95A	BLOQUE A: FACHADA OFICINA COMANDANTE DISTRITO. BLOQUE B: W.C. CAFETERÍA. CONCRETO EN OBRA	25,06,26	23,07,26	28		15,0	8,1	1610	2,083	14720	28,6	4063	162,5	Normal
663	95A		25,06,26	23,07,26	28		15,0	7,9	1580	2,149	14280	29,1	4144	165,7	Normal
664	95A		25,06,26	23,07,26	28		15,0	7,7	1490	2,133	14890	32,0	4548	181,9	Normal








OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: JULIO 2026

CILINDRO Laboratorio	CILINDRO Obra	ESTRUCTURA	FECHA Elaborado	FECHA Ensayo	EDAD (Días)	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	PESO (grs)	DENSIDAD (kgs/cm3)	CARGA ROTURA (kgs)	RESISTENCIA Mpa	RESISTENCIA psi	% Resis. Especif.	Tipo Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
686	97A	BLOQUE B: SEGUNDO PISO, CAFETERIA, PRIMER PISO BAÑOS. RES 2500 CONCRETO EN OBRA	01,07,26	10,07,26	9		15,0	8,3	1640	2,021	9630	17,8	2531	101,3	Normal
687	97A		01,07,26	10,07,26	9		15,2	8,1	1620	2,068	9350	18,1	2581	103,2	Normal
688	97A		01,07,26	10,07,26	9		15,0	8,2	1660	2,096	9390	17,8	2529	101,2	Normal
689	97A	BLOQUE B: SEGUNDO PISO, CAFETERIA, PRIMER PISO BAÑOS. RES 2500 CONCRETO EN OBRA	01,07,26	29,07,26	28										
690	97A		01,07,26	29,07,26	28										
691	97A		01,07,26	29,07,26	28										








OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: JULIO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Días)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
708	98A	BLOQUE A: MOCHETAS, BLOQUE B: CAFETERIA. RES 2500 CONCRETO EN OBRA	07,07,26	14,07,26	9		15,1	8,2	1610	2,019	8560	16,2	2305	92,2	Normal
709	98A		07,07,26	14,07,26	9		15,0	8,2	1620	2,045	9820	18,6	2645	105,8	Normal
710	98A		07,07,26	14,07,26	9		14,9	7,8	1490	2,093	8290	17,3	2468	98,7	Normal
711	98A	BLOQUE A: MOCHETAS, BLOQUE B: CAFETERIA. RES 2500 CONCRETO EN OBRA	07,07,26	04,08,26	28										
712	98A		07,07,26	04,08,26	28										
713	98A		07,07,26	04,08,26	28										








OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: JULIO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(PLG)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
714	398	COLUMNETAS Y DINTEL INFERIOR PASILLO BLOQUE C. RES 3000 Psi CONCRETO EN OBRA	08,07,26	15,07,26	7		30,6	15,4	12250	2,149	25980	13,9	1984	66,1	Normal
715	398		08,07,26	15,07,26	7		30,5	15,1	12050	2,206	26420	14,8	2098	69,9	Normal






716	398	COLUMNETAS Y DINTEL INFERIOR PASILLO BLOQUE C. RES 3000 Psi CONCRETO EN OBRA	08,07,26	05,08,26	28										
717	398		08,07,26	05,08,26	28										

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: JULIO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
718	401	VIGA CORONA 2DO PISO Y COLUMNETAS 1ER PISO BLOQUE C. RES 3000 Psi CONCRETO EN OBRA	10,07,26	24,07,26	14	8"	30,9	15,2	12330	2,199	19690	10,9	1543	51,4	Normal
719	401		10,07,26	24,07,26	14	8"	31,0	15,3	12600	2,211	34360	18,7	2658	88,6	Normal






720	401	VIGA CORONA 2DO PISO Y COLUMNETAS 1ER PISO BLOQUE C. RES 3000 Psi CONCRETO EN OBRA	10,07,26	07,08,26	28	8"									
721	401		10,07,26	07,08,26	28	8"									

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: JULIO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(Plg)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
722	402	VIGA CORONA 2DO PISO COLUMNETAS 1ER PISO. RES 3000 Psi CONCRETO EN OBRA	15,07,26	22,07,26	7	6" 1/4	30,7	15,3	12270	2,174	28470	15,5	2202	73,4	Normal
723	402		15,07,26	22,07,26	7	6" 1/4	30,8	15,5	12490	2,149	24910	13,2	1878	62,6	Normal






724	402	VIGA CORONA 2DO PISO COLUMNETAS 1ER PISO. RES 3000 Psi CONCRETO EN OBRA	15,07,26	12,08,26	28	6" 1/4									
725	402		15,07,26	12,08,26	28	6" 1/4									

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: JULIO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(Pulg)	(cm)	(cm)	(grs)	(kga/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
726	99A	BLOQUE A: PRIMER PISO (MOCHETAS, FACHADA SALA MULTIPLE 50 PERSONAS); BLOQUE B: PRIMER PISO (AREA COMEDOR, DESPENSA FRIA, MENAJE, DESINFECCION Y FACHADA AREA COMEDOR. RES 2500 CONCRETO EN OBRA	17,07,26	24,07,26	9		15,1	8,0	1580	2,082	7890	15,7	2233	89,3	Normal
727	99A		17,07,26	24,07,26	9		14,9	8,2	1590	2,021	8480	16,1	2284	91,4	Normal
728	99A		17,07,26	24,07,26	9		15,0	8,0	1580	2,096	8360	16,7	2371	94,8	Normal
729	99A	BLOQUE A: PRIMER PISO (MOCHETAS, FACHADA SALA MULTIPLE 50 PERSONAS); BLOQUE B: PRIMER PISO (AREA COMEDOR, DESPENSA FRIA, MENAJE, DESINFECCION Y FACHADA AREA COMEDOR. RES 2500 CONCRETO EN OBRA	17,07,26	14,08,26	28										
730	99A		17,07,26	14,08,26	28										
731	99A		17,07,26	04,08,26	28										








OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: JULIO 2026

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)	(Pulg)	(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif.	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
732	403	AREA COMEDOR (BLOQUE B). RES 4000 Psi CONCRETO EN OBRA	17,07,26	24,07,26	7	6" 3/4	30,9	15,1	12610	2,279	32280	18,0	2564	64,1	Normal
733	403		17,07,26	24,07,26	7	6" 3/4	30,8	15,1	12590	2,283	31840	17,8	2529	63,2	Normal






734	403	AREA COMEDOR (BLOQUE B). RES 4000 Psi CONCRETO EN OBRA	17,07,26	14,08,26	28	6" 3/4									
735	403		17,07,26	14,08,26	28	6" 3/4									

OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABOR Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

TUBERÍA

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 02303

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TUBOS DE PVC RÍGIDO MARCAS PLASTIMEC Y RALCO	LISO PESADO (DB) LISO LIVIANO (EB)	DB 2", 3", 4" Y 6" Y EB 3" Y 4"

CÓDIGO IAF:	14, 19	CÓDIGO NACE:	22.21, 27.33	CÓDIGO ICS:	-

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S. - IMEC S.A.S.

Carrera 37 No. 10-07 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1630/2006 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.6.1)

Fecha de Certificación: 2006 / 04 / 20
Fecha de renovación: 2021 / 09 / 24
Fecha de Vencimiento: 2024 / 09 / 24

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 09 / 24 y 2023 / 09 / 24

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02303

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2006 / 04 / 20
FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 09 / 24
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 09 / 24

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TUBOS DE PVC RÍGIDO MARCAS PLASTIMEC Y RALCO

Tipo	Liso pesado (DB), Liso liviano (EB)					
Referencia	DB de 2", 3", 4" y 6" y EB de 3", 4"					
	DB 2"	DB 3"	DB 4"	DB 6"	EB 3"	EB 4"
Diámetro exterior máximo (mm)	60,48	89,10	114,53	168,56	89,10	114,53
Diámetro exterior mínimo (mm)	60,18	88,70	114,07	168,00	88,70	114,07
Diámetro interno mínimo (mm)	50,80	76,20	101,60	152,40	76,20	101,60
Espesor pared mínimo (mm)	1,52	2,34	3,07	4,62	1,55	2,08
Ovalamiento máximo (mm)	1,52	1,52	2,54	2,54	1,52	2,54
Diámetro entrada máximo (mm)	61,11	90,07	115,65	170,13	90,07	115,65
Diámetro entrada mínimo (mm)	60,81	89,67	115,19	169,57	89,67	115,19
Ovalamiento (mm)	1,52	1,52	2,54	2,54	1,52	2,54
Diámetro fondo máximo (mm)	60,45	89,07	114,50	168,53	89,07	114,50
Diámetro fondo mínimo (mm)	60,15	88,67	114,04	167,97	88,67	114,04
Ovalamiento (mm)	1,52	1,52	2,54	2,54	1,52	2,54
Longitud mínima campana (mm)	45,00	73,00	86,00	127,00	73,00	86,00
Referencial	NTC 1630/2006 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6.1)					

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS

Fabricado por **CELTA S.A.S**, en la **Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia** identificada con **número de NIT 800.164.590-1**

Manufactured by **CELTA S.A.S**, in the **Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia** identified with **NIT number 800.164.590-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 - Cap. 3, Art. 20.6 y 20.6.1.1

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 - Capitulo 3, Articulo 20.6 y 20.6.1.1

Resolution No. 90708 of 2013 the Ministry of Mines and Energy. Technical Regulations for Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Sections 20.6 y 20.6.1.1

SECTOR ICS 29.120.10 - 83.080.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER605026
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-04-20
Approval Date:
Fecha de Renovación: 2024-04-17
Renewal Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:
Fecha de Vencimiento: 2027-04-19
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: clientes@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY ID # 9677

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-76, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento" Bogotá D.C., Colombia

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIOS CONDUIT

Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S**, en la **km 27 Vía Fontibón - Facatativá - Los Alpes, Vía Barley de Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,** identificada con **número de NIT 800.033.159-6**

Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S**, in the **km 27 Vía Fontibón - Facatativá - Los Alpes, Vía Barley de Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,** identified with **NIT number 800.033.159-6**

Fabricado por **IPEX INC**, en la **11 Bermondsey Road Toronto, Ontario, M4B1Z3; 247 rue St- Jacques. Saint Jacques de Montcalm Québec JOK 2RO, Joliette, Quebec, Canadá**

Manufactured by **IPEX INC**, in the **11 Bermondsey Road Toronto, Ontario, M4B1Z3; 247 rue St- Jacques. Saint Jacques de Montcalm Québec JOK 2RO, Joliette, Quebec, Canadá**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energia: 2013

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Resolución 90708. Capítulo 3 Artículo 20.6 y 20.6.1.1
Technical Regulation for Electrical Instalations RETIE – Resolution 90708 of 2013. Chapter 3 – Section 20.6 and 20.6.1.1

SECTOR ICS 23.04.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER1033390
Certificate

Fecha de Aprobación: 2023-12-06
Approval Date:
Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-02-01
Last Modification Date:
Fecha de Vencimiento: 2026-12-05
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

Tubos de PVC para Alojar y Proteger Conductores Eléctricos Aislados, Ducto Telefónico y Eléctrico de PVC

Fabricado por **INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S- IMEC S.A.S**, en la **Carrera 37 No 10-07 Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.**

Manufactured by **INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S- IMEC S.A.S**, in the **Carrera 37 No 10-07 Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia,**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 90708:2013 Minminas. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013 – Capítulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1.1

Technical Regulation for Electrical Installations – RETIE 2013, Chapter 3, article 20.6 y 20.6.1.1

SECTOR ICS 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER844704
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2021-05-14	Fecha Última Modificación: Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-07-07	Fecha de Vencimiento: Expiration Date:	2026-07-06

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY ID # 9677

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 02000

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	ENTERA	CC-E de 12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m (½" A 1" x 2.40 m a 3.05 m)

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

COBRES DE COLOMBIA S.A.S.

Carrera 40 No. 11-33 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 2206/2001 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE **(Numeral 15.3)**

Fecha de Certificación: 2005/10/28
Fecha de Renovación: 2023/07/18
Fecha de Vencimiento: 2026/07/17

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2024/07/17 y 2025/07/17

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02000

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/07/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/07/17

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

Tipo	Entera
Referencia	CC-E de 12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m (½" A 1" x 2.40 m a 3.05 m)
Contenido de cobre (%)	> 80
Conductividad a 20°C % IACS	> 97.4
Dureza HRF	> 80
Resistencia a la tracción	> 18
Resistencia en cámara salina	1000 horas mínimo
Marcación	Las varillas de puesta a tierra llevarán la siguiente información: Razón social o marca del fabricante y sus dimensiones, dentro de los primeros 30 centímetros desde la parte superior
Referencial	NTC 2206/2001 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 15.3)

Nota: Este certificado se unifica con el 00140.

Fábrica	Planta
COBRES DE COLOMBIA S.A.S.	YUMBO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 07925

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S.

Calle 10 # 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

IEC 60228/2004 y RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE **(Numeral 20.2)**

Fecha de Certificación: 2021/12/21
Fecha de Actualización: 2023/09/25
Fecha de Vencimiento: 2024/12/21

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2024/12/21

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las caracteristicas del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2021/12/21
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/09/25
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/21

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables de cobre y aluminio desnudo	
Referencia	Cobre: Calibres desde 0.5 mm^2 hasta 800 mm^2 Aluminio: Calibres desde 10 mm^2 hasta 800 mm^2	Calibres desde 0.5 mm^2 hasta 630 mm^2
Marca	CENTELSA y CENTELSA by NEXANS	
Conductor	Cobre suave y Aluminio 1350	Cobre suave
Cableado	Clase 2	Clase 5
Aplicación	Transmisión y distribución de energía eléctrica, en instalación aérea y para sistemas de puesta a tierra.	
Referencial	IEC 60228/2004 y RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)	

Fábrica	Planta
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S	YUMBO, COLOMBIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA -TUBERÍA PRESIÓN EXTREMO LISO - TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO - ACCESORIOS TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO - TUBO SANITARIO

Fabricado y Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F – 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Colombia,** identificada con **número de NIT 800.033.159-6**

Manufactured and Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca; Calle 4A No. 1F - 93 Barrio El Tesoro, Malambo, Atlántico, Colombia,** identified with **NIT number 800.033.159-6**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Expide los requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas

It issues the technical requirements related to chemical composition and information, which must be met by the aqueduct and sewerage pipes, ducts and accessories, those for sanitary use and those of rainwater, acquired by the people providing water and sewage services, as well as hydro-sanitary installations inside the homes

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER660061
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2019-01-04	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2019-12-31
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2025-01-03

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accredited by

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID 8007
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC Carrera 37 No. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA -TUBERÍA PRESIÓN EXTREMO LISO – TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO - ACCESORIOS TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO – TUBO SANITARIO

Fabricado y Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia,**
identificada con **número de NIT 800.033.159-6**

Manufactured and Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca,** identified with **NIT number 800.033.159-6**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Expide los requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas

It issues the technical requirements related to chemical composition and information, which must be met by the aqueduct and sewerage pipes, ducts and accessories, those for sanitary use and those of rainwater, acquired by the people providing water and sewage services, as well as hydro-sanitary installations inside the homes

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER660061
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2019-01-04	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2023-02-08
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2025-01-03

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB
ACCREDITED
PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID # 9677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍAS Y ACCESORIOS CON UNIÓN ELASTOMÉRICA

Fabricado y Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes V[2] Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F – 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Colombia**

Manufactured and Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F – 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 2295 (2008)

Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados para el transporte de fluidos a presión

Joints for plastics pressure pipes using flexible elastomeric seals

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado está sujeto a que la institución y el servicio cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial de certificación y en el documento "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos", lo cual será verificado por ICONTEC

This Certificate is subject to the company's and service's permanent fulfillment of the requirements set forth in the technical document and the "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos" document, which will be verified by ICONTEC

Certificado CSC-0042-3
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1995-02-02	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	2023-10-25	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	2024-03-19
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	2029-10-25		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY ID 3677

F-PS-632
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA DRENAJE SUBTERRANEO Y ALCANTARILLADO.

Fabricado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón – Facatativá,**

Los Alpes, Vía Barley del Colegio – Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón – Facatativá,**

Los Alpes, Vía Barley del Colegio – Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia
El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 3722-3 (2012)

Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra). Sistemas de tuberías de pared estructural de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: tuberías y accesorios con superficie externa no lisa, tipo B.

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (pp) and polyethylene (PE). Part 3: pipes and fittings with non-smooth external surface, type B

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC-CER411921
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	**2015-08-28**	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	**2021-08-27**	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	**2021-09-03**
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	**2027-08-26**		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID #0877
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C. Colombia

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO SANITARIO - TUBO VENTILACIÓN

Fabricado y Comercializado por **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F - 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Colombia**

Manufactured and Trader by **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F - 93**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1087 (2016)

Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación

Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent pipe

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado está sujeto a que la institución y el servicio cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial de certificación y en el documento "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos", lo cual será verificado por ICONTEC.

This Certificate is subject to the company's and service's permanent fulfillment of the requirements set forth in the technical document and the "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos" document, which will be verified by ICONTEC

Certificado CSC-0042-1
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1995-02-02	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	2023-10-25	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	2024-03-19
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	2029-10-25		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accreditated by

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY ID # 8677

F-PS-xxx
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-76, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA AGUA POTABLE EXTREMO LISO - TUBERÍA AGUA POTABLE UNIÓN MECÁNICA - TUBERÍA PRESIÓN AGUA POTABLE

Fabricado y Comercializado **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, en el **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F – 93 Barrio El Tesoro Malambo, Atlántico, Colombia**

Manufactured and Trader **DURMAN COLOMBIA S.A.S.**, in the **Kilómetro 27 Vía Fontibón - Facatativá, Los Alpes Vía Barley del Colegio - Vereda El Corzo Lote 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia. Calle 4 A No. 1 F – 93**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Plásticos. Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) clasificados según la presión (Serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series)

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado está sujeto a que la institución y el servicio cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial de certificación y en el documento "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos", lo cual será verificado por ICONTEC.

This Certificate is subject to the company's and service's permanent fulfillment of the requirements set forth in the technical document and the "R-PS-013 Reglamento para la Certificación de servicios y procesos" document, which will be verified by ICONTEC

Certificado CSC-0042-6
Certificate

Fecha de Aprobación: 1995-02-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2023-10-25
Last Expiration Date:

Fecha de Restauración: 2024-03-19
Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2029-10-25
Next Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2017
09-CPR-002

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID # 0677

F-PS-013
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-76, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento" Bogotá D.C., Colombia

ESTUCO

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

Invesa
La Compañía Amiga
890900652-3

Centro administrativo

Cra 48 26 sur - 181 IN 213
PBX: (4)334-27-27
Celular: 3009109093
ENVIGADO, ANTIOQUIA -COLOMBIA
http://www.invesa.com/
info@invesa.com

Planta de producción

Autopista Norte Km24 Vereda La Palma
PBX: (4)2890811
Celular: 3009109093
COLOMBIA GIRARDOTA - ANTIOQUIA
http://www.sapolin.com/

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Nombre producto	ESTUCO INTERIOR KG	Fecha vencimiento	22/01/27
Lote	4260509452	Fecha emisión certificado	15/07/26
Fecha fabricación	29/05/26	Estado inspección y ensayo	APROBADO

MUESTRA 1

PARAMETROS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS	TÉCNICA/METODO
pH, 25ºC	8 - 9	8.7	I-CC-M-P-008
% Solidos en peso	73,0 - 78,0	73.96	I-CC-M-P-007
Densidad, 25°C, Kg/gal	6,3 - 6,9	6.56	I-CC-M-P-009
Consistencia (cm)	9,0 - 9,5	9.5	I-CC-M-P-081
Viscosidad Brookfield (cP) RV-DVE (A:7,V:10) a 25ºC	180000 - 250000	210800	I-CC-E-I-017
OBSERVACIONES			

- Los resultados aquí reportados son los solicitados por el cliente y solo son válidos para esta muestra y este lote analizado en las fechas indicadas.
- INVESA S.A. ofrece garantía de las especificaciones de este producto más no puede garantizar las condiciones de aplicación porque estas son inherentes al manejo de quien lo aplica o usa.
- Las aplicaciones consignadas en la ficha técnica son fruto de nuestra experiencia mas no se convierte en garantía por tanto cada usuario debe efectuar ensayos antes de aprobar su utilización.
- INVESA S.A. está comprometida con la satisfacción de sus clientes. Para conocer sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) sobre los resultados emitidos y/o los servicios prestados, escribanos al correo de servicio al cliente: contactenos@invesa.com

El presente documento ha sido creado de forma electrónica y es válido sin necesidad de firma

** FIN DEL CERTIFICADO **

INFORME DE INTERVENTORÍA
CUENTA DE COBRO No. 15 DEL CONTRATO DE OBRA
Periodo corte del acta parcial de obra No. 15 del 22 de junio al 26 de julio del 2026
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-01362-2021
OBJETO: Estudio, diseño y construcción de estación base tipo c en el municipio de villa del rosario (la parada) norte de Santander, (convenio interadministrativo suscrito entre la nación ministerio del interior fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana fonsecon y el departamento norte de Santander).

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
R/L. FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-SG-1568-2021
OBJETO: Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra resultante del proceso licitatorio No. LP-SEG-001 de 2021 "Elaboración de estudios y diseños y construcción distrito de policía tipo c en el municipio de villa del rosario, sector la parada norte de Santander".

Contratista: UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD
R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
JULIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Localización del proyecto
2.2. Características técnicas del proyecto
2.3. Actividades a ejecutar
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
3.1. Datos generales
3.2. Aspectos financieros
3.2.1. Estado financiero del contrato de obra
3.3. Aspectos administrativos contractuales
3.3.1. Relación de documentos contractuales
3.4. Garantías
4. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DE OBRA
4.1. Actividades realizadas por el contratista
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
5.1. Datos generales
5.2. Aspectos financieros
5.2.1. Estado financiero del contrato de interventoría
5.3. Aspectos administrativos contractuales
5.3.1. Relación de documentos contractuales
5.4. Garantías
6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA
6.1. Interventoría técnica
6.1.1. Actividades desarrolladas por la interventoría
6.2. Personal de la interventoría
6.3. Equipos de la interventoría
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCIÓN

Villa del Rosario es un municipio fronterizo del Departamento Norte de Santander, está ubicado en la subregión Oriental, con una población aproximada de 111.254 Habitantes (DANE,2020), de los cuales la población urbana es el 97.1%, y la gran mayoría de la población pertenece a los estratos I y II.
La seguridad ciudadana ha adquirido una importancia creciente en las capitales de los departamentos como respuesta al temor creciente de la población frente a los actuales niveles inéditos de delincuencia, el incremento constante de violencias en el ámbito privado y al impacto de temas de carácter social en la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos; violaciones de derechos humanos, amenazas al medio ambiente, problemas de convivencia, accesibilidad a los servicios básicos, ineficiente provisión de servicios sociales y demás inseguridades económicas y sociales que afectan el pleno desarrollo de los individuos. Es por lo tanto el principal tema del debate público y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, referenciando los siguientes datos estadísticos Secuestros 13 de personas a 2017, Tasa de homicidios 47.5, Tasa de hurtos 179 2017, Tasa de violencia intrafamiliar 124.1.

Durante el año 2015 la dirección general de la policía nacional de Colombia y el comando de policía metropolitana de Cúcuta, han ordenado el apoyo de manera temporal, permanente efectiva y de impacto jurisdicción del Municipio de Villa del Rosario que por alguna circunstancia se ha dificultado el cumplimiento de los objetivos trazados en su lucha
En el sector la parada municipio de villa del rosario, se exterioriza por la presencia de bandas criminales quienes por la situación de zona fronteriza del municipio con la república bolivariana de Venezuela y en su afán de controlar la actividad ilícita, del contrabando, transporte ilegal, extensión, el hurto en todas sus modalidades y el tráfico de estupefacientes, generan los homicidios y las lesiones personales, en esta zona de frontera se tiene injerencia y control de los grupos de delincuencia común organizada- GDCO y del bloque CARLOS GERMAN VELAZCO VILLAMIZAR del ELN.

Los hechos se estarían presentando por el control de los pasos no habilitados entre la zona de frontera de Colombia y Venezuela en las trochas conocidas como el Tomito, La Playita y Los Mangos, con el propósito de obtener un control que permita fortalecer las rentas criminales de las estructuras.
En las zona limitrofe o fronteriza, se encuentran ubicadas las trochas que comunican con el vecino país, las cuales son utilizadas para el transporte ilegal de mercancía e hidrocarburos, asimismo, esto es aprovechado por grupos al margen de la Ley para el cobro de cuotas extorsivas, en los 31 kilómetros de frontera, que están siendo disputados por grupos de delincuencia común organizada. Fuentes de financiamiento.

Se basa en el control de los diferentes pasos informales utilizados para el contrabando de Hidrocarburos y elementos como autopartes, víveres y productos de aseo. Cobro de

extorsiones a comerciantes de La Parada y Villa del Rosario, actividades realizadas desde territorio venezolano.

El municipio de Villa del Rosario ha hecho del tema la bandera de sus programas de gobierno abocando por una seguridad, que vaya más allá del sentido reducido del control y el orden público y que en la búsqueda de la protección del hombre del común, llama a nuevos actores a su construcción a partir del diálogo social y la implementación de medidas que disuadan al infractor y que reduzcan la posibilidad de comisión del delito. La policía cumple un papel esencial en la prevención del delito. Su función tradicionalmente ha estado asociada a la protección civil de los ciudadanos.

Resulta indispensable estructurar la organización de la institución policial y el funcionamiento operacional de la misma brindando total apoyo. Por años el municipio no ha contado con una estación de policía que cumpla con todos los requisitos para albergar los uniformados que prestan su servicio de vigilancia y seguridad en el municipio, solo cuenta con unas instalaciones, la cual fue adaptada en predios de una institución educativa del casco urbano que no ofrece ninguna garantía de seguridad y eficiencia al personal. El municipio ha mantenido en funcionamiento la estación de policía, pero no puede garantizar que la prestación de este servicio a la comunidad se haga de manera adecuada debido a que la estación funciona en una edificación improvisada que no cumple los parámetros de diseño y construcción establecidos en las Normas Sismo Resistentes NSR-10, logrando espacios que brinden al personal policial la seguridad y comodidad requeridas para la correcta prestación del servicio, lo que se verá reflejado en mayores niveles de seguridad para la población del municipio de Villa de Rosario.

En virtud de lo consagrado por el artículo 2 la ley 1150 de 2007 y lo adicionado por el numeral 1 del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, "(...) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo"

No tratándose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el mercado, es conclusión que no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de selección de contratación directa señaladas en el artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007.
No siendo aplicable las causales establecidas en artículo 2, numeral 2, literal a, c, d, e, f, g, h, i, de la ley 1150 de 2007, por tratarse de un contrato con objeto complejo como lo es la obra pública, es consecuencia, que la escogencia del contratista debe efectuarse bien por la modalidad de selección a aplicar es la de **LICITACIÓN PÚBLICA**, de acuerdo con lo consagrado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, decreto 1082 de2015 y la ley 1882 de 2018; de acuerdo con la cuantía del contrato y los parámetros legales para determinar la menor cuantía.

Teniendo como parámetro el monto del presupuesto **LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** para la vigencia 2021, así como el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, el presupuesto oficial se establece en la suma de **VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($ 22.982.010.588,00),** en el cual se encuentran incluidos todos los costos de diseños y obras.

Que, el Gobernador del Departamento Norte de Santander, mediante decreto No. 00252 del 11 de febrero de 2020 del departamento, delegó a los secretarios de despacho de la administración Departamental la competencia de expedir los actos administrativos y en general, ejecutar la actividad precontractual, contractual y postcontractual desde la generación de la necesidad, elaboración estudios previos, convocatoria, suscripción de contratos y acta e inicio, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la normatividad contractual vigente y el Manual de Contratación.

El Departamento Norte de Santander a través de la **SECRETARIA DE GOBIERNO,** pone a disposición de los interesados el proyecto de Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato para el **ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).**

El objeto del Contrato es el **ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).**

El alcance del objeto consiste en i) Elaborar los estudios y diseños y demás actividades requeridas en el marco del Convenio en el Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. ii) El desarrollo de las respectivas obras de construcción y iii) Posterior entrega del bien inmueble en completo funcionamiento.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

El proyecto se localiza en el departamento de norte de Santander en el municipio de villa del rosario exactamente en el sector de la parada zona de frontera con Venezuela, en donde las condiciones de frontera y las características de la misma resulta de mucha importancia su ejecución.

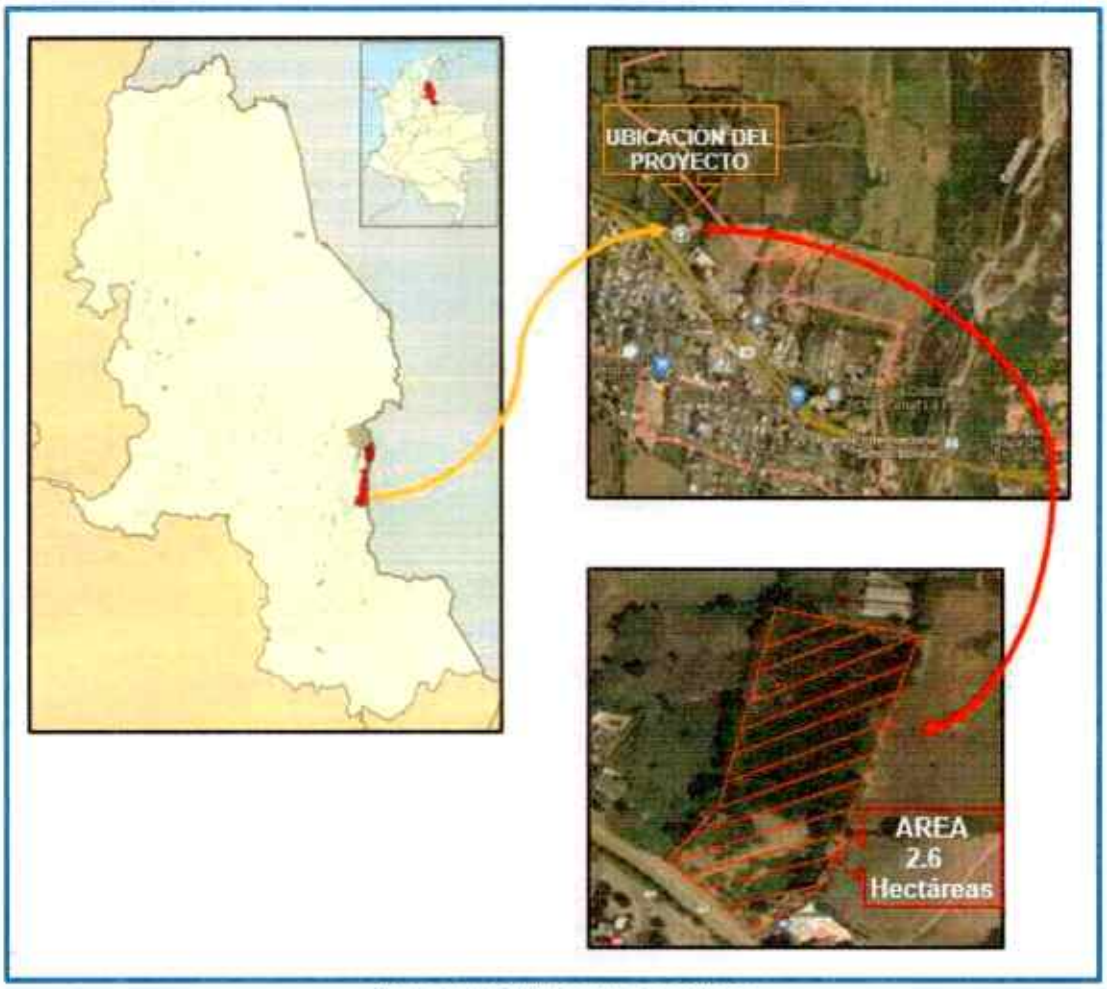


ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

2.2. Características técnicas del proyecto

El tema de seguridad pública se ha vuelto recurrente. El municipio de Villa Rosario Norte de Santander, donde se evidencia y se registra la evolución del delito, el incremento de las tasas poblacionales, los índices crecientes y permanentes de desempleo, la afectación económica por la que se atraviesa; conllevan a visionar y fortalecer e implementar diferentes mecanismos que contribuyan de manera significativa no solamente la disminución de los índices delincuenciales, sino en la inversión social partiendo desde la prevención, como actor representativo de los factores que inciden en mantener las condiciones necesarias para asegurar la convivencia pacífica y seguridad pública.

Por lo anterior, se considera necesario la ubicación de la base del tercer distrito de policía de villa del rosario, esta unidad servirá para albergue, apoyo y la integración de los componentes operacionales con grupos especializados de varias direcciones del nivel operativo de la Policía Nacional, teniendo en cuenta su misionalidad, características, funciones, ámbitos de acción y nivel de aplicabilidad, de tal forma que los comandantes puedan contar con unidades mejor organizadas para la prevención. Disuasión y el control delincuencial.

La ejecución de la obra "**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)**" tiene como fin contribuir a restablecer la seguridad en el territorio fronterizo, permitiendo avanzar y recuperar la legalidad, garantizando la seguridad y convivencia de acuerdo con las políticas de seguridad y las directrices nacionales.

Las especificaciones técnicas de construcción son las establecidas en la Norma Técnica Colombiana, norma sismo resistente NSR-10, las especificaciones técnicas de diseño y estudios técnicos comandos y distritos policía a nivel nacional y la resolución No. 0493 del 12 de diciembre del 2013.

2.3. Actividades a ejecutar

El proyecto tiene dos etapas que consisten en la elaboración de estudios y diseños y una siguiente etapa la construcción, de esta manera se garantiza el cumplimiento del alcance del proyecto.

En el desarrollo del primer componente de estudios y diseños se tendrá en cuenta el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño urbano del espacio público, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño de red de incendios, diseño de red de gas, diseño eléctrico e iluminación, diseño voz y datos, diseño mecánico y

bioclimático, presupuesto y programación de obra y otras que se deriven de los mismos.

Para el componente de construcción se desarrollará el presupuesto que salga del resultado del componente de estudios y diseños para el área de construcción cubierto y el área de construcción descubierto; dando cumplimiento a todos los estándares de calidad, durabilidad y estabilidad de esta.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Datos generales

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO Nº	LP-SG-01362-2021 del 31 de agosto del 2021
OBJETO:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN E MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C. Nº	1.090.407.083 DE CÚCUTA
ACTA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: DIECISIETE (17) MESES, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
PRORROGA No. 01	OTROSÍ ADICIONAL No. 01 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 POR DIECISIETE (17) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.
PRORROGA No. 02	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 DEL 15 DE ABRIL DE 2024 POR DOCE (12) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025.
PRORROGA No. 03	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 03 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 POR DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.
PRORROGA No. 04	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 04 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 POR DOS (02) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
PRORROGA No. 05	OTROSÍ MODIFICATORIO No. 05 DEL 28 DE MAYO DE 2026 POR DOS (02) MESES, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026.
PLAZO TOTAL	CUARENTA MESES (40) Y VEINTICUATRO (24) DIAS, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026.
VALOR INICIAL	$ 892.406.699,00 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 22.089.603.889,00 – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: $ 22.982.010.588,00 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
VALOR INICIAL SEGÚN BALANCE No. 01 (Estudios y Diseños)	Y OCHO PESOS MCTE. $ 889.503.871,00 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 22.092.506.717,00 – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: $ 22.982.010.588,00 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.
VALOR ADICIONAL No. 01 (Presupuesto de Obra)	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 DEL 15 DE ABRIL DE 2024 POR UN VALOR DE $ 11.490.240.893,00
VALOR ADICIONAL No. 02 (Reparaciones)	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 03 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 POR UN VALOR DE $ 2.583.294.926,00
VALOR ADICIONAL No. 03 (Presupuesto de Obra)	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 04 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 POR UN VALOR DE $ 2.838.905.865,00
VALOR TOTAL (Presupuesto de Obra)	$ 36.421.653.475,00
VALOR TOTAL (Presupuesto de Obra + Reparaciones)	$ 39.004.948.401,00
VALOR TOTAL (Presupuesto de Obra + Reparaciones + Estudios y Diseños)	$ 39.894.452.272,00
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RUBRO	**2.3.2.02.02.008** – servicios prestados a las empresas y servicio de producción – 11 RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. **Rubro 2.3.2.02.02.055** – servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546 – 2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR **2.3.2.02.02.008** – Servicio de la construcción -11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE **2.3.2.02.02.009** – Servicio para la comunidad, sociales y personales, cuya fuente de recursos es 1.2.3.2.06 Contribución sobre contratos de obra pública, con Código BPIN 2020004540020-fortalecimiento institucional y servicio de apoyo integral, como estrategia para la seguridad ciudadana en el departamento Norte de Santander, producto DANE: 91199 – Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.
SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA

3.2. Aspectos financieros

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 002246 del 06 de julio de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $892.406.699,00 **TOTALES: $892.406.699,00**
	No. 002247 del 06 de julio de 2021 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 35-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR por un valor de $21.654.977.873,30 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $509.624.744,70 **TOTALES: $22.164.602.618,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3572 del 31 de agosto de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE – Disponibilidad 2246-juli-06/2021 por un valor de $892.406.699,00 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 35-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR – Disponibilidad 2247-juli-06/2021 por un valor de $21.654.977.873,30 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE – Disponibilidad 2247-juli-06/2021 por un valor de $434.626.015,70 **TOTALES: $22.982.010.588,00**
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. (**$ 22.982.010.588,00**)
FORMA DE PAGO:	**Anticipo: N.A.** El departamento pagara al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así: **a). COMPONENTE 1 – estudio y diseños:** un único pago correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($892.406.699,00) previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación de recibo a satisfacción de la interventoría de los estudios y diseños con sus anexos. Los diseños deben estar aprobados por la DIRAF, y el producto debe ser recibido por el ministerio del interior. **b). COMPONENTE 2 – CONSTRUCCIÓN:** El Cien por ciento (100%) del valor

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	de la construcción se pagarán mediante Actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoría del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoría designado o contratado por la secretaria de GOBIERNO y con el Visto Bueno del secretario de GOBIERNO del Departamento. Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor del contrato, y supervisor de interventoría. Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Gobierno la factura o cuenta de cobro correspondiente. Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y probado. Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y especificaciones técnicas del proyecto.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **VIGENCIAS ACTUALIZADAS**	No. 00 001370 del 12 de abril de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S por un valor de $437.528.843,70 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.11.08-R.B OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35VE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR VIGENCIAS EXPIRADAS por un valor de $21.654.977.873,30 **TOTALES: $22.092.506.717,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS**	No. 00 001371 del 12 de abril de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S por un valor de $3.589.950.332,61 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR por un valor de $5.422.652.518,79 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S por un valor de $2.477.638.041,69 **TOTALES: $11.490.240.893,09**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 001232 del 15 de abril de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – DISPONIBILIDAD No. 001371-ABRIL-12/2024 por un valor de $3.589.950.332,61 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR – DISPONIBILIDAD No. 001371-ABRIL-12/2024 por un valor de $5.422.652.518,79 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – DISPONIBILIDAD No. 001371-ABRIL-12/2024 por un valor de $2.477.638.041,69 **TOTALES: $11.490.240.893,09**
VALOR ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA:	ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. (**$11.490.149.893,00**)
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. (**$34.472.251.481,00**)
REGISTRO PRESUPUESTAL **VIGENCIAS ACTUALIZADAS**	No. 00 002176 del 22 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – DISPONIBILIDAD No. 001370-ABRIL-12/2024 por un valor de $437.528.843,70 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.11.08-R.B OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35VE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR VIGENCIAS EXPIRADAS – DISPONIBILIDAD No. 001370-ABRIL-12/2024 por un valor de $21.654.977.873,30 **TOTALES: $22.092.506.717,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS**	No. 00 005031 del 15 de octubre de 2025 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $2.583.294.926,00 **TOTALES: $2.583.294.926,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS**	No. 00 005393 del 31 de octubre de 2025 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD No. 005031-15/10/2024 por un valor de $2.583.294.926,00 **TOTALES: $2.583.294.926,00**
VALOR ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA (REPARACIONES):	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE (**$2.583.294.926,00)**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 001367 del 12 de enero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $ 2.838.905.865,00 **TOTALES: $ 2.838.905.865,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 002851 del 11 de febrero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD No. 001367-12/10/2026 por un valor de $ 2.838.905.865,00 **TOTALES: $ 2.838.905.865,00**
VALOR ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA:	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 2.838.905.865,00)**

3.2.1. Estado financiero del contrato de obra

A la fecha del presente informe se han generado quince (15) actas de recibo parcial, al contrato de obra, las cuales se describen en el siguiente cuadro:
(se actualiza porcentaje de actas de obra ejecutadas de acuerdo con el nuevo valor total del contrato de obra debido al adicional en recursos No. 03 y prorroga No. 05)

ESTADO FINANCIERO DE CONTRATO DE OBRA					
CONCEPTO	**FECHA**	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA**	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR DE ACTA DE OBRA EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO DE ACTAS DE OBRA**
Acta Parcial No. 01	13/05/2022	2,23%	2,23%	$ 889.503.871,00	$ 889.503.871,00
Acta Parcial No. 02	17/04/2024	17,59%	19,82%	$ 7.018.501.487,00	$ 7.908.005.358,00
Acta Parcial No. 03	28/05/2024	6,11%	25,93%	$ 2.437.008.899,00	$ 10.345.014.257,00
Acta Parcial No. 04	02/08/2024	4,24%	30,17%	$ 1.693.360.996,00	$ 12.038.375.253,00
Acta Parcial No. 05	21/10/2024	5,50%	35,67%	$ 2.192.783.899,00	$ 14.231.159.152,00
Acta Parcial No. 06	27/11/2024	3,62%	39,29%	$ 1.444.696.737,00	$ 15.675.855.889,00
Acta Parcial No. 07	13/12/2024	4,29%	43,58%	$ 1.710.779.195,00	$ 17.386.635.084,00
Acta Parcial No. 08	31/01/2025	2,91%	46,49%	$ 1.162.312.401,00	$ 18.548.947.485,00
Acta Parcial No. 09	19/02/2025	7,11%	53,60%	$ 2.834.860.248,00	$ 21.383.807.733,00
Acta Parcial No. 10	16/12/2025	0,39%	53,99%	$ 157.291.519,00	$ 21.541.099.252,00
Acta Parcial No. 11	11/03/2026	2,76%	56,76%	$ 1.102.566.931,00	$ 22.643.666.180,00
Acta Parcial No. 12	15/04/2026	4,07%	60,83%	$ 1.622.602.934,00	$ 24.266.269.114,00
Acta Parcial No. 13	25/05/2026	1,33%	62,16%	$ 529.537.598,00	$ 24.795.806.715,00
Acta Parcial No. 14	24/06/2026	2,05%	64,21%	$ 819.478.025,00	$ 25.615.284.738,00
Acta Parcial No. 15	EN CURSO	2,53%	66,74%	$ 1.008.233.731,00	$ 26.623.518.469,00
TOTAL		**66,74%**		**$ 26.623.518.469,00**	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA					**$ 39.894.452.272,00**
TOTAL, PAGADO EN ACTAS					**$ 25.615.284.738,00**
TOTAL, VALOR FALTANTE POR COBRAR					**$13.270.933.803,00**

3.3. Aspectos administrativos contractuales

A la fecha y para el periodo de corte del informe, se han emitido diversos actos administrativos que conforman la trazabilidad del contrato de obra No. LP-SG-01362-2021. Estos documentos

se relacionan y describen a continuación según su respectiva línea de tiempo:

- ✓ Celebración de contrato de obra No. LP-SG-01362-2021 el día 31 de Agosto del 2021 entre el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC y la Gobernación del Departamento Norte de Santander, suscrito a la Secretaria de Gobierno.

- ✓ El día 19 de Octubre de 2021 se suscribe el Acta de Inicio al contrato de Obra No. LP-SG-01362-2021.

- ✓ El día 13 de Mayo de 2022 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, correspondiente a la elaboración y entrega de estudios y diseños del proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN E MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" por un valor de $889.503.871,00.

- ✓ El día 29 de Diciembre de 2022 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, PRORROGA No. 01 por diecisiete (17) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2024.

- ✓ El día 14 de Febrero de 2023 se suscribe el Acta de Suspensión No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.

- ✓ El día 03 de Noviembre de 2023 se suscribe el Acta de Reinicio No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.

- ✓ El día 15 de Abril de 2024 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, adicional en recursos No. 01 por un valor de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($11.490.240.893,00) y prorroga No. 02 por doce (12) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2025.

- ✓ El día 17 de Abril de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $7.018.501.487,00.

- ✓ El día 22 de Mayo de 2024 se suscribe la minuta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 02 Que mediante Decreto No. 000714 del 4 de abril de 2024, Por la cual se incorporan las vigencias expiradas y/o pasivos exigibles en el decreto de liquidación del Presupuesto General de rentas, recursos de capital y gasto del departamento Norte de Santander, para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), contenido en el Decreto No. 004167 del 28 de diciembre de 2023, se constituyó la vigencia expirada o pasivo exigible para el Convenio interadministrativo 1546-2020 con el Ministerio del Interior, derivado el contrato electrónico de obra pública No. 01362-2021.

- ✓ El día 28 de Mayo de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $2.437.008.899,00.
- ✓ El día 02 de Agosto de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 04 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.693.360.996,00.
- ✓ El día 21 de Octubre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 05 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $2.192.783.899,00.
- ✓ El día 27 de Noviembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 06 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.444.696.737,00.
- ✓ El día 13 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 07 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.710.779.195,00.
- ✓ El día 26 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Suspensión No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El 07 Enero de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 31 de Enero de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 08 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.162.312.401,00.
- ✓ El día 19 de Febrero de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 09 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $2.834.860.248,00.
- ✓ El día 24 de Febrero de 2025 se suscribe el Acta de Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 24 de Junio de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 25 de Agosto de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 25 de Septiembre de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 10 Octubre de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 31 de Octubre de 2025 se suscribe la minuta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, adicional en recursos No. 02 por un valor de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($2.583.294.926,00) y prorroga No. 03 por dos (02) meses y diecisiete (17) dias, hasta el 31 de Marzo de 2026.

- ✓ El día 16 de Diciembre de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 10 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $ 157.291.519,00.

- ✓ El día 11 de Febrero de 2026 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL MODIFICATORIO No. 04 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, adicional en recursos No. 03 por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.838.905.865,00) y prorroga No. 04 por dos (02) meses, hasta el 31 de Mayo de 2026.

- ✓ El día 16 de febrero de 2026 se aprueba el balance al presupuesto de reparaciones sin afectar el valor contratado.

- ✓ El día 11 de Marzo de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 11 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $ 1.102.566.931,00.

- ✓ El día 15 de Abril de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 12 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $ 1.622.602.934,00.

- ✓ El día 25 de Mayo de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 13 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $ 529.537.598,00.

- ✓ El día 28 de Mayo de 2026 se suscribe la minuta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 05 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, prorroga No. 05 por dos (02) meses, hasta el 31 de Julio de 2026.

- ✓ El día 24 de Junio de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 14 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $ 819.478.025,00.

3.3.1. Relación de documentos contractuales

RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	
DOCUMENTO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
Minuta Contrato de Obra	31 de Agosto del 2021
Acta de Inicio de Obra	19 de Octubre de 2021
Acta de Recibo Parcial No. 01	13 de Mayo de 2022
Minuta Otrosí Adicional No. 01	29 de Diciembre de 2022
Acta de suspensión No. 01	14 de Febrero del 2023
Acta de Reinicio No. 01	03 de Noviembre del 2023
Minuta Otrosí Adicional No. 02	15 de Abril de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 02	17 de Abril de 2024
Minuta Otrosí Modificatorio No. 02	22 de Mayo de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 03	28 de Mayo de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 04	02 de Agosto de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 05	21 de Octubre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 06	27 de Noviembre de 2024

RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	
DOCUMENTO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
Acta de Recibo Parcial No. 07	13 de Diciembre de 2024
Acta de Suspensión No. 02	26 de Diciembre de 2024
Acta de Reinicio No. 02	07 Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 08	31 de Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 09	19 de Febrero de 2025
Acta de Suspensión No. 03	24 de Febrero de 2025
Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03	24 de Junio de 2025
Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03	25 de Agosto de 2025
Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03	25 de Septiembre de 2025
Acta de Reinicio No. 03	10 Octubre de 2025
Minuta Otrosí Modificatorio No. 03	31 de Octubre de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 10	16 de Diciembre de 2025
Minuta Otrosí Adicional y Modificatorio No. 04	11 de Febrero de 2026
Balance presupuesto reparaciones No. 01	16 Febrero de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 11	11 de Marzo de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 12	15 de Abril de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 13	25 de Mayo de 2026
Minuta Otrosí Modificatorio No. 05	28 de Mayo de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 14	24 de Junio de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 15	EN CURSO

3.4. Garantías

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN CONTRATO DE OBRA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. Fecha de Expedición: 08/09/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.059,00	08_09_2.021	08_05_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,00	30_12_2.021	30_12_2025
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,00	30_12_2022	30_12_2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. Fecha de Expedición: 08/09/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,00	08_09_2021	30_12_2022
	Patronal	$ 344.730.158,00	08_09_2021	30_12_2022
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,00	08_09_2021	30_12_2022
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,00	08_09_2021	30_12_2022

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4. Fecha de Expedición: 03/11/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.059,00	19_10_2.021	18_06_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,00	19_10_2.021	09_02_2026
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,00	09_02_2023	09_02_2028
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4. Fecha de Expedición: 03/11/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,00	19_10_2021	09_02_2023
	Patronal	$ 344.730.158,00	19_10_2021	09_02_2023
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,00	19_10_2021	09_02_2023
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,00	19_10_2021	09_02_2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 01 (PRORROGA No. 01)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5. Fecha de Expedición: 24/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.058,80	29_12_2.022	01_10_2024
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,20	29_12_2.022	31_05_2027
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,40	31_05_2024	31_05_2029
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5. Fecha de Expedición: 24/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,40	19_10_2021	31_05_2024
	Patronal	$ 344.730.158,82	19_10_2021	31_05_2024
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,82	19_10_2021	31_05_2024
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,82	19_10_2021	31_05_2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 01				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 6. Fecha de Expedición: 28/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.058,80	03_11_2.023	17_06_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,20	03_11_2.023	17_02_2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,40	17_02_2025	17_02_2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 6. Fecha de Expedición: 28/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,40	19_10_2021	17_02_2025
	Patronal	$ 344.730.158,82	19_10_2021	17_02_2025
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,82	19_10_2021	17_02_2025
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,82	19_10_2021	17_02_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 01 Y PRORROGA No. 02)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 7. Fecha de Expedición: 16/04/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.447.225.148,10	16_04_2.024	30_09_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.170.837.722,15	16_04_2.024	31_05_2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 10.341.675.444,30	31_05_2025	31_05_2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 7. Fecha de Expedición: 16/04/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.723.612.574,05	19_10_2021	31_05_2025
	Patronal	$ 861.806.287,00	19_10_2021	31_05_2025
	Contratista y Subcontratistas	$ 861.806.287,00	19_10_2021	31_05_2025
	Vehículos Propios y No Propios	$ 861.806.287,00	19_10_2021	31_05_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 02				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 8-9. Fecha de Expedición: 16/01/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.447.225.148,10	26_12_2.024	12_10_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.170.837.722,15	26_12_2.024	12_06_2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 10.341.675.444,30	12_06_2025	12_06_2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 8-9. Fecha de Expedición: 16/01/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.723.612.574,05	19_10_2021	12_06_2025
	Patronal	$ 861.806.287,00	19_10_2021	12_06_2025
	Contratista y Subcontratistas	$ 861.806.287,00	19_10_2021	12_06_2025
	Vehículos Propios y No Propios	$ 861.806.287,00	19_10_2021	12_06_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 12. Fecha de Expedición: 05/11/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.705.554.640,70	10_10_2.025	31_03_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.558.331.961,05	10_10_2.025	31_03_2026
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 11.116.663.922,10	31_03_2026	31_03_2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 12. Fecha de Expedición: 05/11/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.852.777.320,35	19_10_2021	31_03_2026
	Patronal	$ 926.388.660,18	19_10_2021	31_03_2026
	Contratista y Subcontratistas	$ 926.388.660,18	19_10_2021	31_03_2026
	Vehículos Propios y No Propios	$ 926.388.660,18	19_10_2021	31_03_2026


RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 04 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 03 Y PRORROGA No. 04)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 14. Fecha de Expedición: 18/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.989.445.227,20	19_10_2.021	30_09_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.984.167.840,80	19_10_2.021	31_05_2029
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 11.968.335.681,60	31_05_2026	31_05_2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 13. Fecha de Expedición: 18/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.994.722.613,60	19_10_2021	31_05_2026
	Patronal	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_05_2026
	Contratista y Subcontratistas	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_05_2026
	Vehículos Propios y No Propios	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_05_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO No. 05 (PRORROGA No. 05)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 15. Fecha de Expedición: 09/06/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.989.445.227,20	19_05_2.025	30_11_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.984.167.840,80	19_05_2.026	31_07_2029
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 11.968.335.681,60	31_07_2031	31_07_2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 14. Fecha de Expedición: 09/06/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.994.722.613,60	19_10_2021	31_07_2026
	Patronal	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_07_2026
	Contratista y Subcontratistas	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_07_2026
	Vehículos Propios y No Propios	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_07_2026

4. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DE OBRA

En el siguiente cuadro se presenta los porcentajes programados vs los ejecutados con sus respectivos valores acumulados al periodo comprendido del 19 de octubre de 2021 (inicio) al 26 de julio de 2026 (fecha de corte), que se relacionan del semanal No. 01 al semanal No. 109. Estos porcentajes son actualizados de acuerdo con el adicional No. 03 en recursos y prorroga No. 05. Los porcentajes reportados no incluyen el valor de estudios y diseños, solo se relaciona el valor y porcentaje correspondiente a la ejecución de obra física.

OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (%)	94,61%	VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 36.901.084.054,00
OBRA EJECUTADA ACUMULADA (%)	65,98%	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 25.734.014.598,00

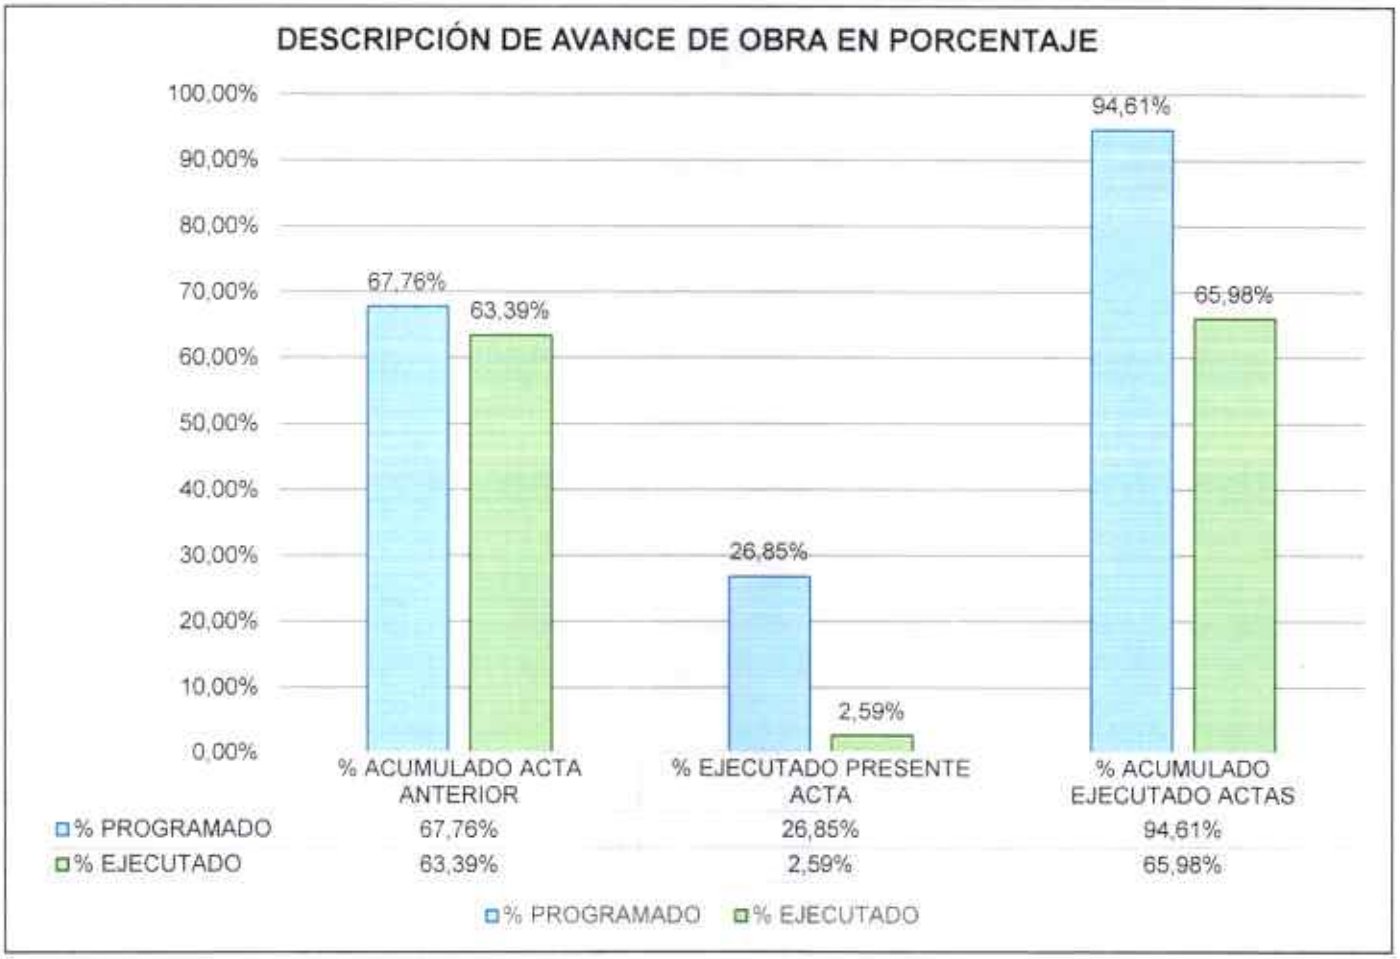



4.1. Actividades realizadas por el contratista

Durante el periodo comprendido entre el 22 de junio al 26 de julio de 2026 el contratista ejecuta el presupuesto de reparaciones y realiza las siguientes actividades:

REPARACIONES

1 BLOQUE A
1,1 PRELIMINARES

1.1.4 NP Puertas de ascensor





2 BLOQUE B

2,2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2.2.4 Acero de refuerzo.




2,3 PUENTES DE ADHERENCIA

2.3.4 Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural.





2,4 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES

2.4.1 Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.
2.4.4 Pañete liso para muro en mortero 1:4.
2.4.5 Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.



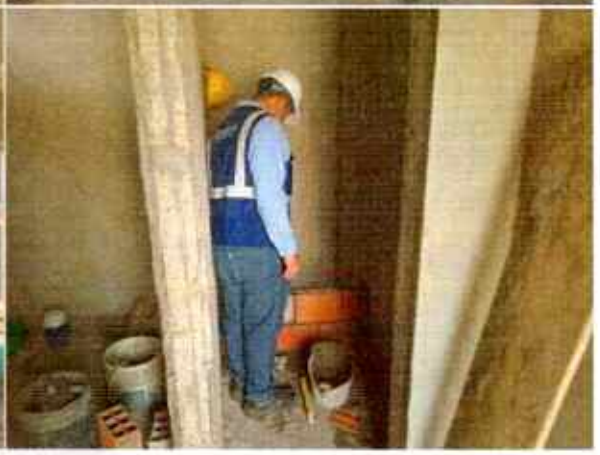

3 BLOQUE C

3,1 PRELIMINARES

3.1.4 Retiro de manto asfaltico.



3,2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3.2.3 Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.



3.2.4 Acero de refuerzo.






3.2.7 Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.




3,4 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES

3.4.1 Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.
3.4.2 Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.









3,5 IMPERMEABILIZACIONES

3.5.3 Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.




3,6 HIDRÁULICO


3.6.1 Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios.

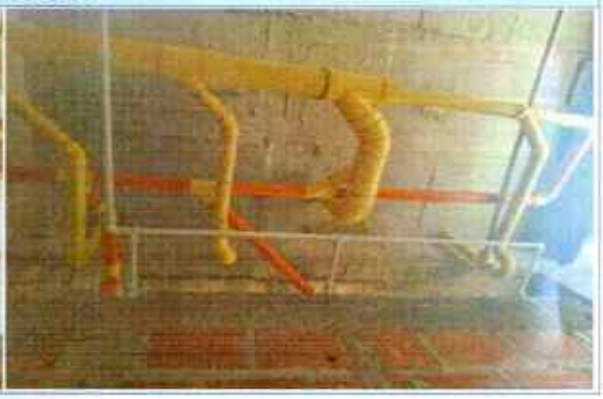3.6.2 NP Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) incluye soporte y accesorios.



3.6.3 NP Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios.

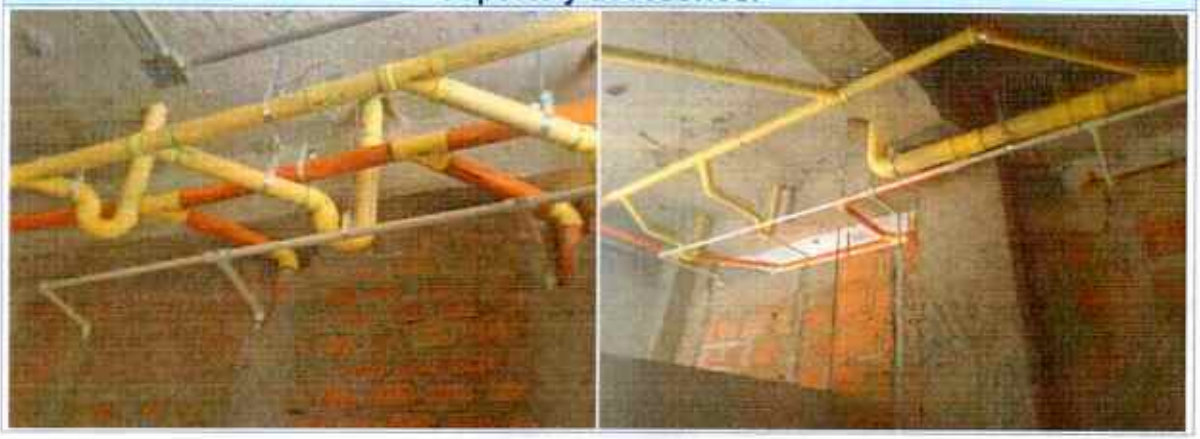


3.6.4 NP Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios.



3.6.5 NP Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg.



3.6.8 NP Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación.

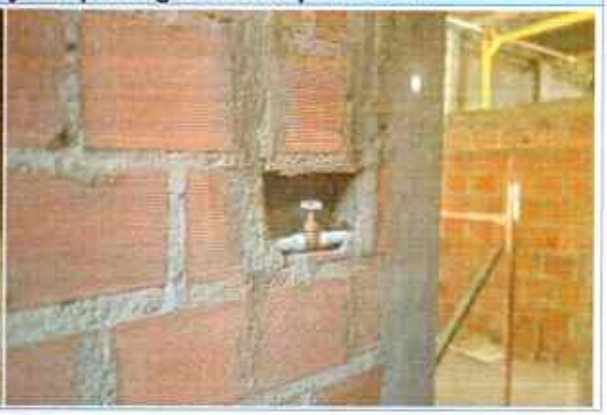3.6.9 NP Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.Reparación.



3,7 SANITARIO

3.7.3 Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.




3.7.4 Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.




3,8 PLUVIAL

3.8.1 Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.




3.8.2 Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg.




3.8.3 Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.



4 BLOQUE D

4,4 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES

4.4.2 Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4.



5 BLOQUE E

5,5 IMPERMEABILIZACIONES

5.5.3 Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.





6 TANQUE SUBTERRANEO

6,1 Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados.



7,0 BLOQUE F

7.1 NP	Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA



CONSTRUCCIÓN


7,000 PISOS Y MAMPOSTERÍA

7,001 Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.





7,004 Filos y dilataciones.

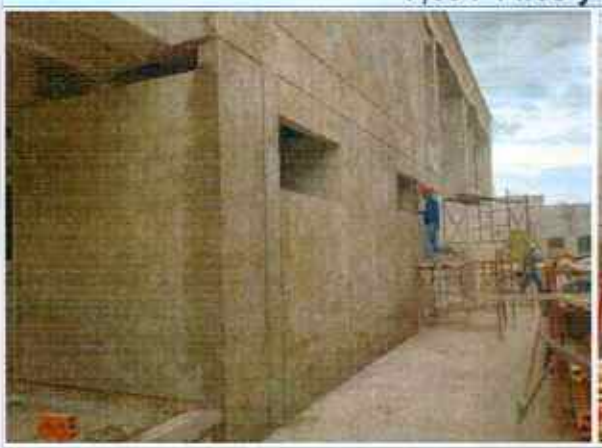



7,007 Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo.




7,008 Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.




7,009 Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m.




8,000 ENCHAPES Y ACABADOS

8,010 Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior.




8,012 Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco.




8,013 Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco.




8,016 Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido.




9,000 CUBIERTA

9,001 Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.




9,002 Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.




16,000 SISTEMA HIDRÁULICO DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO

16,001 Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg.




16,017 Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.

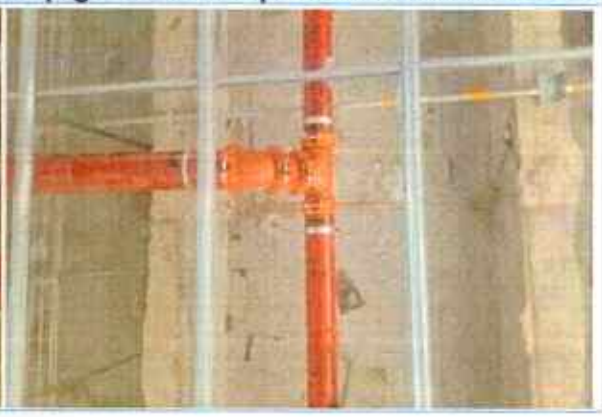16,018 Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.




17,000 SISTEMA DE ACUEDUCTO

17,003	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.




20,000 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

20,002	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.




20,003	Sum./inst. Tubería PVC - Presion RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.




20,004	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.




20,006	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.





20,011	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.




21,000 INSTALACIONES SANITARIAS


21,002 Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg.

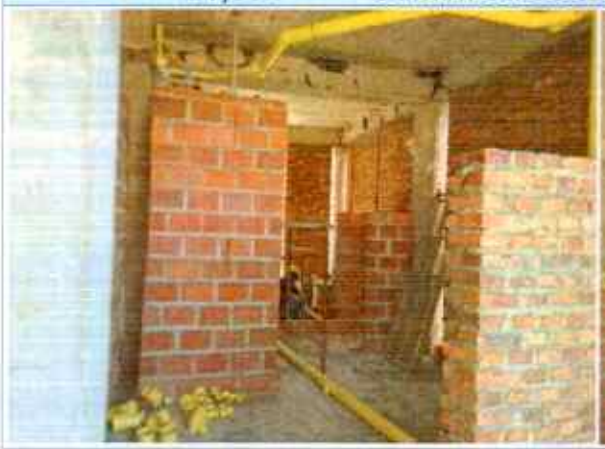


21,005 Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.




21,006 Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.

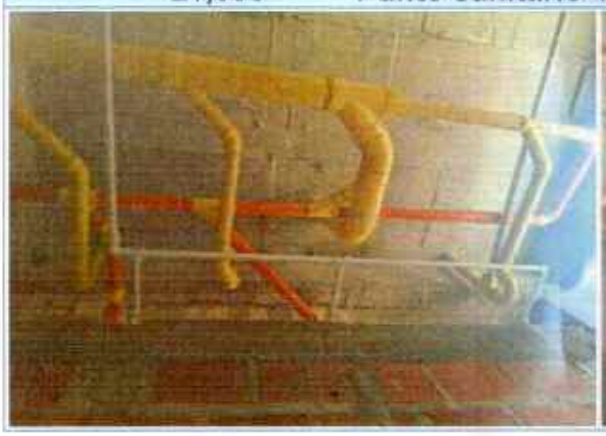


21,007	Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg.




24,000 ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN

24,006	Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg.





26,000 DUCTERÍA ELECTRICA

26,008	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg.




26,009 Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.

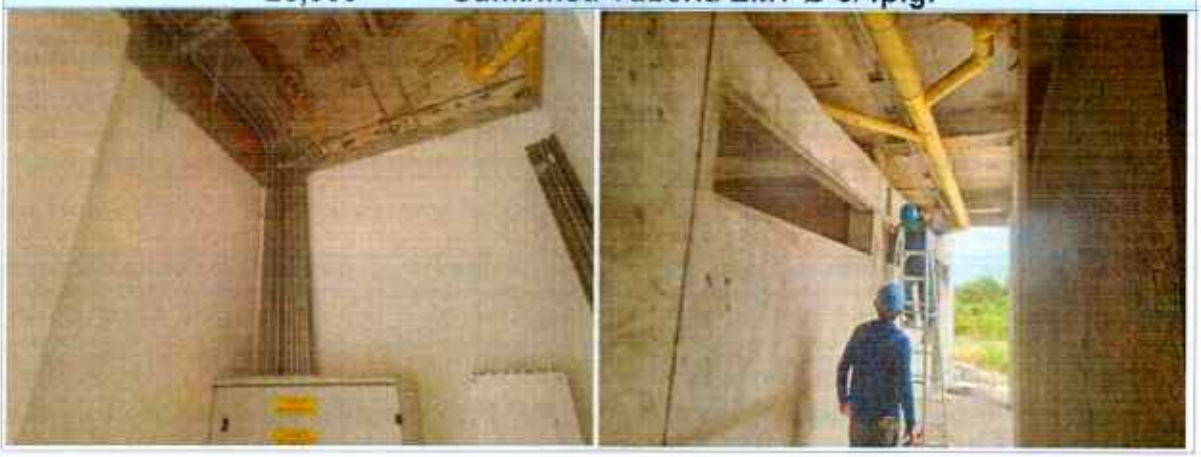

26,011 Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg.



29,000 REDES INTERNAS Y URBANISMO

29,018 Suministro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega



32,000 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

32,004	Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio.




41,000 ITEMS NO PREVISTOS

41,020	Rejillas para cunetas pluviales




5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Datos generales

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO Nº	CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	PARADA NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD
NIT	901.527.625-4
REPRESENTANTE LEGAL	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
C.C. Nº	60.377.366 DE CÚCUTA
ACTA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: DIECISIETE (17) MESES, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
PRORROGA No. 01	OTROSÍ ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 POR DIECISIETE (17) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.
PRORROGA No. 02	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR DOCE (12) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025.
PRORROGA No. 03	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.
PRORROGA No. 04	OTROSÍ ADICIONAL No. 03 Y PRORROGA No. 04 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 POR DOS (02) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
PRORROGA No. 05	OTROSÍ MODIFICATORIO No. 05 DEL 28 DE MAYO DE 2026 POR DOS (02) MESES, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026.
PLAZO TOTAL	CUARENTA MESES (40) Y VEINTICUATRO (24) DIAS, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026.
VALOR INICIAL	$ 535.444.020,00 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 1.881.750.620,00 – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: $ 2.417.194.640,00 DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.
VALOR ADICIONAL No. 01	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR UN VALOR DE NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 ($922.411.625,70)
VALOR ADICIONAL No. 02	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR UN VALOR DE CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE ($180.687.171,00)
VALOR ADICIONAL No. 03	OTROSÍ ADICIONAL No. 03 Y PRORROGA No. 04 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 POR UN VALOR DE DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 227.964.141,00).
VALOR TOTAL (Contrato de Interventoría incluye estudios y Diseños)	TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 70/100 M/CTE ($ 3.748.257.577,70).
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNICIPIO DE VILLA DEL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
RUBRO	ROSARIO – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER **2.3.2.02.02.008** – servicios prestados a las empresas y servicio de producción – 11 RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE – 11-5% CONTRATO DE OBRA. **2.3.2.02.02.055** – servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546 – 2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR – OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO N.C.P. **2.3.2.02.02.008** Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – Fuente Recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario. **2.3.2.02.02.009** Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Codigo BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario.
SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO

5.2. Aspectos financieros

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2468 del 28 de julio de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $2.356.531.569,62. 11-5% CONTRATO DE OBRA $62.903.676,38. **TOTALES: $2.419.435.243,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 4428 del 06 de octubre de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $2.356.531.569,62. 11-5% CONTRATO DE OBRA $60.663.070,38. **TOTALES: $2.417.194.640,00**
VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS **($2.417.194.640,00)** M/CTE. EL DEPARTAMENTO, pagará el valor del contrato celebrado según actas parciales en porcentajes equivalentes al avance ejecutado del contrato vigilado, de acuerdo a las actas suscritas, previa presentación de los informes de interventoría correspondientes, acompañados de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y acreditación del pago de sus obligaciones en seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos laborales, y parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. NOTA 1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: EL INTERVENTOR deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. producto(s) radicado(s) en medio físico ye en magnético, debidamente aprobados por el supervisor del contrato, 2. Constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas y, 3. Factura, luego haber sido emitido el recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIAS ACTUALIZADAS	No. 00 002570 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 112 – EXPIRADAS DE FONDO DE SEGURIDAD por un valor de $1.959.485.819,00 **TOTALES: $1.959.485.819,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS	No. 00 002557 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO DEL INTERIOR por un valor de $500.000.000,00 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 91199 – otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. por un valor de $422.411.625,70 **TOTALES: $922.411.625,70**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 002362 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VIGENCIAS ACTUALIZADAS	producción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 112 – EXPIRADAS DE FONDO DE SEGURIDAD – DISPONIBILIDAD 002570-MAY-31/2024 por un valor de $1.959.485.819,00 **TOTALES: $1.959.485.819,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS**	No. 00 002363 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO DEL INTERIOR – DISPONIBILIDAD 002557-MAY-31/2024 por un valor de $500.000.000,00 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 91199 – otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. DISPONIBILIDAD 002557-MAY-31/2024 por un valor de $422.411.625,70 **TOTALES: $922.411.625,70**
VALOR ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 (**$922.411.625,70**).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS**	No. 00 005032 del 15 de octubre de 2025 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729 – Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $180.687.171,00 **TOTALES: $180.687.171,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 005393 del 07 de noviembre de 2025

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729 – Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD 005032 – 15/10/2025 por un valor de $180.687.171,00 **TOTALES: $180.687.171,00**
VALOR ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (REPARACIONES):	CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (**$180.687.171,00**)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 001366 del 12 de enero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $ 227.964.141,00 **TOTALES: $ 227.964.141,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 002876 del 19 de febrero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD 001366 – 12/01/2026 por un valor de $227.964.141,00 **TOTALES: $ 227.964.141,00**
VALOR ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE **($227.964.141,00).**
VALOR TOTAL	TRES MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
(Contrato de Interventoría incluye estudios y Diseños)	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 70/100 ($3.520.293.436,70)

5.2.1. Estado financiero del contrato de interventoria

A la fecha del presente informe se han generado trece (13) actas de recibo parcial, las cuales se describen el en siguiente cuadro:
(se actualiza porcentaje de actas parciales de interventoría cobradas de acuerdo con el actual valor del contrato de interventoría debido al adicional en recursos No. 03 y prorroga No. 05)

ESTADO FINANCIERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE DE ACTA COBRADA	PORCENTAJE DE ACTAS ACUMULADAS	VALOR DE ACTA COBRADA	VALOR ACUMULADO DE ACTAS DE INTERVENTORÍA
Acta Parcial No. 01	13/05/2022	14,27%	14,27%	$ 534.948.153,00	$ 534.948.153,00
Acta Parcial No. 02	14/06/2024	12,47%	26,74%	$ 467.267.687,00	$ 1.002.215.840,00
Acta Parcial No. 03	09/08/2024	4,37%	31,11%	$ 163.974.667,65	$ 1.166.190.507,65
Acta Parcial No. 04	21/10/2024	5,67%	36,78%	$ 212.398.958,50	$ 1.378.589.466,15
Acta Parcial No. 05	27/11/2024	3,73%	40,51%	$ 139.929.502,53	$ 1.518.518.968,68
Acta Parcial No. 06	13/12/2024	4,37%	44,89%	$ 163.974.667,65	$ 1.682.493.636,33
Acta Parcial No. 07	31/01/2025	3,06%	47,94%	$ 114.548.494,91	$ 1.797.042.131,24
Acta Parcial No. 08	19/02/2025	7,32%	55,27%	$ 274.515.635,04	$ 2.071.557.766,28
Acta Parcial No. 09	11/03/2026	2,35%	57,62%	$ 88.121.133,30	$ 2.159.678.899,58
Acta Parcial No. 10	19/04/2026	3,21%	60,83%	$ 120.319.068,00	$ 2.279.997.967,58
Acta Parcial No. 11	24/04/2026	1,33%	62,16%	$ 49.851.826,00	$ 2.329.849.793,58
Acta Parcial No. 12	24/06/2026	2,05%	64,21%	$ 76.839.280,00	$ 2.406.689.073,58
Acta Parcial No. 13	EN CURSO	2,53%	66,74%	$ 94.830.917,00	$ 2.501.519.990,58
TOTAL		**66,74%**		**$ 2.501.519.990,58**	
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					**$ 3.748.257.577,70**
TOTAL, PAGADO EN ACTAS					**$ 2.406.689.073,58**
TOTAL, VALOR FALTANTE POR COBRAR					**$ 1.246.737.587,12**

5.3. Aspectos administrativos contractuales

A la fecha y para el período de corte del informe mensual, se han emitido diversos actos administrativos que conforman la trazabilidad del contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021. Estos documentos se relacionan y describen a continuación según su respectiva línea de tiempo:

- ✓ Celebración de contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021 entre el contratista de interventor UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD y la Gobernación del Departamento Norte de Santander, suscrito a la Secretaria de

Gobierno.

- ✓ El día 19 de Octubre de 2021 se suscribe el Acta de Inicio al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El día 13 de Mayo de 2022 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, correspondiente a la elaboración y entrega de estudios y diseños del proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN E MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" por un valor de $ 534.948.153,00.

- ✓ El día 30 de Diciembre de 2022 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, PRORROGA No. 01 por diecisiete (17) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2024.

- ✓ El día 14 de Febrero de 2023 se suscribe el Acta de Suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El día 03 de Noviembre de 2023 se suscribe el Acta de Reinicio No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El día 31 de Mayo de 2024 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, adicional en recursos No. 01 por un valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 ($922.411.625,70) y prorroga No. 02 por doce (12) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2025.

- ✓ El día 14 de Junio de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 467.267.687,00.

- ✓ El día 09 de Agosto de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 163.974.667,65.

- ✓ El día 21 de Octubre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 04 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 212.398.958,50.

- ✓ El día 27 de Noviembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 05 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 147.506.306,54.

- ✓ El día 13 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 06 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 172.853.452,29.

- ✓ El día 26 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Suspensión No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El 07 Enero de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 31 de Enero de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 07 al contrato de interventoria No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 120.750.986,02.
- ✓ El día 24 de Febrero de 2025 se suscribe el Acta de Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 24 de Junio de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 25 de Agosto de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 25 de Septiembre de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 10 Octubre de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 18 de Noviembre de 2025 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, adicional en recursos No. 02 por un valor de CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE ($180.687.171,00) y prorroga No. 03 por dos (02) meses y diecisiete (17) dias, hasta el 31 de Marzo de 2026.
- ✓ El día 20 de Febrero de 2026 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL MODIFICATORIO No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, adicional en recursos No. 03 por un valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 227.964.141,00) y prorroga No. 04 por dos (02) meses, hasta el 31 de Mayo de 2026.
- ✓ El día 11 de Marzo de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 09 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 88.121.133,30.
- ✓ El día 19 de Mayo de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 10 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 120.319.068,00.
- ✓ El día 24 de Mayo de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 11 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 49.851.826,00.
- ✓ El día 28 de Mayo de 2026 se suscribe la minuta PRORROGA No. 05 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por dos (02) meses, hasta el 31 de Julio de 2026.

- ✓ El día 24 de Junio de 2026 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 12 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 76.839.280,00.

5.3.1. Relación de documentos contractuales

RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	
DOCUMENTO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
Minuta Contrato de Obra	05 de Octubre del 2021
Acta de Inicio de Obra	19 de Octubre de 2021
Acta de Recibo Parcial No. 01	13 de Mayo de 2022
Minuta Otrosí Adicional No. 01	30 de Diciembre de 2022
Acta de suspensión No. 01	14 de Febrero del 2023
Acta de Reinicio No. 01	03 de Noviembre del 2023
Minuta Otrosí Adicional No. 02	31 de Mayo de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 02	14 de Junio de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 03	09 de Agosto de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 04	21 de Octubre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 05	27 de Noviembre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 06	13 de Diciembre de 2024
Acta de Suspensión No. 02	26 de Diciembre de 2024
Acta de Reinicio No. 02	07 Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 07	31 de Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 08	19 de Febrero de 2025
Acta de Suspensión No. 03	24 de Febrero de 2025
Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03	24 de Junio de 2025
Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03	25 de Agosto de 2025
Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03	25 de Septiembre de 2025
Acta de Reinicio No. 03	10 Octubre de 2025
Minuta Otrosí Modificatorio No. 03	18 de Noviembre de 2025
Munita Otrosí adicional No. 03 y prorroga No. 04	20 de Febrero de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 09	11 de Marzo de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 10	19 de Mayo de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 11	24 de Mayo de 2026
Minuta Prorroga No. 05	28 de Mayo de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 12	24 de Junio de 2026
Acta de Recibo Parcial No. 13	EN CURSO

5.4. Garantías

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN CONTRATO DE INTERVENTORIA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 0. Fecha de Expedición: 12/10/2021 Fecha de Aprobación: 12/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	05_10_2021	05_07_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	05_10_2021	05_03_2026
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	05_10_2021	05_07_2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 0. Fecha de Expedición: 12/10/2021 Fecha de Aprobación: 12/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 363.410.400,00	05_10_2021	05_03_2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 2. Fecha de Expedición: 22/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	19_10_2021	19_07_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	19_10_2021	19_03_2026
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	19_10_2021	19_07_2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 2. Fecha de Expedición:	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 363.410.400,00	19_10_2021	19_03_2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA				
22/10/2021				

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 01 (PRORROGA No. 01)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 3. Fecha de Expedición: 03/02/2023 Fecha de Aprobación: 03/02/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	19_10_2021	01_10_2024
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	19_10_2021	31_05_2027
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	19_10_2021	01_10_2024
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 4. Fecha de Expedición: 03/02/2023 Fecha de Aprobación: 03/02/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 464.000.000,00	19_10_2021	31_05_2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 01				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 4. Fecha de Expedición: 07/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	19_10_2021	28_05_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	19_10_2021	28_01_2028
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	19_10_2021	28_05_2025
Póliza de Responsabilidad	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 01				
Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 5. Fecha de Expedición: 14/11/2023	Predios Labores y Operaciones	$ 464.000.000,00	19_10_2021	28_01_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 01 Y PRORROGA No. 02)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 6. Fecha de Expedición: 11/06/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 333.960.626,57	19_10_2021	31_09_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 333.960.626,57	19_10_2021	31_05_2028
	Calidad del servicio	$ 1.001.881.879,71	19_10_2021	30_09_2025
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 7. Fecha de Expedición: 12/06/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 520.000.000,00	19_10_2021	31_05_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 02				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 7. Fecha de Expedición: 11/06/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 333.960.626,57	19_10_2021	12_10_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 333.960.626,57	19_10_2021	12_06_2028
	Calidad del servicio	$ 1.001.881.879,71	19_10_2021	12_10_2025
Póliza de	**AMPAROS**	**VALOR**	**VIGENCIA**	

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 02				
Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 9. Fecha de Expedición: 10/01/2025		**ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	19_10_2021	12_06_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 03				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 8. Fecha de Expedición: 17/10/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 333.960.626,57	19_10_2021	26_05_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 333.960.626,57	19_10_2021	26_01_2029
	Calidad del servicio	$ 1.001.881.879,71	19_10_2021	26_05_2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 10. Fecha de Expedición: 17/10/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	19_10_2021	26_01_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 10. Fecha de Expedición: 10/11/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 352.029.343,67	19_10_2021	01_08_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 352.029.343,67	19_10_2021	31_03_2029
	Calidad del servicio	$ 1.056.088.031,01	19_10_2021	01_08_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 10. Fecha de Expedición: 10/11/2025	Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	19_10_2021	31_03_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 03 Y PRORROGA No. 04 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 03 Y PRORROGA No. 04)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 12. Fecha de Expedición: 24/02/2026	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
	Cumplimiento del contrato	$ 374.825.757,77	19_10_2021	01_10_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 374.825.757,77	19_10_2021	31_05_2029
	Calidad del servicio	$ 1.124.477.273,31	19_10_2021	01_10_2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 14. Fecha de Expedición: 24/02/2026	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
	Predios Labores y Operaciones	$ 700.362.000,00	19_10_2021	31_05_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS PRORROGA No. 05				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
	Cumplimiento del contrato	$ 374.825.757,77	19_10_2021	01_12_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 374.825.757,77	19_10_2021	31_07_2029

RELACIÓN DE GARANTÍAS PRORROGA No. 05				
ANEXO 13. Fecha de Expedición: 29/05/2026	Calidad del servicio	$ 1.124.477.273,31	19_10_2021	01_12_2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 15. Fecha de Expedición: 29/05/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 700.362.000,00	19_10_2021	31_01_2026

6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA

6.1. Interventoría técnica

La **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** desarrollo la interventoría sobre las actividades comprendidas dentro del alcance del objeto pertenecientes al periodo comprendido entre el 22 de junio al 26 de julio del 2026 en su etapa de reparaciones y construcción de las edificaciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas de la patología, estudios y diseños establecidos.

6.1.1. Actividades desarrolladas por la interventoría

La interventoría hizo seguimiento, control y verificación en el desarrollo de las actividades de la etapa de construcción, que comprenden el periodo del 22 de junio al 26 de julio del 2026:

- ✓ Se supervisa constantemente la ejecución de cada una de las actividades descritas inicialmente, con el fin de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de estas.
- ✓ Seguimiento y control de suministro e instalación de acero en los elementos estructurales en reparación y reposición.
- ✓ Elaboración de asentamiento de al concreto instalado.
- ✓ Elaboración de especímenes de concreto instalado.
- ✓ Verificación de alineación y verticalidad de elementos estructurales.
- ✓ Acompañamiento y participación en vistas técnicas en obra realizadas por parte de las entidades involucradas en el proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA



DIRECCIÓN COMERCIAL: CALLE 2N # 6E-14 apto 202 EDIFICIO BELLA
Tel.: (037) 574 31 94 – 316 447 6533
UTINTERSEGURIDA@GMAIL.COM
SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER COLOMBIA

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA




✓ Acompañamiento y participación en comités virtuales, realizados por las entidades involucradas, de seguimiento con el fin de analizar el estado del avance del

proyecto y asi tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los tiempos pactados.

ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN COMITÉS VIRTUALES



ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN COMITÉS VIRTUALES

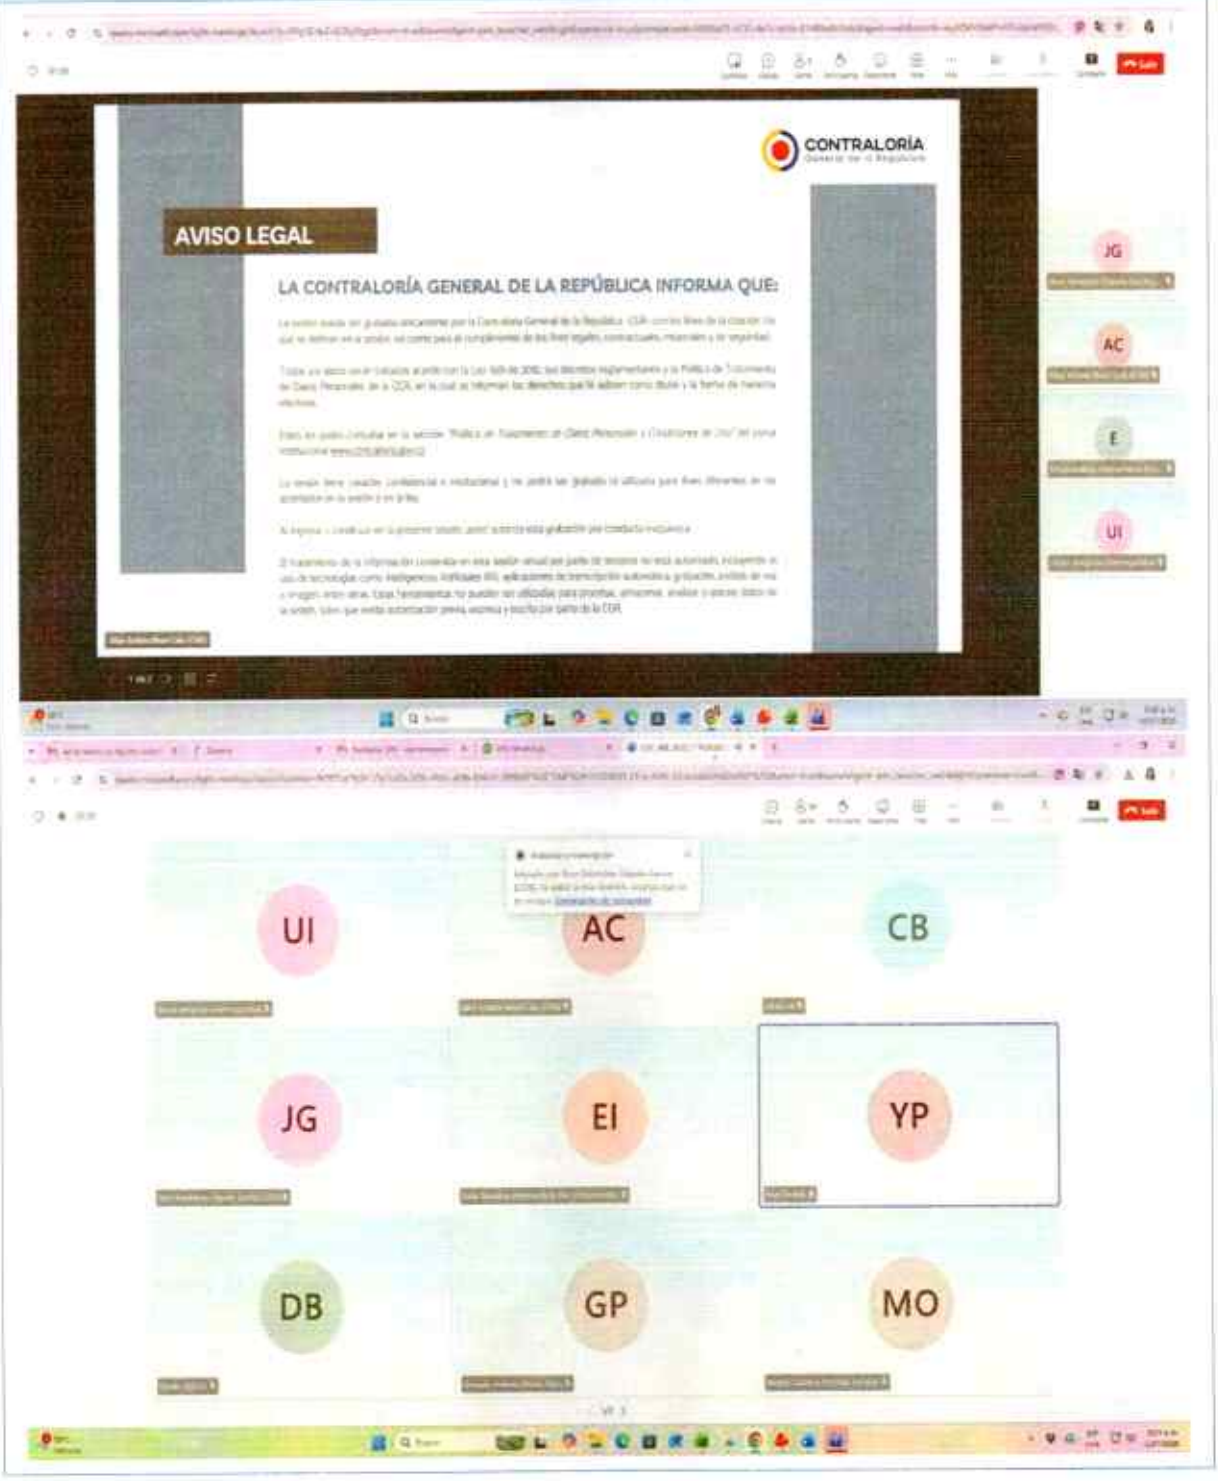

6.2. Personal de la interventoría

Para garantizar el seguimiento y control adecuado y las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER". Se cuenta con el siguiente personal:

CARGO	PERSONAL
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ERIKA MILENA SANABRIA GARCÍA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
INGENIERO ESTRUCTURAL	EDGAR VILLEGAS PALLARES
INGENIERO HIDROSANITARIO	EDGAR VILLEGAS PALLARES
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	ANDRES FELIPE PEREZ RUIZ
INGENIERO ELECTRICISTA	JHON ALEXANDER CARABALI ALVARADO
INGENIERO AMBIENTAL	MYRIAM ARTEAGA CÁRDENAS
PROFESIONAL HSEQ	ANGIE VIVIANA GALVIS SANGUINO
INGENIERO AUXILIAR HSEQ	MARIAM MÓNICA TRUJILLO TRIGOS
TOPÓGRAFO	WILSON ANEIRO NAVARRO CONTRERAS
AUXILIAR TOPÓGRAFO	LUIS ALBERTO CARRIEDO ESPINEL
SECRETARIA	LESLY YAHELVI GALVIS CORREA
CONTADOR	JHONNY TAPIAS NAVARRO
AUXILIAR CONTABLE	KAREN ALEXANDRA MORANTES BOHORQUEZ
CONDUCTOR	JORGE ANDRÉS SANDOVAL MOLINA

6.3. Equipos de la interventoría

Para la ejecución del contrato No. CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021, la interventoría utiliza los siguientes equipos:

- ✓ Oficina
- ✓ Camioneta
- ✓ Equipo de computación
- ✓ Elementos de oficina
- ✓ Equipos de topografía
- ✓ Equipos para la elaboración de mutras de concreto

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ha alcanzado un porcentaje de avance acumulado del 66,74%, en comparación con el 94,73% programado para este periodo de corte, dentro del presupuesto de $39.894.452.272,00, correspondiente a los estudios, diseños, la etapa de construcción y reparaciones según patología. Como resultado se genera un atraso del -27,99%

- Se evidencia que en el presente periodo de corte desde el 22 de junio al 26 de julio de 2026 el porcentaje de avance es del 2,59%, con respecto a un porcentaje programado del 26,85%, correspondiente a la etapa de construcción y reparaciones según patología, cuyo sumatoria asciende a un valor total presupuestado de $ 39.004.948.401,00. Como resultado se genera un atraso del -24,26%

- En la etapa de construcción, que corresponde a un valor de $ 36.421.653.475,00 del proyecto, se ha alcanzado un porcentaje de ejecución acumulado del 64,46%, en comparación con el 94,22% programado acumulado, generando un atraso del -29,76%.

- En la etapa de ejecución de reparaciones según patología, que corresponde a un valor de $ 2.583.294.926,00 presupuestado, se ha alcanzado un porcentaje de avance acumulado del 87,29%, en comparación con el 100,00% programado acumulado, generando un atraso del -12,71%.

- Se evidencia que, en el presente periodo de corte desde el 22 de junio al 26 de julio de 2026, en la etapa de ejecución de reparaciones según patología, el porcentaje de avance es del 14,46%.

- Se recomienda al contratista de obra aumentar la mano de obra de las actividades de obra blanca y carpintería.

En constancia de lo anterior firma,

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD
Nit. 901.527.62-4

-Actividades: Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de aplicación de estuco plastico y estructuración del cielo raso en el bloque A, avanzando en los trabajos de acabado interior programados para la edificación. Asimismo se continuo con la ejecución de mortero impermeabilizado en las fachadas norte de los bloques D y E, al tiempo que se realizaron actividades de aplicación de mortero de los muros interiores de estos mismos bloques, conforme a la programacion de acabados arquitectonicos. De igual manera, se avanzó en la construccion de muros interiores y de fachada del primer piso del bloque C, dando continuidad a las labores de mamposteria previstas para esta etapa del proyecto.

En constancia firman

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 22 de junio del 2026

-Equipos: Herramienta menor

-Maquinaria: N/A

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra

-Clima: Soleado.

-Actividades: Se avanzó con la instalación de mortero impermeabilizado para el pañete de la fachada este bloque A. Asimismo, se continuó con la aplicación de estuco plástico en los muros internos del primer piso, la estructuración del cielo raso en este mismo nivel y la ejecución de regatas para la instalación de puntos de tomas comunes y reguladas en los muros bajos del segundo piso. En el bloque B se realizó la fundida de concreto en los apoyos de las ventanas de la fachada sur, así como en columnetas y dinteles. De igual manera en el bloque C se dio continuidad a la instalación de mampostería en los muros

líder=

Scanned with CamScanner

del primer piso. Finalmente, en los bloques D y E se avanzó con la aplicación de mortero impermeabilizado para el pañete de la fachada norte y se ejecutó la fundida de concreto en columnetas y dinteles. Durante estas actividades, la interventoría en cumplimiento de sus funciones de supervisión y control de calidad, realizó la toma de muestras y los ensayos de asentamiento del concreto con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del material instalado. En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría.

Martes, 23 de junio del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se dio continuidad a la instalación de mortero impermeabilizado para el pañete de la fachada este del bloque A. Asimismo, se avanzó con la aplicación de estuco plástico en los muros internos del primer piso, en el área noroeste, la estructuración del cielo raso en este mismo nivel y la ejecución de regatas para la instalación de puntos de tomas comunes y regulados en los muros bajos del segundo piso. En el bloque B se avanzó con la aplicación de mortero para el pañete de los muros internos. En el bloque C se continuó con la instalación de mampostería en los muros del primer piso. De igual manera, en bloques D y E se avanzó con la ejecución de mortero en los filos de puertas y ventanas. Finalmente, en el bloque F se realizaron pruebas de estanqueidad a la red hidrosanitaria, con el fin de verificar la hermeticidad de las instalaciones y garantizar su correcto funcionamiento.

líder=

Scanned with CamScanner

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría.

Miercoles 24 de junio del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado.
- Actividades: Durante la jornada se continuó con la ejecución del pañete en las fachadas este y norte del bloque A mediante la aplicación de mortero impermeabilizado. De igual forma, se avanzó en la aplicación de estuco plastico sobre los muros interiores del primer piso, específicamente en el sector noroeste, y en el montaje de la estructura metálica para el cielo raso de este nivel. En el bloque B se desarrollaron actividades de pañete con mortero en los muros interiores correspondiente a los baños del segundo piso. En el bloque G prosiguieron los trabajos de levantamiento de mamposteria en los muros del primer y segundo piso. Por su parte, en los bloques D y E continuaron las labores de aplicacion de mortero impermeabilizado en la fachada norte, asi como la conformación de filos en puertas y ventanas. Finalmente, en el bloque E se efectuaron pruebas de estanqueidad a la red hidrosanitaria, con el fin de comprobar la hermeticidad de los tuberias y verificar el adecuado funcionamiento del sistema.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves 25 de junio del 2026

- Equipos: Herramienta menor.

líder=

Scanned with CamScanner

- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se dio continuidad a la aplicacion de estuco plastico en los muros interiores del primer piso y al montaje de la estructura para el cielo raso de este mismo nivel. Asimismo, en el bloque C se avanzó con la ejecución de la mampostería en los muros del primer y segundo piso. En el bloque D continuaron las labores de aplicacion de mortero impermeabilizado para el pañete de la fachada norte, mientras que en los bloques D y E se ejecuto la conformación de filos en puertas y ventanas mediante la aplicación de mortero. De igual manera, en el bloque B se avanzó con el pañete de los muros internos utilizando mortero.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria.

Viernes, 26 de junio del 2026

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado.
- Actividades: Durante la jornada se ejecutó la instalación de la tubería de la red hidraulica interna del primer piso del bloque B y se dio continuidad a la aplicación de mortero para el pañete de los muros internos. Asimismo, se avanzó con la instalación de la cuantía de acero en los dinteles de la fachada de este bloque. En el bloque C continuaron los trabajos de mampostería en los muros interiores y de fachada del

líder

Scanned with CamScanner

primer piso. En el bloque D se realizó la aplicación de mortero impermeabilizado para el pañete de la fachada norte, además de la conformación de los filos en puertas y ventanas y la aplicación de mortero en los muros interiores. Por su parte, en el bloque E se ejecutó la instalación de la tubería de la red hidráulica, en los baños, la instalación de válvulas de doble acción, la conformación de filos en puertas y ventanas, la instalación de tubería PVC conduit de 3/4" en los muros interiores y la colocación de cajetines para interruptores y tomacorrientes. Adicionalmente, se avanzó con la aplicación de mortero en los muros interiores y se realizaron pruebas de estanqueidad a la red sanitaria de los baños, con el fin de verificar la hermeticidad y el correcto funcionamiento del sistema.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría

Sábado 27 de junio del 2026

-Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A.

-Personal: ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo maestros y ayudantes de obra

-Clima: Soleado.

-Actividades: Durante la jornada se dio continuidad a la construcción de los muros bajos del segundo piso del bloque A, Asimismo se ejecutó la instalación de mampostería en los muros interiores y de fachada del bloque C y se avanzó con la aplicación de mortero impermeabilizado en las columnas de la fachada norte del bloque A. En el bloque B se realizó la fundida de concreto en dinteles y columnetas. De igual manera, en el bloque D se iniciaron las labores de estructuración las labores

líder=

Scanned with CamScanner

de estructuración del cielo raso en los recintos del primer piso y se continuó con la aplicacon de mortero para el pañete de los muros interiores y de la fachada norte. Finalmente en el bloque E se dio pañete de los muros interiores y de la fachada norte. Finalmente, en el bloque E se dio continuidad a la ejecución del pañete en las muros interiores y en la fachada norte mediante la aplicación de mortero.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria.

Martes 30 de junio del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: En el desarrollo de las actividades programadas para la jornada, se efectuó la fundidad de concreto en los dinteles de confinamiento de los muros bajos del primer piso del bloque A y se continuo con la aplicacion de mortero para el pañete en las columnas de la fachada norte de este mismo bloque. En el bloque B se llevo a cabo la instalación de tubería PVC correspondiente a la red hidraulica en los baños del segundo piso. Por su parte, en el bloque C se avanzó con la construcción de los muros interiores y de fachada del segundo piso asi como la instalación de cuantia de acero para columnetas y dinteles del primer piso. De igual manera en los bloques D y E prosiguieron las labores de aplicación de mortero para el pañete en los muros interiores y de fachada.

líder:=

Scanned with CamScanner

Adicionalmente en el bloque D se continuo con la aplicación de estuco plastico en los muros interiores del primer piso y con el montaje de la estructura para el cielo raso de este nivel.
En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoria

Mercoles 01 de julio del 2026
- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional en seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Nublado.
- Actividades: Como parte de la programación establecida, se efectuaron pruebas de estanqueidad en la red sanitaria del bloque E, con el proposito de verificar la hermeticidad y el adecuado funcionamiento del sistema. Asimismo, en el bloque D se dio continuidad al montaje de la estructura para el cielo raso en los diferentes tesintas del primer piso y a la aplicación de estuco plastico en los muros interiores de este nivel. En el bloque C prosiguieron los trabajos de mamposteria en los muros de fachada e interiores, además de la instalación de la tuberia correspondiente a la red sanitaria. Finalmente en el bloque A se avanzó con la aplicación de mortero en las columnas de la fachada.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoria.

Jueves 02 de julio del 2026

líder:=

Scanned with CamScanner

-Equipos: Herramienta menor
-Maquinaria: N/A
-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
-Clima: Nublado
-Actividades: las labores ejecutadas durante la jornada comprendieron la aplicación de mortero impermeabilizado en las columnas de la fachada norte del bloque A. En el bloque B se avanzó con la aplicación de mortero en los muros interiores y en las columnas de fachada. Por su parte en el bloque C se realizó la instalación de la cuantía de acero para las columnetas, así como la instalación de tubería hidráulica de 1/2" y de los puntos hidráulicos del mismo diámetro en los baños del primer piso. adicionalmente se llevaron a cabo pruebas de estanqueidad para verificar la hermeticidad de la red. En el bloque D se ejecutó la fundida de concreto en los realces para closets, se continuó con la aplicación de estuco plastico en los recintos. Finalmente, en el bloque G se avanzó con la ejecución del pañete en la fachada sur y con la conformación de filos en puertas y ventanas
En constancia Firman:

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 03 de julio del 2026
-Equipos: Herramienta menor.
-Maquinaria: N/A
-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
-Clima: Nublado, lluvias de intensidad media.

líder=

Scanned with CamScanner

- Actividades: Como parte de las actividades desarrolladas durante la jornada, en el bloque D se ejecutó la fundida de concreto para los retales de closets del primer piso. Asimismo, se dio continuidad a la aplicación de estuco plastico en los muros interiores y al montaje de la estructura para el cielo raso de este mismo nivel. En el bloque C prosiguieron las labores de construccion de los muros interiores y de fachada, junto con la instalación de la cuantia de acero en las columnetas. De igual manera se avanzó con la instalación de la tuberia hidraulica y de los puntos de ½" además de la ejecución de la pruebas de estanqueidad en la red sanitaria para verificar su hermeticidad. Finalmente, continuaron las regatas en los muros con el fin de facilitar la posterior instalacion de la tubería hidraulica para los aparatos sanitarios.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria.

Sabado, 04 de julio del 2026

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de ob
- Clima: Nublado.
- Actividades: En el desarrollo de las actividades programadas se avanzó con la aplicación de mortero impermeabilizado en las columnas de la fachada norte del bloque A. En el bloque B se continuó con la ejecución de pañete en los muros interiores de los pasillos y en las columnas de la fachada sur; adicionalmente se realizó la fundida de concreto en las columnetas del segundo piso. Por su parte en el bloque C prosiguieron los trabajos de mampostería en los muros

lider=

Scanned with CamScanner

interiores y de fachada, así como la instalación de tubería sanitaria correspondiente a los baños del segundo piso en el bloque D se llevaron a cabo labores de aseo y limpieza en los dormitorios como preparación para la posterior ejecución del calistado de piso al tiempo que se continuo con la aplicación de estuco plástico en los muros interiores del primer piso y con el montaje de la estructura para el cielo raso en los dormitorios. Finalmente, En el bloque F se avanzó con la aplicación de mortero impermeabilizado para el pañete de la fachada este.
En constancia firman

Residente de obra

Residente de interventoría.

Lunes 06 de julio del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Como parte de las actividades programadas para la jornada, se realizó el marcado de los tuberías de la red eléctrica del bloque A con el propósito de identificar los circuitos correspondientes a las redes de detección de incendios, energía, voz y datos. Así mismo en este bloque se instalaron los tableros eléctricos en el cuarto técnico, Se avanzó con la instalación de tubería hidráulica de 1/2" en los baños del segundo piso y con la instalación de tubería PVC conduit de 3/4" embebida en piso para la red eléctrica del mismo nivel. De igual manera se dio continuidad a la aplicación del mortero impermeabilizado en las columnas de fachada de los bloques A y B. En el bloque B se

líder=

ejecutó la construcción de muros bajos mediante mampostería y se continuó con la aplicación de pañete en los muros interiores. Por su parte, en el bloque C se realizaron pruebas de estanqueidad en la red sanitaria de los baños del segundo piso para verificar la hermeticidad del sistema, al tiempo que prosiguieron los trabajos de mampostería en los muros interiores y de fachada. En el bloque D se avanzó con la aplicación de estuco plástico en los muros interiores y con el montaje de la estructura para el cielo raso en los diferentes recintos. Finalmente, en el bloque E se continuó con la ejecución del pañete en la fachada sureste.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría

Martes, 07 de julio del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado.
- Actividades: Las labores desarrolladas durante la jornada estuvieron orientadas a dar continuidad a la aplicación de mortero impermeabilizado en las columnas de fachada de los bloques A y B. En el bloque A se avanzó con la instalación de tubería hidráulica de 1½" en los baños del segundo piso, la instalación de tubería PVC conduit de ¾" embebida en piso para la red eléctrica del mismo nivel y la ejecución del pañete en los muros bajos del segundo piso. En el bloque B se continuó con la construcción de los muros bajos mediante mampostería, la aplicación de pañete en los muros interiores y la instalación de una válvula ventosa de doble acción

líder

en la red hidraulica. Por su parte en el bloque C prosiguieron los trabajos de mamposteria en los muros interiores y de fachada, así como la instalación de la cuantia de acero en las columnetas. En el bloque D se dio continuidad a la aplicacion de estuco plastico en los muros interiores, al montaje de la estructura para el cielo raso en los diferentes recintos y a la ejecución del mortero para el alistado de piso en los dormitorios del segundo piso. Finalmente, en el bloque E se avanzó con la aplicación de pañete en la fachada sureste. En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria.

Miercoles, 08 de julio del 2026

-Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.

-Clima: Soleado.

-Actividades: Como parte de las actividades ejecutadas durante la jornada, se realizó la instalación de las tapas de los pozos ubicados entre los bloques C y D. Asimismo, en el bloque C se realizo un avance con la instalacion de la cuantia de acero en columnetas y dinteles, la construccion de muros interiores y de fachada del segundo piso, la instalación de la tuberia sanitaria para los baños del mismo nivel y posteriormente, la fundida de concreto en columnetas y dinteles. En los bloques D y E se ejecutó la fundida de concreto por los mesones, mientras que en el bloque D se dio continuidad al alistado de piso en los recintos del segundo piso, a la aplicación de estuco plastico en los recintos del primer piso y al montaje de la estructura para el cielo raso. En el

lider=

bloque E se avanzó con la aplicación de estuco plástico en la fachada sur, la ejecución de pañete en los baitrones y la instalación de cajas de paso para la red eléctrica. De igual manera, en el bloque B continuó la aplicación de mortero impermeabilizado en la fachada, mientras que en el bloque A se instalaron los cajetines para tomas comunes y regulados en los muros bajos del segundo piso y se dio continuidad a la construcción de los mesones para los baños. Finalmente, la interventoría, en cumplimiento de sus funciones contractuales, realizó la elaboración de especímenes y los ensayos de asentamiento para el control de calidad del concreto instalado. En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría.

Jueves, 09 de julio del 2026

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado
- Actividades: En desarrollo de la programación de obra, se dio continuidad a la aplicación de mortero impermeabilizado en los muros de la fachada norte del bloque A y en la fachada sur del bloque B. Asimismo, prosiguió la construcción de los mesones para los baños en los bloques A y D. En el bloque A también se ejecutó la instalación de tubería EMT y PVC conduit en el cuarto técnico para la llegada a los tableros eléctricos, además de la aplicación de mortero en los muros bajos del segundo piso. Por su parte, en el bloque C se avanzó con la instalación de los puntos hidráulicos de 1½" y de tubería hidráulica de 1½" y ¾" en los baños del primer piso, la construcción de los muros interiores y de fachada del segundo piso, la instalación

líder=

Scanned with CamScanner

de la cuantía de acero en dinteles y columnetas fa fundida de concreto en las columnetas y la instalación de llaves de corte en los baños del primer piso. Durante la ejecucion de estas actividades, la interventoria, en cumplimiento de sus funciones contractuales, realizó la elaboración de especimenes y los ensayos de asentamiento para el control de calidad del concreto instalado. Finalmente, en los bloques D y E se continuó con la aplicación de estuco plastico en los recintos del primer piso del bloque D y en los recintos del segundo piso y la fachada sur del bloque E, así como con el montaje de la estructura para el cielo raso, mientras que en el bloque B se dio continuidad a la ejecución del pañete en los muros interiores

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 10 de julio del 2026

-Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A.

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra

-Clima: Nublado.

-Actividades: Como parte de las labores ejecutadas durante la jornada, se dio continuidad a la construcción de los mosones de los baños del primer piso del bloque A, al tiempo que se avanzó con la instalación de soportes para la tubería y con la ejecución del pañete en los muros bajos del segundo piso. Asimismo, se continuó con la instalacion de tuberia PVC conduit embebido en piso para la red electrica del segundo nivel. En el bloque B prosiguió la aplicacion de mortero impermeabilizado en la fachada, se realizó la instalación del marco para la tapa del cuarto de maquinas del

lider==

Scanned with CamScanner

tanque de almacenamiento. Por su parte, en el bloque C se avanzó con la instalación de la tubería sanitaria para los baños del segundo piso, la construcción de los muros interiores mediante mampostería, la instalación de la cuantía de acero en columnetas y dinteles, la instalación de la tubería hidráulica de 1/2" y la fundida de concreto en dinteles y columnetas. De igual manera, se ejecutó la fundida de concreto para las mesones de los bloques A y E. Durante la ejecución de estas actividades, la interventoría, en cumplimiento de sus funciones contractuales, realizó la elaboración de especímenes y los ensayos de asentamiento para el control de calidad del concreto instalado. En el bloque D se continuó con la aplicación de estuco plástico en los recintos del primer piso en los dormitorios del segundo piso. En el bloque E se avanzó con la aplicación de estuco plástico en los muros de fachada y con la estructuración del cielo raso en los dormitorios del primer piso. Finalmente durante la jornada se recibió la visita de funcionarios de INVIAS con el propósito de revisar los aspectos relacionados con el suministro de agua para la conexión al acueducto. En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría

Sábado, 11 de julio del 2020

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Nublado.
- Actividades: En el desarrollo de las actividades programadas se dio continuidad a la aplicación de estuco plástico en la

líder=

fachada sur del bloque E y al montaje de la estructura para el cielo raso en los dormitorios del primer piso de este mismo bloque. De igual manera, en el bloque D se avanzó con la aplicación de estuco plastico en los muros interiores del primer piso y se llevó a cabo una jornada de aseo y limpieza de la áreas intervenidas, con el fin de mantener condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades posteriores. Asimismo, continuó la aplicacion de mortero impermeabilizado para el peñete en la fachada norte del bloque A y en la fachada sur del bloque B. Finalmente en el bloque C prosiguieron las labores de mamposteria en los muros interiores y de fachada, de acuerdo con la programación establecida.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoria

Martes 14 de julio del 2026

-Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y cadenteros de obra

-Clima: Nublado

-Actividades: En cumplimiento de la programacion de obra, se avanzó con la aplicación de mortero impermeabilizado en los filos de la fachada norte del bloque A y en la fachada sur del bloque B. Asimismo, en el bloque A se ejecutó el mortero para la conformación de los filos de los muros bajos del segundo piso. En el bloque C prosiguieron las labores de mamposteria en los muros interiores y de fachada, junto con la instalacion de la cuantia de acero en columnetas y dinteles. Por su parte, en el bloque D se continuó con la aplicación de estuco plastico en los recintos del primer piso, la

lider=

Scanned with CamScanner

estructuración del cielo raso en los dormitorios del primer piso, la ejecución del alistado de piso en los dormitorios del segundo piso y la aplicación de pañete en la fachada sur. De igual manera, en el bloque E se avanzo con la aplicación de estuco plastico en los muros de fachada y con el montaje de la estructura para el cielo raso en los dormitorios del primer piso. Adicionalmente, se realizó la instalación de los compuertos metálicos de la estación de bombeo. Durante la ejecución de las actividades de fundido de concreto, la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, efectuó la toma de muestras y los ensayos de asentamiento para el control de calidad del concreto instalado

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría.

Miercoles 15 de julio del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingeniera residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado.
- Actividades: las actividades desarrolladas durante la jornada comprendieron la aplicación de estuco plastico en los dormitorios del primer piso del bloque D y el avance para el montaje de la estructura del cielo raso en el pasillo de este mismo bloque. Asimismo, en el bloque C se realizaron pruebas de estanqueidad en la red sanitaria de los baños del segundo piso, con el fin de verificar la hermeticidad y el correcto funcionamiento del sistema. De igual manera en los bloques D y E se ejecutó la instalación de cajas de paso para la red electrica. En el bloque E se continuó con la aplicación de estuco plástico en la fachada sur y con la construcción de los mesones. Por su parte, en el

lider=

bloque D se avanzó en la construcción de los medios cañas sobre la placa de cubierta del área de lavandería. Finalmente, en el bloque B se realizó el encofrado de los dinteles de fachada como preparación para la posterior fundida de concreto.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría.

Jueves 16 de julio del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Nublado, lluvia de intensidad media
- Actividades: En cumplimiento de la programación de obra, se dio continuidad a la aplicación de mortero impermeabilizado en la fachada del bloque B. En este mismo bloque se avanzó con la construcción de los muros del área de cocina, la aplicación de mortero en los muros y en los filos, la instalación de tubería SCH 40 gris correspondiente a la red de detección de incendios del primer piso y la construcción de los apoyos por las ventanas de la fachada norte. Asimismo, en el bloque D prosiguió la construcción de los muros de los baños del segundo piso, el montaje de la estructura para el cielo raso en los diferentes recintos y la ejecución del alistado de piso en el pasillo del segundo nivel. De igual manera, en el bloque E continuó la estructuración del cielo raso en los recintos y la aplicación de estuco plástico en la fachada sur. Finalmente, en el bloque A se ejecutó la construcción de los apoyos para las ventanas de la fachada norte. En el bloque C se continuó con la instalación de mampostería en muros de fachada e internos.

líder

En constancia firman:

Residente de obra | Residente de interventoría

Viernes 17 de julio de 2026

-Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A.

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra

-Clima: Soleado.

-Actividades: En el desarrollo de las actividades programadas para la jornada, se dio continuidad a la aplicación de mortero impermeabilizado en la fachada norte del bloque A y en la fachada sur del bloque B. De igual manera, en el bloque C prosiguieron los trabajos de mampostería en los muros interiores y de fachada, junto con la instalación de la cuantía de acero en los columnetas como preparación para la posterior fundida de concreto. Finalmente en los bloques D y E se avanzó con el montaje de la estructura para el cielo raso en los diferentes recintos de acuerdo con la programación establecida.

En constancia firman:

Residente de obra | Residente de interventoría

Sabado 18 de julio de 2026

-Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra

-Clima: Soleado.

-Actividades: Como parte de las labores ejecutadas durante la jornada se avanzó con la aplicación de estuco plastico, en la fachada sur del bloque E y con el montaje de la estructura para el

líder=

Scanned with CamScanner

cielo raso en las diferentes recintos de los bloques D y E. Asimismo, en el bloque D se realizó la aplicación de mortero de nivelación para el alistado de piso del pasillo del segundo piso y la fundida de concreto en los realces para closets de este mismo nivel. Por su parte, en el bloque C continuaron los trabajos de mampostería en los muros interiores y de fachada conforme a la programación establecida para la obra.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoría

Martes 21 de julio del 2026

-Equipos: Herramiento menor

-Mayornaria: N/A.

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestro y ayudantes de obra.

-Clima: Nublado.

- Actividades: Las actividades desarrolladas durante la jornada comprendieron la instalación de cajas de paso para la red electrica en el segundo piso del bloque E, así como la aplicacion de mortero en los boltrones de este mismo nivel. De igual manera se avanzó con la aplicación de estuco plastico en los recintos del segundo piso del bloque D y del primer piso del bloque E, además de la ejecución de mortero de nivelación sobre la placa de cubierta del area de lavado del bloque D. Asimismo, continuó el montaje de la estructura para el cielo raso en los diferentes recintes de los bloques D y E, junto con la aplicación de estuco plastico en la fachada oeste del bloque E. En el bloque C prosiguieron las labores de instalación de cuantia de acero en columnetas y dinteles, mientras que se avanzó con la instalacion de la tuberia de la red hidraulica principal, la colocacion de regillas para los cargamas pluviales

líder=

Scanned with CamScanner

y la instalacion de la cuantia de acero para la tapa de la caja de inspeccion del macromedidor, conforme a la programacion establecida para la obra.
En constancia firman.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Miercoles 22 de julio del 2026

- Equipos: Herramienta menor.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventor, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: En desarrollo de las actividades programadas para la jornada, se avanzó con la aplicación de mortero en los buitrones del segundo piso del bloque D y con el montaje de la estructura para el cielo raso en los recintos del segundo piso de los bloques D y E. Asimismo, en el bloque E se ejecutó la instalacion de cajas de paso para la red electrica y se continuó con la aplicación de estuco plástico en la fachada oeste. En el bloque C prosiguieron las labores de mamposteria en los muros interiores, la instalacion de la cuantia de acero en las columnetas del segundo piso y la instalación de la tuberia hidraulica en los baños. De igual manera, en el bloque B se realizo la aplicacion de mortero impermeabilizado en la fachada norte, la ejecucion del pañete en los muros interiores y la fundida de concreto en los apoyos de las ventanas de fachada. Finalmente, en el bloque D se efectuó el marcado de la tubería correspondiente a las redes eléctrica y de detección de incendios con el propósito de facilitar su identificacion durante las etapas posteriores a la obra.

En constancia firman:

líder=

Scanned with CamScanner

Residente de obra — Residente de interventoría

Jueves, 23 de julio del 2026

-Equipos: Herramienta menor

-Maquinaria: N/A.

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.

-Clima: Soleado

-Actividades: Como parte de las labores ejecutadas durante la jornada, se realizó la reparación de los puertas del ascensor del bloque A. En el bloque C se dio continuidad a la construcción de los muros interiores y de fachada mediante mampostería, así como la instalación de la cuantía de acero en columnetas y dinteles; igualmente, se ejecutó la fundida de concreto en las columnetas. Por su parte, en el bloque B se avanzó con la conformación de los filos de puertas y ventanas mediante la aplicación de mortero, la ejecución de mortero impermeabilizado en la fachada norte y el pañete de los muros interiores. De igual manera, en los bloques D y E continuó el montaje de la estructura para el cielo raso en los diferentes recintos finalmente, en el bloque E se realizó la instalación de tubería EMT para la red eléctrica y se avanzó con la aplicación de estuco plastico en los recintos del primer piso.

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de interventoría

Viernes 24 de julio del 2026

-Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A.

-Personal: ingeniero residente de obra e interventoría, profesional líder=

Scanned with CamScanner

de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
-Clima: Soleado.
-Actividades: En cumplimiento de la programacion de obra, se dio continuidad a la aplicacion de estuco plastico en la fachada sur del bloque E y al montaje de la estructura para el cielo raso en los diferentes recintos de los bloques D y E. Asimismo en el bloque E se realizó la instalacion de cajas de inspecion para la red electrica, mientras que en el bloque D se avanzó con la aplicacion de estuco plastico en los muros interiores del segundo piso. En el bloque B se ejecutó la instalación de la caja para gabinetes tipo 3, se inicio la estructuracion del cielo raso y se realizo la fundida de concreto en los reales para los closets del armenllo. Por ultimo en el bloque C se llevo a cabo la fundida de concreto en columnetas y dintels. Durante la ejecucion de estas actividades, la interventoria, en cumplimiento de sus funciones contractuales, realizo la toma de muestras, la elaboracion de especimenes y los ensayos de asentamiento para el control de calidad de concreto instalado. e
En constancia firmar:

Residente de obra — Residente de interventoria

Sabado, 25 de julio del 2026
-Equipos: Herramienta menor.
-Maquinaria: N/A.
-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
-Clima: Soleado.
-Actividades: Como parte de las actividades ejecutadas

líder=

durante la jornada, se avanzó con la aplicación de mortero impermeabilizado en las fachadas norte y sur del bloque B. Asimismo, en este mismo bloque se dio continuidad al montaje de la estructura para el cielo raso del primer piso. En el bloque E. se realizó la instalación de los restrictores antisísmicos como parte del sistema de soporte de las instalaciones. Por su parte, en el bloque C prosiguieron los trabajos de mampostería en los muros interiores y se ejecutó la fundida de concreto en las columnetas.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría

líder=

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA:	27 DE JULIO DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	LP-SG-01362-2021 DE 31 DE AGOSTO 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
C.C. o N.I.T.	901514217-6
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON YOEL PARADA REYES
N.I.T	1090407083 DE CUCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.982.010.588,00 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
VALOR ADICIONAL No.1	$11.490.240.893,00 ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
VALOR ADICIONAL No.2	$2.583.294.926,00 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS
VALOR ADICIONAL No.3	$2.838.905.865,00 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$39.894.452.272,00 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. MCTE
LUGAR DE EJECUCIÓN	SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
PLAZO INICIAL	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL No.1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL No.2	DOCE (12) MESES
PLAZO ADICIONAL No.3	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL No.4	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL No.5	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL	CINCUENTA (52) MESES
FORMA DE PAGO	El DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así: a) COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOSNOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

	892.406.699.00) previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoria de los estudios y diseños con sus anexos. Los diseños deben estar aprobados por la DIRAF, y el producto debe ser recibido por el Ministerio del interior. b). COMPONENTE 2 – CONSTRUCCCIÓN: El noventa por ciento (90%) del valor de la construcción se pagarán mediante Actas de recibo parcial y se pagara un diez (10) con el recibo de la obra al 100% a satisfacción de interventoria, policia, Departamento, Municipio, y Ministerio. Las actas parciales deben estar respaldadas por las memorias de mapeo de cada una de las actividades ejecutadas, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoria del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoria designado o contratado por la Secretaria de GOBIERNO y con el Visto Bueno del Secretario de GOBIERNO del Departamento.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2246 del 06 de Julio del 2021 No. 00 2247 del 06 de Julio del 2021 No. 00 001371 del 12 de Abril del 2024 No. 00 005031 del 15 de Octubre del 2025 No. 00 001367 del 12 de Enero del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 2176 del 2 de mayo del 2024 No.00 001232 del 15 de abril del 2024 No. 00 005393 del 31 de Octubre del 2025 No. 00 002851 del 11 de Febrero del 2026
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR EXTERNO	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2021
PRORROGA	PRÓRROGA No. 01: DICIEMBRE 29 DE 2022 PRÓRROGA No. 02: ABRIL 15 DE 2024 PRORROGA No. 03: OCTUBRE 31 DE 2025 PRORROGA No. 04: FEBRERO 11 DE 2026 PRORROGA No. 05: MAYO 28 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 31 DE 2026

	ACTA DE RECIBO No.	FECHA
ACTAS PARCIALES DE OBRAS	1	MAYO 13 DE 2022
	2	ABRIL 17 DE 2024
	3	MAYO 28 DE 2024
	4	AGOSTO 2 DE 2024
	5	OCTUBRE 21 DE 2024
	6	NOVIEMBRE 27 DE 2024
	7	DICIEMBRE 12 DE 2024
	8	FEBRERO 7 DE 2025
	9	FEBRERO 19 DE 2025
	10	DICIEMBRE 16 DE 2025
	11	MARZO 11 DE 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

	12	ABRIL 15 DE 2026
	13	MAYO 25 DE 2026
	14	JUNIO 24 DE 2026
ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	N/A	

RELACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
AMPARO	**PÓLIZA No**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
CUMPLIMIENTO	NB-100176880	19/05/2025	30/11/2026	$ 3,989,445,227.20	25/02/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	NB-100176880	19/05/2026	31/07/2029	$ 5,984,167,840.80	25/02/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100176880	31/07/2026	31/07/2031	$ 11,968,335,681.60	25/02/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	NB-100037857	19/10/2021	31/07/2026	$ 1,994,722,613.60	25/02/2026

2. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN/ ANTICIPO	VALOR PAGADO
PARCIAL 01	13/05/2022	$ 889.503.871,00	N/A	$ 889.503.871,00
PARCIAL 02	17/04/2024	$7.018.501.487,00	N/A	$7.018.501.487,00
PARCIAL 03	28/05/2024	$2.437.008.899,00	N/A	$2.437.008.899,00
PARCIAL 04	02/08/2024	$1.693.360.996,00	N/A	$1.693.360.996,00
PARCIAL 05	21/10/2024	$2.192.783.899,00	N/A	$2.192.783.899,00
PARCIAL 06	27/11/2024	$1.444.696.737	N/A	$1.444.696.737,00
PARCIAL 07	12/12/2024	$1.710.779.195	N/A	$1.710.779.195,00
PARCIAL 08	07/02/2025	$1.162.312.401	N/A	$1.162.312.401,00
PARCIAL 09	19/02/2025	$2.834.860.248	N/A	$2.834.860.248,00
PARCIAL 10	16/12/2025	$157,291,519	N/A	$157,291,519,00
PARCIAL 11	11/03/2026	$1,102,566,928	N/A	$1,102,566,928
PARCIAL 12	15/04/2026	$1,622,602,934	N/A	$1,622,602,934
PARCIAL 13	25/05/2026	$529,537,598	N/A	$529,537,598
PARCIAL 14	24/06/2026	$819,478,025	N/A	$819,478,025
PARCIAL 15	26/07/2026	$1,008,233,731	N/A	
TOTAL				$ $ 25,615,284,738

TOTAL, CONTRATADO	$39,894,452,272
TOTAL, EJECUTADO EN ACTAS	$ 26,623,518,469
TOTAL, PAGADO	$ $ 25,615,284,738

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Frentes de trabajo:

4.005 y 4.005AP) Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg. (0,98 m³). Se realizan actividades de Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg, conforme a las dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y documentos del proyecto, garantizando su correcta colocación, vibrado y acabado para asegurar el adecuado comportamiento estructural del elemento.

7.001 y 7.001AP) Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (198,34 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta modulación, alineación, plomo, nivelación y adecuada integración con los elementos estructurales, en cumplimiento de los requisitos de calidad y estabilidad previstos para el sistema constructivo.

7.003 y 7.003AP) Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad. (18,25 m). Se realizan actividades de Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y documentos del proyecto, garantizando la continuidad del sistema de impermeabilización y la adecuada transición entre superficies.

7.004 y 7.004AP) Filos y dilataciones. (2554,00 m). Se realizan actividades de filos y dilataciones, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y documentos del proyecto, garantizando la adecuada definición de los acabados y el correcto comportamiento de los elementos frente a los movimientos y variaciones propias de la estructura.

7.007 y 7.007AP) Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo. (393,85 m). Se realizan actividades de Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo, de conformidad con las dimensiones, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada transferencia de cargas sobre las aberturas y el correcto desempeño estructural de los elementos.

7.008 y 7.008AP) Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. (107,39 m). Se realizan actividades de Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo, con dimensiones de acuerdo con los planos de diseño, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado confinamiento, soporte y estabilidad de los elementos constructivos.

7.009 y 7.009AP) Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m. (92,00 m). Se realizan actividades de Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m, se desarrollaron conforme a los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos estructurales y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado soporte, nivelación y estabilidad de los elementos para los cuales fueron proyectadas.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

8.010 y 8.010AP) Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior. (2514,37 m²). Se realizan actividades de Estuco plástico sobre superficies b>1m² Interior y exterior, de acuerdo con los detalles constructivos, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando un acabado uniforme, la adecuada preparación de las superficies y las condiciones requeridas para la aplicación de los acabados finales.

8.012 y 8.012AP) Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco. (281,66 m²). Se realizan actividades de Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta nivelación, alineación, fijación y calidad de los acabados finales.

8.013 y 8.013AP) Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco. (330,67 m²). Se realizan actividades de Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta nivelación, alineación, fijación y calidad de los acabados finales.

8.016 y 8.016AP) Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido. (43,60 m). Se realizan actividades de Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido, de acuerdo con los detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada resistencia, nivelación, uniformidad y calidad de los acabados requeridos.

9.001 y 9.001AP) Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. (33,05 m²). Se realizan actividades de Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m, de acuerdo con los detalles constructivos, cotas, espesores y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la elaboración de una superficie uniforme, con las pendientes de diseño, adecuada adherencia y las condiciones de impermeabilidad requeridas para la posterior ejecución de los acabados o elementos previstos.

9.002 y 9.002AP) Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. (105,45 m²). Se realizan actividades de Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante, de acuerdo con los detalles constructivos, procedimientos de instalación y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada adherencia del sistema, la continuidad de la membrana impermeabilizante y la protección de las superficies frente a la infiltración de agua y la acción de los agentes ambientales.

16.001 y 16.001AP) Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg. (20,59 m). Se realizan actividades de Tubería ASTM A-53, ERW, black Steel, SCH 40-4 plg, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta unión, continuidad y estabilidad del sistema, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionamiento previstos.

16.017 y 16.017AP) Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. (1,89 und). Se realizan actividades de Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada, de acuerdo con los detalles constructivos, especificaciones técnicas y ubicación establecida en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta conexión entre los tramos de tubería, la continuidad hidráulica del sistema y el cumplimiento de los requisitos de calidad, estanqueidad y funcionamiento previstos.

16.018 y 16.018AP) Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. (3,62 und). Se realizan actividades de Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada, de acuerdo con los detalles constructivos, especificaciones técnicas y ubicación establecida en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado cambio de dirección de la red, la correcta conexión entre los tramos de tubería y el cumplimiento de los requisitos de calidad, estanqueidad y funcionamiento previstos.

17.003 y 17.003AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (8,07 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento del sistema hidráulico.

20.002 y 20.002AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. (343,97 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento de la red hidráulica.

20.003 y 20.003AP) Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. (153,77 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. y accesorios, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento de la red hidráulica.

20.004 y 20.004AP) Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. (150,86 m). Se realizan actividades de Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg. Incluye soporte y accesorios, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad, estanqueidad y funcionamiento de la red hidráulica.

20.006 y 20.006AP) Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. (107,00 und). Se realizan actividades de Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión, estanqueidad y funcionamiento del punto de suministro de la red hidráulica.

20.011 y 20.011AP) Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. (4,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo

pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado control, aislamiento y operación de la red hidráulica, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionamiento previstos.

20.012 y 20.012AP) Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. (2,00 und). Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado control, aislamiento y operación de la red hidráulica, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad y funcionamiento previstos.

21.002 y 21.002AP) Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. (53,08 m). Se realizan actividades Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada evacuación de las aguas residuales, la estanqueidad de las uniones y el correcto funcionamiento de la red sanitaria.

21.005 y 21.005AP) Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. (61,00 und). Se realizan actividades Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión a la red sanitaria, la hermeticidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales.

21.006 y 21.006AP) Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. (14,00 und). Se realizan actividades Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, detalles constructivos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión a la red sanitaria, la hermeticidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales.

21.007 y 21.007AP) Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg. (27,35 m). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada ventilación de la red sanitaria, el equilibrio de presiones en el sistema, el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos.

21.008 y 21.008AP) Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg. (11,80 m). Se realizan actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg, de acuerdo con los alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada ventilación de la red sanitaria, el equilibrio de presiones en el sistema, el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

22.001 y 22.001AP) Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. (8,41 m). Se realizan Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada captación y conducción de las aguas lluvias, la hermeticidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.

22.005 y 22.005AP) Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. (7,00 und). Se realizan Bajantes de desagüe pluvial PVC Ø 4plg, de acuerdo con la ubicación, alineamientos, niveles, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conducción de las aguas lluvias hacia el sistema de drenaje, la hermeticidad de las uniones, la correcta fijación de los elementos y el óptimo funcionamiento de la red de evacuación pluvial.

24.006 y 24.006AP) Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg. (7,00 und). Se realizan Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg, de acuerdo con la ubicación, cotas, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado acceso para inspección y mantenimiento, la correcta ventilación de la estructura y el óptimo funcionamiento de las conexiones de la red.

26.008 y 26.008AP) Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg. (11,56 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg, de acuerdo con los trazados, alineamientos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada canalización y protección de las redes eléctricas, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad para el funcionamiento del sistema eléctrico.

26.009 y 26.009AP) Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. (312,12 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg, de acuerdo con los trazados, alineamientos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada canalización y protección de las redes eléctricas, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad para el óptimo funcionamiento del sistema eléctrico.

26.011 y 26.011AP) Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg. (373,20 m). Se realizan actividades de Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg, de acuerdo con los trazados, alineamientos, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada canalización y protección de las redes, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad para el óptimo funcionamiento del sistema.

29.018 y 29.018AP) Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega. (22,00 und). Se realizan actividades de Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega, de acuerdo con la ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada protección de las conexiones eléctricas, la

correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad para el funcionamiento del sistema eléctrico.

32.003 y 32.003AP) Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo. (20,99 m). Se realizan actividades de Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo, de acuerdo con los trazados, dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad eléctrica, la correcta conexión al sistema de puesta a tierra y el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad y funcionamiento previstos para la instalación eléctrica.

32.004 y 32.004AP) Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio. (97,85 m). Se realizan actividades de Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio, de acuerdo con los trazados, dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada continuidad eléctrica, la correcta conexión de los elementos del sistema y el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad y funcionamiento previstos para la instalación eléctrica.

41.020) Rejillas para cunetas pluviales (26,42 m²). Se realizan actividades de Rejillas para cunetas pluviales, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, cotas y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada captación y conducción de las aguas lluvias hacia el sistema de drenaje, la correcta fijación de los elementos y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, seguridad y funcionamiento previstos.

-1.1.4 NP) PATOLOGIA_ Puertas de ascensor (2,00 und). Se realizan actividades de instalación de puertas de ascensor, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles, especificaciones técnicas y detalles establecidos en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando su correcta alineación, nivelación, fijación y funcionamiento, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad, resistencia, estanqueidad y operación previstos para el adecuado desempeño del sistema de transporte vertical.

-2.2.4 PATOLOGIA_ Acero de refuerzo (18,41 kg). Se realizan actividades de Acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles de refuerzo y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado desempeño estructural, la correcta disposición del refuerzo y el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos para la rehabilitación de los elementos intervenidos.

-2.3.4 PATOLOGIA_ Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural. (50,00 m). Se realizan actividades de reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural, de acuerdo con la ubicación, alcance de la intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos, estudios y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, el tratamiento de las fisuras, la correcta aplicación del mortero de reparación estructural y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, resistencia, durabilidad y desempeño estructural previstos.

-2.4.1 PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (15,61 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología

y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada integración con los elementos existentes, la correcta modulación, alineación, plomo y nivelación de los muros, así como el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.

-2.4.4 PATOLOGIA_ Pañete liso para muro en mortero 1:4. (153,56 m²). Se realizan actividades de pañete liso para muro en mortero de cemento y arena en proporción 1:4, de acuerdo con la ubicación, espesores, niveles, plomos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta dosificación y aplicación del mortero, la obtención de un acabado uniforme, liso y continuo, y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, resistencia, durabilidad y calidad previstos.

-2.4.5 PATOLOGIA_ Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (12,60 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural del elemento, su correcta integración con la mampostería existente y el cumplimiento de los criterios de calidad y estabilidad definidos para la intervención.

-3.1.4 PATOLOGIA_ Retiro de manto asfaltico. (154,86 m²). Se realizan actividades de retiro de manto asfáltico, de acuerdo con la ubicación, alcance de la intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos y demás documentos del proyecto, garantizando el desmontaje controlado del material existente, la adecuada limpieza de la superficie intervenida, la correcta disposición de los residuos generados y el cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección de los elementos adyacentes y condiciones necesarias para la ejecución de las actividades posteriores.

-3.2.3 NP) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (0,55 m³). Se realizan actividades de Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg, de acuerdo con las dimensiones, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural, la correcta integración con los elementos existentes y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.

-3.2.4 NP) PATOLOGIA_Acero de refuerzo. (2246,95 kg). Se realizan actividades de Acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles de refuerzo y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando el adecuado desempeño estructural, la correcta disposición del refuerzo y el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos para la rehabilitación de los elementos intervenidos.

-3.2.7 NP) PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg. (1,39 m³). Se realizan actividades de Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg, de acuerdo con las dimensiones, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural del elemento, su correcta integración con la estructura existente y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

-3.4.1 NP) PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (228,24 m²). Se realizan actividades de Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada integración con los elementos existentes, la correcta modulación, alineación, plomo y nivelación de los muros, así como el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.

-3.4.2 NP) PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. (175,80 m²). Se realizan actividades de Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada integración con la estructura existente, la correcta modulación, alineación, plomo y nivelación del elemento, así como el cumplimiento de los criterios de calidad y estabilidad definidos para la intervención.

-3.4.3 NP) PATOLOGIA_Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (19,80 m). Se realizan actividades de Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad resistente del elemento, la correcta transferencia de cargas sobre las aberturas y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para la intervención.

-3.4.7 NP) PATOLOGIA_Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo. (222,21 m). Se realizan actividades de Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo, de acuerdo con las dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada recuperación de la capacidad estructural del elemento, su correcta integración con la mampostería existente y el cumplimiento de los criterios de calidad y estabilidad definidos para la intervención.

-3.4.8 PATOLOGIA_Alfajia en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta. (48,30 m). Se realizan actividades de construcción de alfajía en concreto de f'c = 21 MPa para antepecho de cubierta, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta colocación, conformación y acabado del elemento, así como el cumplimiento de los requisitos de resistencia, durabilidad, estabilidad y funcionalidad previstos para la adecuada protección del antepecho y el control del escurrimiento de las aguas.

-3.5.3 PATOLOGIA_Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. (348,89 m²). Se realizan actividades de impermeabilización con manto asfáltico de 3 mm con acabado en foil de aluminio, aplicado sobre imprimante, de acuerdo con la ubicación, pendientes, traslapos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta aplicación del imprimante, la instalación continua del manto con los traslapos y sellos requeridos,

y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, impermeabilidad, durabilidad, resistencia a la intemperie y correcto funcionamiento del sistema de impermeabilización.

-3.6.1 PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios. (13,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 11 de Ø 3/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión de las tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.

-3.6.2 NP) PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) incluye soporte y accesorios. (3,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de Ø 1 1/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión entre tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.

-3.6.3 NP) PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios. (69,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de Ø 1 1/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión entre tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.

-3.6.4 NP) PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios. (3,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de Ø 1 1/4", incluyendo soportes, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada unión entre tuberías y accesorios, la correcta fijación del sistema, la estanqueidad de las conexiones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, presión de servicio, seguridad y funcionamiento previstos.

-3.6.5 NP) PATOLOGIA_Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg. (15,00 und). Se realizan actividades de Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, detalles constructivos, procedimientos de intervención y especificaciones técnicas establecidas en los planos de patología y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada conexión a la red hidráulica, la estanqueidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema intervenido.

-3.6.8 NP) PATOLOGIA_Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación. (1,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de registro de cortina tipo pesado RED-WHITE o equivalente de Ø 1", incluyendo tapa de registro, reparación de la superficie intervenida y demás elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada fijación del conjunto, la estanqueidad de las conexiones, la correcta restitución de las áreas afectadas por la intervención y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, seguridad, durabilidad y funcionamiento previstos.

-3.6.9 NP) PATOLOGIA_Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Reparación. (3,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de registro de cortina tipo pesado RED-WHITE o equivalente de Ø 3/4", incluyendo tapa de registro, reparación de la superficie intervenida y demás elementos necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con la ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada fijación del conjunto, la estanqueidad de las conexiones, la correcta restitución de las áreas afectadas por la intervención y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, seguridad, durabilidad y funcionamiento previstos.

-3.7.3 PATOLOGIA_ Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. (6,00 und). Se realizan actividades de construcción de punto sanitario de Ø 2" en tubería PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación de la tubería, accesorios y conexiones, la adecuada fijación del sistema, la estanqueidad de las uniones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, funcionalidad, evacuación y operación previstos.

-3.7.4 PATOLOGIA_ Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria. (1,00 und). Se realizan actividades de construcción de punto sanitario de Ø 4" en tubería PVC sanitaria, de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación de la tubería, accesorios y conexiones, la adecuada fijación del sistema, la estanqueidad de las uniones y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, funcionalidad, evacuación y operación previstos.

-3.8.1 PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg. (31,00 m). Esta actividad contempla la ejecución de la línea primaria de desagüe pluvial en tubería PVC de Ø 4", ejecutada conforme a los planos de diseño, las especificaciones técnicas y los niveles establecidos en el proyecto. La actividad incluye la instalación de la tubería y sus accesorios, la verificación de alineación y pendientes, la correcta conformación de las uniones para asegurar la estanqueidad del sistema y las pruebas necesarias para garantizar la adecuada evacuación de las aguas lluvias, cumpliendo con los requisitos de calidad, resistencia y funcionamiento.

-3.8.2 PATOLOGIA_ Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg. (1,50 m). La actividad comprende la ejecución de la línea primaria de desagüe pluvial en tubería PVC de Ø 6", de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros, pendientes y demás especificaciones definidas en los planos y documentos técnicos del proyecto. Incluye el suministro e instalación de la tubería y sus

accesorios, la conformación de las uniones, los ajustes necesarios para garantizar la continuidad del sistema y la verificación de su correcto funcionamiento, asegurando una evacuación eficiente de las aguas lluvias y el cumplimiento de los criterios de calidad, resistencia y durabilidad establecidos.

-3.8.3 PATOLOGIA_ Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg. (4,00 und). Corresponde a la instalación del bajante de desagüe pluvial en tubería PVC de Ø 4", de acuerdo con la ubicación, recorrido, niveles y especificaciones técnicas definidas en los planos y demás documentos del proyecto. La actividad incluye el suministro e instalación de la tubería, accesorios, soportes y elementos de fijación requeridos, garantizando la correcta verticalidad, estabilidad, hermeticidad de las uniones y la adecuada conducción de las aguas lluvias hacia el sistema de drenaje, cumpliendo con los requisitos de calidad, resistencia y durabilidad establecidos.

-4.4.2 PATOLOGIA_ Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4. (2,00 m²). Esta actividad contempla la ejecución de pañete liso impermeabilizado en mortero de cemento y arena en proporción 1:4, aplicado sobre las superficies indicadas en los planos y de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. Incluye la preparación del sustrato, la dosificación y aplicación del mortero con aditivo impermeabilizante cuando corresponda, el afinado de la superficie hasta obtener un acabado uniforme y el control de las condiciones de curado, garantizando la adherencia, impermeabilidad, resistencia, durabilidad y calidad del acabado final.

-5.1.7 PATOLOGIA_ Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. (5,45 m). La actividad comprende la demolición de concreto en columnas y vigas de cimentación, conservando el acero de refuerzo existente para su reutilización, de acuerdo con el alcance definido en los planos, las especificaciones técnicas y las indicaciones de la interventoría. Incluye la remoción controlada del concreto mediante procedimientos que eviten daños al acero de refuerzo, su limpieza y acondicionamiento para permitir su posterior incorporación a la estructura, así como la disposición del material producto de la demolición, garantizando la seguridad de la intervención y la integridad de los elementos a conservar.

-5.4.1 PATOLOGIA_ Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (2,22 m²). Se realizan actividades de mampostería en bloque No. 4 con espesor de 0,10 m, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles, alineación y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta colocación de las unidades de mampostería, la adecuada dosificación y aplicación del mortero de pega, el cumplimiento de los plomos y juntas especificadas, y los requisitos de resistencia, estabilidad, durabilidad y calidad previstos.

-5.4.6 PATOLOGIA_ Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo. (3,60 m). Se realizan actividades de construcción de bordillo (poyo) de confinamiento en concreto de f'c = 21 MPa, con altura de 0,10 m, incluyendo acero de refuerzo, de acuerdo con la ubicación, dimensiones, niveles y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación y amarre del acero de refuerzo, la adecuada colocación, vibrado y curado del concreto, y el cumplimiento de los requisitos de resistencia, estabilidad, durabilidad y calidad previstos.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

-5.5.3 PATOLOGIA_ Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. (255,04 m²). Se realizan actividades de impermeabilización con manto asfáltico de 3 mm con acabado en foil de aluminio, aplicado sobre imprimante, de acuerdo con la ubicación, pendientes, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta aplicación del imprimante, la instalación del manto con los traslapos y sellos requeridos, y el cumplimiento de los requisitos de adherencia, impermeabilidad, resistencia a la intemperie, durabilidad y desempeño del sistema.

-5.9.2 PATOLOGIA_ Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg. (10,00 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de tubería EMT de Ø 3/4", de acuerdo con la ubicación, trazado, diámetros y especificaciones técnicas establecidas en los planos eléctricos y demás documentos del proyecto, garantizando la correcta instalación de la tubería, soportes, accesorios y elementos de fijación, la adecuada continuidad del sistema de canalización y el cumplimiento de los requisitos de seguridad, resistencia mecánica, durabilidad y funcionamiento previstos.

-6.1 PATOLOGIA_ Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados. (88,61 m). Se realizan actividades de suministro e instalación de cintas post-aplicadas adheridas con resina epóxica sobre la membrana impermeabilizante, de acuerdo con la ubicación de las juntas, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los planos de diseño y demás documentos del proyecto, garantizando la adecuada preparación de la superficie, la correcta aplicación de la resina epóxica, la instalación y adherencia continua de las cintas, y el cumplimiento de los requisitos de impermeabilidad, flexibilidad, resistencia, durabilidad y sellado de juntas de construcción, juntas de expansión y uniones de elementos prefabricados.

-7.1 PATOLOGIA_ Sum./Inst. Baterias de Planta de emergencia de 150 KVA (2,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de baterías para planta de emergencia de 150 kVA, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, los planos del proyecto y demás documentos contractuales, garantizando la correcta ubicación, fijación y conexión de las baterías, la verificación de la polaridad y continuidad del sistema, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad, capacidad de arranque, confiabilidad, durabilidad y adecuado funcionamiento de la planta de emergencia.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

CUADRO N° 1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

No	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$37.790.587.926,00	94.73%	-28.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$26.623.518.469,00	66.73%	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg.



Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.




Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad.



Filos y dilataciones



Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo.

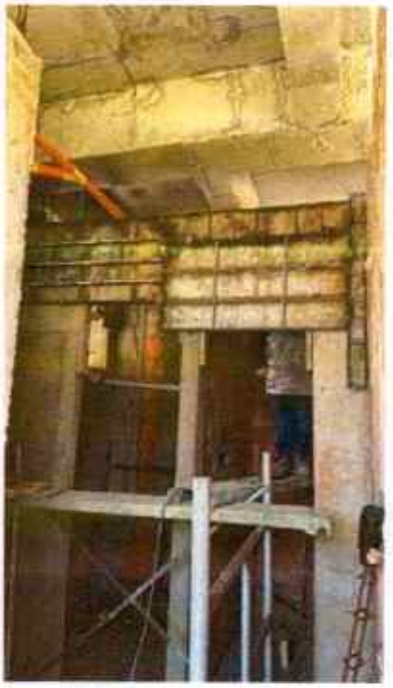

Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.



Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m.



Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior.




Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco.



Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco.



Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido.

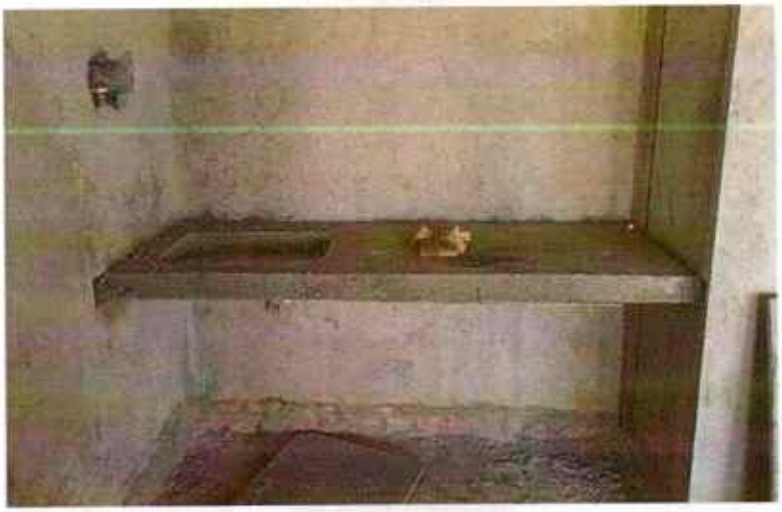

Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.



Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.



Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg.



Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.



Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.




Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.



Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.



Sum./inst. Tubería PVC - presión RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.



Sum./inst. Tubería PVC presión RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.



Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.



Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.



Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.



21.002 y 21.002AP) Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.




Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.



Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.



Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg.

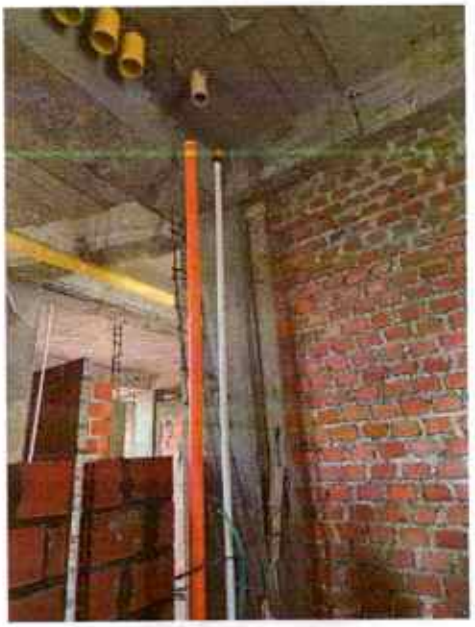

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg.



Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg.




Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.



Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg.



Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg.

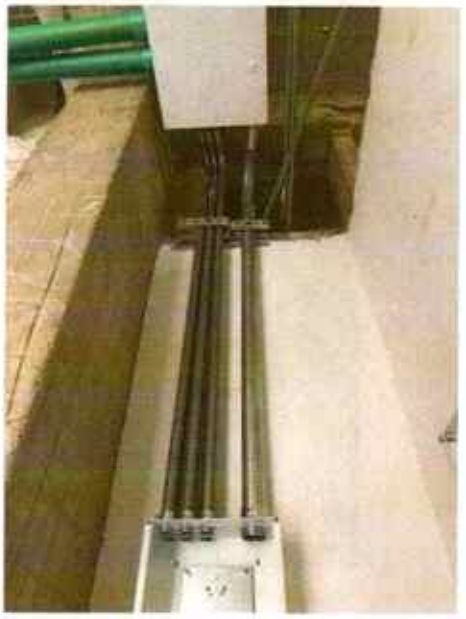

Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.



Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg.



Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo.



Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio.



Rejillas para cunetas pluviales.



PATOLOGÍA_Puertas de ascensor



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

PATOLOGIA_Acero de refuerzo



PATOLOGIA_Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural



PATOLOGIA _ Mamposteria en bloque No.4 e: 0.10m



PATOLOGIA_Pañete liso para muro en mortero 1:4



PATOLOGIA_Columnetas en concreto f´c 21 Mpa, incluye acero de refuerzo.



PATOLOGIA _ Retiro de manto asfáltico



PATOLOGIA_Concreto para columna f´c: 28 Mpa TM ¾ plg




PATOLOGIA_Acero de refuerzo



PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevado f´c: 28 Mpa TM ¾ plg



PATOLOGIA_Mamposteria en bloque No. 4 e: 0.10m

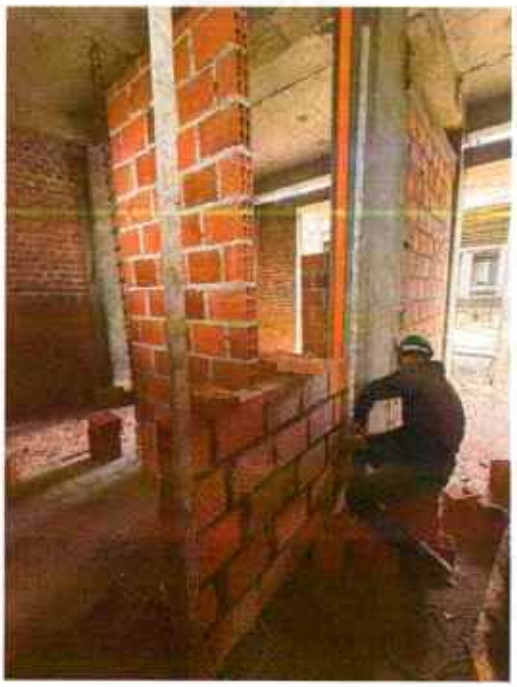

PATOLOGIA_Muro perimetral doble e: 0.24 m en ladrillo de obra común




PATOLOGIA_Dintel 0.15x0.15 en concreto f'c: 21 Mpa; incluye acero de refuerzo



PATOLOGIA_Columneta en concreto f'c: 21 Mpa; incluye acero de refuerzo.



PATOLOGIA_Alfajía en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta.

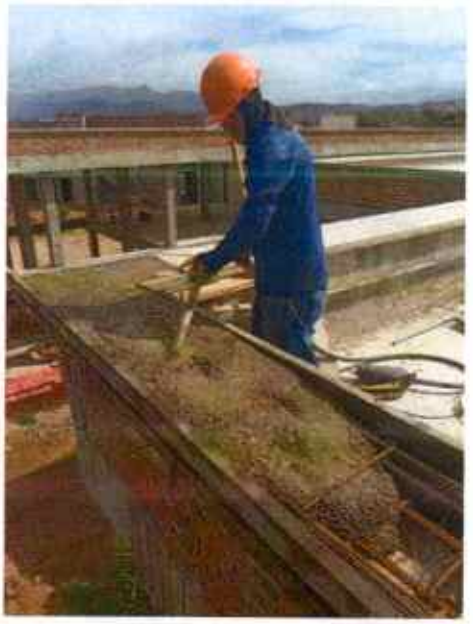

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

PATOLOGIA_Impermeabilización manto asfáltica 3 mm con foil de aluminio , sobre imprimante.



PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios.



PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 21- f(ø: 1 1/4 plg.) incluye soporte y accesorios.



PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios.



PATOLOGIA_Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios.



PATOLOGIA_Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg.



PATOLOGIA_Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED-WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación.



PATOLOGIA_Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED-WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Reparación.




PATOLOGIA_Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria.



PATOLOGIA_Punto sanitario 4 plg en tubería PBV sanitaria.



PATOLOGIA_Linea primaria de desague pluvial PVC Ø 4 plg.

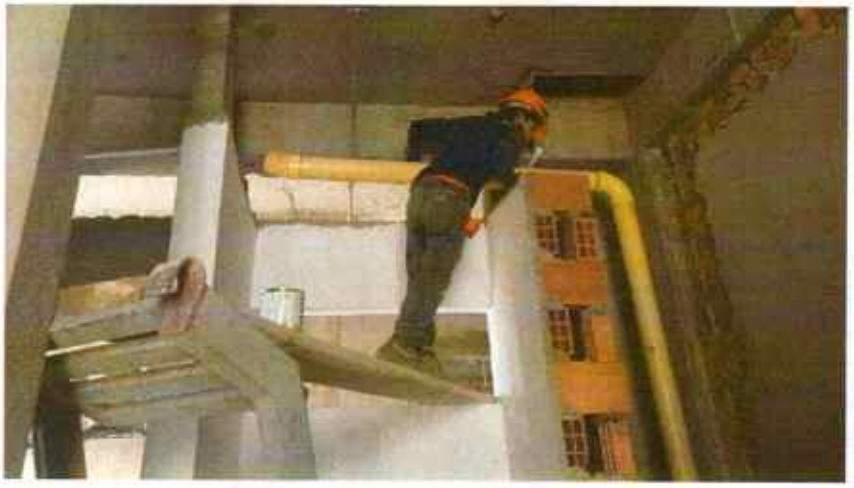

PATOLOGIA_Linea primaria de desaue pluvial PVC Ø 6 plg.



PATOLOGIA_Bajante de desague pluvial PVC Ø 4 plg.




PATOLOGIA_Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

PATOLOGIA_Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser utilizado.

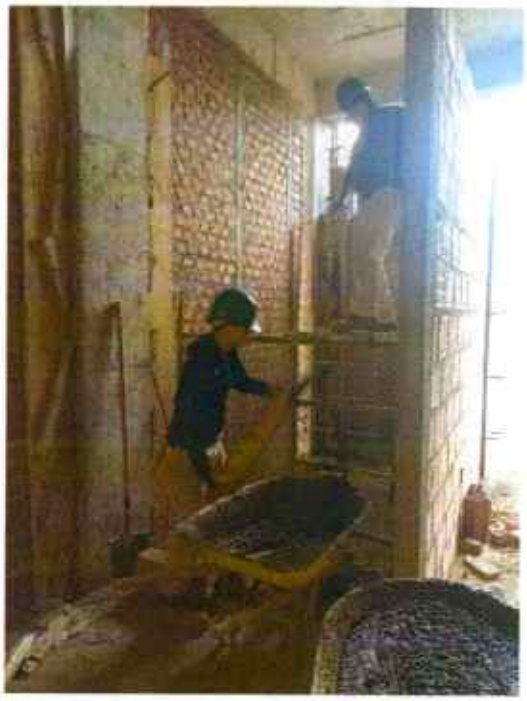

PATOLOGIA_Mamposteria en bloque No. 4 e: 0.10 m.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

PATOLOGIA_Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc: 21 Mpa h: 0.10 incluye acero de refuerzo.



PATOLOGIA_Impermeabilizante manto asfaltico 3mm con foil de aluminio, sobre imprimante.



PATOLOGIA_Sum/inst tubería EMT Ø ¾ plg.



PATOLOGIA_Cintas post-aplicadas adheridas con resina epóxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción .



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

PATOLOGIA-Sum./Inst. Baterias de planta de emergencia de 150 KVA.



4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Articulo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, CARLOS ALBERTO BRAHIM en mi condición de supervisor del contrato de obra LP-SG-01362-2021 DE 31 DE AGOSTO 2021, **CERTIFICO** que:

UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA), NORTE DE SANTANDER. Durante el periodo comprendido del 22/06/2026 al 26/07/2026, aprobado por la supervisión.

El valor por reconocer y pagar es la suma MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. **$1.008.233.731 correspondiente** al pago de la parcial N.º 15.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago).

CARLOS ALBERTO BRAHIM
Supervisor

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DE CONTRATISTA MANIFESTANDO QUE REALIZÓ LOS RESPECTIVOS PAGOS DE FIC SENA DE ACUERDO CON LA LEY, ANEXAR COPIA SOPORTE FIC SENA

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

San José de Cúcuta, 28 de julio de 2026

CERTIFICADO DE VERACIDAD DE APORTES AL FONDO DE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – FIC

NELSON YOEL PARADA REYES, identificado con cedula de ciudadanía N° **88.273.256** y **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA**, identificada con cedula de ciudadanía N° **1.091.060.360** de **CHITAGA**, con tarjeta profesional N° **274197-T** de la Junta de Central de Contadores, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** y **CONTADOR PUBLICO** respectivamente de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6** como consta en el RUT; bajo la gravedad de juramento **CERTIFICAMOS** que LA UNIÓN TEMPORAL se encuentra al día en el pago de los aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, desde su fecha de creación al día de hoy en virtud de la siguiente normatividad: Decreto 083 de 1976; Resolución 2370 de 2008, Resolución 1449 del 2012 y las demás que rijan la materia de acuerdo con la ley colombiana.

El método usado para liquidar el FIC es el de "***Contratos a Todo Costo***: *Se presume que la industria de la construcción destina para la realización de los trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento (25%) de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios; en consecuencia las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción, deberán pagar a título de contribución con destino al FIC, el punto veinticinco por ciento (0.25) del valor de las obras que ejecuten directamente o por medio de subcontratistas".*

Se expide la presente certificación con destino al **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - NIT 800.103.927-7**, para realizar el cobro del **ACTA PARCIAL N° 015** del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Atentamente,

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256 de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360

MOGOLLON BAUTISTA

APELLIDOS

DAYVEL DARILIANA

NOMBRES

Dayvel Mogollón

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2503100-00756956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
274197-T
DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734
DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
295337
308328


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A955563618E9299

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

27 Jul 2026 13:07
NIT 901514217
Usuario: ILEANA STELLA CARVAJAL ARENAS

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
181.53.181.26

Fecha
27 Jul 2026 13:07

Referencia 2
NIT

Número de factura
167032956

Referencia 3
901514217

Descripción del pago
Pago Ordinario FIC

Valor del Pago
$1.586.901

Número de comprobante
TR260727180701PZwtDq

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 2506**

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	167032956	515280008	27/07/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.53.181.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,586,901.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,586,901.00	COP$ 1,586,901.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	167032956	515280008	27/07/2026

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3202435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 015

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/07/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
634760465.00

Costo Total Mano de Obra
158690116.00

Número de Trabajadores en el Periodo
29

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1586901.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1586901.00

ecollect
Seguro para ti

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

27 Jul 2026 13:15
NIT 901514217
Usuario: ILEANA STELLA CARVAJAL ARENAS

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
181.53.181.26

Fecha
27 Jul 2026 13:15

Referencia 2
NIT

Número de factura
167033669

Referencia 3
901514217

Descripción del pago
Pago Ordinario FIC

Valor del Pago
$926.993

Número de comprobante
TR260727181501LZa3mV

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 2506**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	167033669	515314353	27/07/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.53.181.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 926,993.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 926,993.00	COP$ 926,993.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	167033669	515314353	27/07/2026

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3202435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 015

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/07/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
370797029.00

Costo Total Mano de Obra
92699257.00

Número de Trabajadores en el Periodo
29

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
926993.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
926993.00

ecollect
Seguro para ti

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICACIÓN DE ICA

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

San José de Cúcuta, 28 de julio de 2026

Señores;
SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
E. S. D.

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021.**

ASUNTO: **CERTIFICADO RETENCIÓN ICA.**


Cordial saludo,

Mediante la presente, la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6,** en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, certifica que el cobro del **ACTA PARCIAL Nº 015** se ejecutó en el Barrio **LA PARADA**, ubicado en el municipio de **VILLA DEL ROSARIO**, las cuales fueron desarrolladas en el **PERIODO 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2026** en la obra cuyo objeto es: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER."

Cordialmente;

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256 de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

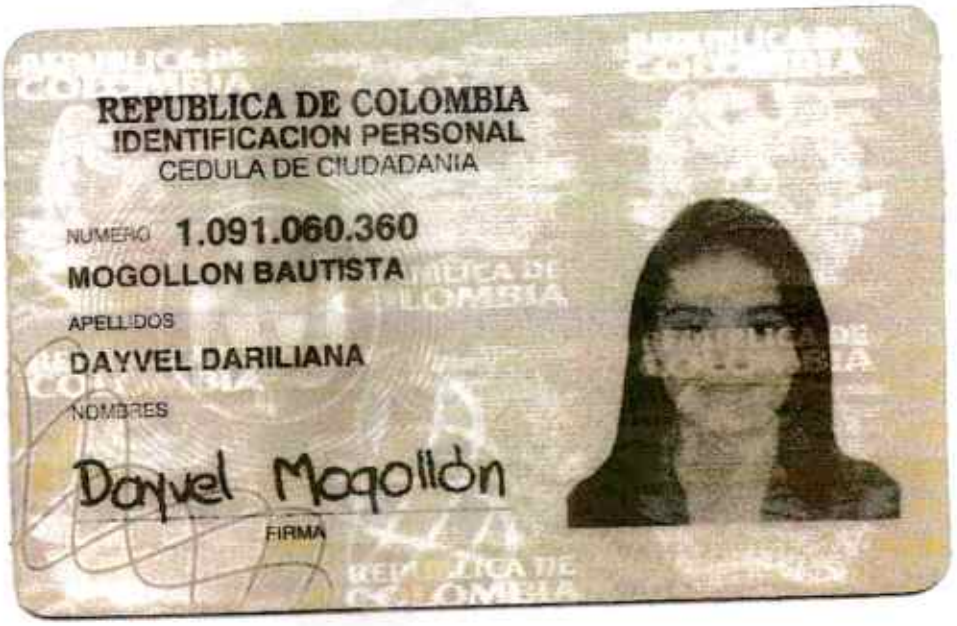

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360

MOGOLLON BAUTISTA

APELLIDOS

DAYVEL DARILIANA

NOMBRES

Dayvel Mogollon

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503100-00756956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
274197-T
DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734
DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
296337
308328


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 9 5 5 5 6 3 6 1 B E 9 2 9 3 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
