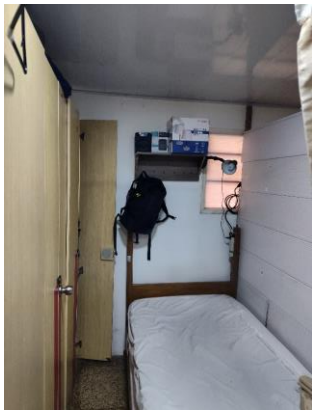
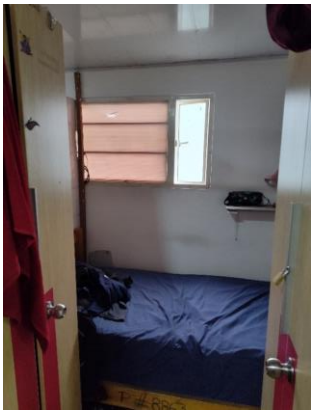
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME VISITA DE CAMPO Y DIAGNOSTICO



FECHA DE INSPECCION	ESTACION A INSPECCIONAR	MOTIVO DE INSPECCION
23/02/2026	B-12 SUBA	Verificación estado actual de la estación y diagnostico de aspectos relevantes


ASPECTOS VERIFICADOS EN INSPECCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ALOJAMIENTO PERSONAL MASCULINO: Encontramos el area con pisos en tableta de trafico pesado, muros en mamposteria con pañete y pintura, y cielo raso en PVC y dos ventanas tipo batiente. En esta area se sugiere generar una comunicación directa mediante un vano o puerta hacia el área de alojamiento de los suboficiales, esto con la finalidad de generar un espacio más amplio. De igual manera se solicita mejorar la ventilación en el área, adecuando las ventanas existentes. Se sugiere generar divisiones para independizar los cubículos del personal operativo.


ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES: Encontramos el area con pisos en porcelanato, muros en mamposteria con pañete y pintura, techo con acabado en pintura. En esta area se requiere cerrar el vano o eliminar la puerta del baño existente en el costado norte, esto debido a que este espacio quedaría comunicado con el area de alojameinto masculino del personal operativo.

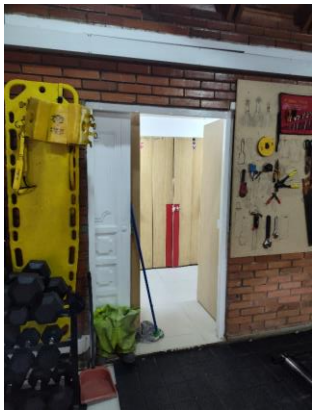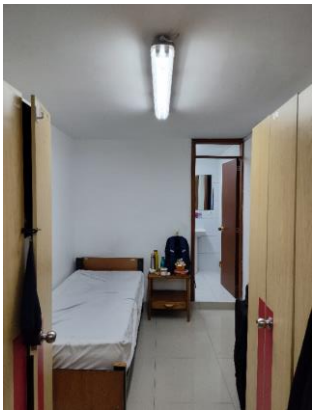



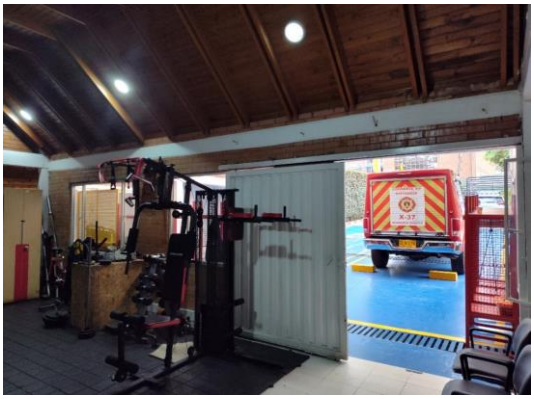


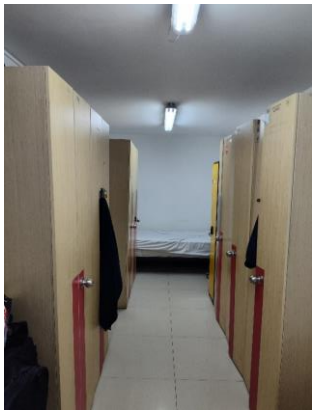GIMNASIO: Este espacio se encuentra en piso con acabado en tableta ceramica y un sobrepiso en laminas de caucho de 1 cm, muros en mamposteria con ladrillo a la vista, columnas con acabado en estuco y pintura, cielo raso en liston de madera. Se sugiere el cambio de lugar del gimnasio para dejar allí el área de Alojamiento de Suboficiales, en este espacio se instalarían muros en drywall, se abriría el vano o la la puerta para el baño sobre el muro del costado occidental, de igual manera mejorar la ventilación del area con las ventanas existentes, cambiando su estructura, reemplazar piso existente en cerámica de toda el area.





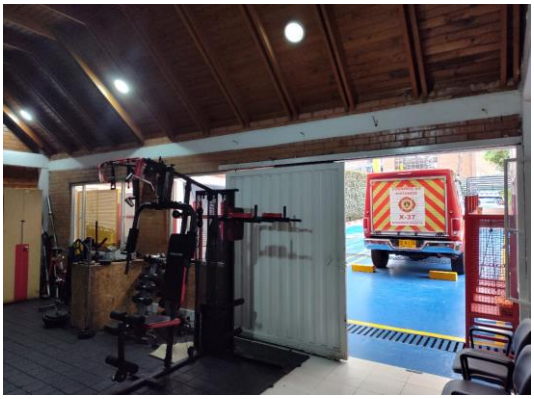



AREA POSTERIOR O PATIO TRASERO: Encontramos un area en cesped, y una rea en piso de concreto, muros en mamposteria con pañete y pintura, y otros en ladrillo a la vista, cubierta en teja temoacustica, y estructura metalica de 10x10. En esta area Se sugiere la construcción de muros ligeros en fibrocemento, para generar un espacio de bodega y otro de gimnasio, se debe nivelar el piso con placa de concreto donde se encuentra actualmente el contenedor; en la bodega incluir la estantería, los muros del gimnasio con enchape cerámico a media altura y los dos espacios con sus respectivas puertas. De igual manera en el área de lavado se sugiere un canal en el piso para recoger las aguas del area de lavanderia y conducirlo al cárcamo existente.










ZONA DE LAVADO DE TRAPEROS: En esta area encontramos piso en concreto y un muro a media altura en ladrillo a la vista con la reja divisoria con el predio de la policia en el costado norte, se sugiere adecuar el muro de media altura, pañetándolo, pintándolo y mejorando la zona de lavado.









ZONA DE ACCESO A LA ESTACION: Encontramos piso en concreto, pero existe un area en malas condiciones, se sugiere el arreglo del piso en concreto, nivelacion y mejora.

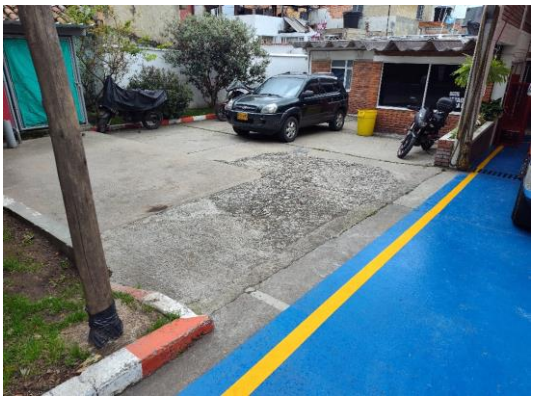


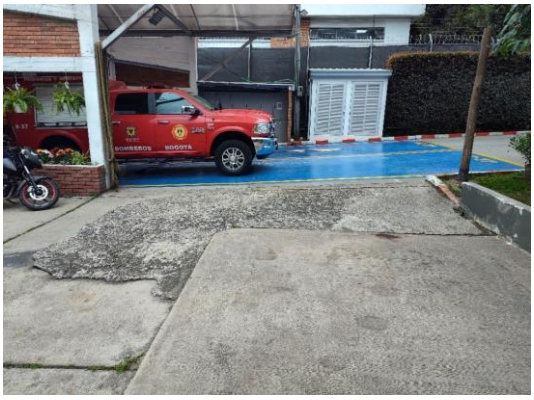


SALA COMEDOR, HALL, GUARDIA Y OFICIALATO: Encontramos piso en tableta trafico pesado, se sugiere el cambio de piso a porcelanato.




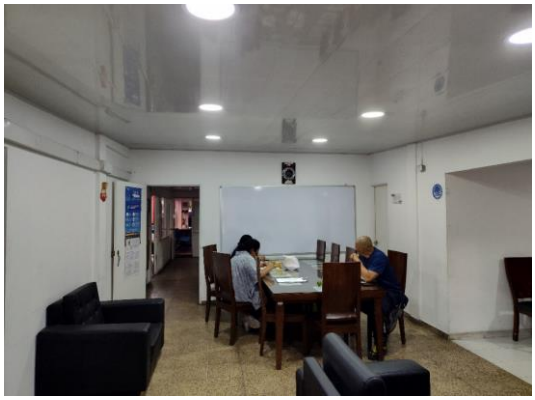


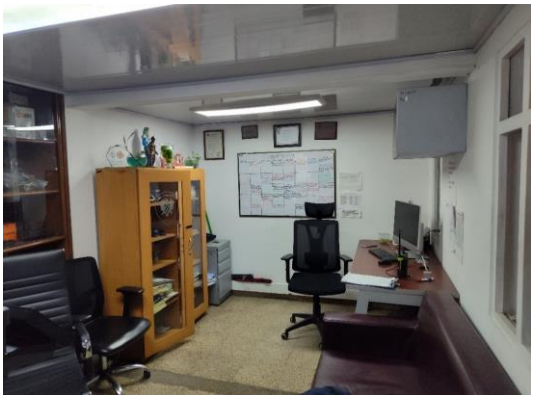


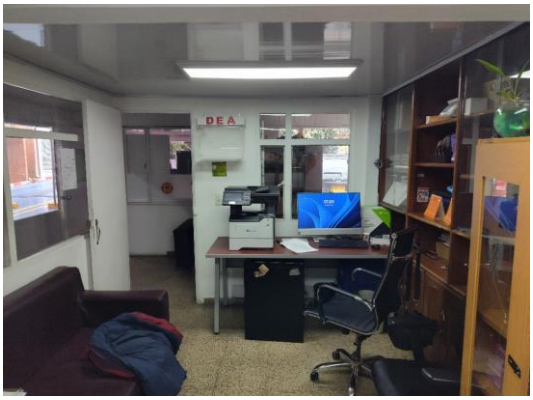



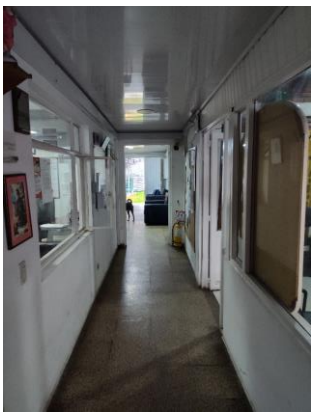

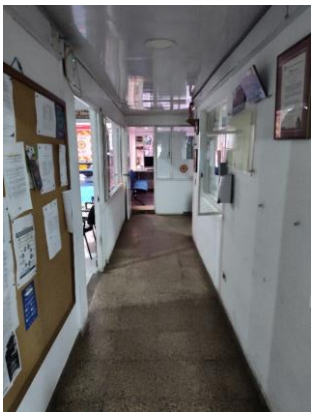


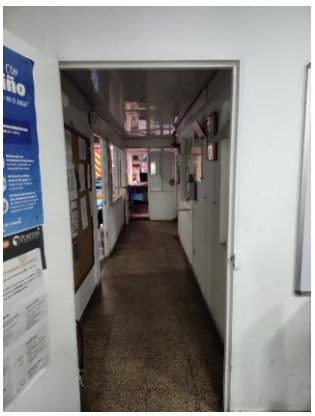

FACHADA PRINCIPAL: Encontramos muro en ladrillo a la vista con reja eslabonada, porton en estructura metalica corredizo. Se sugiere instalar una concertina de seguridad en el area superior de la fachada.





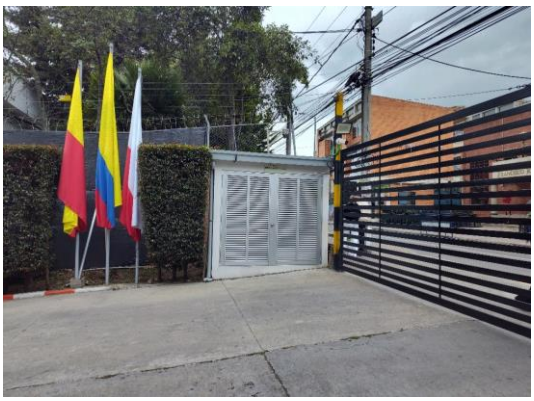



FIRMA
NOMBRE JAVIER LEON ROSSO
