	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC – DIFRA
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: JULIO Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de contrato	181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Contratista	CONSTRUCTURA BAIYITH S.A.S
Objeto	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Valor del Contrato	$ 2.143.500.000,00
Fecha Suscripción	Dia: 23 Mes: NOVIEMBRE Año: 2023
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: JULIO Año: 2026
Forma de Pago	

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023

VALOR: $ 60.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023		*PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024

VALOR: $ 600.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024		*PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025

VALOR: $ 690.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		*PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.*

	PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026 **VALOR: $ 793.500.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** *El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes* / *De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).* / *Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	VIGENCIA 2023 No.:1063523 Dia: 24 Mes: Noviembre Año: 2023 VIGENCIA 2024 No.:17524 Dia: 05 Mes: Enero Año: 2024 VIGENCIA 2025 No.:23325 Dia: 14 Mes: Enero Año: 2025 VIGENCIA 2026 No.:17926 Dia: 01 Mes: Enero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal VF	No aplica.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	No póliza 33-44-101244671 Valor: $ 643.050.000,00 Vigencia desde: 23/11/2023 Vigencia hasta: 31/01/2027 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones	No póliza 33-44-101244671 Valor: $ 107.175.000,00 Vigencia desde: 23/11/2023 Vigencia hasta: 31/07/2029 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía calidad del servicio	No póliza 33-44-101244671 Valor: $ 1.071.750.000,00 Vigencia desde: 23/11/2023 Vigencia hasta: 31/01/2027 Estado: Aprobada
Aprobación Garantía RCE	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica.
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 06 Mes: Diciembre Año: 2023

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	

Fecha firma Modificatorio	Dia: 25 Mes: Enero Año: 2024
Objeto de la Modificación	Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar el valor final del contrato.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 14 Mes: Marzo Año: 2024
Objeto de la Modificación	Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS, la empresa BAYITH CONSTRUCTORA, realiza cesión de derechos económicos del contrato a la empresa CONSTRUCTORA GILGAL S.A.S con NIT. 901.688.961-4.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 27 Mes: Diciembre Año: 2024
Objeto de la Modificación	Reducir el valor de la vigencia 2024 por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($367.993.918,72).
Valor reducción (Si aplica)	$ 367.993.918,72
Nuevo Valor Contrato	$ 1.775.483.151,28
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 23 Mes: Enero Año: 2025

Objeto de la Modificación	Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2025.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

QUINTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 29 Mes: Diciembre Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de constituir la reserva presupuestal con cargo a la vigencia 2025 por valor de $ 153.531.951,00 y modificar la forma de pago de la vigencia 2026, así:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026
(RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025+ VIGENCIA 2026)

VALOR RESERVA 2025: $153.531.951,90

VALOR VIGENCIA 2026: $793.500.000,00

TOTAL A PAGAR EN EL 2026: $ 947.031.951,90

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

SEXTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 09 Mes: Enero Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se efectúa modificación en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2026.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica.

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

SEPTIMO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 31 Mes: Julio Año: 2026
Objeto de la Modificación	De acuerdo con la programación de frentes de obra en el CACOM-4 Y CACOM-6, se efectúa modificación en los siguientes términos: 1. Adicionar recursos por valor de $539.000.000,00. 2. Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026. 3. Modificar de la forma de pago, así:

PAGOS PARCIALES 2026		
VALOR VIGENCIA 2026 + ADICIÓN: $ 1.332.500.000,00		
FECHA CORTE	**PAC**	**VALOR A PAGAR**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).
30 de noviembre de 2026	PAC diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 para ser canceladas en el primer trimestre del 2027.	

4. Ampliar de las garantías contractuales correspondientes.

Valor Adicionado	$ 539.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	$ 2.314.483.151,28
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Hasta el 30 de noviembre de 2026
Registro Presupuestal Ajustado	En expedición.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	En trámite.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No aplica.

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica.
Objeto de la Suspensión	No aplica.
Reinicio	No aplica.
Observaciones	No aplica.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

Jair Enrique Murillo Martinez	Oficial Concreto	No Aplica
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante Concreto	No Aplica
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante Concreto	No Aplica
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante Concreto	No Aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[57,27] %
Avance en Tiempo	[88,82] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 2.314.483.151,28
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 1.325.578.330,94 - (57,27%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 508.978.716,02 - (42,73%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-12-2023	FEC-195 (29-12-23) CFNC-6 (31-12-23)	$ 59.977.070,00	40190124 (26-02-2024)	$ 59.977.070,00
2	31-01-2024	FEC-196 (31-01-24) CFNC-7 (31-01-24)	$ 84.762.768,00	77827524 (19-03-2024)	$ 84.762.768,00
3	11-03-2024	FEC-197 (29-02-24) CFND-3 (04-03-24)	$ 33.437.474,56	125042124 (26-04-2024)	$ 33.437.474,56
4	30-03-2024	FEC-199 (03-04-24)	$ 20.367.952,64	134846224 (06-05-2024)	$ 20.367.952,64
5	30-04-2024	FEC-200 (02-05-24) CFNC-10 (02-05-24)	$ 34.293.875,84	168534024 (29-05-2024)	$ 34.293.875,84
6	31-05-2024	FEC-201 (31-05-24) CFND-5 (31-05-24)	$ 20.206.144,00	252872824 (29-07-2024)	$ 20.206.144,00

7	30-06-2024	FEC-202 (02-07-24) CFND-6 (02-07-24)	$18.449.088,00	280063824 (20-08-2024)	$ 18.449.088,00
8	01-08-2024	FEC-203 (01-08-24)	$ 2.724.592,64	342665724 (24-09-2024)	$ 2.724.592,64
9	02-12-2024	FEC-207 (16-12-24)	$ 2.862.007,68	44680825 (24-02-2025)	$ 2.862.007,68
10	30-12-2024	FEC-208 (30-12-24) CFNC-6 (30-12-24)	$ 14.902.177,92	36693625 (24-02-2025)	$ 14.902.177,92
11	31-01-2025	FEC-209 (31-01-25) CFNC-13 (31-01-25)	$ 22.477.619,84	90543725 (16-02-2025)	$ 22.477.619,84
12	28-02-2025	FEC-210 (28-02-25)	$ 23.981.989,28	118290625 (25-04-2025)	$ 23.981.989,28
13	31-03-2025	FEC-212 (31-03-25) CFNC-14 (31-03-25)	$ 30.166.087,72	172822425 (30-05-2025)	$ 30.166.087,72
14	30-04-2025	FEC-213 (30-04-25)	$ 27.631.849,52	208390025 (26-06-2025)	$ 27.631.849,52
15	31-05-2025	FEC-214 (31-05-25) CFNC-15 (31-05-25)	$ 31.403.540,16	259326625 (28-07-2025)	$ 31.403.540,16
16	01-07-2025	FEC-216 (03-07-25)	$ 20.318.364,12	296393125 (21-08-2025)	$ 20.318.364,12
17	31-07-2025	FEC-217 (31-07-25)	$ 27.886.111,48	347998725 (23-09-2025)	$ 27.886.111,48
18	31-08-2025	FEC-218 (01-09-25)	$ 23.525.361,28	407275125 (28-10-2025)	$ 23.525.361,28
19	30-09-2025	FEC-219 (30-09-25)	$ 46.068.476,08	457904925 (26-11-2025)	$ 46.068.476,08
20	06-11-2025	FEC-223 (06-11-25)	$ 79.797.655,49	6785226 (21-01-2026)	$ 79.797.655,49
21	02-12-2025	FEC-224 (02-12-25)	$ 106.123.126,02	6785226 (21-01-2026)	$ 106.123.126,02
22	23-12-2025	FEC-226 (23-12-25)	$ 97.087.867,11	11449626 (27-01-2026)	$ 97.087.867,11
23	27-01-2026	FEC-227 (27-01-26)	$ 41.015.613,11	81501926 (20-03-2026)	$ 41.015.613,11
24	28-02-2026	FEC-229 (02-03-26)	$ 153.894.440,83	82264926 (20-03-2026)	$153.894.440,83

				76996426 (17-03-2026)	
25	31-03-2026	FEC-232 (02-04-26)	$ 110.924.948,82	138326026 (28-04-2026)	$ 110.924.948,82
26	30-04-2026	FEC-234 (02-05-26)	$ 87.138.317,87	185035026 (27-05-2026)	$ 87.138.317,87
27	31-05-2026	FEC-234 (04-05-26)	$ 45.079.915,25	228390326 (23-06-2026)	$ 45.079.915,25
28	30-06-2026	FEC-237 (02-07-2026) CFNC-22 (02-07-2026)	$ 29.408.506,84	287274226 (29-07-2026)	$ 29.408.506,84
29	31-07-2026	Pendiente	$ 29.665.388,84	Pendiente	Pendiente
				Total Pagos	$ 1.295.912.942,10

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Las actividades ejecutadas parte del mes de JULIO de 2026 se desarrollaron en un frente de trabajo:

1. Tres Esquinas, situada en el municipio de solano, en el departamento de Caquetá, forma parte de la guarnición del Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM-6).

El personal destacado en Tres Esquinas, desarrolla labores de una cuadrilla de pavimento rígido realizando actividades para la construcción y adecuaciones de pavimento rígido.

* Actividades diurnas: Aquellas ejecutadas entre las 06:00 horas y las 19:00 horas.
* Actividades nocturnas: Aquellas ejecutadas entre las 19:01 horas y las 05:59 horas.

Actividades realizadas en la Tres Esquinas, Caquetá:

-Traslado y organización de material
-Apoyo en labores de topografía
-Zanjado para drenaje de agua lluvia

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO

Ver formato anexo al presente informe "GA-JELOG-FR-440 - FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO".

N°	Cuadrilla	Perfiles	Unidad de Medida	Valor Unitario (Incluido IVA)	Horas trabajadas	Valor Total
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	136	$ 6.468.859,04
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	654	$ 23.196.529,80
TOTAL						**$ 29.665.388,84**

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El servicio de mano de obra de cuadrillas de personal calificado y no calificado con y sin equipos para la construcción y mantenimiento de vías y/o aeródromos pertenecientes a las guarniciones militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, es un contrato que se va ejecutando de acuerdo a la proyección de necesidades de las Unidades Militares.

Con fecha 07 de julio de 2026, el contratista envía pago de planilla de seguridad social de mes de junio 2026.

Mediante oficio No FAC-S-2026-025855-CE del 18 de julio de 2026 la supervisión solicita al contratista personal para el CACOM-4. (se anexa oficio al presente informe)

Mediante oficio No FAC-S-2026-025871-CE del 19 de julio de 2026 la supervisión solicita al contratista personal para el CACOM-6. (se anexa oficio al presente informe)

Con fecha 28 de julio de 2026 la ordenación del gasto envía al contratista oficio de aceptación de modificación del contrato en adición de recursos, extensión del plazo de ejecución, modificación de forma de pago y ampliación de garantías. (Se anexa oficio al presente informe)

Con fecha 29 de julio de 2026 el contratista envía oficio con radicado CB-038-2026 con respuesta de aceptación de la modificación del contrato.

Mediante oficio No FAC-S-2026-148601-CI del 30 de julio de 2026 la supervisión emite concepto técnico favorable a la ordenación del gasto para proceder con la modificación propuesta. (Se anexa oficio al presente informe)

Mediante oficio No FAC-S-2026-148706-CI del 30 de julio de 2026 la Ordenación del Gasto solicita a la Dirección de Compras Públicas viabilidad jurídica para proceder con el modificatorio solicitado. (Se anexa oficio al presente informe)

Con fecha 31 de julio de 2026 se autoriza la modificación del contrato en los siguientes términos:

1. Adicionar recursos por valor de $539.000.000.
2. Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.
3. Modificar de la forma de pago, así:

PAGOS PARCIALES 2026		
VALOR VIGENCIA 2026 + ADICIÓN: $ 1.332.500.000,00		
FECHA CORTE	**PAC**	**VALOR A PAGAR**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).
30 de noviembre de 2026	PAC diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 para ser canceladas en el primer trimestre del 2027.	

4. Ampliar de las garantías contractuales correspondientes.

En el presente mes de junio de 2026 no se hizo necesario el recibimiento de los ítems ponderables ofrecidos por la firma contratista.

Durante la ejecución del contrato en julio de 2026, la firma contratista ha incorporado a cuatro (04) personas, todas de origen colombiano, lo que representa el 100% de su personal. Esto cumple con el estímulo a la industria nacional, ya que en su propuesta se comprometió a destinar al menos el 90% de sus empleados o contratistas a personas colombianas. (Se anexa evidencia al presente informe)

El contratista envía soportes de liquidación del siguiente personal:

- JAVIER NIETO GARZON
- WILLIAM NIETO GARZON
- JOSE ALVARO CANO
- JOHAN OLIVARES AGUIRRE
- ISIDRO CASALLAS HERNANDEZ
- JOSE REINALDO MONTENEGRO MONTENEGRO
- JAEL LOPEZ
- CARLOS QUINTERO GUERRA
- LUIS ESPEJO LEON
- JUAN SEBASTIAN ORTEGON
- JOSE LIZCANO MONTOYA
- JHONATHAN URUEÑA LOPEZ
- EDUAR QUINTERO URUEÑA
- JUAN CAMILO URUEÑA

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Para el presente mes no se han presentado incumplimientos del contratista.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí: X No:
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002015402 Fecha Dia: 31 Mes: 01 Año: 2024 No. Soporte: 1002021219 Fecha Dia: 15 Mes: 02 Año: 2024 No. Soporte: 1002026236 Fecha Dia: 15 Mes: 03 Año: 2024 No. Soporte: 1002038135 Fecha Dia: 11 Mes: 04 Año: 2024 No. Soporte: 1002049745 Fecha Dia: 15 Mes: 05 Año: 2024 No. Soporte: 1002063115 Fecha Dia: 15 Mes: 06 Año: 2024 No. Soporte: 1002081925 Fecha Dia: 15 Mes: 07 Año: 2024 No. Soporte: 1002102053 Fecha Dia: 13 Mes: 08 Año: 2024 No. Soporte: 1002178200 Fecha Dia: 15 Mes: 12 Año: 2024 No. Soporte: 1002192520 Fecha Dia: 15 Mes: 01 Año: 2025 No. Soporte: 1002200078 Fecha Dia: 15 Mes: 02 Año: 2025 No. Soporte: 1002207441 Fecha Dia: 01 Mes: 04 Año: 2025 No. Soporte: 1002232336 Fecha Dia: 30 Mes: 04 Año: 2025 No. Soporte: 1002243734 Fecha Dia: 26 Mes: 05 Año: 2025 No. Soporte: 1002255643 Fecha Dia: 21 Mes: 06 Año: 2025 No. Soporte: 1002266271 Fecha Dia: 15 Mes: 07 Año: 2025 No. Soporte: 1002278105 Fecha Dia: 06 Mes: 08 Año: 2025 No. Soporte: 1002298063 Fecha Dia: 18 Mes: 09 Año: 2025 No. Soporte: 1002311226 Fecha Dia: 09 Mes: 10 Año: 2025 No. Soporte: 1002343787 Fecha Dia: 29 Mes: 11 Año: 2025 No. Soporte: 1002347197 Fecha Dia: 03 Mes: 12 Año: 2025 No. Soporte: 1002379538 Fecha Dia: 31 Mes:01 Año: 2026 No. Soporte: 1002384495 Fecha Dia: 06 Mes: 03 Año: 2026 No. Soporte: 1002396205 Fecha Dia: 10 Mes: 04 Año: 2026 No. Soporte: 1002415642 Fecha Dia: 08 Mes: 05 Año: 2026 No. Soporte: 1002433339 Fecha Dia: 10 Mes: 06 Año: 2026 No. Soporte: 1002448355 Fecha Dia: 14 Mes: 07 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	DIFRA
Observaciones: No aplica.	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el período evaluado correspondiente al mes de julio de 2026, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, suscrito con la firma CONSTRUCTORA BAIYITH S.A.S., cuyo objeto es la prestación del servicio de mano de obra de cuadrillas de personal calificado y no calificado para la construcción y mantenimiento de vías y/o aeródromos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Se constató que las actividades programadas fueron desarrolladas conforme a los requerimientos operacionales de la

Entidad, manteniendo personal activo en el frente de trabajo ubicado en Tres Esquinas, Caquetá, apoyando labores de construcción y adecuación de pavimento rígido.

La supervisión evidenció que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas y de seguridad social exigidas, manteniendo vigentes las garantías contractuales y presentando oportunamente la documentación soporte requerida. Durante el período no se registraron incumplimientos, novedades contractuales adversas ni materialización de riesgos que afectaran la correcta ejecución del contrato.

Adicionalmente, se adelantaron las actuaciones administrativas necesarias para la modificación contractual aprobada el 31 de julio de 2026, consistente en la adición de recursos por valor de $539.000.000, la prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026, la modificación de la forma de pago y la ampliación de las garantías correspondientes, con el propósito de atender las necesidades operacionales previstas en el CACOM-4 y CACOM-6.

A la fecha del presente informe, el contrato presenta un avance físico del 57,27% y se encuentra en ejecución, registrando cumplimiento satisfactorio de las actividades desarrolladas y de los compromisos adquiridos por el contratista. En consecuencia, esta supervisión considera procedente continuar con la ejecución contractual conforme a las condiciones vigentes, por cuanto los servicios prestados cumplen con los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO Supervisor Principal	C.C. 1.069.178.174 de Ricaurte / Cundinamarca
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No 006 del diecinueve (19) de marzo de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Firma	Ricardo Carvajal Rico	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-440
	FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO	Versión N°:	1
		Vigencia:	29/11/2024

CONTRATO No.	181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO CONTRATO	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
FECHA	31 DE JULIO DE 2026
MES DE SEGUIMIENTO LAPSO	JULIO

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---|---

REGISTRO FOTOGRAFICO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6



01 JULIO DE 2026



02 JULIO DE 2026



03 JULIO DE 2026



04 JULIO DE 2026



06 JULIO DE 2026



07 JULIO DE 2026



08 JULIO DE 2026



09 JULIO DE 2026



10 JULIO DE 2026



11 JULIO DE 2026



13 JULIO DE 2026



14 JULIO DE 2026



15 JULIO DE 2026



16 JULIO DE 2026



17 JULIO DE 2026



18 JULIO DE 2026



21 JULIO DE 2026



22 JULIO DE 2026



23 JULIO DE 2026



24 JULIO DE 2026



25 JULIO DE 2026



27 JULIO DE 2026



28 JULIO DE 2026



29 JULIO DE 2026



30 JULIO DE 2026

				
31 JULIO DE 2026				

01-07-26 Ubicacion: Tres esquina Caqueta Firma

Cuadrilla de Pavimento Rigido CACOM-6

Nombres	Cargo	Hora.	
Jair murillo Martinez	OFicial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 17:30	Eustorio
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Mantenimiento cunetas, limpieza remocion de sedimento y bano. Ura subestacion electrica.

02-07-26 Ubicacion: Tres esquina Caqueta Firma

Cuadrilla de Pavimeto Rijido - CACOM-6

Nombres	Cargo	Hora.	
Jair murillo Martinez	OFicial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 17:30	Eustorio
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST carvajal Rico kevin	supervisor	7:30 - 17:30	

Actividad - Mantenimiento cunetas limpieza y remocion de sedimento y bano ura subestacion electrica.

03-07-26 Ubicacion: Tres esquinas caqueta Firma

Cuadrilla de Pavimento Rijido - CACOM-6

Nombre	Cargo	Hora.	
Jair murillo Martinez	OFicial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 17:30	Eustorio
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudate	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST. Carvajal Rico Kevin	supervisor		

Actividad: Mantenimiento cunetas. limpieza y remocion de sedimento y bano ura subestacion electrica.

04-07-26. Ubicacion: Tres Esquinas Caqueta Firma

Escuadrilla de Pavimento Rijido. CACOM-6

Nombre	Cargo	Hora	
Jair Murillo Martinez	OFicial	7:30 - 12:30	Jair M
Eusterio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 12:30	EOSLORIO
Javier manuel Rodriguez Arrida	Ayudante	7:30 - 12:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 12:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico kevin	Supervisor		

Actividad: Mantenimiento cuneta, limpieza y remocion de borra y sedimento uno subestacion electrica.

06-07-26 Ubicacion: Tres Esquinas Caqueta Firma.

Escuadrilla de Pavimeto Rijido. CACOM-6

Nombre	Cargo	Hora	
Jair Murillo Martinez	OFicial	7:30 - 17:30	Jair M
Eusterio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 17:30	EOSLORIO
JAVier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier
FAbian Eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor		

Actividad: Mantenimiento cunetas limpieza y remocion de borra y sedimentos uno subestacion electrica.

07-07-26. Ubicacion: Tres Esquinas Caqueta. Firma

Escuadron de Pavimeto Rijido. CACOM-6

Nombre	Cargo	Hora	
Jair murillo Martinez	OFicial	7:30 - 17:30	Jair M
Eusterio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 17:30	EOSLORIO
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier
FAbian Eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico kevin	Supervisor		

Actividad: Mantenimiento cunetas limpieza, remocion de borra y sedimentos uno subestacion electrica

Powered by CamScanner

08-07-26. Ubicación: Tres esquinas Caqueta. Firma.

Escuadrilla de Pavimento Rijido. CACOM-6

Nombre	Cargo	Hora.	
Jair Murillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eusterio Arriola Bohorquez	Ayudante.	7:30 - 17:30	Eosterio.
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Mantenimiento cunetas, limpieza de sedimentos y bano via subestacion electrico.

09-07-26 Ubicacion: Tres Esquinas Caqueta Firman

Escuadrilla de Pavimento Rigido CACOM-6

Nombre	Cargo	Hora	
Jair murillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eusterio Arriola Bohorquez	Ayudante	7:30 - 17:30	Eosterio.
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Mantenimiento cunetas, limpieza de sedimentos y bano via subestacion electrico.

10-07-26. Ubicación. Tres Esquinas caqueta Firma(

Escuadrilla de Pavimento Rijid CACOM-6

Nombre	Cargo	Hora	
Jair murillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eusterio Arriola Bohorquez	Ayudante	7:30 - 17:30	Eosterio.
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Mantenimiento cunetas limpieza de sedimentos y bano via subestacion electrico.

Powered by CamScanner

11-07-26 Ubicacion Tres Esquinas Caqueta Firma
Escuadrilla de Pavimento Rijido CAcot-6

Nombre	Cargo	Hora	
Jair murillo Martinez	Oficial	7:30 - 12:30	Jair M
Gustavo Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 12:30	Gustavo
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 12:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 12:30	Fabian Perez

ST Carvajal Rico Kevin Supervisor
Actividad: Mantenimiento cunetas, limpieza de sedimentos y barro via subestacion electrica.

13-07-26 ubicacion Tres Esquinas Caqueta Firma
Escuadrilla de Pavimento Rijido CAcot-6

Nombre	Cargo	Hora	
Jair murillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Gustavo Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 17:30	Gustavo
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
fabian Eduardo Perez sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez

ST Carvajal Rico Kevin Supervisor
Actividad: Mantenimiento cunetas, limpieza de sedimento y barro via subestacion electrica.

14-07-26 Ubicacion: Tres Esquinas Caqueta Firma
Escuadrilla de Pavimento Rijido CAcot-6

Nombre	Cargo	Hora	
Jair murillo martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Gustavo Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 17:30	Gustavo
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	7:30 - 17:30	Javier R
fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	7:30 - 17:30	fabian Perez

ST Carvajal Rico Kevin Supervisor
Actividad: Mantenimiento cunetas limpieza de sedimento y barro via subestacion electrica.

Powered by CamScanner

15-07-26 Ubicacion Tres Esquinas Caqueta Firma
Escuadrilla de Pavimento Rijido CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	
Jair murillo Martinez	Oficial	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30 - 17:30	EOSTORGIO
Javier manuel Rodriguez Arriola	Ayudnte	7:30 - 17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudnte	7:30 - 17:30	fabian Perez
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Mantenimiento cunetas limpieza de Sedimentos y barrido subestacion electrico.

Fecha: 16/07/2026 Ubicacion: Tres Esquinas, Caqueta Solano
Cuadrilla: Pavimento rigido Guarnicion: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Murillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	No asistio
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	EOSTORGIO
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	07:30-17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	fabian Perez
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Mantenimiento cunetas limpieza de Sedimentos y barrido subestacion electrico.

Fecha: 17/07/2026 Ubicacion: Tres Esquinas, Caqueta
Cuadrilla: Pavimento Rigido Guarnicion: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Murillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	No asistio
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	EOSTORGIO
Javier Manuel Rodriguez Arriola	Ayudante	07:30-17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	fabian Perez
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Zanjeado y conduccion agua lluvia via perimetral.

Fecha: 18/07/2026 Ubicacion: Tres Esquinas, Caqueta
Cuadrilla: Pavimento Rigido Guarnicion: CACOM-6

Powered by CamScanner

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Murillo Martinez	Oficial	07:30-12:30	No asistió, ecostovigi
Eustorgio Arrola Blanquicet	Ayudante	07:30-12:30	ecostovigi
Javier Manuel Rodriguez Arrola	Ayudante	07:30-12:30	Javier R.
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-12:30	fabian Perez
ST. Conrado Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Zanjado y conduccion de agua lluvia en vía perimetral.

Fecha: 21/07/2026 Ubicacion: Tres Esquinas, Caqueta'
Cuadrilla: Pavimento Rigido Guarnicion: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Murillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	No asistió, ecostovigi
Eustorgio Arrola Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	
Javier Manuel Rodriguez Arrola	Ayudante	07:30-17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	fabian Perez
ST. Conrado Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Zanjado y conduccion agua lluvia en vía perimetral.

Fecha: 22/07/2026 Ubicacion: Tres Esquinas, Caqueta'
Cuadrilla: Pavimento Rigido Guarnicion: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Murillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	No asistió, ecostovigi
Eustorgio Arrola Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	
Javier Manuel Rodriguez Arrola	Ayudante	07:30-17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	fabian Perez
ST. Conrado Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Apoyo limpieza de cajas sanitarias en excavacion de banca de vía.

Fecha: 23/07/2026 Ubicacion: Tres Esquinas, Caqueta'
Cuadrilla: Pavimento Rigido Guarnicion: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Murillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	No asistió

Powered by CamScanner

Eustorgio Arnolo Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	Eustorgio
Jovanni Manuel Rodriguez Arnolo	Ayudante	07:30-17:30	Jovanni M
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	fabian Perez
ST. Cowgal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Apoyo en actividades de topografia para construccion de via perimetral.

Fecha: 24/07/2026 Ubicacion: Tres Esquinas, Caqueta
Cuadrilla: Pavimento Rigido Guarnicion: CACOR-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Murillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	No asistio
Jovanni Manuel Rodriguez Arnolo	Ayudante	07:30-17:30	Jovanni R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	fabian Perez
ST. Cowgal Rico Kevin	Supervisor	07:30-17:30	
- Eustorgio Arnolo Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	Eustorgio

Actividad: Apoyo en actividades de topografia para construccion de via perimetral.

Fecha: 25/07/2026 Ubicacion: Tres Esquinas, Caqueta
Cuadrilla: Pavimento Rigido Guarnicion: CACOR-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Murillo Martinez	Oficial	07:30-12:30	No asistio
Jovanni Manuel Rodriguez Arnolo	Ayudante	07:30-12:30	Jovanni R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-12:30	fabian Perez
Eustorgio Arnolo Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	Eustorgio
ST. Cowgal Rico Kevin	Supervisor		

Actividad: Apoyo en actividades de topografia para construccion de via perimetral.

Fecha: 27/07/2026 Ubicacion: Tres Esquinas, Caqueta
Cuadrilla: Pavimento Rigido Guarnicion: CACOR-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Murillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	No asistio
Jovanni Manuel Rodriguez Arnolo	Ayudante	07:30-17:30	Jovanni R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	fabian Perez

Powered by CamScanner

Eustagio Arnulo Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	Eustagio
ST. Conejal Rio Kevin	Supervisor		

Actividad: Construcción andén a listamiento de suelo.

Fecha: 28/07/2026 Ubicación: Tres Esquinas, Coqueté
Cuadrilla: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Trujillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	No asistió
Javier Manuel Rodriguez Arnolo	Ayudante	07:30-17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	Fabian Perez
Eustagio Arnulo Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	Eustagio
ST. Conejal Rio Kevin	Supervisor		

Actividad: Alistamiento, excavación y compactación de anden.

Fecha: 29/07/2026 Ubicación: Tres Esquinas, Coqueté
Cuadrilla: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Trujillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	Jair M
Javier Manuel Rodriguez Arnolo	Ayudante	07:30-17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	Fabian Perez
Eustagio Arnulo Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	Eustagio
ST. Conejal Rio Kevin	Supervisor		

Actividad: Construcción y fundida de anden.

Fecha: 30/07/2026 Ubicación: Tres Esquinas, Coqueté
Cuadrilla: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Trujillo Martinez	Oficial	07:30-17:30	Jair M
Javier Manuel Rodriguez Arnolo	Ayudante	07:30-17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	Fabian Perez
Eustagio Arnulo Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	
ST. Conejal Rio Kevin	Supervisor		

Powered by CamScanner

Actividad: Fundido de anden.

Fecha: 31/07/2026 Ubicación: Tres Esquinas, Caquetá
Cuadrillo: Pavimento Rígido Comisión: CACOL-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Jair Carlos Molinares	Oficial	07:30-17:30	Jair M
Javier Daniel Rodriguez Arnedo	Ayudante	07:30-17:30	Javier R
Fabian Eduardo Perez Sarmiento	Ayudante	07:30-17:30	fabian Perez
Eustorgio Arnedo Blanquicet	Ayudante	07:30-17:30	EGSTORGO
Sr. Consejo Rico Kean	Operador		

Actividad: Fundido de anden.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900509251	3	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 77 # 59-36 Of 1001	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3131933	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	513518509	9508610756	N	2026/07/14	2026/07/27	BANCO DAVIVIENDA	13	$455,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAQUETA (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800
Centro de Trabajo: TRES ESQUINAS - CAQUETÁ (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800
Ciudad: SOLANO Depto: CAQUETA (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800
1	CC	1101384282	ARRIOLA EUSTORGIO								A			▫	▫						230301	30	($1,750,905)	($280,200)	ESSC07	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
2	CC	1101384282	ARRIOLA EUSTORGIO								C										230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1129529189	MURILLO JAIR								A			▫	▫						231001	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS037	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
4	CC	1129529189	MURILLO JAIR								C										231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1007162715	PEREZ FABIAN								A			▫	▫						230301	30	($1,750,905)	($280,200)	ESSC24	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
6	CC	1007162715	PEREZ FABIAN								C										230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	9022233	RODRIGUEZ JAVIER								A			▫	▫						231001	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS002	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
8	CC	9022233	RODRIGUEZ JAVIER								C										231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(4)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$450,800	$4,300	$0	$455,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$450,800	$4,300	$0	$455,100
TOTAL				4	$450,800	$4,300	$0	$455,100

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Fecha, 07 de julio del 2026

Señores:
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
Bogotá D.C.

Ref.: CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Cordial Saludo,

El suscrito EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO, en calidad de Representante Legal de CONSTRUCTORA BAYITH SAS, identificada con Nit No.900.509.251-3, certifica que la empresa CONSTRUCTORA BAYITH SAS se encuentra PAZ Y SALVO durante los últimos seis (06) meses por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, por lo tanto; a fecha de 04 de junio de 2026, CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.,se encuentra al día con las obligaciones.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	**PERSONA NATURAL**		**PERSONA JURÍDICA**	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (**X**)	No ()

Cordialmente,

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal
C.C 72.274.612 De Barranquilla

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. NIT 900.509.251-3

CONSTRUCTORA GILGAL
NIT 901.688.961-4

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SARA PATRICIA HERNÁNDEZ SAUCEDO identificada con CC 44.153.989, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCTORA GILGAL SAS identificada con NIT 901.688.961-4, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estamos obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 30 días del mes de Junio de 2026.

SARA PATRICIA HERNÁNDEZ SAUCEDO
Representante Legal
CONSTRUCTORA GILGAL SAS
NIT 901.688.961-4

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900509251	3	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 77 # 59-36 Of 1001	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3131933	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	459162885	9507638924	N	2026/06/12	2026/07/07	BANCO DAVIVIENDA	25	$459,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAQUETA (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800
Centro de Trabajo: TRES ESQUINAS - CAQUETÁ (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800
Ciudad: SOLANO Depto: CAQUETA (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800
1	CC	1101384282	ARRIOLA EUSTORGIO								A			▫	▫						230301	30	($1,750,905)	($280,200)	ESSC07	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
2	CC	1101384282	ARRIOLA EUSTORGIO								C										230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1129529189	MURILLO JAIR								A			▫	▫						231001	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS037	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
4	CC	1129529189	MURILLO JAIR								C										231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1007162715	PEREZ FABIAN								A			▫	▫						230301	30	($1,750,905)	($280,200)	ESSC24	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
6	CC	1007162715	PEREZ FABIAN								C										230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	9022233	RODRIGUEZ JAVIER								A			▫	▫						231001	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS002	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
8	CC	9022233	RODRIGUEZ JAVIER								C										231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(4)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$450,800	$8,300	$0	$459,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$450,800	$8,300	$0	$459,100
TOTAL				4	$450,800	$8,300	$0	$459,100

FAC-S-2026-025855-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-025855-CE del 18 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSOP-ASOIN

Señor
EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Representante Legal
Calle 77 # 59-35 OF 10013003961584
Barranquilla, Atlántico

Contraseña:yp4yC20y80

Asunto: Solicitud personal cuadrilla pavimento rígido CACOM-4 (ajuste fecha de inicio)

En atención al oficio No. FAC-S-2026-022232-CE del 19 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DIFRA-SUSOP-ASOIN, mediante el cual se solicitó la consecución de personal para una cuadrilla de pavimento rígido en el Comando Aéreo de Combate No. 4, y en el marco del contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, cuyo objeto es “EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y/O AERÓDROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITARES DE LA FAC”, me permito informar que la necesidad del personal requerido se mantiene, realizando el siguiente ajuste en la fecha de inicio:

Lugar: Melgar, Tolima
Guarnición: Comando Aéreo de Combate No. 4
Cuadrilla: Pavimento rígido
Cantidad oficiales: Uno (01)
Cantidad ayudantes: Cuatro (04)
Tiempo: Cuatro (04) meses aproximadamente a partir del 03 de agosto de 2026

Lo anterior, con el fin de dar inicio a las labores de mantenimiento en el aeródromo del CACOM-4 conforme a la programación actualizada del proyecto.

Agradezco se adelanten las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad del personal en la fecha indicada.

Atentamente,



Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
Especialista Soporte Ingeniería

Supervisor principal CTO 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Anexo: N/A
ST. CARVAJAL / ASOIN

Elaboró: ST. CARVAJAL / ASOIN Revisó: ST. CARVAJAL / ASOIN Aprobó:ST. CARVAJAL / ASOIN

FAC-S-2026-025871-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-025871-CE del 19 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSOP-ASOIN

Señor
EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Representante Legal
Calle 77 # 59-35 OF 1001
Barranquilla, Atlántico

Contraseña:gDtavgPedy

Asunto: Solicitud personal cuadrilla CACOM-6

En el marco del contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, cuyo objeto es “EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y/O AERÓDROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITARES DE LA FAC”, me permito solicitar al señor Representante Legal de la firma contratista CONSTRUCTORA BAYITHS.A.S la consecución del personal para una cuadrilla en los siguientes términos:

Lugar: Tres Esquinas, Caquetá
Guarnición: Comando Aéreo de Combate No. 6
Cuadrilla: Pavimento rígido
Cantidad oficiales: siete (07)
Cantidad ayudantes: Tres (03)
Tiempo: Cuatro (04) meses aproximadamente a partir del 19 de agosto de 2026

Lo anterior, con el fin de apoyar las labores de construcción de la vía perimetral de la Unidad.

Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
Especialista Soporte Ingeniería

Supervisor principal contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Anexo: N/A
ST. CARVAJAL / ASOIN

Elaboró: ST. CARVAJAL / ASOIN Revisó: ST. CARVAJAL / ASOIN Aprobó:ST. CARVAJAL / ASOIN

FAC-S-2026-027080-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-027080-CE del 28 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA

Señor
EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Representante Legal
Calle 77 # 59-35 OF 1001
Barranquilla, Atlántico

Contraseña:xvFI6e9ApM

Asunto: Solicitud de aceptación de modificación contractual No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

En el marco del Contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, suscrito entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S., cuyo objeto corresponde a la “Prestación del servicio de mano de obra de cuadrillas de personal calificado y no calificado, con y sin equipos, para la construcción y mantenimiento de vías y/o aeródromos pertenecientes a las guarniciones militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, de manera atenta me permito solicitar su aceptación respecto de la modificación contractual propuesta, la cual comprende los siguientes aspectos:

1. Adicionar el valor del contrato por una suma de quinientos treinta y nueve millones ($ 539.000.000).

2. Prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el 30 de noviembre de 2026.

3. Modificar la forma de pago así:

PAGOS PARCIALES 2026
VALOR VIGENCIA 2026 CON VALOR DE ADICIÓN: $ 1.332.500.000,00

FECHA CORTE	PAC	VALOR A PAGAR
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).
30 de noviembre de 2026	PAC diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 para ser canceladas en el primer trimestre de 2027.	

4. Ampliar la vigencia y actualizar los valores asegurados de las garantías constituidas, de conformidad con las modificaciones efectuadas al valor y plazo contractual, en los términos establecidos por la normatividad vigente y las condiciones pactadas en el contrato.

Justificación:

Durante la vigencia 2026 la Dirección de Infraestructura ha puesto en marcha frentes de trabajo de alta importancia estratégica, entre los cuales se destacan la construcción de una vía perimetral en el Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM 6) y la construcción de infraestructura aeroportuaria en el Comando Aéreo de Combate No. 4 (CACOM 4). Estos proyectos demandan una capacidad operativa superior a la inicialmente prevista y requieren personal adicional para cumplir los cronogramas establecidos y las metas institucionales fijadas para la presente vigencia.

En este sentido, los recursos disponibles y el plazo actualmente vigente del contrato resultan insuficientes para atender la totalidad de las necesidades operativas derivadas de los nuevos frentes de obra que se encuentran en ejecución. Por lo tanto, se hace necesario adicionar recursos y ampliar el plazo contractual, con el fin de garantizar la continuidad ininterrumpida de las actividades constructivas, evitar retrasos en los cronogramas de ejecución y asegurar el cumplimiento de los objetivos del plan de fortalecimiento de la infraestructura aeronáutica militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La modificación propuesta permitirá mantener la disponibilidad de cuadrillas de personal idóneo y con experiencia comprobada, optimizando los tiempos de ejecución, reduciendo riesgos asociados a procesos de selección y entrenamiento de nuevo personal, mejorando los niveles de productividad y asegurando la correcta ejecución técnica de las actividades contratadas.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que la modificación planteada contribuye directamente al cumplimiento de los fines institucionales y a la continuidad de los proyectos de infraestructura actualmente en ejecución, se solicita respetuosamente manifestar por escrito su aceptación a la presente modificación contractual, con el propósito de adelantar los trámites administrativos correspondientes.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,



Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Director Infraestructura

Ordenador del gasto

Anexo: N/A
ST. CARVAJAL / ASOIN; CT. CALDERON / AROPI; TC. BARRAGAN / SUSOP; MY. HERNANDEZ / ASOIN; TE. DIAZ / AROPI

Elaboró: ST. CARVAJAL / ASOIN Revisó: CT. CUADROS / ARESU Aprobó:CR. SILVA / DIFRA

BAYITH
CONSTRUCTORA
NIT 900.509.251-3

Barranquilla, 29 julio de 2026. CB-038-2026

Señores:
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Aten.: Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Directora de Infraestructura
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1 AL CONTRATO No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023.

Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal de CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S., procedo a dar respuesta a su comunicación con radicado No. FAC-S-2026-027080-CE, fechada el 28 de julio de 2026, mediante la cual la Fuerza Aeroespacial Colombiana solicita nuestra aceptación formal para la modificación del Contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y/O AERÓDROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA".

Al respecto, me permito manifestar que CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S., ACEPTA INTEGRALMENTE la propuesta de modificación en los términos planteados por la Dirección de Infraestructura, los cuales comprenden:

1) ***Adición al valor del contrato***: Se acepta la adición al valor del contrato por una suma de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($539.000.000).

2) ***Prórroga del plazo de ejecución***: Se acepta la extensión del plazo hasta el 30 de noviembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de los frentes de trabajo estratégicos en el Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM 6) y el Comando Aéreo de Combate No. 4 (CACOM 4).

3) ***Modificación de la forma de pago***: Se aceptan las condiciones de pagos parciales para la vigencia 2026 con valor de adición, por la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.332.500.000,00), con fechas de corte al último día de cada mes y pagos sujetos a la programación del PAC de diciembre 2026 y/o primer trimestre de 2027, conforme a los documentos de radicación y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

Esta aceptación se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad que rige la contratación estatal, el cual permite que las partes, de común acuerdo, modifiquen las estipulaciones contractuales para asegurar el cumplimiento de los fines estatales.

Coincidimos en que esta prórroga es necesaria para evitar afectaciones en los cronogramas de obra y asegurar el fortalecimiento de la infraestructura aeronáutica militar.

Quedamos atentos a la remisión del documento modificatorio (Otrosí) para proceder con su firma y trámite legal.

Cordialmente,

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal
CC 72.274.612
CONSTRUCTORA BAYITH SAS

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
NIT. 900.509.251-3

FAC-S-2026-148601-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-148601-CI del 30 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSOP-ASOIN

Señora Coronel
MARIBEL SILVA BARRERA
Director Infraestructura
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto técnico modificación contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

En mi calidad de supervisor principal del contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, suscrito entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la sociedad CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S., cuyo objeto corresponde a la "Prestación del servicio de mano de obra de cuadrillas de personal calificado y no calificado, con y sin equipos, para la construcción y mantenimiento de vías y/o aeródromos pertenecientes a las guarniciones militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana", respetuosamente me permito emitir concepto técnico favorable respecto de la modificación contractual propuesta a la señora Coronel Director de Infraestructura y Ordenador del Gasto.

Lo anterior, considerando que mediante comunicación No. FAC-S-2026-027080-CE del 28 de julio de 2026 se solicitó al contratista su aceptación para efectuar una modificación contractual consistente en:

1. Adición de recursos por valor de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($539.000.000).

2. Prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.

3. Modificación de la forma de pago para la vigencia 2026 conforme a la programación financiera establecida por la Dirección de Infraestructura.

4. Ampliación y actualización de las garantías contractuales de acuerdo con el nuevo valor y plazo del contrato.

Así mismo, mediante oficio CB-038-2026 del 29 de julio de 2026, el contratista CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. manifestó su aceptación integral de las condiciones propuestas para la modificación contractual.

De acuerdo con la programación actualizada de mano de obra y la planeación de los proyectos de infraestructura que se ejecutan en el Comando Aéreo de Combate No. 4 (CACOM-4) y el Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM-6), se evidencia la necesidad de mantener y ampliar la disponibilidad de cuadrillas de personal especializado para garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

La información consolidada de programación y proyección financiera permite establecer que los recursos actualmente disponibles en el contrato resultan suficientes únicamente hasta el mes de septiembre de 2026, presentándose posteriormente un déficit presupuestal derivado del incremento de actividades programadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Particularmente, las obras en ejecución demandan un aumento significativo en la disponibilidad de personal de mano de obra calificada y no calificada, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, especialmente para las actividades asociadas a la construcción de infraestructura aeroportuaria en CACOM-4 y a la construcción de la vía perimetral en CACOM-6, proyectos considerados prioritarios para el fortalecimiento de la infraestructura estratégica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Del análisis efectuado a la programación de obra y a la proyección de costos, se concluye que la adición por valor de $539.000.000 permite cubrir las necesidades previstas de personal hasta el 30 de noviembre de 2026, garantizando la continuidad operativa de los frentes de trabajo y evitando afectaciones a los cronogramas de ejecución.

La extensión del plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2026 resulta técnica y administrativamente necesaria, toda vez que las actividades programadas en CACOM-4 y CACOM-6 superan el plazo actualmente vigente del contrato. La prórroga permitirá asegurar la continuidad del personal requerido sin interrupciones que puedan generar retrasos en la ejecución de las obras y afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La adición presupuestal solicitada se encuentra debidamente sustentada en la programación de mano de obra proyectada para los meses restantes de ejecución, evidenciándose que el

valor adicional requerido corresponde a las necesidades reales de personal derivadas del incremento de actividades constructivas en los proyectos mencionados.

La modificación de la forma de pago resulta procedente y coherente con la programación financiera de la Entidad y con la dinámica de ejecución del contrato, permitiendo efectuar pagos parciales conforme a la prestación efectiva del servicio, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

Como consecuencia del incremento del valor contractual y de la ampliación del plazo de ejecución, se considera indispensable la actualización y ampliación de las garantías contractuales, con el fin de mantener la cobertura adecuada de los riesgos amparados durante toda la vigencia del contrato y su período adicional de cobertura.

En mérito de lo expuesto, me permito emitir CONCEPTO FAVORABLE para la modificación del contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, consistente en:

1. Adicionar recursos por valor de $539.000.000,00.
2. Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.
3. Modificar de la forma de pago, así:

<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES 2026</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR VIGENCIA 2026 + ADICIÓN: $ 1.332.500.000,00</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td></tr>
<tr><td>30 de noviembre de 2026</td><td>PAC diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 para ser canceladas en el</td></tr>
</table>

	primer trimestre del 2027.	

4. Ampliar de las garantías contractuales correspondientes.

Atentamente,



Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
Especialista Soporte Ingeniería

Supervisor principal contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Anexo: Programación de obra y proyección de mano de obra en formato PDF
TC. BARRAGAN / SUSOP; MY. HERNANDEZ / ASOIN; CT. CALDERON / AROPI; TE. DIAZ / AROPI; ST. CARVAJAL / ASOIN

Elaboró: ST. CARVAJAL / ASOIN Revisó: ST. CARVAJAL / ASOIN Aprobó:ST. CARVAJAL / ASOIN

PROGRAMACIÓN PROYECTO COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4

PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PISTA CACOM-4 (FASE NORTE)				
	ACTIVIDAD PRINCIPAL	**FECHA INICIO**	**FECHA FINALIZACIÓN**	**ESTADO**
1	PRELIMINARES	21/07/2026	12/01/2027	EN EJECUCIÓN
2	BASES Y RELLENOS	14/09/2026	18/01/2027	PENDIENTE
3	PAVIMENTO HIDRÁULICO	23/11/2026	27/05/2027	PENDIENTE
4	NIVELACIÓN ZONAS SEGURIDAD	27/02/2027	6/05/2027	PENDIENTE
5	SEÑALIZACIÓN	16/04/2027	26/06/2027	PENDIENTE
6	ASEO DE OBRA	26/06/2027	9/07/2027	PENDIENTE



PROGRAMACIÓN PROYECTO COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6

CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN VÍA PERIMETRAL CACOM-6 (TRAMO 1)				
	ACTIVIDAD PRINCIPAL	**FECHA INICIO**	**FECHA FINALIZACIÓN**	**ESTADO**
1	PRELIMINARES	20/05/2026	26/06/2026	FINALIZADO
2	EXCAVACIÓN	26/06/2026	20/07/2026	EN EJECUCIÓN
3	AFIRMADO MATERIAL	29/06/2026	16/10/2026	EN EJECUCIÓN
4	PAVIMENTO HIDRÁULICO	21/09/2026	17/11/2026	PENDIENTE
5	OBRAS DE ARTE	13/10/2026	18/12/2026	PENDIENTE
6	DEMARCACIÓN	18/11/2026	19/12/2026	PENDIENTE

CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN VÍA PERIMETRAL CACOM-6 (TRAMO 1)									
	ACTIVIDAD PRINCIPAL	**2026**							
		MAY	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	PRELIMINARES								
2	EXCAVACIÓN								
3	AFIRMADO MATERIAL								
4	PAVIMENTO HIDRÁULICO								
5	OBRAS DE ARTE								
6	DEMARCACIÓN								

VoBo. Mayor Hernandez Carranza Edwin Guillermo
Subdirector de Soporte y Operaciones de Ingeniería (E)
Dirección de Infraestructura

PROYECCIÓN MANO DE OBRA 2026

EJECUTADO MES FEBRERO

| N° | HORARIO | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---

EJECUTADO MES JUNIO 2026

| N° | HORARIO | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | | | | | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---

PROYECCIÓN MES SEPTIEMBRE 2026

N°	HORARIO	LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL HORAS DIURNAS	TOTAL HORAS NOCTURNAS	TOTAL HORAS
				M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M			
				D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N			
1	08:00 - 17:00	MELGAR - MAÑANA	OFICIAL	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
2	08:00 - 17:00		OFICIAL	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
3	08:00 - 17:00		AYUDANTE																												8	8	8	23,727722	0	23,72772181
4	08:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
5	08:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
6	08:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
7	17:00 - 01:00	MELGAR - NOCHE - MADRUGADA	OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
8	17:00 - 01:00		OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
9	17:00 - 01:00		OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
10	17:00 - 01:00		OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
11	17:00 - 01:00		OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
12	17:00 - 01:00		AYUDANTE	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
13	17:00 - 01:00		AYUDANTE	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
14	17:00 - 01:00		AYUDANTE	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
15	01:00 - 09:00	MELGAR - MADRUGADA	OFICIAL	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	66	110	176
16	01:00 - 09:00		AYUDANTE	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	66	110	176
17	08:00 - 17:00	TQS - MAÑANA	OFICIAL	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
18	08:00 - 17:00		OFICIAL	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
19	08:00 - 17:00		AYUDANTE																												8	8	8	24	0	24
20	08:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
21	08:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
22	08:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	196	0	196
23	17:00 - 01:00	TQS - NOCHE - MADRUGADA	OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
24	17:00 - 01:00		OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
25	17:00 - 01:00		OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
26	17:00 - 01:00		OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
27	17:00 - 01:00		OFICIAL	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
28	17:00 - 01:00		AYUDANTE	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
29	17:00 - 01:00		AYUDANTE	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
30	17:00 - 01:00		AYUDANTE	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	42	154	196
31	01:00 - 09:00	TQS - MADRUGADA	OFICIAL	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	66	110	176
32	01:00 - 09:00		AYUDANTE	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	66	110	176
																																	TOTAL	**2943,7277**	**2904**	**5847,727722**

PROYECCIÓN MES OCTUBRE 2026

N°	HORARIO	LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL HORAS DIURNAS	TOTAL HORAS NOCTURNAS	TOTAL HORAS
				J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S			
				D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N			
1	07:00 - 17:00	MELGAR - MAÑANA	OFICIAL	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
2	07:00 - 17:00		OFICIAL	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
3	07:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
4	07:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
5	07:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
6	07:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
7	07:00 - 17:00	MELGAR - NOCHE - MADRUGADA	OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
8	07:00 - 17:00		OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
9	07:00 - 17:00		OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
10	07:00 - 17:00		OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
11	07:00 - 17:00		OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
12	07:00 - 17:00		AYUDANTE	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
13	07:00 - 17:00		AYUDANTE	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
14	07:00 - 17:00		AYUDANTE	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
15	07:00 - 17:00	MELGAR - MADRUGADA	OFICIAL	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	69	115	184
16	01:00 - 09:00		AYUDANTE	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	69	115	184
17	07:00 - 17:00	TQS - MAÑANA	OFICIAL	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
18	07:00 - 17:00		OFICIAL	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
19	07:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
20	07:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
21	07:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
22	07:00 - 17:00		AYUDANTE	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5	193	0	193
23	07:00 - 17:00	TQS - NOCHE - MADRUGADA	OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
24	07:00 - 17:00		OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
25	07:00 - 17:00		OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
26	07:00 - 17:00		OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
27	07:00 - 17:00		OFICIAL	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
28	07:00 - 17:00		AYUDANTE	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
29	07:00 - 17:00		AYUDANTE	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
30	07:00 - 17:00		AYUDANTE	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5	46	147	193
31	07:00 - 17:00	TQS - MADRUGADA	OFICIAL	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	69	115	184
32	07:00 - 17:00		AYUDANTE	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	69	115	184
																																		TOTAL	**3066**	**2697**	**5763**

PROYECCIÓN MES NOVIEMBRE 2026

N°	HORARIO	LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL HORAS DIURNAS	TOTAL HORAS NOCTURNAS	TOTAL HORAS
				D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L			
				D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N			
1	08:00 - 17:00	MELGAR - MAÑANA	OFICIAL			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
2	08:00 - 17:00		OFICIAL			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
3	08:00 - 17:00		AYUDANTE			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
4	08:00 - 17:00		AYUDANTE			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
5	08:00 - 17:00		AYUDANTE			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
6	08:00 - 17:00		AYUDANTE			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
7	17:00 - 01:00	MELGAR - NOCHE - MADRUGADA	OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
8	17:00 - 01:00		OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
9	17:00 - 01:00		OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
10	17:00 - 01:00		OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
11	17:00 - 01:00		OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
12	17:00 - 01:00		AYUDANTE			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
13	17:00 - 01:00		AYUDANTE			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
14	17:00 - 01:00		AYUDANTE			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
15	01:00 - 09:00	MELGAR - MADRUGADA	OFICIAL			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			60	100	160
16	01:00 - 09:00		AYUDANTE			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			60	100	160
17	08:00 - 17:00	TQS - MAÑANA	OFICIAL			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
18	08:00 - 17:00		OFICIAL			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
19	08:00 - 17:00		AYUDANTE			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
20	08:00 - 17:00		AYUDANTE			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
21	08:00 - 17:00		AYUDANTE			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
22	08:00 - 17:00		AYUDANTE			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5			8	8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	172	0	172
23	17:00 - 01:00	TQS - NOCHE - MADRUGADA	OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
24	17:00 - 01:00		OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
25	17:00 - 01:00		OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
26	17:00 - 01:00		OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
27	17:00 - 01:00		OFICIAL			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
28	17:00 - 01:00		AYUDANTE			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
29	17:00 - 01:00		AYUDANTE			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
30	17:00 - 01:00		AYUDANTE			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5			1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	1 7	1 7	1 7	1 7	5		1 7	39	133	172
31	01:00 - 09:00	TQS - MADRUGADA	OFICIAL			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			60	100	160
32	01:00 - 09:00		AYUDANTE			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			3 5	3 5	3 5	3 5	3 5			60	100	160
																																TOTAL				
																																2928	**2528**	**5456**

feb-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1						
3	ASFALTO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 40.722,71	1418	$ 57.744.802,78
4		AYUDANTE	H.H.	$ 33.230,13	1469	$ 48.815.060,97
7	ASFALTO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 50.912,44	59,5	$ 3.029.290,18
8		AYUDANTE	H.H.	$ 40.799,64	55	$ 2.243.980,20
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	232	$ 11.035.112,48
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	928	$ 32.914.953,60
TOTAL						**$ 155.783.200,21**

mar-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1						
3	ASFALTO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 40.722,71	1134	$ 46.179.553,14
4		AYUDANTE	H.H.	$ 33.230,13	1323	$ 43.963.461,99
7	ASFALTO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 50.912,44	0	$ -
8		AYUDANTE	H.H.	$ 40.799,64	0	$ -
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	209	$ 9.941.114,26
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	836	$ 29.651.833,20
TOTAL						**$ 129.735.962,59**

abr-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1						
3	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 42.404,66	200	$ 8.480.932,00
4		AYUDANTE	H.H.	$ 31.884,57	600	$ 19.130.742,00
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	200	$ 9.513.028,00
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	600	$ 21.281.220,00
TOTAL						**$ 58.405.922,00**

may-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1						
3	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 40.722,71	40	$ 1.628.908,40
4		AYUDANTE	H.H.	$ 33.230,13	120	$ 3.987.615,60
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	196	$ 9.322.767,44
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	588	$ 20.855.595,60
TOTAL						**$ 35.794.887,04**

jun-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4						
3	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 42.404,66	0	$ -
4		AYUDANTE	H.H.	$ 31.884,57	0	$ -
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	191	$ 9.084.941,74
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	573	$ 20.323.565,10
TOTAL						**$ 29.408.506,84**

jul-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4						
3	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 42.404,66	0	$ -
4		AYUDANTE	H.H.	$ 31.884,57	0	$ -
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	218	$ 10.369.200,52
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	654	$ 23.196.529,80
TOTAL						**$ 33.565.730,32**

ago-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 42.404,66	596	$ 25.273.177,36
2		AYUDANTE	H.H.	$ 31.884,57	651	$ 20.756.855,07
5	CONCRETO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 53.194,76	760	$ 40.428.017,60
6		AYUDANTE	H.H.	$ 38.992,49	361	$ 14.076.288,89
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	596	$ 28.348.823,44
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	651	$ 23.090.123,70
5	CONCRETO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 60.150,32	760	$ 45.714.243,20
6		AYUDANTE	H.H.	$ 43.821,11	361	$ 15.819.420,71
TOTAL						**$ 213.506.949,97**

sep-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 42.404,66	668	$ 28.326.312,88
2		AYUDANTE	H.H.	$ 31.884,57	804	$ 25.626.512,81
5	CONCRETO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 53.194,76	880	$ 46.811.388,80
6		AYUDANTE	H.H.	$ 38.992,49	572	$ 22.303.704,28
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	668	$ 31.773.513,52
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	804	$ 28.516.834,80
5	CONCRETO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 60.150,32	880	$ 52.932.281,60
6		AYUDANTE	H.H.	$ 43.821,11	572	$ 25.065.674,92
TOTAL						**$ 261.356.223,61**

oct-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 42.404,66	685	$ 29.047.192,10
2		AYUDANTE	H.H.	$ 31.884,57	979	$ 31.214.994,03
5	CONCRETO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 53.194,76	850	$ 45.215.546,00
6		AYUDANTE	H.H.	$ 38.992,49	556	$ 21.679.824,44
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	685	$ 32.582.120,90
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	979	$ 34.723.857,30
5	CONCRETO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 60.150,32	850	$ 51.127.772,00
6		AYUDANTE	H.H.	$ 43.821,11	556	$ 24.364.537,16
TOTAL						**$ 269.955.843,93**

nov-26						
N°	**Cuadrilla**	**Perfiles**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario (Incluido IVA)**	**Horas trabajadas**	**Valor Total**
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 42.404,66	599	$ 25.400.391,34
2		AYUDANTE	H.H.	$ 31.884,57	865	$ 27.580.153,05
5	CONCRETO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 53.194,76	765	$ 40.693.991,40
6		AYUDANTE	H.H.	$ 38.992,49	499	$ 19.457.252,51
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 47.565,14	599	$ 28.491.518,86
2		AYUDANTE	H.H.	$ 35.468,70	865	$ 30.680.425,50
5	CONCRETO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 60.150,32	765	$ 46.014.994,80
6		AYUDANTE	H.H.	$ 43.821,11	499	$ 21.866.733,89
TOTAL						**$ 240.185.461,35**

MES	VALOR	SALDO	OBSERVACIÓN
FEBRERO	$ 153.894.440,83	$ 752.121.897,96	Los recursos actuales del contrato son suficientes para atender las necesidades de acuerdo a la programación de personal, en concordancia con la programación de obra hasta el 26 de septiembre 2026. La adición por $539.000.000,00 son suficientes para atender las necesidades de personal, en concordancia con la programación de obra hasta el 30 de noviembre de 2026.
MARZO	$ 110.924.948,82	$ 641.196.949,14	
ABRIL	$ 87.138.317,87	$ 554.058.631,27	
MAYO	$ 45.079.915,25	$ 508.978.716,02	
JUNIO	$ 29.408.506,84	$ 479.570.209,18	
JULIO	$ 33.565.730,32	$ 446.004.478,86	
AGOSTO	$ 213.506.949,97	$ 232.497.528,89	
SEPTIEMBRE	$ 261.356.223,61	-$ 28.858.694,72	
OCTUBRE	$ 269.955.843,93	-$ 298.814.538,65	
NOVIEMBRE	$ 240.185.461,35	-$ 539.000.000,00	

Ricardo Carvajal Rico

ST. Kevin Ricardo Carvajal Rico
Supervisor principal contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-148706-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-148706-CI del 30 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA

Señor Coronel
JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Director Compras Públicas
Bogotá; D.C.

Asunto: Solicitud modificatorio contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

En referencia al contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es "EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y/O AERÓDROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Director Compras Publicas, tenga a bien autorizar a quien corresponda se analice la viabilidad jurídica de la solicitud de modificatorio, conforme a lo indicado en los oficios relacionados a continuación:

- Oficio No FAC-S-2026-027080-CE del 28 de julio de 2026 radicado por la ordenación cuyo asunto es "Solicitud de aceptación de modificación contractual No. 181-00-A-COFAC-DIFRA- 2023".
- Oficio No CB-037-2026 del 29 de julio de 2026 radicado por el representante legal de la firma contratista CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. con asunto "ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No. 1 AL CONTRATO No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023".
- Oficio No FAC-S-2026-148601-CI del 30 de julio de 2026 radicado por la supervisión cuyo asunto es "Concepto técnico modificación contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023".

Atentamente,

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Director Infraestructura

Anexo: Oficio No FAC-S-2026-027080-CE del 28 de julio de 2026
Oficio No CB-037-2026 del 29 de julio de 2026
Oficio No FAC-S-2026-148601-CI del 30 de julio de 2026
EDP de adición
CPA
CDP

TC. BARRAGAN / SUSOP; MY. HERNANDEZ / ASOIN; CT. CALDERON / AROPI; TE. DIAZ / AROPI; ST. CARVAJAL / ASOIN; CT. LLACHE / SUCO 3; ASD2. LOZANO / SUBEC

Elaboró: ST. CARVAJAL / ASOIN Revisó: MY. HERNANDEZ / ASOIN Aprobó:CR. SILVA / DIFRA

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Fecha, 31 de julio del 2026

Señores:
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
Bogotá D.C.

Ref.: CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Cordial Saludo,

El suscrito EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO, en calidad de Representante Legal de CONSTRUCTORA BAYITH SAS, identificada con Nit No.900.509.251-3, certifica que la empresa CONSTRUCTORA BAYITH SAS se encuentra PAZ Y SALVO durante los últimos seis (06) meses por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, por lo tanto; a fecha de 04 de junio de 2026, CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.,se encuentra al día con las obligaciones.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	**PERSONA NATURAL**		**PERSONA JURÍDICA**	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (**X**)	No ()

Cordialmente,

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal
C.C 72.274.612 De Barranquilla

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. NIT: 900.509.251-3

CONSTRUCTORA GILGAL
NIT 901.688.961-4

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SARA PATRICIA HERNÁNDEZ SAUCEDO identificada con CC 44.153.989, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCTORA GILGAL SAS identificada con NIT 901.688.961-4, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estamos obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 31 días del mes de Julio de 2026.

SARA PATRICIA HERNÁNDEZ SAUCEDO
Representante Legal
CONSTRUCTORA GILGAL SAS
NIT 901.688.961-4

CONSTRUCTORA GILGAL
NIT 901.688.961-4

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SARA PATRICIA HERNÁNDEZ SAUCEDO identificada con CC 44.153.989, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCTORA GILGAL SAS identificada con NIT 901.688.961-4, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estamos obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 31 días del mes de Julio de 2026.

SARA PATRICIA HERNÁNDEZ SAUCEDO
Representante Legal
CONSTRUCTORA GILGAL SAS
NIT 901.688.961-4

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900509251	3	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 77 # 59-36 Of 1001	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3131933	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	513518509	9508610756	N	2026/07/14	2026/07/27	BANCO DAVIVIENDA	13	$455,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAQUETA (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800
Centro de Trabajo: TRES ESQUINAS - CAQUETÁ (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800
Ciudad: SOLANO Depto: CAQUETA (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800
1	CC	1101384282	ARRIOLA EUSTORGIO								A			▫	▫						230301	30	($1,750,905)	($280,200)	ESSC07	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
2	CC	1101384282	ARRIOLA EUSTORGIO								C										230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1129529189	MURILLO JAIR								A			▫	▫						231001	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS037	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
4	CC	1129529189	MURILLO JAIR								C										231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1007162715	PEREZ FABIAN								A			▫	▫						230301	30	($1,750,905)	($280,200)	ESSC24	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
6	CC	1007162715	PEREZ FABIAN								C										230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	9022233	RODRIGUEZ JAVIER								A			▫	▫						231001	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS002	30	($1,750,905)	($70,100)	CCF13	30	($1,750,905)	($70,100)	14-4	30	($1,750,905)	0.522%	($9,200)	30	$0	$0	Si	($429,600)
8	CC	9022233	RODRIGUEZ JAVIER								C										231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(4)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$450,800		$0	$0		$450,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$450,800	$4,300	$0	$455,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$450,800	$4,300	$0	$455,100
TOTAL				4	$450,800	$4,300	$0	$455,100

CERTIFICACIÓN PORCENTAJE DE PERSONAL NACIONAL

Fecha, 31 de julio del 2026.

Señores:
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
Bogotá D.C.

Ref.: CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Asunto: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Cordial Saludo,

El suscrito EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO, en calidad de Representante Legal de CONSTRUCTORA BAYITH SAS, identificada con Nit No.900.509.251-3, certifica que la empresa CONSTRUCTORA BAYITH SAS mantenemos el porcentaje de personal nacional.

De conformidad con lo con lo manifestado anteriormente, presentamos el listado de personal que se encuentra vinculado al contrato de la referencia durante el periodo del mes de Julio 2026:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA
1	JAIR ENRIQUE MURILLO MARTINEZ	1.129.529.189
2	EUSTORGIO ARRIOLA BLANQUICET	1.101.384.282
3	FABIAN EDUARDO PEREZ SARMIENTO	1.007.162.715
4	JAVIER MANUEL RODRIGUEZ ARRIOLA	9.022.233

Cordialmente,

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal
C.C 72.274.612 De Barranquilla

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. NIT. 900.509.251-3


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.101.384.282
ARRIOLA BLANQUICET
APELLIDOS
EUSTORGIO
NOMBRES
Eustorgio Arrola
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1987
LOS PALMITOS
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-DIC-2006 GUARANDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDRA LUNA PINZON
0073718654A 1


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.129.529.189
MURILLO MARTINEZ
APELLIDOS
JAIR ENRIQUE
NOMBRES
Jair Murillo
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1987
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-ABR-2005 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.162.715**

PEREZ SARMIENTO

APELLIDOS

FABIAN EDUARDO

NOMBRES

Fabian Perez

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-SEP-2000**

EL PIÑON
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

05-OCT-2018 EL PIÑON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2102800-01053698-M-1007162715-20181228 **00639**74947G 1 51198425

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 9.022.233

RODRIGUEZ ARRIOLA

APELLIDOS

JAVIER MANUEL

NOMBRES

Javier Rodriguez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1980

GUARANDA
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

08-JUN-2000 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

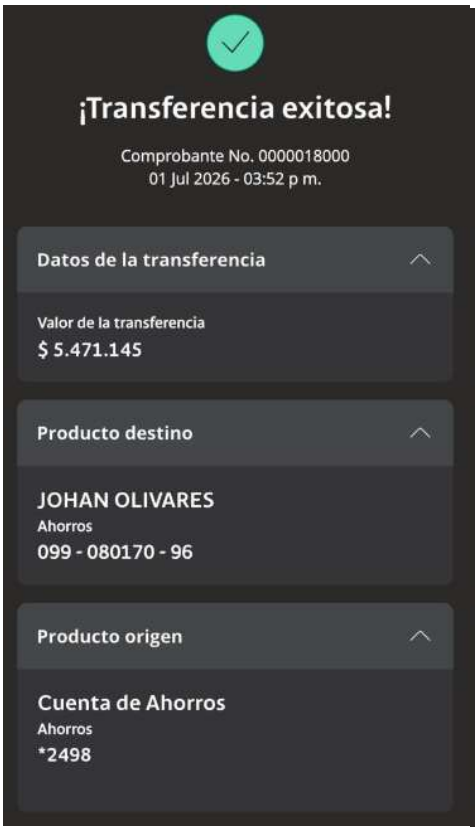
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0300150-01318011-M-0009022233-20220908 0084727098A 1 8505021444

EVIDENCIA PAGO CONCEPTO LIQUIDACIONES PERSONAL FRENTE DE TRABAJO PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ)





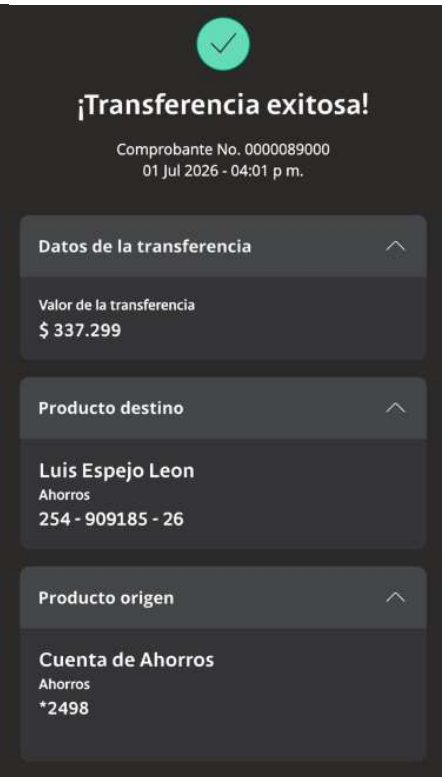


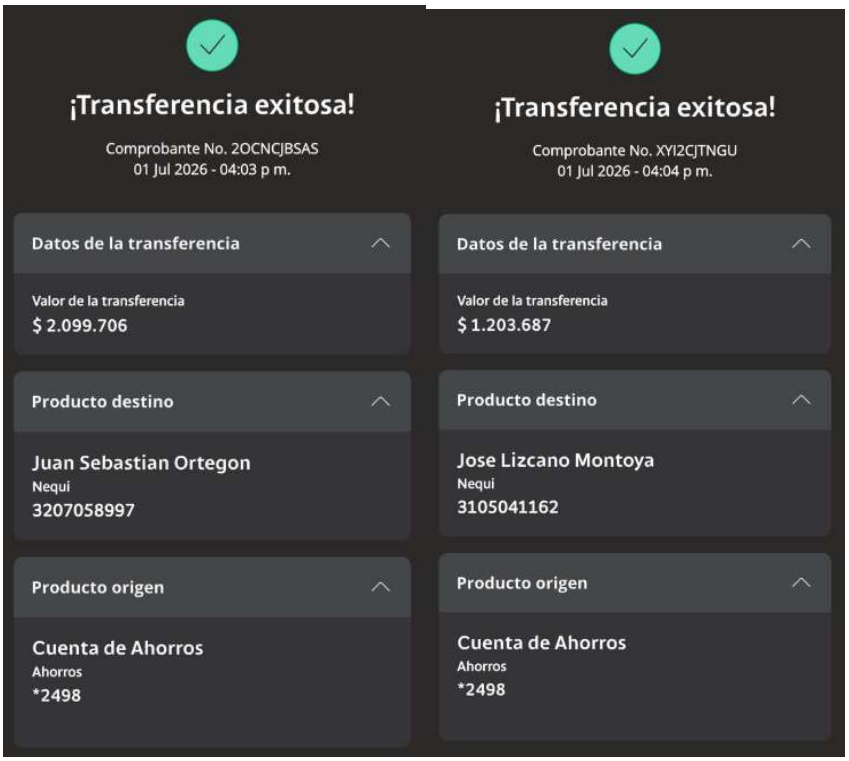


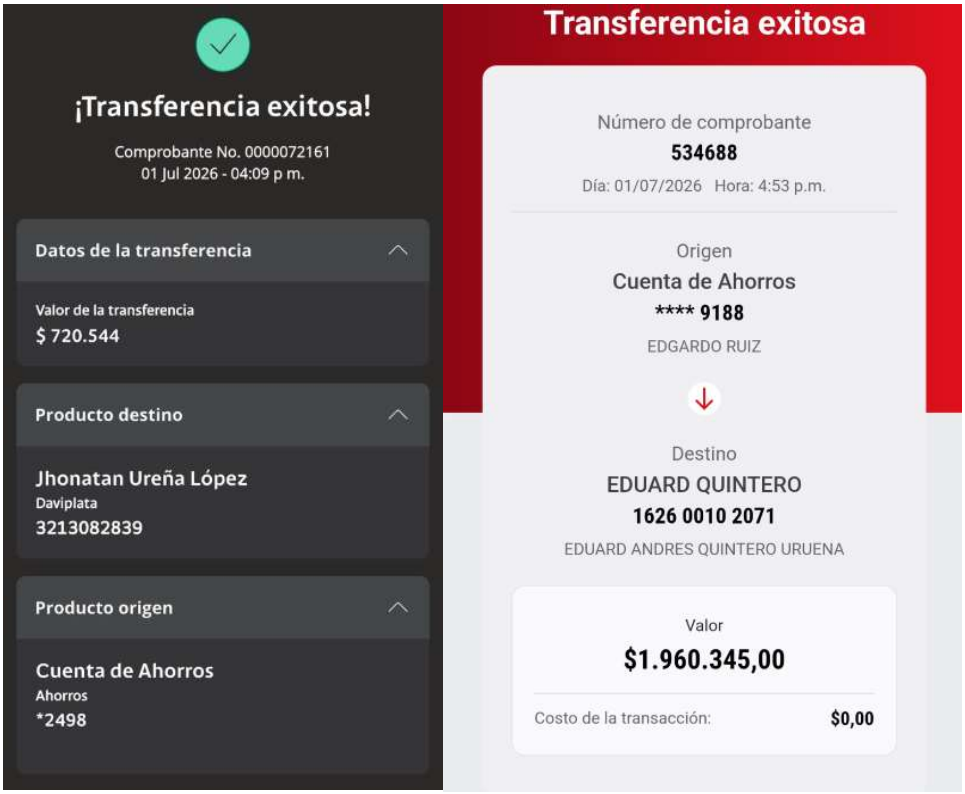

¡Transferencia exitosa!
Comprobante No. 0000018200
01 Jul 2026 - 03:56 p m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 2.342.429
Producto destino
Jose Reinaldo Montenegro
Ahorros
424 - 804322 - 44
Producto origen
Cuenta de Ahorros
Ahorros
*2498

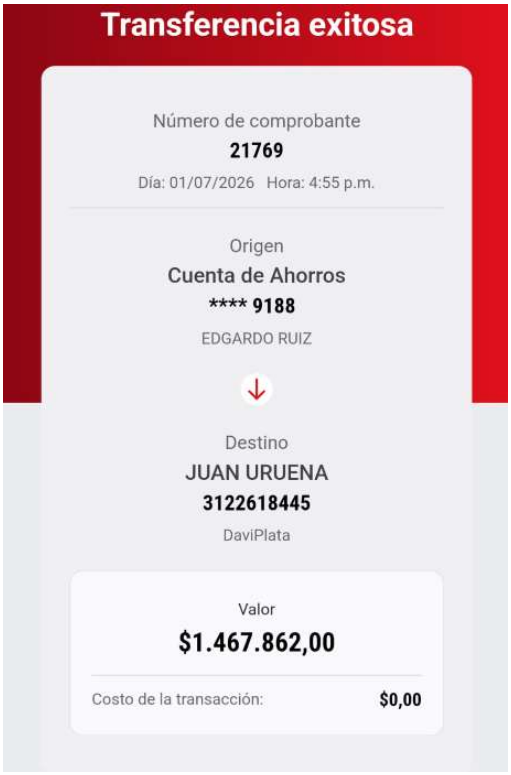

¡Transferencia exitosa!
Comprobante No. 0000003800
01 Jul 2026 - 03:58 p m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 1.426.063
Producto destino
Jael López
Ahorros
453 - 779935 - 04
Producto origen
Cuenta de Ahorros
Ahorros
*2498


¡Transferencia exitosa!
Comprobante No. 0000066600
01 Jul 2026 - 03:59 p m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 4.064.185
Producto destino
Carlos Quintero
Ahorros
254 - 781869 - 78
Producto origen
Cuenta de Ahorros
Ahorros
*2498


¡Transferencia exitosa!
Comprobante No. 0000089000
01 Jul 2026 - 04:01 p m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 337.299
Producto destino
Luis Espejo Leon
Ahorros
254 - 909185 - 26
Producto origen
Cuenta de Ahorros
Ahorros
*2498


¡Transferencia exitosa!
Comprobante No. 2OCNCJBSAS
01 Jul 2026 - 04:03 p m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 2.099.706
Producto destino
Juan Sebastian Ortegon
Nequi
3207058997
Producto origen
Cuenta de Ahorros
Ahorros
*2498
¡Transferencia exitosa!
Comprobante No. XYI2CJTNGU
01 Jul 2026 - 04:04 p m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 1.203.687
Producto destino
Jose Lizcano Montoya
Nequi
3105041162
Producto origen
Cuenta de Ahorros
Ahorros
*2498


¡Transferencia exitosa!
Comprobante No. 0000072161
01 Jul 2026 - 04:09 p m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 720.544
Producto destino
Jhonatan Ureña López
Daviplata
3213082839
Producto origen
Cuenta de Ahorros
Ahorros
*2498
Transferencia exitosa
Número de comprobante
534688
Día: 01/07/2026 Hora: 4:53 p.m.
Origen
Cuenta de Ahorros
**** 9188
EDGARDO RUIZ
Destino
EDUARD QUINTERO
1626 0010 2071
EDUARD ANDRES QUINTERO URUENA
Valor
$1.960.345,00
Costo de la transacción:
$0,00


Transferencia exitosa
Número de comprobante
21769
Día: 01/07/2026 Hora: 4:55 p.m.
Origen
Cuenta de Ahorros
**** 9188
EDGARDO RUIZ
Destino
JUAN URUENA
3122618445
DaviPlata
Valor
$1.467.862,00
Costo de la transacción:
$0,00
