INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

UNIDAD EJECUTORA:
Subdireccion de Vias Regionales

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Informe Mensual No. 4

Periodo: Febrero - 2026

CONTRATO NÚMERO 1703 DE 2025

Objeto:
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA LA JABONERA SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES MASTER SAS

FECHA DE INICIO CONTRATO:
10/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO CONTRATO:
30/06/2026

SUPERVISOR

ING. JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Área Técnica Dirección Territorial Boyacá

Fecha:
5/03/2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1703-2025 **Contratista:** CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

Contrato de Interventoría No. N/A **Interventoría:** N/A

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORME MENSUAL No. **4** **MES O PERIODO:** Febrero - 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	N/A	N/A
5.1	Información general del contrato	N/A	N/A
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	N/A	N/A
5.3	Informes especialistas y profesionales	N/A	N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC	N/A	N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.	N/A	N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e	N/A	N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.	N/A	N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		N/A
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	N/A
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Resolución de designación No. 5094 de fecha 25/11/2025

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá **PERIODO MES:** Febrero - 2026

CONTRATO DE OBRA No.: 1703-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2025
FECHA DE INICIO: 10/11/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2026
PLAZO ACUMULADO: HASTA 30-06-2026

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 242.474.935,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 242.474.935,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 72.248.717,10
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A **INTERVENTOR:** N/A **SUPERVISOR DEL CONTRATO :** JAIM JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Mantenimiento Periódico y Rutinario	Rocería	Ha	12
	Remoción de derrumbes	m3	45
	Bacheo con Material de Afirmado	m3	300
	Señal vertical de Tránsito	Un	3
	Limpieza de alcantarillas, box y pontones	Un	64
	Limpieza de encoles y descoles	ml	600
	Revisión Diseño Muro	Gl	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD
Mantenimiento Periódico y Rutinario	Rocería	Ha	3,72	3,72
	Remoción de derrumbes	m3	0	0
	Bacheo con Material de Afirmado	m3	0	0
	Señal vertical de Tránsito	Un	0	0
	Limpieza de alcantarillas, box y pontones	Un	0	0
	Limpieza de encoles y descoles	ml	0	0
	Revisión Diseño Muro	Gl	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	172.417.587,00	1.645.878,00	174.063.465,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	54.540.343,00		54.540.343,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	13.871.127,00		13.871.127,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	240.829.057,00	1.645.878,00	242.474.935,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 75.652.643,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 3.095.679,84
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 4,09%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Desarrollo de revision y ajuste de estudios y diseños

Foto 2

Desarrollo de revision y ajuste de estudios y diseños

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor Contrato
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al **Contrato de Obra No. 1703-2025**, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y la empresa **Construcciones Master S.A.S.**, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA LA JABONERA SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA


Este contrato fue adjudicado mediante el proceso de selección abreviada **SA-MC-DEO-SVR-009-2025**, cuyo registro en el SECOP II se encuentra bajo el ID **CO1.PCCNTR.8317236**. En el marco del presente proyecto, el contratista es responsable de adelantar las actividades orientadas a conservar las condiciones de transitabilidad, seguridad y funcionalidad del corredor vial.

La supervisión del contrato se realiza por parte del Instituto Nacional de Vías, a cargo del supervisor designado Ing. Jaime Alexander González Choconta, quien verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ambientales, sociales y administrativas establecidas. De igual manera, se cuenta con el equipo técnico del contratista, responsable de la planeación, ejecución y control de las labores programadas durante el plazo contractual.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION

El proyecto se sitúa al norte del departamento de Boyacá, y conecta el casco urbano, situado a unos 1.950 metros sobre el nivel del mar, con la vereda La Jabonera, descendiendo por las laderas de la Cordillera Oriental y bordeando zonas del cañón del río Chicamocha. Este trayecto atraviesa paisajes de bosque seco premontano y áreas agrícolas donde predominan cultivos como cítricos, aguacate y cacao, además de sistemas silvopastoriles con cría de caprinos. La vía es rural y forma parte de la red vial secundaria que comunica varias veredas del sector, siendo clave para la movilidad y el desarrollo

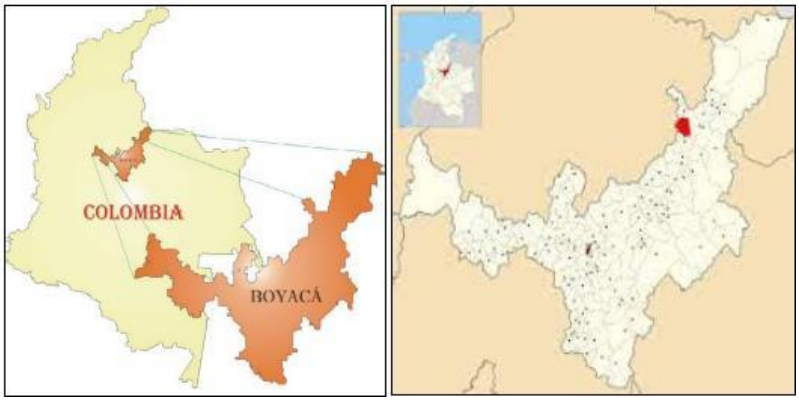

El proyecto objeto de este informe se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Soatá, cuyas coordenadas son 6°19′58″N 72°41′02″O en el departamento de Boyacá, específicamente sobre la vía 54955 en el tramo Soatá – La Jabonera – Sector Apartaderos.

El corredor vial hace parte de una ruta TERCIARIA que conecta diferentes veredas del SECTOR APARTADEROS - LA JABONERA y constituye una vía fundamental para la movilidad local, el acceso a centros poblados y el transporte de productos agrícolas de la región.


Como punto de referencia inicial se toma el **PR0+000**, localizado aproximadamente en las coordenadas:

Latitud: 6°17'58.47"N
Longitud: 72°40'44.63"W

El punto de referencia final del tramo intervenido corresponde al **PR9+300**, ubicado hacia el sector de La Jabonera, con coordenadas aproximadas:

Latitud: 6°17'22.65"N
Longitud: 72°38'59.99"W

Estas coordenadas se establecen a partir de la verificación en campo y el seguimiento cartográfico preliminar realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Boyacá del INVÍAS, definiendo así el alcance lineal del mantenimiento rutinario programado para esta sección de la vía **54955**.

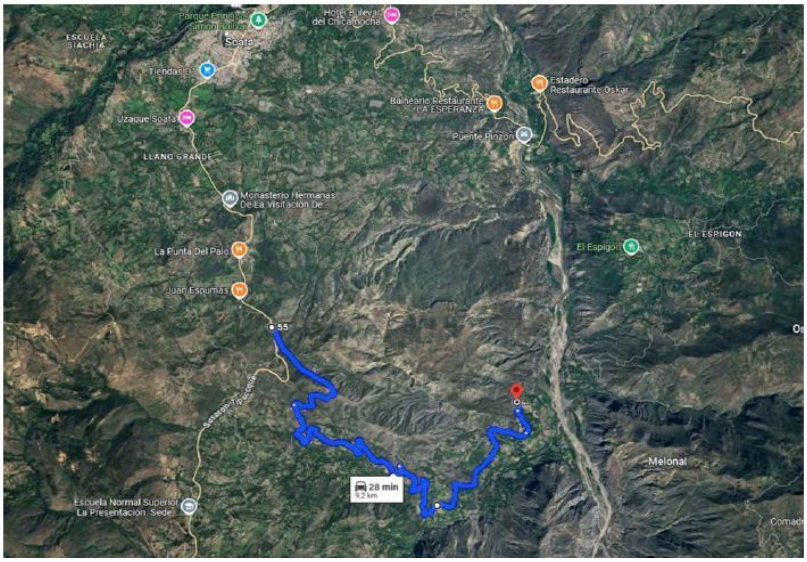

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de **mantenimiento periódico y rutinario de la vía 54955, tramo Soatá – La Jabonera – Sector Apartaderos**, tiene como zona de influencia directa al **municipio de Soatá**, en el departamento de Boyacá. Esta vía constituye un corredor estratégico que conecta áreas rurales productivas con el casco urbano del municipio, facilitando la movilidad de habitantes, transporte de mercancías y acceso a servicios esenciales.

En su zona de influencia indirecta se encuentran comunidades pertenecientes a las veredas **La Jabonera, Apartaderos, Resguardo** y sectores aledaños que dependen de este corredor para actividades productivas, desplazamiento hacia instituciones educativas, centros de salud y comercialización agrícola.

Beneficios esperados de la ejecución del proyecto

La intervención del corredor vial genera una serie de beneficios sociales, económicos y operativos, entre los cuales se destacan:

Mejoramiento de la transitabilidad: El mantenimiento rutinario garantiza una superficie de rodadura en mejores condiciones, reduciendo tiempos de desplazamiento y costos de operación vehicular.

Mayor seguridad vial: Al corregir deterioros, limpiar drenajes y mejorar visibilidad, se disminuye el riesgo de accidentes, especialmente en tramos rurales donde circulan motociclistas, vehículos de carga y transporte escolar.

Facilitación del transporte de productos agrícolas: La región cuenta con producción de caña, frutales, café y productos pecuarios. El mejoramiento del corredor facilita la salida a mercados locales y regionales.

Fortalecimiento del acceso a servicios básicos: La vía es empleada para el traslado hacia Soatá, donde se concentran los servicios de salud, educación, comercio y administración municipal.

Impacto positivo en la economía local: Al mejorar la conectividad, se favorecen pequeños comerciantes, transportadores y productores locales, dinamizando la economía rural.

Continuidad en la prestación del servicio público de transporte: Un tramo en buen Limpieza manual de cunetas no revestidas estado evita interrupciones y facilita la operación de rutas veredales y transporte intermunicipal.

En conjunto, estos beneficios contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población rural del municipio de Soatá y a garantizar la funcionalidad del corredor vial dentro de la red secundaria del departamento de Boyacá.


2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El Supervisor realizó el inventario físico del corredor vial, documentando el estado inicial de la superficie de rodadura, obras de drenaje, señalización, coronaciones, taludes y elementos de la estructura existente.

Se identificaron afectaciones como alta maleza a lado y lado de la vía, derrumbes, falta de material de afirmado en algunos sectores, conformación de la calzada existente, falta limpieza cunetas, alcantarillas bacheos, se identificó un punto crítico en el km 4.4 en el cual se derrumbó parte de la alcantarilla y es necesario para que la banca no se pierda, las cuales fueron registradas mediante recorrido técnico.

		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 0+000- Vía en Buen estado	Km 0+200- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 0+900- Vía en Buen estado	Km 1+500- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 2+100- Vía en Buen estado	Km 2+400- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 2+600- Vía en Buen estado	Km 2+800- Vía en Buen estado	

		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 3+600- Vía en Buen estado	Km 4+100- Vía en Buen estado	
		Sitio Critico, amenaza posible perdida parcial de banca, se requiere obra de contención de talud inferior y recuperación de descole de alcantarilla
Km 4+400- Sitio Critico Falla talud	Km 4+400- Sitio Critico Falla talud	
		Sitio Critico, amenaza posible perdida parcial de banca, se requiere obra de contención de talud inferior y recuperación de descole de alcantarilla
Km 4+400- Sitio Critico Falla talud	Km 4+400- Sitio Critico Falla talud	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 4+700- Vía en Buen estado	Km 5+400- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 5+700- Vía en Buen estado	Km 6+100- Vía en Buen estado	

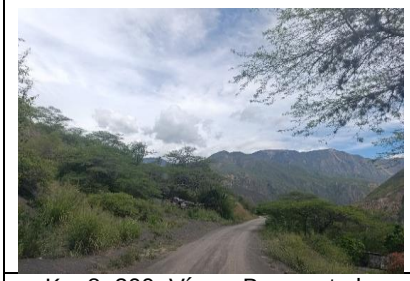		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 6+800- Vía en Buen estado	Km 7+000- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 8+300- Vía en Buen estado	Km 8+400- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 8+500- Vía en Buen estado	Km 8+900- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 9+200- Vía en Buen estado	Km 9+300- Vía en Buen estado	

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la intervención del corredor vial mediante actividades orientadas al mantenimiento periódico y rutinario. Entre las características técnicas se incluyen:

-Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
-Remoción de derrumbes
-Conformación Calzada Existente
-Bacheo con Material de Afirmado
-Señal vertical de Tránsito tipo SR, SP y/o SI, dimensión 75 x 75 cm, en lámina galvanizada retroreflectiva, con película retroflectiva tipo IV.
-Limpieza manual de cunetas no revestidas
-Limpieza de alcantarillas con diámetro 36"
-Limpieza de pontones y box coulvert
-Limpieza de encoles y descoles
-PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

-GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA e IVA) (G)

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. Información general del contrato

CONTRATO DE OBRA	1703-2025
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.
SUPERVISOR:	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR:	$ 242.474.935,00
PLAZO DE EJECUCIÓN :	HASTA 31-12-2025
ANTICIPO	$ 72.248.717,10
PLAZO DE EJECUCION	$ 0,00
FECHA DE INICIACIÓN:	10/11/2025
FECHA DE TERMINACION	30/06/2026

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Toma de información para desarrollo de estudios y diseños del Km 4+400- Sitio Critico Falla talud

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

Se incluye en el presente periodo el Item No previsto de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL, con el fin de adelantar la revisión de la cartilla de obras menores y proyectar un diseño a fin de solucionar la problemática del punto critico del Km 4+400- Sitio Critico Falla talud

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL	GL	1	9.956.000,00	9.956.000,00

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Supervisión.

Se esta coordinando con el contratista para definir acciones a seguir

4. Reportes ejecución mensual contrato de obra:

4.1. Informe semanal.

Se anexa informes semanales del periodo de: Febrero - 2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento periódico y rutinario de la Vía Soata-La Jabonera, Boyacá-Colombia

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá | SEMANA No.: 13 del 2/02/2026 al 8/02/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOHAN ALEXIS TORRES REYES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA LA JABONERA SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de este mantenimiento se hara desmonte, limpieza de zonas no boscosas(roceria), remocion de derrumbres, bacheo con material de afirmado, limpieza de alcantarillas, encoles, descoles, pontones y señalizacion

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 1703-2025 | VALOR INICIAL: $ 242.474.935,00
FECHA DE INICIO: 10/11/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | VALOR ACUMULADO: $ 242.474.935,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2026
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: N/A
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. N/A | VALOR INICIAL: $ -
FECHA DE INICIO: N/A | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: N/A | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: N/A | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 242.474.935			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 242.474.935			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 240.829.057,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.652.643,33	31,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.095.679,84	1,29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (72.556.963,49)	-30,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.652.643,33	31,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.095.679,84	1,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (72.556.963,49)	-30,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 31,4% | Avance o Atraso Físico % -30,1%
Meta Física Ejecutada % 1,3%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2025	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	12	12		Prog	3,72			3,72	31,0%
						Ejec	3,72			3,72	31,0%
*	Remoción de derrumbes	m3	45	45		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Conformacion Calzada Existente	m3	46500	46500		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Bacheo con Material de Afirmado	m3	300	300		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Señal vertical de Tránsito tipo	Un	3	3		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza manual de cunetas no revestidas	ml	18601	18601		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de alcantarillas con diametro 36"	Un	60	60		Prog	20			20	33,3%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de pontones y box coulvert	Un	4	4		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de encoles y descoles	ml	600	600		Prog	200			200	33,3%
						Ejec	0			0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora balde 1.5 m3	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador vibratorio	1	0
Carrotanque de agua 1000 litros	1	0
Total	4	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Apartaderos - Jabonera | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SIN PRESENTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se incluye en el presente periodo el Item No previsto de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL, con el fin de adelantar la revision de la cartilla de obras menores y proyectar un diseño a fin de solucionar la problematica del punto critico del Km 4+400- Sitio Crítico Falla talud

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desarrollode ajuste y/o revision de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Requerimientos al contratista a fin de iniciar actividades acordadas y programada junto con la supervision del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento periódico y rutinario de la Vía Soata-La Jabonera, Boyacá-Colombia

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá | SEMANA No.: 14 del 9/02/2026 al 15/02/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOHAN ALEXIS TORRES REYES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA LA JABONERA SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de este mantenimiento se hara desmonte, limpieza de zonas no boscosas(roceria), remocion de derrumbres, bacheo con material de afirmado, limpieza de alcantarillas, encoles, descoles, pontones y señalizacion

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 1703-2025 | VALOR INICIAL: $ 242.474.935,00
FECHA DE INICIO: 10/11/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | VALOR ACUMULADO: $ 242.474.935,00
FECHA DE VENCIMIENTO VENTE: 30/06/2026 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: N/A
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. N/A | VALOR INICIAL: $ -
FECHA DE INICIO: N/A | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: N/A | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VENTE: N/A | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 242.474.935			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 242.474.935			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 240.829.057,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.652.643,33	31,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.095.679,84	1,29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (72.556.963,49)	-30,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.652.643,33	31,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.095.679,84	1,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (72.556.963,49)	-30,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 31,4% | Avance o Atraso Físico % -30,1%
Meta Física Ejecutada % 1,3%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2025	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	12	12		Prog	3,72			3,72	31,0%
						Ejec	3,72			3,72	31,0%
*	Remoción de derrumbes	m3	45	45		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Conformacion Calzada Existente	m3	46500	46500		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Bacheo con Material de Afirmado	m3	300	300		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Señal vertical de Tránsito tipo	Un	3	3		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza manual de cunetas no revestidas	ml	18601	18601		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de alcantarillas con diametro 36"	Un	60	60		Prog	20			20	33,3%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de pontones y box coulvert	Un	4	4		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de encoles y descoles	ml	600	600		Prog	200			200	33,3%
						Ejec	0			0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora balde 1.5 m3	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador vibratorio	1	0
Carrotanque de agua 1000 litros	1	0
Total	4	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Apartaderos - Jabonera | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SIN PRESENTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Toma de informacion de Campo para desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Requerimientos al contratista a fin de iniciar actividades acordadas y programada junto con la supervision del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento periódico y rutinario de la Vía Soata-La Jabonera, Boyacá-Colombia

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá | SEMANA No.: 15 del 16/02/2026 al 22/02/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOHAN ALEXIS TORRES REYES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA LA JABONERA SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de este mantenimiento se hará desmonte, limpieza de zonas no boscosas(rocería), remoción de derrumbes, bacheo con material de afirmado, limpieza de alcantarillas, encoles, descoles, pontones y señalización

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 1703-2025 | VALOR INICIAL: $ 242.474.935,00
FECHA DE INICIO: 10/11/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | VALOR ACUMULADO: $ 242.474.935,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2026
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: N/A
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. N/A | VALOR INICIAL: $ -
FECHA DE INICIO: N/A | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: N/A | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: N/A | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 242.474.935			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 242.474.935			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 240.829.057,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.652.643,33	31,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.095.679,84	1,29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (72.556.963,49)	-30,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.652.643,33	31,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.095.679,84	1,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (72.556.963,49)	-30,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 31,4% | Avance o Atraso Físico % -30,1%
Meta Física Ejecutada % 1,3%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2025	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	12	12		Prog	3,72			3,72	31,0%
						Ejec	3,72			3,72	31,0%
*	Remoción de derrumbes	m3	45	45		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Conformación Calzada Existente	m3	46500	46500		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Bacheo con Material de Afirmado	m3	300	300		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Señal vertical de Tránsito tipo	Un	3	3		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza manual de cunetas no revestidas	ml	18601	18601		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de alcantarillas con diámetro 36"	Un	60	60		Prog	20			20	33,3%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de pontones y box coulvert	Un	4	4		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de encoles y descoles	ml	600	600		Prog	200			200	33,3%
						Ejec	0			0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora balde 1.5 m3	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador vibratorio	1	0
Carrotanque de agua 1000 litros	1	0
Total	4	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Apartaderos - Jabonera | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SIN PRESENTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Requerimientos al contratista a fin de iniciar actividades acordadas y programada junto con la supervisión del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento periódico y rutinario de la Vía Soata-La Jabonera, Boyacá-Colombia

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá | SEMANA No.: 16 del 23/02/2026 al 1/03/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOHAN ALEXIS TORRES REYES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA LA JABONERA SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de este mantenimiento se hará desmonte, limpieza de zonas no boscosas(rocería), remoción de derrumbes, bacheo con material de afirmado, limpieza de alcantarillas, encoles, descoles, pontones y señalización

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 1703-2025 | VALOR INICIAL: $ 242.474.935,00
FECHA DE INICIO: 10/11/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | VALOR ACUMULADO: $ 242.474.935,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2026
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: N/A
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. N/A | VALOR INICIAL: $ -
FECHA DE INICIO: N/A | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: N/A | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: N/A | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 242.474.935			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 242.474.935			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 240.829.057,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.652.643,33	31,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.095.679,84	1,29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (72.556.963,49)	-30,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.652.643,33	31,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.095.679,84	1,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (72.556.963,49)	-30,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 31,4% | Avance o Atraso Físico % -30,1%
Meta Física Ejecutada % 1,3%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2025	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	12	12		Prog	3,72			3,72	31,0%
						Ejec	3,72			3,72	31,0%
*	Remoción de derrumbes	m3	45	45		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Conformación Calzada Existente	m3	46500	46500		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Bacheo con Material de Afirmado	m3	300	300		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Señal vertical de Tránsito tipo	Un	3	3		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza manual de cunetas no revestidas	ml	18601	18601		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de alcantarillas con diámetro 36"	Un	60	60		Prog	20			20	33,3%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de pontones y box coulvert	Un	4	4		Prog	0			0	0,0%
						Ejec	0			0	0,0%
*	Limpieza de encoles y descoles	ml	600	600		Prog	200			200	33,3%
						Ejec	0			0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora balde 1.5 m3	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador vibratorio	1	0
Carrotanque de agua 1000 litros	1	0
Total	4	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Apartaderos - Jabonera | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SIN PRESENTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Requerimientos al contratista a fin de iniciar actividades acordadas y programada junto con la supervisión del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matrícula Profesional No: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

No se ha iniciado actividades de obra que requieran Maquinaria y equipo, las actividades desarrolladas en el periodo se utilizo solo personal - El equipo y maquinaria se relaciona el Siguiente Formato:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Febrero - 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO No. 1703-2025 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. N/A **INTERVENTORÍA:** N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadora balde 1.5 m3		1.5			I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			
Motoniveladora					I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			
Compactador vibratorio					I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			
Carrotanque de agua 1000 litr					I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4			
TOTAL ACTIVO					0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
TOTAL EN REPARACIÓN					0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
TOTAL INACTIVO					4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4			

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4	100

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El contrato no ha iniciado actividades de obra en Campo que requieran la maquinaria comtemplada

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

El personal se relaciona el Siguiente Formato:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Dia / Mes/ Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá

CONTRATO DE OBRA No: 1703-2025 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero - 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N/A **INTERVENTOR:** N/A

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias,
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
5	JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA	6,771,585	Residente	$ 1.423.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONSTRUCCIONES MASTER Y CIA LTDA	$ 284.700,00	$ 19.900	V	NUEVA EPS CM		$ 11.400	COLPENSIONES		$ 45.600	$ 11.400	$ -	$ -	
6																																													
7																																													
8																																													
9																																													
10																																													
N																																													

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/03/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01110|01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

Se presenta formato de acuerdo a lo ejecutado en el periodo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá

CONTRATO DE OBRA No: 1703-2025 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: Febrero - 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	742525	C-2402-0600-13-51102A-2402112-02	10	Nación	1703-2025	$ 242.474.935	$ 242.474.935
TOTAL						$ 242.474.935	$ 242.474.935

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 242.474.935,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	10-30 Nov-2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	742525 del 16/10/2025	$ 242.474.935,00	$ 242.474.935,00				
2	Parcial	Diciembre - 2025	$ 3.095.679,84	$ 22.450,00	$ 3.118.130	$ -	$ 3.118.129,84	$ -	742525 del 16/10/2025	$ 239.356.805,16	$ 239.356.805,16				
3	Parcial	Enero - 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	742525 del 16/10/2025	$ 239.356.805,16	$ 239.356.805,16				
4	Parcial	Febrero - 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	742525 del 16/10/2025	$ 239.356.805,16	$ 239.356.805,16				
TOTALES			**$ 3.095.679,84**	**$ 22.450,00**	**$ 3.118.129,84**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		$ 239.356.805,16	$ 239.356.805,16				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$ 3.095.679,84	$ 22.450,00	**$ 3.118.129,84**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ -	$ -	**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL	$ -	$ -	**$ -**
OBRAS DE LIMPIEZA	$ -	$ -	**$ -**
ÍTEM NO PREVISTOS	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 3.095.679,84	$ 22.450,00	**$ 3.118.129,84**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. Estado general del tiempo.

Se presenta formato de acuerdo a lo ejecutado en el periodo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá

CONTRATO DE OBRA No: 1703-2025 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero - 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N/A **INTERVENTOR:** N/A

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24				
Lluvias moderadas		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Lluvias intensas		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Total horas		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24				

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. Resumen ensayos de Laboratorio.

En el presente periodo no se adelantaron obras que requieran la realización de ensayos de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas, por tanto no se realizan ensayos de control de calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá

CONTRATO DE OBRA No.: 1703-2025 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSU Febrero - 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N N/A **INTERVENTOR:** N/A

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

No se han inicado actividades de obra en campo

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en

Firma

Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Se anexa formato de seguimiento a Garantías y el respectivo anexo actualizado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/03/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá

CONTRATO DE OBRA No. 1703-2025 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIO: 10/11/2025
PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2025
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 46203
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 242.474.935,00
VALOR ACUMULADO: $ 242.474.935,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A **INTERVENTOR:** N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 24.247.493,50	3	10	2025	LIQUIDACION		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 72.742.480,50	3	10	2025	LIQUIDACION		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 48.494.987,00	3	10	2025	31	10	2028
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 72.742.480,50	ACTA DE ENTREGA			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 600 - 47 - 994000077535

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/10/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 284.700.000,00	3	10	2025	31	12	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 600-74 - 994000012326 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

Supervisor

Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra

No se ha iniciado actividades en campo, Plan de calidad aun en desarrollo del contratista de obra y por presentar a la supervisión

4.9. Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo. No se ha desembolsado a la fecha
- Seguimiento Programa de Obra.
- Seguimiento Programa de Inversiones.
- Actas de Comité de Obra
- Actas de Reunión.

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1703-2025 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A **INTERVENTOR:** N/A
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:
Plan de Inversion inicial

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Material de afermado		$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	20,62%
2	Equipos y herramienta menor		$ 5.000.000,00			$ 5.000.000,00	6,87%
3	Transporte de materiales		$ 22.000.000,00			$ 22.000.000,00	30,24%
4	Costos de Personal (Mano de Obra)		$ 30.742.480,50			$ 30.742.480,50	42,26%
TOTAL			$ 72.742.480,50			$ 72.742.480,50	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** Febrero - 2026 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1703-2025 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A **DE** N/A ENTIDAD FINANCIERA: N/A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 267882959 **BANCO** Banco de Occidente SUCURSAL: Tunja
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 72.248.717,10** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A (Indicar número y año)

INTERVENTOR: N/A

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Material de afermado	$ 15.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 15.000.000,00
2	Equipos y herramienta menor	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00
3	Transporte de materiales	$ 22.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00
4	Costos de Personal (Mano de Obra)	$ 30.742.480,50	$ -	$ -	$ -	$ 30.742.480,50
	TOTALES	$ 72.742.480,50	$ -	$ -	$ -	$ 72.742.480,50

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (___N/A__) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
Anticipo sin desembolso a la fecha

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá

PROGRAMA DE INVERSIONES ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

35 de 49

CONTRATO No: 1703-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **SUPERVISOR:** JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2025 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 242.474.935,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 242.474.935,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 30-06-2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Noviembre-2025	2 Diciembre-2025	3 Enero-2026	4 Febrero-2026	5 Marzo-2026	6 Abril-2026	7 Mayo-2026	8 Junio-2026	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...	
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	$9.986.064	4,40%	1,36%	% P	0,00%	1,47%			1,47%			1,47%			100%
	$9.986.064	4,40%	$3.095.680	$ P	$0	$3.328.688			$3.328.688			$3.328.688			
				$ E	$0	$3.095.680			$0			$0			
				% E	0,00%	1,36%			0,00%			0,00%			
Remoción de derrumbes	$920.340	0,41%	0,00%	% P	0,00%	0,14%			0,14%			0,14%			
	$920.340	0,41%	$0	$ P	$0	$306.780			$306.780			$306.780			
				$ E	$0	$0			$0			$0			
				% E	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			
Conformacion Calzada Existente	$62.775.000	27,66%	0,00%	% P	0,00%	9,22%			9,22%			9,22%			
	$62.775.000	27,66%	$0	$ P	$0	$20.925.000			$20.925.000			$20.925.000			
				$ E	$0	$0			$0			$0			
				% E	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			
Bacheo con Material de Afirmado	$48.163.500	21,22%	0,00%	% P	0,00%	7,07%			7,07%			7,07%			
	$48.163.500	21,22%	$0	$ P	$0	$16.054.500			$16.054.500			$16.054.500			
				$ E	$0	$0			$0			$0			
				% E	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			
Señal vertical de Tránsito tipo SR, SP y/o SI, dimensión 75 x 75 cm, en lámina galvanizada retroreflectiva, con película retroflectiva tipo IV.	$2.341.500	1,03%	0,00%	% P	0,00%	0,34%			0,34%			0,34%			
	$2.341.500	1,03%	$0	$ P	$0	$780.500			$780.500			$780.500			
				$ E	$0	$0			$0			$0			
				% E	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			
Limpieza manual de cunetas no revestidas	$39.713.135	17,50%	0,00%	% P	0,00%	5,83%			5,83%			5,83%			
	$39.713.135	17,50%	$0	$ P	$0	$13.237.712			$13.237.712			$13.237.712			
				$ E	$0	$0			$0			$0			
				% E	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			27%
Limpieza de alcantarillas con diametro 36"	$6.385.800	2,81%	0,00%	% P	0,00%	0,94%			0,94%			0,94%			
	$6.385.800	2,81%	$0	$ P	$0	$2.128.600			$2.128.600			$2.128.600			
				$ E	$0	$0			$0			$0			
				% E	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			
Limpieza de pontones y box coulvert	$853.048	0,38%	0,00%	% P	0,00%	0,13%			0,13%			0,13%			
	$853.048	0,38%	$0	$ P	$0	$284.349			$284.349			$284.349			
				$ E	$0	$0			$0			$0			
				% E	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			
Limpieza de encoles y descoles	$1.279.200	0,56%	0,00%	% P	0,00%	0,19%			0,19%			0,19%			
	$1.279.200	0,56%	$0	$ P	$0	$426.400			$426.400			$426.400			
				$ E	$0	$0			$0			$0			
				% E	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$54.540.343	24,03%	0,00%	% P	0,00%	8,01%			8,01%			8,01%			
	$54.540.343	24,03%	$0	$ P	$0	$18.180.114			$18.180.114			$18.180.114			
				$ E	$0	$0			$0			$0			
				% E	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 226.957.930,00**	**100%**	**1,36%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 226.957.930,00**	**100%**	**$ 3.095.679,84**												

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**33,33%**	**0,00%**	**0,00%**	**33,33%**	**0,00%**	**0,00%**	**33,33%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$75.652.643**	**$0**	**$0**	**$75.652.643**	**$0**	**$0**	**$75.652.643**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**	**66,67%**	**66,67%**	**66,67%**	**100,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$75.652.643**	**$75.652.643**	**$75.652.643**	**$151.305.287**	**$151.305.287**	**$151.305.287**	**$226.957.930**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**1,36%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$3.095.680**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**		
EJECUTADO ACUMULADO	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
IVA SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA	$ 1.645.878,00 / $ 1.645.878,00	$ 22.450,00	1,36%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA e IVA) (G)	$ 13.871.127,00 / $ 13.871.127,00	$ -	0%
*	$ - / $ -		
*	$ - / $ -		
*	$ - / $ -		
*	$ - / $ -		
*	$ - / $ -		
*	$ - / $ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.517.005,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.517.005,00	$ -	0%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 242.474.935,00**	**$ 3.118.129,84**	**1,29%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 242.474.935,00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
Programa de obra inical, Hasta 31-12-2025

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Apoderado
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Aprueba Firma:
Nombre: N/A
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: A2507200 - 79463217

Revisó Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor de Contrato
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Revisó Firma:
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 1220209356 8 BYC

Revisó Firma:
Nombre: JOHAN ALEXIS TORRES REYES
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-375135 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. Boyacá **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4 **DE** Febrero - 2026 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 3 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 36 de 49

CONTRATO No: 1703-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA 30-06-2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 242.474.935,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 242.474.935,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 Noviembre-2025	2 Diciembre-2025	3 Enero-2026	4 Febrero-2026	5 Marzo-2026	6 Abril-2026	7 Mayo-2026	8 Junio-2026	9	10 Indicar mes y año N…	
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	$9.986.064	4,40%	1,36%	% P	0,00%	1,47%	0,00%	0,00%	1,47%	0,00%	0,00%	1,47%			
	$9.986.064	4,40%	$3.095.680	$ P	$0	$3.328.688	$0	$0	$3.328.688	$0	$0	$3.328.688			
				$ E	$0	$3.095.680	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Remoción de derrumbes	$920.340	0,41%	0,00%	% P	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,14%			
	$920.340	0,41%	$0	$ P	$0	$306.780	$0	$0	$306.780	$0	$0	$306.780			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Conformacion Calzada Existente	$62.775.000	27,66%	0,00%	% P	0,00%	9,22%	0,00%	0,00%	9,22%	0,00%	0,00%	9,22%			
	$62.775.000	27,66%	$0	$ P	$0	$20.925.000	$0	$0	$20.925.000	$0	$0	$20.925.000			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Bacheo con Material de Afirmado	$48.163.500	21,22%	0,00%	% P	0,00%	7,07%	0,00%	0,00%	7,07%	0,00%	0,00%	7,07%			
	$48.163.500	21,22%	$0	$ P	$0	$16.054.500	$0	$0	$16.054.500	$0	$0	$16.054.500			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Señal vertical de Tránsito tipo SR, SP y/o SI, dimensión 75 x 75 cm, en lámina galvanizada retroreflectiva, con película retroflectiva tipo IV.	$2.341.500	1,03%	0,00%	% P	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,34%			
	$2.341.500	1,03%	$0	$ P	$0	$780.500	$0	$0	$780.500	$0	$0	$780.500			46%
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Limpieza manual de cunetas no revestidas	$39.713.135	17,50%	0,00%	% P	0,00%	5,83%	0,00%	0,00%	5,83%	0,00%	0,00%	5,83%			
	$39.713.135	17,50%	$0	$ P	$0	$13.237.712	$0	$0	$13.237.712	$0	$0	$13.237.712			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Limpieza de alcantarillas con diametro 36"	$6.385.800	2,81%	0,00%	% P	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%	0,94%			
	$6.385.800	2,81%	$0	$ P	$0	$2.128.600	$0	$0	$2.128.600	$0	$0	$2.128.600			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Limpieza de pontones y box coulvert	$853.048	0,38%	0,00%	% P	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,13%			
	$853.048	0,38%	$0	$ P	$0	$284.349	$0	$0	$284.349	$0	$0	$284.349			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Limpieza de encoles y descoles	$1.279.200	0,56%	0,00%	% P	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,19%			
	$1.279.200	0,56%	$0	$ P	$0	$426.400	$0	$0	$426.400	$0	$0	$426.400			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$54.540.343	24,03%	0,00%	% P	0,00%	8,01%	0,00%	0,00%	8,01%	0,00%	0,00%	8,01%			
	$54.540.343	24,03%	$0	$ P	$0	$18.189.114	$0	$0	$18.180.114	$0	$0	$18.180.114			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 226.957.930,00	100%	**1,36%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 226.957.930,00**	100%	**$ 3.095.679,84**												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**33,33%**	**0,00%**	**0,00%**	**33,33%**	**0,00%**	**0,00%**	**33,33%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$75.652.643**	**$0**	**$0**	**$75.652.643**	**$0**	**$0**	**$75.652.643**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**	**66,67%**	**66,67%**	**66,67%**	**100,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$75.652.643**	**$75.652.643**	**$75.652.643**	**$151.305.287**	**$151.305.287**	**$151.305.287**	**$226.957.930**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**1,36%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$3.095.680**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,36%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**	**$3.095.680**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
IVA SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA	$ 1.645.878,00 / $ 1.645.878,00	$ 22.450,00	0,01%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA e IVA) (G)	$ 13.871.127,00 / $ 13.871.127,00	$ -	0%
	$ - / $ -	$ -	0%
	$ - / $ -	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.517.005,00	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.517.005,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 228.603.808,00**	**$ 3.118.129,84**	**1,29%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 242.474.935,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
En el presente periodo se acuarda el desarrollan actividades de estudios y diseños del punto crítico, se incluye NP, de estudios y diseños

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Aprueba Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Conclusiones y recomendaciones

-El contratista en el presente periodo esta realizando la revisión y estudios y diseños para la construcción de una obra de contención del talud (muro en gaviones y/o similar en un punto critico) y recuperación del descole de la alcantarilla existente


8. Anexos

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo


Fecha	No radicado	Asunto	Remite	Destino


8.2 Registro fotográfico del avance de las obras



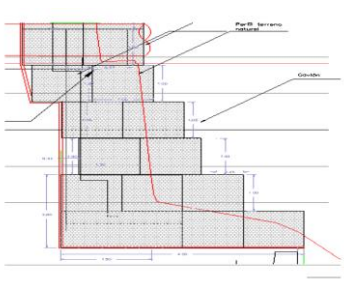

Toma de información estudios y diseños del Km 4+400- Sitio Critico

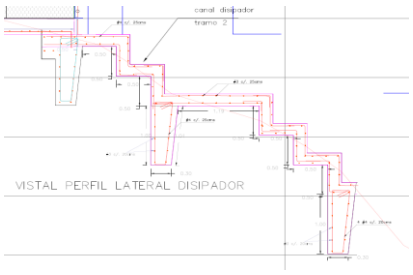

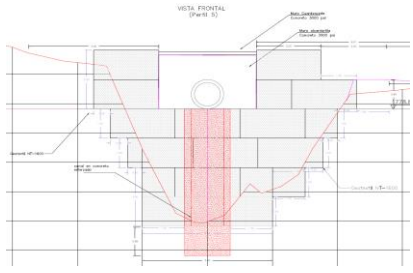

Toma de información estudios y diseños del Km 4+400- Sitio Critico

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

N/A

8.4 Copia bitácora

Se anexa copia de bitácora de las actividades desarrolladas
