12.17 CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Como equipo profesional del contrato de interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA",** damos constancia que el contratista del contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024, que tiene por objeto **"CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, a cumplido con los aportes al sistema de integral de seguridad social y cada uno de los salarios, recargos laborales y demás, en el presente periodo facturado por el contratista de obra según las siguientes consideraciones:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6
No CONTRATO: 55 DEL 07 MARZO 2024
PERIODO: 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
MES: DOS (02)
PLANILLA No: 9475749736

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de septiembre 2024.



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L Interventoría



ROBERTO CASTAÑEDA PARDO
Director Interventoría

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901808237	6	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS ALBEIRO GOMEZ	DG 10 18 91	FLORENCIA-CAQUETA	3123956333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	996472779	9475749736	E	2024/10/09	2024/10/22	BANCOLOMBIA	13	$4,145,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1006521703	ALDANA BARREIRO LINDA XIOMARA	X																	230301	12	ESSC62	12	CCF13	12	14-23	12	12	Si
2	CC	1006521453	CALDERON CALDERON GABRIEL																		230301	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
3	CC	96362474	CALDERON NARANJO MARIO																		231001	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
4	CC	17642378	CALDERON VASQUEZ VICTOR JULIO	X																	25-14	19	ESSC62	19	CCF13	19	14-23	19	19	Si
5	CC	1006521642	CALDERON CALDERON YEFERSON FABIAN	X																	230301	3	EPS002	3	CCF13	3	14-23	3	3	Si
6	CC	1117884157	CAVICHE RAMIREZ SEBASTIAN	X																	230301	3	ESSC62	3	CCF13	3	14-23	3	3	Si
7	CC	17648840	CELIS TOVAR JAIRO	X																	230301	10	ESSC62	10	CCF13	10	14-23	10	10	Si
8	CC	17605239	CHAUX YATE JUAN CARLOS	X																	25-14	3	ESSC62	3	CCF13	3	14-23	3	3	Si
9	CC	11002724	GUERRA ARRIETA BIGAIEL																		25-14	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
10	CC	4957317	HURTADO GARCIA ALBERTO	X																	230201	12	EPS037	12	CCF13	12	14-23	12	12	Si
11	CC	1117784579	LUNA SILVA WILEN																		230301	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
12	CC	1006521513	PIRACOA AGUDELO SORAYA YANINE	X																	230301	12	ESSC62	12	CCF13	12	14-23	12	12	Si
13	CC	16187820	RAMIREZ GURRUTE RUBINSE	X																	230301	19	ESSC62	19	CCF13	19	14-23	19	19	Si
14	CC	1006549114	RIVERA GOMEZ ANDRES	X																	230301	3	ESSC62	3	CCF13	3	14-23	3	3	Si
15	CC	17637979	ROBLES TRUJILLO ARMANDO																		231001	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
16	CC	1115796242	SEGURA OME YILMER ALEXANDER																		230301	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
17	CC	1117885090	VALENZUELA CANTILLO FERNANDO																		230301	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
Total	**Afiliados(17)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901808237	6	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS ALBEIRO GOMEZ	DG 10 18 91	FLORENCIA-CAQUETA	3123956333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	996472779	9475749736	E	2024/10/09	2024/10/22	BANCOLOMBIA	13	$4,145,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$2,121,800	$19,900	$0	$2,141,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$3,900	$0	$419,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$360,600	$3,400	$0	$364,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,262,000	$11,800	$0	$1,273,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$83,200	$800	$0	$84,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$923,500	$8,600	$0	$932,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$923,500	$8,600	$0	$932,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$530,600	$5,000	$0	$535,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	17	$530,600	$5,000	$0	$535,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$530,600	$5,100	$0	$535,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$140,600	$1,400	$0	$142,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$384,800	$3,600	$0	$388,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$5,200	$100	$0	$5,300
TOTAL				**17**	**$4,106,500**	**$38,600**	**$0**	**$4,145,100**

12.18 DISEÑO DE MEZCLA

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva – Huila

12.19 RESULTADOS DE LABORATORIO

CODIGO	ING - SU - 019
VERSIÓN	02
FECHA	1-mar.-2018
PAGINA	1 DE 1


RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13 - ASTM C 39/C 39M – 01

CLIENTE :	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA	**FECHA:**	30/09/2024
PROYECTO:	ALCANTARILLADO MORELIA		

Muestra N°	Fecha toma	Fecha rotura	Edad dias	Localizacion en obra	Descripción elemento	Lectura dial [kN]	Resistencia obtenida individual [psi]	Resistencia obtenida muestra [psi]	Resistencia esperada [psi]	Asent. [pulg]	Diametro muestra [cm]	Altura muestra [cm]	Area [cm2]	Masa muestra [g]	Volumen [cm3]	Densidad [g/cm3]	Tipo de falla	Factor de resistencia obtenido (%)	Cumple (Si/No)	Observaciones
1	30/09/2024	28/10/2024	28	ND	ND	543.1	**4399**	**4399**	4000	8.5	15.10	30.20	179.1	12347	5408.2	2.283	5	110		PLACA MIXER WCY137
2	30/09/2024	28/10/2024	28	ND	ND	538.1	**4416**	**4416**	4000	8.0	15.00	30.10	176.7	12728	5319.1	2.393	5	110		PLACA MIXER WOW037
3	30/09/2024	28/10/2024	28	ND	ND	539.7	**4371**	**4371**	4000	5.0	15.10	30.00	179.1	12273	5372.4	2.284	3	109		PLACA MIXER WNW134

Observaciones:

I.N.V. E -410 FIGURA 410 - 3. ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TIPICOS



Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos

Tipo 2
Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos

Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados

Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1

Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)

Tipo 6
Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

Nota: Porcentaje de resistencia esperada a cada edad

3 Días, 40% a 50%
7 Días, 65% a 70%
14 Días, 80% a 85%
28 Días, 100%, como mínimo

Ejecutó	**Aprobó**
Laboratorista Nombre/Firma	Ingeniero control de calidad: Nombre/Firma

12.20 INFORME CONTRATISTA

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva – Huila

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 055 DEL 7 DE MARZO DEL 2024
INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1
FECHA: 10/09/2024

Alcaldía de Morelia

UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023

CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA



INFORME DE OBRA

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 – 30 SEPTIEMBRE DE 2024

R.L CONTRATISTA:	LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ	
SUPERVISORA:	PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES	
INTERVENTOR:	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	

INDICE

INDICE DE TABLAS 3
INDICE DE ILUSTRACIONES 3
INTRODUCCIÓN 4
GENERALIDADES 5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 6
RESUMEN DEL PRESUPUESTO INICIAL 7
GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA 8
PROCESOS ADMINISTRATIVOS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 9
ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO 13
LISTADO DE PERSONAL DE OBRA 14
CONTROL DEL CLIMA 16
DIFICULTADES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 17
CONCLUSIONES 18
ANEXOS 19
REGISTRO FOTOGRÁFICO 20
BITÁCORA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 21
APROBACIÓN DE POLIZAS 22
PERFIL DEL PROFESIONAL OFRECIDO E IDÓNEO 23
ACTA CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD 24
PERMISOS, LICENCIAS Y OTRAS AUTORIZACIONES 25
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 26
ACTAS DE COMITÉ 27
OFICIOS 28
PLANILLA DE SS DEL MES DE SEPTIEMBRE 29
INFORME SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 30
INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 31
INFORME AMBIENTAL MES DE SEPTIEMBRE 32
ENSAYOS DE LABORATORIO MES DE SEPTIEMBRE 33

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información del contrato de obra. 6
Tabla 2. Presupuesto del proyecto. 7
Tabla 3. Garantías de cumplimiento. 8
Tabla 4. Garantías de responsabilidad civil. 8
Tabla 5. Porcentaje de ejecución en pesos. 12
Tabla 6. Estado financiero de la obra. 13
Tabla 7. Personal de obra. 14
Tabla 8. Profesionales de la propuesta. 15
Tabla 9. Control del clima. 16

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización de morelia en Colombia. 5
Ilustración 2. Localización de morelia en Caquetá. 5
Ilustración 3. Porcentaje de obra programado vs ejecutado. 12

INTRODUCCIÓN

La **UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** presenta informe del periodo comprendido entre el 01 y 30 de septiembre. Obra que se ejecuta dentro del contrato de obra pública No. **055 del 07 de marzo del 2024** cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ".**

En el periodo comprendido del presente informe, se han realizado diversas actividades las cuales rigen dentro del marco del alcance del contrato en mención. Es de completa relevancia, cabe recalcar que, como objetivo principal por nuestra parte, es realizar todas las actividades contratadas, cumpliendo con todas aquellas establecidas dentro del contrato y del mismo modo proporcionar los resultados que requieren todas las partes involucradas dentro de los tiempos pactados. En el presente documento, se exponen detalles como el progreso de ejecución, calidad del trabajo, cumplimiento de los tiempos establecidos, aspectos financieros y algunos más que se consideran relevantes.

GENERALIDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra pública No. **055 del 07 de marzo del 2024** tiene el alcance para la "**CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**".

Se da inicio a la construcción de alcantarillado en tubería de 8", el cual comprende la intervención de más de trescientos (394.16) metros lineales, dicho proyecto se deriva en cinco (05) capítulos, como lo son preliminares, excavaciones y rellenos, suministro e instalación tubería red sanitaria, estructuras en concreto y pavimentos y concreto. El presente proyecto Beneficiará a cerca de 50 familias con necesidad de dirigir el agua contaminada por medio de obras de infraestructuras controladas en aspectos técnicos, ambientales y sociales.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Morelia, se encuentra localizado al suroccidente de la capital del departamento del Caquetá, esta se encuentra a 24 kilómetros, sobre la carretera Marginal de la selva, la cabecera municipal está ubicada a 1°29′25″ de latitud norte y 75°43′43″ longitud oeste y tiene una altura aproximada de 258 msnm.



Ilustración 1. Localización de morelia en Colombia.



Ilustración 2. Localización de morelia en Caquetá.

INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	055 del 07 de marzo del 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ
NIT:	800.095.773-4
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2023
NIT:	901.808.237-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRARO:	07 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$1.404.440.820,00

Tabla 1. Información del contrato de obra.

Los documentos técnicos para el inicio de la obra se pueden evidenciar en la sección de anexos.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO INICIAL

PRELIMINARES	$36,258,190
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$693,777,308
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA	$72,538,212
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$83,808,552
PAVIMENTOS Y CONCRETOS	$161,072,697
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA	$1.404.440.820.00

Tabla 2. Presupuesto del proyecto.

El contrato de obra está por la suma de MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($1.404.440.820,00), para tener en cuenta, este valor expuesto, incluye costos directos, indirectos, tasas, contribuciones y descuentos de ley.

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

La Aseguradora solidaria de Colombia es una entidad constituida en 1993. Con más de novecientos (900) colaboradores y cuarenta y siete (47) agencias en todo el país, se ha consolidado como una de las compañías más rentables en el sector de seguros generales.

PÓLIZA DE GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09VA POLIZA No. 560-47-994000176867									ANEXO: 0
AMPARO	SUMA ASEGURADA		VIGENCIA						
			DESDE				HASTA		
CUMPLIMIENTO	$ 140,444,082.00		7	3	2024		12	2	2025
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 70,222,041.00		7	3	2024		12	8	2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 280,888,164.00		5 años a partir de acta de recibo final.						

Tabla 3. Garantías de cumplimiento.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POLIZA No. 560-74-994000032197										ANEXO: 0
AMPARO	% AMPARO	SUMA ASEGURADA		VIGENCIA						
				DESDE				HASTA		
CONTRATO	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA	$ 260,000,000.00		7	3	2024		10	8	2024
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		$ 260,000,000.00		7	3	2024		10	8	2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$ 260,000,000.00		7	3	2024		10	8	2024
RCE PATRONAL		$ 260,000,000.00		7	3	2024		10	8	2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 260,000,000.00		7	3	2024		10	8	2024
GASTOS MEDICOS		$ 26,000,000.00		7	3	2024		10	8	2024
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA		$ 260,000,000.00		7	3	2024		10	8	2024

Tabla 4. Garantías de responsabilidad civil.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS LLEVADOS A CABO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Durante el periodo del presente informe, comprendido entre el primero (01) de septiembre del 2024 y el treinta (30) de septiembre del 2024, se realizan actividades especificadas a continuación, cabe recalcar que, estas actividades se ejecutan según especificaciones técnicas y normativa vigente, dando paso así a una correcta ejecución del proyecto contratado.

Cabe recalcar que, las actividades que se presentan a continuación, son aquellas que se han ejecutado o en obra, en el periodo comprendido de este informe, en donde también se especifican las dificultades en el proceso constructivo.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

PRELIMINARES		
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO, PAGADO EN m	Preliminares
1.3	DEMOLICIÓN DE CAJILLAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS, PAGADO EN un	Preliminares
1.4	CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e ≤ 10 cm, PAGADO EN m2	Preliminares

EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2.1	EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN	Excavaciones y rellenos
2.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO	Excavaciones y rellenos
2.3	EXCAVACION MANUAL EN SECO EN MATERIAL COMUN	Excavaciones y rellenos
2.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN SECO EN MATERIAL CONGLOMERADO	Excavaciones y rellenos
2.6	BOMBEO PARA MANEJO DE AGUA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, PAGADO EN hr	Excavaciones y rellenos
2.7	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA Y/O METALICO PARA EXCAVACIONES	Excavaciones y rellenos
2.8	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE	Excavaciones y rellenos
2.9	RELLENO ESTRUCTURAL PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERIA	Excavaciones y rellenos
2.10	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	Excavaciones y rellenos
2.11	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	Excavaciones y rellenos
2.12	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	Excavaciones y rellenos

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA RED SANITARIA		
3.1	INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC Ø 6" CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE	Suministro e instalación tubería red sanitaria
3.2	INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC Ø 8" CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE	Suministro e instalación tubería red sanitaria
3.3	SUM. E INST. SILLA YEE PVC Ø 6"Y/O ACCESORIO, PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA SEGÚN DISEÑO Y TRAMO DE ALCANTARILLADO Ø 8"	Suministro e instalación tubería red sanitaria

ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4.1	CAJILLA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, SEGÚN DISEÑO 0,60 x 0,60 m (INCL. ACERO DE REFUERZO EN TAPA)	Estructuras en concreto
4.5	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 4,01 < H ≤ 5,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	Estructuras en concreto
4.7	ACERO DE REFUERZO, PAGADO EN kg	Estructuras en concreto

- **CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA**

Durante el periodo del presente informe, se llega a un avance del 19.08%, esto correspondiente a la ejecución, de los ítems que se presentaron con anterioridad:

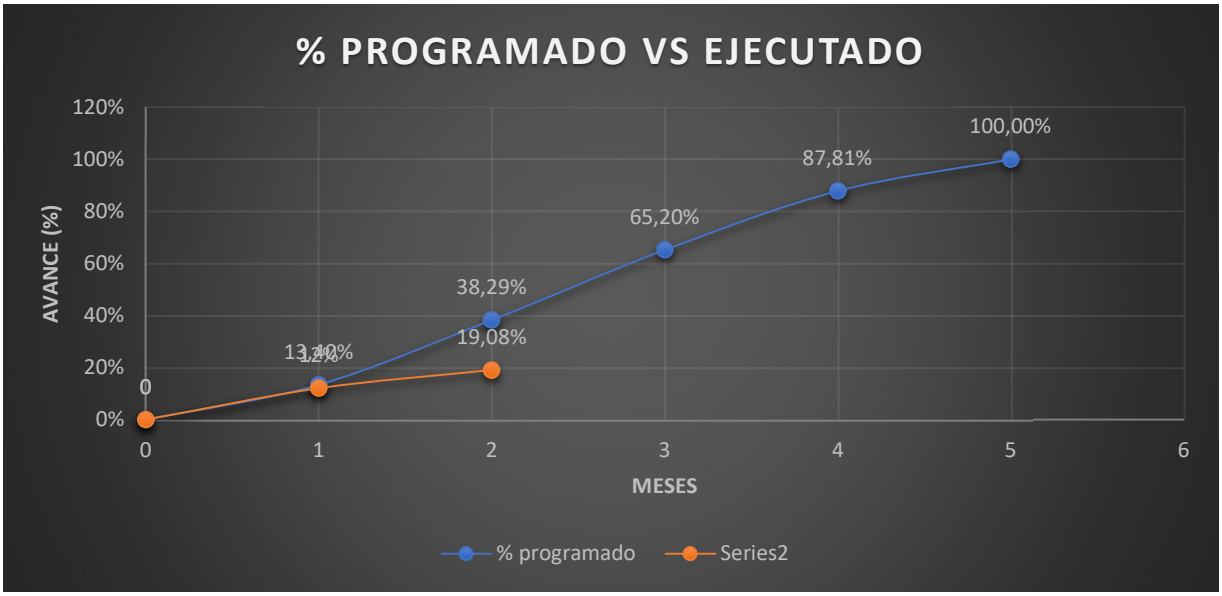


Ilustración 3. Porcentaje de obra programado vs ejecutado.

NOTA: En la sección de anexos, se presenta cuadro de avance.

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.404.440.820,00
VALOR EJECUTADO	$ 267.941.819,32
PORCENTAJE EJECUTADO	19,08 %
SALDO POR EJECUTAR	$ 1.136.499.000,68
PORCENTAJE VALOR POR EJECUTAR	80,92 %

Tabla 5. Porcentaje de ejecución en pesos.

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el proceso que se ha llevado a cabo hasta la fecha, se expone a continuación el estado financiero actual del proyecto, se evidencia el valor total del contrato puesto que, no se ha realizado anticipo y tampoco se han realizado actas parciales a la fecha.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	**%**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**TOTAL ENTREGADO AL CONTRATISTA**
VALOR DEL CONTRATO	100.00%	$ 1,404,440,820.00		
TOTAL				$ -

Tabla 6. Estado financiero de la obra.

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

NOMBRE	CARGO
MARIO CALDERON NARANJO	AYUDANTE
GABRIEL CALDERON NARANJO	AYUDANTE
ARMANDO ROBLES TRUJILLO	AYUDANTE
FERNANDO VALENZUELA CANTILLO	AYUDANTE
WILEN LUNA SILVA	AYUDANTE
BIGAIL ARRIETA GUERRA	OFICIAL
YILMER ALEXANDER SEGURA	OFICIAL
JAIRO CELIS TOVAR	AYUDANTE
VICTOR JULIO CALDERON VASQUEZ	AYUDANTE
RUBINSE RAMIREZ GURRETE	AYUDANTE
YEFERSON FABIAN CALDERON CALDERON	AYUDANTE
SEBASTIAN CAVICHE RAMIREZ	AYUDANTE
JUAN CARLOS CHAUX YATE	AYUDANTE
ANDRES RIVERA GOMEZ	AYUDANTE
LINDA XIOMARA ALDANA BARREIRO	PALETERA
SORAYA YANINE PIRACOA AGUDELO	PALETERA
ALBERTO HURTADO GARCIA	MAESTRO

Tabla 7. Personal de obra.

NOMBRE	CARGO
CARLOS MAURICIO ARISTIZABAL CARVAJAL	DIRECTOR DE OBRA
LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ	RESIDENTE DE OBRA
DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	ASESOR HIDRAULICO
LUIS ARMANDO JAIME RICO	ASESOR SISOMA
SERAFIN LAVERDE ORTEGON	INSPECTOR DE OBRA
CRISTIAN ANDRES SENDOYA PEREZ	TOPOGRAFO

Tabla 8. Profesionales de la propuesta.

CONTROL DEL CLIMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE MORELIA
FORMATO CONTROL DEL CLIMA

CONTRATO DE OBRA No.: 055 del 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 202400000500 DE MAYO DEL 2024
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA
MES: 01 de septiembre del 2024 al 30 de septiembre del 2024

FECHA	LLUVIA FUERTE			LLOVIZNA			LLUVIA DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO (Horas)	TIEMPO DE LLUVIA ACUMULADO (Horas)
	De (Hr)	A (Hr)	TOTAL HORAS	De (Hr)	A (Hr)	TOTAL HORAS		
1/08/2024								
2/08/2024								
3/08/2024								
4/08/2024								
5/08/2024	7:00 a. m.	12:00 a. m.	5				5	5
6/08/2024								
7/08/2024								
8/08/2024								
9/08/2024	6:00 a. m.	10:30 p. m.	4,5				2,5	2,5
10/08/2024								
11/08/2024								
12/08/2024								
13/08/2024								
14/08/2024								
15/08/2024								
16/08/2024	10:00 a. m.	12:00 p. m.	2				2	2
17/08/2024								
18/08/2024								
19/08/2024								
20/08/2024								
21/08/2024								
22/08/2024								
23/08/2024								
24/08/2024								
25/08/2024								
26/08/2024								
27/08/2024								
28/08/2024	7:00 a. m.	10:00 p. m.	3				3	3
29/08/2024								
30/08/2024								
TOTAL			14,5	TOTAL		0	12,5	12,5

DÍAS FESTIVOS
DÍAS DOMINGOS
DÍAS CON SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES MEDIANTE ACTA

LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
RESIDENTE DE OBRA

Tabla 9. Control del clima.

DIFICULTADES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

- En el periodo del presente informe, se encuentra con dificultad en el proceso constructivo, debido a que al momento de realizar excavación para la respectiva instalación de la tubería de 8", se encuentra con nivel freático, el cual debe ser bombeado para poder trabajar cómodamente en el sector, puesto que, se inicia en los tramos pz 6 - 5.

- En la actividad de excavación de material común y selección del mismo para relleno, debido a las fuertes lluvias repentinas que se presentaron en el sitio de obra, el material se contaminó y saturo de humedad, encontrándose en las condiciones inadecuadas para la reutilización.

- Una de las dificultades más representativas las cuales generaron mayor impacto en el transcurso del presente informe, se basó en los daños causados a la tubería de ¾", ½", 3" y 4" hidráulica además de, las redes de gas domiciliario, en donde se contaba con planimetría existente, la cual no estaba suficientemente aterrizada.

- Se debe anotar que, la realización de las redes domiciliarias hasta el momento ha presentado un crecimiento debido a que, diversas propiedades, fueron fragmentadas en varios apartamentos, los cuales presentan la necesidad de transportar los residuos de agua contaminada.

CONCLUSIONES

- El contrato de obra No. 055 del 07 de marzo del 2024 se encuentra vigente y en ejecución.

- Durante el periodo del actual informe, se ha dado solución a todas las problemáticas presentadas, esto en aras de dar cumplimiento a todas las actividades contratadas.

- En el presente mes, la UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA, realiza actividades entre los pozos, 6 – 8, 6 - 5.

- A la fecha del presente informe, se realiza suministro y transporte de instalación de 60.08 m de tubería de 8” corrugada y 84.40 m de tubería de 6” corrugada entre los pozos, 6 – 8, 6 - 5.

- Durante el periodo del presente informe, 01 de septiembre del 2024, hasta el 30 de septiembre del 2024, se encuentra un avance de obra ejecutado, del 19.08%.

LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
C.C. 16.189.113 de Florencia - Caquetá
RL. UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

ANEXOS

AVANCE DE OBRA PERIODO 01 SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.:	055 DEL 07 DE MARZO DEL 2024	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	$ 1.404.440.820
NIT:	901.808.237-6	
REP. LEGAL:	LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ	01 DE AGOSTO DE 2024
INTERVENTOR:	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
NIT:	1.080.290.331	CINCO (05) MESES



			CONDICIONES INICALES			EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE			TOTAL ACUMULADO			OBSERV.
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	% DE AVANCE	CANT.	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	
1	**PRELIMINARES**											
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO, PAGADO EN m	m	658,16	7.700,00	5.067.832,00	134,48	$ 1.035.496,00	20,43%	271,48	$ 2.090.396,00	41,25%	
1.2	DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EXISTENTES, PAGADO EN un	un	3,00	510.659,50	1.531.978,50	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
1.3	DEMOLICIÓN DE CAJILLAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS, PAGADO EN un	un	2,00	144.346,80	288.693,60	2,00	$ 288.693,60	100,00%	2,00	$ 288.693,60	100,00%	
1.4	CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e ≤ 10 cm, PAGADO EN m2	m2	730,83	41.291,90	30.177.359,28	105,59	$ 4.360.011,72	14,45%	105,59	$ 4.360.011,72	14,45%	
1.5	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE (INCL. RETIRO MAX. 5 km), PAGADO EN m	m	291,89	29.213,60	8.527.157,70	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
1.6	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, PAGADO EN m3	m3	0,00	236.067,00	0,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
Subtotal					**$ 45.593.021,00**		**$ 5.684.201,32**			**$ 6.739.101,32**		
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
2.1	EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN	m3	3.876,24	30.225,00	117.159.354,00	178,63	$ 5.399.092,00	4,61%	685,80	$ 20.728.305,00	17,69%	
2.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO	m3	1.710,11	62.028,20	106.075.045,00	9,80	$ 607.876,00	0,57%	53,81	$ 3.337.737,00	3,15%	
2.3	EXCAVACION MANUAL EN SECO EN MATERIAL COMUN	m3	109,04	68.308,50	7.448.359,00	89,97	$ 6.145.716,00	82,51%	107,23	$ 7.324.721,00	98,34%	
2.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN SECO EN MATERIAL CONGLOMERADO	m3	72,69	71.485,70	5.196.296,00	9,16	$ 654.809,00	12,60%	9,16	$ 654.809,00	12,60%	
2.5	EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCOSO	m3	114,01	321.393,80	36.642.107,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
2.6	BOMBEO PARA MANEJO DE AGUA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, PAGADO EN hr	hr	131,76	36.897,90	4.861.667,00	12,00	$ 442.775,00	9,11%	52,00	$ 1.918.691,00	39,47%	
2.7	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA Y/O METALICO PARA EXCAVACIONES	m2	1.647,95	92.639,30	152.664.934,00	117,69	$ 10.902.719,00	7,14%	414,83	$ 38.429.561,00	25,17%	
2.8	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE	m3	137,88	90.259,00	12.444.911,00	7,00	$ 631.813,00	5,08%	92,76	$ 8.372.425,00	67,28%	
2.9	RELLENO ESTRUCTURAL PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3	272,25	106.835,30	29.085.910,00	27,04	$ 2.888.827,00	9,93%	47,66	$ 5.091.771,00	17,51%	
2.10	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	m3	4.859,53	41.836,60	203.306.213,00	248,53	$ 10.397.650,00	5,11%	777,83	$ 32.541.762,00	16,01%	
2.11	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	m3	1.135,94	92.725,10	105.330.150,00	42,76	$ 3.964.925,00	3,76%	42,76	$ 3.964.925,00	3,76%	
2.12	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	m3	971,28	125.294,00	121.695.556,00	29,53	$ 3.699.932,00	3,04%	135,91	$ 17.028.708,00	13,99%	
Subtotal					**$ 901.910.502,00**		**$ 45.736.134,00**			**$ 139.393.415,00**		
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA RED SANITARIA**											
3.1	INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC Ø 6" CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE	m	264,00	91.705,90	24.210.358,00	84,40	$ 7.739.978,00	31,97%	126,40	$ 11.591.626,00	47,88%	
3.2	INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC Ø 8" CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE	m	394,16	126.490,00	49.857.298,00	60,08	$ 7.599.519,00	15,24%	187,08	$ 23.663.749,00	47,46%	
3.3	SUM. E INST. SILLA YEE PVC Ø 6"Y/O ACCESORIO, PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA SEGÚN DISEÑO Y TRAMO DE ALCANTARILLADO Ø 8"	un	68,00	297.529,70	20.232.020,00	4,00	$ 1.190.119,00	5,88%	11,00	$ 3.272.827,00	16,18%	
Subtotal					**$ 94.299.676,00**		**$ 16.529.616,00**			**$ 38.528.202,00**		
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											
4.1	CAJILLA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, SEGÚN DISEÑO 0,60 x 0,60 m (INCL. ACERO DE REFUERZO EN TAPA)	un	44,00	819.562,90	36.060.768,00	3,00	$ 2.458.689,00	6,82%	10,00	$ 8.195.629,00	22,73%	
4.2	POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 0 < H ≤ 2,00 m (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	5.080.081,50	5.080.081,00	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 5.080.081,00	100,00%	
4.3	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 2,01 < H ≤ 3,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	6.746.766,00	6.746.766,00	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 6.746.766,00	100,00%	

CONDICIONES INICALES						EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE			TOTAL ACUMULADO			OBSERV.
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	% DE AVANCE	CANT.	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	
4.4	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 3,01 < H ≤ 4,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	2,00	8.344.339,90	16.688.679,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
4.5	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 4,01 < H ≤ 5,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	9.617.197,20	9.617.197,00	0,50	$ 4.808.599,00	50,00%	1,00	$ 9.617.198,00	100,00%	
4.6	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 5,01 < H ≤ 7,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	10.820.295,20	10.820.295,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
4.7	ACERO DE REFUERZO, PAGADO EN kg	kg	2.277,75	10.509,20	23.937.330,00	468,76	$ 4.926.293,00	20,58%	2.154,02	$ 22.637.027,00	94,57%	
Subtotal					**$ 108.951.116,00**		**$ 12.193.581,00**			**$ 52.276.701,00**		
5	**PAVIMENTOS Y CONCRETOS**											
5.1	SUM. E INST. SUB-BASE GRANULAR ESP. INVIAS	m3	331,98	250.149,90	83.044.764,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
5.2	SUM. E INST. MATERIAL DE AFIRMADO	m3	96,38	168.899,90	16.278.572,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
5.3	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e = 0,12 m	m2	1.106,62	91.874,90	101.670.602,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
5.4	REPOSICIÓN DE ANDENES e = 0,12 m EN CONCRETO 3000 PSI	m2	44,00	155.981,80	6.863.199,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
5.5	CUNETAS RATONIADAS Y ESCOBIADAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, e = 0,10 m (INCL. DILATACIONES EN MADERA PARA JUNTA EN FRIO)	m2	9,24	166.381,80	1.537.368,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
Subtotal					**$ 209.394.505,00**		**$ -**			**$ -**		
6	**PMT**											
6,1	MANEJO DE PLAN DE TRAFICO (PMT)	Un	1,00	36.592.000,00	36.592.000,00	0,40	$ 14.636.800,00	40,00%	0,70	$ 25.614.400,00	40%	
Subtotal					**$ 36.592.000,00**		**$ 14.636.800,00**			**$ 25.614.400,00**		
7	**PMA**											
7,1	IMPLEMENTACION DEL PMA	Un	1,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,40	$ 3.080.000,00	40,00%	0,70	$ 5.390.000,00	40%	
Subtotal					**$ 7.700.000,00**		**$ 3.080.000,00**			**$ 5.390.000,00**		
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.404.440.820,00**		**$ 97.860.332,32**	**6,97%**		**$ 267.941.819,32**	**19,08%**	



LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
REP. LEGAL UT ALCANTARILLADO MORELIA 2023
CONTRATISTA DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 1 DE 14

FOTO No 01	FOTO No 02
	
Ubicación: **Morelia**	Ubicación: **Morelia**
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN	VACIADO DE CONCRETO DE 4000PSI PARA PLACA DE POZO

FOTO No 03	FOTO No 04
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN	VACIADO DE CONCRETO DE 4000PSI PARA CUERPO DE POZO

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 1 DE 14

FOTO No 01	FOTO No 02
	
Ubicación: **Morelia**	Ubicación: **Morelia**
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN	VACIADO DE CONCRETO DE 4000PSI PARA PLACA DE POZO

FOTO No 03	FOTO No 04
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN	VACIADO DE CONCRETO DE 4000PSI PARA CUERPO DE POZO

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 2 DE14

FOTO No 05	FOTO No 06
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CAJAS DE INSPECCIÓN	COMPACTACIÓN DE MATERIAL COMUN EN POZO No.8

FOTO No 07	FOTO No 08
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
COMPACTACIÓN DE MATERIAL COMUN EN POZO No.8	VACIADO DE CONCRETO DE 4000PSI PARA TAPA DE POZO

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 3 DE 14

FOTO No 09	FOTO No 10
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXVACACIÓN MECANICA PARA SACO DE FALLO	FUNDICIÓN DE BORDILLO

FOTO No 11	FOTO No 12
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE	EXCAVACIÓN DE TRAMO PARA BRECHA DE TUBERÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 4 DE 14

FOTO No 13	FOTO No 14
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACIÓN MANUAL PARA BRECHA DE TUBERÍA	EXCAVACIÓN MECANICA PARA BRECHA DE TUBERÍA PRINCIPAL

FOTO No 15	FOTO No 16
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACIÓN MANUAL PARA BRECHA DE TUBERÍA	EXCAVACION MANUAL EN SECO EN MATERIAL COMUN

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 5 DE 14

FOTO No 17	FOTO No 18
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACIÓN MANUAL PARA BRECHA DE TUBERÍA	ARMADO DE ACERO DE REEFUERZO PARA POZO

FOTO No 19	FOTO No 20
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
SOLADO DE LIMPIEZA PARA POZO No.6	ENTIBADO EN MADERA

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 6 DE 14

FOTO No 21	FOTO No 22
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACIÓN MECANICA	COMPACTACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL COMUN

FOTO No 23	FOTO No 24
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA POZO	VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA POZO

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 7 DE 14

FOTO No 25	FOTO No 26
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
NIVELEACIÓN DE TRAMO	EXCAVACIÓN MANUAL PARA BRECHA DE TUBERÍA

FOTO No 27	FOTO No 28
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
ATRAQUE DE TUBERÍA	ATRAQUE DE TUBERÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 8 DE 14

FOTO No 29	FOTO No 30
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
COMPACTACIÓN DE MATERIAL COMUN	EXCAVACIÓN MANUAL PARA DOMICILIARIAS

FOTO No 31	FOTO No 32
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
CORTE DE PAVIMENTO	REPOSICIÓN DE TUBERIA DE ACUEDUCTO

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 9 DE 14

FOTO No 33	FOTO No 34
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION

FOTO No 35	FOTO No 36
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 10 DE 14

FOTO No 37	FOTO No 38
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
REPOSICIÓN DE ANDEN	REPOSICIÓN DE ANDEN

FOTO No 39	FOTO No 40
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC Ø 8” CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE Y ACCESORIO	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 11 DE 14

FOTO No 41	FOTO No 42
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA PLACA DE POZO	CORTE DE PAVIMENTO

FOTO No 43	FOTO No 44
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACIÓN MECANICA PARA BRECHA DE TUBERÍA	EXCAVACIÓN MECANICA PARA BRECHA DE TUBERÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 12 DE 14

FOTO No 45	FOTO No 46
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
VISITA APOYO A LA SUPERVISIÓN	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE 3"

FOTO No 47	FOTO No 48
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
ENTIBADO EN MADERA	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 13 DE 14

FOTO No 49	FOTO No 50
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
CAJILLA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, SEGÚN DISEÑO 0,60 x 0,60 m (INCL. ACERO DE REFUERZO EN TAPA)	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION

FOTO No 51	FOTO No 52
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACIÓN MECANICA	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS DE 12"

REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA"**	HOJA 14 DE 14

FOTO No 53	FOTO No 54
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
EXCAVACIÓN MANUAL PARA DOMICILIARIAS	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6" PARA DOMICILIARIAS

FOTO No 55	FOTO No 56
	
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
FIGUTADO E INSTALACIÓN DE ACERO PARA POZOS DE INSPECCIÓN	DEMOLICIÓN DE ANDEN

BITÁCORA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

Licitación de obra Pública de Infraestructura de agua Potable y Saneamiento Básico.

Contrato No. 55 del 04 de marzo de 2024.

Objeto del Contrato:

CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ.

Scanned with CamScanner

Contratista: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023

Ubicación: El municipio de Morelia, se encuentra localizado al suroccidente de la capital del departamento del Caquetá, esta se encuentra a 24 Kilómetros, sobre la carretera marginal de la selva, la cabecera municipal está ubicada a 1° 29'25" de latitud norte y 75°43'43" longitud oeste y tiene una altura aproximada de 258 msnm.

Fecha de Inicio: 01 de agosto de 2024.

fecha estimada de finalización:

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2024.

Scanned with CamScanner

firmas Autorizadas.

Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

Fecha: 31 de Agosto del 2024 sábado
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 3 Ayudante: 1
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Moto bomba: 1 Planta electrica: 2
electro bomba: 1 soltavin: 1
Pulidora: 1 Tranzadora: 1
Personal interventoria: Residente: 1 Inspector: 1
Clima: Despejado: soleado.
Actividades de obra:
-Se realiza relleno en material común y se compacta por capas
-Se formaletea y funde 3 anillo en pozo 7.
-Se daña tobera de gas y se repara

Fecha: 02 de Septiembre del 2024 lunes.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2.
Director: 0. Cadenero: 1
Oficial: 3 Ayudante: 1
Maestro: 1. Topografo: 1.
Herramientas y Equipos: Moto bomba: 1 Planta electrica: 2
Electrobomba: 1 Soltavin: 1.
Pulidora: 1. Tranzadora: 1.
Personal Interventoria: Residente: 1 Inspector 1
Clima: Despejado-Soleado.
Actividades de obra:
-Se realizan actividades de relleno en material común y se compacta por capas
-Se fonde caja de inspección. entre pozo 6 y 8.

Scanned with CamScanner


Fecha: 03 de Septiembre del 2024 Martes.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 3 Ayudante: 1
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 2.
Electrobomba: 1 Saltarin: 2.
Pulidora: 1 Tranzadora: 1
Personal interventoria: Residente: 1 Inspector: 1.
Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de obra:
- Se instala tuberia de domiciliaria entre pozo 6 y 8.
- Se funde tapa de pozo 3.
- Se funde tapas para cajas de inspección.
- Se funde 1 anillo de pozo 7.


Fecha: 04 de Septiembre del 2024 Miercoles.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 3 Ayudante: 1
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 2.
Electrobomba Saltarin: 2
Pulidora: 1 Tranzadora: 1
Personal Interventoria: Residente: 1 Ingeniero: 1.
Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de obra:
- Se realiza instalación de formaleta de madera y se funde la misma
- Se realiza relleno en material común y se compacta.
- Se funde tapa de pozo 4.

Fecha: 05 de Septiembre del 2024 Jueves.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 3 Ayudante: 1
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y equipos: Motobomba: 1 Planta Electrica: 2
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Pulidora: 1 Tranzadora: 1.
Personal de interventoria: Residente: 1 Inspector: 1.
Clima: Lluvioso.
Actividades de Obra:
- No se ejecutan actividades debido a fuertes lluvias.
- Se tiene visita del componente tecnico del POA, Ing Neiser, contratista Ing ana sofia Santofimio

Fecha: 06 de Septiembre del 2024. Viernes.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 3 Ayudante: 1
Maestro: 1. Topografo: 1
Herramientas y equipos: Motobomba: 1 Planta Electrica: 2
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Pulidora: 1 Tranzadora: 1
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector 1.
Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de obra:
- Demolición de cajas de inspección.
- Armado de acero de refuerzo y vaciado para tapado de cajas de inspección.
- Soldadura de malla electrosoldada existente para dejarla en sitio.

Fecha: 07 de Septiembre de 2024 Sábado.
Personal en obra: Residente 1 Inspector: 1 Maquinista: 2.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 3 Ayudante: 1
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta Electrica: 2
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Roladora: 1 Tranzadora: 1
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector 1
Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de obra:
- Se finaliza la soldadura de malla electrosoldada
- Se funde sardinel para correcta instalación de malla electrosoldada.





Fecha: 09 de Septiembre de 2024 Lunes.
Personal en obra: Residente: 1. Inspector: 1 Maquinista: 2.
Director: 0. Cadenero: 1.
Oficial: 2 Ayudante: 4.
Maestro: 1. Topografo: 1.
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta Electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2.
Roladora: 1 Tranzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajunta: 1.
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1.
Clima: Despejado-Soleado. - Llovio durante 8am - 10am.

Actividades de obra:
- Continua con demolición de cajas de inspección existente.
- Formaleteado de madera para cajas de inspección
- Vaciado de concreto para 3 cajas de inspección entre el pozo 8 y 6.

Scanned with CamScanner

- Descargue de material a la obra como cemento y tubería.
- Se recomienda usar los EPP a los trabajadores de acuerdo a la actividad que realicen.

Res Obra Res. Interventoría

Fecha: 10 de Septiembre de 2024 Martes.
Personal en Obra: Residente: 1 Inspecto: 1 Maquinista: 1
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta eléctrica: 1
Electrobomba: 1 Soldadora: 2
Pulidora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajarita: 1
Personal de Interventoría: Residente: 1 Inspector: 1
Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de Obra:
- Instalación de formaleta de madera para caja de inspección.
- Fundición de concreto para vaciado de caja de inspección.
- Armado de acero de refuerzo para tapas de caja de inspección.
-

Fecha: 11 de Septiembre de 2024 Miercoles.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 1.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 6.
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2.
Pulidora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1. Vibrocompactador: 1
Pajarita: 1.
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1.
Clima: Despejado-soleado.
Actividades de obra:
- Se realiza excavación de brecha, instalación de tubería para domiciliaria de caja de inspección, relleno de material común y compactación por capas.
- Excavación con pajarita para instalación de tubería de 8".
- Instalación de cama y atraque de arena para tubería de 8".
- Se le recuerda al contratista hacer uso del entibado para salvaguardar a los trabajadores que realizan labores en el interior de la brecha

Res. Interventoria

Fecha: 12 de Septiembre de 2024 Jueves.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 1
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Pulidora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1.
Pajarita: 1


Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1
Clima: Despejado - Soleado
Actividades de Obra:
- Entibado para excavación
- Relleno de material común y compactación por capas.
- Excavación para construcción de pozo No. 6.
- Armado de acero de refuerzo para pozo No. 6
- Vaciado de solado de limpieza para pozo No. 6.
- Vaciado de concreto para placa de pozo No. 6.
- Se le recuerda al contratista realizar la toma de muestra de concretos para los vaciados en pozos, cajas de inspección y reposición de andenes.

Res. Interventoria

Fecha: 13 de Septiembre de 2021
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 1
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Pulidora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajunta: 1
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1
Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de obra:
- Relleno de material común y compactación por capas.
- Instalación de acero de refuerzo para pozo nb. 6.
- Instalación de formaleta para pozo No. 6.


Scanned with CamScanner

- Se tiene visita del secretario de obras departamental ing Henley Suarez.



Res. Interventoria

Fecha: 14 de Septiembre de 2024
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 1.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Pulidora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajarita: 1
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1.
Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de obra
- Se realizó recolección de material de concreto y corte de pavimento para realizar acopio en un lugar determinado
- Aseo general de la obra.



Res Interventoria

Fecha: 16 de Septiembre de 2024.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 1.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 1 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Polidora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajunta: 1
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1
Clima: lluvias 10 am - 12 am.
Actividades de obra:
- Excavación para conformación de domiciliarias.
- Conformación de material comun entre pozo No. 7 y 8
- Vaciado de concreto de 4000 Psi para pozo No. 6.

Res. Interventoria

Fecha: 17 de Septiembre de 2024.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 1.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 1 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Polidora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajunta: 1
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1

Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de obra:
- Continuar con excavación para conformación de domiciliarias
- Se realiza vaciado de concreto de 4000psi pozo No.6
- Instalación de tubería y atraque para domiciliarias
- Relleno de material común y compactación por capas.

Res. Interventoría

Fecha: 18 de Septiembre de 2021.
Personal en obra: Residente 1 Inspector: 1 Maquinista: 2.
Director: 0. Cadenero: 1
Oficial: 1 Ayudante: 8.
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramientas y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 1.
Electrobomba: 1 Saltarin: 2.
Polidora: 1 Tranzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1.
Pajunta: 1
Personal de Interventoría: Residente: 1 Inspector: 1.
Clima: Despejado - soleado.
Actividades de obra:
- Corte de pavimento existente entre tramo de pozo No. 6 y No. 5.
- Armado de acero de refuerzo para tapa de pozo No. 6.
- Excavación de material para domiciliarias
- Relleno y compactación de material común.

Res. Interventoría

Fecha: 19 de Septiembre de 2024

Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1

Herramienta y Equipo: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Pulidora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajunta: 1

Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1

Clima: Despejado-Soleado.

Actividades de obra:

- Relleno de material comun por capas y compactacion.
- Conformacion de tramo entre Pozo No. 8 y No. 7 con material de granzon y compactacion con vibrocompactador.
- Se recomienda usar el material de lleno de rasante adecuado segun lo contratado, ya que en este tramo se de aplicar material de afirmado, material con una granulometria mas homogenea

Res. Interventoria

Fecha: 20 de Septiembre de 2024.

Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1

Herramienta y Equipo: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Pulidora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajunta: 1

Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1

Clima: Despejado - soleado

Actividades de obra:
- Continuan compactación con vibrocompactador y saltarin en bordes entre el tramo No.8 y No.7.
- Relleno de material común y compactación por capas.
- Limpieza general del tramo
- Reparación de andenes entre la calle 2 #4 entre Pozo No.8 y No.6.
- Se recomienda realizar el corte completo de asfalto entre tramo pz-6 al Pz-5.

Res. Interventoria

Fecha: 21 de Septiembre de 2024.
Personal de obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramienta y equipo: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Polvora: 1 Tronzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pegurite:
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1
Clima: Despejado - Soleado
Actividades de obra:
- Relleno de material común y compactación por capas.
- Instalación de formaleta y acero de refuerzo para tapa de Pozo 6.
- Vaciado de concreto para tapa de Pozo No.6.

Res Interventoria

Fecha: 23 de Septiembre de 2024.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramienta y Equipos: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Polidora: 1 Tranzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajunta: 1
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1
Clima: Soleado - Despejado
Actividades de obra:
- Excavación mecanica entre el tramo del pozo No. 6 y No 5.
- Instalación de entibado y tubería de 8" entre pozo No. 6 y No 5
- Compactación con vibrocompactador entre pozo No. 8 y No. 6.
- Relleno de material común y compactación por capas entre pozo No. 6 y No. 5.
- Instalacion de 1 tubo de 6m de 8"

Res. Interventoria

Fecha: 24 de Septiembre de 2024.
Personal en obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2. Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramienta y Equipo: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 2
Polidora: 1 Tranzadora: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajunta: 1
Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1

Clima: Despejado - Soleado
Actividades de obra:
- Se realiza excavación entre Pozo No.6 y No.5
- Instalación de tubería de 8" entre pozo No.6 y No.5
- Instalación de atraque para tubería de 8"
- Instalación de 3 tubos de 6m de 8"

Res. Interventoría

Miercoles 25 de Septiembre 2024

Personal:	Res. Obra: 1	Inspector: 1	Ope. retro oruga: 1
	Director Obra: 1	Cadenero: 1	Ope. Retrocargador: 1
	Oficiales: 2	Topografo: 1	Ope Volqueta: 2
	Maestro: 1	Ayudantes: 8	
	Res Interventor: 1	Insp. Interventoria: 1	

Total Personas: 22

Herramientes y Equipos:	Retro Oruga: 1	saltarin: 1
	Retrocargador: 1	Generador: 1
	Volqueta Sencilla: 2	Electrobomba: 1

Estado del clima: Soleado - Desejado

Actividades

7:00 Se inicia jornada con la novedad de lluvia en horas de la madrugada
Se continua con excavacion mecánica en el tramo Pz-6 al Pz-5, con chequeo de excavacion con nivel de precision.
Se continua con la conformacion de cama de arena en tramo Pz-6 al Pz-5.
Se continua con instalacion de tubería novafort de 8" en tramo Pz-6 al Pz-5.
Se continua con la conformacion de atraque de tuberia

Se realiza lleno y compactado de material seleccionado de la excavacion.

15:00 Se tiene visita del equipo interdisciplinario del PDA. Ing Neiser Castro y Ing. Ana Sofia sundelfmio como componente tecnico. Ing Lina Ortiz como componente ambiental y la Dra Paola Sierra como componente social.

16:00 Se finaliza jornada

Res. Interventoria

Jueves 26 de septiembre 2024

Personal en Obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 1 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1

Herramienta y Equipo: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 1
Polidora: 1 Tronzador: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajonta: 1

Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1

Clima: Despejado - Soleado.

Actividades de Obra:

- Continua con excavacion mecanica entre el tramo P2.6 al P25, con chapeade excavacion con nivel de precision.
- Se continua con conformacion de cama de arena en el tramo P26 al P25.
- Continua con instalacion de tuberia novafort de 8" en el tramo P26 al P25
- Continua con conformacion de atraque de tuberia.
- Se realiza lleno y compactacion por capas de material seleccionado de excavacion.

Res. Interventoria

Fecha: 27 de Septiembre de 2024

Personal de obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1

Herramienta y Equipo: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 1
Pulidora: 1 Trenzador: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajarita: 1

Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1

Clima: Despejado - Soleado.

Actividades de Obra:

- Se realiza excavación mecanica entre el tramo P_{25} al pozo existente, con chequeo de excavación con nivel de precisión.
- Se realizó instalación de tuberia rowfort de 8" entre el tramo P_{25} al pozo existente.
- Se realizó conformación de atraque de tubería.
- Se realizó instalación de entibado.
- Se utiliza material seleccionado de la excavacion para lleno de brechas
- Se realiza compactacion mecanica con saltarin.

Res. Interventoria

Scanned with CamScanner

Fecha: 28 de Septiembre de 2024.

Personal de obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 8
Maestro: 1 Topografo: 1

Herramienta y Equipo: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 1
Pulidora: 1 Tranzador: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajarita: 1

Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1

Clima: lluvias 7am - 9:30 am.

Actividades de Obra:

- Se realizó limpieza de obras de arte.
- Se realizó instalación de tubería novafort de 12", el cual existia entre el P27 al P28, para escorrentia de aguas lluvias
- Se realizó solado de limpieza para P25.

Res Interventoría

Fecha: 30 de Septiembre de 2024.

Personal de obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 2 Ayudante: 12
Maestro: 1 Topografo: 1

Herramienta y Equipo: Motobomba: 1 Planta electrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 1
Pulidora: 1 Tranzador: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pajarita: 1

Personal de Interventoria: Residente: 1 Inspector: 1.

Scanned with CamScanner

Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de Obra:
- Se realizó instalación de acero de refuerzo para placa y cuerpo de P25.
- Se realizó demolición de brecha de anden en concreto para domiciliaria entre P26 a P25.
- Excavación manual para domiciliaria entre P26 a P25.
- Fundición de placa de P25 de concreto de 4000 Psi.
- Toma de muestras de concreto de 4000 Psi.
- Instalación de tubería novafort de 6" para domiciliaria entre P26 a P25
- Bombeo para manejo de agua.

Res. Interventoría

Fecha: 01 de octubre de 2024.
Personal de obra: Residente: 1 Inspector: 1 Maquinista: 2.
Director: 0 Cadenero: 1
Oficial: 1 Ayudante: 2
Maestro: 1 Topografo: 1
Herramienta y Equipo: Motobomba: 1 Planta eléctrica: 1
Electrobomba: 1 Saltarin: 1
Roldora: 1 Tronzador: 1
Retroexcavadora: 1 Vibrocompactador: 1
Pyunto: 1
Personal de Interventoría: Residente: 1 Inspector: 1
Clima: Despejado - Soleado.
Actividades de Obra:
- Se realiza instalación de formaleta metalica para P25.
- Se realiza fundición de concreto de 4000 Psi para primer cuerpo de P25.
- Continua con excavación manual para domiciliarias entre tramo de P26 a P25.

21
31

APROBACIÓN DE POLIZAS

Florencia, 19 de marzo de 2024

Señores
Municipio de Morelia
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 55 DEL 07 DE MARZO DE 2024

Asunto: Pólizas de contrato.

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito adjuntar las pólizas de garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra No. 55, ejecutado por **UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023**.

Cordialmente,

LUIS ALBEIRO GÓMEZ RUIZ
cc.16.189.113 de Florencia Caquetá
Representante legal
UT ALCANTARILLADO MORELIA 2023

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Décimo Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2023
Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607752010

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000032197 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGE: 560 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
16	03	2024		07	03	2024	23:59 A LAS	10	08	2024	23:59 A LAS	156	16	03	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
07	03	2024	23:59 A LAS	10	08	2024	23:59 A LAS	156

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

DIRECCIÓN: DG 10 18 91 BRR LAS CIRCASIAS CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETÁ TELÉFONO: 3134956532

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

DIRECCIÓN: DG 10 18 91 BRR LAS CIRCASIAS CIUDAD: **FLORENCIA, CAQUETÁ** TELÉFONO: 3134956532

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 20 NIT : 901808237

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CAQUETÁ CIUDAD: MORELIA

DIRECCION: LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	26,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 55 DEL 07/03/2024 REFERENTE A CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA.

ASEGURADO: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 NIT: 901.808.237-6 Y/O MUNICIPIO DE MORELIA NIT: 800.095.773-4

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE MORELIA NIT: 800.095.773-4

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********222,247	$*********0.00	$ *******42,227	$ **********264,473

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560775201

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE207F080AFE7E5E

CLIENTE

YEIBUSTOS 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000032197** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000032197 **ANEXO:** 0 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 **IDENTIFICACION:** 901.808.237-6

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	UNION TEMPORAL ALCANTARILLAD	901808237-6	LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO	MORELIA	260,000,000.00	222,247	264,473

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
222,247	264,473

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607752002

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000176867 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	03	2024	16	03	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

DIRECCIÓN: DG 10 18 91 BRR LAS CIRCASIAS CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETÁ TELÉFONO: 3134956532

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE MORELIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.773-4**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MORELIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.773-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	07/03/2024	12/02/2025	140,444,082.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	07/03/2024	12/08/2027	70,222,041.00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	280,888,164.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 17640217 - QUINTERO RAMIREZ, MILTON JAVIER - PART: 20.00%
NIT 901386183 - INGEGOMEZ CONSTRUCCIONES & EQUIPOS ZOMAC SAS - PART: 70.00%
NIT 901502544 - JACO INGENIERIA ZOMAC SAS - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800095773 - MUNICIPIO DE MORELIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO No. 55 DEL 07/03/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***491,554,287.00	$ ********3,127,844	$****11,000.00	$ ******596,380	$ ********3,735,224

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560775200

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F080AFE7E5F

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000176867** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE MORELIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.773-4**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MORELIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.773-4**

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Décimo Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2023
Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607752010

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000032197 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGE: 560 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
05	08	2024	10	08	2024	23:59	05	01	2025	23:59	148	05	08	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
10	08	2024	23:59	05	01	2025	23:59	148

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

DIRECCIÓN: DG 10 18 91 BRR LAS CIRCASIAS CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETÁ TELÉFONO: 3134956532

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

DIRECCIÓN: DG 10 18 91 BRR LAS CIRCASIAS CIUDAD: **FLORENCIA, CAQUETÁ** TELÉFONO: 3134956532

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 20 NIT : 901808237

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CAQUETÁ CIUDAD: MORELIA

DIRECCION: LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	26,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 55 DEL 07/03/2024 REFERENTE A CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA.

ASEGURADO: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 NIT: 901.808.237-6 Y/O MUNICIPIO DE MORELIA NIT: 800.095.773-4

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE MORELIA NIT: 800.095.773-4

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560775201

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

YEIBUSTOS 0

CBDE207F060FFA7D5E

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000032197** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

SE REGISTRA ACTA DE INICIO EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000032197 **ANEXO:** 1 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 **IDENTIFICACION:** 901.808.237-6

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	UNION TEMPORAL ALCANTARILLAD	901808237-6	LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO	MORELIA	260,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

Somos la Décima Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2025

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2024

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607752002

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000176867 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2024	05	08	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

DIRECCIÓN: DG 10 18 91 BRR LAS CIRCASIAS CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETÁ TELÉFONO: 3134956532

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE MORELIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.773-4**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MORELIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.773-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	01/08/2024	09/07/2025	140,444,082.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/08/2024	09/01/2028	70,222,041.00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	280,888,164.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 17640217 - QUINTERO RAMIREZ, MILTON JAVIER - PART: 20.00%
NIT 901386183 - INGEGOMEZ CONSTRUCCIONES & EQUIPOS ZOMAC SAS - PART: 70.00%
NIT 901502544 - JACO INGENIERIA ZOMAC SAS - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800095773 - MUNICIPIO DE MORELIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO No. 55 DEL 07/03/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***491,554,287.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560775200

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F060FFA7C56

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000176867** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.808.237-6**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE MORELIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.773-4**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MORELIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.773-4**

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

SE REGISTRA ACTA DE INICIO EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024

CLIENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

1652
R/N

Despacho: **Secretaría Planeacion e Infraestructura**

Morelia Caquetá 19 de marzo de 2024

Señores:
UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT.901.808.237-6
DG 10 18 91 BARRIO LAS CIRCASIAS
Florencia

Asunto: Aprobación de Pólizas

Comedidamente me permito comunicarle que fue aprobada la Póliza de cumplimiento No. 560-47-994000176867, anexo 0, emitida el 16 de marzo de 2024, por Seguradora Solidaria de Colombia identificada con NIT: 860.524.654-6, amparando el Municipio de Morelia, en los siguientes riesgos:

Descripción del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	07/03/2024	12/02/2025	140.444.082.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07/03/2024	12/08/2027	70.222.041.00
Estabilidad y calidad de la obra	Ver nota aclaratoria		280.888.164.00
Valor Total Asegurado			**$ 491.554.287.00**

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.560-74-994000032197, anexo 0, emitida el 16 de marzo de 2024, por Seguradora Solidaria de Colombia, identificada con NIT: 860.524.654-6.

Descripción del Amparo	Valor Asegurado
Predios labores y operaciones	260.000.000.00
Contratistas y subcontratistas	260.000.000.00

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co -
Código postal: 185010

Proyectó: Proyectó: Leidy Johana Florez - Auxiliar Administrativo

Revisó: Paola Yineth Salinas Cifuentes - Secretaria Planeacion e Infraestructura

Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes - Secretaria Planeacion e Infraestructura

Escanea el código QR

Rce patronal	260.000.000.00
Vehículos propios y no propios	260.000.000.00
Gastos médicos	26.000.000.00
Responsabilidad civil cruzada	260.000.000.00
Valor Total Asegurado	**$ 260.000.000.00**

Dicha póliza cuenta con los anexos de condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica y fueron expedidas según lo estipulado en el contrato No.55 del 07 de marzo de 2024. Objeto "CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA CAQUETA.

Con vocación de servicio,

ING. PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

PERFIL DEL PROFESIONAL OFRECIDO E IDÓNEO

PERFIL DEL PROFESIONAL OFRECIDO E IDÓNEO				
PERFIL OFRECIDO PARA EL CARGO	**REQUISITOS DE EXPERIENCIA GENERAL**	**REQUISIETOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA**	**PERSONAL OFRECIDO**	**Cédula**
DIRECTOR DE OBRA dedicación del 20% Ingeniero civil, con postgrado en gerencia de proyectos	Quince (15) años, contados a partir de la tarjeta profesional.	Experiencia especifica en obras civiles mayor a cinco (05) años en actividades de dirección de construcción de obras de agua potable y saneamiento básico, que tenga conocimiento certificado en manejo de herramientas ofimaticas.	CARLOS MAURICIO ARISTIZABAL CARVAJAL	79,553,803
RESIDENTE DE OBRA dedicación del 100% Ingeniero civil, con postgrado en educación y gestión ambiental	Diez (10) años, contados a partir de la tarjeta profesional	Experiencia especifica en obras civiles mayor a cinco (05) años en actividades de residencia de construcción de obras de agua potable y saneamiento básico.	LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ	16,189,113
ASESOR HIDRAULICO dedicación del 50% Profesional de la ingeniería Postgrado en ingeniería Civil, con enfasis en recursos hidricos y medio ambiente.	Diez (10) años de experiencia a partir de la tarjeta profesional	Experiencia especifica en obras civiles mayor a cinco (05) años en actividades como asesor hidraulico en la construcción de obras de saneamiento básico	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	1,018,410,974
ASESOR SISOMA dedicación del 80% Profesional de la ingeniería Postgrado en gerencia en seguridad y salud en el trabajo Postgradi en gestión social y ambiental	Diez (10) años de experiencia a partir de la tarjeta profesional	Experiencia especifica en obras civiles mayor a cinco (05) años en actividades como asesor en seguridad y salud en el trabajo y/o salud ocupacional, de construcción de obras de saneamiento básico.	LUIS ARMANDO JAIME RICO	13,352,644
INSPECTOR DE OBRA 100% Tecnologo en construcción	Diez (10) años de experiencia a partir de la tarjeta profesional	Haberse desarrollado como inspector de obra de tres proyectos de infraestructura, que como mínimo dos sean de saneamiento básico y en el otro, la inspecicón de obra haya sido especificamente en temas hidrosanitarios y contemple dentro de las actividades desarrolladas inspección a: alcantarillado, instalaciones de ventilación, y desagues.	SERAFIN LAVERDE ORTEGON	17,668,003
TOPOGRAFO Tecnologo en topografía (100%)	Cuatro (04) años, contados a partir de la tarjeta profesional.	Haberse desarrollado como topógrafo en dos proyectos de saneamiento básico.	CRISTIAN ANDRES SENDOYA PEREZ	1,078,246,643

ACTA CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTOS (06/Junio/2024)

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICO**
NÚMERO DE CONTRATO:	**055 DEL 07 DE MARZO DE 2024**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 – NIT 901.808.237-6**
R.L:	**LUIS ALBEIRO GOMEZ – C.C. 16.189.113**
INTERVENTORIA:	**EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO – C.C. 1.080.290.331**
SUPERVISORA:	**PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S**

I. PARTICIPANTES

Se anexa planillas de asistencia firmada por los participantes

II. OBJETO

Socializar proyecto cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ”

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A

V. TEMAS TRATADOS

1. Saludo de apertura

Se realiza apertura de la reunión siendo las 9:30 de la mañana, brindando un saludo especial por parte del Señor alcalde Carlos Fernando Trujillo Dulcey y dando paso a la presentación de las demás partes involucradas en el proceso,

2. Presentación del contratista de obra

Se realiza la presentación por parte del contratista de obra la Union Temporal Alcantarillado Morelia 2023 – NIT 901.808.237-6 cuyo representante legal es el señor Luis Alberto Gomez.

3. Presentación del contratista de interventoría

Se realiza la presentación por parte del contratista de interventoría el señor Eduar Mauricio Gordo Barreiro.

4. Presentación de la Supervisión

Realiza la presentación la Ingeniera Paola Yineth Salinas Cifuentes como supervisora designada del contrato de obra No. 55 del 2024, de igual manera realiza la presentación el equipo del PDA quienes realizaran la supervisión del contrato de interventoría.

5. Socialización del alcance del proyecto

Se inicia la presentación y socialización de los componentes del proyecto, en los cuales se indica que la ubicación de este será en el área urbana del municipio de Morelia específicamente sobre la calle 2 entre Carrera 2 y 5.

Nuevamente se indican los datos generales del contrato como se relación a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICO**
NÚMERO DE CONTRATO:	**055 DEL 07 DE MARZO DE 2024**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 – NIT 901.808.237-6**
R.L:	**LUIS ALBERTO GOMEZ – C.C. 16.189.113**
VALOR DEL CONTRATO:	**MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($1.404.440.820) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (05) MESES**
INTERVENTORIA:	**EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO – C.C. 1.080.290.331**
SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA:	**PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S**

Se informa del alcance del proyecto el cual comprende los barrios Centro y Alameda con más de 300 metro lineales (394,16) de alcantarillado en tubería de 8”, dicho proyecto se deriva en cinco (05) capítulos, como lo son preliminares, excavaciones y rellenos, suministro e instalación

tubería red sanitaria, estructuras en concreto y pavimentos y concreto. El presente proyecto Beneficiará a cerca de 50 familias con necesidad de dirigir el agua contaminada por medio de obras de infraestructuras controladas en aspectos técnicos, ambientales y sociales.

6. Espacio para preguntas e inquietudes

Una vez se explica el alcance del proyecto se brinda un espacio para dudas y preguntas por parte de la comunidad, las cuales son atendidas una a una durante la jornada.

7. Conformación de la Veedurías ciudadana

Dentro de la jornada se brinda un espacio a la Personera Municipal Diana Patricia Solarte para socializar y conformar la veeduría del contrato de obra pública No. 55, al igual que les explica el alcance, derechos y deberes que adquiere una veeduría.

8. Cierre de la jornada

VI. COMPROMISOS PACTADOS - FECHA Y RESPONSABLES

1. Remitir copia del contrato de obra a la Personera Municipal

Para constancia, se anexa planillas de asistenta con la firma de los participantes

Alcaldía de Morelia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

FECHA: 06/06/2024 **ACTIVIDAD:** Socialización Proyecto Alcantarillado

HORA INICIO: 9:30AM **HORA FINALIZACIÒN:** 10:30AM **LUGAR:** Auditorio Concejo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Paola Salinas **CARGO:** Sec Planeación

No	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	GENERO			TIPO D.I.				NÚMERO DE DOCUMENTO	N° DE CEL/TEL	ENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL		HECHO VICTIMIZANTE	S.G.S.S.S	EPS	FIRMA O HUELLA
			F	M	OTRO	C.C	T.I	NIU	S.D				CLASE	ETNIA (SOLO PARA INDIGENA)				
	Victor Alfonso	56		X						96341163	3134283669							
	Judy salinas motta	30	X							1.110.534.595	3166829078							
	Gelen Ortiz B.	22	X							1006789609	3224350102							
		28		X						4962122	3212011231							
	Jose Ramiro Orozco C.			X						17.627.094	3214585930							
	Educ. M. Gs. de B.			X		Y				1080290331	3103892788							
	Cristian Fernando Coral			X		X				1075233184	3188605805	Interventoria						
	Omias Olmos									17.637.975	313 669 5227	Comunal.						
	SERGIO HERRERA									6803710	3144968283							SERGIO

ENFOQUE DIFERENCIAL	HECHO VICTIMIZANTE		SGSSS	EPS	
1. INDIGENA	A.C: ACTO TERRORISTA	DEL: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y	1. CONTRIBUTIVO	1. ASMET SALUD	6.FAMAC
2. AFROCOLOMBIANO	D: DESPLAZAMIENTO	H: HOMICIDIO	2.SUBSIDIADO	2. NUEVA EPS	7. OTRA
3. LGTBI	S: SECUESTRO	VIN: VINCULACIÓN NIÑ@ GRUPOS	3. POBLACION ESPECIA	3. COOMEVA	
4.HABITANTE DE CALLE	A: AMENAZA	MIN: MINAS ANTIPERSONALES	4. PPNA	4. MEDIMAS	
5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	DES: DESAPARICIÓN FORZADA	AF: ABANDANO FORZADO		5. SANITAS	

Alcaldía de Morelia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

FECHA: 06/06/2024 **ACTIVIDAD:** Socialización Alcantarillado Tramos Viales C.U.

HORA INICIO: 9:30 AM **HORA FINALIZACIÒN:** 10:30 AM **LUGAR:** Auditorio Concejo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Paola Salinas **CARGO:** Sec. Planeación

No	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	GENERO			TIPO D.I.				NÚMERO DE DOCUMENTO	N° DE CEL/TEL	ENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL		HECHO VICTIMIZANTE	S.G.S.S.S	EPS	FIRMA O HUELLA
			F	M	OTRO	C.C	T.I	NIU	S.D				CLASE	ETNIA (SOLO PARA INDIGENA)				
	Maria Sa[illegible]	59	X							26[illegible]	312[illegible]						V	
	Diana Solarte	34	X			X				1118[illegible]	3166290646	Pastusa						
	Felipe Durán C	25		X		X				1117553568	3202051255	PDA						
	Juan Carlos Andrade	25		X		X				1117986021	3214303403							
	Robert Fernando	40		X		X				6'803974	3123325452							
	Mayerly Molina E.	31	X			X				1053875751	3147740353							
	Jady Diana Flores	37	X							1.117[illegible]	3144215069							
	Jesus Alfonso M.	45		X		X				17659711	3111535272							
	Stevens Ospitia G.	28		X		X				1.117.542.560	3118735985	—	—	—	—	1	2	

ENFOQUE DIFERENCIAL	HECHO VICTIMIZANTE		SGSSS	EPS	
1. INDIGENA	A.C: ACTO TERRORISTA	DEL: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y	1. CONTRIBUTIVO	1. ASMET SALUD	6.FAMAC
2. AFROCOLOMBIANO	D: DESPLAZAMIENTO	H: HOMICIDIO	2.SUBSIDIADO	2. NUEVA EPS	7. OTRA
3. LGTBI	S: SECUESTRO	VIN: VINCULACIÓN NIÑ@ GRUPOS	3. POBLACION ESPECIA	3. COOMEVA	
4.HABITANTE DE CALLE	A: AMENAZA	MIN: MINAS ANTIPERSONALES	4. PPNA	4. MEDIMAS	
5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	DES: DESAPARICIÓN FORZADA	AF: ABANDANO FORZADO		5. SANITAS	

Alcaldía de Morelia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

FECHA: 06/06/2024 **ACTIVIDAD:** Socialización Proyecto: Contrato Tramos de Alcantarillado

HORA INICIO: 9:30AM **HORA FINALIZACIÒN:** 10:30AM **LUGAR:** Auditorio Concejo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Paola Salinas **CARGO:** Sec. Planeación

No	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	GENERO			TIPO D.I.				NÚMERO DE DOCUMENTO	N° DE CEL/TEL	ENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL		HECHO VICTIMIZANTE	S.G.S.S.S	EPS	FIRMA O HUELLA
			F	M	OTRO	C.C	T.I	NIU	S.D				CLASE	ETNIA (SOLO PARA INDIGENA)				
	Luz Andrea Gomez ortiz		X			X				38562947	3232295466	Alcaldia		N/A	H	1	2	Luz Andrea Gomez
	Carlos Fernando Tiq	36		X		X				1.117884377	3177274824	Alcaldia				1	2	
	Jeidy Tatiana Jaramillo	30	X							1010213870	3153343140	PDA		N/A				
	Yudy Nataly Garcia	40	X							40610912	3133053434	PDA						
	Andres Felipe Parra	27		X		X				1020823340	3115313537	PDA		N/A				
	John Hamilton Lozada	33		X						1117884910	3118302891	ASOJUNTAS						
	Alexander salazar	38		X		X				7697744	3216403078	Concejo						

ENFOQUE DIFERENCIAL	HECHO VICTIMIZANTE		SGSSS	EPS	
1. INDIGENA	A.C: ACTO TERRORISTA	DEL: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y	1. CONTRIBUTIVO	1. ASMET SALUD	6.FAMAC
2. AFROCOLOMBIANO	D: DESPLAZAMIENTO	H: HOMICIDIO	2.SUBSIDIADO	2. NUEVA EPS	7. OTRA
3. LGTBI	S: SECUESTRO	VIN: VINCULACIÓN NIÑ@ GRUPOS	3. POBLACION ESPECIA	3. COOMEVA	
4.HABITANTE DE CALLE	A: AMENAZA	MIN: MINAS ANTIPERSONALES	4. PPNA	4. MEDIMAS	
5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	DES: DESAPARICIÓN FORZADA	AF: ABANDANO FORZADO		5. SANITAS	

PERMISOS, LICENCIAS Y OTRAS AUTORIZACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

Despacho: **Secretaria Planeacion e Infraestructura**

RESOLUCIÓN No. 12
(julio/26/2024)

"POR LA CUAL SE CONCEDE PERMISO DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO"

LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE MORELIA EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,

CONSIDERANDO:

Que el señor LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No.16.189.113, solicito permiso de intervención del espacio público en la vía, para la construcción de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia Caquetá en la calle 2 entre carrera 2 y 4 vía Valparaíso barrio el centro y barrio alameda en el marco del contrato "CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA CAQUETA" ejecutado por UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023.

Que la Secretaría de Planeación considera procedente conceder el permiso al señor LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ, para adelantar la intervención.

En mérito de lo antes expuesto, El Secretario de Planeación Municipal en uso de sus facultades legales,

R E S U E L V E:

PRIMERO: conceder permiso de intervención del espacio público de la vía, para la construcción de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia Caquetá en la calle 2 entre carrera 2 y 4 vía Valparaíso barrio el centro y barrio alameda del municipio de Morelia Caquetá. Al señor LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.189.113 de Florencia Caquetá.

SEGUNDO: que el señor LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ deberá garantizar la correcta realización de la obra, así como la recolección y disposición final de los materiales retirados, reposición de andenes y utilizados para tal fin. Así mismo deberán realizar la delimitación del área a intervenir con los correspondientes implementos de seguridad durante la ejecución de la obra.

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co -
Código postal: 185010

Proyectó: Proyectó: Leidy Johana Florez - Auxiliar Administrativo

Revisó: Paola Yineth Salinas Cifuentes - Secretaria Planeacion e Infraestructura

Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes - Secretaria Planeacion e Infraestructura

TERCERO: Que el señor LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ, deberá, ejecutar la obra en el menor tiempo posible y garantizar que el área intervenida se dejará en buenas condiciones, esto es llevando a cabo el relleno de las brechas.

CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y contra ella proceden los recursos de la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Morelia-Caquetá, a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE OBRA - ACTIVIDADES

				mes 1				mes 2			
Capítulo	**Descripción de la actividad**	**Valor**	**Duración (semanas)**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**
1	PRELIMINARES	$ 45,593,022.00	10	$ 4,559,302.20	$ 4,559,302.20	$ 4,559,302.20	$ 4,559,302.20		$ 4,559,302.20	$ 4,559,302.20	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 901,910,502.00	11			$ 81,991,863.82	$ 81,991,863.82	$ 81,991,863.82	$ 81,991,863.82	$ 81,991,863.82	
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA RED SANITARIA	$ 94,299,676.00	8					$ 11,787,459.50	$ 11,787,459.50	$ 11,787,459.50	$ 11,787,459.50
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 108,951,118.00								$ 18,158,519.67	$ 18,158,519.67
5	PAVIMENTOS Y CONCRETOS	$ 209,394,505.00	5								
TOTOAL COSTO DIRECTO		**$ 1,360,148,823.00**		$ 4,559,302.20	$ 4,559,302.20	$ 86,551,166.02	$ 86,551,166.02	$ 93,779,323.32	$ 98,338,625.52	##########	$ 29,945,979.17
				0.34%	0.34%	6.36%	6.36%	6.89%	7.23%	8.57%	2.20%
				0.34%	0.67%	7.03%	13.40%	20.29%	27.52%	36.09%	38.29%

CRONOGRAMA DE OBRA - ACTIVIDADES

mes 3				mes 4				mes 5			
S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
$ 4,559,302.20	$ 4,559,302.20	$ 4,559,302.20	$ 4,559,302.20								
$ 81,991,863.82		$ 81,991,863.82	$ 81,991,863.82	$ 81,991,863.82	$ 81,991,863.82				$ 81,991,863.82		
	$ 11,787,459.50		$ 11,787,459.50			$ 11,787,459.50	$ 11,787,459.50				
	$ 18,158,519.67	$ 18,158,519.67		$ 18,158,519.67	$ 18,158,519.67						
		$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50
$ 86,551,166.02	$ 34,505,281.37	##########	##########	##########	##########	$ 32,726,910.00	$ 32,726,910.00	$ 20,939,450.50	##########	$ 20,939,450.50	$ 20,939,450.50
6.36%	2.54%	9.24%	8.77%	8.90%	8.90%	2.41%	2.41%	1.54%	7.57%	1.54%	1.54%
44.65%	47.19%	56.43%	65.20%	74.10%	83.00%	85.41%	87.81%	89.35%	96.92%	98.46%	100.00%

ACTAS DE COMITÉ






Objeto: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ACUEDUCTO MORELIA**	
REP. LEGAL:	**LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ**	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA		
NOMBRE	**FECHA**	**COMPROMISOS - CONCLUSIONES**
ACTA DE REUNIÓN 3	5/09/2024	-Es de suma importancia la entrega del Balance No 1 por parte del contratista para realizar todo lo pertinente a su formalización por parte de la interventoría y las partes involucradas; y poder reflejar el porcentaje de avance fisio real. -Se dio a conocer los acontecimientos presentados durante el primer mes de ejecución a cada una de las partes involucradas. -Entregar consolidado de usuario para la construcción de domiciliarias -Entrega de APU de ítem no previsto

ACTA DE REUNION

ACTA No. 3	FECHA: 5-SEPT-2024	HORA INICIO: 04:00 PM TERMINACIÓN: 06:00 PM	LUGAR: CONCEJO MUNICIPAL
PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 5, EN EL MUNICPIO DE MORELIA – CAQUETA.			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO TECNICO POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES.			
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ING PAOLA SALINAS- SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD	ASISTIÓ		FIRMA
		SI	NO	
PAOLA YINETH SALINAS	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS	X		
NEISER ANDRES CASTRO	APOYO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – GESTOR PDA	X		
ANA SOFIA SANTOFIMIO	APOYO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – GESTOR PDA	X		
YASELLY ANDREA VARGAS	AUX DE INGENIERIA	X		
CRISTIAN FERNANDO CORAL SUAREZ	INTERVENTORIA	X		
LUIS ALBEIRO GOMEZ	R.L LEGAL UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	X		

ORDEN DEL DÍA

No.	TEMÁTICA	RESPONSABLE
1	CONOCER EL ESTADO DEL AVANCE DE LA OBRA DURANTE EL PRIMER MES DE EJECUCION.	INTERVENTORIA
2	CONOCER LAS SITUACIONES PARTICULARES IDENTIFICADAS	INTERVENTORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

No.	TEMAS TRATADOS
1	Se informa a los presentes que los compromisos adquiridos en el comité No 2, se cumplieron en su totalidad. Se deja el precedente en que la suscripción del acta de inicio quedo con fecha 1 de agosto 2024 tanto para el contratista e interventoría. Desde el día 1 al 11 de agosto, el contratista realizo gestión administrativa, técnica y operativa para iniciar con la ejecución de actividades en obra. El contratista inicia la ejecución de actividades en obra el día lunes 12 de agosto 2024.
2	Durante el desarrollo de actividades en este primer mes, se han identificado una seria de situaciones las cuales se dan a conocer a continuación: 1. **DOMICILIARIAS:** Se he evidenciado diferencia en la cantidad de domiciliarias contractuales, versus las reales en campo. Se evidencia que hay cajas de inspección que se encuentran a la vista, como hay unas que no. Al igual, que hay unas cajas de inspección que se encuentran sobre anden que cuentan con acabados en enchape. Durante la ejecución de actividades realizada por el contratista durante este primer mes, se han acercado usuarios beneficiarios de esta reposición de alcantarillado, y han solicitado que se le construya la respectiva domiciliaria. Por ende, se le hace traslado a la secretaria De Planeación E Infraestructura Y De Las TICS para que nos acredite la cantidad de domiciliarias, de acuerdo al castro de usuarios de agua potable. 2. **INTERVENCION DE VIA PZ-6 AL PZ-5** El contratista manifiesta que el día 9 de septiembre del año en curso, se obtiene respuesta por parte de la entidad que tiene a cargo este tremo de vía. Adicional a ello, se identifica que este tramo cuenta con una capa de asfalto MDC; de acuerdo a esto, se generaría la creación de un ítem no previsto. Se le solicita al contratista realizar la entrega del respectivo APU de dicho ítem con sus respectivas cotizaciones y análisis del mercado. 3. **VEEDURIA** En el lapso de este primer mes de ejecución de actividades, se ha evidenciado una frecuente ausencia de los miembros de la veeduría. Se invita al componente social de las partes realizar un acercamiento con la veeduría para recodarles la importancia del roll que están ejerciendo.

No.	TEMAS TRATADOS
	4. DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION En vista que en el departamento del Caquetá no cuenta con una empresa acreditada para la disposición de RCD, se le hace el traslado a la secretaria De Planeación E Infraestructura Y De Las TICS para que disponga de un lote para tal propósito, teniendo en cuenta la normatividad colombiana ambiental y demás que se encentren vigentes. **5. BALANCE** Teniendo en cuenta lo mencionado en los puntos anteriores, este proyecto se deberá balancear para obtener el alcance físico, financiero y social real. Para la realización de este balance, se debe realizar un trabajo de campo en conjunto entre personal técnico por parte del contratista e interventoría para unificar cantidades y evitar discrepancias al momento de conciliar dicho balance entre las partes. **6. REPROGRAMACION** Teniendo en cuenta que se va a realizar el Balance No 1, se solicita que paralelo al envío de dicha información, se envíe la reprogramación respectiva al caso; con esto se logra obtener los porcentajes de avance físico vs programado reales.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Entregar consolidado de usuario para la construcción de domiciliarias	SECRETARIA DE PLANEACION	13-Sept-2024
2	Entrega de APU de ítem no previsto	CONTRATISTA	16-Sept-2024
3	Entrega de Balance No 1	CONTRATISTA	19-Sept-2024

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS COMITÉ No 2

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
1. Es de suma importancia la entrega del Balance No 1 por parte del contratista para realizar todo lo pertinente a su formalización por parte de la interventoría y las partes involucradas; y poder reflejar el porcentaje de avance fisio real. 2. Se dio a conocer los acontecimientos presentados durante el primer mes de ejecución a cada una de las partes involucradas.

ANEXOS SI (X) NO ( )

Lista de asistencia

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

FECHA: 05/09/2024 ACTIVIDAD: Comité Técnico Alcantarillado (Tramos)

HORA INICIO: 4PM HORA FINALIZACIÒN: 6PM LUGAR: Morelia - Concejo Municipal

FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	GENERO			TIPO D.I.				NÚMERO DE DOCUMENTO	N° DE CEL/TEL	ENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL		HECHO VICTIMIZANTE	S.G.S.S.S	EPS	FIRMA O HUELLA
			F	M	OTRO	C.C	T.I	NIU	S.D				CLASE	ETNIA (SOLO PARA INDIGENA)				
1	Ana Sofia Santofimio	21	X			X				1006508029	3178166682	PDA Gobernación						AnaSofiaSC.
2	Neiser Andres Castro	33		X		X				1112102662	3143088958	PDA Caquetá						
3	Luis Alcira Gomez	42		X		X				16.189.113	3123756223	contratista RPL.						
4	Yaselly Andrea Vargas N	25	X			X				1.234.643.874	3124070100	Aux. Contratista						Yaselly Vargas N.
5	Paola Lineth Salinas	42	X			X				36309968	3102567668	Mpio Morelia SPI		N/A		1	2	
6	Cristian Fernando Cruz	35		X		X				1075.233.184	3188605805	Interventor		0		1	5	

ENFOQUE DIFERENCIAL	HECHO VICTIMIZANTE		SGSSS	EPS	
1. INDIGENA	A.C: ACTO TERRORISTA	DEL: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y	1. CONTRIBUTIVO	1. ASMET SALUD	6.FAMAC
2. AFROCOLOMBIANO	D: DESPLAZAMIENTO	H: HOMICIDIO	2.SUBSIDIADO	2. NUEVA EPS	7. OTRA
3. LGTBI	S: SECUESTRO	VIN: VINCULACIÓN NIÑ@ GRUPOS	3. POBLACIONESPECIA	3. COOMEVA	
4.HABITANTE DE CALLE	A: AMENAZA	MIN: MINAS ANTIPERSONALES	4. PPNA	4. MEDIMAS	
5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	DES: DESAPARICIÓN FORZADA	AF: ABANDANO FORZADO		5. SANITAS	

OFICIOS

RADICADOS

U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

Alcantarilladomorelia23@gmail.com

Florencia Caquetá 04 de Septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Atte, ING JOSE RICARDO BURBANO
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ
Transversal 11 No.19-34/48
Barrio La Inmaculada
Florencia Caquetá

REF: "CONSTRUCCIÓN *DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ*"

ASUNTO: Solicitud de permiso para uso de zona de vía

Respetado Ingeniero Burbano

La **UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023**, por medio de la presente, requiere realizar intervención (excavación) del tramo comprendido entre K0+000 al K0+040 de la Vía Morelia - Valparaíso, toda vez que, se presenta en el tramo paso de la tubería a instalar de 8", comprendido entre el pozo 5 y pozo 6, por dicha razón se solicita al Instituto Nacional de Vías el permiso para uso de zona de vía, agradecemos su pronta respuesta.

Atentamente,

LUIS ALBEIRO GÓMEZ RUIZ
cc.16.189.113 de Florencia Caquetá Representante legal
UT ALCANTARILLADO MORELIA 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTION DE INNOVACION Y REGLAMENTACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA **SOLICITUD DE PERMISO PARA USO ZONA DE VIA**	CÓDIGO	MINREI-FR-80		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

Fecha 4/09/2024 Ciudad Morelia - Caquetá Dirección Territorial Caquetá

1. Solicitante

Nombre del solicitante: UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023

Persona natural [ ] Persona Jurídica [X]

Cedula de ciudadanía o NIT: 901808237-6

2. Datos para Notificación:

Departamento: Caquetá Municipio: Florencia

Dirección: Calle 14E #14-78 Este Barrio Chapinero

Ciudad: Florencia-Caquetá Correo electrónico: utalcantarilladomorelia23@gmail.com

Teléfono: 3134956532 Celular: 3134956532

3. Información General

Tipo de vía: Carretera [x] Fluvial [ ] Férrea [ ]

Objeto del permiso: El contrato, el cual tiene por objeto "Construcción de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia, Caquetá" ve la necesidad de intervenir en el punto inicial PR0+000 al punto final PR0+93.24 con actividades de excavación, para la instalación de tubería PVC con diametro de 8", para llevar a cabalidad el objeto del contrato.

Localización del proyecto: Vía Morelia Valparaiso Ruta K0+000 inicial K 0+040 final.

Costo de las obras objeto del permiso: MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($1.404.440.820,00) MCTE

Costo de las obras de reposición: VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($27.158.148,00) MCTE

Plazo de ejecución (Días calendario): 75 días

4. Sí el permiso es para adecuación o la construcción de los carriles de entrada y salida a predios colindantes a la vía nacional, indicar la siguiente información:

Numero(s) de matricula inmobiliaria:


Circulo Registral:

Departamento:

Municipio:

Nota 1: El peticionario a través del diligenciamiento y firma del presente formulario autoriza al Instituto Nacional de Vías, para que realice las consultas relacionadas con la Tradición y Libertad del inmueble (en caso de que la solicitud sea para la construcción de accesos), la existencia y Representación Legal de la empresa y Registro Unico Tributario (en los casos en los que se requiera) ante las entidades encargadas.

Nota 2: Para el diligenciamiento de este formulario, así como para anexar los documentos de soporte de la presente solicitud, deberán seguirse todas las recomendaciones señaladas en el https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T3380



Firma y nombre: LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
Cedula: 16.189.113
Razón social: UT ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

Alcantarilladomorelia23@gmail.com

Florencia Caquetá 12 de Septiembre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNCIPAL DE MORELIA
Atte, PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

REF: "CONSTRUCCIÓN *DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ*"

ASUNTO: Solicitud de permiso pará rutas alternas

Respetado Ingeniera Salinas

La **UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023**, por medio de la presente, requiere de su aprobación para las rutas alternas, con el fin de encomendar las actividades de obras, el cual se efectuará en la calle 2 entre carrera 2 y 4 vía a Valparaíso barrio el centro y barrio alameda Del municipio de Morelia, Caquetá como se aprecia en la siguiente imagen:



ALCALDIA DE MORELIA
VENTANILLA UNICA
RADICADO POR: ERIKA GUACA
FECHA: 12 SEP 2024
HORA: 4:16 pm
No. FOLIOS: (0)
No. RADICACION: 0001152
TELEFONO:

Scanned with CamScanner

U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

Alcantarilladomorelia23@gmail.com

Por dicha razón se ha analizado en el sitio las siguientes rutas alternas:

Durante toda la ejecución del contrato para la movilización de las mulas las rutas alternas son las siguientes, vía Valparaiso una cuadra antes de la entrada de Morelia se observa un desvío ingresando a la calle 6 B/ Angel Ricardo, como el que se encuentra en la siguiente foto:



Ingresando a la Carrera 5 para luego tomar la Calle 4 o Calle 5, saliendo por la ruta principal 6502 en la Carrera 2, esta ruta funciona en doble sentido para entrada y salida de mulas, se observa en la siguiente imagen:



Scanned with CamScanner


U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

Alcantarilladomorelia23@gmail.com

El ingresa de carros pequeños y camiones será entre toda la Carrera 5 para luego tomar la Calle 4 o Calle 5, saliendo por la ruta principal 6502 en la Carrera 2, esta ruta funciona en doble sentido para entrada y salida.



Y para la intervención del pozo N5 y N1 el cual comprende entre la Carrera 2 y Carrera 4, para carros y camiones se dispondrá la entrada y salida entre la Carrera 4 tomando la Calle 4 saliendo por la ruta principal 6502 en la Carrera 2.

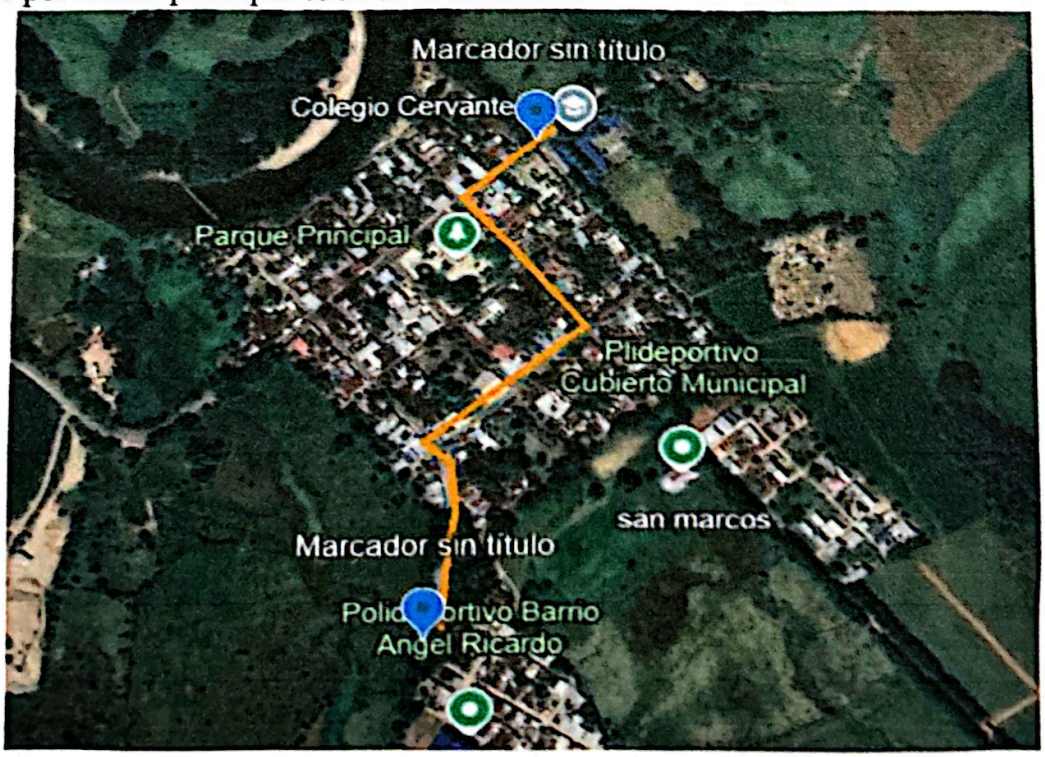

Scanned with CamScanner

U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

Alcantarilladomorelia23@gmail.com

Por lo que se solicita la aprobación y divulgación a la comunidad, de las rutas pertinentes, el cual se espera llevar a cabo la próxima semana para la intervención de actividades de obra, agradecemos su pronta respuesta.

Atentamente,

LUIS ALBEIRO GÓMEZ RUIZ
cc.16.189.113 de Florencia Caquetá Representante legal
UT ALCANTARILLADO MORELIA 2023

Scanned with CamScanner

U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

utalcantarilladomorelia23@gmail.com

Florencia Caquetá 19 de septiembre de 2024

ALCALDIA DE MORELI
VENTANILLA UNICA
RADICADO POR: Natalia cat
FECHA: 19 SEP 2024
HORA: 4:19 pm
No. FOLIOS: (0)
No. RADICACION: 0001188
TELEFONO:

Señores
ALCALDIA MUNCIPAL DE MORELIA
Atte, PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL


REF: "CONSTRUCCIÓN *DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ*"

ASUNTO: Fechas de intervención para la "CONSTRUCCIÓN *DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ*".

Cordial saludo

Mediante el presente documento, informo la duración que tendrá la intervención del tramo de la calle 2 entre carrera 5 y 2, donde daré a conocer las rutas alternas que se utilizaran durante este tiempo.

La intervención de estos tramos se hará en dos secciones, la primera sección comprende el tramo de la calle 2 entre carrera 5 a 4 (Pz8 a Pz5); la sección dos comprende el tramo de la calle 2 entre carrera 4 a carrera 2 (Pz5 a Pz1)

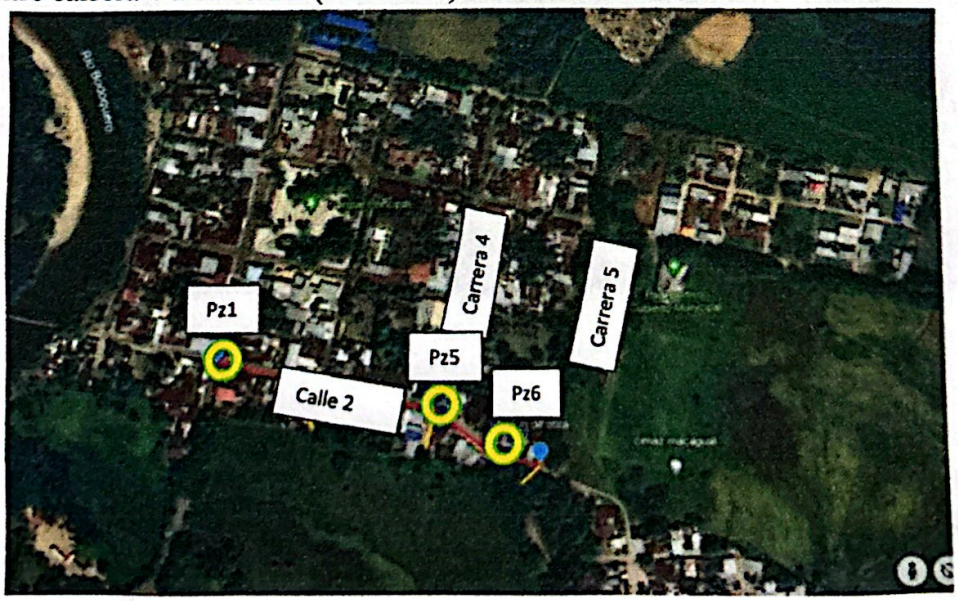

Scanned with CamScanner

U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

utalcantarilladomorelia23@gmail.com


Sección 1. Calle 2 entre carrera 5 a carrera 4

Para la ejecución de las actividades en la sección 1 se estima una duración de 3 semanas, por ende, se plantean las siguientes rutas vehiculares de carga pesada y liviana.

Carga pesada:

Para el ingreso de los vehículos de carga pesada provenientes de Florencia o Belén con dirección a Valparaíso, deberán ingresar por la calle 4 (Parque principal) y transitarán hasta la carrera 5 donde serán orientados por las auxiliares viales.

Para la salida de los vehículos de carga pesada provenientes de Valparaíso con dirección hacia Belén o Florencia, serán orientados por las auxiliares viales hasta tomar la carrera 5 con dirección a la calle 5.

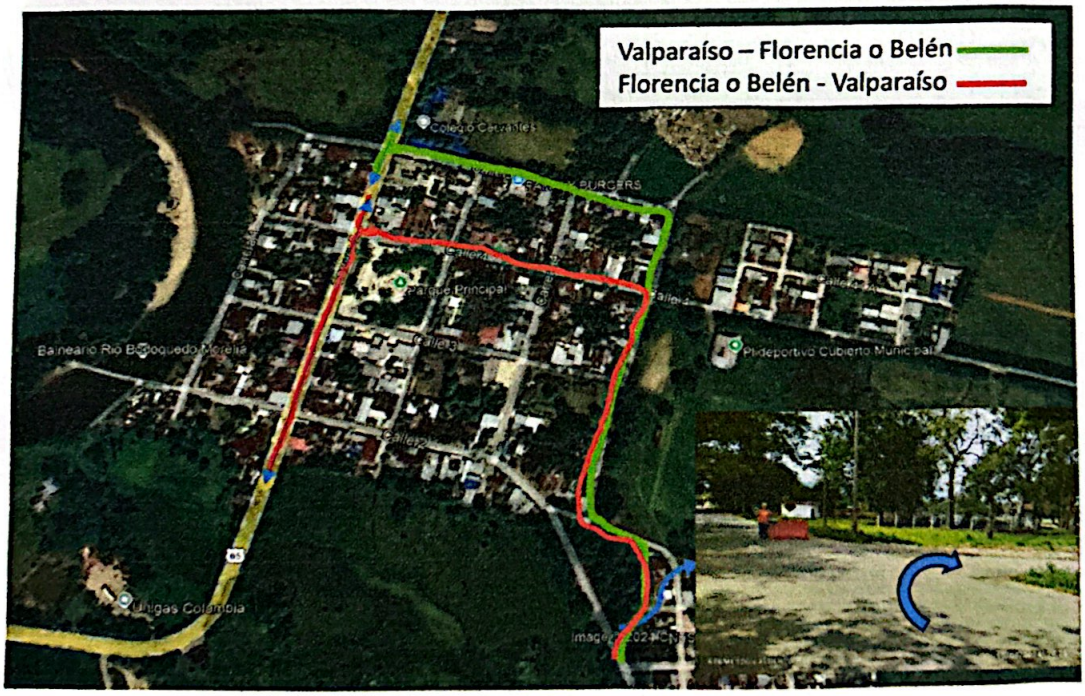

Carga Liviana


Para el ingreso de los vehículos de carga liviana provenientes de Florencia o Belén con dirección a Valparaíso, deberán ingresar por la calle 4 (Parque principal) y transitarán hasta la carrera 5 donde serán orientados por las auxiliares viales.

Scanned with CamScanner

U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

utalcantarilladomorelia23@gmail.com

Para la salida de los vehículos de carga liviana provenientes de Valparaíso con dirección hacia Belén o Florencia, serán orientados por las auxiliares viales hasta tomar la carrera 5 con dirección a la calle 5.

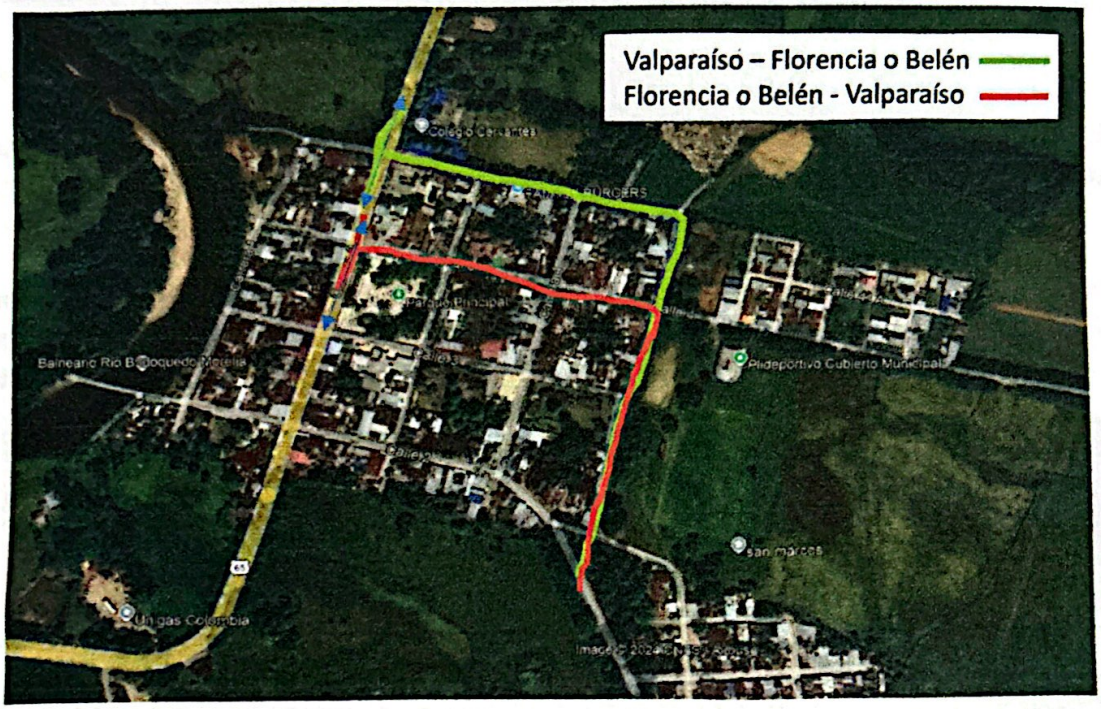

Scanned with CamScanner

U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

utalcantarilladomorelia23@gmail.com


Sección 2. Calle 2 entre carrera 4 a carrera 2

Para la ejecución de las actividades en la sección 2 se estima una duración de 10 semanas, el cual empieza a transcurrir el tiempo después de culminar la primera sección, por ende se plantean las siguientes rutas vehiculares de carga pesada y liviana.

Carga pesada:

Para el ingreso de los vehículos de carga pesada provenientes de Florencia o Belén con dirección a Valparaíso, deberán ingresar por la calle 4 (Parque principal) y transitarán hasta la carrera 5 donde serán orientados por las auxiliares viales.

Para la salida de los vehículos de carga pesada provenientes de Valparaíso con dirección hacia Belén o Florencia, serán orientados por las auxiliares viales hasta tomar la carrera 5 con dirección a la calle 5.

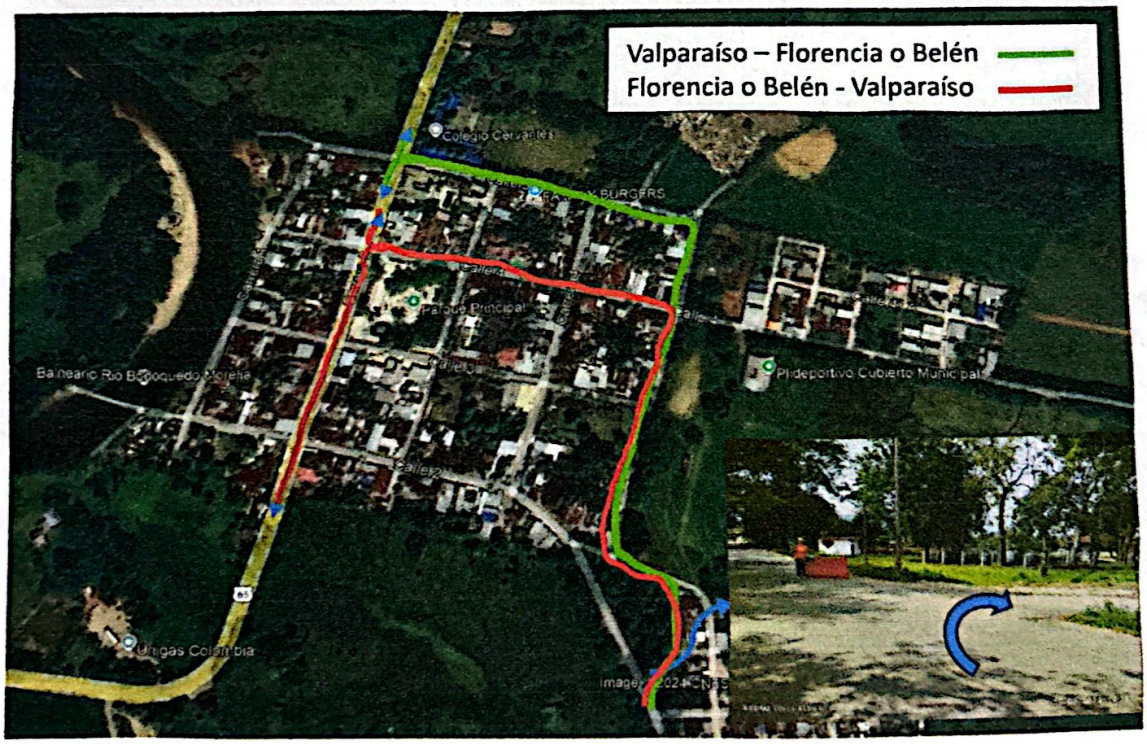

Carga Liviana


Para el ingreso de los vehículos de carga liviana provenientes de Florencia o Belén con dirección a Valparaíso, deberán ingresar por la calle 4 (Parque principal) y transitarán hasta la carrera 4 ingresando por la calle 2 donde serán orientados por las auxiliares viales.

Scanned with CamScanner

U.T. ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6

utalcantarilladomorelia23@gmail.com

Para la salida de los vehículos de carga liviana provenientes de Valparaíso con dirección hacia Belén o Florencia, deberán transitar por la calle 2 donde serán orientados por las auxiliares viales ingresando a la carrera 4 hasta llegar a la calle 5.

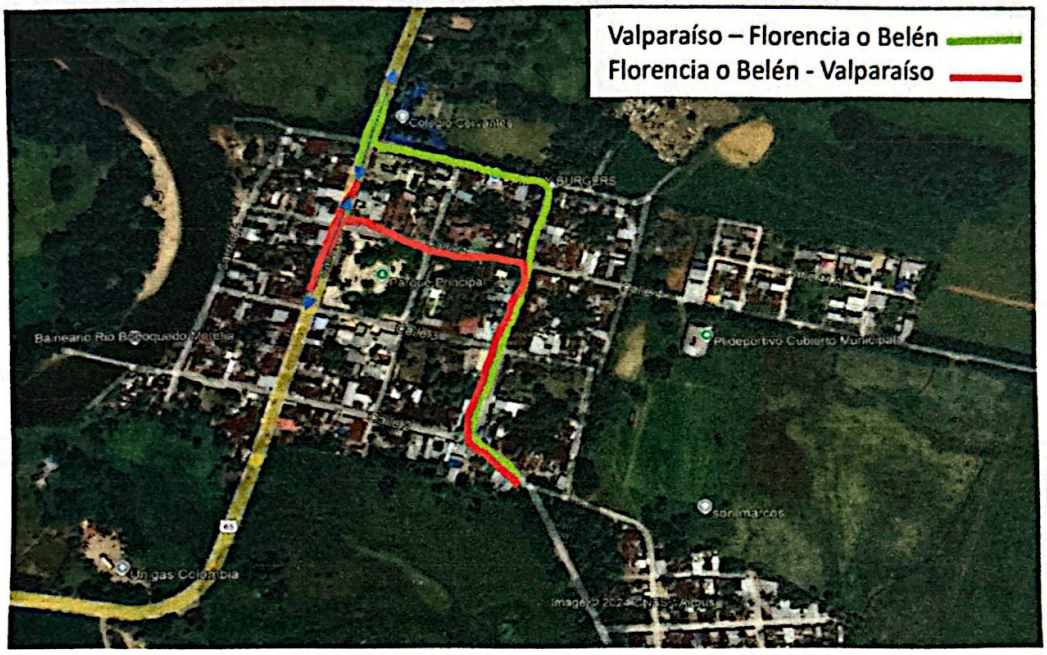

Informamos que el día de hoy 19 de septiembre del presente año iniciamos con la pedagogía a los vehículos que circulan por esta ruta; dicho esto le queremos informar que el día de mañana viernes 20 de septiembre daremos inicio a la intervención en el tramo Pz6 a Pz5. Por consiguiente, le solicitamos como es costumbre su oportuna gestión en divulgar en los medios oficiales el contenido de este documento y evitar traumatismos a la comunidad.

Agradecemos su pronta y oportuna gestión.

Atentamente,

LUIS ALBEIRO GÓMEZ RUIZ
cc.16.189.113 de Florencia Caquetá Representante legal
UT ALCANTARILLADO MORELIA 2023

Scanned with CamScanner

RECIBIDOS

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

Neiva, 27 de Septiembre 2024

INT-MOR-020

SEÑORES:
UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT No 901.808.237-6
R. LEGAL LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
Contratista de Obra
Correo: utalcantarilladomorelia23@gmail.com

Referencia:
Contrato de interventoría
No 202400000500 de Mayo de 2024

OBJETO:
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

Asunto: **INCUMPLIMIENTO AL PMT**.

Respetados ingenieros

De manera atenta solicito se sirva darle cumplimiento al PMT suministrado por ustedes; a razón de que a la fecha no se cuenta con la señalización mínima requerida para la orientación de los vehículos que están tomando las rutas alternas.

Recordarle que esta señalización debe cumplir su principal objetivo de orientar a todos los vehículos que transitan diariamente en entre las rutas (**Florencia o Belén hacia Valparaíso y viceversa**), y adicionalmente, se debe garantizar a los conductores legibilidad y entendimiento en horas del día y noche; con esto, se minimiza el malestar social que se ha venido presenciando en el transcurrir de esta semana.
Por favor atender esta solicitud a la menor brevedad, teniendo en cuenta que llega el fin de semana y aumenta el tránsito vehicular tipo livianos y pesados por estas rutas.

Agradezco su oportuna gestión.

Atentamente,

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

Neiva, 27 de Septiembre 2024

INT-MOR-021

SEÑORES:
UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT No 901.808.237-6
R. LEGAL LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
Contratista de Obra
Correo: utalcantarilladomorelia23@gmail.com

Referencia:
Contrato de interventoría
No 202400000500 de Mayo de 2024

OBJETO**:**
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

Asunto: **RESULTADOS DE FALLOS DE CILINDROS DEL DISEÑO DE MEZCLA**.

Cordial saludo

De acuerdo al correo recibido el día 18 de septiembre del presente año, se solicita enviar a esta interventoría los resultado de laboratorio de fallos de cilindro del diseño de mezcla, debido a que en la información adjunta en el correo, no contaba con ese registro.

Lo anterior es con el objetivo de validar que las dosificaciones sugeridas estén cumpliendo para obtener las resistencias de los concretos preparados en obra.

Agradezco su oportuna gestión.

Atentamente,

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

Neiva, 27 de Septiembre 2024

INT-MOR-022

SEÑORES:
UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT No 901.808.237-6
R. LEGAL LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
Contratista de Obra
Correo: utalcantarilladomorelia23@gmail.com

Referencia:
Contrato de interventoría
No 202400000500 de Mayo de 2024

OBJETO**:**
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

Asunto: **RESULTADOS DE LABORATORIO DE CONCRETOS DE POZOS.**

Cordial saludo

De acuerdo al avance físico que refleja el proyecto en cuestión, solicito se envié a la menor brevedad los respectivos resultados de laboratorio de concreto de los pozos Pz-3, Pz-4, Pz-7 y Pz-6, los cuales ya se encuentras construidos en su totalidad

Agradezco su oportuna gestión.

Atentamente,

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

PLANILLA DE SS DEL MES DE SEPTIEMBRE

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79533803	CARLOS MAURICIO ARISTIZABAL CARVAJAL	CALLE 10 No 79-15 TORRE 1 - APTO 303	7041713	lalita547@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	22/10/2024	81106966	$375.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	20	2.400	0	164.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	20	3.000	0	211.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	164.900
Pensión	1	208.000	211.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	375.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79533803	CARLOS MAURICIO ARISTIZABAL CARVAJAL	CALLE 10 No 79-15 TORRE 1 - APTO 303	7041713	lalita547@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	22/10/2024	81106966	$375.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79533803	ARISTIZABAL CARVAJAL CARLOS MAURICIO	3	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 16189113	0	LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ	I	000	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	DIAGONAL 10 18 91		4356415			ALBEIROGOMEZ@INGENIEROS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-09	30776562	I	2024-10-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	462.800	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30776562	2024-10-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 16189113	GOMEZ RUIZ LUIS ALBEIRO	1.300.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	461.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 16189113	0	LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ	I	000	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	DIAGONAL 10 18 91		4356415			ALBEIROGOMEZ@INGENIEROS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-09	30776562	I	2024-10-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	462.800	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30776562	2024-10-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	800	0	208.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	800	0	208.800
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	600	0	163.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	600	0	163.100
ARP(Administradoras: 1)				1	90.500	0	400	0	90.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	90.500	0	400	0	90.900
Gran Total					461.000	0	1.800	0	462.800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018410974	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL	TV 50 No 69B 44 SUR	7188430	gallegol74@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CAQUETÁ	FLORENCIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	02/10/2024	80712153	$402.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018410974	DIEGO ARMANDO GALLEGO MURIEL		TV 50 No 69B 44 SUR	7188430	gallegol74@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CAQUETÁ	FLORENCIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	02/10/2024	80712153	$402.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018410974	GALLEGO MURIEL DIEGO ARMANDO	59	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13352644		JAIMES RICO LUIS ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 ESQ	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4380000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	970922501	9475244375	I	2024/09/11	2024/10/09	BANCOLOMBIA	28	$258,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	13352644	JAIMES RICO LUIS ARMANDO	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales - Independiente pensionado activo	0	No	No		X	2024/08/01																												

Total **Afiliados(1)**

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		COMPENSAR	30	$ 1.300.000	12,5%	$ 162.500	$
																					$ 0						$ 162.500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 162.500			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 162.500						$ 0						$ 90.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13352644		JAIMES RICO LUIS ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 ESQ	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4380000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	970922501	9475244375	I	2024/09/11	2024/10/09	BANCOLOMBIA	28	$258,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$1,900	$0	$92,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$1,900	$0	$92,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$3,400	$0	$165,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$3,400	$0	$165,900
TOTAL				**1**	**$253,000**	**$5,300**	**$0**	**$258,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901808237	6	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS ALBEIRO GOMEZ	DG 10 18 91	FLORENCIA-CAQUETA	3123956333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1039898582	9477120811	E	2024/10/09	2024/11/12	BANCOLOMBIA	34	$1,110,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	17668003	LAVERDE ORTEGON SERAFIN																		231001	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901808237	6	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS ALBEIRO GOMEZ	DG 10 18 91	FLORENCIA-CAQUETA	3123956333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1039898582	9477120811	E	2024/10/09	2024/11/12	BANCOLOMBIA	34	$1,110,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$13,600	$0	$573,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$560,000	$13,600	$0	$573,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,600	$6,000	$0	$249,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$243,600	$6,000	$0	$249,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$3,400	$0	$143,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$140,000	$3,400	$0	$143,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$3,400	$0	$143,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$140,000	$3,400	$0	$143,400
TOTAL				**1**	**$1,083,600**	**$26,400**	**$0**	**$1,110,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1078246643		SENDOYA PEREZ CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 2A Bis # 6-35 Barrio Andes Alto	FLORENCIA-CAQUETA	3134841618	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	953152724	9474403876	I	2024/10/10	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1078246643	SENDOYA CRISTIAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total			**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$370,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1078246643		SENDOYA PEREZ CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 2A Bis # 6-35 Barrio Andes Alto	FLORENCIA-CAQUETA	3134841618	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	953152724	9474403876	I	2024/10/10	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901808237	6	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS ALBEIRO GOMEZ	DG 10 18 91	FLORENCIA-CAQUETA	3123956333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	996472779	9475749736	E	2024/10/09	2024/10/22	BANCOLOMBIA	13	$4,145,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1006521703	ALDANA BARREIRO LINDA XIOMARA	X																	230301	12	ESSC62	12	CCF13	12	14-23	12	12	Si
2	CC	1006521453	CALDERON CALDERON GABRIEL																		230301	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
3	CC	96362474	CALDERON NARANJO MARIO																		231001	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
4	CC	17642378	CALDERON VASQUEZ VICTOR JULIO	X																	25-14	19	ESSC62	19	CCF13	19	14-23	19	19	Si
5	CC	1006521642	CALDERON CALDERON YEFERSON FABIAN	X																	230301	3	EPS002	3	CCF13	3	14-23	3	3	Si
6	CC	1117884157	CAVICHE RAMIREZ SEBASTIAN	X																	230301	3	ESSC62	3	CCF13	3	14-23	3	3	Si
7	CC	17648840	CELIS TOVAR JAIRO	X																	230301	10	ESSC62	10	CCF13	10	14-23	10	10	Si
8	CC	17605239	CHAUX YATE JUAN CARLOS	X																	25-14	3	ESSC62	3	CCF13	3	14-23	3	3	Si
9	CC	11002724	GUERRA ARRIETA BIGAIEL																		25-14	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
10	CC	4957317	HURTADO GARCIA ALBERTO	X																	230201	12	EPS037	12	CCF13	12	14-23	12	12	Si
11	CC	1117784579	LUNA SILVA WILEN																		230301	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
12	CC	1006521513	PIRACOA AGUDELO SORAYA YANINE	X																	230301	12	ESSC62	12	CCF13	12	14-23	12	12	Si
13	CC	16187820	RAMIREZ GURRUTE RUBINSE	X																	230301	19	ESSC62	19	CCF13	19	14-23	19	19	Si
14	CC	1006549114	RIVERA GOMEZ ANDRES	X																	230301	3	ESSC62	3	CCF13	3	14-23	3	3	Si
15	CC	17637979	ROBLES TRUJILLO ARMANDO																		231001	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
16	CC	1115796242	SEGURA OME YILMER ALEXANDER																		230301	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
17	CC	1117885090	VALENZUELA CANTILLO FERNANDO																		230301	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	30	Si
Total	**Afiliados(17)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901808237	6	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS ALBEIRO GOMEZ	DG 10 18 91	FLORENCIA-CAQUETA	3123956333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	996472779	9475749736	E	2024/10/09	2024/10/22	BANCOLOMBIA	13	$4,145,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$2,121,800	$19,900	$0	$2,141,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$3,900	$0	$419,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$360,600	$3,400	$0	$364,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,262,000	$11,800	$0	$1,273,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$83,200	$800	$0	$84,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$923,500	$8,600	$0	$932,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$923,500	$8,600	$0	$932,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$530,600	$5,000	$0	$535,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	17	$530,600	$5,000	$0	$535,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$530,600	$5,100	$0	$535,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$140,600	$1,400	$0	$142,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$384,800	$3,600	$0	$388,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$5,200	$100	$0	$5,300
TOTAL				**17**	**$4,106,500**	**$38,600**	**$0**	**$4,145,100**

INFORME SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE

2024

SEGUNDO INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2024.

"Construcción de Tramos de Alcantarillado en el Municipio de Morelia Departamento del Caquetá"



01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA
NIT: 901808237-6.

Alcaldia de Morelia

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCION 4
2. JUSTIFICACIÓN 5
3. ALCANCE 5
4. OBJETIVOS 6
   4.1 GENERAL 6
   4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 6
5. PRELIMINARES DE OBRA 7
6. DIAGNOSTICO ZONA DE INFLUENCIA DIRACTA DEL PROYECTO 7
   6.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 7
   6.2 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 7
   6.3 AREA DE INFLUENCIA 8
7. SISTEMA BIOFISICO 9
   7.1 GEOLOGIA Y SUELOS 9
   7.2 CLIMA 10
   7.3 PRECIPITACION 10
   7.4 ACCESO A LA LOCALIDAD 11
   7.5 RUIDO AMBIENTAL 11
   7.6 COMPONENTE SOCIAL 11
      7.6.1 ASPECTOS CULTURALES 11
      7.6.2 ECONOMÍA 11
      7.6.3 NIVEL DE SERVICIOS PÚBLICOS 12
8. DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA 12
   8.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS VIVIENDAS 12
9. ACTIVIDADES REALIZADAS PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 14
   9.1 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 14
      9.1.1 ACTIVIDADES GESTIÓN COMUNITARIA 14
10. ESTADÍSTICAS ACTAS DE CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDAS (Actas de Vecindad) BARRIO ALAMEDA Y CENTRO. 17
11. CENSO DE BENEFICIARIOS BARRIO ALAMEDA Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE MORELIA. 26

12. PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. 35
13. VALLA INFORMATIVA. 36
14. INTERFERENCIAS PRESENTADAS DURANTE LA OBRA. 36
16. PERSONAL DE LA REGIÓN. 39

1. INTRODUCCION

Tener un sistema adecuado para la evacuación y tratamiento de aguas residuales es un anhelo para muchas comunidades rurales, que a menudo deben desechar estas aguas de manera abierta, ya sea en las cunetas de las calles o en los patios. Esta práctica puede generar una emergencia sanitaria, debido al riesgo de brotes virales e infecciones, así como a la proliferación de diversos vectores. Estos problemas no solo ponen en peligro la salud de la población, sino que también afectan negativamente la economía, el medio ambiente y la calidad de vida en general.

Razón por la cual se hizo necesario adelantar el proceso de selección con el fin de contratar los servicios de persona natural o jurídica con la capacidad jurídica, técnica y financiera capaz de ejecutar el objeto y alcance del presente proceso contractual. El contrato de obra le fue adjudicado a la **UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023** y la Interventoría a la obra le fue adjudicada al **Ing. EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO**. Dicho contrato tiene como objeto la **"Construcción de Tramos de Alcantarillado en el Municipio de Morelia Departamento del Caquetá".**

Con la implementación del Plan de Acompañamiento Social, en conformidad con el contrato de obra No. 055 de 2024, cuyo propósito es la "Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023", se pretende gestionar adecuadamente los impactos sociales generados durante la ejecución del proyecto. Esto tiene el objetivo de prevenir, mitigar, controlar, compensar y/o restaurar las afectaciones al entorno físico, biológico y social provocadas por la obra.

El Plan de Acompañamiento Social en la Obra sirve como una herramienta valiosa para integrar a la comunidad en el desarrollo del proyecto de manera voluntaria y asegurar una participación activa, así como el fortalecimiento de la infraestructura del proyecto denominado "Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023".

2. JUSTIFICACIÓN

El Plan de Acompañamiento Social en Obra es crucial para integrar a la comunidad en la realización del proyecto de forma voluntaria, asegurando así su participación activa en el desarrollo adecuado del proyecto “Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023”. Además, el plan se enfoca en proteger el bienestar de los trabajadores, garantizando tanto su seguridad como su salud en el entorno laboral.

3. ALCANCE

El Plan de Acompañamiento Social en Obra establece los requisitos mínimos necesarios para prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera oportuna y eficaz los impactos generados por las obras civiles asociadas con el proyecto titulado “Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023”.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Prevenir, reducir, controlar y/o mitigar los impactos generados por la **"Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023"**, en sus áreas de influencia directa e indirecta, a través de la implementación del Plan de Acompañamiento Social en obra.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evitar, reducir, gestionar, compensar y/o restaurar los impactos en la comunidad social causados durante la realización del proyecto.

- Informar y presentar el proyecto y las actividades a realizar en la obra a la comunidad en general.

- Crear, capacitar y fortalecer el Comité de Veeduría Ciudadana, que son los beneficiarios directos.

- Responder de manera rápida y adecuada a las preocupaciones de la comunidad y asegurar el bienestar de los trabajadores, protegiendo su entorno laboral.

- Fomentar la participación de la comunidad en el control social sobre la ejecución del proyecto.

5. PRELIMINARES DE OBRA

Culminados los trámites de legalización del contrato y antes de iniciar con las obras, el profesional del área social hará una inducción y elaborara un cronograma de trabajo, en donde se articulan las actividades a ejecutar con la comunidad durante el desarrollo de la obra.

6. DIAGNOSTICO ZONA DE INFLUENCIA DIRACTA DEL PROYECTO

6.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato derivado de selección mediante Licitación de Obra Pública de Infraestructura de Agua Potable Saneamiento Básico, que tiene por objeto la "**Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023**".

El contrato de obra No. 055 – 2024, fue suscrito entre la Alcaldía de Morelia y UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO 2023 el 01 de agosto del 2023, con un plazo de ejecución de cinco (05) meses.

El objetivo del proyecto consiste en la construcción de alcantarillado en tubería de 8", el cual comprende la intervención de más de trescientos (394.16) metros lineales, dicho proyecto se deriva en cinco (05) capítulos, como lo son preliminares, excavaciones y rellenos, suministro e instalación tubería red sanitaria, estructuras en concreto y pavimentos y concreto. El presente proyecto Beneficiará a cerca de 50 familias con necesidad de dirigir el agua contaminada por medio de obras de infraestructuras controladas en aspectos técnicos, ambientales y sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar buena funcionabilidad del servicio.

6.2 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

El municipio de Morelia, se encuentra localizado al suroccidente de la capital del departamento del Caquetá, esta se encuentra a 24 kilómetros, sobre la carretera Marginal de la selva, la cabecera municipal está ubicada a 1°29′25″ de latitud norte y 75°43′43″ longitud oeste y tiene una altura aproximada de 258 msnm.





Figura 1 y 2. Ubicación del Área de Estudio

6.3 AREA DE INFLUENCIA

Es crucial considerar el área de influencia para entender las relaciones entre las actividades realizadas en las diversas fases del proyecto y su entorno. Esto permite diseñar programas de gestión social que optimicen las actividades del proyecto, corrigiendo posibles conflictos con la comunidad y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

El área de influencia directa del proyecto abarca toda la cabecera del barrio centro y alameda anillo 003 del municipio de Morelia, que son los lugares donde se llevará a cabo el proyecto titulado "Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023".

En la figura siguiente se delinean las diferentes áreas de influencia, tanto directas como indirectas, y se identifican claramente cada una de ellas.



Figura 3. Ubicación del Proyecto

7. SISTEMA BIOFISICO

7.1 GEOLOGIA Y SUELOS

El Municipio de Morelia en el Departamento del Caquetá, Colombia, presenta una variedad interesante en cuanto a su geología y tipos de suelos, dada su ubicación en una región con características geológicas.

Morelia está ubicada en la región amazónica de Colombia, un área que ha sido influenciada por procesos geológicos diversos. El área está en parte constituida por formaciones de origen sedimentario, como los depósitos de arenas, limos y arcillas que se han acumulado a lo largo del tiempo.

En el Departamento del Caquetá, los suelos son en su mayoría ricos en nutrientes, lo que es favorable para la agricultura. Los tipos de suelos comunes en la región incluyen:

- **Suelos Ferralíticos**: Común en áreas tropicales, estos suelos están bien drenados y son ricos en hierro y aluminio. Son típicos en regiones con un clima cálido y húmedo.
- **Suelos Lateríticos**: Se forman en climas tropicales y subtropicales, ricos en óxidos de hierro y aluminio, y son conocidos por su color rojizo. Son buenos para ciertos cultivos pero pueden requerir enmiendas para mantener la fertilidad.
- **Suelos Aluviales**: Estos suelos se encuentran cerca de ríos y cuerpos de agua, y son fértiles debido a la deposición de sedimentos. Son adecuados para la agricultura intensiva.

Los suelos en Morelia tienden a ser profundos y bien estructurados, con una buena capacidad de retención de agua debido a la influencia de la vegetación tropical y la alta pluviosidad. Sin embargo, la acidez del suelo puede ser un factor limitante en algunas áreas, requiriendo prácticas de manejo y fertilización adecuadas para optimizar su uso agrícola.

7.2 CLIMA

El clima de Morelia es característico de las regiones tropicales húmedas, con temperaturas cálidas y abundantes precipitaciones durante todo el año. Este clima tiene efectos significativos en la biodiversidad, la agricultura y la vida cotidiana en la región. Sin embargo, también presenta desafíos que requieren estrategias de gestión adecuadas para asegurar un desarrollo sostenible y resiliente en el contexto de las variaciones climáticas actuales y futuras.

7.3 PRECIPITACION

La alta precipitación en Morelia, que excede los 3,000 mm anuales, tiene un impacto significativo en las arterias fluviales locales, como el río Caquetá, con un caudal promedio de aproximadamente 2,000 m³/s en la parte baja de su curso, Arroyo El Naranjo un afluente menor del río Caquetá, con un caudal promedio de aproximadamente 5 m³/s, Arroyo San Francisco, importante con un caudal promedio de alrededor de 3 m³/s.

7.4 ACCESO A LA LOCALIDAD

La cabecera municipal de Morelia se encuentra ubicada entre los municipios de El Pato (10 km) y San Vicente del Caguán (37 km) al suroeste del Departamento del Caquetá. Está situada a una distancia de aproximadamente 115 kilómetros de Florencia, la capital departamental, con la que se comunica a través de la carretera Intermunicipal Florencia-Morelia (115 km) y la carretera Marginal de la Selva. La conexión terrestre con Florencia es fundamental para el acceso al municipio, siendo la principal vía de comunicación para los viajeros y el transporte de bienes.

7.5 RUIDO AMBIENTAL

La producción de niveles sonoros en el sitio donde se va a realizar la intervención es mínima solamente el ocasionado por la operación de la maquinaria.

7.6 COMPONENTE SOCIAL

7.6.1 ASPECTOS CULTURALES

Las actividades culturales como festivales, reinados, ferias y eventos relacionados al esparcimiento, se realizan en el casco urbano, facilitando el desplazamiento y la receptividad de turistas.

El municipio cuenta con vías de acceso, servicios de transporte público urbano e intermunicipal de manera permanente, por medio de automóviles, busetas, buses, mixtos o chivas y camperos. Igualmente, existen establecimientos comerciales dedicados a la hotelería y la gastronomía, que permiten alojar y alimentar a un número moderado de visitante

7.6.2 ECONOMÍA

En el área de influencia indirecta, las actividades económicas principales corresponden al comercio de productos alimenticios (tiendas, restaurantes), instituciones educativas, recreativas (parque), Hogares comunitarios.

7.6.3 NIVEL DE SERVICIOS PÚBLICOS

En el municipio de Morelia, Departamento del Caquetá, el servicio de recolección de residuos ordinarios está a cargo del Comité de Servicios Públicos. Este comité se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los residuos. La disposición final de los residuos se realiza en el sitio de disposición final de la inspección de El Dorado y el caserío de Versalles, que opera como un botadero a cielo abierto.

En Morelia, la recolección de residuos se efectúa los días lunes y viernes en la zona urbana, mientras que en el caserío de Versalles no se presta el servicio de recolección de residuos sólidos.

El servicio de alcantarillado en la población de Morelia actualmente tiene una cobertura del 0%. Este aspecto se abordará y mejorará con la ejecución de futuros proyectos de infraestructura.

El suministro de agua potable en Morelia proviene del proyecto de acueducto destinado al municipio de Curillo. La captación de agua se realiza del río Fragua Chorroso, ubicado en el municipio de San José del Fragua.

El servicio de energía eléctrica en Morelia es proporcionado por la Empresa Electrificadora del Caquetá.

8. DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA

8.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS VIVIENDAS

Con el reconocimiento de la zona de influencia directa de la obra, se determinó un total de 55 viviendas en el Barrio Centro y Alameda del Municipio de Morelia, en el área de influencia directa del proyecto **“**Construcción de Tramos de Alcantarillado Morelia 2023”.

El Barrio Centro y Alameda del Municipio de Morelia cuentan con servicio de recolección de los residuos sólidos, servicio de energía es prestado por la electrificadora del Caquetá, cuentan con servicio de alcantarillado sanitario quedara funcionando con la ejecución del presente proyecto.

El área de influencia directa del proyecto cuenta con locales comerciales, colegio, hogar infantil por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Las vías están en regular estado.
