CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	feb-26
PÁGINA:	1 de 6

1. FECHA DE ELABORACIÓN	9	6	2026	**2. INFORME No.**	17	**3. SEMANA No.**	18	**4. PERIODO:**	1	JUNIO	al	7	JUNIO

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA	**6. NIT:**	902.016.365-5

7. CONTRATO No.	1330-2025	**8. FECHA CONTRATO:**	22/12/2025	**9. VALOR DEL CONTRATO:**	$1752.539.631
10. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**11. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**12. PLAZO:**	21 meses

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	Consorcio Construhábitat 001	**16. NIT:**	902.005.653-4

17. CONTRATO No.	1269-2025	**18. FECHA CONTRATO:**	27/11/2025	**19. VALOR DEL CONTRATO:**	$16´415.325.538
20. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**21. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**22. PLAZO:**	21 meses

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

Valor Inicial	$16´415.325.538	Valor Inicial	$1752.539.631
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses	Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación		Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1		Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1		Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1		Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027	Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027	Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

CONTRATO DE OBRA

VR. CONTRATO	$	16,415,325,538.00
VR. ETAPA 1	$	947,833,365.00
VR. ETAPA 2	$	15,467,492,173.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO	$	1,752,539,631.00
VR. ETAPA 1	$	422,876,893.00
VR. ETAPA 2	$	1,329,662,738.00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$189.480.993,00	0	
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$189.480.993,00		

VALOR EJECUTADO ET1	$189.480.993,00	% Avc.	
VALOR POR EJECUTAR ET1		% Falt.	100.00%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2		% Falt.	100.00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 14,272,095.00	$246.696,00	13/04/2026
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$ 14,272,095.00		

VALOR EJECUTADO ET1	$	14,272,095.00	% Avc.	3.37%	
VALOR POR EJECUTAR ET1	$	408,604,798.00	% Falt.	96.63%	
VALOR EJECUTADO ET2			% Avc.	0	
VALOR POR EJECUTAR ET2	$	1,329,662,738.00	% Falt.	100.00%	
VALOR RETEGARANTIA			% Avc.		
VALOR POR DEDUCCIÓN			% Falt.		

ETAPA DE FACTIBILIDAD


De acuerdo con lo expuesto en el Comité de Seguimiento N.° 18 y atendiendo la solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat, se continúa realizando el seguimiento al cronograma inicialmente aprobado para el Contrato 1269-2025, con el fin de evaluar el avance real frente a la programación establecida. Al corte del presente informe, el avance general del proyecto registra un cumplimiento ejecutado del 64% frente a un 51% programado, evidenciando un desempeño superior al previsto. Respecto a las fases del proyecto, la Fase I presenta un cumplimiento del 100% tanto programado como ejecutado, mientras que la Fase II registra un avance programado del 71% frente a un avance ejecutado del 61%, identificándose una diferencia que será objeto de seguimiento durante los próximos periodos. Se precisa que la representación gráfica de la evolución del cronograma será incorporada una vez se cuente con tres puntos de control consecutivos que permitan realizar un análisis comparativo de tendencias y comportamiento del proyecto.


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado Anterior	59.00%	42.00%	17.00%
Durante la semana	5.00%	9.00%	-4.00%
Actual Acumulado	64.00%	51.00%	13.00%


Valor Etapa 1	

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		

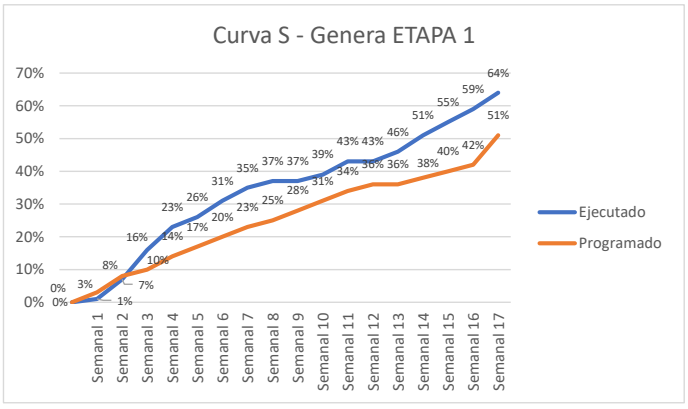

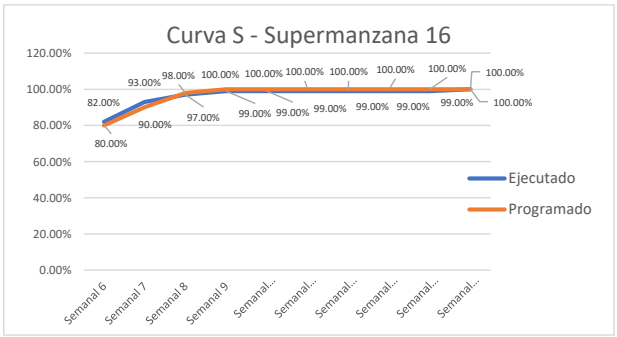


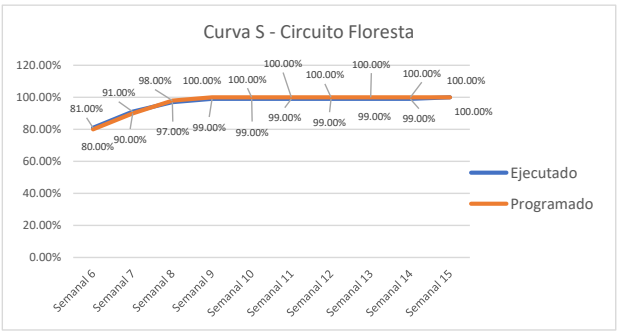


PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I

Resumen de la semana	**SUPERMANZANA 16**	**100%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor	100%	100%
	Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
	Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%
	CIRCUITO FLORESTA	**100%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
	Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%

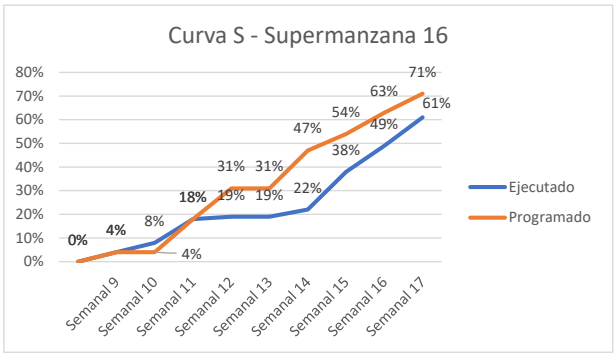

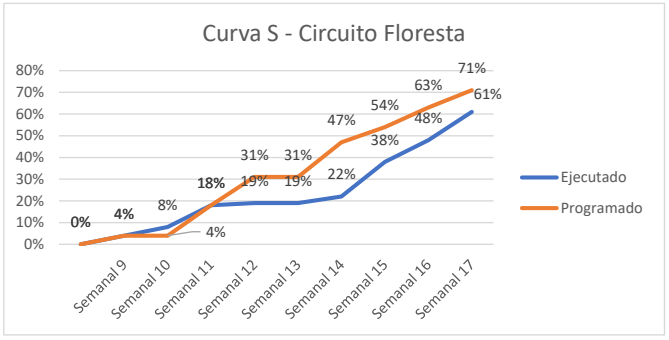

	Estado de cronograma por componente FASE II		
	SUPERMANZANA 16	**71%**	**61%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano Atraso	73%	83%
	Vías transporte y movilidad Atraso	75%	22%
	Redes Hidráulicas	61%	69%
	Redes Secas	61%	46%
	Arqueología:	74%	100%
	Presupuesto y cronograma	59%	34%
	Geotecnia	74%	71%
	Pavimentos	71%	83%
	Estructuras	61%	46%
	Ambiental y SST	71%	69%
	Social	75%	73%
	Componente BIM	82%	27%
Resumen de la semana	**CIRCUITO FLORESTA SUR**	**71%**	**61%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	73%	83%
	Vías transporte y movilidad	75%	22%
	Redes Hidráulicas	61%	69%
	Redes Secas	61%	46%
	Arqueología:	74%	100%
	Presupuesto y cronograma	59%	34%
	Geotecnia	74%	71%
	Pavimentos	71%	83%
	Estructuras	61%	46%
	Ambiental y SST	71%	69%
	Social	75%	73%
	Componente BIM	82%	27%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana

Durante la semana comprendida entre el 01/06/2026 y el 07/06/2026
Revisión de diseño Arq. Para presentar al IDRD
Comité de seguimiento semanal N 18
Reunión con IDRD - Revision de diseño
Reunión de seguimiento componente Transito
Verificación de informacion para SDA

CIRCUITO FLORESTA

Actividades ejecutado	Actividades programado
03/06/2026 Revisión de diseño arquitectonico - Virtual 04/06/2026 Comité de seguimiento N18 - Presencial 04/06/2026 IDRD - Presencial 05/06/2025 Reunion avance de transito	09/06/2026 Mesa de trabajo JJB 09/06/2026 Comité de seguimiento BIM 10/06/2026 Reunion revision de SUDS - SDA 11/06/2026 Comite de seguimiento N19 - Virtual

KENNEDY SUPERMANZANA 16

Actividades ejecutado	Actividades programado
03/06/2026 Revisión de diseño arquitectonico - Virtual 04/06/2026 Comité de seguimiento N18 - Presencial 04/06/2026 IDRD - Presencial 05/06/2025 Reunion avance de transito	09/06/2026 Mesa de trabajo JJB 09/06/2026 Comité de seguimiento BIM 10/06/2026 Reunion revision de SUDS - SDA 11/06/2026 Comite de seguimiento N19 - Virtual

ITEM	Nombre de tarea	Du	Comienzo	Fin	Costo	Costo Programado	Costo Ejecutado	%Programado real	%Completado real	%DIFER	%PROGRAMADO	para diligenciar	Texto20	Predecesoras	Sucesoras
1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.	162 dias	4 febrero 2026 9:00 a. m.	2 octubre 2026 7:00 p. m.	$ 947.833.395,99	$ 448.978.587,09	$ 408.997.429,64	47%	43%	-4%	51%	63%	58%		
1.1	ETAPA 1	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 947.833.395,99	$ 448.978.587,09	$ 408.997.429,64	47%	43%	-4%	51%	63%	58%		
1.1.1	Acta de inicio	0 dias	4 febrero 202	4 febrero 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%		4FC+2d;7
1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 dias	5 febrero 2026 7:00	5 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%	3FC+2 dias	5
1.1.3	Revision de documentos de ingreso por Interventoria	3 dias	6 febrero 2026 9:00	10 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%	4	6
1.1.4	Ajuste de observaciones	2 dias	11 febrero 20	12 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%	5	208;692
1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 dias	11 febrero 20	11 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%	3FC+6 dias	8
1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 dias	12 febrero 20	16 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%	7	9
1.1.7	Ajuste de observaciones	2 dias	17 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%	8	208;692
1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto	0 dias	13 febrero 2026 7:00	13 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%	3FC+8 dias	11
1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 dias	16 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%	10	12
1.1.10	Ajuste de observaciones	2 dias	19 febrero 20	20 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%	11	208;692
1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.712,99	$ 225.985.024,37	$ 204.776.848,84	48%	43%	-4%	51%	63%	58%		
1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dia	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%		
1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 8	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 120.680.743,37	$ 99.472.567,84	76%	63%	-13%	71%	61%	49%		
1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dia	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.683,00	$ 222.993.562,72	$ 204.220.580,80	47%	43%	-4%	51%	63%	58%		
1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dia	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%		
1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 8	3 julio 2026 7	$ 157.956.438,00	$ 117.689.281,72	$ 98.916.299,80	75%	63%	-12%	71%	60%	48%		
1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dia	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST	COMPONENTE AMBIENTAL
Se recidio la subsacion al infome semanal N3 SST con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-296 Se recibio respuesta a la subsanacion de PAPSO con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-301 Se dio aprobacion al infoeme mensual N 3 SST con el comunicado SDH-1330-2025-0268 Se dio aprobacion al PAPSO con el cominicado SDH-1330-2025-0272	El 2 de junio se envió el oficio SDH-1330-2025-0269 con observaciones del MAO V1. El 3 de junio se asistió a reunión para Revisión de Diseño arquitectónico de manera virtual. El 4 de junio se asistió a comité integral presencial. El 5 de junio se asistió a Reunión - verificación de inf. SDA.

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRACTO	
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".	
TIPO DE DOCUMENTO	**CONTRATO No Y NOMBRE**
INFORME SEMANAL No 17	**Consorcio Perseverar SDHT / 1330 DE 2025**

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 17 DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2026	
PROGRAMA	**ACTIVIDAD**	**FECHA**	**FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES**	**SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA**
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	**APROBADO**	02/03/2026 20/04/2026	20/04/2026	Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social llega comunicado de aprobación con numero de radicado 2-2026-23930 del 17 de abril del 2026.
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social EL contratista remite mediante oficio CCH-001-SDHT-1269-258 encuesta de caracterización para revisión y aprobación.	09/03/2026 07/05/2026	12/03/2026 07/05/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026. Se tiene estipulado como fecha límite de entrega el 22 de junio del 2026. Se realiza verificación del documento y encuesta, por lo que al remitir se verifica que sea el mismo para dar ella correspondiente aprobación por parte de la interventoría para su aplicación.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	NA	NA	NA	NA
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	El contratista remite acta de participación y formación del 14 de mayo del 2026 para revisión y concepto. Parque Ciudad Kennedy Oriental – Supermanzana 16.	2/06/2026	02/06/2026 al 04/06/2026	Se realiza revisión y se solicitan ajustes al acta los cuales fueron subsanados, para posterior aprobación y remisión a la entidad para visto bueno.
	El contratista remite acta de participación del 14 de mayo del 2026 para revisión y concepto Circuito Floresta Sur.	3/06/2026	03/06/2026 al 04/06/2026	Se realiza revisión y se solicitan ajustes al acta los cuales fueron subsanados, para posterior aprobación y remisión a la entidad para visto bueno.
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Se asiste al Comité técnico semanal N°18 de manera virtual con el acompañamiento de las especialistas del contratista, la entidad y la interventoría.	4/06/2026	4/06/2026	Se asistió al comité en donde se logra informar a las áreas sobre las actividades realizadas durante la semana anterior.
CORRESPONDENCIA	Se recibe aprobación al informe social mensual 2 de la interventoría.	1/06/2026	1/06/2026	Se recibe aprobación del informe social mensual N°2 de la interventoría, por parte de la entidad bajo radicado 2-2026-36459.
	Se recibe informe semanal 16 del contratista para revisión y concepto.	2/06/2026	02 al 03 de junio del 2026	Se recibe informe semanal 16 del contratista donde se emiten observaciones, que son atendidas para posterior concepto de aprobación por parte de la interventoría, esta es remitida a la entidad para su visto bueno.

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN ALISTAMIENTO	

TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO	

TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	

N/A

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Se radico nuevamente el PMT del poligono de Supermanzana 16 y se realizo mesa de trabajo para revision de la metodologia presentada a la SDM

32. PERSONAL INTERVENTORÍA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	**CANT.**	**CARGO**	**CANT.**	**EQUIPO / MAQUINARÍA**	**CANT.**	**UBICACIÓN**	**DÍA**	**HORAS DE LLUVIA**	**ESTADO**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	DIRECTOR CONSULTORÍA	1				LUNES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MARTES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				JUEVES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				VIERNES		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				SÁBADO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1				DOMINGO		
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1				**ESTADO**		
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1				**LLUVIOSO (L)**		
		AFORADOR PARA MOV. 1	1				**FAVORABLE (F)**		
		AFORADOR PARA MOV. 2	1				**SOLEADO (S)**		

TOTAL DE PERSONAL	**16**	**TOTAL DE PERSONAL**	**25**	**TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO**	

36. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

38. OBSERVACIONES
Se mantiene la observación por parte de la interventoría frente al posible riesgo de los tiempos del contrato, teniendo en cuenta la programación presentada por parte del Consultor y avalada por la Secretaria de Hábitat, amparados en los términos contractuales del contrato pero que a la evaluación de la interventoría podrá generar atrasos en el final de cada una de las etapas del proyecto.
39. RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con la metodología de la radicación de derechos de petición ante las entidades que no den respuesta oportuna para los requerimientos realizados.



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA
