CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	feb-26
PÁGINA:	1 de 6

1. FECHA DE ELABORACIÓN	23	6	2026	**2. INFORME No.**	19	**3. SEMANA No.**	20	**4. PERIODO:**	15	JUNIO	al	21	JUNIO

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA	**6. NIT:**	902.016.365-5

7. CONTRATO No.	1330-2025	**8. FECHA CONTRATO:**	22/12/2025	**9. VALOR DEL CONTRATO:**	$1752.539.631
10. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**11. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**12. PLAZO:**	21 meses

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	Consorcio Construhábitat 001	**16. NIT:**	902.005.653-4

17. CONTRATO No.	1269-2025	**18. FECHA CONTRATO:**	27/11/2025	**19. VALOR DEL CONTRATO:**	$16´415.325.538
20. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**21. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**22. PLAZO:**	21 meses

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

Valor Inicial	$16´415.325.538	Valor Inicial	$1752.539.631
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses	Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación		Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1		Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1		Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1		Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027	Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027	Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

CONTRATO DE OBRA

VR. CONTRATO	$	16,415,325,538.00
VR. ETAPA 1	$	947,833,365.00
VR. ETAPA 2	$	15,467,492,173.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO	$	1,752,539,631.00
VR. ETAPA 1	$	422,876,893.00
VR. ETAPA 2	$	1,329,662,738.00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$189.480.993,00	0	
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$189.480.993,00		

VALOR EJECUTADO ET1	$189.480.993,00	% Avc.	
VALOR POR EJECUTAR ET1		% Falt.	100.00%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2		% Falt.	100.00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 14,272,095.00	$246.696,00	13/04/2026
Acta No. 2	$ 15,857,883.00		16/06/2026
Acta No. 3	$ 42,287,689.00		16/06/2026
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$ 72,417,667.00		

VALOR EJECUTADO ET1	$	72,417,667.00	% Avc.	17.12%	
VALOR POR EJECUTAR ET1	$	350,459,226.00	% Falt.	82.88%	
VALOR EJECUTADO ET2			% Avc.	0	
VALOR POR EJECUTAR ET2	$	1,329,662,738.00	% Falt.	100.00%	
VALOR RETEGARANTIA			% Avc.		
VALOR POR DEDUCCIÓN			% Falt.		

ETAPA DE FACTIBILIDAD


De acuerdo con lo expuesto en el Comité de Seguimiento N.° 18 y atendiendo la solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat, se continúa realizando el seguimiento al cronograma inicialmente aprobado para el Contrato 1269-2025, con el fin de evaluar el avance real frente a la programación establecida. Al corte del presente informe, el avance general del proyecto registra un cumplimiento ejecutado del 73% frente a un 56% programado, evidenciando un desempeño superior al previsto. Respecto a las fases del proyecto, la Fase I presenta un cumplimiento del 100% tanto programado como ejecutado, mientras que la Fase II registra un avance programado del 85% frente a un avance ejecutado del 84%, identificándose una diferencia que será objeto de seguimiento durante los próximos periodos. Se precisa que la representación gráfica de la evolución del cronograma será incorporada una vez se cuente con tres puntos de control consecutivos que permitan realizar un análisis comparativo de tendencias y comportamiento del proyecto.


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado Anterior	66.00%	54.00%	12.00%
Durante la semana	7.00%	2.00%	5.00%
Actual Acumulado	73.00%	56.00%	17.00%


Valor Etapa 1	

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		

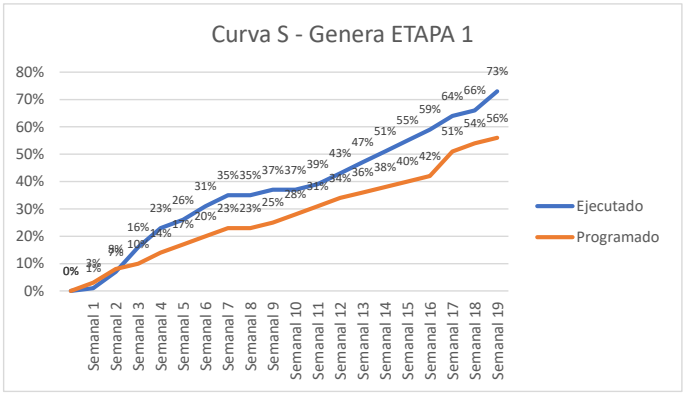

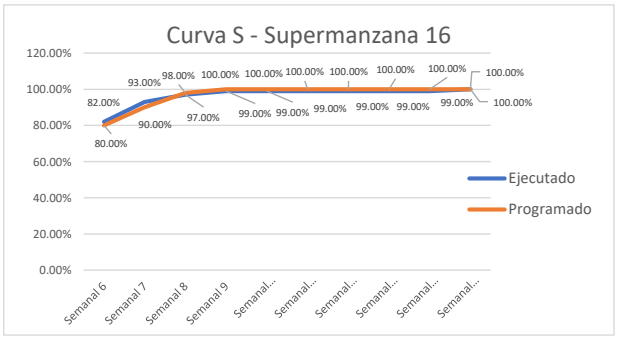


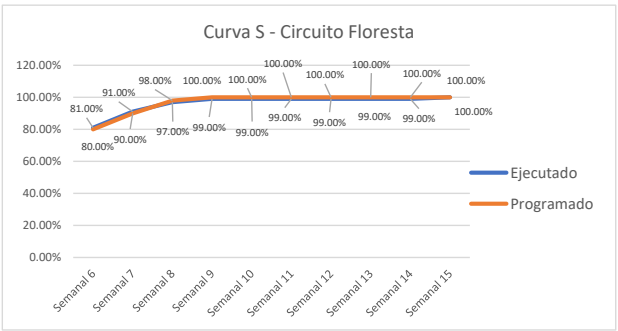


PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I

Resumen de la semana	**SUPERMANZANA 16**	**100%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor	100%	100%
	Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
	Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%
	CIRCUITO FLORESTA	**100%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
	Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%

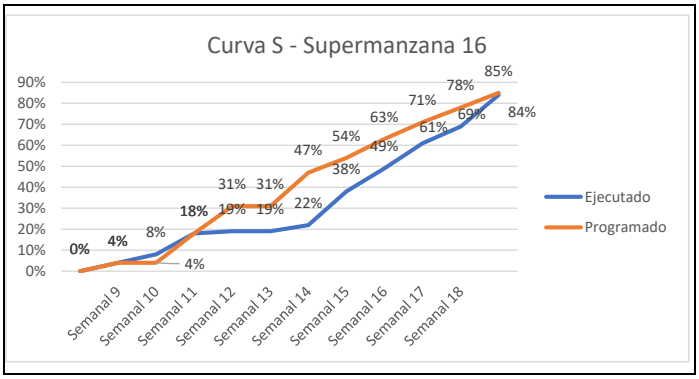

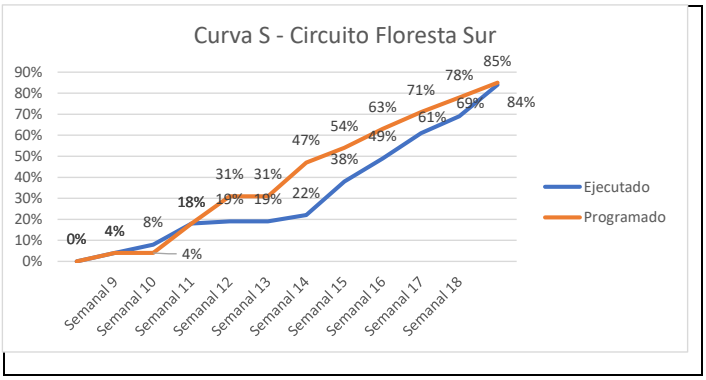

Estado de cronograma por componente FASE II

Resumen de la semana	**SUPERMANZANA 16**	**85%**	**84%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano Atraso	88%	87%
	Vías transporte y movilidad Atraso	89%	91%
	Redes Hidráulicas	83%	86%
	Redes Secas	83%	81%
	Arqueología:	88%	100%
	Presupuesto y cronograma	81%	50%
	Geotecnia	88%	89%
	Pavimentos	92%	90%
	Estructuras	83%	63%
	Ambiental y SST	85%	88%
	Social	89%	86%
	Componente BIM	98%	54%
	CIRCUITO FLORESTA SUR	**85%**	**84%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	88%	87%
	Vías transporte y movilidad	89%	91%
	Redes Hidráulicas	83%	86%
	Redes Secas	83%	81%
	Arqueología:	88%	100%
	Presupuesto y cronograma	81%	50%
	Geotecnia	88%	89%
	Pavimentos	92%	90%
	Estructuras	83%	63%
	Ambiental y SST	85%	88%
	Social	89%	86%
	Componente BIM	98%	54%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana

Durante la semana comprendida entre el 15/06/2026 y el 21/06/2026

Comité de seguimeinto N 20
Reunión de seguimiento componente Transito
Mesa de trabajo compoente de geometria Vial

CIRCUITO FLORESTA

Actividades ejecutado	Actividades programado
18/06/2026 Comité de seguimiento N 20 18/06/2026 Mesa de trabajo componente de geometria vial 19/06/2026 Reunión de seguimiento componente Transito	23/06/2026 Comité de seguimiento BIM 25/06/2026 Comité de seguimiento N21 - Virtual 26/06/2026 Reunion virtual revision de diseño Arquitectonico

KENNEDY SUPERMANZANA 16

Actividades ejecutado	Actividades programado
18/06/2026 Comité de seguimiento N 20 18/06/2026 Mesa de trabajo componente de geometria vial 19/06/2026 Reunión de seguimiento componente Transito	23/06/2026 Comité de seguimiento BIM 25/06/2026 Comité de seguimiento N21 - Virtual 26/06/2026 Reunion virtual revision de diseño Arquitectonico

ITEM	Nombre de tarea	Du	Comienzo	Fin	Costo	Costo Programado	Costo Ejecutado	%Programado real	%Completado real	%DIFER	%PROGRAMADO	para diligenciar
1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.	162 dias	4 febrero 2026 9:00 a. m.	2 octubre 2026 7:00 p. m.	$ 947.833.395,99	$ 485.932.300,22	$ 464.998.327,13	51%	49%	-2%	56%	73%
1.1	ETAPA 1	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 947.833.395,99	$ 485.932.300,22	$ 464.998.327,13	51%	49%	-2%	56%	73%
1.1.1	Acta de inicio	0 días	4 febrero 202	4 febrero 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 días	5 febrero 2026 7:00	5 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.3	Revision de documentos de ingreso por Interventoria	3 días	6 febrero 2026 9:00	10 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.4	Ajuste de observaciones	2 días	11 febrero 20	12 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 días	11 febrero 20	11 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 días	12 febrero 20	16 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.7	Ajuste de observaciones	2 días	17 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto	0 días	13 febrero 2026 7:00	13 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 días	16 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.10	Ajuste de observaciones	2 días	19 febrero 20	20 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.712,99	$ 243.592.089,82	$ 233.684.955,64	51%	49%	-2%	56%	73%
1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 día	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%
1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 día	7 abril 2026 8	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 138.287.808,82	$ 128.380.674,64	88%	81%	-6%	85%	84%
1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 día	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.683,00	$ 242.340.210,40	$ 231.313.371,49	51%	49%	-2%	56%	73%
1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 día	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%
1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 día	7 abril 2026 8	3 julio 2026 7	$ 157.956.438,00	$ 137.035.929,40	$ 126.009.090,49	87%	80%	-7%	85%	84%
1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 día	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST	COMPONENTE AMBIENTAL
El 12 de junio se recibe la version 3 de SG-SST con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-325 El 17 de junio de envian observaciones al SG-SST con el comunicado SDH-1330-2025-0300	El 16 de junio se envió oficio SDH-1330-2025-0293 con las observaciones de la matriz de impactos V3. El 18 de junio se envió la subsanación de observaciones del informe mensual 4 - mayo hechas por parte de la supervisión del componente ambiental de la Secretaría de Hábitat. El 18 de junio se asistió a comité integral virtual. El 19 de junio se envió oficio SDH-1330-2025-0304 con las observaciones del Manejo Ambiental de Obra (MAO) V2.

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".	
TIPO DE DOCUMENTO	**CONTRATO No Y NOMBRE**
INFORME SEMANAL No 18	Consorcio Perseverar SDHT / 1330 DE 2025

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 18 DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2026	
PROGRAMA	**ACTIVIDAD**	**FECHA**	**FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES**	**SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA**
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	APROBADO	02/03/2026 20/04/2026	20/04/2026	Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social llega comunicado de aprobación con numero de radicado 2-2026-23930 del 17 de abril del 2026.
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social El contratista remite mediante oficio CCH-001-SDHT-1269-258 encuesta de caracterización para revisión y aprobación.	09/03/2026 07/05/2026	12/03/2026 07/05/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026. Se tiene estipulado como fecha límite de entrega el 22 de junio del 2026. Se realiza verificación del documento y encuesta, por lo que al remitir se verifica que sea el mismo para dar ella correspondiente aprobación por parte de la interventoría para su aplicación.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	NA	NA	NA	NA
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Se recibe Acta de formación y participación 3 de Parque Ciudad Kennedy Oriental supermanzana 16	16/06/2026	16/06/2026 al 17/06/2026	Se da aprobación al acta de formación y participación 3 con la comunidad del polígono de Parque ciudad Kennedy oriental supermanzana 16. se remite al contratista con copia a la entidad para su conocato.
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Se asiste al Comité técnico semanal N°20 de manera virtual con el acompañamiento de las especialistas del contratista, la entidad y la interventoría.	18/06/2026	18/06/2026	Se asistió al comité en donde se logra informar a las áreas sobre las actividades realizadas durante la semana anterior.
CORRESPONDENCIA	Se recibe subsanación de las observaciones al informe mensual 04 del contratista mediante radicado CCH001-SDHT1269-2025-324	15/06/2026	15/06/2026 al 17/06/2026	Se remite aprobación del informe mensual social 4 del contratista bajo radicado SDH-1330-2025-0296
	Se recibe Visto bueno por parte de la entidad al informe semanal N°18 de la interventoría	16/06/2026	16/06/2026	Se recibe concepto de visto bueno por parte de la entidad al informe semanal No. 18 de la interventoría el cual se encuentra en DRIVE del área social.
	Se recibe informe semanal Social Ni 18 por parte del contratista	16/06/2026	16/06/2026 al 17/06/2026	Se recibe concepto de visto bueno por parte de la entidad al informe semanal No. 18 del contratista el cual se encuentra en DRIVE del área social.
	Se da aprobación al informe mensual social N° 4 del contratista	17/06/2026	17/06/2026	Se da aprobación al informe social mensual N° 4 del contratista, mediante numero radicado SDH-1330-2025-0296.
	Se recibe sugerencia sobre la entrega de avance al documento de caracterización por parte de la entidad	19/06/2026	19/06/2026	Mediante correo ele crónico se recibe correo en el cual se sugiere por arte de la entidad, que la entrega del 22 de junio del 2026 sea vista como avances
	Se recibe metodología de comité Mi Hábitat Parque ciudad Kennedy oriental Supermanzana 16	19/06/2026	19/06/2026 al 21/06/2026	El documento se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN ALISTAMIENTO	

TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO	

TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	

N/A

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Se radico nuevamente el PMT del poligono de Supermanzana 16 y se realizo mesa de trabajo para revision de la metodologia presentada a la SDM

32. PERSONAL INTERVENTORÍA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	**CANT.**	**CARGO**	**CANT.**	**EQUIPO / MAQUINARÍA**	**CANT.**	**UBICACIÓN**	**DÍA**	**HORAS DE LLUVIA**	**ESTADO**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	DIRECTOR CONSULTORÍA	1				LUNES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MARTES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				JUEVES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				VIERNES		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				SÁBADO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1				DOMINGO		
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1				**ESTADO**		
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1				**LLUVIOSO (L)**		
		AFORADOR PARA MOV. 1	1				**FAVORABLE (F)**		
		AFORADOR PARA MOV. 2	1				**SOLEADO (S)**		

TOTAL DE PERSONAL	**16**	**TOTAL DE PERSONAL**	**25**	**TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO**	

36. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

38. OBSERVACIONES

Se mantiene la observación por parte de la interventoría frente al posible riesgo de los tiempos del contrato, teniendo en cuenta la programación presentada por parte del Consultor y avalada por la Secretaria de Hábitat, amparados en los términos contractuales del contrato pero que a la evaluación de la interventoría podrá generar atrasos en el final de cada una de las etapas del proyecto.

39. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con la metodología de la radicación de derechos de petición ante las entidades que no den respuesta oportuna para los requerimientos realizados.



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA
