CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	feb-26
PÁGINA:	1 de 6

1. FECHA DE ELABORACIÓN	23	6	2026	**2. INFORME No.**	20	**3. SEMANA No.**	21	**4. PERIODO:**	22	JUNIO	al	28	JUNIO

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA	**6. NIT:**	902.016.365-5

7. CONTRATO No.	1330-2025	**8. FECHA CONTRATO:**	22/12/2025	**9. VALOR DEL CONTRATO:**	$1752.539.631
10. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**11. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**12. PLAZO:**	21 meses

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	Consorcio Construhábitat 001	**16. NIT:**	902.005.653-4

17. CONTRATO No.	1269-2025	**18. FECHA CONTRATO:**	27/11/2025	**19. VALOR DEL CONTRATO:**	$16´415.325.538
20. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**21. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**22. PLAZO:**	21 meses

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

Valor Inicial	$16´415.325.538
Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

Valor Inicial	$1752.539.631
Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

CONTRATO DE OBRA

VR. CONTRATO	$	16,415,325,538.00
VR. ETAPA 1	$	947,833,365.00
VR. ETAPA 2	$	15,467,492,173.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO	$	1,752,539,631.00
VR. ETAPA 1	$	422,876,893.00
VR. ETAPA 2	$	1,329,662,738.00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$189.480.993,00	0	
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$189.480.993,00		

VALOR EJECUTADO ET1	$189.480.993,00	% Avc.	
VALOR POR EJECUTAR ET1		% Falt.	100.00%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2		% Falt.	100.00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 14,272,095.00	$246.696,00	13/04/2026
Acta No. 2	$ 15,857,883.00		16/06/2026
Acta No. 3	$ 42,287,689.00		16/06/2026
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$ 72,417,667.00		

VALOR EJECUTADO ET1	$	72,417,667.00	% Avc.	17.12%	
VALOR POR EJECUTAR ET1	$	350,459,226.00	% Falt.	82.88%	
VALOR EJECUTADO ET2			% Avc.	0	
VALOR POR EJECUTAR ET2	$	1,329,662,738.00	% Falt.	100.00%	
VALOR RETEGARANTIA			% Avc.		
VALOR POR DEDUCCIÓN			% Falt.		

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


De acuerdo con lo expuesto en el Comité de Seguimiento N.° 20 y atendiendo la solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat, se continúa realizando el seguimiento al cronograma inicialmente aprobado para el Contrato 1269-2025, con el fin de evaluar el avance real frente a la programación establecida. Al corte del presente informe, el avance general del proyecto registra un cumplimiento ejecutado del 74% frente a un 59% programado, evidenciando un desempeño superior al previsto. Respecto a las fases del proyecto, la Fase I presenta un cumplimiento del 100% tanto programado como ejecutado, mientras que la Fase II registra un avance programado del 93% frente a un avance ejecutado del 87%, identificándose una diferencia que será objeto de seguimiento durante los próximos periodos. Se precisa que la representación gráfica de la evolución del cronograma será incorporada una vez se cuente con tres puntos de control consecutivos que permitan realizar un análisis comparativo de tendencias y comportamiento del proyecto.


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado Anterior	73.00%	59.00%	14.00%
Durante la semana	1.00%	0.00%	1.00%
Actual Acumulado	74.00%	59.00%	15.00%


Valor Etapa 1	

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		

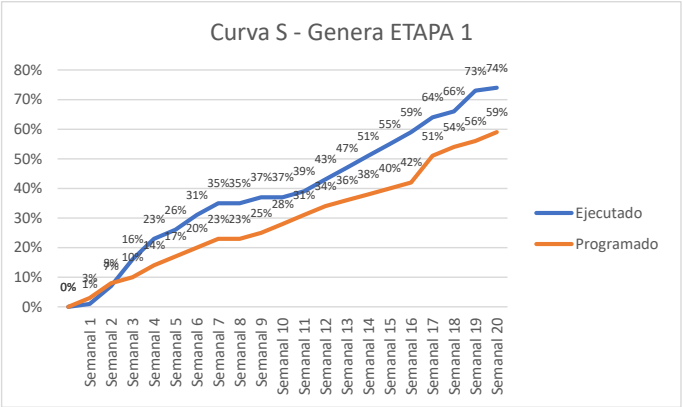

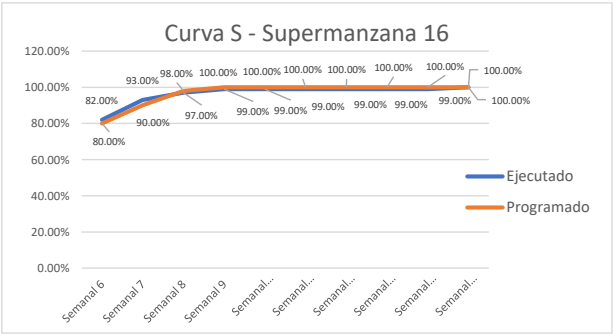

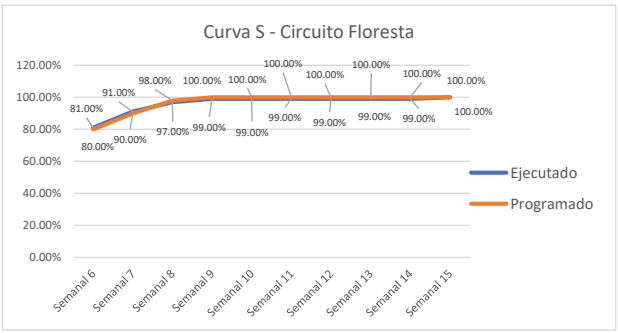



PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I

Resumen de la semana

SUPERMANZANA 16	**100%**	**100%**
Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%
CIRCUITO FLORESTA	**100%**	**100%**
Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%

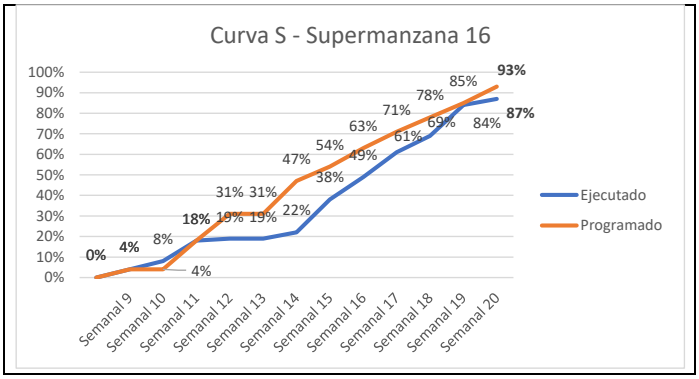

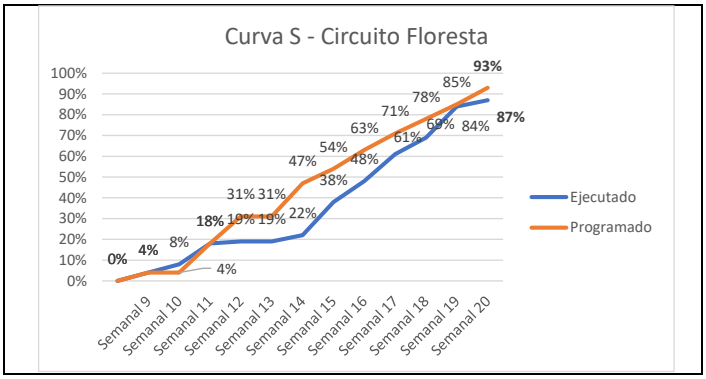

	Estado de cronograma por componente FASE II		
	SUPERMANZANA 16	**87%**	**93%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano Atraso	88%	98%
	Vías transporte y movilidad Atraso	91%	98%
	Redes Hidráulicas	95%	97%
	Redes Secas	94%	97%
	Arqueología:	100%	96%
	Presupuesto y cronograma	63%	95%
	Geotecnia	95%	96%
	Pavimentos	93%	100%
	Estructuras	96%	100%
	Ambiental y SST	88%	93%
	Social	67%	98%
	Componente BIM	63%	100%
Resumen de la semana	**CIRCUITO FLORESTA SUR**	**87%**	**93%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	88%	98%
	Vías transporte y movilidad	91%	98%
	Redes Hidráulicas	95%	97%
	Redes Secas	94%	97%
	Arqueología:	100%	96%
	Presupuesto y cronograma	63%	95%
	Geotecnia	95%	96%
	Pavimentos	93%	100%
	Estructuras	96%	100%
	Ambiental y SST	88%	93%
	Social	67%	98%
	Componente BIM	63%	100%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana

Durante la semana comprendida entre el 22/06/2026 y el 28/06/2026

Comité de seguimeinto N 21
Comite de seguimiento BIM
Reunión virtual para revision de componente de Arquitectura.

CIRCUITO FLORESTA

Actividades ejecutado	Actividades programado
23/06/2026 Comité de seguimiento BIM 25/06/2026 Comité de seguimiento N21 - Virtual 26/06/2026 Reunion virtual revision de diseño Arquitectonico	23/06/2026 comité de seguimiento BIM 30/06/2026 reviosn de cronograma 30/06/2026 Revision presentacion a SDA 30/06/2026 Reunion con SDA 01/07/2026 Reunion 50% de avance Circuito floresta 02/07/2026 Reunion 50% de avance Supermanzana 16 02/07/2026Comité de seguimiento N22

KENNEDY SUPERMANZANA 16

Actividades ejecutado	Actividades programado
23/06/2026 Comité de seguimiento BIM 25/06/2026 Comité de seguimiento N21 - Virtual 26/06/2026 Reunion virtual revision de diseño Arquitectonico	23/06/2026 comité de seguimiento BIM 30/06/2026 reviosn de cronograma 30/06/2026 Revision presentacion a SDA 30/06/2026 Reunion con SDA 01/07/2026 Reunion 50% de avance Circuito floresta 02/07/2026 Reunion 50% de avance Supermanzana 16 02/07/2026Comité de seguimiento N22

ITEM	Nombre de tarea	Du	Comienzo	Fin	Costo	Costo Programado	Costo Ejecutado	%Programado real	%Completado real	%DIFER	%PROGRAMADO	para diligenciar
1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.	162 dias	4 febrero 2026 9:00 a. m.	2 octubre 2026 7:00 p. m.	$ 947.833.395,99	$ 518.521.963,99	$ 478.979.582,61	55%	51%	-4%	59%	74%
1.1	ETAPA 1	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 947.833.395,99	$ 518.521.963,99	$ 478.979.582,61	55%	51%	-4%	59%	74%
1.1.1	Acta de inicio	0 días	4 febrero 202	4 febrero 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 días	5 febrero 2026 7:00	5 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.3	Revision de documentos de ingreso por Interventoria	3 días	6 febrero 2026 9:00	10 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.4	Ajuste de observaciones	2 días	11 febrero 20	12 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 días	11 febrero 20	11 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 días	12 febrero 20	16 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.7	Ajuste de observaciones	2 días	17 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto	0 días	13 febrero 2026 7:00	13 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 días	16 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.10	Ajuste de observaciones	2 días	19 febrero 20	20 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%
1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.712,99	$ 260.202.908,99	$ 242.171.285,77	55%	51%	-4%	59%	74%
1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 día	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%
1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 día	7 abril 2026 8	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 154.898.627,99	$ 136.867.004,77	98%	87%	-11%	93%	87%
1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 día	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.683,00	$ 258.319.055,00	$ 236.808.296,84	55%	50%	-5%	59%	74%
1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 día	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%
1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 día	7 abril 2026 8	3 julio 2026 7	$ 157.956.438,00	$ 153.014.774,00	$ 131.504.015,84	97%	83%	-14%	93%	87%
1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 día	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST	COMPONENTE AMBIENTAL
El 24 de junio se recibio el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-347 Respuesta a las observaciones al informe mensual N04 el 24 de junio se recibio el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-348 entrega de sg-sst V4	El 23 de junio se envió oficio SDH-1330-2025-0311 con la aprobación de la matriz de impactos. El 25 de junio se asistió a comité integral virtual. El 26 de junio se asistió a mesa de trabajo para revisión del PGRCD con el contratista y la supervisión del componente ambiental.

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".	
TIPO DE DOCUMENTO	CONTRATO No Y NOMBRE
INFORME SEMANAL No 20	Consorcio Perseverar SDHT / 1330 DE 2025

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 20 DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2026	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	APROBADO	02/03/2026 20/04/2026	20/04/2026	Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social llega comunicado de aprobacion con numero de radicado 2-2026-23930 del 17 de abril del 2026.
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social	09/03/2026	12/03/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026. Se tiene estipulado como fecha limite de entrega el 22 de junio del 2026.
	El contratista remite mediante oficio CCH-001-SDHT-1269-258 encuesta de caracterización para revisión y aprobación.	07/05/2026	07/05/2026	Se realiza verificacion del documento y encuesta, por lo que al remitir se verifica que sea el mismo para dar ela correspondiente aprobación por parte de la interventoria para su aplicación.
	Se recibe avance de caracterización social por parte del contratista	23/06/2023	23/06/2026 al 26/06/2026	Se realiza revisión de documento al cual se le emiten observaciones y reenvia con copia a la entidad para revisión y concepto.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	Se recibe Volante de convocatoria para la socialización de avance de fase 2 etapa 1 circuito floresta sur	23/06/2026	23/06/2026	Se realiza revisión al documento al cual se le da visto bueno, se remite concepto al consultor y a la entidad
	Se recibe correolectronico con Presentaciones de reunión de avance circuito floresta sur	23/06/2026	23/06/2026 al 24/06/2026	Se recibe mediante correo electronico presentaciones de socializacion de avance de circuito floresta sur el cual es observado y remitido a la entidad para concepto.
	Se recibe metodologia y presentacion de taller de formción y participación de circuito floresta sur	23/06/2026	23/06/2026 al 24/06/2026	Se recibe metodologia y presentación del taller de formacion y participación del polígono circuito floresta, el cual fue observado y remitido con copia a la entidad para concepto.
	Se recibe mediante correo electronico Metodologia decuerto comité mi habitat de Parque ciudad Kennedy Oriental supermanzana 16	24/06/2026	24/06/2026 al 25/06/2026	Se da aprobación a la metodologia de la actividad, se remite concepto con copia a la entidad.
	Se recibe mediante correo electronico de metodologia de recorrido de Parque ciudad Kennedy Oriental supermanzana 16	24/06/2026	24/06/2026 al 25/06/2026	Se da aprobación a la metodologia de recorrodo y se remite concepto con copia a la entidad
	Se recibe presentación de reunion de avance de etapa 1 de supermanzana 16	24/06/2026	24/06/2026 al 25/06/2026	Se da aprobación a la presentación de la actividad, se remite concepto con copia a la entidad.
	Se recibe mediante correo electronico Metodologia de reunión de avance de circuito floresta sur	23/06/2026	23/06/2026 al 24/06/2026	Se recibe metodologia de reunion de avance del polígono de circuito floresta sur, el cual se le realiza devolución con observaciones.
	Se recibe Volante de convocatoria para la socialización de avance de fase 2 etapa 1 Parque Ciudad Kennedy Oriental supermanzana 16	23/06/2026	23/06/2026	Se realiza revisión al documento al cual se le da visto bueno, se remite concepto al consultor y a la entidad
	Se realiza seguimiento al PSI de Polígono Parque Ciudad Kennedy Oriental supermanzana 16	25/06/2026	25/06/2026	Se realiza verificación de atención a la ciudadania del Punto Satelite de informacion del Polígono de supermanzana 16
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Se Asiste a comité Mi habitat 3 del polígono de supermanzana 16	25/06/2026	25/06/2026	Se realiza seguimiento a la actividad de comité Mi Hábitat con la finalidad de que se cumpla con lo estipulado contractualmente por la entidad.
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Se asiste al Comité técnico semanal N°21 de manera virtual con el acompañamiento de las especialistas del contratista, la entidad y la interventoria.	25/06/2026	25/06/2026	Se asistió al comité en donde se logra informar a las areas sobre las actividades realizadas durante la semana anterior.
CORRESPONDENCIA	se remite oficio al contratista sobre el avance que se debera entregar el 22 de junio del 2026	22/06/2026	22/06/2026	Teniendo en cuenta el correo emitido por la entidad, se remite oficio de clarificación de entrega al documento de caracterización Social del dia 22 de junio del 2026
	Se envia informe mensual N°3 subsanado a la entidad para su concepto	22/06/2026	22/06/2026	Se remite informe mensual social N°3 subsanado para concepto por parte de la entidad
	Se envia el informe semanal social 19 a la entidad para su concepto	22/06/2026	22/06/2026	se remite a la entidad informe semanal 19 para su revisión y concepto.
	Se recibe informe semanal Social N° 19 por parte del contratista	23/06/2026	23/06/2026	Se aprueba informe semanal 19 del contratista y se remite con copia a la entidad para concepto.
	Se recibe mediante correo electronico Vist bueno de la entidad al Acta de comite mi hábitat 3	24/06/2026	24/06/2026	Se da visto bueno al acta de comité mi Hábitat 3 por parte de la entidad
	Se recibe mediante correo electronico aprobacion a informe mensual 3 de la interventoria	26/06/2026	26/06/2026	se recibe mediante correo electronico aprobación al informe mensual 3 de la interventoria.
	Se realiza envio de PGS a la lider de ECOBARRIOS	24/06/2026	24/06/2026	Se remite a la lider de la estrategia de ECO BARRIOS el PGS del contratista para su conocimiento de las actividades contractuales

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN ALISTAMIENTO	

TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO	

TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	

N/A

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Se radico nuevamente el PMT del poligono de Supermanzana 16 y se realizo mesa de trabajo para revision de la metodologia presentada a la SDM

32. PERSONAL INTERVENTORÍA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	**CANT.**	**CARGO**	**CANT.**	**EQUIPO / MAQUINARÍA**	**CANT.**	**UBICACIÓN**	**DÍA**	**HORAS DE LLUVIA**	**ESTADO**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	DIRECTOR CONSULTORÍA	1				LUNES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MARTES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				JUEVES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				VIERNES		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				SÁBADO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1				DOMINGO		
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1				**ESTADO**		
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1				**LLUVIOSO (L)**		
		AFORADOR PARA MOV. 1	1				**FAVORABLE (F)**		
		AFORADOR PARA MOV. 2	1				**SOLEADO (S)**		

TOTAL DE PERSONAL	**16**	**TOTAL DE PERSONAL**	**25**	**TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO**	

36. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

38. OBSERVACIONES
Se mantiene la observación por parte de la interventoría frente al posible riesgo de los tiempos del contrato, teniendo en cuenta la programación presentada por parte del Consultor y avalada por la Secretaria de Hábitat, amparados en los términos contractuales del contrato pero que a la evaluación de la interventoría podrá generar atrasos en el final de cada una de las etapas del proyecto.
39. RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con la metodología de la radicación de derechos de petición ante las entidades que no den respuesta oportuna para los requerimientos realizados.



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA
