CONTRATISTA
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA / BIF
ILULED COLOMBIA S.A.S
NIT: 901.605.178-8

Floridablanca, 24 de Junio del 2026 AFBE – 058 - 2026

Ingeniero;
DIEGO IVAN CORTES ACUÑA
Supervisor Contrato No. 051 de 2022
Banco Inmobiliario de Floridablanca
Tel: 6978599
Transversal 29 # 5-33 Piso 3
Barrio Lagos III etapa
Floridablanca

Respetado Ingeniero;

A continuación, relacionamos la información correspondiente del mes de Junio del 2026.

- Formato Medidas Fotométricas

Cualquier inquietud estamos dispuestos a atenderla con la mayor prontitud.

Cordialmente;

HAIR HOD LOPEZ B.
HAIR HERNANDO LOPEZ BALLESTEROS
Supervisor Técnico
ILULED COLOMBIA S.A.S
Elaboro: Andrea Juliana Ordoz – Asistente Administrativa

ILULED COLOMBIA SAS

FORMATO MEDIDAS FOTOMETRICAS

BIF Alumbrado Público Banco Inmobiliario de Floridablanca

MUNICIPIO: Floridablanca Junio 2026

Malla 1
DIRECCIÓN: Calle 54 # 15-49 Barrio Oasis
FECHA TOMA MEDIDA: 19 de Mayo 2026
LUMINARIA: 03530
ALTURA DE MONTAJE: 7 m
AVANCE: 1 m
INTERDISTANCIA: 30 m
ANGULO DE INCLINACION: 15°


E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	Eprom	Emin	Uo
12,5	13,9	16,2	10,4	12,6	14,1	8,4	10,7	11,8	12,34375	8,4	68%

Simulación




Malla 2
DIRECCIÓN: Calle 53 # 15-03 Barrio Oasis
FECHA TOMA MEDIDA: 26 de Mayo 2026
LUMINARIA: 03945
ALTURA DE MONTAJE: 7 m
AVANCE: 1 m
INTERDISTANCIA: 29 m
ANGULO DE INCLINACION: 15°

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	Eprom	Emin	Uo
11,9	13,2	15,5	10,1	12,5	14,3	8,3	10,2	11,2	12,03125	8,3	69%




Malla 3
DIRECCIÓN: Calle 57 # 15-90 Barrio el Reposo
FECHA TOMA MEDIDA: 04 de Junio 2026
LUMINARIA: 03262
ALTURA DE MONTAJE: 7 m
AVANCE: 1 m
INTERDISTANCIA: 28 m
ANGULO DE INCLINACION: 15°

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	Eprom	Emin	Uo
12,6	13,1	16,2	10,7	12,6	13,1	8,1	10,2	10,8	12,01875	8,1	67%



Malla 4
DIRECCIÓN: Carrera 15a # 57a-17 Barrio el Reposo
FECHA TOMA MEDIDA: 11 de Junio 2026
LUMINARIA: 03609
ALTURA DE MONTAJE: 7 m
AVANCE: 1 m
INTERDISTANCIA: 27m
ANGULO DE INCLINACION: 15°

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	Eprom	Emin	Uo
12,9	14,1	17,2	10,7	12,2	14,5	8,4	10,7	11,6	12,43125	8,4	68%



Luxómetro: EXTECH

Fecha de calibración: 16/03/2026

ELABORÓ ILULED COLOMBIA S.A.S.

REVISÓ INTERVENTORIA MUNICIPIO

REVISÓ SUPERVISOR BIF

CONTRATISTA
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA / BIF
ILULED COLOMBIA S.A.S
NIT: 901.605.178-8

Floridablanca, 25 de Junio del 2026 AFBE – 061 - 2026

Ingeniero;
DIEGO IVAN CORTES ACUÑA
Supervisor Contrato No. 051 de 2022
Banco Inmobiliario de Floridablanca
Tel: 6978599
Transversal 29 # 5-33 Piso 3
Barrio Lagos III etapa
Floridablanca

Asunto: Reporte de mantenimiento de las luminarias reportadas en la verificación de eficiencia realizada el 10 de junio del 2026.

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a lo acordado anexo relación; Relación de luminarias inactivas, formato de verificación de eficiencia lumínica, fotografías, orden de trabajo y ordenes de servicios del 11 de junio del 2026.

Cordialmente;

HAIR HERNANDO LOPEZ B.
HAIR HERNANDO LOPEZ BALLESTEROS
Supervisor Técnico
ILULED COLOMBIA S.A.S
Elaboro: Andrea Juliana Ordaz - Asistente Administrativa

VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LUMINARIAS
MES DE MAYO 2026

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECTOR:	08	Total de luminarias en el sector:	1.475

RELACIÓN DE LUMINARIAS INACTIVAS (LA)

ITEM	DIRECCIÓN	CANT	CODIGO/ DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
1	Kr 16B # 202A-26 B.G.CHAP	1	5999	APAGADA
2	CALLE 200 # 13-288 B RIOFRIO	1	12071	APAGADA
3	CALLE 41 # 23-81 B. CAÑAVERAL	1	4941	APAGADA
4	Cr 24 # 35-200 B CAÑAVERAL	1	4936	APAGADA
5	SANTA MARIA B. CAÑAVERAL	1	AL1052	APAGADA
6	IGLESIA B CAÑAVERAL	1	14508	APAGADA
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

TOTAL (LA)

BIF Alumbrado Público Banco Inmobiliario de Floridablanca

FORMATO VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LUMINARIAS

Alcaldía Municipal de Floridablanca

Año	2026	Mes	Junio	Municipio	Floridablanca
Sector	Urbano	Zona	8	Total luminarias instaladas en el sector	1475

Ítem	Dirección	Cantidad	Código / Descripción	Observación
1	Carrera 16b # 202a-26 Barrio Gonzalez Chaparro	1	5999	APAGADA
2	Calle 200 # 13-288 Sector Rio Frio	1	12071	APAGADA
3	Calle 41 # 23-81 Barrio Cañaveral	1	4941	APAGADA
4	Carrera 35-200 barrio Cañaveral	1	4936	APAGADA
5	Via santa Maria Cañaveral Barrio Cañaveral	1	AL1052	APAGADA
6	Iglesia Barrio Cañaveral	1	14508	APAGADA
	TOTAL L.A.	**6**		

Porcentaje de Luminarias Inactivas

$$\%LI = \frac{LA}{LT} \times 100$$

Porcentaje de Luminarias Inactivas

$$\%LI = \frac{6}{1475} \times 100 = 0.41$$

Las Partes acuerdan que se está cumpliendo con el:

99,59

% de eficiencia en el servicio de Alumbrado Público

Dado en Floridablanca, el dia 10 de Junio 2026. Firman en conformidad quienes intervienen

NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
JAVIER FERNANDO BERDUGO	ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	SUPERVISOR INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PUBLICO	
DIEGO IVAN CORTES ACUÑA	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	SUPERVISOR DEL BIF DE ALUMBRADO PUBLICO	
HAIR HERNANDO LOPEZ BALLESTEROS	ILULED COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR TECNICO	
JORGE ARAGON AMAYA	INTERVENTORIAS TECNICAS & ELECTRICAS S.A.S	INTERVENTOR	



INFORME MANTENIMOENTO RECORRIDO EFICIENCIA
INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
JUNIO - 2026

Las visitas de inspección derivadas del recorrido nocturno realizado en compañía de funcionarios delegados, como representantes de las Entidades intervinientes del Convenio y el acompañamiento de la Interventoría con el fin de identificar el cumplimiento de eficiencia del 99,59% establecido en el Convenio, se llevó a cabo según la Zonificación del Convenio para el Municipio, en la Zona 8 que se presenta a continuación:

ZONA 8	CANT
BUENOS AIRES	96
VILLAS DE SAN DIEGO	95
GONZALEZ CHAPARRO	112
VERSALLES	195
LOS PRINCIPES	62
CAÑAVERAL	564
LA PAZ	154
BAVIERA	38
BRISAS DE FLORIDA	36
VILLA YOLANDA	36
VILLA CLAVER	62
VILLA MARGARITA	25
TOTAL	**1.475**

VERIFICACION MANTENIMIENTO EJECUTADO SEGÚN RECORRIDO DE EFICIENCIA

LUMINICA JUNIO 2026

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

Ítem	Dirección	Cantidad	Código / Descripción	Observación
1	Carrera 16b # 202a-26 Barrio González Chaparro	1	5999	REPARADA
2	Calle 200 # 13-288 Sector Rio Frio	1	12071	REPARADA
3	Calle 41 # 23-81 Barrio Cañaveral	1	4941	REPARADA
4	Carrera 35-200 barrio Cañaveral	1	4936	REPARADA

3	Vía santa María Cañaveral Barrio Cañaveral	1	AL1052	REPARADA
4	Iglesia Barrio Cañaveral	1	14508	REPARADA

Es importante resaltar que el personal técnico designado por la Interventoría efectuó la revisión posterior al recorrido de eficiencia, sin novedad como complemento de nuestra participación activa en esta diligencia, la cual se realiza la siguiente noche del recorrido de eficiencia.

En constancia se firma a los 11 días del mes de junio de 2026, por quienes intervinieron

NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FIRMA
JAVIER FERNANDO BERDUGO	ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	SUPERVISOR INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PUBLICO	
DIEGO IVAN CORTES ACUÑA	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	SUPERVISOR DEL BIF DE ALUMBRADO PUBLICO	
HAIR HERNANDO LOPEZ BALLESTEROS	ILULED COLOMBIA S.A.S.	SUPERVISOR TECNICO	
JORGE ARAGON AMAYA	INTERVENTORIAS TECNICAS & ELECTRICAS S.A.S	INTERVENTOR	

	ALUMBRADO PUBLICO	Fecha:	22/06/2026
		Versión :	2
	ORDEN DE TRABAJO		

Asunto:

Eficiencia Luminica

Numero: **011336**

Creación: 11/06/2026 06:30:06 a.m.
Inicio: 11/06/2026 06:30:06 a.m.
Finalización:

Detalle:

Mantenimiento A.P. Barrios & Veredas De Floridablanca Se programan tareas de Mantenimineto del Alumbrado Pùblico de Floridablanca. Se presta disponibilidad en tiempo real a las tareas asignadas por la empresa en jornada continua de 7:00 A.M. a 4:00 P.M.Mantenimiento A.P. Barrios & Veredas De Floridablanca

Tipo: Mantenimiento
Vehiculo: Camioneta 4X4; LNV 189
Cuadrilla: Grupo 2

Responsable:

Jose Antonio Galviz Alvarez

Medidas de Seguridad

- ☐ **Uso de Implementos de deguridad**
- ☐ **Verificar ausencia de tensión**
- ☐ **Solicitud de corte o suspensión**
- ☐ **Solicitud de vale de materiales**
- ☐ **Revisión Vehiculo**
- ☐ **Revisión de herramientas**
- ☐ **Registro de operaciones**
- ☐ **Cierre de la ODT y el Vale**

Autoriza:

Hair Hernando Lopez Ballesteros

Nombre	Documento

Reportes a atender		
Numero: 088532	**Fecha:** 11/06/2026 06:37:52 a.m.	**Asunto:** Eficiencia Luminica
Nombre: INTERVENTORIAS TECNICAS	**Telefono:** 6913408	
Dirección:		
Sitio: Santa Maria; Barrio cañaveral, Floridablanca		**Detalle:** Eficiencia Luminica AL1052
Infraestructura:		

Reportes a atender		
Numero: 088533	**Fecha:** 11/06/2026 06:38:21 a.m.	**Asunto:** Eficiencia Luminica
Nombre: INTERVENTORIAS TECNICAS	**Telefono:** 6913408	
Dirección:		
Sitio: Iglesia; Barrio cañaveral, Floridablanca		**Detalle:** Eficiencia Luminica 014508
Infraestructura:		

Nombre	Documento
Jose Antonio Galviz Alvarez	
Julian Enrique Ariza Osma	91014623
Libardo Alfonso Forero Gonzalez	91156411

Reportes a atender

Numero: 088528	**Fecha:** 11/06/2026 06:34:52 a.m.	**Asunto:** Eficiencia Luminica
Nombre: INTERVENTORIAS TECNICAS	**Telefono:** 6913408	
Dirección:		
Sitio: Cr 16 B 202 A - 26; Barrio gonzalez chaparro, Floridablanca		**Detalle:** Eficiencia Luminica 05999
Infraestructura:		

Reportes a atender

Numero: 088529	**Fecha:** 11/06/2026 06:36:04 a.m.	**Asunto:** Eficiencia Luminica
Nombre: INTERVENTORIAS TECNICAS	**Telefono:** 6913408	
Dirección:		
Sitio: Cl 200 # 13 - 288; Vereda rio frio, Floridablanca		**Detalle:** Eficiencia Luminica 012071
Infraestructura:		

Reportes a atender

Numero: 088530	**Fecha:** 11/06/2026 06:36:50 a.m.	**Asunto:** Eficiencia Luminica
Nombre: INTERVENTORIAS TECNICAS	**Telefono:** 6913408	
Dirección:		
Sitio: Cl 41 # 23 - 81; Barrio cañaveral, Floridablanca		**Detalle:** Eficiencia Luminica 04941
Infraestructura:		

Reportes a atender

Numero: 088531	**Fecha:** 11/06/2026 06:37:24 a.m.	**Asunto:** Eficiencia Luminica
Nombre: INTERVENTORIAS TECNICAS	**Telefono:** 6913408	
Dirección:		
Sitio: Cr 24 # 35 - 200; Barrio cañaveral, Floridablanca		**Detalle:** Eficiencia Luminica 04936
Infraestructura:		

BIF	ALUMBRADO PUBLICO FLORIDABLANCA		CODIGO	PS-FO-01		
			VERSION	1.0		
			PAGINA	1		
ORDEN DE SERVICIO N° 11336	VALE DE MATERIAL N°	OPERACIÓN N°		DIA	MES	AÑO
			FECHA DE INICIO	11	06	2026
REPORTE N° 88528	INFRAESTRUCTURA 5999	CODIGO/ESSA	HORA DE INICIO			
NOMBRE DEL ENCARGADO JOSE ANTONIO GALVIZ ALVAREZ			HORA DE CIERRE			

DIRECCION CORREGIDA: CR 16B # 202A-26 B. GONZALEZ CHAPARRO.

NOTA:REGISTRAR DIRECCION EN CASO QUE NO CORESPONDA CON LA DIRECCION DEL REPORTE

ITEM	ACTIVIDAD	MATERIAL	COD. INSTALADO	CANTIDAD	ESTADO	COD. RETIRADO
1	CAMBIO	FOTOCELDA		1	NUEVA	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

OBSERVACION:

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO COMO CONSTACIA DE LABORES REALIZADAS, NO GENERA NINGUN COSTO ADICIONAL PARA EL USUARIO

SUPERVISOR	RESPONSABLE ODS	USUARIO	AUDITOR

BIF Alumbrado Público Banco Inmobiliario de Floridablanca

SUPERVISOR TECNICO

BIF	ALUMBRADO PUBLICO FLORIDABLANCA		CODIGO	PS-FO-01
			VERSION	1.0
			PAGINA	1
ORDEN DE SERVICIO N° 11336	VALE DE MATERIAL N°	OPERACIÓN N°		DIA MES AÑO
			FECHA DE INICIO	11 06 2026
REPORTE N° 88529	INFRAESTRUCTURA 12071	CODIGO/ESSA	HORA DE INICIO	
NOMBRE DEL ENCARGADO JOSE ANTONIO GALVIZ ALVAREZ			HORA DE CIERRE	

DIRECCION CORREGIDA: CL 200 # 13-288 VEREDA ROTELO.

NOTA:REGISTRAR DIRECCION EN CASO QUE NO CORESPONDA CON LA DIRECCION DEL REPORTE

ITEM	ACTIVIDAD	MATERIAL	COD. INSTALADO	CANTIDAD	ESTADO	COD. RETIRADO
1	CAMBIO	DRIVER 50W		1	NUEVO	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

OBSERVACION:

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO COMO CONSTACIA DE LABORES REALIZADAS, NO GENERA NINGUN COSTO ADICIONAL PARA EL USUARIO

SUPERVISOR	RESPONSABLE ODS	USUARIO	AUDITOR

BIF Alumbrado Público Floridablanca
RECURSO TECNICO

BIF	ALUMBRADO PUBLICO FLORIDABLANCA		CODIGO	PS-FO-01		
			VERSION	1.0		
			PAGINA	1		
ORDEN DE SERVICIO N° 11336	VALE DE MATERIAL N°	OPERACIÓN N°		DIA	MES	AÑO
			FECHA DE INICIO	11	06	2026
REPORTE N° 88530	INFRAESTRUCTURA 4941	CODIGO/ESSA	HORA DE INICIO			
NOMBRE DEL ENCARGADO JOSE ANTONIO GALVIZ ALVAREZ			HORA DE CIERRE			

DIRECCION CORREGIDA: CL 41 # 23-81 CAÑAVERAL.

NOTA: REGISTRAR DIRECCION EN CASO QUE NO CORESPONDA CON LA DIRECCION DEL REPORTE

ITEM	ACTIVIDAD	MATERIAL	COD. INSTALADO	CANTIDAD	ESTADO	COD. RETIRADO
1	CAMBIO	COLECTOR		1	NUEVO	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

OBSERVACION:

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO COMO CONSTACIA DE LABORES REALIZADAS, NO GENERA NINGUN COSTO ADICIONAL PARA EL USUARIO

SUPERVISOR	RESPONSABLE ODS	USUARIO	AUDITOR

BIF Alumbrado Público Banco Inmobiliario de Floridablanca
PERSONAL TECNICO

BIF	ALUMBRADO PUBLICO FLORIDABLANCA		CODIGO	PS-FO-01		
			VERSION	1.0		
			PAGINA	1		
ORDEN DE SERVICIO N° 11336	VALE DE MATERIAL N°	OPERACIÓN N°		DIA	MES	AÑO
			FECHA DE INICIO	11	06	2026
REPORTE N° 88531	INFRAESTRUCTURA U·4936.	CODIGO/ESSA	HORA DE INICIO			
NOMBRE DEL ENCARGADO JOSE ANTONIO GALVIZ ALVAREZ			HORA DE CIERRE			

DIRECCION CORREGIDA: CR 24 # 35-200 B. CAÑAVERAL

NOTA:REGISTRAR DIRECCION EN CASO QUE NO CORESPONDA CON LA DIRECCION DEL REPORTE

ITEM	ACTIVIDAD	MATERIAL	COD. INSTALADO	CANTIDAD	ESTADO	COD. RETIRADO
1	CAMBIO	DRIVER KOW		1	NUEVO	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

OBSERVACION:

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO COMO CONSTACIA DE LABORES REALIZADAS, NO GENERA NINGUN COSTO ADICIONAL PARA EL USUARIO

SUPERVISOR	RESPONSABLE ODS	USUARIO	AUDITOR

BIF	ALUMBRADO PUBLICO FLORIDABLANCA		CODIGO	PS-FO-01		
			VERSION	1.0		
			PAGINA	1		
ORDEN DE SERVICIO N° 11336	VALE DE MATERIAL N°	OPERACIÓN N°		DIA	MES	AÑO
			FECHA DE INICIO	11	06	2026
REPORTE N° 88532	INFRAESTRUCTURA AL1052	CODIGO/ESSA	HORA DE INICIO			
NOMBRE DEL ENCARGADO JOSE ANTONIO GALVIZ ALVAREZ			HORA DE CIERRE			

DIRECCION CORREGIDA: VIA GAUTA MARIA B. CAÑAVERAL.

NOTA:REGISTRAR DIRECCION EN CASO QUE NO CORESPONDA CON LA DIRECCION DEL REPORTE

ITEM	ACTIVIDAD	MATERIAL	COD. INSTALADO	CANTIDAD	ESTADO	COD. RETIRADO
1	MANTENIMIENTO					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

OBSERVACION: GE AJUSTO CONEXION.

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO COMO CONSTACIA DE LABORES REALIZADAS, NO GENERA NINGUN COSTO ADICIONAL PARA EL USUARIO

SUPERVISOR	RESPONSABLE ODS	USUARIO	AUDITOR

ALCALDIA DE FLORIDABLANCA Administrativo Publico Banco Inmobiliario de Floridablanca

BIF	ALUMBRADO PUBLICO FLORIDABLANCA		CODIGO	PS-FO-01		
			VERSION	1.0		
			PAGINA	1		
ORDEN DE SERVICIO N° 11336	VALE DE MATERIAL N°	OPERACIÓN N°		DIA	MES	AÑO
			FECHA DE INICIO	11	06	2026
REPORTE N° 88533	INFRAESTRUCTURA 14508	CODIGO/ESSA	HORA DE INICIO			
NOMBRE DEL ENCARGADO JOSE ANTONIO GALVIZ ALVAREZ			HORA DE CIERRE			

DIRECCION CORREGIDA: IGLESIA B. CANAVERAL

NOTA: REGISTRAR DIRECCION EN CASO QUE NO CORRESPONDA CON LA DIRECCION DEL REPORTE

ITEM	ACTIVIDAD	MATERIAL	COD. INSTALADO	CANTIDAD	ESTADO	COD. RETIRADO
1	CAMBIO	DLIVER 50 W.		2	NUEVO	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						


OBSERVACION:

NOTA: LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO COMO CONSTACIA DE LABORES REALIZADAS, NO GENERA NINGUN COSTO ADICIONAL PARA EL USUARIO

SUPERVISOR	RESPONSABLE ODS	USUARIO	AUDITOR

EFICIENCIA LIMINICA MAYO 2026

LUMINARIA 5999 REPARADA

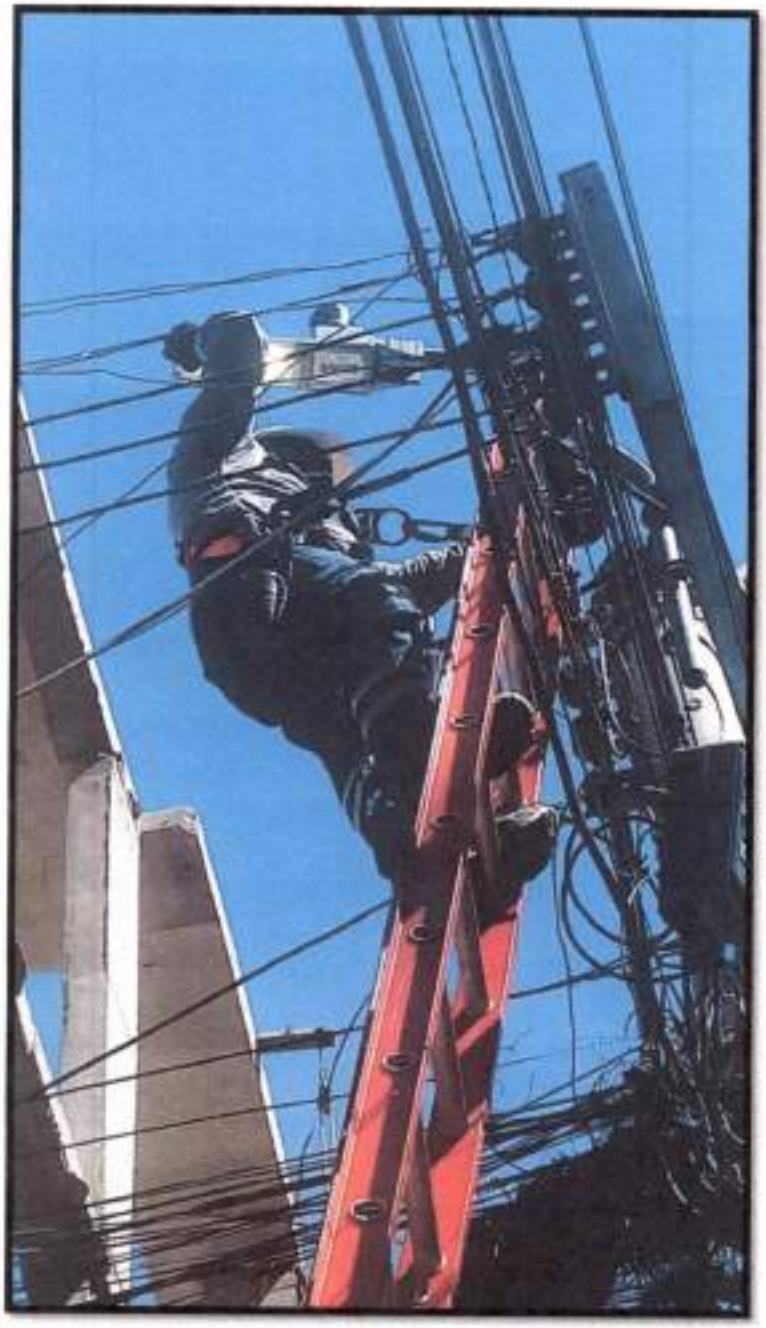

LUMINARIA 12071 REPARADA



LUMINARIA 4941 REPARADA



LUMINARIA 4936 REPARADA



LUMINARIA 14508 REPARADA



CONTRATISTA
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA / BIF
ILULED COLOMBIA S.A.S
NIT: 901.605.178-8

Floridablanca, 22 de Julio del 2026

AFBE – 068 - 2026

Ingeniero;
DIEGO IVAN CORTES ACUÑA
Supervisor Contrato No. 051 de 2022
Banco Inmobiliario de Floridablanca
Tel: 6978599
Transversal 29 # 5-33 Piso 3
Barrio Lagos III etapa
Floridablanca

Respetado Ingeniero;

A continuación, relacionamos la información correspondiente del 01 al 30 de Junio del 2026.

- Reporte variación de carga.

Cualquier inquietud estamos dispuestos a atenderla con la mayor prontitud.

Cordialmente;

ILULED COLOMBIA SAS 901.605.178-8 TECNICO

ING. JAIME ARMANDO ALMEYDA RUEDA
Coordinador Técnico
Iluled Colombia SAS
Elaboro: Andrea Juliana Ordoz – Auxiliar Administrativa

Gmail

Floridablanca BIF <apfloridablanca.bif@gmail.com>

Acuse de Recibido 20260320035273 - 44524

1 mensaje

ESSA <ESSA@essa.com.co>
Para: "apfloridablanca.bif@gmail.com" <apfloridablanca.bif@gmail.com>

21 de julio de 2026 a las 2:05 p.m.

ESSA
Grupo epm

Acuse de Recibido 20260320035273 - 44524

Respetado Cliente / Usuario,

Hemos recibido una solicitud enviada desde el correo electrónico **apfloridablanca.bif@gmail.com**.

Para futuras solicitudes, radique su **Petición, Queja, Reclamo o Recurso (PQR)** en el siguiente enlace oficial:

https://www.essa.com.co/site/serviciosdigitales/crear-pqr-clientes

Su solicitud ha sido registrada con el siguiente radicado:

No. 20260320035273 del 7/21/2026

Asunto: **"Solicitud de radicacion Variacion de carga junio 2026"**

Esta será atendida dentro de los términos legales establecidos, conforme a la Ley 142 de 1994 y la Ley 1437 de 2011.

Recomendaciones:

- Incluir número de cuenta.
- Adjuntar copia de la factura.
- Indicar número del medidor del inmueble.

Floridablanca, 21 de julio de 2026

Señores
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP.
Atn. Ingeniero Jaime Enrique Osorio
Profesional equipo operación y calidad
Carrera 19 No. 24-56
L.C.

Ref. Información Variación Carga SAP mes de junio 2026 - Municipio Floridablanca.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales establecidas en el marco del "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA", suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF; así como, para dar continuidad al proceso de variación de carga producto de la modernización y/o expansión del Sistema de Alumbrado Público – SAP – que se está llevando a cabo en el Municipio, atentamente mediante la presente, como Operador del alumbrado público se estará informando sobre este tipo de actividades; a fin de que se surtan los procedimientos a que haya lugar entre las Entidades involucradas que permitan desarrollar, socializar y conciliar el consumo de energía para el SAP del Municipio de Floridablanca; para ello, acudo a sus buenos oficios para informar que, en el mes de junio de 2026 no hubo variación de carga.

Agradezco de antemano la atención y colaboración.

Atentamente,

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
Director Banco Inmobiliario de Floridablanca
C.C. Ing. Gerson Andrés González Ortiz - Secretario de Infraestructura Municipio de Floridablanca
Arq. Javier Fernando Berdugo – P.E. Supervisor Interventoría Alumbrado Público Mpio de Floridablanca
Ing. Jorge Aragon Amaya – INTECELEC S.A.S.
Archivo

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 97 85 99
Info@bif.gov.co
www.bif.gov.co
