RELATORIA MESA DE TRABAJO

Florencia Caquetá, 03 de febrero de 2025
Hora programada: 3:00 pm
Lugar: Secretaria de infraestructura y plan departamental de aguas del Caquetá.

Contrato de Interventoría No. 202500000025, cuyo objeto contractual es la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA) DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DEALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ".

TEMAS A DESARROLLAR:
SOCIALIZAR LAS OBSRVACIPNES RESULTANES DE LA REVSIION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE CONSULTORIA, EN AS A LA RESOLUCION 0330 DE 12017, NSR 10 Y DOICUEMNTYO TECNICO SOPORTE DEL PROCESO

ASISTENTES:

- ANA SOFIA SANTOFIMIO CALDERON – Apoyo a la supervisión PDA Caqueta
- ANDRES GOMEZ – Interventoría
- MAURICIO NOVA – Apoyo a la interventoría

DESARROLLO

La ingeniera ana sofia saluda a los presentes y aclara que el objetivo de la mesa técnica es socializar las observaciones resultantes de la revisión de los entregables por parte de interventoría y por parte de la supervisión de esta, es decir pda.
Aclaramos que los entregables actuales son los siguientes:

PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA
DIAGNOSTICO DETALLADO DE LA SITUACION	9/12/2025
FORMULACION Y ANALSIS DE ALTERNATIVAS, ESCOGENCIA DE LA MAS FAVORABLE	6/01/2026
ESTUDIO HIDROLOGICO	6/01/2026
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	18/12/2025

ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA	18/12/2025
DISEÑOS ESTRUCTURALES	6/01/2026
PLANOS	6/01/2026
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CNSTRUCCION	6/01/2026
REQUISITOS AMBIENTALES	6/01/2026
REQUISITOS PREDIALES	6/01/2026
APOYO A LA FORMULACION Y PRESENTACIN DEL PORYECTO ANTE EL MECANISMO DE FINANCIACION	6/01/2026

Cabe aclarar que la consultoría brindo acceso el 21 de enero de 2026, así que la revisión preliminar se realizó en menos de dos semanas.

Las observaciones resultantes son las siguientes:

0. DIAGOSTICO
    a. El Excel de cálculos no abre
    b. Utilizan la fuente de datos para la población el registro del DANE 2018, tomando en cuenta que hay una data más actualizada post pandemia, se recomienda ajustarse a la fuente de información más reciente
    c. Ampliar el análisis de amenaza y vulnerabilidad, tomando como insumo la hidrología del proyecto
    d. No se presentan cantidades referentes a la población afectadas
    e. No se identifica las características socioculturales n la demanda y necesidades de la población
    f. No hay memorial de responsabilidad
    g. No se encentra firmado el anexo presentado.
1. ALTERNATIVAS
    a. No se presentan planos
    b. No se presentan memorias de cálculos preliminares
    c. Hace falta complementar con los anexos respetivos el análisis multicriterio de alternativas (ejemplo, mencionan que la alternativa 1 tiene un valor total, pero no presentan el presupuesto)
2. DISEÑOS HIDRAULICOS
    a. No presentan reconocimiento de campo, investigación predial inicial
    b. No presenta diseño geométrico y análisis de interferencias
    c. No hay diseño hidráulico

d. No presentan obras complementarias
e. No presentan manual de arranque y puesta en marcha
f. No hay manual de operación y mantenimiento
g. No hay análisis de selección de alternativas para tuberías
h. No presenta diseño y modelación hidráulica de redes de alcantarillado
i. No presenta diseño de obras complementarias
j. No hay planos hidráulicos
k. No hay memorial de responsabilidad
l. No se encuentra firmado el documento

3. HIDROLOGIA
    a. No hay estudio de socavación
    b. No hay mancha de inundación
    c. No hay modelación soporte
    d. No hay planos
    e. No hay memoria de cálculos
    f. No hay memorial de responsabilidad
    g. El informe no se encuentra firmado
4. TOPOGRAFIA
    a. No presentan procedimiento de materialización de vértices geodésicos
    b. No presenta procedimiento de posicionamiento de vértices geodésicos
    c. No anexan los archivos RINEX
5. ESTUDIO DE SUELOS
    a. Definir que norma establece el número de sondeos que se debe realizar y a que distancia, además justificar la profundidad de los apiques
    b. Se solicita registro fotográfico de los apiques para corroborar el hecho de que no se presenta nivel freático en la zona
6. ESTUDIO ESTRUCTURAL
    a. No presenta memoria de cálculos del box coulvert
    b. No presenta planos
    c. No presenta memoria de cálculos de obras complementarias
    d. No presenta memorial de responsabilidad
    e. Los planos no se encuentran firmados

7. PLANOS
    a. No presentan planos:
        i. Plano de localización general del proyecto.
        ii. Planos de implantación sobre el plano topográfico correspondiente en planta y perfil, según naturaleza del componente
        iii. Esquema del proyecto
        iv. Plano de implantación de estructuras puntuales
        v. Plano de cruce de vías
        vi. Plano de interferencia de redes, si se dispone de esta información.

vii. Planos hidráulicos.
viii. Planos geológicos.
ix. Planos hidrológicos.
x. Planos estructurales del box coulvert y viaducticoss..
xi. Planos de pasos elevados y/o subfluviales (si aplican)
xii. Planos de detalle constructivo por componentes.
xiii. reducido en planta y otro en perfil


8. PRESUPUESTO
    a. No se encuentra el presupuesto en la información compartida por la consultoria, además sin planos no se podría verificar las cantidades
9. REQUISITOS PREDIALES
    a. No presentan estudio predial
10. REQUISITOS AMBIENTALES
    a. No presentan estudio de requisitos ambientales
11. APOYO A LA FORMULACION
    a. Carta de presentación del proyecto diligenciada para ser complementada y firmada por parte de la alcaldía.
    b. Las fichas MGA, EBI y los soportes de la carta de presentación deberán ser gestionadas certificado de requerimiento o no de permiso por parte de la aeronáutica civil.
    c. Certificado de concordancia del proyecto con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.
    d. Certificación de afectación o no de grupos étnicos.
    e. Certificación de afectación o no de patrimonio arqueológico.
    f. Certificado de necesidad o no de realizar reasentamiento de población.
    g. Certificado de afectación o no de vías concesionadas por la alcaldía.

Tras socializar las observaciones resultantes de ambas revisiones, el interventor se compromete a entregar dichas observaciones a la consultoría bajo su supervisión con copia al pda Caquetá.

REGISTRO FOTOGRAFICO



LISTADO DE ASISTENCIA

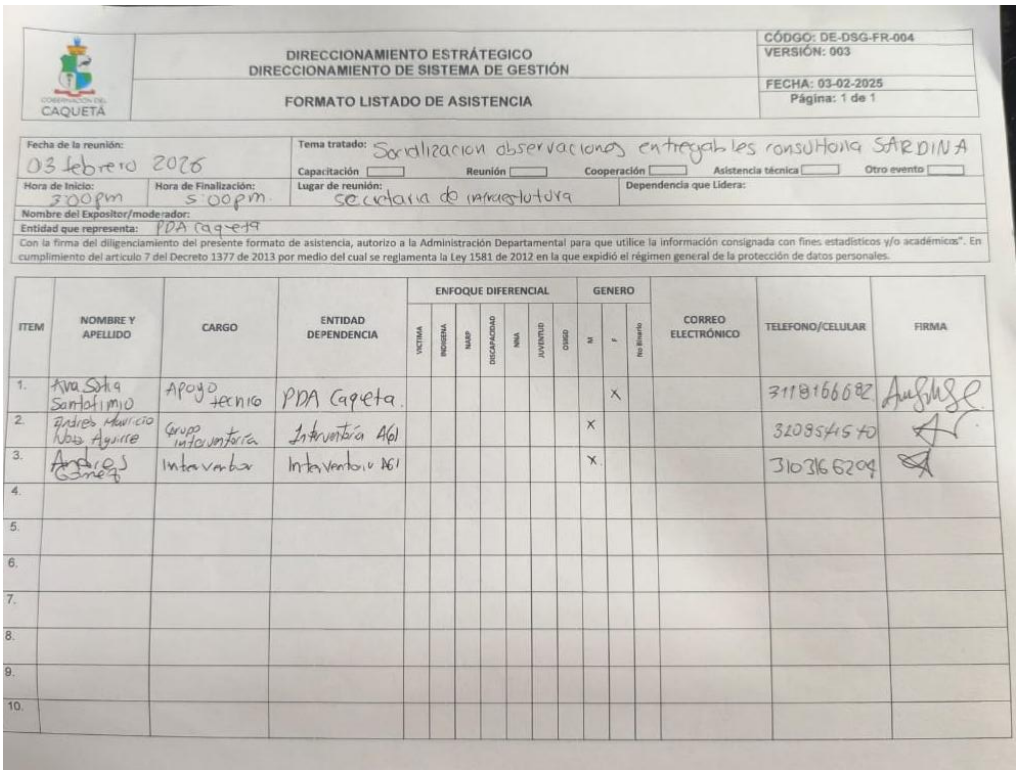

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO
DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: DE-DSG-FR-004
VERSIÓN: 003
FECHA: 03-02-2025
Página: 1 de 1

Fecha de la reunión: 03 febrero 2026
Tema tratado: Socializacion observaciones entregables consultoria SARDINA
Capacitación [ ] Reunión [ ] Cooperación [ ] Asistencia técnica [ ] Otro evento [ ]
Hora de Inicio: 3:00 pm
Hora de Finalización: 5:00 pm.
Lugar de reunión: secretaria de infraestructura
Dependencia que Lidera:
Nombre del Expositor/moderador:
Entidad que representa: PDA caqueta

Con la firma del diligenciamiento del presente formato de asistencia, autorizo a la Administración Departamental para que utilice la información consignada con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	ENTIDAD DEPENDENCIA	ENFOQUE DIFERENCIAL							GENERO			CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
				VICTIMA	INDIGENA	NARP	DISCAPACIDAD	NNA	JUVENTUD	OTRO	M	F	No Binario			
1.	Ana Sofia Santofimio	Apoyo tecnico	PDA Caqueta									X			3118166682	
2.	Andres Mauricio Nova Aguirre	Grupo interventoria	Interventoria AGI								X				3208545470	
3.	Andres Gomez	Interventor	Interventoria AGI								X				3103662094	
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
