INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10
CONTRATO N°: MT – DC – MC No. 254
PERIODO: 9
CONTRATISTA: CONSORCIO ID 064

1. INTRODUCCIÓN.

El Instituto Nacional de Vías **INVIAS**, buscando el beneficio de la comunidad del municipio de Timbiqui - Cauca, mediante la Garantía de la comunicación terrestre de la población rural del corregimiento de Bubuey y el municipio de Timbiqui, de una manera segura, brindando comodidad a los usuarios y disminuyendo el riesgo que puede presentar el estado el estado actual de la vía, debido a que por un lado la vía está en mal estado, intransitable o con restricciones de tránsito y por otro lado hay deficiente mantenimiento y falta de obras de arte que permita el drenaje adecuado de las aguas lluvias y el transito adecuado de los peatones por lo que no se brinda condiciones de seguridad y comodidad, generando un bajo desarrollo socioeconómico. Por esto, se realiza la construcción de la placa huella y obras de arte en la vía del corregimiento de Bubuey, municipio de Timbiqui:

EJECUCIÓN	DEPARTAMENTO	M/PIO	NOMBRE DE LA VÍA	No DE CONTRATO	LONGITUD TOTAL (Km)	VALOR CONTRATO DE OBRA
DEP	CAUCA	TIMBIQUI	VIA CORREGIMIENTO BUBUEY	MT – DC – MC No. 254	200 ML	$ 990.927.001

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS suscribió el convenio interadministrativo No. 002661 del 27 de diciembre de 2019 con el Municipio de Timbiqui, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. A través de este convenio, el Municipio de Timbiqui adjudicó el contrato de obra No. MT-DC-MC- No. 254, a fin de cumplir el objeto pactado en el convenio en mención.

A fin de llevar un estricto control de parte del **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** a la ejecución del proyecto, la entidad consideró necesario realizar en forma simultánea al contrato obra, el concurso de méritos abierto No. CMA-DO-SRT-064-2020 cuyo objeto corresponde a la **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”,** con el fin de realizar el seguimiento de las obras de mejoramiento y mantenimiento de la vía en mención.,

Para el control técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra, el Instituto Nacional de Vías adjudicó la Interventoría al **CONSORCIO ID 064**, mediante contrato No. **1220 de 2020**, el cual tuvo orden de inicio el día quince (15) de diciembre del 2020.

El desarrollo de esta interventoría se hace en conjunto con el personal técnico y administrativo necesario, para los objetivos que se describen a continuación:

- ✓ Recuperar los niveles de servicio y capacidad vial de los corredores a intervenir, para de esta forma ofrecer a la comunidad y a las regiones una infraestructura vial adecuada, de calidad aceptable.

- ✓ Ofrecer una infraestructura vial en buenas condiciones, que permita disminuir los costos de operación de los vehículos, reducir los tiempos de viaje, mejorar la comodidad para la circulación vehicular y reducir los niveles de accidentalidad.

- ✓ Apoyar el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.

- ✓ Disponer de capacidad instalada, maquinaria, equipo y personal para dar respuesta a los requerimientos de mejoramiento vial que contribuya a la movilidad rural de los municipios.

A continuación, se indica el avance de las actividades del contrato de obra durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2021, además de las labores ejecutadas por la Interventoría y la información contractual que le permita a la Entidad contratante conocer detalladamente la ejecución del contrato de Obra, el cual está siendo supervisado por la Interventoría según Contrato N°1220 de 2020 del **CONSORCIO ID 064.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA.

2.1. Localización del proyecto.

El proyecto cuyo objeto es "**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020**)" se localiza técnicamente así: La vía que se proyecta intervenir es la que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de Bubuey. Esta vía se encuentra parcialmente pavimentada, con placa huella en buen estado hasta la abscisa k1+048, con este proyecto se propone extender la placa huella hasta la abscisa k1+248, construyendo doscientos (200) metros lineales de placa huella con dos (2) alcantarillas de 36”. El ancho de la vía, incluidas las cunetas debe ser mínimo de 6 m. Sin embargo, se deberán considerar sobre anchos en aquellos sitios en que se requiera para el caso de curvas o zonas que se necesite permitir el paso de dos vehículos al tiempo, esta vía estará ubicada sobre un terreno ondulado, con pendientes longitudinales que varían entre 2% y 7%, la condición actual de la sub rasante presenta un suelo heterogéneo con sectores donde se presenta baja consistencia en sus primeros 50 cm, y mejorando la capacidad de soporte por debajo de los 50cm. Los suelos de sub rasante en general están conformados por suelos finos de color habanos y amarillos.

2.2. Estado inicial de la Obra.

La empresa AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S realizará el consolidando de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto como son: levantamiento topográfico, diseño geométrico, estudio Hidráulico e hidrológico, diseño de pavimentos, diseño

geotécnico, diseño estructural, entre otros, los cuales serán revisados por los especialistas de la interventoría para así proceder con la aprobación y ejecución de los mismos.

Así mismo, se realizarán actividades de rocería y mejoramiento de las condiciones actuales del corredor, a través del programa denominado “EMPRENDEDORES RURALES” impulsado por el Invias a través de su departamento del SGR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

ESTADO INICIAL DE LA VÍA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY - MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA.



Foto No. 1: VALLA INFORMATIVA



Foto No. 2: INSTALACION DE FORMALETAS




Foto No. 3: INSTALACION DE FORMALETAS

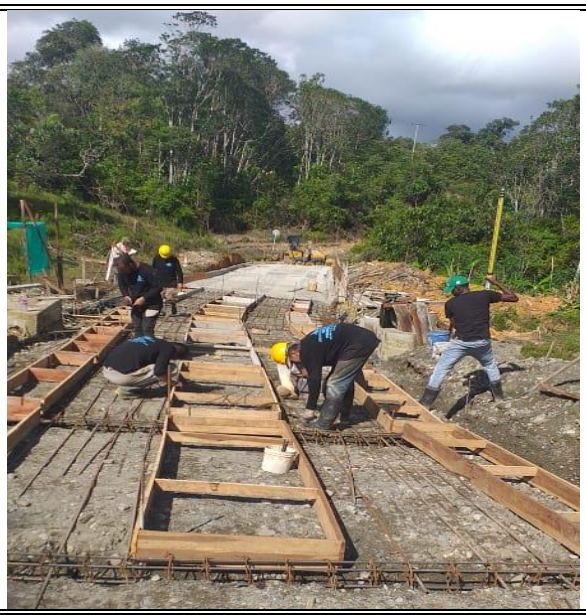
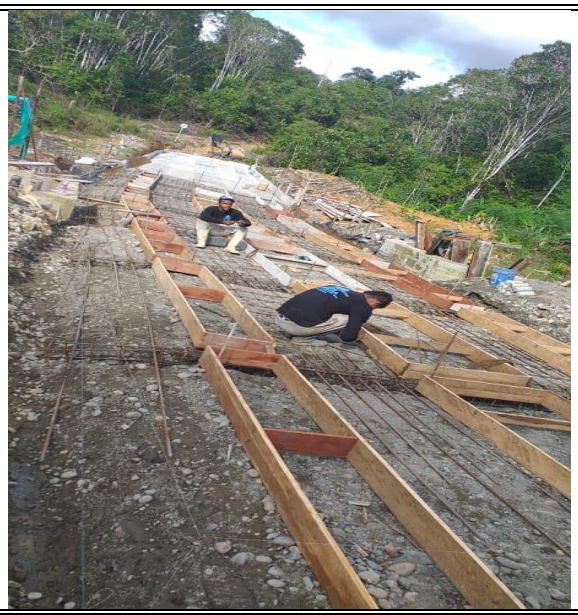



Foto No. 4: INSTALACION DE FORMALETAS





Foto No. 5: INSTALACION DE ACERO





Foto No. 6: INSTALACION DE ACERO




Foto No. 7: FUNDICION DE BORDILLOS




Foto No. 8: FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA



Foto No. 9: FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA



Foto No. 10: FUNDICION DE PLACA HUELLA



Foto No. 11: FUNDICION DE PLACA HUELLA



Foto No. 12: FUNDICION DE PLACA HUELLA





Foto No. 13: NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBBASE





Foto No. 14: TRAMO EJECUTADO DE PLACA HUELLA

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1. Contrato

CONTRATO No.:	MT-DC-MC- No. 254
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 990.927.001 m/cte
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 990.927.001 m/cte
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TIMBIQUI
CONTRATISTA:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO DE OBRA	24 DE AGOSTO DE 2020
FECHA ORDEN DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO FINAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
OTRO SI No. 1 - PRORROGA	A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA OTRO SI No. 1 - PRORROGA	30 DE ABRIL DEL 2021
MUNICIPIO:	TIMBIQUI - CAUCA

El contrato de obra se encuentra en ejecución en donde se adelantaron actividades de excavación, descapote, llegada de material de mejoramiento por parte de La empresa AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

3.2. Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas.

- No se realizaron actividades unos días por fuertes lluvias.
- Se nivela y se compacta subbase granular desde la ABS-150 A LA ABS-200.
- Corte de hierro.
- Se instalan formaletas para bordillos.
- Se instalan formaletas para vigas transversales.
- Se instalan formaletas para placa huella.
- Se instala acero para placa huella.
- Se instala acero para vigas transversales.
- Se funde concreto ciclópeo para placa huella.
- Se realiza fundición de bordillos.
- Se realiza fundición de placa huella.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY

4.2 Relación de Maquinaria y Equipo de Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

4.3 Control Diario Del Personal De Obra.

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTRATO OBRA.

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA

4.5 Estado General del Tiempo

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA.

4.8 Informe Avance Físico-Financiero

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-15 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

4.10 Seguimiento Programa De Inversiones

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV

4.11 Actas De Comité De Obra

4.12 Informe Semanal

Se adjunta los informes semanales correspondiente al mes de agosto del periodo 27/08/2021 al 30/09/2021.

Informe semanal No. 30: 27 al 02 de septiembre del 2021
Informe semanal No. 31: 03 al 09 de septiembre del 2021
Informe semanal No. 32: 10 al 16 de septiembre del 2021
Informe semanal No. 33: 17 al 23 de septiembre del 2021
Informe semanal No. 34: 24 al 30 de septiembre del 2021

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	1220 de 2020
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL
VALOR INICIAL:	$ 428.593.375
FECHA DE INCIO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA INICIAL DEL FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
PRORROGA No. 1	A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO ACTUALIZADO PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2021
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 1	30 DE MAYO DEL 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. JORGE MEDINA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JUAN CAMILO CACERES
MUNICIPIO:	TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas.

Durante el presente periodo Interventoría realiza las siguientes actividades.

- Seguimiento y acompañamiento a actividades realizadas por el contratista (compactación de material subbase, nivelación de subbase, encofrado, instalación de placa huella).
- Cumplimiento del protocolo de bioseguridad, de manera conjunta con personal del contratista.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Relación de maquinaria y equipo interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO INT.

6.2 Control diario del personal de interventoría.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INT.

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS INT

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa registro fotográfico en el formato DF002152-1-V1 REGISTRO FOTOGRÁFICO para revisión y aprobación de la supervisión, y correspondiente al desarrollo de actividades de obra en el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2021.

8. COMENTARIOS ADICIONALES DEL SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO

1. Se solicita al contratista la elaboración y ejecución del Plan de Contingencia debido a los atrasos que se evidenciaron en este periodo.
2. El proyecto a fecha de corte 30 de septiembre de 2021, tiene un programado acumulado de 100% versus a un ejecutado acumulado de 79,81%.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. _____10_____ **MES O PERIODO:** 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		
2.1	Localización		X		
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				
2.3	Características técnicas del proyecto		X		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		X	
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5			
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		X	
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		X	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 / 9 / 2021

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: MT-DC-MC- No. 254

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE INICIACION:	18 DE DICIEMBRE DEL 2020	FECHA DE OTRO SI - PRORROGA	30 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE JULIO DEL 2021	FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 990.927.001,00	VALOR ADICIÓNALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 990.927.001,00	AMORTIZACION ANTICIPO:	$ 300.101.595,84
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 396.370.800,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1220 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción	ML	200
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción	ML	100
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 121.878.196,68	227.833.939		227.833.939	1,87	$ -	0	0,000
Acumulado:	$ 987.166.903,00	787.050.305	-	787.050.305	0,80	$ -	0	0,000

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 990.927.001
Total	$ 990.927.001

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 990.927.001
2020	$ -
Total	$ 990.927.001

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,79	8,00	0,80	2,00	200.116.598	0	200.116.598	200.116.598
Interventor:	0,00	8,00	0,76	2,50	-	0	-	-

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.000.000
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 4.000.000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	17-sep-21	30-may-22
Buen manejo del anticipo	17-sep-21	30-may-22
Prestaciones sociales	17-sep-21	30-nov-24
Calidad del servicio	30-nov-21	30-nov-26
Estabilidad de la obra	30-nov-21	30-nov-26

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsavilidad civil excontractual	25/09/2020	30/11/2021

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	9	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021 **CONTRATO No.** MT-DC-MC- No. 254 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S. **SECTOR:** K1+048 HASTA K1+248
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora Champion																															
Vibrocompactador Dynapac												X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Retrocargador New Holand												X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Volqueta dobletroque																															
Furgón																															
Mezcladora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Equipo de topografía	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Herramienta menor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Equipo de laboratorio - Densidades																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LOS DIAS QUE ESTAN EN BLANCO ES PORQUE NO LLEGO EL PERSONAL REQUERIDO Y POR FUERTES LLUVIAS

CONVENCIONES:

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. : 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cauca

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** MT-DC-MC- No. 254 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL

CONTRATISTA: **AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.** **SECTOR:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ID 064

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALEX YAIR MANCILLA	REPRESENTANTE LEGAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MARIN DUARTE ALEXON		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LUANGO VALENCIA JHON ALEXANDER		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BEDOYA SANCHEZ ALBERTO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. : 19202139938 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: MT-DC-MC- No. 254 **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL

SECTOR: CORREGIMIENTO BUBUEY - MUNICIPIO TIMBIQUI

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
						$ 990.927.001
			TOTAL			$ 990.927.001

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 990.927.001,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.2020000635 De (20/05/2020)	Valor Total Ejecutado Acumulado|	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	PARCIAL	18/12/2020 al 17/01/2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 990.927.001,00				acta en 0
2	PARCIAL	18/01/2020 al 17/02/2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 990.927.001,00				acta en 0
3	PARCIAL	18/02/2020 al 17/03/2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 990.927.001,00				acta en 0
4	PARCIAL	18/03/2020 al 17/04/2021	$ 264.808.360	$ 760.000,00	$ 265.568.359,60	$ 106.227.343,84	$ 290.219.425		$ 265.568.360	$ 725.358.641,40				
5	PARCIAL	18/04/2020 al 18/05/2021	$ 217.415.720	$ -	$ 217.415.720,00	$ 86.966.288,00	$ 203.253.137		$ 482.984.080	$ 507.942.921,40				
6	PARCIAL	17/06/2020 al 17/08/2021	$ 267.269.910	$ -	$ 267.269.910,00	$ 106.907.964,00	$ 96.345.173		$ 750.253.990	$ 240.673.011,40				
TOTALES			**$ 749.493.990**	**$ 760.000**	**$ 750.253.990**	**$ 300.101.596**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 745.493.989,60	$ -	$ 745.493.989,60
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		$ -	$ -
AJUSTES		$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.000.000,00	$ 760.000,00	$ 4.760.000,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 749.493.989,60	$ 760.000,00	$ 750.253.989,60

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Rep. Legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202139938 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No MT-DC-MC- No. 254 **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

SECTOR: K1+048 HASTA K1+248

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	18	16	16	18		18	24	24	24		16	16	18	24	24	24	24		18	24	24	24	16	18		24	18	16	24	16		
Lluvias moderadas	4	2	2	4		4					2	2	4						6				2	4			4	2		2		
Lluvias intensas	2	6	6	2	24	2	24	24	24	24	6	6	2					24					6	2			2	6		6		
Trafico en la via																																0
Total	24	24	24	24	24	24	48	48	48	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. : 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: MT-DC-MC- No. 254 **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA RURAL

SECTOR: CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO - CONCRETO 3000 PSI (PLACA HUELLA)

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo (%)	Resultado del Ensayo (%)	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZARON ENSAYOS

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: Alex yair mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	30 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: MT-DC-MC- No. 254

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA RURAL

SECTOR: CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Ba se Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
MARIN DUARTE ALEXON					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EPS SURA	30	POSITIVA	COLPENSION	30	COMFANDI	30	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.	
LUANGO VALENCIA JHON ALEXANDER					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COMFENALCO VALLE	30	POSITIVA	PORVENIR	30	COMFANDI	30	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.	
BEDOYA SANCHEZ ALBERTO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EPS SURA	30	POSITIVA	COLPENSION	30	COMFANDI	30	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.	

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. : 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 6 **PERIODO MES:** sep-21 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 217.415.720,00

CONTRATO DE OBRA No :	MT-DC-MC- No. 254	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DIEMBRE DEL 2020	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2021
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)	FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DEL 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/05/2021
CONTRATISTA:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE JULIO DEL 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30 NOVIEMBRE DEL 2021
SECTOR:	CORREGIMIENTO VIA BBUEY - TIMBIQUI	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 990.927.001,00	VALOR ADICIONALES:	$ -
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 990.927.001,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 300.101.596
TRAMO:	K1+048 HASTA K1+248	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 396.370.800,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1220 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
MT-DC-MC- No. 254	HASTA 30-11-21	30/11/2021	$ 990.927.001	990.927.001,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 990.927.001
Total	$ 990.927.001

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 396.370.800
Amortizado $	$ 300.101.596
Saldo $	$ 96.269.204

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1220 DE 2020	HASTA 15-12-21	12/12/2021	$ 428.593.375,00	$ 428.593.375,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 121.878.196,68	227.833.939	-	227.833.939	1,87	X	0	0,000
Acumulado:	$ 987.166.903,00	787.050.305	-	787.050.305	0,80		0	0,000

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,79	8,00	0,80	2,00	203.876.696	0	203.876.696	203.876.696
Interventor:	0,00	8,00	0,76	2,50	428.593.375	0	428.593.375	428.593.375

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	0,885
Calzada:	0,885
Bermas:	0,885
Sub base:	0,885
Base:	
Placa Huella:	0,885

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.000.000
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 4.000.000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0+25	PR 0+050	PR 0+100	PR 0+150	PR 0+200	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
											En el mes		Acumulado	
											Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANACIONES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
AFIRMADOS, SUB BAASES Y BASES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CONCRETO HIDRAULICO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
TRANSPORTES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre : ALEX YAIR MANCILLA
Representante Legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. MT-DC-MC- No. 254 **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)

FECHA DE INICIO: 18/12/2020

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE-20

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: **$ 990.927.001,00**

VALOR ACUMULADO: **$ 990.927.001,00**
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: **$ 4.000.000,00**

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: **$ 4.000.000,00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ID 064

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 99.092.700,10	25	9	2020	30	6	2021
Buen manejo del anticipo		$ 396.370.800,40	25	9	2020	30	6	2021
Pago de prestaciones sociales		$ 198.185.400,20	25	9	2020	31	12	2023
Calidad de servicio		$ 297.278.100,30	21	12	2020	31	12	2025
Estabilidad de Obra		$ 297.278.100,30	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **C-100032285**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 333.465.140,00	25	9	2020	31	12	2020
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **C-100006834** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 99.092.700,10	17	9	21	30	5	22
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 396.370.800,40	17	9	21	30	5	22
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 198.185.400,20	17	9	21	30	11	2024
Calidad de Estudios y Diseños		$ 297.278.100,30	30	11	21	30	11	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 297.278.100,30	30	11	21	30	11	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **C-100032285**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 1.811.705.200,00	25	9	20	30	11	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **C-100006834** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. **3**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JOHANY MUÑOZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 1920240631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 **CONTRATO No.** 1220 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO ID 064** **SECTOR:** COREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI K1+048 HASTA K1+248

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA INTERVENTORIA NO HA HECHO USO DE EQUIPOS DURANTE ESTE PERIODO

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 1920213993

Firma
Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 1920240631 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	9	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1220 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064 **SECTOR:**

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JOHANY MUÑOZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: johany muñoz
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202139938 CAU

Firma
Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 1920240631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	30	9	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ID 064

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 428.593.375,00

VALOR ACUMULADO: $ 428.593.375,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 214.296.687,5	22	9	2020	31	3	2021
Cumplimiento del contrato		$ 42.859.337,5	22	9	2020	31	3	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 85.718.675,0	22	9	2020	30	3	2024
Calidd del servicio		$ 128.578.012,5	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **21-44101333391**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SA**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 214.296.687,5	22	9	2020	9	1	2022
Cumplimiento del contrato		$ 42.859.337,5	22	9	2020	9	1	2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 85.718.675,0	22	9	2020	9	7	2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 30 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

Calidd del servicio		$ 128.578.012,5	31	12	2020	31	12	2025	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101322041

Certificado de modificación o anexo No.: **8**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SA**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JOHANY MUÑOZ

Director de Interventoría

Matricula No.: 19202139938 CAU

Firma

Nombre: JORGE MEDINA

Supervisor Contrato de Interventoría

Matricula No.: 1920240631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	DF002-OB-1		
		VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO FOTOGRÁFICO 01 AL 12 MAYO DE 2021	PAGINA	1	DE	1

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	MT-DC-MC- No. 254	**FECHA ELABORACIÓN**		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ID 064	**CONTRATO N°**	1220 DE 2020	30 (Día)	9 (Mes)	2021 (Año)
NOMBRE DEL PROYECTO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)**					




Descripción: INSTALACION DE FORMALETAS





Descripción: INSTALACION DE FORMALETAS

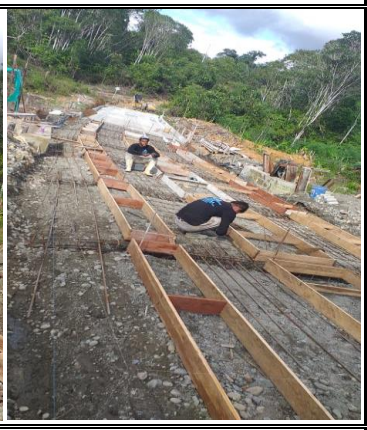Descripción: INSTALACION DE FORMALETAS




Descripción: INSTALACION DE ACERO

Descripción: INSTALACION DE ACERO

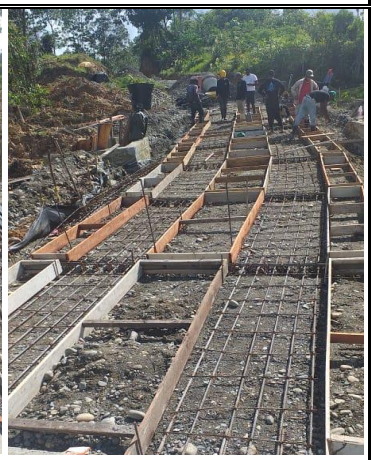



Descripción: FUNDICION DE BORDILLOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	DF002-OB-1		
		VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO FOTOGRÁFICO 01 AL 12 MAYO DE 2021	PAGINA	1	DE	1





Descripción: FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA

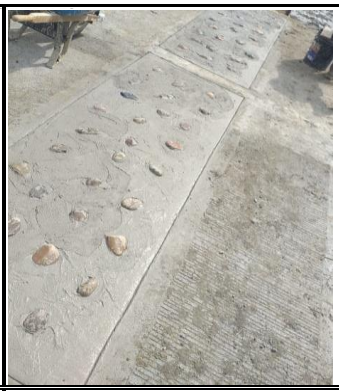


Descripción: : FUNDICION DE PLACA HUELLA



Descripción: FUNDICION DE PLACA HUELLA

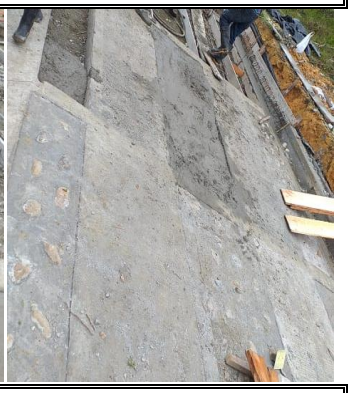Descripción: : FUNDICION DE PLACA HUELLA




Descripción: NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBBASE




Descripción: TRAMO EJECUTADO DE PLACA HUELLA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO	DSL-152		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. **10** **MES O PERIODO:** AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20

CONSECUTIVO	ASUNTO	REFERENCIA	FECHA DE RECIBO		
			DIA	MES	AÑO
ID064-041-2020	APROBACIÓN SOLICITUD PRORROGA NO. 4	LA INTERVENTORÍA EMITE APROBACIÓN A LA SOLICITUD DE PRORROGA NO. 4 DEL CONTRATISTA DE OBRA Y SOLICITA AL MUNICIPIO SU APROBACIÓN Y PROCEDER CON LA MISMA.	16	9	2021
ID064-045-2020	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DOCUMENTAL	LA INTERVENTORÍA NOTIFICA AL CONTRATISTA DE OBRA ACERCA DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DERIVADO DE NO ENTREGAR LA DOCUMENTACÓN CONTRACTUAL REQUERIDA.	21	9	2021
ID064-049-2020	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	LA INTERVENTORÍA REALIZA SOLICITUD DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTIGENCIA AL CONTRATISTA DE OBRA DEBIDO AL RETRASO MAYOR LA 10% QUE PRESENTA.	17	9	2021
ID064-053-2020	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ	LA INTERVENTORÍA NOTIFICA AL INVIAS, SOBRE EL PRESEUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEBIDO A QUE NO HA REALIZADO LA DILIGENCIA EN LAS SOLICITUDES DE LA INTERVENTORÍA EN CUANTO TRATA A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23	9	2021
ID064-062-2020	SOLICITUD REPROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN POLIZAS	LA INTERVENTORÍA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA ENTREGAR REPROGRAMACIÓN Y POLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO A LA PRORROGA NO. 4.	27	9	2021

AYAPAC S.A.S
NIT.900.228.581-2

BUREAU VERITAS

AYA- 577-2021

Santiago de Cali, 02 de septiembre de 2021.

ING JOHANY MUÑOZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO ID 064
CONTRATO 1220 DE 2020

Referencia: **SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO MT-DC-LP N. 254 DEL 2020 - CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY-MUNICIPIO DE TIMBIQUI-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

Cordial saludo;

Según comunicación No. AYA- 576-2021 habiamos solicitado inicialmente una prorroga al contrato por un plazo hasta el día 19 de septiembre del 2021, aprobada por ustedes el día 12 de agosto del 2021 mediante oficio ID064-035-2020 pero, teniendo en cuenta un ajuste a la programación realizada y el plan de contingencia remitido a la interventoria, encontramos que este plazo no es suficiente para la terminación de las actividades programadas según cronograma de obra.

Lo anterior justificado en las precipitaciones presentes en la zona que no han permitido desarrollar de manera adecuada las actividades programadas. Situación que se viene presentado desde el mes de abril, como lo confirma un anexo a esta comunicación con los datos emitidos por el IDEAM, es por esto que nos vemos en la necesidad nuevamente de solicitar formalmente una adición en tiempo para finalizar las obras en mención, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2021.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente

Alex Yair Mancilla
Ayapac construcciones SAS

CC.
ALCALDIA MUNICIPAL TIMBIQUI

*ANEXO HISTORIAL DE PRECIPITACIONES EN TIMBIQUI CAUCA – CONCEPTO CLIMATICO DE LA REGION (IDEAM)



PRECIPITACIÓN

La distribución de lluvias en el departamento del Cauca registra una gran variabilidad territorial. Las mayores lluvias ocurren hacia la vertiente del Pacífico en los municipios de López, Timbiquí y Guapi, con volúmenes superiores a los 7000 mm anuales. Los menores valores se registran en sectores de la cuenca del Patía, en municipios como Rosas, El Bordo y La Fonda, entre otros, con cantidades anuales menores a los 1000 mm en promedio.

El régimen de lluvias predominante en el departamento es bimodal con una temporada seca muy marcada hacia los meses de junio, julio y agosto y una temporada lluviosa principal en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Adicionalmente, se registran dos temporadas secundarias: en los meses de enero y febrero las lluvias disminuyen y en el periodo de marzo a mayo, se incrementan. En la vertiente del Pacífico, no existe una temporada seca definida y las lluvias predominan durante todo el año.

El número de días con lluvia oscila alrededor de 250 en la vertiente pacífica y en el extremo suroriental del Cauca; en el resto del departamento se conserva entre 100 y 200 días lluviosos al año, en promedio.

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

En la vertiente occidental se presentan climas cálidos húmedos y supe húmedos. Hacia la cuenca del Patía el clima es de tipo cálido semiárido. Sobre la parte central predomina el clima templado húmedo y semihúmedo. Los climas fríos se registran a lado y lado de la meseta de Popayán.

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
MINAMBIENTE
TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Popayán, 13 de septiembre de 2021.

Señores
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ING. OSWALDO ARAGON
SECRETARIO PLANEACIÓN MUNCIPAL
MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA
Edificio El CAM Cra 2 # 3 – 16, Timbiqui, Cauca

REFERENCIA	**CONTRATO MT-DC-LP No. 254 DE 2020**
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY – MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
ASUNTO:	**APROBACION SOLICITUD PRORROGA No. 5**

En respuesta al comunicado AYA 577 - 2021 enviado el 02 de septiembre de 2021, realizado por el Contratista AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S, y en el que solicita una prórroga al contrato al contrato de obra No. **MT- DC-LP No. 254 DE 2020**; La Interventoría avala esta solicitud por el tiempo requerido hasta el 30 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en su comunicado ya que estas motivan dicha adición en tiempo.

Por lo anterior la Interventoría pone a consideración del municipio de Timbiquí, la aprobación al requerimiento de prórroga.

Agradezco la atención

prestada. Cordialmente;



JOHANY MUÑOZ LONDOÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ID 064
Anexos: oficio solicitud de prórroga AYA 578-2021
Copia: ING JUAN CAMILO CACERES – GESTOR TECNICO INVIAS
ING JORGE MEDINA – SUPERVISOR INVIAS

Popayán, 26 de agosto del 2021.

Señores
AYAPAC CONSTRUCCIONES
S.A.S ALEX JAIR MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL
Calle 8ª No 16 -67
Cali, Valle del Cauca

REFERENCIA: **CONTRATO MT-DC-LP No. 254 DE 2020**

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY – MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ASUNTO: **PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DOCUMENTAL REITERACIÓN OFICIO ID064-037-2020**

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No. 1220 de 2020, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", por medio del presente notificamos a ustedes el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, las que se citan a continuación y sin que la enunciación sea taxativa:

CLÁUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, "1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.","5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.", "11. Cumplir con las normas de gestión ambiental que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato…relacionadas con el manejo ambiental." **CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA,** "3. Presentar el PAGA…","10. Entregar informes mensuales con sus respectivos actas de obra, programa de obra…".


De acuerdo con lo anterior se le ha solicitado con reiteración mediante oficio No. ID064-037-2020, y que como es del conocimiento del contratista de obra, a esta interventoría no ha sido allegada la documentación solicitada, de ese modo se insta a dar cumplimiento a más tardar

el lunes 27 de septiembre del 2021. Y presentar los informes a los que hubiese lugar en adelante en los primeros 5 días hábiles posteriores al mes ejecutado.

1. Informe mensual ambiental No. 1: del 01 al 30 de abril del 2021
2. Informe mensual ambiental No. 2: del 01 al 12 de mayo del 2021
3. Informe mensual ambiental No. 3: del 01 al 31 de julio del 2021
4. Informe mensual ambiental No. 4: del 01 al 31 de agosto del 2021
5. Informe mensual de bioseguridad No. 1: del 01 al 30 de abril del 2021
6. Informe mensual de bioseguridad No. 2: del 01 al 12 de mayo del 2021
7. Informe mensual de bioseguridad No. 3: del 01 al 31 de julio del 2021
8. Informe mensual de bioseguridad No. 4: del 01 al 31 de agosto del 2021
9. Informes de seguridad y salud en el trabajo SST.

Quedamos atentos a comentarios,

Atentamente,



JOHANY MUÑOZ LONDOÑO
DIRECTOR DE
INTERVENTORÍA
CONSORCIO ID 064
Copia: Ing. Juan Camilo Caceres – Gestor INVIAS

Popayán, 17 de septiembre del 2021.

Señores
AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S
ALEX JAIR MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL
Calle 8ª No 16 -67
Cali, Valle del Cauca

REFERENCIA:	**CONTRATO MT-DC-LP No. 254 DE 2020**
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY – MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ASUNTO:	**SOLICITUD PLAN DE CONTIGENCIA**

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No. 1220 de 2020, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", por medio del presente notificamos a ustedes la desviación en el cumplimiento del cronograma a la fecha 15 de septiembre de 2021:

Programado: 96,80%
Ejecutado: 77,61 %
Desviación: **19,19 %**

Siendo así una desviación que requiere atención inmediata por parte del contratista de obra, de este modo se insta de forma urgente y sin dilación a elaborar e implementar Plan de Contingencia a mas tardar 3 días calendario posterior a recepción de este comunicado.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

JOHANY MUÑOZ LONDOÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ID 064
Copia: Ing. Juan Camilo Cáceres – Gestor INVIAS

Popayán, 23 de septiembre de 2021.

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECTOR TERRITORIAL
ATN. ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLÓN
Carrera 9 No. 25N-06
Popayán

REFERENCIA:	**CONTRATO 1220 DE 2020**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
ASUNTO:	**PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002661 DE 2019. MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, CAUCA.**

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No. 1220 de 2020, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", por medio del presente informamos a usted el presunto incumplimiento según lo consignado en el convenio en mención a la **CLAUSULA SÉPTIMA**. MANEJO DE LOS RECURSOS, 5 "*Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el **INSTITUTO** serán manejados y reintegrados al **INSTITUTO** conforme al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre del 2005…y serán consignados a la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera del **INSTITUTO,** Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión de que trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al MUNICIPIO*.".

Toda vez que esta interventoría ha solicitado en reiteradas ocasiones al Municipio de Timbiquí se le informe sobre los estados de estos rendimientos financieros y su devolución mediante los oficios ID064-010-2020, ID064-018-2020, ID064-023-2020 y ID064-034-2020, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta ante dicha solicitud.

Agradezco la atención

prestada. Cordialmente;

JOHANY MUÑOZ LONDOÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ID 064

Anexos: ID064 010-2020, ID064-018-2020, ID064-023-2020, ID064-034-2020.
Copia: Ing. Juan Camilo Cáceres, Ing. Jorge Medina.

Popayán, 27 de septiembre del 2021.

Señores
AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S
ALEX JAIR MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL
Calle 8ª No 16 -67
Cali, Valle del Cauca

REFERENCIA:	**CONTRATO MT-DC-LP No. 254 DE 2020**
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY – MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ASUNTO:	**SOLICITUD REPROGRAMACION Y ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO A PRÓRROGA.**

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No. 1220 de 2020, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", se solicita la entrega expedita de la reprogramacion de acuerdo a la fecha de solicitud de prorroga hasta el 30 de noviembre del 2021 y en formato Excel, y los tramites de pólizas actualizadas, según las fechas aprobadas en la solicitud de prorroga No.3 del contrato. Toda vez que para dar continuidad con el trámite requerimos mantener la documentación vigente y actualizada.

Es necesaria la entrega de la totalidad de la documentación mencionada en este oficio para el día **30 de septiembre de 2021**, para un óptimo seguimiento por parte de esta interventoría al contrato de referencia, también, la omisión de la presente solicitud evidencia una falta de cumplimiento que las obligaciones contractuales que darían lugar a un presunto incumplimiento de acuerdo al articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

Quedo atento a lo solicitado.

Cordialmente;

JOHANY MUÑOZ LONDOÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ID 064
Copia: Ing. Juan Camilo Caceres – Gestor INVIAS
Jorge Medina Supervisor Contrato INVIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	1	9	21
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ALCALDIA MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA No. MT –DC – LP 001 **DE** 2020

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY – MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ING CAMILO CACERES	GESTOR INVIAS	INVIAS
DIEGO PEREA	CONTRATISTA	AYAPAC CONSTRUCCIONES SAS
ARQ. FERNANDO PEREZ	CONTRATISTA	AYAPAC CONSTRUCCIONES SAS
ING. JOHANY MUÑOZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA CONSORCIO ID064
ING. BRAYAN GUERRERO	COORDINADOR APOYO	INTERVENTORIA CONSORCIO ID064
ING. ERNESTO PERDOMO	REPRESENTANTE L.	INTERVENTORIA CONSORCIO ID064
FERNEY ALEGRÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA CONSORCIO ID064

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar avances que se tengan del proyecto en cuanto a la entrega de documentacion y actividades tecnicas

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Revisar avances que se tengan del proyecto en cuanto a la entrega de documentacion y actividades en obra

Requerimientos enviados por interventoria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

FISICO

AVANCE PROGRAMADO: 91,00%

AVANCE EJECUTADO: 76,00%

1. La interventoria comenta que se presenta un atraso importante en la ejecucion de las obras, teniendo en cuenta que el plazo de terminacion del contrato esta proximo 19 de septiembre 2021. La interventoria hace llamado de atencion al contratista ya que el atraso se ha intensificado en aproximadamente en un 10% a 15%, aunado la anterior solicita aumentar los rendimientos y tomar las medidas necesarias para tales fines.
El contratista comenta que ha presentado estos retrasos por hechos no imputables como lo son las lluvias y limitaciones al transporte maritimo ya que según comenta se han presentado paros de dicho gremio, también menciona que ha tomado las medidas necesarias entre esas incrementar el personal de obra y aumentar la cantidad de equipos para aumentar los rendimientos.

2. La interventoría comenta sobre el proceso construcitivo que manifiesta el contratista, sobre que estos son autonomos en las decisiones siempre y cuanto se cumplas la normativa técnica y de calidad, así mismo evaluar los temás logisiticos y técnicos para mejorar el rendimiento y mitigar la desviación que presentan actualmente.

3. Sobre la caracterizacion vial, el contratista comenta que ya fue contratado el profesional que se encargara de esto. En los proximos dias estara comentado a la interventoria el plazo que necesitan para desarrollar esta actividad y la respectiva entrega.

4. La interventoría solicita sea enviado la documentación pendiente siendo esta, caracterización vial, informes de gestión ambiental, y planillas de seguridad social; el contratista comenta que el consultor ya se encuentra realizando actividades y se aclara el alcance de la caracterización es la longitud de 3,2 del corredor Timbiquí - Bubey, el cual debe ser radicado y posteriormente aprobado por el Ministerio de Transporte.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega de documentación informes ambientales	**11/09/2021**	**contratista**
Entrega de afiliacion y planillas del personal de obra	**11/09/2021**	**contratista**

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

No se cuenta con asistencia por parte del municipio de Timbiquí.

Pendiente confirmar reuión entre la secretaría de planeación, contratista e interventoría.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
BRAYAN GUERRERO	

Original: Informe mensual de Interventoría.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial
