19

19 Anexo V CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
(41 folios)

Alcaldía de Aguazul	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAN:

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.262 expedida en Tunja, en mi condición de Interventor y **SAUDITH ANDREA MORALES RODRIGUEZ** identificada con cedula de ciudadania No. 33.366.488 de Tunja, Boyacá con tarjeta profesional No. 117143-T inscrita a la Junta Central de Contadores de Colombia en condición de contadora pública, luego de examinar la contabilidad y de más documentación del **CONSORCIO SUBESTACIÓN**, verifico y apruebo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes: salud, pensión, riesgos laborales, ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar, según se indica en las planillas soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por las mismas durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre del 2025 al 18 marzo de 2026, en relación con el personal requerido para el desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARALA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.", Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Alcaldía de Aguazul

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

RELACIÓN PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2025

PERIODO	PANILLA No.	IBC PENSIÓN	PENSIÓN		IBC	SALUD		CCF COMFACASANARE	RIESGOS POSITIVA		ICBF	SENA	TOTAL
			VR LIQUIDADO	AFP		VR LIQUIDADO	EPS	VR LIQUIDADO	IBC	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	
NOVIEMBRE 2025 DICIEMBRE 2025	9496339448	$1.423.500	$227.900	COLPENSIONES PORVENIR	$1.423.500	$ 178.100	NUEVA EPS SANITAS	$57.000	$1.423.500	$99.300	$42.800	$28.500	$633.600
NOVIEMBRE 2025	9496339223	-	-	-	-	-	-	-	$2.277.600	$ 158.600	-	-	$158.600
TOTAL		**$1.423.500**	**$227.900**		**$1.423.500**	**$178.100**		**$57.000**	**$3.701.100**	**$ 257.900**	**$ 42.800**	**$ 28.500**	**$792.200**

RELACIÓN PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2025

PERIODO	PANILLA No.	IBC PENSIÓN	PENSIÓN		IBC	SALUD		CCF COMFACASANARE	RIESGOS POSITIVA		ICBF	SENA	TOTAL
			VR LIQUIDADO	AFP		VR LIQUIDADO	EPS	VR LIQUIDADO	IBC	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	
DICIEMBRE 2025 ENERO 2026	9497661799	$4.697.550	$751.800	COLPENSIONES PORVENIR	$4.697.550	$ 587.500	NUEVA EPS SANITAS	$188.100	$4.697.550	$327.000	$141.300	$94.100	$2.090.000
DICIEMBRE 2025	9497657571	-	-	-	-	-	-	-	$1.423.500	$ 99.100	-	-	$99.100
TOTAL		**$4.697.550**	**$751.800**		**$4.697.550**	**$ 587.500**		**$188.100**	**$7.544.550**	**$ 525.400**	**$ 141.300**	**$ 94.100**	**$2.228.200**

RELACIÓN PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2026

PERIODO	PANILLA No.	IBC PENSIÓN	PENSIÓN		IBC	SALUD		CCF COMFACASANARE	RIESGOS POSITIVA		ICBF	SENA	TOTAL
			VR LIQUIDADO	AFP		VR LIQUIDADO	EPS	VR LIQUIDADO	IBC	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	
ENERO 2026 FEBRERO 2026	9499462047	$5,135,990	$822.000	COLPENSIONES PORVENIR	$5,135,990	$ 642.100	NUEVA EPS SANITAS	$205.700	$5,135,990	$357.700	$154.300	$103.000	$2.284.800
ENERO DE 2026	9499436741								$3.501.810	$ 243.800			$243.800
TOTAL		**$5,135,990**	**$822.000**		**$5,135,990**	**$ 642.100**		**$205.700**	**$8.637.800**	**$ 601.500**	**$ 154.300**	**$103.000**	**$2.528.600**

RELACIÓN PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2026

PERIODO	PANILLA No.	IBC PENSIÓN	PENSIÓN		IBC	SALUD		CCF COMFACASANARE	RIESGOS POSITIVA		ICBF	SENA	TOTAL
			VR LIQUIDADO	AFP		VR LIQUIDADO	EPS	VR LIQUIDADO	IBC	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	
FEBRERO 2026 MARZO 2026	9501230109	$7,003,620	$1,120,800	COLPENSIONES PORVENIR	$7,003,620	$ 875.600	NUEVA EPS SANITAS	$280,400	$7,003,620	$487,600	$210,400	$140,400	$3,115,200
FEBRERO DE 2026	9501223645								$3,501,810	$ 243,800			$ 243,800
TOTAL		$7,003,620	$1,120,800		$7,003,620	$ 875.600		$280,400	$10,505,430	$ 731,400	$ 210,400	$140,400	$3,359,000

RELACIÓN PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2026

PERIODO	PANILLA No.	IBC PENSIÓN	PENSIÓN		IBC	SALUD		CCF COMFACASANARE	RIESGOS POSITIVA		ICBF	SENA	TOTAL
			VR LIQUIDADO	AFP		VR LIQUIDADO	EPS	VR LIQUIDADO	IBC	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	VR LIQUIDADO	
MARZO 2026 ABRIL 2026	9502861648	$5,427,806	$868,700	COLPENSIONES PORVENIR	$5,427,806	$ 687,600	NUEVA EPS SANITAS	$217,300	$5,427,806	$377,900	$163,300	$108,700	$2,414,300
MARZO 2026	9501223645								$2,217,814	$ 154,400			$ 154,400
TOTAL		$5,427,806	$868,700		$5,427,806	$687,600		$217,300	$7,645,620	$ 532,300	$ 163,300	$108,700	$2,568,700

RELACIÓN PLANILLAS SS TRABAJORES OPS MES DE NOVIEMBRE 2025

PERIODO	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE TRABAJADOR	PANILLA No.	TOTAL
NOVIEMBRE 2025	CC 1.049.607.835	COCUNUBO VARGAS DEYBER EUFRANIO	7995222021	741.300
NOVIEMBRE 2025	CC 7.186.364	GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	9497978819	429.000

RELACIÓN PLANILLAS SS TRABAJORES OPS MES DE NOVIEMBRE 2025				
PERIODO	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE TRABAJADOR	PANILLA No.	TOTAL
DICIEMBRE 2025	CC 1.049.607.835	COCUNUBO VARGAS DEYBER EUFRANIO	7998579346	743.500
DICIEMBRE 2025	CC 1.116.548.487	GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	9497978285	429.000

RELACIÓN PLANILLAS SS TRABAJORES OPS MES DE ENERO 2026				
PERIODO	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE TRABAJADOR	PANILLA No.	TOTAL
ENERO 2026	CC 1.049.607.835	COCUNUBO VARGAS DEYBER EUFRANIO	6003611671	788.400
ENERO 2026	CC 1.116.548.487	GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	9499484959	518.900

RELACIÓN PLANILLAS SS TRABAJORES OPS MES DE FEBRERO 2026				
PERIODO	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE TRABAJADOR	PANILLA No.	TOTAL
FEBRERO 2026	CC 1.049.607.835	COCUNUBO VARGAS DEYBER EUFRANIO	6003688739	788.400
FEBRERO 2026	CC 1.116.548.487	GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	9500738635	518.900

RELACIÓN PLANILLAS SS TRABAJORES OPS MES DE FEBRERO 2026				
PERIODO	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE TRABAJADOR	PANILLA No.	TOTAL
MARZO 2026	CC 1.049.607.835	COCUNUBO VARGAS DEYBER EUFRANIO	6009449426	805.500
MARZO 2026	CC 1.116.548.487	GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	9500738635	518.900

Para constancia se firma en Aguazul, a los veintidós (22) días del mes de mayo del 2026.

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
CC No 1.049.607.262 DE TUNJA
INTERVENTOR

SAUDITH ANDREA MORALES RODRIGUEZ
C.C. No. 33.366.488 de Tunja
TP No. 117143-T
CONTADORA PÚBLICA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
33.366.488
MORALES RODRIGUEZ
SAUDITH ANDREA


19-ABR-1982
MIRAFLORES
(BOYACA)
1.67
O+
F
02-JUN-2000 TUNJA


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
117143-T
SAUDITH ANDREA
MORALES RODRIGUEZ
C.C. 33366488
RESOLUCION INSCRIPCION 016
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
FECHA 02/03/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
127044


DUPLICADO
182910

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 9 2 4 7 1 4 F 2 E 3 4 7 9 8 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SAUDITH ANDREA MORALES RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33366488 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 117143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9496339448	9496339448	E	2025/12/09	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	9	$637,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cdp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80429681	CERON PRECIADO ANDERSMIRO	X																	210301	4	$189,800	$30,400	EPS017	4	$189,800	$23,800	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$13,300	4	$189,800	$9,500	No	$84,600
1	CC	1-0753160	LOZANO AMEZQUITA WAGNER	X																	25-14	24	$1,138,800	$182,200	EPS005	24	$1,138,800	$142,400	CCF69	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$79,300	24	$1,138,800	$57,000	No	$506,600
1	CC	1116549559	MENDOZA GARCIA WILLIAM	X	X																210301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$11,900	CCF64	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$94,900	$4,800	No	$42,400
Total	Afiliados(3)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,100			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,300		$1,423,500	$71,300		$633,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9496339448	9496339448	E	2025/12/03	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	9	$637,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$227,900	$1,400	$0	$229,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$182,300	$1,100	$0	$183,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$45,600	$300	$0	$45,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$99,300	$600	$0	$99,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$99,300	$600	$0	$99,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$57,000	$400	$0	$57,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$57,000	$400	$0	$57,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$178,100	$1,100	$0	$179,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$23,800	$200	$0	$24,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$154,300	$900	$0	$155,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$42,800	$300	$0	$43,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$42,800	$300	$0	$43,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,500	$200	$0	$28,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$28,500	$200	$0	$28,700
TOTAL				3	$633,600	$4,000	$0	$637,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	94963392Z3	94963392Z3	Y	2025/12/03	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	9	$159,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049607835	COCIUBUBO VARGAS DEYSER STEFANO	X																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14.23	24	$1,138,800	$79,300	0	$0	$0	No	$79,300
2	CC	1116548487	GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	X																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14.23	24	$1,138,800	$79,300	0	$0	$0	No	$79,300
Total			Afiliados(2)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,277,600	$158,600		$0	$0		$158,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901187309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9496339223	9496339223	Y	2025/12/03	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	9	$159,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$158,600	$900	$0	$159,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$158,600	$900	$0	$159,500
TOTAL				2	$158,600	$900	$0	$159,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1098667835
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			DEYDER ELIFRANDO COCUNUBO VARGAS
CIUDAD/MUNICIPIO			BOYACÁ
DIRECCIÓN	TOWA	DEPARTAMENTO	TUNJA
TIPO APORTANTE	CENTRO	TELÉFONO	7444444
TIPO EMPRESA	SUCURSAL/DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades registradores y facilitadoras de la sert
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			79952220821	TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre	AÑO 2025	
DIAS DE MORA	1						
FECHA PAGO (AAAA-MM-DD)	2025-12-15			NÚMERO AUTORIZACIÓN			19851859287

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
05-14	05-14 COLPENSIONES	1	$ 469.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 469.300	$ 300	$ 469.300
SUBTOTALES:										**$ 469.300**	**$ 300**	**$ 469.300**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AGREG	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AGREG	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS900	EPS900 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.080	$ 0	$ 300	$ 0	$ 312.380	$ 300	$ 0	$ 312.700
SUBTOTALES:													**$ 312.380**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 312.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.100	$ 13.100	$ 100	$ 0	$ 13.200
SUBTOTALES:									**$ 13.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 13.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10 COMPENSAR	1	$ 15.000	$ 100	$ 15.100
SUBTOTALES:			**$ 15.000**	**$ 100**	**$ 15.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES								
																												PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MEN	
TIP	TIPO DOC IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	NRO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO MENSUAL	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VIP	NOMBRE	DIAS COT	RIC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	NOMBRE	DIAS COT	RIC	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	TOTAL APORTE	NOMBRE	DIAS COT	RIC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS LICEN	RIC	NOMBRE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098667835	DEYDER ELIFRANDO COCUNUBO VARGAS	1	INDEPENDIENTE	$ 3.500.000	INTEGRAL																PENSIÓN OBLIGATORIA	30	$ 469.000	$ 469.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 469.000	EPS900 SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.080	$ 0	$ 312.080	14-11 ARL SURA	14	$ 2.500.000	$ 13.100	$ 13.100			CCF10 - COMPENSAR	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 741.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116548487		GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 SUR No 43-36	BOGOTA-BOGOTA D.C.	4631204	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	208767-4579	5497978819	1	2025/12/19	2026/01/16	BANCOLOMBIA	28	$436,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$781,242	$15,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$429,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$781,242	$15,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$429,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$781,242	$15,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$429,000
1	CC	1116548487	GUTIERREZ JENCY	23/10/1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$781,242	$15,700	64-22	30	$1,423,500	0.5225	$7,500	30	$0	$0	No	$429,000
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$781,242	$15,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$429,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$4,000	$0	$231,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$4,000	$0	$231,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$200	$0	$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$300	$0	$16,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$15,700	$300	$0	$16,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$3,100	$0	$181,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$3,100	$0	$181,100
TOTAL				1	$429,000	$7,600	$0	$436,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174310227	No.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2065971305	9497661799	E	2026/01/06	2026/01/07	BANCOLOMBIA	1	$2,091,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	rac	ens	vct	vl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80429681	CORON PRECIADO ANGELMIRO		X																	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$130,900	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-23	23	$1,091,350	$70,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
2	CC	1116555426	CLAVIJO PERALTA JOHAN SEBASTIAN	X	X																	230301	14	$664,300	$106,300	EPSC25	14	$664,300	$83,100	CCF69	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$46,100	14	$664,300	$33,300	No	$295,600
3	CC	1116550297	POLGUIN MARTINEZ WILLIAM ESNITH	X	X																	230301	18	$854,100	$136,700	EPSC25	18	$854,100	$106,800	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-23	18	$854,100	$59,500	18	$854,100	$42,800	No	$380,000
4	CC	1006441492	SUAREZ ARIZA JUVIAN	X	X																	230301	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$83,100	CCF69	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$46,100	14	$664,300	$33,300	No	$295,600
5	CC	74753260	LOZANO ARIZQUITA EDWAGNER																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total	Afiliados(5)																							$4,697,550	$751,800			$4,697,550	$587,500			$4,697,550	$188,100			$4,697,550	$327,100		$4,697,550	$235,400		$2,090,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2065971305	94987661799	E	2026/01/06	2026/01/07	BANCOLOMBIA	1	$2,091,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$751,800	$600	$0	$752,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$524,000	$400	$0	$524,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$327,200	$200	$0	$327,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$327,200	$200	$0	$327,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$188,100	$200	$0	$188,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$188,100	$200	$0	$188,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$587,500	$600	$0	$588,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$189,900	$200	$0	$190,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$136,500	$100	$0	$136,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$83,100	$100	$0	$83,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$200	$0	$178,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$141,300	$100	$0	$141,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$141,300	$100	$0	$141,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$94,100	$100	$0	$94,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$94,100	$100	$0	$94,200
TOTAL				5	$2,090,000	$1,800	$0	$2,091,800

2026/01/07 11:42 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2063914972	9497657571	Y	2026/01/06	2026/01/07	BANCOLOMBIA	1	$198,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	irp	vct	tri	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049607835	COCUNUBO VARGAS DEYDER ELIFRANIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14 23	30	$1,421,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1116348487	GUTIERREZ PINTO JEACY SIDNEY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14 23	30	$1,421,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	Afiliados(2)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,843,000	$198,200		$0	$0		$198,200

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2065914972	94976575?1	V	2026/01/06	2026/01/07	BANCOLOMBIA	1	$198,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$200	$0	$198,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$198,200	$200	$0	$198,400
TOTAL				2	$198,200	$200	$0	$198,400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	1049637835
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DEYDER STEFANO COCUBURO VARGAS
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO	BOYACA
DIRECCION	CENTRO	TELEFONO	7444444
TIPO APORTANTE	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades registradoras y tasadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			75980379345	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre AÑO	2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/15	NUMERO AUTORIZACION			0384447747

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 400.000	$ 1.000	$ 401.000
SUBTOTALES:										**$ 400.000**	**$ 1.000**	**$ 401.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 512.500	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 512.500	$ 1.200	$ 0	$ 513.700
SUBTOTALES:													**$ 512.500**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 513.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-17	14-17 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.100	$ 13.100	$ 100	$ 0	$ 13.200
SUBTOTALES:									**$ 13.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 13.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFAMILIAR	1	$ 15.000	$ 100	$ 15.100
SUBTOTALES:			**$ 15.000**	**$ 100**	**$ 15.100**

COTIZACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116548487		GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 SUR No 43-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4633204	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2087639066	94979788185	I	2026/01/22	2026/01/16	BANCOLOMBIA	0	$429,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret sln ige lma vac sln ige lma vac avp vct irl	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$781,242	$15,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$429,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$781,242	$15,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$429,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$781,242	$15,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$429,000
1	CC	1116548487	GUTIERREZ JENCY	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$781,242	$15,700	14-23	10	$1,423,500	2.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$429,000
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$781,242	$15,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$429,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$15,700	$0	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$429,000	$0	$0	$429,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	ACACIAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	51705257	94994620147	E	2026/02/04	2026/02/10	BANCOLOMBIA	6	$2,293,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118546822	CARDENAS CONTRERAS JOHN FABER	X																	230301	3	$175,091	$26,300	EPS065	3	$175,091	$21,900	CCF69	3	$175,091	$7,100	14-23	3	$175,091	$6,900	3	$175,091	$6,900	No	$78,300
2	CC	80429681	ERON PRECIADO ANGELINO	X	X																230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$36,500	CCF69	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$14,700	5	$291,818	$20,400	No	$130,000
3	CC	1116553206	CUEVAS HURTADO JOSUE ORLANDO	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPSC25	25	$1,459,088	$182,400	CCF69	23	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$1,459,088	$73,000	No	$648,900
4	CC	74751260	LOZANO ANEZQUITA ORIANDER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
5	CC	74751823	MANCHA JAIRO	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPSC25	25	$1,459,088	$182,400	CCF69	23	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$1,459,088	$73,000	No	$648,900
Total	Afiliados(5)																						$5,135,990	$822,000			$5,135,990	$640,100			$5,135,990	$205,700			$5,135,990	$357,700		$5,135,990	$257,000		$2,284,600

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	51705257	5499462047	E	2026/02/04	2026/02/10	BANCOLOMBIA	6	$2,293,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$822,000	$3,200	$0	$825,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$541,800	$2,100	$0	$543,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$357,700	$1,400	$0	$359,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$357,700	$1,400	$0	$359,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$205,700	$800	$0	$206,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$205,700	$800	$0	$206,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$642,100	$2,600	$0	$644,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$364,800	$1,400	$0	$366,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,500	$200	$0	$36,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,800	$1,000	$0	$241,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$154,300	$600	$0	$154,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$154,300	$600	$0	$154,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$103,000	$400	$0	$103,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$103,000	$400	$0	$103,400
TOTAL				5	$2,284,800	$9,000	$0	$2,293,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	51674441	94994367#1	V	2026/02/04	2026/02/10	BANCOLOMBIA	6	$244,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049907835	COCUNUBO VARGAS DEYDER EFRAIN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	1116548487	GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	Afiliados(2)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810	$243,800		$0	$0		$243,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	51674441	5499436741	Y	2026/02/04	2026/02/10	BANCOLOMBIA	6	$244,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$1,000	$0	$244,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$243,800	$1,000	$0	$244,800
TOTAL				2	$243,800	$1,000	$0	$244,800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1048607835
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DEYDER STEFANO COLMENO VARGAS	
CIUDAD/MUNICIPIO	TULUÁ	DEPARTAMENTO	ROYACA
DIRECCIÓN	CENTRO	TELÉFONO	7444444
TIPO APORTANTE	32-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades legisladoras y facultativas de la ad
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			6060611071	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero AÑO	2024
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaa/mm/dd)			2024/01/16	NUMERO AUTORIZACIÓN			35871800053

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
SUBTOTALES:											$ 400.000	$ 0	$ 400.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 312.000
SUBTOTALES:													$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 312.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO AUTHOR PENSION	PLANILLA	VALOR		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:									$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFENALCO	1	$ 15.000	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:			$ 15.000	$ 0	$ 15.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																				PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
AP	INFORMACION CENA	NUMERO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	INFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ESP	ADMIN	ING	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ING	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ING	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ING	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC COLOMBIANO	1048607835 DEYDER STEFANO COLMENO VARGAS	01-DEPENDIENTE COTIZANTE	00-SIN SUBTIPO	$ 1.300.000	INTEGRAL		NO							1 - 30								25-14 COLPENSIONES	X	$ 1.300.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005 SANITAS S.A	X	$ 1.300.000	$ 312.000	$ 0	$ 312.000	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	X	$ 1.300.000	3.000.004	$ 80.000	X	$ 1.300.000	CCF10 COMFENALCO	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 788.400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116548487		GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 SUR No 43-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4533204	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	517566022	9499484959	1	2026/02/19	2026/02/10	BANCOLOMBIA	0	$518,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Sde	Tar	Ret	Vsp	Cap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Min	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cecigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900
1	CC	1116548487	GUTIERREZ JENCY								X									23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$10,600	14-23	30	$1,750,905	0.3225	$9,200	30	$0	$0	No	$518,900
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$518,900	$0	$0	$518,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	126089638	95012301O9	E	2026/03/04	2026/03/09	BANCOLOMBIA	5	$3,125,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118544827	CARDENAS CONTRERAS JOHN FABER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS065	30	$1,750,905	$210,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
2	CC	1116953206	CUENIS HUNTADO JOSUE ORLANDO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$210,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
3	CC	74753260	LOZANO AMEZQUITA DAVAGNER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS065	30	$1,750,905	$210,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
4	CC	74751823	MANCHA JAIRO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$210,900	CCF69	30	$1,752,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
Total	Afiliados(4)																						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$875,600			$7,007,620	$280,400			$7,003,620	$487,600		$7,003,620	$350,800		$3,115,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174230227	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	426069638	9501230109	E	2026/03/04	2026/03/09	BANCOLOMBIA	5	$3,125,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800	$3,800	$0	$1,124,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,000	$0	$281,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$2,800	$0	$843,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$487,600	$1,600	$0	$489,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$487,600	$1,600	$0	$489,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$1,000	$0	$281,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	$280,400	$1,000	$0	$281,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$875,600	$3,000	$0	$878,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$437,800	$1,500	$0	$439,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$437,800	$1,500	$0	$439,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$210,400	$700	$0	$211,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$210,400	$700	$0	$211,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,400	$500	$0	$140,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$140,400	$500	$0	$140,900
TOTAL				4	$3,115,200	$10,600	$0	$3,125,800

aportes en línea

Planilla Resumen

227

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	126047415	950122316	Y	2026/03/04	2026/03/09	BANCOLOMBIA	5	$144,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049607835	COLMENARES VARGAS DEYDER ELIFRANIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	1116548487	GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	Afiliados(2)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810	$243,800		$0	$0		$243,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	126047415	950122365	Y	2026/03/04	2026/03/09	BANCOLOMBIA	5	$244,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$800	$0	$244,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$243,800	$800	$0	$244,600
TOTAL				2	$243,800	$800	$0	$244,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CEYDER DUFRANC COLOMBIA S.A.S.U.S.
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO	BOYACA
DIRECCIÓN	CENTRO	TELÉFONO	744444
TIPO APORTANTE	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades regladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		60036687729	TIPO DE PLANILLA				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO		3558
DÍAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/m/m/dd)		2026/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN				193084163

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES		$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES:										$ 480.000	$ 0	$ 480.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	EPS048 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.936	$ 0	$ 0	$ 312.936
SUBTOTALES:													$ 312.936	$ 0	$ 0	$ 312.936

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 66.900	$ 66.900	$ 0	$ 0	$ 66.900
SUBTOTALES:										$ 66.900	$ 0	$ 0	$ 66.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 15.000	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:			$ 15.000	$ 0	$ 15.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
AP	TIPO IDENTIFICACIÓN	NUMERO ID	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	INGRESO TRABAJADORES	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP																									
																			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.333.333				NO										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS048 SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 312.936	$ 0	$ 312.936	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	III	$ 66.900	30	$ 2.000.000	CCF10 COMFABOY	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 788.400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116548487		GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 SUR No 43-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4633204	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	51756022	5499484959	I	2026/02/19	2026/02/10	BANCOLOMBIA	0	$518,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing Ret TDE TAE TDP VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VTE IRL	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900
1	CC	1116548487 GUTIERREZ JENCY	X	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$10,600	14-23	30	$1,750,905	0.5225	$9,200	30	$0	$0	No	$518,900
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$518,900	$0	$0	$518,900

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	208958454	950286148	E	2026/04/07	2026/04/08	BANCOLOMBIA	1	$2,414,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118654822	CARDENAS CONTRERAS JOHN FABER		X																230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS005	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-23	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300	No	$571,100
2	CC	1116553205	CUEVAS PURTADO JOSUE ORLANDO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
3	CC	74753260	LOZANO ANEZQUITA OMAGNER		X																25-14	19	$1,108,907	$177,500	EPS005	19	$1,108,907	$138,700	CCF69	19	$1,108,907	$44,400	14-23	19	$1,108,907	$77,200	19	$1,108,907	$55,500	No	$493,300
4	CC	74751823	VIANCHA JAIRO		X																230301	22	$1,283,997	$205,500	EPSC25	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-23	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300	No	$571,100
Total	Afiliados(4)																						$5,427,806	$868,700			$5,427,806	$678,600			$5,427,806	$217,800			$5,427,806	$377,900		$5,427,806	$271,800		$2,414,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	206938454	95028861648	E	2026/04/07	2026/04/08	BANCOLOMBIA	1	$2,416,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$868,700	$700	$0	$869,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$177,500	$200	$0	$177,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$691,200	$500	$0	$691,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$377,900	$300	$0	$378,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$377,900	$300	$0	$378,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$217,300	$200	$0	$217,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	$217,300	$200	$0	$217,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$678,600	$600	$0	$679,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$379,400	$300	$0	$379,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$299,200	$300	$0	$299,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$163,100	$200	$0	$163,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$163,100	$200	$0	$163,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$108,700	$100	$0	$108,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$108,700	$100	$0	$108,800
TOTAL				4	$2,414,300	$2,100	$0	$2,416,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	206940045	9502796842	Y	2026/04/07	2026/04/08	BANCOLOMBIA	1	$154,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	sln	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049607835	COCONUBO VARGAS DEYDER STIPHANO		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	19	$1,108,967	$77,200	0	$0	$0	No	$77,200
2	CC	1116548487	GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	19	$1,108,967	$77,200	0	$0	$0	No	$77,200
Total	Afiliados(2)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,217,934	$154,400		$0	$0		$154,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987309	4	CONSORCIO SUBESTACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SUBESTACION	CARRERA 16 # 36 - 41	AGUAZUL-CASANARE	3174320227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-03	206942045	95027968 43	Y	2026/04/07	2026/04/08	BANCOLOMBIA	1	$154,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$154,400	$200	$0	$154,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$154,400	$200	$0	$154,600
TOTAL				2	$154,400	$200	$0	$154,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143997836
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DEYDER DUFRANIO COCUNUBO VARGAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades inmobiliarias y de alquiler de bi
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			600844945[illegible]	TIPO DE PLANILLA:			I INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN (ITNG):	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			31				
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa):			30/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2000[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 483.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.500	$ 0	$ 400.000	$ 8.500	$ 408.500
SUBTOTALES:										$ 400.000	$ 8.500	$ 408.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 6.700	$ 0	$ 272.500	$ 6.700	$ 0	$ 279.200
SUBTOTALES:													$ 272.500	$ 6.700	$ 0	$ 279.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS PERIODOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 60.000	$ 1.900	$ 0	$ 61.900
SUBTOTALES:									$ 60.000	$ 1.900	$ 0	$ 61.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13 COMFABOY	1	$ 15.000	$ 400	$ 15.400
SUBTOTALES:			$ 15.000	$ 400	$ 15.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																								PENSIÓN							SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF			
AP	INSCRIPCIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	VSL	IGE	TDE	TAE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FSP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
3	02 TRABAJADOR DEPENDIENTE	COLOMBIANO NACIDO EXTRANJERO	03 DEPENDIENTE PENSIONADO POR APORTES		$ 2.700.000																					25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.598.200	$ 408.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 408.000	EPS005 SANITAS S.A.	30	$ 2.598.200	$ 312.500	$ 0	$ 312.500	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.598.200	$ 1.044.676	$ 60.000	30	$ 2.598.200	CCF13 COMFABOY	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 805.500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116548487		GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 33 SUR No 43-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4633204	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	207905445	95024196 99	I	2026/04/22	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	$518,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tas vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900
1	CC	1116548487	GUTIERREZ JENCY	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$10,600	14-23	30	$1,750,905	0.5225	$9,200	30	$0	$0	No	$518,900
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$518,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$518,900	$0	$0	$518,900

20 Anexo VI. DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

(9 folios)

240

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 20 de Febrero de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO SUBESTACION identificado(a) con NIT No. 901987309 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	88200006398	2025/10/28	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141205832851

(415)7707212489984(8020) 000014120583285 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 7 3 0 9	4	Impuestas y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SUBESTACION

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 36 41

42. Correo electrónico consorciosubestacion26@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 5 0 8 5 9 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 8 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre COCUNUBO VARGAS DEYDER EUFRANIO

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 02-03-2026 08:59:31 AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141205832851

(415)7707212489984(8020) 000014120583285 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 7 3 0 9	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 8 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 8 0 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141205832851

(415)7707212489984(8020) 000014120583285 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 7 3 0 9	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 6	2 0 2 5 0 8 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 0 7 8 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COCUNUBO	VARGAS	DEYDER	EUFRANIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141205832851

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 9 8 7 3 0 9 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

14. Buzón electrónico:

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 4 9 6 4 6 1 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEDRAZA	GOMEZ	ADRIANA	MARCELA

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 8 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 4 6 2 8 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ZAGO INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 5 0 8 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 7 8 6 4 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GEMINIS CG SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 5 0 8 0 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CONTROLADA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764106574008

(415)7707212489984(8020)0018764106574008

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901987309	4				

11. Razón social: CONSORCIO SUBESTACION

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal — Cód. 4 4

24. Dirección: CR 16 36 41

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Yopal

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2026-03-02 / 08:56:21 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Áres
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: COCUNUBO VARGAS DEYDER EUFRANIO
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1049607835 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO SUBESTACION

997. Fecha formalización: 2026-03-02 08:56:21

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764106574008

(415)7707212489984(8020) 001876410657400 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901987309	4				

11. Razón social
CONSORCIO SUBESTACION

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO SUBESTACION CR 16 36 41	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FSUB	1	10	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

21 Anexo VII – CORRESPONDENCIA RECIBIDA
(36 folio)

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R
24-02-2026

GÉMINIS CG

OFC020_CS_2026

Aguazul 24 de febrero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de la versión ajustada de informe mensual de obra No. 03

Cordial saludo,

En atención a su comunicación de devolución, nos permitimos hacer entrega nuevamente del Informe Mensual de Obra No. 03, correspondiente al mes de enero de 2026.

Informamos que se realizó una revisión integral del documento, atendiendo cada una de las observaciones y precisiones de forma que fueron señaladas por su equipo en los diferentes apartes del cuerpo del informe, con estos ajustes, el documento cumple con los requerimientos técnicos y administrativos establecidos.

Agradecemos su gestión para la validación final y posterior trámite de aprobación del mismo

Sin otro particular.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R
18-02-2026.

GÉMINIS CG

OFC018_CS_2026

Aguazul 18 de febrero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud reiterativa de retiro de planta eléctrica antigua y transferencia automática – Alerta por riesgo inminente en cuarto eléctrico.

Cordial saludo.

Por medio de la presente comunicación, me dirijo a ustedes con el fin de reiterar de manera urgente la solicitud del retiro físico de la planta eléctrica antigua y su respectiva transferencia automática, equipos que actualmente se encuentran en el área de la subestación del proyecto de la referencia.

Como es de su conocimiento, la permanencia de estos equipos desincorporados en el sitio está impidiendo el cierre hermético y la restricción adecuada de acceso a los cuartos eléctricos. Esta situación ha derivado en una vulnerabilidad crítica de seguridad: el ingreso constante de animales al cuarto eléctrico, específicamente de un gato.

Tal como se evidencia en el registro fotográfico adjunto a este documento, esta situación ha dejado de ser un evento aislado para convertirse en una costumbre del animal. El felino ha sido captado en múltiples ocasiones transitando por el área de la transferencia automática y, lo que es más grave, descansando y pernoctando directamente sobre la parte superior de los tableros eléctricos.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG









CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

Hacemos hincapié en que esta situación representa un riesgo latente y de alta criticidad por las siguientes razones:

- Riesgo eléctrico y operativo: Al interior de este cuarto se encuentra todo el cableado y conexionado de los tableros eléctricos, los cuales se encuentran energizados. El contacto, movimiento o la simple presencia de fluidos del animal sobre estos componentes puede generar un cortocircuito severo, desencadenando un accidente que sacaría de funcionamiento la subestación eléctrica y afectaría el suministro al centro administrativo.
- Riesgo para la vida del animal: La exposición directa del felino a barras y terminales de alta tensión representa un peligro mortal e inminente para la mascota.
- Integridad de los equipos nuevos: La presencia de agentes externos, polvo, humedad o fauna compromete la garantía y el buen estado de los equipos recientemente instalados.

Por todo lo anterior, solicitamos su pronta gestión y autorización para ejecutar o coordinar el retiro definitivo de los equipos mencionados. Esto nos permitirá cerrar y asegurar las puertas de los cuartos eléctricos de forma definitiva, mitigando cualquier riesgo de ingreso de agentes externos y salvaguardando tanto la infraestructura del proyecto como la vida del animal.

Agradecemos la atención prestada a esta solicitud y quedamos a la espera de sus prontas instrucciones para darle solución a este hallazgo.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R. 11-02-2026

GÉMINIS CG

OFC017_CS_2026

Aguazul 11 de febrero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de retiro de planta eléctrica y transferencia automática existentes correspondientes al Contrato No. 0806.

Cordial saludo,

En cumplimiento del desarrollo del contrato de la referencia y tras la ejecución de las actividades programadas, mediante el presente documento me permito solicitar formalmente su gestión para coordinar el retiro de los equipos de respaldo eléctrico antiguos.

Como consta en el acta de comité no. 003 con fecha del 07 de febrero de 2026, se realizaron las pruebas dinámicas para verificar la operatividad de los equipos nuevos. Durante dicha inspección, la interventoría y la supervisión verificaron que la nueva planta de 250 KVA y la transferencia funcionan correctamente y operan de manera sincronizada con las instalaciones existentes. En consecuencia, el sistema fue dejado energizado, en modo automático y totalmente operativo.

Debido a que las actividades de instalación, pruebas y puesta en marcha de los nuevos equipos ya quedaron realizadas y viabilizadas, requerimos su apoyo frente a los siguientes puntos:

- Disponibilidad de equipos anteriores: Informamos que la planta eléctrica y la transferencia automática que operaban anteriormente se encuentran ya desconectadas y fuera de servicio, estando totalmente disponibles para su entrega formal y retiro de las instalaciones.
- Liberación del área: Es indispensable programar el retiro de estos equipos antiguos de manera pronta con el fin de despejar las áreas de trabajo. Esto nos permitirá ejecutar las obras civiles complementarias y los remates del proyecto, siendo un requisito previo para avanzar hacia el acta de recibo final.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

Agradecemos su gestión ante la Alcaldía Municipal para coordinar la logística de entrega de estos equipos y así proceder con el cierre definitivo de estas actividades de obra.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R.
09-02-2026

GÉMINIS CG

OFC016_CS_2026

Aguazul 09 de febrero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de prórroga al plazo de ejecución para el contrato en referencia

Cordial saludo,

La presente solicitud tiene como objeto formalizar la necesidad de una prórroga en el plazo contractual, fundamentada en las decisiones técnicas tomadas de manera mancomunada durante la ejecución del proyecto, como se evidencia en los comités de obra, la prioridad ha sido garantizar la funcionalidad y estabilidad de la infraestructura, lo cual ha implicado la ejecución de mayores cantidades de obra y especificaciones superiores a las previstas originalmente.

A continuación, sustento las causales que afectaron el rendimiento programado:

1. Desfase en el inicio efectivo

Una vez formalizada el acta de inicio del proyecto el 19 de noviembre de 2025, se solicitó a la interventoría la coordinación necesaria para la intervención de la subestación eléctrica y la autorización de corte en la plazoleta central (Oficio No. OFC004_CS_2025). En respuesta, el 21 de noviembre de 2025 se realizó la inspección visual con apoyo de la secretaría de infraestructura, firmándose el acta correspondiente el 25 de noviembre. Esto generó un inicio efectivo de las actividades constructivas hasta esa fecha, provocando un desfase inicial de siete (7) días.

2. Inconsistencia diseño físico vs. RETIE

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Según consta en el comité de obra No. 001 del 25 de noviembre de 2025, se identificó que las dimensiones originales del cuarto de la planta eléctrica no cumplían con las distancias de seguridad del RETIE ni permitían la operatividad de los equipos. La interventoría certificó la necesidad técnica de ajustar las dimensiones, lo que implicó un replanteo estructural y balance de mayores cantidades, consumiendo días operativos críticos al inicio del contrato.


3. Interferencia de redes hidrosanitarias no inventariadas

El evento de mayor impacto fue la aparición de redes no inventariadas y la saturación del suelo en diciembre (comité de obra No. 002 del 23 de diciembre de 2025). Ante la pérdida de capacidad portante, se siguió la ruta de acción obligatoria ordenada por interventoría: retiro de lodos, mejoramiento con material granular y la prohibición de avanzar hasta obtener resultados de densidad (Proctor Modificado). Este estricto protocolo de calidad desplazó la fecha de fundida de la losa de fondo.

4. Factores climáticos

Sumado a lo anterior, las fuertes lluvias a inicios de enero de 2026 causaron inestabilidad en los taludes y derrumbes sobre la parrilla de refuerzo. Esto obligó a realizar limpieza manual y lavado a presión del acero (para garantizar adherencia según NSR-10) y a perfilar nuevamente los taludes, consumiendo días operativos completos.



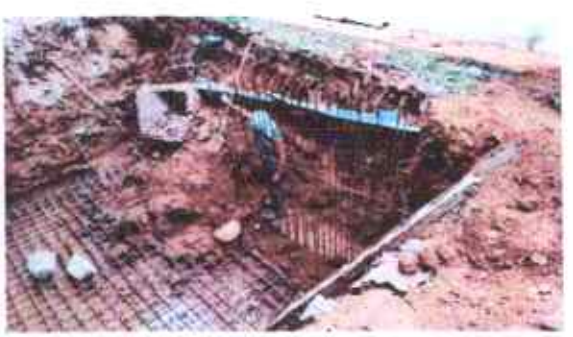

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG





En virtud de lo expuesto, es evidente que la sumatoria de los factores técnicos y administrativos descritos, desde el desfase en el inicio hasta la complejidad de los hallazgos hidrosanitarios y geotécnicos, ha generado una alteración inevitable en la ruta crítica del proyecto.

Aunque la obra se ha ejecutado de manera ágil y diligente, superando los obstáculos presentados, la magnitud de estos imprevistos ha generado una pérdida de tiempo imposible de recuperar dentro de la vigencia actual sin poner en riesgo la calidad técnica.

Por consiguiente, solicitamos formalmente una prórroga al plazo de ejecución de un (1) mes. Este tiempo es estrictamente necesario para culminar actividades como fraguados, rellenos técnicos, acabados y cuarto de máquinas bajo los estándares de ingeniería requeridos, garantizando la estabilidad y funcionalidad que la entidad espera.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

09.02.2026
Yamid Lesmes D.

GÉMINIS CG

OFC015_CS_2026

Aguazul 09 de febrero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe mensual de obra No. 03 del contrato 0806 del 2025.

Cordial saludo,

Dando respuesta a su solicitud, adjuntamos formalmente el Informe Mensual de Obra No. 03, correspondiente al mes de enero de 2026, el cual incluye los componentes requeridos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o revisión técnica que considere necesaria para la aprobación del mismo.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC014_CS_2026

Aguazul 02 de febrero de 2026

Yamid Lesmes R.
02-02-2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Radicación de informe de balance de obra subsanado y respuesta a oficio IAT-OFI-2026-01-CON-018.

Cordial saludo,

En atención al oficio IAT-OFI-2026-01-CON-018 con fecha del 29 de enero de 2026, y con el propósito de mantener el trabajo colaborativo y el rigor técnico en el desarrollo de nuestro proyecto, nos permitimos radicar nuevamente el informe de balance de mayores y menores cantidades con los ajustes previamente solicitados.

Hemos revisado de manera detallada las observaciones emitidas por la interventoría y procedimos a subsanar los hallazgos bajo los siguientes términos:

- Ajuste de medidas y cantidades: Se corrigieron las discrepancias identificadas entre las cantidades del cuadro comparativo y las medidas de los soportes. Las memorias de cálculo fueron verificadas y ajustadas estrictamente a los lineamientos técnicos del proyecto y a las dimensiones finales de los elementos construidos en terreno.
- Soportes gráficos: Se reorganizó la documentación visual para asegurar una relación uniforme con los ítems de mayores cantidades reportados. Actualmente, cada soporte gráfico se encuentra debidamente identificado y vinculado de forma clara a la memoria de cálculo correspondiente, lo que facilitará enormemente su trazabilidad y revisión.

Agradecemos profundamente sus observaciones y el control técnico realizado, ya que contar con soportes precisos nos permite garantizar juntos la transparencia en la liquidación y la estabilidad del contrato. Anexo a este documento, entregamos el paquete documental completo para proceder con su validación definitiva.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

Quedamos a su entera disposición en caso de requerir alguna aclaración adicional o una revisión conjunta.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R.
28-01-2026

GÉMINIS CG

OFC012_CS_2026

Aguazul 28 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Validación de cronograma y horarios para la ventana de operación.

Cordial saludo,

En alcance a nuestra solicitud de ventana de operación y conforme a lo concertado en el comité técnico realizado con la entidad y su despacho, nos permitimos presentar por escrito el cronograma detallado de horarios para la intervención programada de la nueva planta eléctrica.

El propósito de este oficio es formalizar los tiempos de ejecución acordados y obtener su validación para el inicio de las maniobras.

- Fechas de intervención: sábado 31 de enero y domingo 01 de febrero de 2026.
- Franja horaria autorizada: Se ha establecido el siguiente horario de trabajo continuo para garantizar la ejecución de las actividades sin afectar la jornada laboral administrativa:
  - Inicio de labores (Corte y bloqueo): 07:00 a.m.
  - Cierre de actividades (Restablecimiento provisional): 05:00 p.m.
- Actividades Críticas:
  - Sábado 31/01: Desconexión de acometidas existentes e izaje de componentes.
  - Domingo 01/02: Pruebas de carga, transferencia automática y verificación de niveles de combustible (se garantiza suministro de 40 galones).

Agradecemos firmar el recibido a satisfacción de este cronograma como constancia de la autorización para el ingreso del personal y el inicio de las actividades en los horarios estipulados.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R.
27-01-2026

GÉMINIS CG

OFC011_CS_2026

Aguazul 27 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de ventana de operación y desconexión programada – Logística de retiro de equipo existente

Cordial saludo,

Hacemos referencia al oficio OFC009_CS_2026 radicado el pasado 19 de enero de 2026, mediante el cual se solicitó la autorización de una ventana de operación para el cambio de la planta eléctrica del Centro Administrativo. Al respecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:

- Urgencia de coordinación: A la fecha no se ha recibido confirmación formal sobre la ventana de trabajo solicitada, esta validación es indispensable para coordinar de manera efectiva el desplazamiento y la intervención de los distintos profesionales, técnicos y proveedores especializados que deben concurrir simultáneamente para la ejecución segura de la tarea.
- Estado de la planta existente: Se informa que, una vez finalizada la maniobra y puesta en funcionamiento la nueva planta eléctrica, el equipo existente quedará totalmente desconectado del sistema.
- Retiro de equipo: Por lo anterior, solicitamos que la Administración Municipal, a través de su gestión, programe de manera inmediata el retiro y la movilización de la planta eléctrica antigua. Lo anterior es necesario para liberar los espacios técnicos y evitar obstrucciones que impidan la normal finalización de las obras complementarias.

Reiteramos que el personal y los materiales se encuentran listos en sitio, pero dependen de su pronta respuesta para asegurar la logística y evitar retrasos en el cronograma de obra.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R.
19-01-2026

GÉMINIS CG

OFC010_CS_2026

Aguazul 19 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Respuesta al oficio IAT-OFI-2026-01-CON-014 – Entrega de balance de mayores y menores cantidades

Cordial saludo,

En atención a su requerimiento mediante el oficio de la referencia, por medio del cual solicita la entrega del informe de balance de mayores y menores cantidades del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", nos permitimos hacer entrega formal del documento técnico solicitado para su respectiva revisión y aprobación.

Como es de su conocimiento, la ejecución de la obra se ha visto supeditada a eventos externos y situaciones de fuerza mayor ajenas al control de este contratista, estos factores han derivado en la necesidad de ajustar técnicamente los ítems de ejecución, garantizando siempre la estabilidad y funcionalidad de la obra. El informe adjunto contiene:

- Balance técnico y financiero: Cuadro comparativo con el detalle de las cantidades del presupuesto inicial frente a las ejecutadas, incluyendo las variaciones resultantes de los ajustes de diseño y obra.
- Justificación de variaciones: Análisis pormenorizado de cada ítem (mayores y menores cantidades), debidamente sustentado en las condiciones reales del terreno y los requerimientos técnicos surgidos durante la ejecución.
- Anexos de soporte: Memorias de cálculo actualizadas y soportes gráficos que evidencia la necesidad de los ajustes propuestos.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del cronograma y la calidad técnica de la obra, quedando atentos a sus observaciones o validación del presente balance para proceder con el trámite administrativo de las actas correspondientes.

Agradecemos su atención y quedamos a su entera disposición.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
ingeniería y soluciones integrales

OFC009_CS_2026

Aguazul 19 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de ventana de operación y desconexión programada – Cambio de planta eléctrica

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la Dirección de Obra se permite informar a la Interventoría que ya se encuentran en sitio la totalidad de los elementos, equipos y materiales necesarios para proceder con el cambio definitivo de la planta eléctrica existente por el nuevo equipo suministrado, cumpliendo así con las especificaciones técnicas del proyecto.

En atención a los compromisos adquiridos en los distintos comités técnicos realizados entre las partes, y entendiendo la criticidad del servicio eléctrico para el funcionamiento del Centro Administrativo, se ha determinado que dicha maniobra debe ejecutarse fuera de la jornada laboral ordinaria.

Por lo anterior, solicitamos formalmente la gestión y autorización de una ventana de operación para los días:

- Sábado 24 de enero de 2026
- Domingo 25 de enero de 2026

Durante este periodo, se requiere realizar el corte de energía total de las instalaciones de la Alcaldía, con el fin de ejecutar las maniobras de retiro del equipo existente, adecuación de conexiones, puesta en marcha y pruebas de carga de la nueva planta eléctrica de manera segura y eficiente.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
ingeniería y soluciones integrales

Solicitamos a la Interventoría realizar las gestiones pertinentes ante la Entidad para la aprobación de este horario y coordinar de manera conjunta los planes de contingencia y maniobra necesarios, garantizando que el día lunes 26 de enero el sistema se encuentre operando en condiciones óptimas.
Quedamos atentos a su pronta respuesta para proceder con la logística de personal y equipos de apoyo.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R.
17-01-2026

GÉMINIS CG

OFC008_CS_2026

Aguazul 17 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025. cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe mensual de obra No. 02 del contrato 0806 del 2025.

Cordial saludo.

Dando respuesta a su solicitud, adjuntamos formalmente el Informe Mensual de Obra No. 02, correspondiente al mes de diciembre de 2025, el cual incluye los componentes requeridos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o revisión técnica que considere necesaria para la aprobación del mismo.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC007_CS_2026

Aguazul 05 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de la versión ajustada de informe mensual de obra No. 01

Cordial saludo,

En atención a su comunicación de devolución, nos permitimos hacer entrega nuevamente del Informe Mensual de Obra No. 01, correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Informamos que se realizó una revisión integral del documento, atendiendo cada una de las observaciones y precisiones de forma que fueron señaladas por su equipo en los diferentes apartes del cuerpo del informe, con estos ajustes, el documento cumple con los requerimientos técnicos y administrativos establecidos.

Agradecemos su gestión para la validación final y posterior trámite de aprobación del mismo.

Sin otro particular.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC006_CS_2026

Aguazul 05 de enero de 2026

Yamid Lesmes R.
05-01-2026
8:30 AM

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Información de llegada de equipo nuevo y solicitud urgente de retiro de planta existente.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informarles que, de acuerdo con el cronograma de suministros y ejecución del proyecto, la nueva planta eléctrica está programada para arribar a la obra el día de mañana 06 de enero de 2026.

Al respecto, es imperativo precisar que el equipo de trabajo ha optimizado los rendimientos mediante la ejecución de la mayor cantidad posible de actividades en frentes externos y periféricos. No obstante, el avance de la obra ha alcanzado un punto de inflexión en su ruta crítica, donde el inicio de las adecuaciones locativas internas del cuarto técnico es de carácter obligatorio para la continuidad del cronograma.

Por lo anterior, solicitamos su gestión inmediata para el retiro de la planta eléctrica existente, la desocupación total de este espacio es un prerrequisito técnico indispensable para proceder con:

- Adecuaciones civiles y mecánicas: Intervención en bases, sistemas de anclaje y acabados superficiales del recinto.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

- Acondicionamiento ambiental: Ajustes en los sistemas de ventilación y ductería de escape específicos para las dimensiones del nuevo equipo.
- Protocolos de maniobra: Disposición del radio de giro y espacio necesario para el ingreso seguro de la nueva unidad.

Dada la llegada inminente del equipo, cualquier demora en el retiro de la planta existente impactará directamente en los tiempos de instalación y puesta en marcha.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

270

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC005A_CS_2025

Yamid Lesmes R
11-12-2025
9:30 AM

Aguazul 11 de diciembre de 2025

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe mensual de obra No. 01del contrato 0806 del 2025.

Cordial saludo,

Dando respuesta a su solicitud, adjuntamos formalmente el Informe Mensual de Obra No. 01, correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual incluye los componentes requeridos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o revisión técnica que considere necesaria para la aprobación del mismo.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC004_CS_2025

Aguazul 19 de noviembre de 2025

Yamid Lesmes R
19-11-2025

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de coordinación para intervención en subestación eléctrica y autorización de corte en plazoleta central del contrato 0806 del 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento del cronograma de actividades establecido para el proyecto y dando continuidad a lo estipulado en el acta de inicio de la referencia, se requiere su colaboración y aval para proceder con dos hitos cruciales para el avance de la obra:

- Coordinación para entrega y levantamiento de acta de subestación: solicitamos a la interventoría que coordine y programe la entrega física de la subestación eléctrica (SE) para la ampliación del cuarto de planta eléctrica.

  Es indispensable:
  - Entrega y acceso: Formalizar la entrega del área de la SE para poder iniciar los trabajos de obra civil.
  - Acta de Estado: Participar en el levantamiento de un acta de inspección y entrega, donde se deje evidencia documental (fotográfica y descriptiva) del estado actual de los equipos, componentes y la infraestructura existente de la Subestación, antes

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

de cualquier intervención, esto es vital para establecer el punto de partida y las responsabilidades sobre la custodia de los activos.

- Autorización de Intervención para instalación de banco ducto: Requerimos la autorización expresa de la Interventoría para realizar el corte y la excavación necesarios en el área de la plazoleta central y área de jardín, con el fin de ejecutar la instalación del banco ducto eléctrico.

Agradecemos su pronta gestión y coordinación para la programación de estas actividades, permitiendo así el cumplimiento de los plazos contractuales. Por favor, sírvase indicarnos la fecha y hora más adecuadas para realizar la inspección y firma del Acta.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC003_CS_2025

Aguazul 12 de noviembre de 2025

12-11-2025
Yamid Lesmes R

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de Trámite para Suscripción del Acta de Inicio de Obra - Contrato No. 0806 de 2025.

Cordial saludo,

En seguimiento a la fase pre-constructiva del Contrato de Obra de la referencia, el CONSORCIO SUBESTACIÓN, se dirige a la Interventoría con el fin de solicitar el trámite ante la entidad contratante para la Suscripción del Acta de Inicio de Obra.

Certificamos y confirmamos que, a la fecha, se han superado y cumplido la totalidad de los requisitos que condicionaban el inicio de la ejecución, según se detalla a continuación:

- Cumplimiento legal y de seguridad social: Se ha entregado la totalidad de la documentación legal y de seguridad social requerida, lo cual incluye: soportes de afiliación al sistema de seguridad social integral (ARL, EPS y AFP) del personal operativo.
- Documentos de planeación: Se ha presentado la programación de obra ajustada y al flujo de caja correspondiente al proyecto.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

Habiéndose verificado el cumplimiento del 100% de los requisitos, solicitamos a la Interventoría gestionar y convocar con carácter de urgencia a la entidad contratante para la firma del Acta de Inicio de Obra, permitiendo así el inicio formal de los trabajos y el cumplimiento del plazo contractual.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC002_CS_2025

Aguazul 04 de noviembre de 2025

Yamid Lesmes D.
04-11-2025

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Justificación por no realización de afiliaciones a la ARL.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio me permito informar que no ha sido posible realizar el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) de las personas que estarán vinculadas en el contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, debido a que la empresa aún no ha sido registrada en el sistema de seguridad correspondiente, pero que son situaciones administrativas ajenas a nuestra voluntad.

Actualmente nos encontramos adelantando los tramites necesarios para la formalización y registro de la entidad ante las plataformas y organismos pertinentes, en primera instancia, se realizo el tramite de la afiliación con la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, sin embargo, dicho trámite no ha podido ser finalizado por motivos administrativos internos de esa entidad (cambio de plataformas virtuales).

Posteriormente, se procede a gestionar el registro con la ARL SURA, el tramite de sebe realizar por plataforma virtual, pero se encuentra presentando falla masiva en el portal.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

Es importante resaltar que el Consorcio se encuentra actuado de manera diligente, realizando los trámites y siguiendo las instrucciones indicadas por las ARL involucradas. Nos mantenemos en constante comunicación para obtener la aprobación final y proceder inmediatamente con la afiliación de los trabajadores, conforme a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales.

Agradecemos su comprensión frente a esta situación, que esperamos sea resuelta a la mayor brevedad posible. Reiteramos nuestra disposición para entregar cualquier soporte o información adicional que se requiera.


Se anexa como evidencia las respuestas por parte de las entidades a la cual se ha realizado la solicitud.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com


GÉMINIS CG

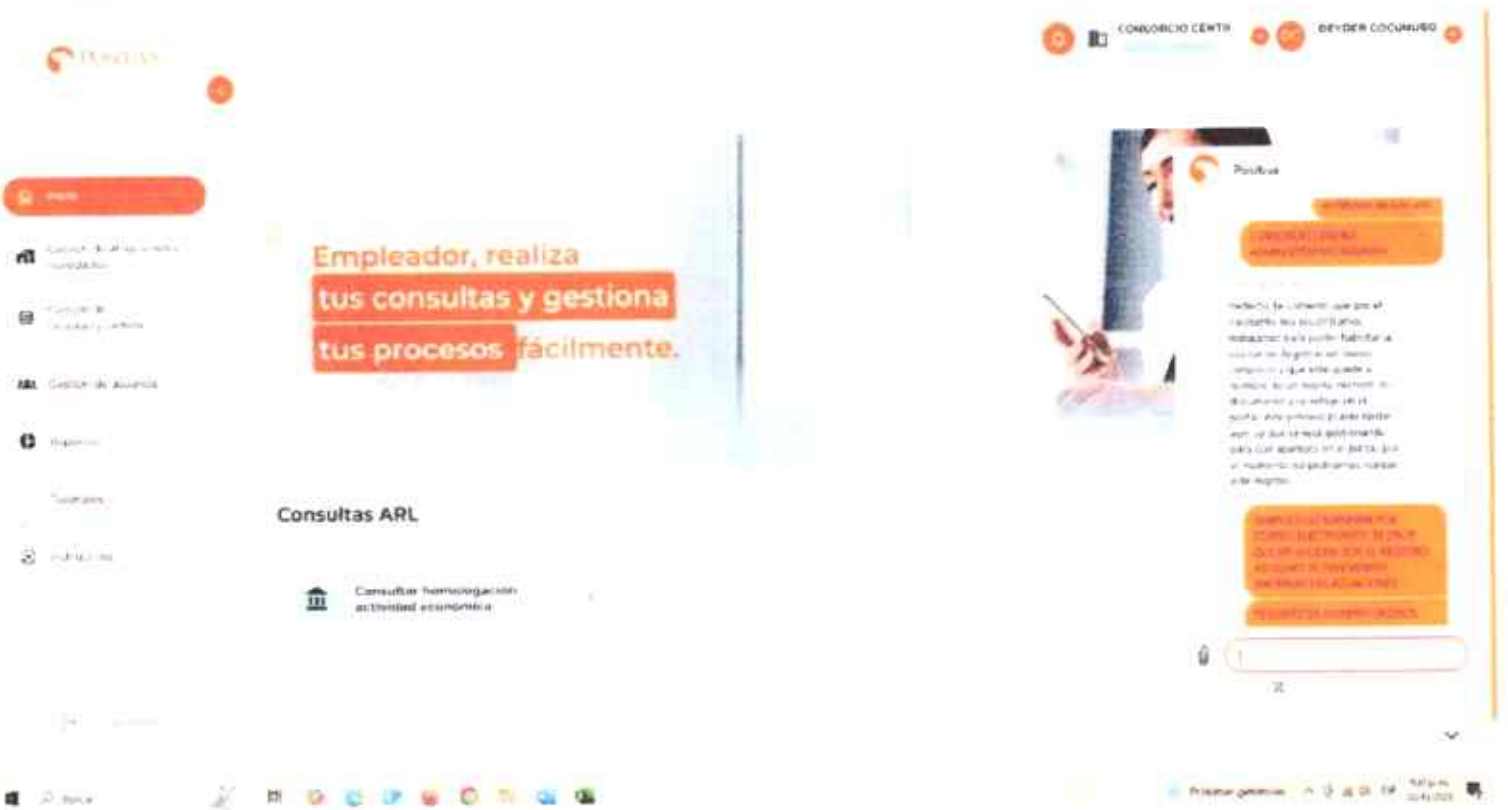




CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com


GÉMINIS CG

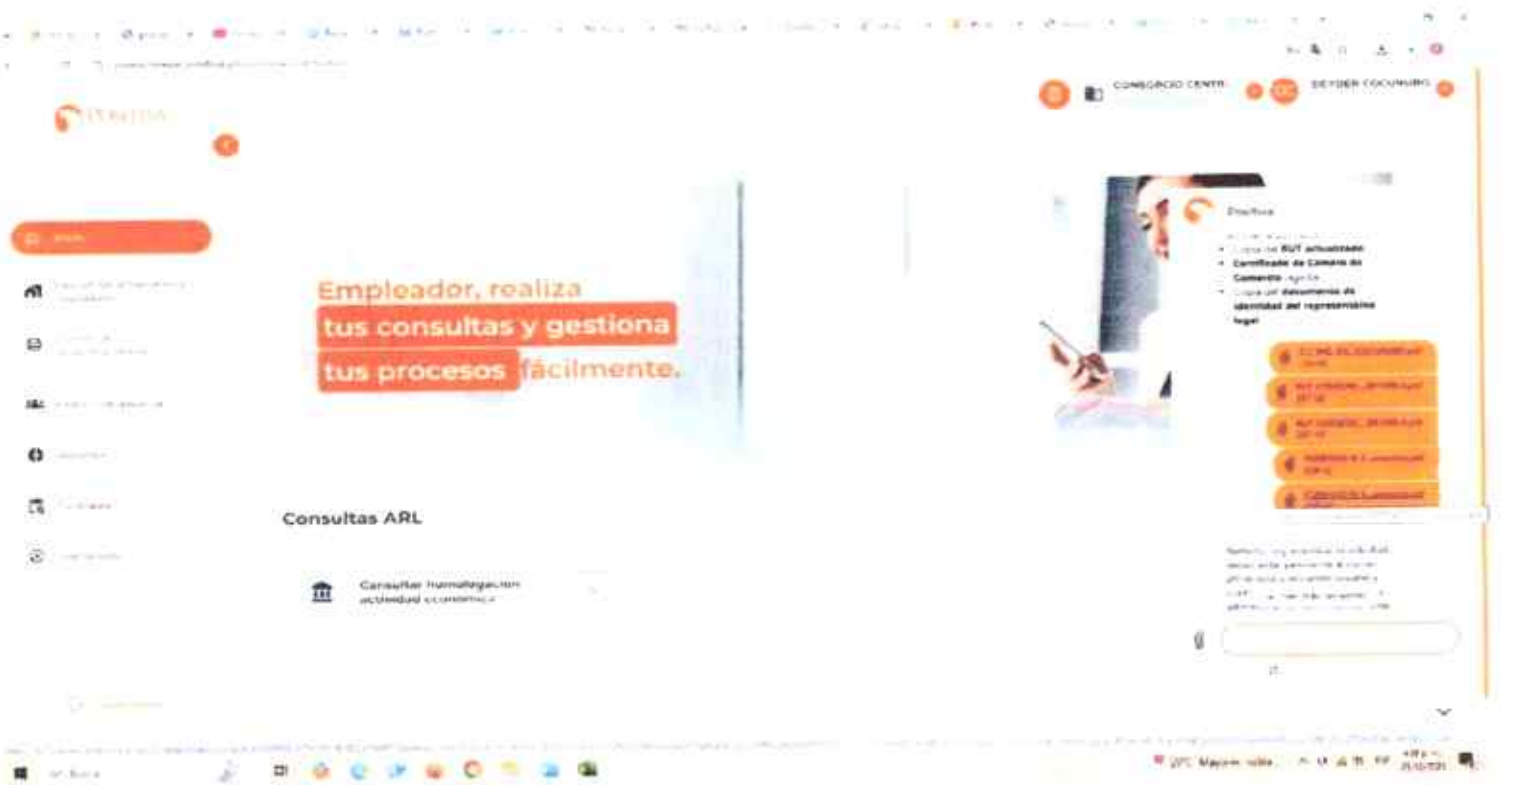

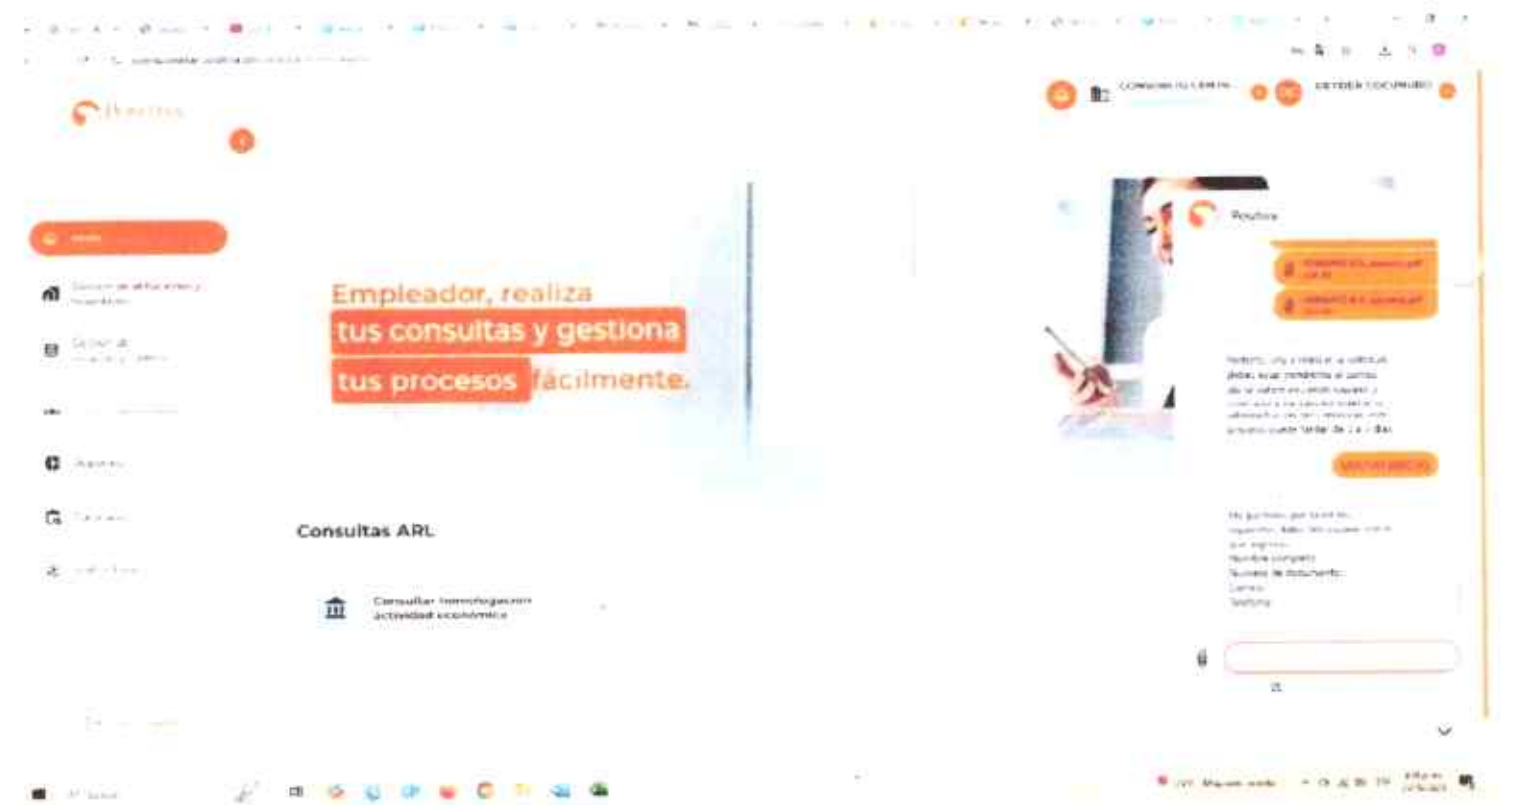

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

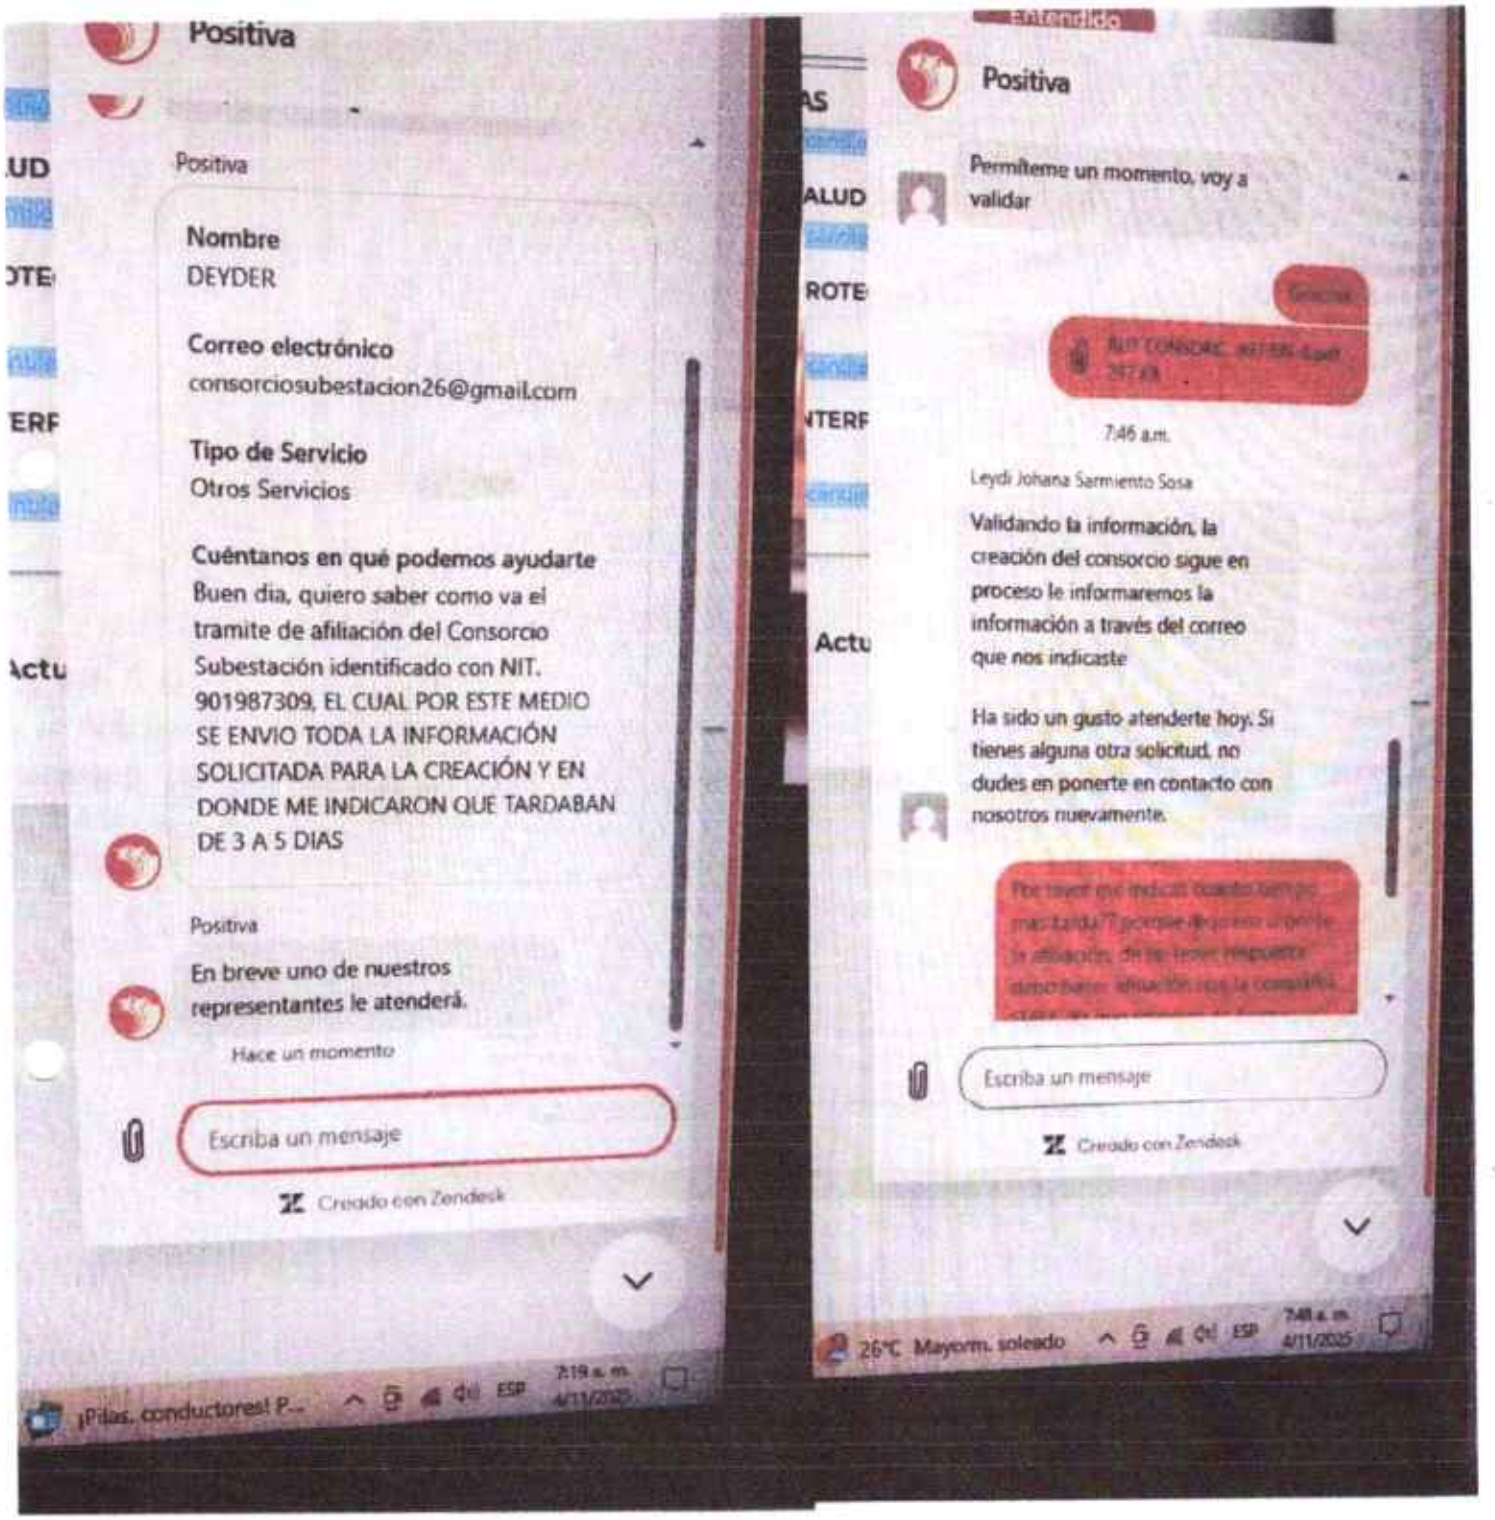

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG





CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG



No se puede acceder a este sitio

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC001_CS_2025

Aguazul 28 de octubre de 2025

Yamid Lesmes R.
28-10-2025

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Respuesta a solicitud de documentos para el acta de inicio del contrato.

Cordial saludo,

En atención al oficio mediante el cual se solicita la documentación necesaria para la elaboración del acta de inicio del contrato de obra pública 0806 de 15 de septiembre de 2025, me permito informar que actualmente me encuentro realizando el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Una vez se formalice dicha vinculación y se obtenga el respectivo soporte, procederé a remitir el documento faltante para completar los requisitos establecidos.

Adjunto los siguientes documentos requeridos:

- Pólizas de garantías y amparos
- Comprobante de aprobación de pólizas
- Pago de estampilla del contrato
- Documentación del personal ofertado y aprobado

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

- Programación de obra y flujo de caja.

Agradecemos su comprensión y colaboración para continuar con una excelente disposición respecto al trámite.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

22 Anexo VIII – CORRESPONDENCIA ENVIADA

(47 folios)

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT. 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-033

Aguazul, 27 de febrero de 2026

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
27 FEB 2026
ID: 26

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025 09 12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe de interventoria No. 03

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del Informe de Interventoría número tres (03) correspondiente al contrato de la referencia.

Se informa a la entidad que este documento contiene el seguimiento y control detallado de las actividades realizadas por esta Interventoría durante el periodo reportado. Se remite para su conocimiento, fines pertinentes y control por parte de la Administración Municipal.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Una (1) carpeta, con 100 folios*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-032



Aguazul, 27 de febrero de 2026

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega del informe de obra No. 03 – Contrato de Obra No. 806 del 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del informe de obra número tres (03) correspondiente al contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Se informa a la entidad que dicho documento ya ha sido revisado y avalado en su totalidad por la interventoria, verificando que su contenido se ajusta a las actividades ejecutadas en campo, se remite para su conocimiento, fines pertinentes y control por parte de la Administración Municipal.

Esta Interventoria considera viable y necesaria la ejecución de estas maniobras para dar cumplimiento al cronograma y asegurar la continuidad del servicio eléctrico en el Centro Administrativo.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:
- *Una (1) carpeta, con 182 folios*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-031

Aguazul, 19 de febrero de 2026

19 FEB 2026

SEÑOR
GONZALO ANDRÉS MÉNDEZ LOPEZ
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de polizas prorroga No. 2 del contrato en referencia.

Cordial saludo,

Mediante la presente, me permito radicar las pólizas actualizadas correspondientes a la Prórroga No. 2 del contrato de la referencia, con el fin de garantizar la suficiencia de las coberturas durante el nuevo periodo de ejecución pactado.

Los documentos adjuntos y debidamente cargados en la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación son:

- Póliza No. 42-40-101050334 – Anexo 6: Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Póliza No. 42-44-101163784 – Anexo 5: Cumplimiento y demás amparos contractuales.

Por lo anterior, se remiten dichos documentos para su revisión, aprobación y demás fines pertinentes por parte de la oficina asesora jurídica.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Pólizas responsabilidad civil extra contractual (3 folios)*
- *Polizas de cumplimiento (2 folios)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

RADICADO: OFI-2026-02-ENT-030

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
18 FEB 2026
Recibido por
Hora 3:42 AM PM
Folios
Radicado No

Aguazul, 18 de febrero de 2026

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de retiro de equipos antiguos y Alerta por riesgo critico en subestación eléctrica.

Cordial saludo,

En mi calidad de interventor del contrato de obra, y dando continuidad al trámite iniciado mediante el oficio radicado ante su despacho el pasado 11 de febrero de 2026 (Radicado No. OFI-2026-02-ENT-028), me permito elevar una reiteración con carácter de urgencia respecto al retiro de la planta eléctrica y transferencia automática antiguas.

Esta solicitud se fundamenta y refuerza por los siguientes hechos de alta criticidad:

i. Operatividad del sistema nuevo:
   a. Se reitera que desde el pasado 07 de febrero de 2026, según consta en el acta de comité No. 003, el nuevo sistema de 250 KVA se encuentra totalmente operativo, sincronizado y energizado.
   b. Los equipos antiguos ya han sido desconectados y están a disposición inmediata de la administración municipal.

ii. Hallazgo de Riesgo Inminente (Oficio OFC017_CS_2026): El contratista CONSORCIO SUBESTACIÓN ha reportado una situación de peligro latente mediante comunicación del 18 de febrero de 2026, la cual esta Interventoria respalda plenamente:
   a. Invasión de fauna: La permanencia de los equipos desincorporados impide el cierre hermético de los cuartos, lo que ha permitido el ingreso de un gato que pernocta sobre los tableros energizados.
   b. Peligro de siniestro: Existe un riesgo crítico de cortocircuito severo provocado por el animal, lo que causaría la salida de funcionamiento de la subestación y daños irreparables a la infraestructura nueva.
   c. Riesgo vital: La exposición del animal a barras y terminales de alta tensión representa un peligro de muerte inminente

iii. Afectación al avance de obra
   a. La presencia de estos activos bloquea la ejecución de obras civiles complementarias, remates y acabados finales.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

b. Esta situación impide el progreso hacia el acta de recibo final y la liquidación del contrato, generando un retraso administrativo y técnico injustificado.

Por lo expuesto, se solicita a la Secretaria de Infraestructura coordinar de manera inmediata el retiro físico de estos elementos. Es imperativo asegurar el recinto para mitigar los riesgos eléctricos y salvaguardar la integridad de los equipos recientemente instalados.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia oficio OFC017_CS_2026 (3 folios)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

INT-OFI-2026-02-ENT-029

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
18 FEB 2026
Recibido por
Hora 10:50 AM PM
Radicado No. Folios

Aguazul, 17 de febrero de 2026

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXION AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de prorroga No. 1 del contrato 0806 de 2025 y aval técnico de Balance de Cantidades No. 1

Cordial saludo,

En mi calidad de interventor del contrato de la referencia, y en cumplimiento de mis funciones de seguimiento y control técnico, administrativo y financiero, me permito remitir a su despacho el oficio radicado por el contratista bajo la referencia OFC016_CS_2026 de fecha 09 de febrero de 2026.

Tras realizar un análisis detallado de las causales expuestas por el contratista y verificar los informes de comité y las condiciones en sitio, esta interventoria emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para la adición en tiempo solicitada de un (1) mes, sustentado en los siguientes hallazgos técnicos no imputables al contratista:

i. Destase administrativo en el inicio efectivo:
Si bien el acta de inicio de obra se formalizó el 19 de noviembre de 2025, el inicio real de las actividades constructivas se vio desplazado hasta el 25 de noviembre, debido a los trámites de coordinación con la Secretaria de Infraestructura para la intervención de la subestación eléctrica y la autorización de corte en la plazoleta central. Este periodo de siete (7) días se considera un ajuste técnico necesario y no una demora injustificada, ya que permitió establecer los perímetros de seguridad requeridos para trabajos en zonas energizadas, generando un impacto inicial en la ruta crítica ajeno a la voluntad del contratista.

ii. Optimización de diseño por normativa RETIE:
Se verificó en el comité de obra No. 001 que las dimensiones originales del cuarto de la planta eléctrica no cumplían con las distancias de seguridad exigidas por el RETIE. Esta Interventoria avaló la necesidad técnica de replantear las dimensiones estructurales para garantizar la operatividad y legalización futura de los equipos, lo cual impactó el inicio de la ruta crítica.

iii. Imprevistos geotécnicos y redes no inventariadas:
Durante las excavaciones en diciembre, se encontraron redes hidrosanitarias no inventariadas y una saturación imprevista del suelo, documentadas en el comité de obra No. 002. Ante esta situación, y para garantizar la estabilidad del tanque, esta Interventoría prohibió avanzar con la fundida de la losa de fondo

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

hasta que se ejecutara el retiro de lodos, el mejoramiento con material granular y se obtuvieran los resultados de densidad (Proctor Modificado) conformes. Este estricto control de calidad fue indispensable, pero consumió tiempo del cronograma original.

iv. Factores climáticos y recuperación de acero:
Las fuertes lluvias de enero de 2026 provocaron inestabilidad en los taludes, afectando la parrilla de refuerzo del tanque de almacenamiento de agua. Para dar cumplimiento a la norma NSR-10 respecto a la adherencia del concreto, se requirió realizar limpieza manual y lavado a presión de todo el acero antes de autorizar la fundida.

La interventoria certifica que las demoras presentadas obedecen a la atención de imprevistos técnicos y a la priorización de la calidad y estabilidad de la obra, el tiempo adicional de un mes (1) es estrictamente necesario para finalizar las actividades de fraguado, rellenos técnicos y acabados bajo estándares de ingenieria adecuados.

Por lo anterior, recomendamos a la entidad contratante proceder con el trámite administrativo para la prórroga del plazo de ejecución, con el fin de garantizar el recibo a satisfacción de la infraestructura.

Concepto favorable al balance de cantidades No. 1

De manera complementaria a la solicitud de adición en tiempo, y considerando que las situaciones técnicas expuestas anteriormente (necesidades sobrevinientes y optimizaciones constructivas) generaron procesos de optimización en la ejecución física del proyecto, me permito radicar y dar AVAL TÉCNICO al informe de balance de mayores y menores cantidades de obra No. 1.

Esta interventoria certifica que ha revisado rigurosamente las memorias de cálculo y los soportes gráficos presentados por el contratista, encontrándolas plenamente conformes a la realidad de la obra y a las especificaciones técnicas del proyecto. Las variaciones cuantitativas consolidadas en este balance están debidamente justificadas y documentadas en los comités de obra No. 001 y No. 002, por lo cual se solicita respetuosamente a su despacho la revisión, aprobación y trámite conjunto de ambos requerimientos para la correcta legalización de la obra.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia oficio OFC016_CS_2026 (3 folios)*
- *Copia de comité de obra No. 001 (2 folios)*
- *Copia de comité de obra No. 002 (3 folios)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11 FEB 2026
Recibido por
Hora 11:18 AM PM
Radicado No Folios

INT-OFI-2026-02-ENT-028

Aguazul, 11 de febrero de 2026

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXION AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de retiro de equipos existentes (planta eléctrica y transferencia).

Cordial saludo,

En mi calidad de interventor del contrato No. 0806, me permito dar traslado y respaldar la solicitud presentada por el contratista de obra CONSORCIO SUBESTACIÓN mediante el oficio OFC017_CS_2026 de fecha 11 de febrero de 2026.

Informo a su despacho que el pasado 07 de febrero de 2026, tras las pruebas dinámicas registradas en el acta de comité No. 003, se verifico el correcto funcionamiento y sincronización de la nueva planta de 250 KVA y su sistema de transferencia. Al encontrarse el nuevo sistema totalmente operativo y energizado, se han generado las siguientes necesidades apremiantes para el éxito del proyecto:

- La planta eléctrica y la transferencia automática antiguas ya han sido desconectadas y se encuentran disponibles para su entrega formal a la administración municipal.
- La presencia de estos equipos antiguos en el sitio impide actualmente la ejecución de las obras civiles complementarias, remates y acabados finales del proyecto.
- Es indispensable que la entidad gestione el retiro de estos activos de manera inmediata, ya que su permanencia bloquea el avance hacia el acta de recibo final y la liquidación del contrato.

Por lo anterior, solicito de manera respetuosa se coordinen las acciones logisticas necesarias para el retiro de dichos elementos, permitiendo así que el contratista proceda con los trabajos finales sin más dilaciones.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia oficio OFC017_CS_2026 (2 folios)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-027

Aguazul, 11 de febrero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11 FEB 2026
Recibido por
Hora 11:17
Radicado No.
Folios

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de prorroga No. 2 del contrato de interventoria 0798 de 2025.

Cordial saludo,

En mi calidad de interventor del contrato de la referencia, y actuando en cumplimiento de las funciones de seguimiento y control técnico, administrativo y financiero, me permito elevar ante su despacho la solicitud de Prorroga No. 2 al plazo de ejecución de la interventoria, basada en los siguientes fundamentos:

- Sincronización con el contrato de obra: Mediante oficio IAT-OFI-2026-02-ENT-026, el 10 de febrero de 2026, esta interventoria emitió concepto técnico favorable para la prórroga del contrato de obra No. 0806 de 2025, para otorgar una prórroga de un (1) mes, debido a retrasos no imputables al contratista relacionados con trámites administrativos iniciales, ajustes normativos RETIE y condiciones geotecnicas imprevistas
- Permanencia de la supervisión: Conforme a los principios de contratación estatal, el contrato de interventoria debe ser concomitante con el contrato de obra objeto de vigilancia. Dado que la obra requiere un (1) mes adicional para finalizar actividades criticas como el fraguado, rellenos técnicos y acabados, es indispensable que la supervisión técnica se mantenga activa para validar dichas actividades.
- Garantia de supervisión técnica: Debido a los imprevistos técnicos documentados, tales como ajustes por normativa RETIE, hallazgos geotécnicos y factores climáticos que afectaron la ruta critica de la obra, es imperativo que la interventoria mantenga su vigencia.
- Aseguramiento del cierre del proyecto: El tiempo solicitado permitirá no solo el acompañamiento en la fase final de construcción, sino también la consolidación de los informes finales, y el inicio del proceso de liquidación administrativa y técnica del proyecto.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

- Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades finales, se propone llevar el personal de la interventoria al mínimo operativo posible. Por lo tanto, para este nuevo periodo de ejecución, se establece que el único profesional necesario en campo y oficina será el residente de interventoría, quien asumirá la responsabilidad del seguimiento de las tareas restantes
- La presente solicitud de prórroga no representa remuneración adicional ni mayores costos para la entidad contratante; su único propósito es la alineación de los cronogramas para la correcta ejecución del objeto contractual. La interventoria reafirma su compromiso de cumplir con el seguimiento integral sin que esto afecte el presupuesto inicialmente pactado.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar el recibo a satisfacción de la infraestructura para el Municipio de Aguazul, se recomienda proceder con la extensión del plazo del contrato de interventoría por un tiempo igual al otorgado al contratista de obra, un (1) mes calendario.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-026

Aguazul, 10 de febrero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10 FEB 2026
Recibido por
Hora 2:38 AM PM
Radicado No. Folios

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de prorroga No. 1 del contrato 0806 de 2025

Cordial saludo,

En mi calidad de interventor del contrato de la referencia, y en cumplimiento de mis funciones de seguimiento y control técnico, administrativo y financiero, me permito remitir a su despacho el oficio radicado por el contratista bajo la referencia OFC016_CS_2026 de fecha 09 de febrero de 2026.

Tras realizar un análisis detallado de las causales expuestas por el contratista y verificar los informes de comité y las condiciones en sitio, esta interventoria emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para la adición en tiempo solicitada de un (1) mes, sustentado en los siguientes hallazgos técnicos no imputables al contratista:

i. Desfase administrativo en el inicio efectivo:

Si bien el acta de inicio de obra se formalizó el 19 de noviembre de 2025, el inicio real de las actividades constructivas se vio desplazado hasta el 25 de noviembre, debido a los trámites de coordinación con la Secretaria de Infraestructura para la intervención de la subestación eléctrica y la autorización de corte en la plazoleta central. Este periodo de siete (7) días se considera un ajuste técnico necesario y no una demora injustificada, ya que permitió establecer los perímetros de seguridad requeridos para trabajos en zonas energizadas, generando un impacto inicial en la ruta crítica ajeno a la voluntad del contratista.

ii. Optimización de diseño por normativa RETIE:

Se verificó en el comité de obra No. 001 que las dimensiones originales del cuarto de la planta eléctrica no cumplían con las distancias de seguridad exigidas por el RETIE. Esta Interventoría avaló la necesidad técnica de replantear las dimensiones estructurales para garantizar la operatividad y legalización futura de los equipos, lo cual impactó el inicio de la ruta crítica.

iii. Imprevistos geotécnicos y redes no inventariadas:

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Durante las excavaciones en diciembre, se encontraron redes hidrosanitarias no inventariadas y una saturación imprevista del suelo, documentadas en el comité de obra No. 002. Ante esta situación, y para garantizar la estabilidad del tanque, esta Interventoria prohibió avanzar con la fundida de la losa de fondo hasta que se ejecutara el retiro de lodos, el mejoramiento con material granular y se obtuvieran los resultados de densidad (Proctor Modificado) conformes. Este estricto control de calidad fue indispensable, pero consumió tiempo del cronograma original.

iv. Factores climáticos y recuperación de acero:

Las fuertes lluvias de enero de 2026 provocaron inestabilidad en los taludes, afectando la parrilla de refuerzo del tanque de almacenamiento de agua. Para dar cumplimiento a la norma NSR-10 respecto a la adherencia del concreto, se requirió realizar limpieza manual y lavado a presión de todo el acero antes de autorizar la fundida.

La interventoria certifica que las demoras presentadas obedecen a la atención de imprevistos técnicos y a la priorización de la calidad y estabilidad de la obra, el tiempo adicional de un mes (1) es estrictamente necesario para finalizar las actividades de fraguado, rellenos técnicos y acabados bajo estándares de ingenieria adecuados.

Por lo anterior, recomendamos a la entidad contratante proceder con el trámite administrativo para la prórroga del plazo de ejecución, con el fin de garantizar el recibo a satisfacción de la infraestructura.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia oficio OI C016_CS_2026 (3 folios)*
- *Copia de comité de obra No. 001 (2 folios)*
- *Copia de comité de obra No. 002 (3 folios)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-025

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
09 FEB
Recibido por: AM PM
Hora: Folios
Radicado No

Aguazul, 07 de febrero de 2026

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Informe de balance de mayores y menores cantidades de obra No. 1 del contrato 0806 de 2025

Cordial saludo,

En cumplimiento de mis obligaciones contractuales de seguimiento y control, me permito radicar ante su despacho el informe de balance de mayores y menores cantidades de obra No. 1, para su respectiva revisión, aprobación y trámite pertinente.

El presente documento consolida y justifica técnicamente las variaciones cuantitativas surgidas durante la ejecución del proyecto, las cuales responden a necesidades sobrevinientes y optimizaciones constructivas debidamente documentadas en los comités de obra No. 001 y No. 002

Esta interventoria certifica que ha revisado las memorias de cálculo y los soportes gráficos presentados por el contratista, encontrándolas conformes a la realidad de la obra y a las especificaciones técnicas del proyecto.

Se anexa a este oficio la siguiente documentación soporte en fisico:

- Informe de justificación técnica de ítems (mayores y menores).
- Copias de las Actas de Comité No. 001 y 002.
- Cuadro consolidado de Balance de Cantidades.
- Memorias de cálculo detalladas y soportes gráficos.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Una (1) carpeta, con 200 folios*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-024

Aguazul, 05 de febrero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
05 FEB 2026
Recibido por:
Hora: 2:51 AM PM
Radicado No: Folios

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe de interventoria No. 02.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del Informe de Interventoria número dos (02) correspondiente al contrato de la referencia.

Se informa a la entidad que este documento contiene el seguimiento y control detallado de las actividades realizadas por esta Interventoria durante el periodo reportado. Se remite para su conocimiento, fines pertinentes y control por parte de la Administración Municipal.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Una (1) carpeta, con 103 folios*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

INT-OFI-2026-02-ENT-023

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
05 FEB 2026
Recibido por:
Hora 2:50 AM PM
Folios:
Radicado No.

Aguazul, 05 de febrero de 2026

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega del informe de obra No. 02 – Contrato de Obra No. 806 del 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del informe de obra número dos (02) correspondiente al contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Se informa a la entidad que dicho documento ya ha sido revisado y avalado en su totalidad por la interventoria, verificando que su contenido se ajusta a las actividades ejecutadas en campo, se remite para su conocimiento, fines pertinentes y control por parte de la Administración Municipal.

Esta Interventoría considera viable y necesaria la ejecución de estas maniobras para dar cumplimiento al cronograma y asegurar la continuidad del servicio eléctrico en el Centro Administrativo.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:
- *Una (1) carpeta, con 174 folios*

300

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-022

Aguazul, 05 de febrero de 2026

Deyder Cocunubo
5-02-2026
Hora: 9:15 am

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Requerimiento de entrega informe mensual de obra No. 03 (enero 2026)

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa y financiera que competen a esta Interventoria, nos permitimos solicitar de manera formal la entrega del Informe Mensual de Obra No. 03, correspondiente al periodo ejecutado en el mes de enero de 2026.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de referencia y el pliego de condiciones, es responsabilidad del contratista de obra presentar los reportes que evidencien el avance físico y financiero del proyecto, al respecto, recordamos que dicho informe debe contener, como mínimo, los siguientes soportes como mínimo:

i. Informe juridico
ii. Informe administrativo
iii. Informe técnico
iv. Informe financiero y contable

La entrega oportuna de este documento es indispensable para proceder con la revisión, validación y posterior trámite de aprobación del mismo, actas de recibo parcial y demás gestiones administrativas necesarias para el normal flujo del contrato.
Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

301

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-021

Aguazul, 03 de febrero de 2026

Deyder Cocunbo
3-02-2026
Hora 8:00 am

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Devolución para ajustes - Informe Mensual de Obra No. 02

Cordial saludo,

Tras realizar la revisión técnica del informe mensual de obra No. 02 recibido en dias pasados, nos permitimos hacer la devolución del mismo con el fin de que se realicen algunas precisiones y ajustes menores.

Es importante mencionar que las observaciones identificadas son, en su gran mayoria, de forma y presentación, y no afectan el contenido técnico de fondo, sin embargo, estos ajustes son necesarios para garantizar que el documento cumpla con los estándares de calidad requeridos para su archivo y aprobación definitiva.

Las observaciones y comentarios se han consignado detalladamente en cada uno de los apartes dentro del cuerpo del informe, para que procedan con la corrección correspondiente, una vez realizados los ajustes, agradeceria remitir nuevamente el informe para proceder de inmediato con su validacion.

Quedamos atentos a cualquier duda técnica para agilizar esta entrega.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-02-ENT-020

ALCALDÍA DE AGUAZUL
03 FEB 2026

Aguazul, 03 de febrero de 2026

SEÑOR
GONZALO ANDRÉS MÉNDEZ LOPEZ
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de pólizas prorroga No. 1 del contrato en referencia.

Cordial saludo,

Mediante la presente, me permito radicar las pólizas actualizadas correspondientes a la Prórroga No. 1 del contrato de la referencia, con el fin de garantizar la suficiencia de las coberturas durante el nuevo periodo de ejecución pactado.

Los documentos adjuntos y debidamente cargados en la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación son:

- Póliza No. 42-40-101050334 – Anexo 1: Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Póliza No. 42-44-101163784 - Anexo 2: Cumplimiento y demás amparos contractuales.

Por lo anterior, se remiten dichos documentos para su revisión, aprobación y demás fines pertinentes por parte de la oficina asesora juridica.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:
- *Pólizas responsabilidad civil extra contractual (3 folios)*
- *Pólizas de cumplimiento (2 folios)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-019

Aguazul, 30 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
30 ENE 2026
Recibido por
Hora: 4:00 AM ☐ PM ☑
Radicado No. Folios

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Remisión y concepto técnico sobre puesta en marcha de planta eléctrica – Contrato 0806 de 2025.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del contrato 0806 de 2025, nos permitimos remitir para su gestión el oficio OFC013_CS_2026 presentado por el Consorcio Subestación.

Al respecto, la interventoría ha validado la necesidad técnica y el cronograma propuesto por el contratista para la entrada en funcionamiento de la nueva planta eléctrica, resaltando los siguientes puntos ante la Administración Municipal:

- El contratista ha programado la puesta en marcha para los días 31 de enero y 01 de febrero de 2026, conforme a los acuerdos de coordinación técnica previos.
- Es imperativo que la entidad integre este nuevo equipo en su plan de suministro de combustible de manera inmediata.
- El contratista suministrará 40 galones para las pruebas iniciales de funcionamiento.
- Se informa que el equipo posee un tanque con capacidad aproximada de 120 galones, por directrices del proveedor y para garantizar la seguridad técnica, el nivel debe mantenerse entre el 50% y el 70% de su capacidad.
- Esta medida es esencial para asegurar la autonomía del sistema una vez se realice la desconexión definitiva de la planta antigua, evitando riesgos por bajo nivel de combustible.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Esta Interventoria considera viable y necesaria la ejecución de estas maniobras para dar cumplimiento al cronograma y asegurar la continuidad del servicio eléctrico en el Centro Administrativo.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC013_CS_2026 (2 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-CON-018

Aguazul, 29 de enero de 2026

Deyder Cocunubo
29-01-2026
Hora: 3:00 pm

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Devolución y solicitud de ajustes a memorias de cantidades y soportes gráficos del balance de obra.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento y control técnico al contrato de la referencia, esta interventoría se permite realizar la devolución del informe de balance de mayores y menores cantidades radicado recientemente.

Tras realizar la revisión detallada de la documentación aportada, se han identificado observaciones que requieren de su inmediata corrección y ajuste, bajo los siguientes lineamientos:

i. Ajuste de medidas y cantidades: Se observan discrepancias entre las cantidades relacionadas en el cuadro comparativo y las medidas mostradas en los soportes gráficos. Es necesario que las memorias de cálculo se ajusten estrictamente a los lineamientos técnicos del proyecto y a las dimensiones finales de los elementos construidos.
ii. Soportes gráficos: Los soportes gráficos aportados no guardan una relación uniforme con los ítems de mayores cantidades reportados. Se requiere que cada soporte gráfico esté debidamente identificado y vinculado a la memoria de cálculo correspondiente para facilitar su trazabilidad.

Por lo anterior, se solicita al CONSORCIO SUBESTACIÓN realizar los ajustes pertinentes y radicar nuevamente el paquete documental completo para proceder con la validación definitiva. Contar con soportes precisos es un requisito indispensable para garantizar la transparencia en la liquidación de las actas y la estabilidad financiera del contrato.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-017

Aguazul, 29 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
29 ENE 2026
Recibido por
Hora 10:34 AM PM
Folios
Radicado No.

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe de interventoria No. 01.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del Informe de Interventoría número uno (01) correspondiente al contrato de la referencia.

Se informa a la entidad que este documento contiene el seguimiento y control detallado de las actividades realizadas por esta Interventoria durante el periodo reportado. Se remite para su conocimiento, fines pertinentes y control por parte de la Administración Municipal.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Una (1) carpeta, con 94 folios*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-016

Aguazul, 29 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
29 ENE 2026
Recibido por:
Hora 10:33 AM PM
Folios
Radicado No.

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega del informe de obra No. 01 – Contrato de Obra No. 806 del 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del informe de obra número uno (01) correspondiente al contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Se informa a la entidad que dicho documento ya ha sido revisado y avalado en su totalidad por la interventoría, verificando que su contenido se ajusta a las actividades ejecutadas en campo, se remite para su conocimiento, fines pertinentes y control por parte de la Administración Municipal.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Una (1) carpeta, con 126 folios*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-015

Aguazul, 27 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
27 ENE 2026
Recibido por:
Hora 2:42 AM PM
Radicado No. _____ Folios _____

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: REITERACIÓN – Solicitud de ventana de operación y logística de retiro de equipo existente – Contrato de Obra 0806 de 2025.

Cordial saludo,

En ejercicio de nuestras funciones de control al contrato de obra No. 0806 de 2025, de manera atenta reiteramos la solicitud enviada mediante el oficio IAT-OFI-2026-01-ENT-013 con fecha del 19 de enero, la cual aún se encuentra pendiente de respuesta formal por parte de la Administración Municipal.

El contratista CONSORCIO SUBESTACIÓN, a través del oficio OFC011_CS_2026, ha manifestado la urgencia de definir la ventana de operación debido a que el retraso en la confirmación está afectando la programación con proveedores y especialistas, adicionalmente, se requiere que la Entidad considere los siguientes puntos criticos para la ejecución de la maniobra:

- Reactivación de la ventana de trabajo: Al no haberse podido ejecutar la actividad en las fechas anteriormente propuestas, solicitamos definir a la mayor brevedad un nuevo horario (preferiblemente fin de semana) para realizar el cambio de la planta eléctrica y las pruebas de carga.
- Desconexión y retiro de equipo existente: Es importante informar que, una vez entre en funcionamiento el nuevo equipo, la planta eléctrica antigua quedará totalmente fuera de servicio, por tanto, se requiere que la administración municipal organice la logística para el retiro y traslado de este activo, liberando así el espacio necesario para terminar las obras complementarias.
- Coordinación de profesionales: La falta de una fecha definida impide al contratista asegurar la presencia simultánea de los técnicos necesarios, lo que podría derivar en mayores tiempos de ejecución o retrasos en la entrega final del proyecto

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Dada la relevancia del sistema eléctrico para la operatividad del Centro Administrativo, solicitamos su valiosa gestión para formalizar esta autorización y coordinar los planes de contingencia necesarios.

Agradecemos su atención y diligencia ante esta necesidad técnica prioritaria.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC011_CS_2026 (1 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-CON-014

Aguazul, 19 de enero de 2026

Deyder Cocunubo
19/01/2026
Hora: 8 00am

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Requerimiento de entrega informe balance No. 1

Cordial saludo,

En mi calidad de Interventor del contrato de la referencia, y en ejercicio de las facultades de seguimiento, control y vigilancia técnica y administrativa que me corresponden, me permito solicitar de manera inmediata la entrega del informe de balance de mayores y menores cantidades.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de consolidar el estado actual de la ejecución técnica y financiera del proyecto, teniendo en cuenta los eventos externos de fuerza mayor y/o situaciones imprevisibles que han afectado el desarrollo normal de las actividades y que han requerido el análisis, ajuste y validación de las cantidades inicialmente pactadas. El informe deberá contener, como mínimo, los siguientes puntos:

- Cuadro comparativo: Relación detallada de las cantidades del presupuesto inicial frente a las ejecutadas y por ejecutar.
- Justificación Técnica: Sustento detallado de cada ítem que presente variación (mayores o menores cantidades), vinculándolos directamente con los eventos externos reportados en comités de obra.
- Análisis financiero: Impacto económico de los ajustes en el valor total del contrato y disponibilidad de recursos.
- Soportes: Soportes gráficos y memorias de cálculo que respalden las variaciones solicitadas.

Es imperativo contar con este documento para garantizar la correcta liquidación de actas y la continuidad del flujo de inversión, evitando traumatismos en el cronograma de entrega final, se otorga un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción de esta comunicación para la radicación del informe ante esta Interventoría.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-013

Aguazul, 19 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
19 ENE 2026
Recibido por:
Hora: 2:26 AM PM
Folios:
Radicado No.

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de autorización de ventana de operación y corte de energía programado – Contrato de Obra 0806 de 2025

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de control y seguimiento al Contrato de Obra Pública No. 0806 de 2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO", remito formalmente la solicitud de ventana de operación presentada por el contratista Consorcio Subestación mediante el oficio OFC009_CS_2026.

El contratista informa que dispone en sitio de la totalidad de los equipos y materiales para el cambio definitivo de la planta eléctrica existente por la nueva unidad, con el fin de garantizar la puesta en funcionamiento de dicho equipo y minimizar el impacto en la operación administrativa, se requiere un corte total de energía en las instalaciones de la Alcaldía durante el siguiente periodo:

- Sábado 24 de enero de 2026
- Domingo 25 de enero de 2026

Esta Interventoría ha revisado la pertinencia técnica de la solicitud y considera necesario que la Entidad y la Supervisión realicen las coordinaciones internas y los planes de comunicación pertinentes para autorizar esta ventana de trabajo, lo anterior es fundamental para ejecutar de manera segura el retiro del equipo anterior, la adecuación de conexiones y las pruebas de carga necesarias.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Agradecemos su gestión ante la Administración Municipal para confirmar la disponibilidad de estas fechas, con el fin de que el sistema se encuentre operando en condiciones óptimas para el inicio de la jornada laboral el lunes 26 de enero.

Agradecemos su atención y diligencia ante esta necesidad técnica prioritaria.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC009_CS_2026 (2 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-CON-012

Aguazul, 08 de enero de 2026

Deyder Cocunubo
8-01-2026
Hora: 8:00 am

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Requerimiento de entrega informe mensual de obra No. 02 (diciembre 2025)

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa y financiera que competen a esta Interventoría, nos permitimos solicitar de manera formal la entrega del Informe Mensual de Obra No. 02, correspondiente al periodo ejecutado en el mes de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de referencia y el pliego de condiciones, es responsabilidad del contratista de obra presentar los reportes que evidencien el avance físico y financiero del proyecto, al respecto, recordamos que dicho informe debe contener, como mínimo, los siguientes soportes como mínimo:

i. Informe jurídico
ii. Informe administrativo
iii. Informe técnico
iv. Informe financiero y contable

La entrega oportuna de este documento es indispensable para proceder con la revisión, validación y posterior trámite de aprobación del mismo, actas de recibo parcial y demás gestiones administrativas necesarias para el normal flujo del contrato.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-011

Aguazul, 05 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
05 ENE 2026
Recibido por
Hora: 3:00 AM PM
Folios
Radicado No.

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de retiro de planta eléctrica existente.

Cordial saludo,

En ejercicio de las facultades de seguimiento y control que competen a esta Interventoria sobre el contrato de obra, de manera muy atenta nos permitimos hacer entrega del requerimiento formal emitido por el contratista CONSORCIO SUBESTACIÓN a través del oficio OFC006_CS_2026, y radicado a esta interventoria el dia 05 de enero de 2026.

Mediante la citada comunicación, el contratista informa que, en cumplimiento del cronograma de suministros, se tiene programado el arribo de la nueva planta eléctrica para el dia 06 de enero de 2026, es pertinente resaltar que el equipo de trabajo de obra ha optimizado los rendimientos ejecutando las actividades en áreas externas y periféricas; no obstante, el avance del proyecto ha alcanzado un punto critico donde es imperativo intervenir el recinto técnico para garantizar la continuidad de la ruta crítica.

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de evitar traumatismos en la ejecución, solicitamos respetuosamente su valiosa intermediacion para gestionar, a la mayor brevedad posible, el retiro de la planta eléctrica existente, la desocupación total de este espacio se constituye como un prerrequisito técnico indispensable para proceder con las siguientes actividades:

i. Adecuaciones civiles y mecánicas: Intervención en bases y sistemas de anclaje.
ii. Acondicionamiento: Ajustes en ventilación y ductería de escape.
iii. Protocolos de maniobra: Disposición de espacio para el ingreso seguro del nuevo equipo

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Agradecemos de antemano su gestión y diligencia, la cual permitirá prevenir retrasos en los tiempos de instalación y puesta en marcha del sistema, asegurando así el cumplimiento de los objetivos contractuales en beneficio de la comunidad de Aguazul.

Agradecemos su atención y diligencia ante esta necesidad técnica prioritaria.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC006_CS_2026 (2 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-12-CON-010B

Deyder Cocunubo
22 de Dic 2025
Hora: 2 35pm

Aguazul, 22 de diciembre de 2025

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Devolución para ajustes - Informe Mensual de Obra No. 01

Cordial saludo,

Tras realizar la revisión técnica del informe mensual de obra No. 01 recibido en días pasados, nos permitimos hacer la devolución del mismo con el fin de que se realicen algunas precisiones y ajustes menores.

Es importante mencionar que las observaciones identificadas son, en su gran mayoría, de forma y presentación, y no afectan el contenido técnico de fondo, sin embargo, estos ajustes son necesarios para garantizar que el documento cumpla con los estándares de calidad requeridos para su archivo y aprobación definitiva.

Las observaciones y comentarios se han consignado detalladamente en cada uno de los apartes dentro del cuerpo del informe, para que procedan con la corrección correspondiente, una vez realizados los ajustes, agradeceria remitir nuevamente el informe para proceder de inmediato con su validación.

Quedamos atentos a cualquier duda técnica para agilizar esta entrega.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-12-CON-010A

Deyder Cocunubo
5/12/2025
Hora: 8:15am

Aguazul, 5 de diciembre de 2025

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Requerimiento de entrega informe mensual de obra No. 01 (noviembre 2025)

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa y financiera que competen a esta Interventoría, nos permitimos solicitar de manera formal la entrega del Informe Mensual de Obra No. 01, correspondiente al periodo ejecutado en el mes de noviembre de 2025.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de referencia y el pliego de condiciones, es responsabilidad del contratista de obra presentar los reportes que evidencien el avance físico y financiero del proyecto, al respecto, recordamos que dicho informe debe contener, como mínimo, los siguientes soportes como mínimo:

i. Informe jurídico
ii. Informe administrativo
iii. Informe técnico
iv. Informe financiero y contable

La entrega oportuna de este documento es indispensable para proceder con la revisión, validación y posterior trámite de aprobación del mismo, actas de recibo parcial y demás gestiones administrativas necesarias para el normal flujo del contrato.

Agradecemos la remisión de este informe en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la recepción del presente oficio.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-ENT-010

Aguazul, 20 de noviembre de 2025

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
20 NOV 2025
Recibido por: 11:53 AM PM
Hora:
Radicado No.
Folios:

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de acta de inspección y entrega de subestación y plazoleta central, para la autorización de intervención de las áreas.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato de obra No. 0806 de 2025 y dando continuidad a lo estipulado en el acta de inicio, esta Interventoría se permite radicar ante su despacho la solicitud emitida por el CONSORCIO SUBESTACIÓN (Contratista), la cual requiere la autorización de la entidad contratante para el inicio de actividades que afectan activos críticos y áreas comunes.

La solicitud del Contratista, avalada por esta Interventoría, se centra en la necesidad de obtener la entrega física de la subestación eléctrica (SE) para la ampliación del cuarto de planta, esta acción debe estar precedida por una inspección conjunta (Entidad, Interventoría y Contratista) para levantar un acta de estado y custodia, que deje registro documental del estado actual de los equipos antes de cualquier obra civil, lo cual es vital para establecer responsabilidades.

Adicionalmente, se requiere la autorización expresa para intervenir, mediante corte y excavación, el área de la plazoleta central y area de jardín, esta intervención es indispensable para la correcta instalación del banco ducto eléctrico conforme a los diseños aprobados, elemento esencial para la conexión al sistema eléctrico objeto del contrato.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Considerando que estas gestiones son cruciales para el avance de la obra y el cumplimiento del cronograma, solicitamos a la impartir la autorización formal a la mayor brevedad posible, esto permitira a la Interventoria coordinar la inspección y la entrega formal de las áreas

Agradecemos su gestión y pronta respuesta.

Cordialmente.

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC004_CS_2025 (2 folios)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-ENT-009

Aguazul, 14 de noviembre de 2025

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
14 NOV 2025
Recibido por: _____
Hora: 3:14 AM ☐ PM ☑
Radicado No. _____ Folios: _____

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud anticipo de obra y entrega de plan de inversión del contrato de obra No. 0806 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar el plan de inversión del anticipo del contrato de obra No. 0806 de 2025, para su revisión y aprobación para el desarrollo de dicho contrato, suscrito entre CONSORCIO SUBESTACIÓN con NIT 901.987.309-4, representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS y el Municipio de Aguazul.

Asi mismo solicitamos se autorice el trámite para el desembolso del anticipo por un valor de **TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS** ($ 393.079.896,50)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
1	Pago de salarios, jornales y seguridad social	$ 19,653,994.82	5.00%
2	Compra Materiales	$ 157,231,958.60	40.00%
3	Alquileres de equipos y/o Compra de Equipos	$ 176,885,953.43	45.00%
4	Transporte de materiales y equipos	$ 39,307,989.65	10.00%
TOTAL		**$ 393,079,896.50**	**100.00%**

Notas: Los porcentajes se toman sobre el 100% del anticipo recibido por el contratista.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Así mismo adjuntamos copia de la certificación bancaria para el manejo de los recursos de la fiduciaria Bancolombia S.A – CTA ahorros 60600006200 denominada P.A. ANT CONSORCIO SUBESTACIÓN.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Certificación bancaria (1 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-ENT-008

Aguazul, 13 de noviembre de 2025

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
14 NOV 2025
Recibido por:
Hora: 3:38 AM PM
Radicado No. _____ Folios _____

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de acta de inicio de obra Contrato No. 0806 de 2025.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoria y en cumplimiento con lo establecido en las obligaciones contractuales, nos dirigimos a ustedes para solicitar formalmente la convocatoria para la suscripción del Acta de Inicio de Obra del Contrato No. 0806 de 2025.

Esta solicitud se fundamenta en la superación de los impedimentos que motivaron la suspensión temporal de la Interventoría y la consecuente imposibilidad de iniciar la Obra, tal como se detalla a continuación:

I. Aprobación del Informe Pre-Constructivo

Confirmamos que el Informe Pre-constructivo, que incluye la revisión y el aval técnico de los documentos de planeación inicial, ha sido APROBADO.

II. Subsanación de Requisitos Legales

Se informa que el Contratista de Obra (Consorcio Subestación) ha subsanado la totalidad de la documentación legal y de seguridad social requerida, la cual era indispensable para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y poder dar inicio a la ejecución. Específicamente, se ha verificado la entrega de:

- Soportes de Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS y AFP).
- Programación de Obra ajustada y aprobada por la Interventoría.
- Flujo de Caja.

III. Solicitud de Suscripción del Acta de Inicio

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

II. SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

Con el fin de garantizar el equilibrio contractual y que el plazo de ejecución de la interventoría se equipare al plazo total y real del contrato de obra, se requiere la siguiente modificación:

- Plazo Afectado y Consumido:
  - El contrato de interventoría estuvo activo por un total de 30 días calendario en la etapa pre-constructiva, espera de los documentos por parte del contratista para la firma del acta de inicio de obra, hasta el momento de la suspensión.
  - El plazo contractual de la Interventoría es de ciento cinco (105) días calendario, mientras que el contrato de obra tiene un plazo de tres (3) meses de ejecución (aproximadamente 90 días).

- Necesidad de Equiparación: La diferencia en los plazos originales de ejecución (105 días interventoría vs. 90 días obra), genera una inconsistencia en la capacidad de la Interventoría para acompañar toda la fase de Obra, la diferencia de 15 días en la fecha de terminación del Contrato de Obra respecto al de la Interventoría debe ser subsanada para asegurar la supervisión de las labores finales.

Prórroga Solicitada: Solicitamos la prórroga del plazo de ejecución del Contrato de Interventoria No. 0798 de 2025 por un término de 15 DÍAS CALENDARIO, que corresponde al tiempo requerido para equiparar las fechas de terminación de los dos contratos (obra e interventoría) y garantizar la cobertura total de la fase constructiva y los trámites de cierre.

En consecuencia,

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-CON-005

Deyder Cocunubo V
Fecha 3-nov-2025
Hora 9:30 am

Aguazul, 03 de noviembre de 2025

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACION
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: *Requerimiento de documentación faltante para acta de inicio*

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoria del contrato de la referencia, acusamos recibo de su comunicación OFC001 CS 2025, radicada el pasado 28 de octubre de 2025, junto con los documentos adjuntos (pólizas, comprobante de aprobación, pago de estampilla, documentación de personal y programación de obra).

Una vez revisada la documentación y su respuesta, evidenciamos que aún no se ha completado la totalidad de los requisitos indispensables para proceder con la elaboración y suscripción del acta de inicio de la etapa constructiva, en su comunicación, y usted menciona estar en proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

Por lo anterior, solicitamos formalmente radicar a la mayor brevedad posible la siguiente documentación contractual pendiente:

- Soportes de afiliación a ARL. (Certificado final, no solo el trámite).
- Soportes de afiliación EPS
- Soportes de afiliación a AFP.

Reiteramos que la entrega de la totalidad de los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal ofertado y aprobado es un requisito indispensable para legalizar el inicio de actividades y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Agradecemos su pronta gestión con el fin de no generar mayores retrasos en el cronograma general del proyecto
Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-CON-004

Aguazul, 24 de octubre de 2025

Recibi
Deyder Cocunubo V
24/10/2025
2:50 pm

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de documentación para acta de inicio

Cordial saludo.

En nuestra calidad de Interventoria del contrato de la referencia y en seguimiento al desarrollo de la etapa preconstructiva, nos dirigimos a ustedes con el fin de avanzar hacia la formalización de la etapa constructiva, teniendo en cuenta que el proyecto ya recibió el aval preconstructivo por parte de esta Interventoria y fue radicado informe a la entidad contratante, y considerando que se cumple el plazo estipulado para la legalización del inicio de obra, solicitamos formalmente la entrega de la siguiente documentación contractual pendiente, la cual es indispensable para proceder con la elaboración y suscripción del acta de inicio:

- Pólizas de garantias y amparos
- Comprobante de aprobación de pólizas
- Pago de estampillas del contrato
- Documentación del personal ofertado y aprobado
- Afiliaciones de ARL, EPS y AFP
- Programación de obra y flujo de caja.

Agradecemos radicar la documentación mencionada a la mayor brevedad posible, con el fin de dar cumplimiento a los términos contractuales y evitar retrasos en el cronograma general del proyecto.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-ENT-003

Aguazul, 16 de octubre de 2025

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

15 OCT 2025
9:04 am

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de reunión de socialización para inicio de actividades

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y las buenas prácticas de la ingeniería, nos permitimos solicitar formalmente a la Entidad contratante (Municipio de Aguazul), la convocatoria a una reunión de socialización con los actores involucrados y la comunidad beneficiaria del proyecto, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", esta reunión es un hito fundamental y un requisito para poder proceder con la suscripción del acta de inicio de la Obra.

El objetivo principal es realizar la presentación formal del proyecto, asegurando la correcta comprensión y el consenso necesario para un desarrollo armónico de las actividades.

Agradecemos su gestión para citar a los actores que consideren pertinentes, de igual forma, solicitamos su apoyo en la coordinación de la fecha, lugar y los medios audiovisuales necesarios para la presentación.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-ENT-002

Aguazul, 14 de octubre de 2025

14 OCT 2025
10:15am

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega informe preconstructivo

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, la Interventoria remite, para su revisión y aprobación, el informe preconstructivo del contrato cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

En el documento se certifica que los estudios y diseños suministrados han sido verificados y cumplen con la ingeniería de detalle, la normativa aplicable y los estándares de diseño requeridos para el proyecto.

Se solicita su aprobación formal del informe para autorizar el inicio de la etapa de construcción de las obras.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

329

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-ENT-001

Aguazul, 03 de octubre de 2025

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

03 OCT 2025
Folio 329

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 y No. SECOP II RSC-CM-003-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACION DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Plan de inversión del anticipo

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar el plan de inversión del anticipo, para su revisión y aprobación para el desarrollo del contrato en referencia, suscrito entre YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.607.262 de Tunja y el Municipio de Aguazul.

Asi mismo solicitamos se autorice el trámite para el desembolso del anticipo por un valor de **VEINTE TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS** ($ 23.913.880,00)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
1	Pago de salarios y seguridad social	$ 17.935.410,00	75,00%
2	Alquileres y arriendos	$ 2.989.235,00	12,50%
3	Papelería y compra de equipos	$ 2.989.235,00	12,50%
TOTAL		$ 23.913.880	100%

Asi mismo adjuntamos copia de la certificación bancaria para el manejo de los recursos del BANCO BBVA – CTA ahorros 001309810002000016289.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA
