3632

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			Puerto Gaitán
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	**Versión:** 06	**Vigencia:** 30/06/2026	

1090-1417

Puerto Gaitán, 29 de julio de 2026

Señores (as):
SECRETARÍA DE HACIENDA
Atn; DR RAMON OCTAVIO COLINA
Secretario de Hacienda

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: Kara P.
Fecha 30 JUL 2026
Hora: 8:39 a.m.

SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
Atn; DRA. ALEJANDRA CASTILLO BLANDÓN
Secretaria De Contratación
Alcaldía Municipal
Puerto Gaitán

REF. Proyecto BPIN 202500000031783 – Contrato de obra No. 1683 del 02 de diciembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META" (Proceso LP-SI-010-2025).

Asunto: REMISION DE DOCUMENTOS PARA PARGO DE LA PARCIAL No 2 DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito remitir a sus despachos la documentación radicada ante esta Secretaría, correspondiente al pago del Acta Parcial No. 2 del contrato de obra en referencia, con el fin de adelantar el trámite para su respectivo pago.

La presente acta parcial fue avalada y aprobada por la interventoría, y los documentos se entregan con el propósito de garantizar la continuidad y oportunidad en el proceso administrativo de pago.

Agradezco de antemano su atención y colaboración, quedando atenta a cualquier consulta o requerimiento adicional que se estime pertinente.

Atentamente,

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: Kara P.
Fecha 04 AGO 2026
Hora: 5:20 p.m.

ING. CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Revisó: Ing. Luz Adriana Hernández Cantor - Directora Técnica De Seguimiento De Proyectos De Infraestructura
Aprobó: Ing. Christian Julián Fernández Reyes - Secretario De Infraestructura

Escanea este código
Encuesta de Satisfacción

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / WhatsApp 3208632489 - 3117775374
E-mail: atencionalciudadano@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/alcaldiadepuertogaitan

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

PUERTO GAITAN – 28/07/2026

Señor(a)
ING. CHRISTIAN JULIAN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía municipal – Puerto Gaitán, Meta

Ref.: Contrato de Obra No. 1683 -2025, **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META".**

Asunto: Remisión de solicitud de cobro de Acta Parcial No. 02 del contrato de obra No.1683, avalado por interventoría

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y supervisión técnica, administrativa, financiera y contractual asignadas a esta Interventoría, se realizó la revisión integral de la documentación presentada por el contratista correspondiente a la solicitud de cobro parcial No. 2, asociada al Acta Parcial de Obra No. 02 del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, cuyo objeto es la "Construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta".

Como resultado de la verificación efectuada sobre las cantidades de obra ejecutadas, memorias de cálculo, registros de avance, soportes técnicos, ensayos de laboratorio, actas de obra y demás documentos contractuales, esta Interventoría evidenció que las actividades objeto de cobro corresponden al avance físico real ejecutado durante el período comprendido entre el 21 de mayo de 2026 y el 21 de julio de 2026, cumpliendo con las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y las condiciones contractuales establecidas.

En consecuencia, la Interventoría revisa, aprueba y avala la presente solicitud de pago por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($943.919.838,00), dejando constancia de que, con la presentación de este parcial, el proyecto alcanza un avance físico y financiero acumulado del 34,36% del valor total del contrato, equivalente a MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.479.633.437,00).

Cordialmente,

5:-0256
2:29 PM

R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
86.088.145 DE VILLAVICENCIO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
NIT: 902.014.419-5
Utinterpolicia2025@gmail.com

4 Contratos
Alexandra C

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-TC-DOC-001
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	CORRESPONDENCIA	

Recibido 2:40 pm Julian A.

Villavicencio, 21 de julio de 2026

Cons. 2026-027-ADM

Señores
DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
Puerto Gaitán, Meta
Utinterpolicia2025@gmail.com

Referencia: **CONTRATO 1683 DE 2025.**
Objeto: **"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META".**

Asunto: Solicitud de cobro parcial No. 2 del Contrato de Obra No. 1683 de 2025.

En calidad de representante legal de la contratista del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, cuyo objeto corresponde a la "Construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán - Meta", respetuosamente nos permitimos solicitar el trámite de cobro parcial No. 2, correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 02, por un valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($943.919.838,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2026 al 21 de julio de 2026.
Con la presentación de este parcial, el proyecto alcanza un avance físico y financiero acumulado del 34,36% del valor total del contrato, equivalente a MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.479.633.437,00).
Para los fines pertinentes, se adjuntan los soportes correspondientes acorde a la lista de chequeo y demás documentación correspondiente acorde a la naturaleza de esta solicitud, con el fin de continuar el trámite administrativo y de revisión ante la interventoría.

Cordialmente,

R/L INGRID MARYORI GARCIA FONSECA
1.121.837.768 de Villavicencio
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT. 902.011.453-2
Email: utingepoliciagaitan@gmail.com

	LISTA DE CHEQUEO PAGOS PARCIALES DE CONTRATOS OBRA PÚBLICA E INTERVENTORIA	
ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-22 | Version:05 | Fecha:10-01-2025	Puerto Gaitán

CONTRATO No. 1683 DE 2025 DIA 2 MES DICIEMBRE AÑO 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

PERIODO DEL INFORME DESDE DIA 21 MES MAYO AÑO: 2026

HASTA DIA 21 MES JULIO AÑO: 2026

GFI | SCO X

No	FORMATO	DOCUMENTO/TRAMITE	DOCUMENTOS					RESPONSABLE
			GFI	DAC	SI	NO	N/A	
1	INF-FR-22	Verificación de la lista de Chequeo	X	X	X			Interventor Supervisor designado
2	-	Copia Minuta de contrato, adicionales, modificatorias, prorrogas, etc.	X	N/A			X	Interventor Supervisor designado
3	-	Copia del certificado de registro presupuestal	X	N/A			X	Interventor Supervisor designado
4	-	Factura	X	X	X			Contratista
5	-	Certificación bancaria	X	X	X			Contratista
6	-	Rut Primera Cuenta	N/A	N/A			X	Contratista
7	INF-FR-74 INF-FR-80	Informe de parcial de obra / informe de parcial de interventoria	N/A	X	X			Contratista
8	SCO-FR-101	Certificación de cumplimiento	X	X	X			Interventoria
9	SCO-FR-109	Certificado Pago Seguridad Social (Supervision a interventoria)	N/A	N/A			X	Supervisor designado
10	INF-FR-55	Certificado Pago Seguridad Social (Interventoria a obra)	X	X	X			Interventoria
11		certificado del revisor fiscal (incluir soportes del revisor) en caso de no tener revisor fiscal debe estar firmado solo por el R/L	X	X	X			Interventoria
12		Verificación pago seguridad social integral Salud, pensión y riesgos Anexando dos fotocopia de las planillas legibles y comprobante de pago	X	X	X			Interventoria
13		Informe de interventoría / informe de supervisión	N/A	X	X			Supervisor designado
14	INF-FR-28	formato de pago parcial	X	X	X			Contratista
15	INF-FR-11/23	Formato de acta de Pago Parcial o final	N/A	X	X			Supervisor designado
16	INF-FR-20	Memorias de calculo	N/A	X	X			Contratista
17	INF-FR-83	Planos rotulados y firmados	N/A	N/A			X	Contratista
18	SCO-FR-100	Informe de inversion y buen manejo del anticipo (si aplica)	N/A	X	X			Contratista
19		CD (con toda la información en formato Word, PDF, dwg, mpp, en otros.)	N/A	x	X			Contratista

NOTA: Se advierte que la omisión de verificación real de la presente información constituye falsedad ideológica en documento que puede servir de prueba, tipificada en la Ley Penal como *delito; además de las sanciones administrativas y disciplinarias que conlleva*

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
R.L. /UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

5635

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

FACTURA

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

5636

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

CALLE 2 27 106

VILLAVICENCIO,META, Colombia

NIT 902011453 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764110227831 del 26/05/2026 al 26/05/2028
Habilita numeración de:
FEIP-1 al FEIP-10
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FEIP6

Fecha de emisión:	29/07/2026 10:34:47 AM
Fecha de validación DIAN:	29/07/2026 10:34:56 AM
Fecha de vencimiento:	28/08/2026
Plazo (Días):	30
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Cliente:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
	NIT 800079035 - 1
Dirección:	CALLE 10 10 60
Codigo Cliente	001
Teléfono:	3203750721
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Puerto Gaitán
Departamento:	Meta
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		ACTA PARCIAL N°2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1683 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	1,00	unidad	COP 943,919,838.00	COP 0.00			COP 943,919,838.00

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 943,919,838.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 943,919,838.00
Neto a pagar	COP 943,919,838.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 613408f33682ea27f8eed189229fec61175178d0f87437100bb474a648ba1563c693dbf54d2ff326c8b27288671a4d07

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICACIÓN BANCARIA

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN identificado(a) con NITPJ 9020114532 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH SuperdÃ-a Especial 360 No. 364935304 desde el 17 de diciembre de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de julio de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

INFORME DE PARCIAL

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025

"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"

INFORME PARCIAL No. 02

PERIODO:
21 DE MAYO DE 2026 AL 21 DE JULIO DE 2026

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL INGE POLICÍA GAITÁN
NIT. 902.011.453-2

PUERTO GAITÁN-META

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL INGE POLICÍA GAITÁN

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	RESIDENTE DE OBRA	
REVISÓ	GONZALO BECERRA MEJIA	DIRECTOR DE OBRA	
APROBÓ	INGRID MARYORI GARCIA FONSECA	R/L UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

INTERVENTORÍA UNIÓN TEMPORAL INTER POLICÍA 2025

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
REVISÓ	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PÉREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
APROBÓ	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO	R/L UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	

TABLA DE CONTENIDO

1. Información general del contrato de obra 5
   1.1. Generalidades del contrato de obra 5
   1.2. Localización del contrato de obra 5
   1.3. Descripción del proyecto 6
   1.4. Alcance del contrato de obra 7
   1.5. Población beneficiada 8
2. Información del contrato de obra 9
3. Información legal del contrato de obra 10
   3.1. Pólizas según Adjudicación de contrato de obra 10
   3.2. Pólizas según Acta de Inicio 11
4. Información financiera del contrato 11
   4.1. Plan de inversión del anticipo 11
   4.2. Información de avance financiero del proyecto 13
   4.3. Balance financiero del proyecto 14
   4.4. Relación de certificados de disponibilidad presupuestal - CDP 14
   4.5. Relación de registros presupuestales - RP 15
   4.6. Órdenes de pago efectuadas 16
5. Información técnica del contrato 16
   5.1. Descripción de las actividades ejecutadas 16
   5.2. Reportes actividades cobradas y por cobrar 20
   5.3. Cuadro de avance acumulado mes a mes 48
   5.4. Gráfico de avance de obra 49
6. Información administrativa del contrato 51
   6.1. Relación personal de obra (profesional, técnico, operativo) 51
   6.2. Pagos de seguridad social y parafiscales 53
7. Cuadro resumen ensayos de laboratorio 53
8. Control de maquinaria y equipos 53
9. Conclusiones 53
10. Anexos 55

TABLAS

Tabla 1 . Localización contrato de obra 5
Tabla 2. Resumen alcance del contrato 8

Tabla 3. Información del contrato de obra 10
Tabla 4. Póliza de cumplimiento según contrato de obra 10
Tabla 5. Póliza de responsabilidad civil según contrato de obra 10
Tabla 6. Póliza de cumplimiento según acta de inicio 11
Tabla 7. Póliza de responsabilidad civil según acta de inicio 11
Tabla 8. Plan de inversión del anticipo 1 13
Tabla 9. Plan de inversión del anticipo 2 13
Tabla 10. Información avance financiero 14
Tabla 11. Balance financiero 14
Tabla 12. CDP 2025 14
Tabla 13. CDP 2026 15
Tabla 14. RP 2025 15
Tabla 15. RP 2026 16
Tabla 16. RP DE RESEERVA PRESUPUESTAL 16
Tabla 17. Órdenes de pago efectuadas 16
Tabla 18. Actividades ejecutadas 19
Tabla 19. Ejecución acumulada del proyecto 47
Tabla 20. Avance acumulado mes a mes 48
Tabla 21. % programado vs. % ejecutado 48
Tabla 22. Relación personal mayo 51
Tabla 23. Relación personal junio 52
Tabla 24. Maquinaria mayo 53
Tabla 25. Maquinaria junio 53

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general del municipio de Puerto Gaitán. 6
Ilustración 2. Localización del proyecto, imagen tomada de Google Earth 6

GRÁFICAS

Gráfica 1. Avance físico 48
Gráfica 2. Avance en moneda 49
Gráfica 3. Avance en porcentaje 50

1. Información general del contrato de obra

1.1. Generalidades del contrato de obra

Considerando que el municipio de Puerto Gaitán – Meta, en su plan de desarrollo "JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027", ha viabilizado, priorizado y aprobado proyectos de inversión entre los cuales se encuentra incluido el programa 4501 "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA". Con la finalidad de cumplir con la meta PDM0318 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MANTENER O MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO", fue adjudicado mediante la licitación pública LP-SI-010-2025, que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", con código BPIN 202500000031783. Este proyecto se encuentra suscrito al contrato de obra pública 1683 del día tres (03) de diciembre de 2025, siendo perfeccionado con el acta de inicio de fecha el día dieciocho (18) de diciembre de 2025.

1.2. Localización del contrato de obra

El proyecto objeto del contrato 1683 de 2025 se encuentra localizado en el municipio de Puerto Gaitán-Meta. En la siguiente tabla se presenta un resumen de la ubicación del municipio.

Puerto Gaitán Meta	
País:	Colombia
Región:	Orinoquía
Departamento:	Meta
Ubicación:	**Lat. N. 3° 05' y 4° 08' Log. O. 71° 05' y 72° 30'**
Altitud:	149 msnm
Superficie:	17.536 km²
Temperatura media:	27 °C
Fundación:	1932
Población:	46.689 habitantes

Tabla 1 . Localización contrato de obra



Ilustración 1. Localización general del municipio de Puerto Gaitán.

El proyecto se localiza en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la Estación de Policía, ubicada en la Carrera 10 N.° 17-31, barrio Alto Manacacías. Este sector corresponde a un área estratégica del municipio, donde se concentra una parte significativa de la actividad administrativa, comercial y social del territorio.

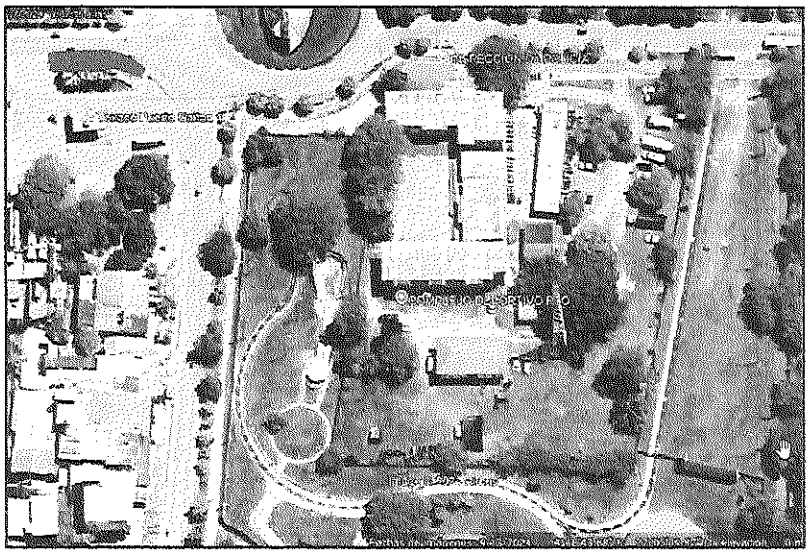


Ilustración 2. Localización del proyecto, imagen tomada de Google Earth.

1.3. Descripción del proyecto

El proyecto tiene como objetivo la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin

de superar las deficiencias físicas y funcionales que actualmente limitan el cumplimiento de las funciones misionales de la Policía Nacional. La intervención se fundamenta en un diagnóstico técnico que evidencia deterioro estructural, insuficiencia de espacios, fallas en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal.

Puerto Gaitán es un municipio de alta relevancia estratégica debido a su crecimiento demográfico, desarrollo agroindustrial y ubicación cercana a corredores de movilidad interdepartamental, lo cual ha incrementado las exigencias en materia de seguridad y control territorial. En este contexto, el proyecto busca dotar a la institución de una infraestructura moderna, funcional y acorde con las dinámicas urbanas y sociales del territorio.

La propuesta contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la rehabilitación del edificio "Casa Blanca" destinado a vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos, fortalecer la seguridad física de la estación y optimizar la capacidad operativa institucional.

El proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia institucional y responsabilidad fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia policial y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán.

1.4. Alcance del contrato de obra

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio, mediante la construcción de una edificación de dos (2) niveles destinada a nuevos alojamientos con capacidad para albergar hasta ciento doce (112) personas, la rehabilitación integral del edificio denominado Casa Blanca, con capacidad para cuatro (4) grupos familiares, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio, y la demolición y posterior construcción de un nuevo cerramiento perimetral, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y control del recinto policial.

A continuación, se muestra el alcance del contrato el cual consta de 23 capítulos enfocados a satisfacción del objeto contratado.

CAP.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS	
1	PRELIMINARES	$ 4.198.624,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 80.230.348,00
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 417.501.889,00
4	RED DE PRESION	$ 10.903.310,00
5	RED SANITARIA	$ 34.354.320,00
6	RED PLUVIAL	$ 11.900.456,00
7	RED CONTRA INCENDIOS	$ 1.014.054,00
8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 141.083.078,00
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO	$ 13.938.854,00
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 565.737.574,00
11	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 46.128.228,00
12	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 378.485.102,00
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	
13	DEMOLICION Y DESMONTE	$ 41.757.891,00
14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 37.303.929,00
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 223.371.272,00
16	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 144.145.763,00
17	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 8.154.912,00
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA	
18	PRELIMINARES	$ 714.444,00
19	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS	$ 57.497.172,00
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO	
20	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	$ 34.412.024,00
21	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 814.593.767,00
	OTROS	
22	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 75.936.264,00
23	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 119.989.209,00
VALOR TOTAL		$ 4.306.277.668,00

Tabla 2. Resumen alcance del contrato

1.5. Población beneficiada

El proyecto beneficia de manera directa al personal de la Policía Nacional que presta servicio en el municipio de Puerto Gaitán, al proporcionar una infraestructura moderna,

funcional y segura que mejora las condiciones de alojamiento, operación y bienestar laboral. De manera indirecta, la iniciativa impacta positivamente a la comunidad del municipio, al fortalecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al orden público y al desarrollo social del territorio.

2. Información del contrato de obra

Número del proceso:	**LP-SI-010-2025**
Tipo de contrato:	Contrato de Obra
Número del contrato:	1683 del 2025
Fecha del contrato:	03 de diciembre de 2025
Objeto:	Construcción, adecuación y mejoramiento de la estación de policía del municipio de puerto Gaitán - meta
Contratista:	Union Temporal Inge Policía Gaitan
Nit:	902.011.453-2
Representante legal:	Ingrid Maryori García Fonseca C.C. No. 1.121.837.768 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	utingepoliciagaitan@gmail.com
Contratante:	Municipio de Puerto Gaitán Alcalde municipal LUIS CÉSAR PÉREZ GAITÁN C.C. No. 1.122.120.037 de ACACIAS - META
Interventoría:	Unión Temporal Inter policía 2025
Nit:	902.014.419-5
Representante legal:	Diego Armando Cardoso Guerrero C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	Utinterpolicia2025@gmail.com
Valor:	Cuatro mil trescientos seis millones doscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte ($4.306.277.668,00)
Plazo inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Supervisor:	Christian Julián Fernández Reyes CC. 1.124.823.789 de Puerto Gaitan - Meta Secretario de infraestructura
Fecha del acta de inicio:	18 de diciembre de 2025

Fecha de terminación:	17 de agosto de 2026

Tabla 3. Información del contrato de obra

3. Información legal del contrato de obra

3.1. Pólizas según Adjudicación de contrato de obra

DATO	DESCRIPCIÓN		
Póliza de cumplimiento No	30-44-101067871		
Anexo No.	0		
Fecha de expedición	09 de diciembre de 2025		
Fecha de aprobación	23 de diciembre de 2025		
Compañía de seguros	Seguros del estado S.A.		
ACTUALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO			
Amparos	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	02/12/2025	02/12/2026	$ 430.627.766,80
Buen manejo del anticipo	02/12/2025	02/12/2026	$ 2.153.138.834,00
Salarios y prestaciones sociales	02/12/2025	02/08/2029	$ 215.313.883,40
Estabilidad y calidad	02/12/2025	02/12/2030	$ 430.627.766,80

Tabla 4. Póliza de cumplimiento según contrato de obra

DATO	DESCRIPCIÓN		
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No	30-40-101025675		
Anexo No.	0		
Fecha de expedición	09 de diciembre de 2025		
Fecha de aprobación	23 de diciembre de 2025		
Compañía de seguros	Seguros del estado S.A.		
ACTUALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO			
Amparos	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Predios labores y operaciones	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Daño emergente y lucro cesante	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Contratistas y subcontratistas	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Responsabilidad civil patronal	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Vehículos propios y no propios	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00

Tabla 5. Póliza de responsabilidad civil según contrato de obra

3.2. Pólizas según Acta de Inicio

DATO	DESCRIPCIÓN		
Póliza de cumplimiento No	30-44-101067871		
Anexo No.	1 y 2		
Fecha de expedición	23 de diciembre de 2025		
Fecha de aprobación	23 de diciembre de 2025		
Compañía de seguros	Seguros del estado S.A.		
ACTUALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			
Amparos	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	18/12/2025	18/12/2026	$ 430.627.766,80
Buen manejo del anticipo	18/12/2025	18/12/2026	$ 2.153.138.834,00
Salarios y prestaciones sociales	18/12/2025	18/08/2029	$ 215.313.883,40
Estabilidad y calidad	18/12/2025	18/12/2030	$ 430.627.766,80

Tabla 6. Póliza de cumplimiento según acta de inicio

DATO	DESCRIPCIÓN		
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No	30-40-101025675		
Anexo No.	1 y 2		
Fecha de expedición	23 de diciembre de 2025		
Fecha de aprobación	23 de diciembre de 2025		
Compañía de seguros	Seguros del estado S.A.		
ACTUALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			
Amparos	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Predios labores y operaciones	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Daño emergente y lucro cesante	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Contratistas y subcontratistas	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Responsabilidad civil patronal	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Vehículos propios y no propios	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00

Tabla 7. Póliza de responsabilidad civil según acta de inicio

4. Información financiera del contrato

4.1. Plan de inversión del anticipo

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla un anticipo equivalente al 50% del valor total del contrato. Inicialmente, el contrato contaba con el Registro Presupuestal (RP) correspondiente a la vigencia 2025. No obstante, al no realizarse el cobro del valor del anticipo durante dicha vigencia por trámites y temas administrativos ajenos al contratista, se hizo necesario adelantar el trámite de reserva presupuestal. Este proceso depende exclusivamente de los trámites administrativos del presupuesto ordinario y del cambio de vigencia, y no está supeditado a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.

En razón de lo anterior, en una primera etapa se gestionó la solicitud de desembolso correspondiente al 35% del valor total del contrato, equivalente a $1.507.197.183,80, con cargo al Registro Presupuestal original de la vigencia 2026 (No. **RES.2026000004**). Por concepto de FONSET, la entidad aplica una retención del 5% sobre este valor, resultando un valor neto de anticipo de $1.431.837.324,61, trámite que fue debidamente radicado en el mes de enero.

Posteriormente, una vez se surtió el trámite de la reserva presupuestal, se realizó la solicitud No. 2 del anticipo correspondiente al 15% restante, equivalente a $645.941.650,20. Por concepto de FONSET, se aplica una retención del 5%, resultando un valor neto de $613.644.567,69. Esta solicitud fue tramitada con cargo al Registro Presupuestal de la reserva presupuestal con vigencia actualizada a 2026. Cabe precisar que este RP fue expedido inicialmente el 18 de diciembre de 2025 y, debido a los trámites administrativos mencionados, la entidad lo renovó y expidió el 1 de enero de 2026 con vigencia 2026, manteniendo el mismo número: No. **RES.2026004223**.

Para efectos de total transparencia, trazabilidad y en atención a las observaciones de control, se relacionan los tres (3) Registros Presupuestales que amparan la gestión del anticipo contractual:

1. **RP original de la vigencia 2025**: Base para la constitución de la reserva presupuestal (expedido inicialmente el 18 de diciembre de 2025).
2. **RP de la reserva presupuestal con vigencia actualizada a 2026**: No. **RES.2026004223** (expedido el 1 de enero de 2026, con cargo al cual se tramitó el 15% restante del anticipo).
3. **RP original de la vigencia 2026**: No. **RES.2026000004** (con cargo al cual se tramitó el 35% inicial del anticipo).

Durante el mes de marzo de 2026, se realizó el desembolso del anticipo No. 2, con lo cual se completa el giro total del anticipo contractual.

En cumplimiento con las condiciones contractuales, fue suscrito con la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos P.A. ANTICIPO UNIÓN TEMPORAL INGE POLICÍA GAITÁN, con el objeto de administrar y girar los recursos del anticipo del contrato 1683 de 2025. Igualmente, fue registrada la cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 482800059677, correspondiente al fideicomiso en el cual serán abonados los recursos objeto del contrato fiduciario.

A la fecha de corte del presente informe, el informe del plan de inversión del anticipo se encuentra en curso.

A continuación, se presenta la tabla del plan de inversión del anticipo No. 01 correspondiente al 35% y del anticipo No. 02 correspondiente al 15%, teniendo en cuenta que la totalidad del anticipo equivale al 50% del valor total del contrato, es decir, $2.153.138.834. Por concepto de FONSET, la entidad aplica una retención del 5%, resultando un valor neto total del anticipo de $2.045.481.892,30.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	PLAZO DE EJECUCION (MESES Y/O DIAS)
1	MATERIALES	$ 887.739.141,26	62,00%	1 MES
2	MANO DE OBRA	$ 229.093.971,94	16,00%	1 MES
3	ALQUILER/COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 114.546.985,97	8,00%	1 MES
4	TRANSPORTE	$ 200.457.225,44	14,00%	1 MES
TOTAL		$ 1.431.837.324,61	100,00%	

Tabla 8. Plan de inversión del anticipo 1

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	PLAZO DE EJECUCION (MESES Y/O DIAS)
1	MATERIALES	$ 380.459.631,97	62,00%	1 MES
2	MANO DE OBRA	$ 98.183.130,83	16,00%	1 MES
3	ALQUILER/COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 49.091.565,41	8,00%	1 MES
4	TRANSPORTE	$ 85.910.239,48	14,00%	1 MES
TOTAL		$ 613.644.567,69	100,00%	

Tabla 9. Plan de inversión del anticipo 2

4.2. Información de avance financiero del proyecto

PERIODO		VALOR PROGRAMADO		VALOR EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$28.037.949	$28.037.949	$22.553.339	$22.553.339
2	01 AL 31 DE ENERO DE 2026	$77.425.939	$105.463.888	$34.577.032	$57.130.370
3	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$191.735.345	$297.199.233	$121.980.573	$179.110.943

4	01 AL 31 DE MARZO DE 2026	$187.737.987	$484.937.220	$104.792.889	$283.903.832
5	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	$221.627.087	$706.564.307	$95.934.936	$379.838.768
6	01 AL 31 DE MAYO DE 2026	$331.938.505	$1.038.502.812	$189.309.686	$569.148.454
7	01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	$822.518.250,00	$1.861.021.062,00	$111.043.842,97	$680.192.297,05
8	01 AL 31 DE JULIO DE 2026	$1.118.293.153,00	$2.979.314.215,00	$799.441.140,00	$1.479.633.437,05

Tabla 10. Información avance financiero

4.3. Balance financiero del proyecto

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$ 4.306.277.668,00
VALOR PROYECTO ACTUALIZADO	$ 4.306.277.668,00
VALOR ANTICIPO No. 01 – 35%	$1.507.197.183,80
VALOR ANTICIPO No. 02 – 15%	$645.941650,20
VALOR ANTICIPO TOTAL (50%)	$ 2.153.138.834,00
VALOR PARCIAL No. 01	$535.713.599,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$267.856.799,50
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$1.885.282.034,50

Tabla 11. Balance financiero

4.4. Relación de certificados de disponibilidad presupuestal - CDP

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025	
CDP	DIS.2025002848 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025
RUBRO	FDS-1-4514501-202500000031783-4501040
FUENTE	1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LIGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA
CCPET	2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CPC DAN	53129 – OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
VALOR DEL CDP	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($620.406.812,00)

Tabla 12. CDP 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026	
CDP	DIS.2026000007 DEL 02 DE ENERO DE 2026
RUBRO	FDS-1-4514501-202500000031783-4501040
FUENTE	1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LIGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA
CCPET	2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CPC DAN	53129 – OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
VALOR PRESUPUESTO	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($ 3.685.870.856,00)

Tabla 13. CDP 2026

4.5. Relación de registros presupuestales - RP

REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025	
NÚMERO	RES.2025004223
FECHA DEL REGISTRO	18/12/2025
BENEFICIARIO	902.011.453 – UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEPTO DEL RECURSO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMEINTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META
FUENTE O RECURSO	1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($ 620.406.812,00)

Tabla 14. RP 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026	
NÚMERO	RES.2026000004
FECHA DEL REGISTRO	02/01/2026
BENEFICIARIO	902.011.453 – UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEPTO DEL RECURSO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMEINTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META
FUENTE O RECURSO	1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

VALOR TOTAL DEL REGISTRO	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($ 3.685.870.856,00)

Tabla 15. RP 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL	
NÚMERO	RES.2025004223
FECHA DEL REGISTRO	01/01/2026
BENEFICIARIO	902.011.453 – UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEPTO DEL RECURSO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMEINTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META
FUENTE O RECURSO	1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($ 620.406.812,00)

Tabla 16. RP DE RESEERVA PRESUPUESTAL

4.6. Órdenes de pago efectuadas

A la fecha de corte del presente informe, se cuenta con órdenes de pago efectuadas, las cuales se relacionan en el cuadro a continuación.

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No.	VALOR NETO	FECHA
ANTICIPO No. 01 CTO 1683/2025 – 35%	EGR.2026010031	$1.431.837.324,61	21/01/2026
ANTICIPO No. 02 CTO 1683/2025 – 15%	EGR.2026030507	$24.257.838,20	16/03/2026
	EGR.2026030508	$589.386.812,00	16/03/2026

Tabla 17. Órdenes de pago efectuadas

5. Información técnica del contrato

5.1. Descripción de las actividades ejecutadas

En el marco del proyecto "Construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta", durante el periodo comprendido entre el

21 de mayo de 2026 al 21 de julio de 2026, para el presente informe se resumen las actividades ejecutadas a cobrar.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VA. UNIT	VA. TOTAL
2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	m3	166,81	$ 36.161,00	$ 6.032.016,00
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	1084,27	$ 1.718,00	$ 1.862.776,00
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	136,01	$ 69.801,00	$ 9.493.634,00
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	15559,55	$ 1.718,00	$ 26.731.307,00
3.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,35	$ 1.187.618,00	$ 415.666,00
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	4,90	$ 1.581.877,00	$ 7.751.198,00
3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	16,69	$ 1.538.398,00	$ 25.675.863,00
3.7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	27,24	$ 1.383.418,00	$ 37.684.306,00
3.8	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	3,64	$ 708.833,00	$ 2.580.152,00
3.9	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	kg	34,24	$ 10.015,00	$ 342.914,00
3.10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	3395,33	$ 9.265,00	$ 31.457.733,00
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 22 (NO INCLUYE CONCRETO)	m2	264,00	$ 103.015,00	$ 27.195.960,00
4.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	16,09	$ 12.699,00	$ 204.327,00
4.2	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	77,59	$ 17.026,00	$ 1.321.047,00
4.3	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	19,99	$ 18.834,00	$ 376.492,00
4.4	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	34,94	$ 26.867,00	$ 938.733,00
4.5	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	80,20	$ 29.502,00	$ 2.366.060,00
4.7	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	81,00	$ 3.772,00	$ 305.532,00

4.8	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	9,00	$ 10.567,00	$ 95.103,00
4.10	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	74,00	$ 56.864,00	$ 4.207.936,00
4.11	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 105.587,00	$ 211.174,00
4.12	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 49.274,00	$ 98.548,00
4.13	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 72.748,00	$ 145.496,00
5.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	39,30	$ 32.268,00	$ 1.268.132,00
5.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	60,00	$ 63.421,00	$ 3.805.260,00
5.5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	14,00	$ 94.871,00	$ 1.328.194,00
5.6	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 91.113,00	$ 728.904,00
5.7	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	u	2,00	$ 96.052,00	$ 192.104,00
5.8	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 75.022,00	$ 600.176,00
10.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	283,19	$ 63.676,00	$ 18.032.406,00
10.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	426,94	$ 29.811,00	$ 12.727.508,00
13.1	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m2	119,70	$ 15.712,00	$ 1.880.726,00
13.2	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	8,00	$ 87.783,00	$ 702.264,00
13.3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	13,00	$ 19.175,00	$ 249.275,00
13.4	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	2,00	$ 40.819,00	$ 81.638,00
13.5	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	2,00	$ 32.654,00	$ 65.308,00
13.6	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	2,00	$ 16.325,00	$ 32.650,00
13.7	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	130,40	$ 6.386,00	$ 832.734,00
13.8	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	159,61	$ 9.793,00	$ 1.563.061,00
13.10	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	452,15	$ 1.718,00	$ 776.794,00

15.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	92,04	$ 63.676,00	$ 5.860.739,00
15.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	173,88	$ 29.811,00	$ 5.183.537,00
15.15	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	m2	159,61	$ 41.912,00	$ 6.689.574,00
21.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.90MM), (H=2,5m), SEPARACION DE EJES A 150MM, (INCLUYE: TAPA PARA TUBERIA, YEE SOPORTE DE 0.5M, ANCLAJE, CONCERTINA)	m	207,36	$ 2.107.712,00	$ 437.055.160,00

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	$687.150.118,00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$233.631.040,12
ADMINISTRACIÓN 29%	$199.273.534,22
IMPREVISTOS 1%	$6.871.501,18
UTILIDAD 4%	$27.486.004,72
VALOR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$11.306.065,97
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$11.832.614,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$471.959.919,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	$943.919.838,00
VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO	$943.919.838,00

Tabla 18. Actividades ejecutadas

5.2. Reportes actividades cobradas y por cobrar

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		OBRA ACUMULADA		OBRA POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS													
1	**PRELIMINARES**												
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	358,00	$ 3.568,00	$ 1.277.344,00	358,00	$ 1.277.344,00		$ 0,00	358,00	$ 1.277.344,00	0,00	$ 0,00
1.2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	m2	358,00	$ 8.160,00	$ 2.921.280,00	358,00	$ 2.921.280,00		$ 0,00	358,00	$ 2.921.280,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal:	**$ 4.198.624,00**		**$ 4.198.624,00**		**$ 0,00**		**$ 4.198.624,00**		**$ 0,00**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	m3	322,81	$ 36.161,00	$ 11.673.132,00	156,00	$ 5.641.116,00	166,81	$ 6.032.016,00	322,81	$ 11.673.132,00	0,00	$ 0,00
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	2098,27	$ 1.718,00	$ 3.604.828,00	1014,00	$ 1.742.052,00	1084,27	$ 1.862.776,00	2098,27	$ 3.604.828,00	0,00	$ 0,00
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	243,87	$ 69.801,00	$ 17.022.370,00	107,86	$ 7.528.736,00	136,01	$ 9.493.634,00	243,87	$ 17.022.370,00	0,00	$ 0,00

2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	27898,73	$ 1.718,00	$ 47.930.018,00	12339,18	$ 21.198.711,00	15559,55	$ 26.731.307,00	27898,73	$ 47.930.018,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal:	**$ 80.230.348,00**		**$ 36.110.615,00**		**$ 44.119.733,00**		**$ 80.230.348,00**		**$ 0,00**
3	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**												
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	3,81	$ 765.474,00	$ 2.916.456,00	3,75	$ 2.870.528,00		$ 0,00	3,75	$ 2.870.528,00	0,06	$ 45.928,00
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	9,06	$ 1.108.301,00	$ 10.041.207,00	9,06	$ 10.041.207,00		$ 0,00	9,06	$ 10.041.207,00	0,00	$ 0,00
3.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	15,18	$ 1.187.618,00	$ 18.028.041,00	14,83	$ 17.612.375,00	0,35	$ 415.666,00	15,18	$ 18.028.041,00	0,00	$ 0,00
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	11,06	$ 1.581.877,00	$ 17.495.560,00	6,16	$ 9.744.362,00	4,90	$ 7.751.198,00	11,06	$ 17.495.560,00	0,00	$ 0,00
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	39,72	$ 1.538.398,00	$ 61.105.169,00	23,00	$ 35.383.154,00	16,69	$ 25.675.863,00	39,69	$ 61.059.017,00	0,03	$ 46.152,00
3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	27,10	$ 1.034.931,00	$ 28.046.630,00	27,10	$ 28.046.630,00		$ 0,00	27,10	$ 28.046.630,00	0,00	$ 0,00
3.7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN	m3	55,69	$ 1.383.418,00	$ 77.042.548,00	28,41	$ 39.302.905,00	27,24	$ 37.684.307,00	55,65	$ 76.987.212,00	0,04	$ 55.337,00

	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN												
3.8	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	3,79	$ 708.833,00	$ 2.686.477,00	0,15	$ 106.325,00	3,64	$ 2.580.152,00	3,79	$ 2.686.477,00	0,00	$ 0,00
3.9	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	kg	897,04	$ 10.015,00	$ 8.983.856,00	861,13	$ 8.624.217,00	34,24	$ 342.914,00	895,37	$ 8.967.131,00	1,67	$ 16.725,00
3.10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	10959,24	$ 9.265,00	$ 101.537.359,00	7563,91	$ 70.079.626,00	3395,33	$ 31.457.733,00	10959,24	$ 101.537.359,00	0,00	$ 0,00
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 22 (NO INCLUYE CONCRETO)	m2	556,93	$ 103.015,00	$ 57.372.144,00	286,02	$ 29.464.350,00	264,00	$ 27.195.960,00	550,02	$ 56.660.310,00	6,91	$ 711.834,00
3.12	IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE PLACA CUBIERTA CON PRODUCTO SIKAFILL-12 POWER O SIMILAR	m2	271,04	$ 118.973,00	$ 32.246.442,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	271,04	$ 32.246.442,00
				Subtotal:	**$ 417.501.889,00**		**$ 251.275.679,00**		**$ 133.103.793,00**		**$ 384.379.472,00**		**$ 33.122.418,00**
4	**RED DE PRESION**												

4.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	40,09	$ 12.699,00	$ 509.103,00	24,00	$ 304.776,00	16,09	$ 204.327,00	40,09	$ 509.103,00	0,00	$ 0,00
4.2	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	77,59	$ 17.026,00	$ 1.321.047,00		$ 0,00	77,59	$ 1.321.047,00	77,59	$ 1.321.047,00	0,00	$ 0,00
4.3	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	25,99	$ 18.834,00	$ 489.496,00	6,00	$ 113.004,00	19,99	$ 376.492,00	25,99	$ 489.496,00	0,00	$ 0,00
4.4	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	34,94	$ 26.867,00	$ 938.733,00		$ 0,00	34,94	$ 938.733,00	34,94	$ 938.733,00	0,00	$ 0,00
4.5	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	80,20	$ 29.502,00	$ 2.366.060,00		$ 0,00	80,20	$ 2.366.060,00	80,20	$ 2.366.060,00	0,00	$ 0,00
4.6	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	20,00	$ 3.296,00	$ 65.920,00	20,00	$ 65.920,00		$ 0,00	20,00	$ 65.920,00	0,00	$ 0,00
4.7	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	81,00	$ 3.772,00	$ 305.532,00		$ 0,00	81,00	$ 305.532,00	81,00	$ 305.532,00	0,00	$ 0,00
4.8	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	9,00	$ 10.567,00	$ 95.103,00		$ 0,00	9,00	$ 95.103,00	9,00	$ 95.103,00	0,00	$ 0,00
4.9	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	13,00	$ 11.474,00	$ 149.162,00	13,00	$ 149.162,00		$ 0,00	13,00	$ 149.162,00	0,00	$ 0,00
4.10	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	74,00	$ 56.864,00	$ 4.207.936,00		$ 0,00	74,00	$ 4.207.936,00	74,00	$ 4.207.936,00	0,00	$ 0,00
4.11	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 105.587,00	$ 211.174,00		$ 0,00	2,00	$ 211.174,00	2,00	$ 211.174,00	0,00	$ 0,00
4.12	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 49.274,00	$ 98.548,00		$ 0,00	2,00	$ 98.548,00	2,00	$ 98.548,00	0,00	$ 0,00

4.13	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 72.748,00	$ 145.496,00		$ 0,00	2,00	$ 145.496,00	2,00	$ 145.496,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal:	**$ 10.903.310,00**		**$ 632.862,00**		**$ 10.270.448,00**		**$ 10.903.310,00**		**$ 0,00**
5	**RED SANITARIA**												
5.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	87,30	$ 32.268,00	$ 2.816.996,00	48,00	$ 1.548.864,00	39,30	$ 1.268.132,00	87,30	$ 2.816.996,00	0,00	$ 0,00
5.2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	10,71	$ 47.720,00	$ 511.081,00	10,71	$ 511.081,00		$ 0,00	10,71	$ 511.081,00	0,00	$ 0,00
5.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	162,45	$ 63.421,00	$ 10.302.741,00	60,00	$ 3.805.260,00	60,00	$ 3.805.260,00	120,00	$ 7.610.520,00	42,45	$ 2.692.221,00
5.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	u	3,00	$ 1.117.232,00	$ 3.351.696,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 3.351.696,00
5.5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	30,00	$ 94.871,00	$ 2.846.130,00	14,00	$ 1.328.194,00	14,00	$ 1.328.194,00	28,00	$ 2.656.388,00	2,00	$ 189.742,00
5.6	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	18,00	$ 91.113,00	$ 1.640.034,00	8,00	$ 728.904,00	8,00	$ 728.904,00	16,00	$ 1.457.808,00	2,00	$ 182.226,00
5.7	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	u	4,00	$ 96.052,00	$ 384.208,00	2,00	$ 192.104,00	2,00	$ 192.104,00	4,00	$ 384.208,00	0,00	$ 0,00
5.8	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	18,00	$ 75.022,00	$ 1.350.396,00	8,00	$ 600.176,00	8,00	$ 600.176,00	16,00	$ 1.200.352,00	2,00	$ 150.044,00

5.9	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 588.950,00	$ 1.177.900,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.177.900,00
5.10	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	215,00	$ 12.085,00	$ 2.598.275,00	136,00	$ 1.643.560,00		$ 0,00	136,00	$ 1.643.560,00	79,00	$ 954.715,00
5.11	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	38,00	$ 21.288,00	$ 808.944,00	38,00	$ 808.944,00		$ 0,00	38,00	$ 808.944,00	0,00	$ 0,00
5.12	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	86,00	$ 36.492,00	$ 3.138.312,00	86,00	$ 3.138.312,00		$ 0,00	86,00	$ 3.138.312,00	0,00	$ 0,00
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	u	10,00	$ 226.831,00	$ 2.268.310,00	10,00	$ 2.268.310,00		$ 0,00	10,00	$ 2.268.310,00	0,00	$ 0,00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	u	8,00	$ 115.731,00	$ 925.848,00	8,00	$ 925.848,00		$ 0,00	8,00	$ 925.848,00	0,00	$ 0,00
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	u	1,00	$ 233.449,00	$ 233.449,00	1,00	$ 233.449,00		$ 0,00	1,00	$ 233.449,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal:	**$ 34.354.320,00**		**$ 17.733.006,00**		**$ 7.922.770,00**		**$ 25.655.776,00**		**$ 8.698.544,00**
6	**RED PLUVIAL**												
6.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	71,50	$ 30.425,00	$ 2.175.388,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	71,50	$ 2.175.388,00
6.2	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 36.492,00	$ 182.460,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 182.460,00
6.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	80,00	$ 63.421,00	$ 5.073.680,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	80,00	$ 5.073.680,00

3951

6.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	u	4,00	$ 1.117.232,00	$ 4.468.928,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.468.928,00
				Subtotal:	**$ 11.900.456,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 11.900.456,00**
7	**RED CONTRA INCENDIOS**												
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR TIPO ABC. CAPACIDAD 10LB . INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	u	6,00	$ 169.009,00	$ 1.014.054,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.014.054,00
				Subtotal:	**$ 1.014.054,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.014.054,00**
8	**RED ELECTRICA - BAJA TENSION**												
8.1	PUESTA A TIERRA EN VARILLA GALVANIZADA 5/8" X 2.40 M PARA RED COMPACTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 309.456,00	$ 1.547.280,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.547.280,00
8.2	ALAMBRE CU AISLADO No 8	m	16,00	$ 11.342,00	$ 181.472,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 181.472,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18W	u	92,00	$ 181.525,00	$ 16.700.300,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,00	$ 16.700.300,00
8.4	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER	u	1,00	$ 1.152.705,00	$ 1.152.705,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.152.705,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN												
8.5	ACOMETIDA GENERAL BIFASICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 1.970.365,00	$ 1.970.365,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.970.365,00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 40A-10KA	u	1,00	$ 69.753,00	$ 69.753,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 69.753,00
8.7	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	64,00	$ 134.464,00	$ 8.605.696,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	64,00	$ 8.605.696,00
8.8	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 227.107,00	$ 1.816.856,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.816.856,00
8.9	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	92,00	$ 271.828,00	$ 25.008.176,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,00	$ 25.008.176,00
8.10	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 199.056,00	$ 1.592.448,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.592.448,00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 5.566.253,00	$ 44.530.024,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 44.530.024,00

8.12	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	u	5,00	$ 1.251.752,00	$ 6.258.760,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 6.258.760,00
8.13	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	m	110,00	$ 29.626,00	$ 3.258.860,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	110,00	$ 3.258.860,00
8.14	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 99.185,00	$ 495.925,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 495.925,00
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 3/4 "	m	380,00	$ 10.458,00	$ 3.974.040,00	150,00	$ 1.568.700,00		$ 0,00	150,00	$ 1.568.700,00	230,00	$ 2.405.340,00
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 1 "	m	16,00	$ 12.235,00	$ 195.760,00	16,00	$ 195.760,00		$ 0,00	16,00	$ 195.760,00	0,00	$ 0,00
8.17	ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO	m	900,00	$ 6.074,00	$ 5.466.600,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	900,00	$ 5.466.600,00
8.18	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,5W	u	86,00	$ 212.303,00	$ 18.258.058,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	86,00	$ 18.258.058,00
				Subtotal:	**$ 141.083.078,00**		**$ 1.764.460,00**		**$ 0,00**		**$ 1.764.460,00**		**$ 139.318.618,00**
9	**RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO**												
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	u	2,00	$ 3.457.978,00	$ 6.915.956,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 6.915.956,00
9.2	SUMINISTRO DE INSTALACION DE ANILLO	m	113,00	$ 16.570,00	$ 1.872.410,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	113,00	$ 1.872.410,00

	PERIMETRAL EN ALUMINIO 8mm												
9.3	SUMINISTRO DE INSTALACION PUNTA CAPTORA h=1,00m	u	10,00	$ 451.270,00	$ 4.512.700,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 4.512.700,00
9.4	SUMINISTRO DE INSTALACION CAJA DE EMPALME BIMETALICO	u	4,00	$ 159.447,00	$ 637.788,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 637.788,00
				Subtotal:	**$ 13.938.854,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 13.938.854,00**
10	**MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS**												
10.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	570,32	$ 63.676,00	$ 36.315.696,00		$ 0,00	283,19	$ 18.032.406,00	283,19	$ 18.032.406,00	287,13	$ 18.283.290,00
10.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	426,67	$ 41.730,00	$ 17.804.939,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	426,67	$ 17.804.939,00
10.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	977,12	$ 29.811,00	$ 29.128.924,00		$ 0,00	426,94	$ 12.727.508,00	426,94	$ 12.727.508,00	550,18	$ 16.401.416,00
10.4	ESTUCO PLASTICO	m2	788,98	$ 19.232,00	$ 15.173.663,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	788,98	$ 15.173.663,00
10.5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	426,67	$ 16.021,00	$ 6.835.680,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	426,67	$ 6.835.680,00
10.6	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	m2	788,98	$ 13.292,00	$ 10.487.122,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	788,98	$ 10.487.122,00
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CANTERA	m2	515,93	$ 121.102,00	$ 62.480.155,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	515,93	$ 62.480.155,00

	DURO GRIS 51X51 CM												
10.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM	m2	193,64	$ 88.221,00	$ 17.083.114,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	193,64	$ 17.083.114,00
10.9	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	18,00	$ 178.658,00	$ 3.215.844,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 3.215.844,00
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PVC BLANCO E=10MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y REMATES PERIMETRALES)	m2	532,84	$ 154.098,00	$ 82.109.578,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	532,84	$ 82.109.578,00
10.11	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	91,76	$ 158.791,00	$ 14.570.662,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	91,76	$ 14.570.662,00
10.12	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADOS EN CONCRETO, E=0,1M INCLUYE PLANTILLAS S/DISEÑO DE ANDEN, LOSETA TATIL DE PRECAUCION Y LOSETA TACTIL DE GUIA	m2	85,76	$ 313.176,00	$ 26.857.974,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	85,76	$ 26.857.974,00
10.13	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.	m3	1,39	$ 1.127.060,00	$ 1.566.613,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,39	$ 1.566.613,00

	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN												
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN CANTERA DURO GRIS	m	254,08	$ 13.036,00	$ 3.312.187,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	254,08	$ 3.312.187,00
10.15	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	m2	507,85	$ 41.912,00	$ 21.285.009,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	507,85	$ 21.285.009,00
10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 304. S/DISEÑO.	m2	99,36	$ 1.543.414,00	$ 153.353.615,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	99,36	$ 153.353.615,00
10.17	MESON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3	17,62	$ 3.641.135,00	$ 64.156.799,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,62	$ 64.156.799,00
				Subtotal:	**$ 565.737.574,00**		**$ 0,00**		**$ 30.759.914,00**		**$ 30.759.914,00**		**$ 534.977.660,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y PRESION**												
11.1	SANITARIO INSTITUCIONAL VÁLVULA DE BOLA 1" INCLUYE ACCESORIOS	u	16,00	$ 295.145,00	$ 4.722.320,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 4.722.320,00
11.2	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	u	4,00	$ 1.003.195,00	$ 4.012.780,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.012.780,00
11.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	u	28,00	$ 614.996,00	$ 17.219.888,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 17.219.888,00

459

11.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	u	16,00	$ 175.382,00	$ 2.806.112,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 2.806.112,00
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON	u	8,00	$ 398.362,00	$ 3.186.896,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 3.186.896,00
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL	u	24,00	$ 590.843,00	$ 14.180.232,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 14.180.232,00
				Subtotal:	**$ 46.128.228,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 46.128.228,00**
12	**CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO**												
12.1	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE FACHADA CON VENTANAL (8,95M2) EN ALUMINIO BLANCO CON PUERTA EN MADERA. S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	2,00	$ 17.408.145,00	$ 34.816.290,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 34.816.290,00
12.2	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CONJUNTO DE PUERTA CORREDIZA Y VENTANA EN ALUMINIO BLANCO. H=2.5m L=4.0m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE.	u	8,00	$ 4.195.195,00	$ 33.561.560,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 33.561.560,00

12.3	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CONJUNTO DE PUERTA CORREDIZA Y VENTANA EN ALUMINIO BLANCO. H=2.5m L=3.0m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE.	u	8,00	$ 3.293.404,00	$ 26.347.232,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 26.347.232,00
12.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	20,80	$ 933.400,00	$ 19.414.720,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,80	$ 19.414.720,00
12.5	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	6,64	$ 1.436.259,00	$ 9.536.760,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,64	$ 9.536.760,00
12.6	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO BLANCO. H=2.1m L=1.62m. TIPO S/DISEÑO.	u	8,00	$ 2.873.614,00	$ 22.988.912,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 22.988.912,00

2595

	INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE												
12.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO TABLA TRIPEX 2.1 X 8 A 9	m2	28,16	$ 473.145,00	$ 13.323.763,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,16	$ 13.323.763,00
12.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION BARANDA METALICA EN TUBERIA 2". PARA ESCALERA S/DISEÑO	m	31,94	$ 394.741,00	$ 12.608.028,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	31,94	$ 12.608.028,00
12.9	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION BARANDA METALICA EN 5 TUBOS DE 2" PARA BALCON S/DISEÑO	m	72,80	$ 1.180.755,00	$ 85.958.964,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	72,80	$ 85.958.964,00
12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET EN MADERA TIPO. S/DISEÑO	m2	94,94	$ 1.263.207,00	$ 119.928.873,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	94,94	$ 119.928.873,00
				Subtotal:	**$ 378.485.102,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 378.485.102,00**
				COSTOS DIRECTOS DE ALOJAMIENTOS NUEVOS	**$ 1.705.475.837,00**		**$ 311.715.246,00**		**$ 226.176.658,00**		**$ 537.891.904,00**		**$ 1.167.583.934,00**
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES													
13	**DEMOLICION Y DESMONTE**												
13.1	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE	m2	239,40	$ 15.712,00	$ 3.761.453,00		$ 0,00	119,70	$ 1.880.726,00	119,70	$ 1.880.726,00	119,70	$ 1.880.726,00

353

	TRASIEGO Y CARGUE MANUAL												
13.2	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	20,00	$ 87.783,00	$ 1.755.660,00		$ 0,00	8,00	$ 702.264,00	8,00	$ 702.264,00	12,00	$ 1.053.396,00
13.3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	13,00	$ 19.175,00	$ 249.275,00		$ 0,00	13,00	$ 249.275,00	13,00	$ 249.275,00	0,00	$ 0,00
13.4	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	4,00	$ 40.819,00	$ 163.276,00		$ 0,00	2,00	$ 81.638,00	2,00	$ 81.638,00	2,00	$ 81.638,00
13.5	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	4,00	$ 32.654,00	$ 130.616,00		$ 0,00	2,00	$ 65.308,00	2,00	$ 65.308,00	2,00	$ 65.308,00
13.6	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	4,00	$ 16.325,00	$ 65.300,00		$ 0,00	2,00	$ 32.650,00	2,00	$ 32.650,00	2,00	$ 32.650,00
13.7	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE	m2	159,61	$ 6.386,00	$ 1.019.269,00		$ 0,00	130,40	$ 832.734,00	130,40	$ 832.734,00	29,21	$ 186.535,00

	O DE ALMACENAMIENTO												
13.8	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	311,12	$ 9.793,00	$ 3.046.798,00		$ 0,00	159,61	$ 1.563.061,00	159,61	$ 1.563.061,00	151,51	$ 1.483.737,00
13.9	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	257,40	$ 20.886,00	$ 5.376.056,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	257,40	$ 5.376.056,00
13.10	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	15244,58	$ 1.718,00	$ 26.190.188,00		$ 0,00	452,15	$ 776.794,00	452,15	$ 776.794,00	14792,43	$ 25.413.395,00
				Subtotal:	**$ 41.757.891,00**		**$ 0,00**		**$ 6.184.450,00**		**$ 6.184.450,00**		**$ 35.573.441,00**
14	**RED ELECTRICA - BAJA TENSION**												
14.1	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	23,00	$ 158.551,00	$ 3.646.673,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 3.646.673,00
14.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	32,00	$ 134.464,00	$ 4.302.848,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	32,00	$ 4.302.848,00
14.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 227.107,00	$ 908.428,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 908.428,00
14.4	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 199.056,00	$ 1.592.448,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.592.448,00

14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 5.566.253,00	$ 22.265.012,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 22.265.012,00
14.6	ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO	m	100,00	$ 6.074,00	$ 607.400,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 607.400,00
14.7	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	20,00	$ 199.056,00	$ 3.981.120,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 3.981.120,00
				Subtotal:	**$ 37.303.929,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 37.303.929,00**
15	**ACABADOS ARQUITECTONICOS**												
15.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	184,08	$ 63.676,00	$ 11.721.478,00		$ 0,00	92,04	$ 5.860.739,00	92,04	$ 5.860.739,00	92,04	$ 5.860.739,00
15.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	20,40	$ 41.730,00	$ 851.292,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,40	$ 851.292,00
15.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	347,76	$ 29.811,00	$ 10.367.073,00		$ 0,00	173,88	$ 5.183.537,00	173,88	$ 5.183.537,00	173,88	$ 5.183.537,00

15.4	ESTUCO PLASTICO	m2	347,76	$ 19.232,00	$ 6.688.120,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	347,76	$ 6.688.120,00
15.5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	20,40	$ 16.021,00	$ 326.828,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,40	$ 326.828,00
15.6	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	m2	347,76	$ 13.292,00	$ 4.622.426,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	347,76	$ 4.622.426,00
15.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CANTERA DURO GRIS 51X51 CM	m2	311,12	$ 121.102,00	$ 37.677.254,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	311,12	$ 37.677.254,00
15.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM	m2	71,88	$ 89.317,00	$ 6.420.106,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	71,88	$ 6.420.106,00
15.9	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	2,16	$ 178.658,00	$ 385.901,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,16	$ 385.901,00
15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PVC BLANCO E=10MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y REMATES PERIMETRALES)	m2	311,12	$ 154.098,00	$ 47.942.970,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	311,12	$ 47.942.970,00
15.11	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	68,06	$ 158.791,00	$ 10.807.315,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	68,06	$ 10.807.315,00
15.12	ESCARIFICADO DE FACHADA Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE COLOR INSTITUCIONAL	m2	310,41	$ 37.562,00	$ 11.659.620,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	310,41	$ 11.659.620,00

15.13	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADOS EN CONCRETO, E=0,1M INCLUYE PLANTILLAS S/DISEÑO DE ANDEN, LOSETA TATIL DE PRECAUCION Y LOSETA TACTIL DE GUIA	m2	183,18	$ 313.176,00	$ 57.367.580,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	183,18	$ 57.367.580,00
15.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN CANTERA DURO GRIS	m	268,00	$ 13.036,00	$ 3.493.648,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	268,00	$ 3.493.648,00
15.15	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	m2	311,12	$ 41.912,00	$ 13.039.661,00		$ 0,00	159,61	$ 6.689.574,00	159,61	$ 6.689.574,00	151,51	$ 6.350.087,00
				Subtotal:	**$ 223.371.272,00**		**$ 0,00**		**$ 17.733.850,00**		**$ 17.733.850,00**		**$ 205.637.423,00**
16	**CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO**												
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO TABLA TRIPEX 2.1 X 8 A 9	u	16,00	$ 473.145,00	$ 7.570.320,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 7.570.320,00
16.2	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	18,72	$ 933.400,00	$ 17.473.248,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,72	$ 17.473.248,00

16.3	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	1,80	$ 1.436.259,00	$ 2.585.266,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,80	$ 2.585.266,00
16.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA FIJA ALUMINIO BLANCO. 2,70m x 3,05m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	1,00	$ 5.005.114,00	$ 5.005.114,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.005.114,00
16.5	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA FIJA ALUMINIO BLANCO. 2,70m x 2,30m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	1,00	$ 3.548.706,00	$ 3.548.706,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.548.706,00
16.6	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION PUERTA ALUMINIO BLANCO. 1,80m x 1,68m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	2,00	$ 3.354.750,00	$ 6.709.500,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 6.709.500,00

16.7	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION PUERTA ALUMINIO BLANCO. 1,50m x 1,68m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	4,00	$ 3.180.964,00	$ 12.723.856,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 12.723.856,00
16.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION PUERTA ALUMINIO BLANCO. 0,60m x 1,68m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	2,00	$ 2.405.338,00	$ 4.810.676,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 4.810.676,00
16.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET EN MADERATIPO. S/DISEÑO	m2	39,60	$ 1.263.207,00	$ 50.022.997,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,60	$ 50.022.997,00
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INTEGRAL TIPO. S/DISEÑO. DE 3,3M DE LARGO X 0,6 DE ANCHO	u	4,00	$ 8.424.020,00	$ 33.696.080,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 33.696.080,00
				Subtotal:	**$ 144.145.763,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 144.145.763,00**
17	**APARATOS SANITARIOS Y PRESION**												
17.1	SANITARIO INSTITUCIONAL VÁLVULA DE BOLA 1" INCLUYE ACCESORIOS	u	4,00	$ 295.145,00	$ 1.180.580,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.180.580,00
17.2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE	u	4,00	$ 614.996,00	$ 2.459.984,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.459.984,00

589

	GRIFERIA Y ACCESORIOS												
17.3	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	u	4,00	$ 175.362,00	$ 701.528,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 701.528,00
17.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON	u	4,00	$ 398.362,00	$ 1.593.448,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.593.448,00
17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL	u	4,00	$ 554.843,00	$ 2.219.372,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.219.372,00
				Subtotal:	**$ 8.154.912,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.154.912,00**
	COSTOS DIRECTOS DE EDIFICACIONES EXISTENTES				**$ 454.733.767,00**		**$ 0,00**		**$ 23.918.300,00**		**$ 23.918.300,00**		**$ 430.815.468,00**
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA												
18	**PRELIMINARES**												
18.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	12,25	$ 3.568,00	$ 43.708,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,25	$ 43.708,00
18.2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	m2	12,25	$ 8.160,00	$ 99.960,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,25	$ 99.960,00
18.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	m3	12,06	$ 36.161,00	$ 436.102,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,06	$ 436.102,00
18.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	78,39	$ 1.718,00	$ 134.674,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	78,39	$ 134.674,00
				Subtotal:	**$ 714.444,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 714.444,00**
19	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS**												

19.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	0,46	$ 765.474,00	$ 352.118,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,46	$ 352.118,00
19.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,72	$ 1.108.301,00	$ 1.906.278,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,72	$ 1.906.278,00
19.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,60	$ 1.187.618,00	$ 712.571,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,60	$ 712.571,00
19.4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	3,53	$ 1.581.877,00	$ 5.584.026,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,53	$ 5.584.026,00
19.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,20	$ 1.538.398,00	$ 1.846.078,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,20	$ 1.846.078,00
19.6	MUROS ARMADOS CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) EN ALTURAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	8,32	$ 1.413.921,00	$ 11.763.823,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,32	$ 11.763.823,00
19.7	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8"	m2	0,64	$ 231.807,00	$ 148.356,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,64	$ 148.356,00

582

19.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN TUBO 4" Y 2" S/DISEÑO	u	1,00	$ 9.294.934,00	$ 9.294.934,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.294.934,00
19.9	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,08	$ 1.054.377,00	$ 84.350,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,08	$ 84.350,00
19.10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	1954,95	$ 9.265,00	$ 18.112.612,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1954,95	$ 18.112.612,00
19.11	PINTURA VINILO SOBRE CONCRETO AL INTERPERIE, ACABADO CON COLOR INSTITUCIONAL	m2	121,94	$ 38.735,00	$ 4.723.346,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	121,94	$ 4.723.346,00
19.12	SUMINISTRO E INSTALACION SELLO DE JUNTAS CON CINTA SIKA WATERBAR O SIMILAR	m	26,40	$ 112.450,00	$ 2.968.680,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,40	$ 2.968.680,00
				Subtotal:	**$ 57.497.172,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 57.497.172,00**
	COSTOS DIRECTOS DEL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA				**$ 58.211.616,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 58.211.616,00**
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO												
20	**PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**												
20.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y	m2	134,34	$ 3.568,00	$ 479.325,00	134,34	$ 479.325,00		$ 0,00	134,34	$ 479.325,00	0,00	$ 0,00

563

	REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS												
20.2	DEMOLICIO DEL CERRAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m	335,85	$ 91.320,00	$ 30.669.822,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	335,85	$ 30.669.822,00
20.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3-km	1899,23	$ 1.718,00	$ 3.262.877,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1899,23	$ 3.262.877,00
				Subtotal:	**$ 34.412.024,00**		**$ 479.325,00**		**$ 0,00**		**$ 479.325,00**		**$ 33.932.699,00**
21	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**												
21.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	39,52	$ 791.802,00	$ 31.292.015,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,52	$ 31.292.015,00
21.2	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓNVIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	41,17	$ 1.187.618,00	$ 48.894.233,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	41,17	$ 48.894.233,00
21.3	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,	kg	2547,00	$ 9.265,00	$ 23.597.955,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2547,00	$ 23.597.955,00

	COLOCACIÓN Y AMARRE												
21.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.90MM), (H=2,5m), SEPARACION DE EJES A 150MM, (INCLUYE: TAPA PARA TUBERIA, YEE SOPORTE DE O.5M, ANCLAJE, CONCERTINA)	m	329,33	$ 2.107.712,00	$ 694.132.793,00		$ 0,00	207,36	$ 437.055.160,00	207,36	$ 437.055.160,00	121,97	$ 257.077.633,00
21.5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	217,58	$ 16.021,00	$ 3.485.849,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	217,58	$ 3.485.849,00
21.6	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,60	$ 1.108.301,00	$ 664.981,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,60	$ 664.981,00
21.7	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,68	$ 1.581.877,00	$ 2.657.553,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,68	$ 2.657.553,00
21.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE PORTON ABATIBLE A DOS HOJAS, H=2.5M X L=6M INCLUYE MARCO EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.90MM), Y TUBERIA INTERNA VERTICAL EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=1,90MM)	u	1,00	$ 9.868.388,00	$ 9.868.388,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.868.388,00

SEPARACION DE EJES A 150MM. (INCLUYE: ANCLAJES A COLUMNAS DE SOPORTES, CERRADURA TIPO PASADOR)												
Subtotal:				**$ 814.593.767,00**		**$ 0,00**		**$ 437.055.160,00**		**$ 437.055.160,00**		**$ 377.538.607,00**
COSTOS DIRECTOS DEL CERRAMIENTO				**$ 849.005.791,00**		**$ 479.325,00**		**$ 437.055.160,00**		**$ 437.534.485,00**		**$ 411.471.306,00**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 3.067.427.011,00		$ 312.194.571,00		$ 687.150.118,00		$ 999.344.689,00		$ 2.068.082.324,00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 1.042.925.183,74		$ 106.146.154,14		$ 233.631.040,12		$ 339.777.194,26		$ 703.147.990,16
ADMINISTRACIÓN 29%				$ 889.553.833,19		$ 90.536.425,59		$ 199.273.534,22		$ 289.809.959,81		$ 599.743.873,96
IMPREVISTOS 1%				$ 30.674.270,11		$ 3.121.945,71		$ 6.871.501,18		$ 9.993.446,89		$ 20.680.823,24
UTILIDAD 4%				$ 122.697.080,44		$ 12.487.782,84		$ 27.486.004,72		$ 39.973.787,56		$ 82.723.292,96
VALOR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 75.936.264,00		$ 42.018.066,08		$ 11.306.065,97		$ 53.324.132,05		$ 22.612.131,95
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 119.989.209,00		$ 75.354.808,00		$ 11.832.614,00		$ 87.187.422,00		$ 32.801.787,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO				$ 0,00		$ 267.856.800,00		$ 471.959.919,00		$ 739.816.719,00		$ 1.413.322.116,50
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 4.306.277.668,00		$ 535.713.599,00		$ 943.919.838,00		$ 1.479.633.437,00		$ 2.826.644.233,00
VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO				**$ 4.306.277.668,00**		**$ 535.713.599,00**		**$ 943.919.838,00**		**$ 1.479.633.437,00**		**$ 2.826.644.233,00**

Tabla 19. Ejecución acumulada del proyecto

5.3. Cuadro de avance acumulado mes a mes


CONTRATO No. 1683 DE 2025
OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
CUADRO DE COMPARACION DE COSTOS DEL PROYECTO

No. MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR. MENSUAL EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO ACUMULADO
18/12/2025	$0	$0	0,00%	0,00%	$0	$0	0,00%	0,00%
31/12/2025	$28.037.949	$28.037.949	0,65%	0,65%	$22.553.338,67	$22.553.338,67	0,52%	0,52%
31/01/2026	$77.425.939	$105.463.888	1,80%	2,45%	$34.577.031,67	$57.130.370,33	0,80%	1,33%
28/02/2026	$191.735.345	$297.199.233	4,45%	6,90%	$121.980.572,67	$179.110.943,00	2,83%	4,16%
31/03/2026	$187.737.987	$484.937.220	4,36%	11,26%	$104.792.888,84	$283.903.831,84	2,43%	6,59%
30/04/2026	$221.627.087	$706.564.307	5,15%	16,41%	$95.934.936,12	$379.838.767,96	2,23%	8,82%
31/05/2026	$331.938.505	$1.038.502.812	7,71%	24,12%	$189.309.686,12	$569.148.454,08	4,40%	13,22%
30/06/2026	$822.518.250	$1.861.021.062	19,10%	43,22%	$111.043.842,97	$680.192.297,05	2,58%	15,80%
31/07/2026	$1.118.293.153	$2.979.314.215	25,97%	69,19%	$799.441.140,00	$1.479.633.437,05	18,56%	34,36%
17/08/2026	$1.326.963.453	$4.306.277.668	30,81%	100,00%				

Tabla 20. Avance acumulado mes a mes


% PROGRAMADO	%EJECUTADO	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
69,19%	34,36%	-34,83%

Tabla 21. % programado vs. % ejecutado

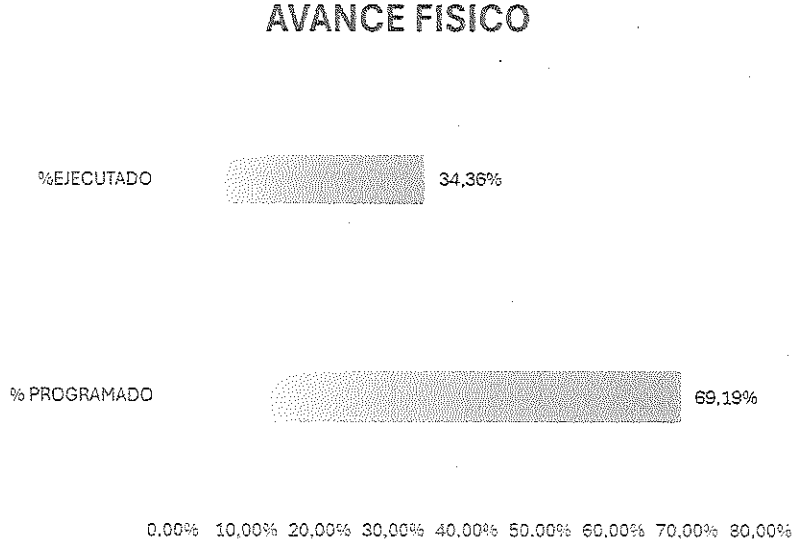


Gráfica 1. Avance físico

5.4. Gráfico de avance de obra

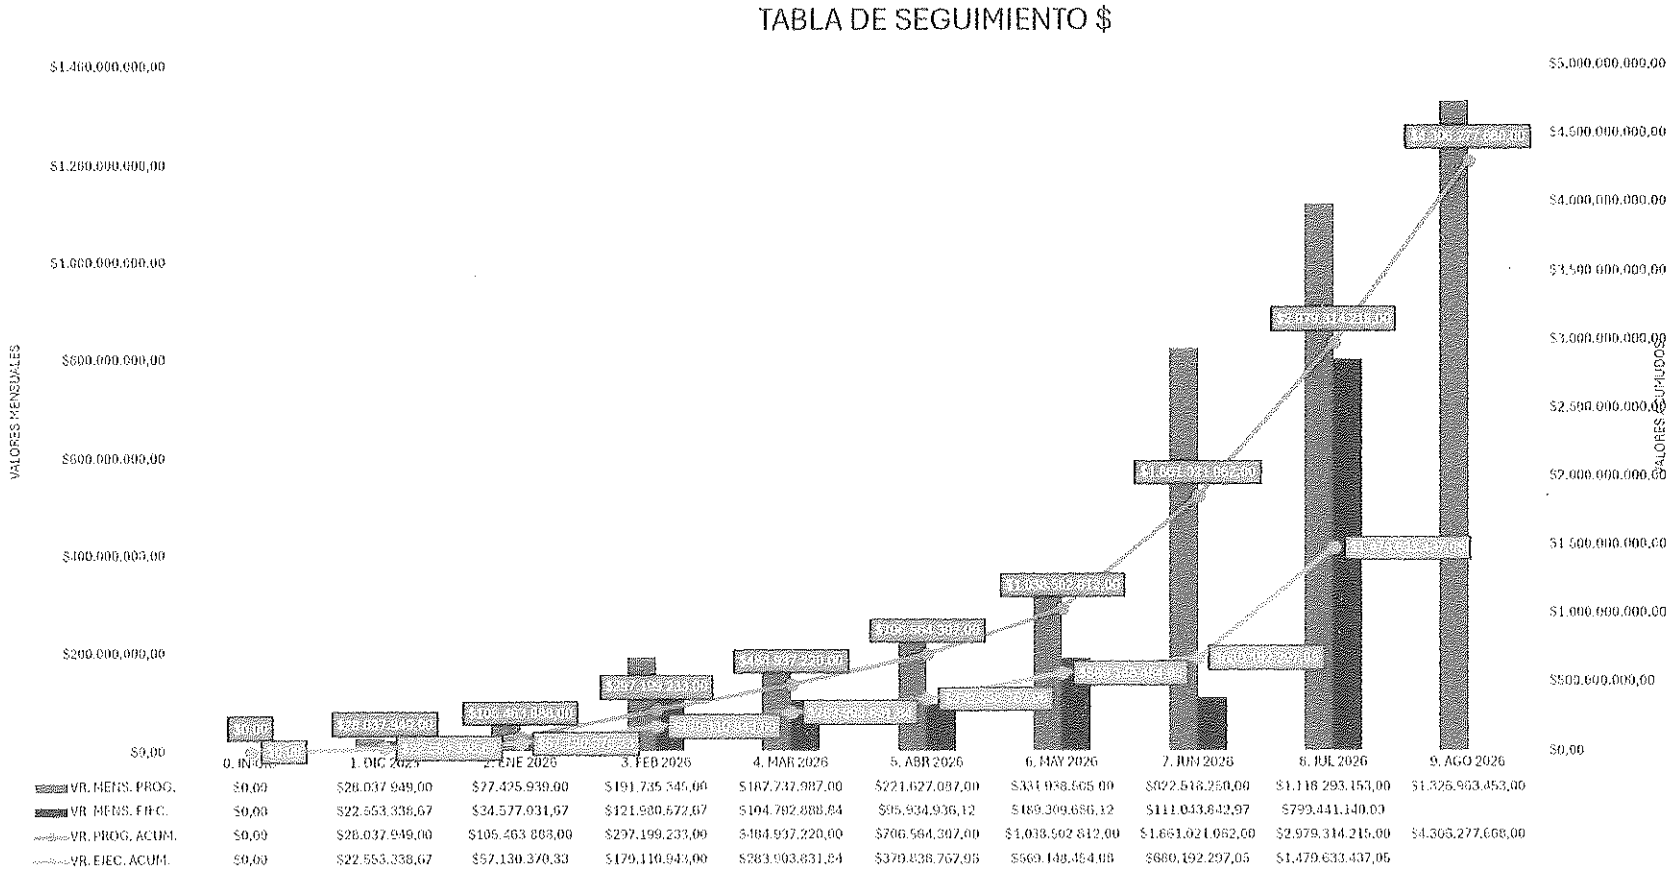

Gráfica 2. Avance en moneda

TABLA DE SEGUIMIENTO %

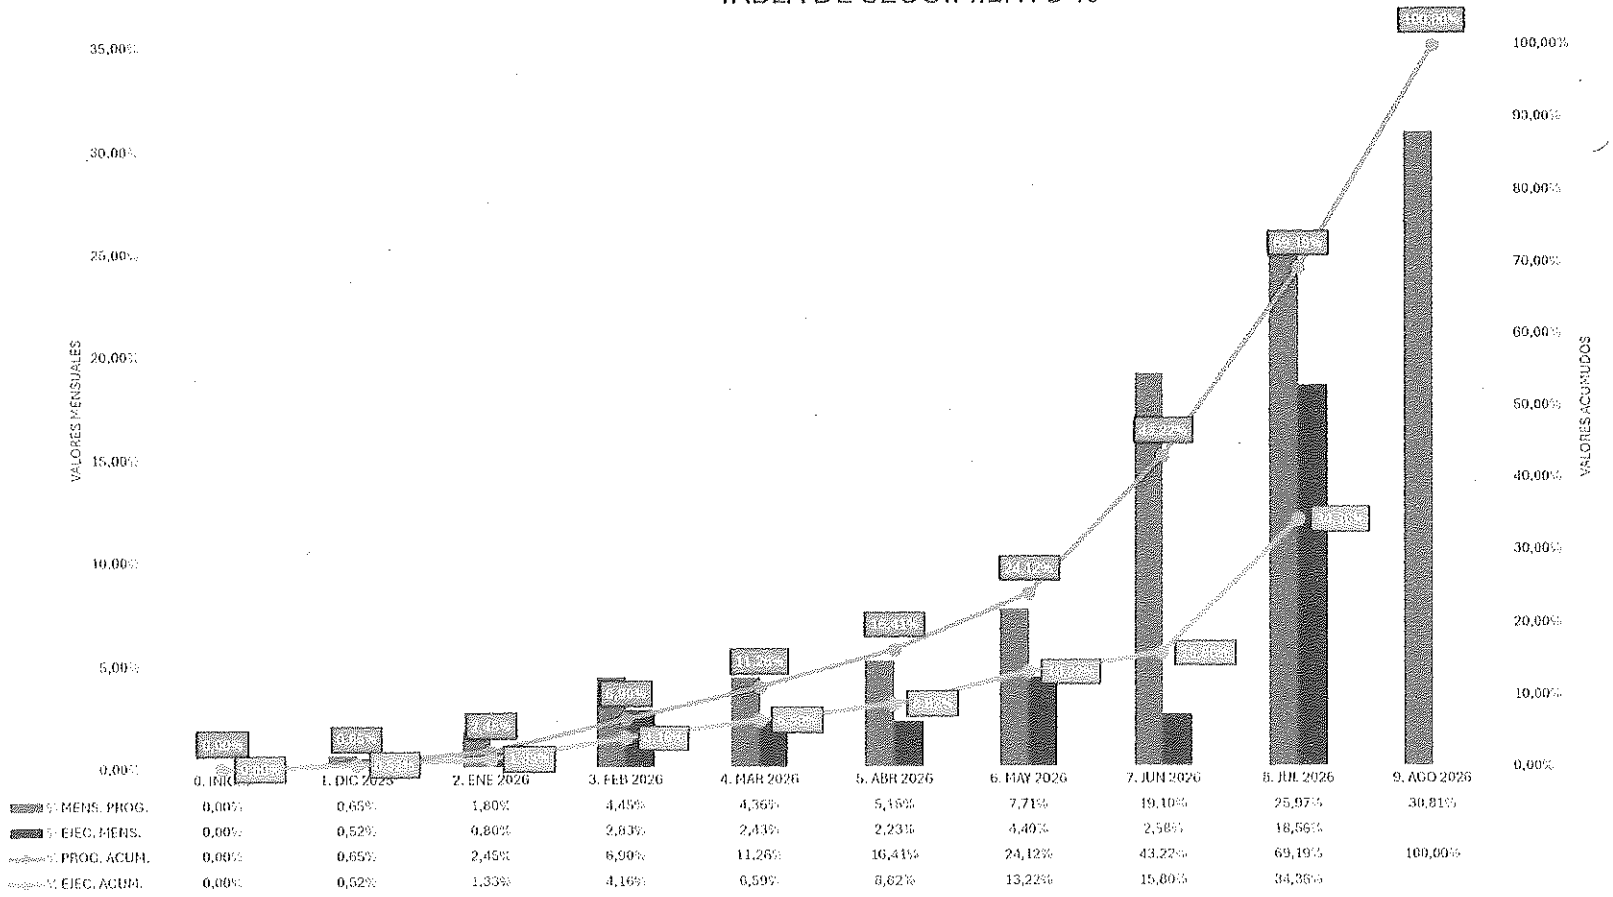

Gráfica 3. Avance en porcentaje

6. Información administrativa del contrato

6.1. Relación personal de obra (profesional, técnico, operativo)

De acuerdo con las necesidades del proyecto y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en las siguientes tablas (periodo a cobrar):

PERIODO 01/05/26 – 31/05/26

PERSONAL PROFESIONAL						
CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. T.P.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA NO.
Director de Obra	Gonzalo Becerra Mejia	17.310.424	N/A	EPS Sanitas	Sura	1082108229
Residente de Obra	Jennifer Andrea Becerra Morales	1.121.852.433	Colpensiones	EPS Sanitas	Sura	1082108229
Profesional en Salud Ocupacional	Mayra Alejandra Cardenas Lesmes	1.121.884.993	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1082108229
Topografo	Marcos Didier Delgadillo Delgadillo	80.166.369	Porvenir	Capital Salud	Sura	1082108229
Ingeniera Ambiental	Jenny Paola Feria Triana	1.121.863.524	Protección	Sanitas	Sura	1082108229
Aux. Administrativo	Brayan Steven Rivera Martinez	1.193.092.733	Porvenir	EPS Sanitas	Sura	1082108229
Aux. Residente de Obra	Margie Daniela Herrera Paez	1.122.144.736	Proteccion	Famisanar	Sura	1082108229
Aux. Profesional SST	Yonli Yulieth Lozano Gonzalez	1.121.867.537	Colfondos	Famisanar	Sura	1082108229
Maestro Obra	Oscar Alexander Patiño Perez	86.055.645	Colfondos	Famisanar	Sura	1082108229
Oficial	Segundo Roa	93.372.770	Porvenir	Nueva eps	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Agustin Aguilar Gonzalez	86.008.125	Porvenir	Famisanar	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Dagoberto Cortes	74.857.071	Porvenir	Capital salud	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Juan Martin Bolivar Gaitan	1.125.549.456	Porvenir	Nueva EPS	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Vicente Gaitan Gaitan	8.192.573	Protección	EPS Mallamas	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Yesid Galindo Gaitan	1.006.946.002	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	David Verbel Solis	1.101.450.750	Colpensiones	Famisanar	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Robinson Matinez Gil	PPT 1824421	No	Nueva eps	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Juan Ramon Galindo Nariño	1.124.992.965	Proteccion	Mallamas	Sura	1082108229

Tabla 22. Relación personal mayo

PERIODO 01/06/26 – 30/06/26

PERSONAL PROFESIONAL						
CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. T.P.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA NO.
Director de Obra	Gonzalo Becerra Mejia	17.310.424	N/A	EPS Sanitas	Sura	1082984046
Residente de Obra	Jennifer Andrea Becerra Morales	1.121.852.433	Colpensiones	EPS Sanitas	Sura	1082984046
Profesional en Salud Ocupacional	Mayra Alejandra Cardenas Lesmes	1.121.884.993	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1082984046
Topografo	Marcos Didier Delgadillo Delgadillo	80.166.369	Porvenir	Capital Salud	Sura	1082984046
Ingeniera Ambiental	Jenny Paola Feria Triana	1.121.863.524	Protección	Sanitas	Sura	1082984046
Aux. Administrativo	Brayan Steven Rivera Martinez	1.193.092.733	Porvenir	EPS Sanitas	Sura	1082984046
Auxiliar Ingeniero Residente	Martin Omar Gutierrez Vega	17.340.851	Porvenir	Salud total	Sura	1082984046
Aux. Profesional SST	Yonli Yulieth Lozano Gonzalez	1.121.867.537	Colfondos	Famisanar	Sura	1082984046
Maestro Obra	Oscar Alexander Patiño Perez	86.055.645	Colfondos	Famisanar	Sura	1082984046
Oficial	Segundo Roa	93.372.770	Porvenir	Nueva eps	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Agustin Aguilar Gonzalez	86.008.125	Porvenir	Famisanar	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Dagoberto Cortes	74.857.071	Porvenir	Capital salud	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Juan Martin Bolivar Gaitan	1.125.549456	Porvenir	Nueva EPS	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Vicente Gaitan Gaitan	8.192.573	Porvenir	Mallamas eps	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Yesid Galindo Gaitan	1.006.946.002	Porvenir	Nueva eps	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	David Verbel Solis	1.101.450.750	Colpensiones	Famisanar	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Robinson Martinez Gil	PPT 1824421	N/A	Nueva eps	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Juan Ramon Galindo Nariño	1.124.992.965	Proteccion	Mallamas	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Edgar Reinaldo Amaya Barrera	1124820136	Porvenir	Pijaos salud	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Ruben Dario Galindo Mariño	1125004759	Porvenir	Mallamas	Sura	1082984046
Oficial de obra	Alvaro Martinez Gil	PPT 1755999	N/A	Nueva Eps	Sura	1082984046

Tabla 23. Relación personal junio

Nota: El contratista de obra se abstiene de presentar el pago de seguridad social del mes JULIO 2026, en razón a lo preceptuado en el Decreto 1273 del 23 de julio de 2028, Articulo 3.2.7.6 *Plazos.* Entendiendo que la obligación del pago es mes vencido.

6.2. Pagos de seguridad social y parafiscales

En Anexos se encuentran las planillas de pago de seguridad social correspondientes al periodo del informe de cada uno de los empleados tanto profesionales, como personal operativos y técnicos junto con el certificado emitido por el contador público que avala dichos pagos.

7. Cuadro resumen ensayos de laboratorio

Durante el periodo analizado por el presente informe, se realizaron tomas de muestras, se adjunta resultados de estos.

8. Control de maquinaria y equipos

A continuación, se relaciona la maquinara usada según el periodo de uso:
PERIODO 01/05/26 – 31/05/26

TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	USO EN OBRA
Volqueta	Dodge	D 600	1971	Transporte de material

Tabla 24. Maquinaria mayo

PERIODO 01/06/26 – 30/06/26

TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	USO EN OBRA
Volqueta	Dodge	D 600	1971	Transporte de material

Tabla 25. Maquinaria junio

9. Conclusiones

Aspectos Financieros y Valor Neto de Cobro

Para efectos exclusivos de la presentación y cobro del presente Informe Parcial No. 02, correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de mayo y el 21 de julio de 2026, concluimos que las actividades de obra ejecutadas, medidas y aprobadas en esta etapa ascienden a un valor bruto de novecientos cuarenta y tres millones novecientos diecinueve mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte ($943.919.838,00). Este monto integra de manera integral los costos directos e indirectos, la administración, los imprevistos, la utilidad y los valores correspondientes a los planes de manejo ambiental y de tránsito (PMAT).

Tras aplicar la respectiva amortización del anticipo contractual por valor de cuatrocientos setenta y un millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos ($471.959.919,00), solicitamos formalmente el reconocimiento y pago de un valor neto a favor de la **Unión Temporal INGE POLICÍA GAITÁN** por la suma de cuatrocientos setenta y un millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos m/cte ($471.959.919,00).
Con la radicación y aprobación de este segundo cobro parcial, el valor total ejecutado y acumulado del contrato alcanza la suma de mil cuatrocientos setenta y nueve millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos con cinco centavos ($1.479.633.437,05), lo que representa un avance físico y financiero acumulado del **34.36%** frente al valor total del contrato fijado en cuatro mil trescientos seis millones doscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos ($4.306.277.668,00).

Respaldo Técnico y Materialización de las Obras
La procedencia de esta solicitud de cobro se sustenta en la materialización real y verificable de los trabajos en el terreno, los cuales abarcan frentes críticos y estructurales del proyecto, tales como excavaciones, estructuras de concreto, redes hidráulicas y sanitarias, mampostería, demoliciones y un porcentaje altamente representativo del cerramiento perimetral.
Desde la Unión Temporal garantizamos que cada ítem facturado cuenta con el respaldo empírico y técnico exigido contractualmente, soportado mediante las actas de medición, registros fotográficos, bitácoras de obra, certificaciones de calidad de los materiales y los respectivos resultados de los ensayos de laboratorio. Todo ello demuestra fehacientemente que lo cobrado corresponde estrictamente a obra física ejecutada bajo los rigurosos estándares de calidad requeridos por la Interventoría y el Municipio de Puerto Gaitán.

Solvencia Jurídica, Administrativa y Presupuestal
Esta solicitud de pago se encuentra plenamente blindada jurídica, financiera y administrativamente. La Unión Temporal ha cumplido a cabalidad con la gestión del anticipo del 50% a través de la fiducia mercantil constituida con la entidad financiera Davivienda, ingresando dichos recursos en su proceso natural de amortización proporcional al avance físico de la obra.
De igual manera, acreditamos el estricto cumplimiento de nuestras obligaciones legales, fiscales y laborales, demostrando el pago oportuno de la seguridad social integral y los aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la obra durante los meses de mayo y junio de 2026, manteniendo vigentes las pólizas de cumplimiento, buen manejo del anticipo y responsabilidad civil extracontractual.

Adicionalmente, el presente cobro cuenta con el respaldo financiero de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y los Registros Presupuestales (RP) vigentes, incluyendo la reserva presupuestal debidamente actualizada a la vigencia fiscal 2026.
En virtud de lo anterior, solicitamos a la Interventoría y al Ente Territorial el trámite, aprobación y giro de este segundo pago parcial, al encontrarse debidamente justificado, cuantificado y soportado conforme a las cláusulas y condiciones estipuladas en el Contrato de Obra No. 1683 de 2025.

10. Anexos

1. Registro fotográfico.
2. Bitácoras de obra.
3. Nómina del personal.
4. Certificado de calidad de los materiales
5. Ensayos/laboratorios
6. Informe SST
7. Informe Ambiental
8. Informe de transito

Los siguientes son los profesionales encargados de la elaboración del presente informe de cobro parcial.

Director de Obra
Gonzalo Becerra Mejia
CC: 17.310.424 de Villavicencio
M.P: 25700-40739 CND

Residente de Obra
Jennifer Andrea Becerra Morales
CC: 1.121.852.433 de Villavicencio
M.P: A71052012 - 1121852433

Vo.Bo. interventoría

Director de Interventoría
Robinson Fernando Marroquin Pérez
CC: 86.053.753 de Villavicencio
M.P: 25202-090337 CND

Residente de Interventoría
Johathan Andres Gaviria Contreras
CC: 1.121.844.182 de Villavicencio
M.P: 25202-193762 CND

5645

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

REGISTRO FOTOGRAFICO

21 DE MAYO DE 2026 AL 21 DE JULIO DE 2026


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	m3	166,81	2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	1084,27



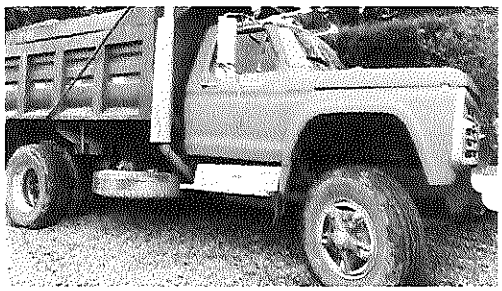


2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	136,01	2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	15559,55



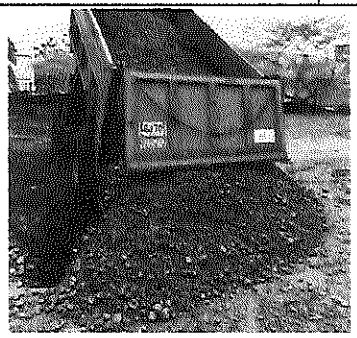

3.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,35	3.4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	4,90





3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	16,69	3.7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	27,24







REGISTRO FOTOGRAFICO


21 DE MAYO DE 2026 AL 21 DE JULIO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
3.8	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	3,64	3.9	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	kg	34,24

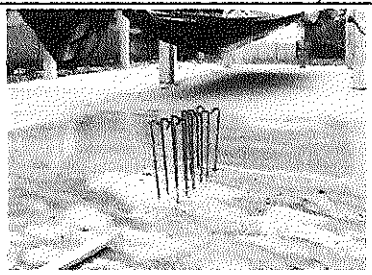





3.10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	3395,33	3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 22 (NO INCLUYE CONCRETO)	m2	264,00







4.1	TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	16,09	4.2	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	77,59

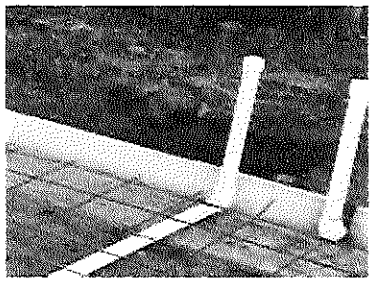

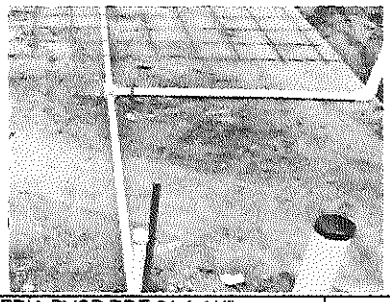



4.3	TUBERIA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	19,99	4.4	TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	34,94















4.5	TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	80,20	4.7	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	81,00










REGISTRO FOTOGRAFICO

21 DE MAYO DE 2026 AL 21 DE JULIO DE 2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
4.8	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	9,00	4.10	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	74,00
							
4.11	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	4.12	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00
							
4.13	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	5.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	39,30
							
5.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	60,00	5.5	SALI... SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	14,00
							
5.6	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	5.7	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	u	2,00
							
5.8	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	10.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	283,19
							





REGISTRO FOTOGRAFICO

21 DE MAYO DE 2026 AL 21 DE JULIO DE 2026

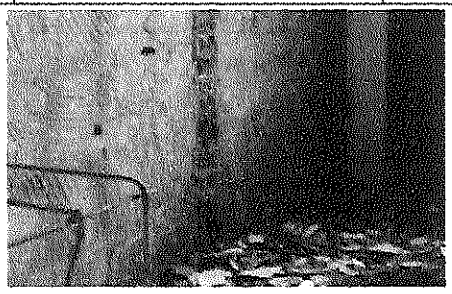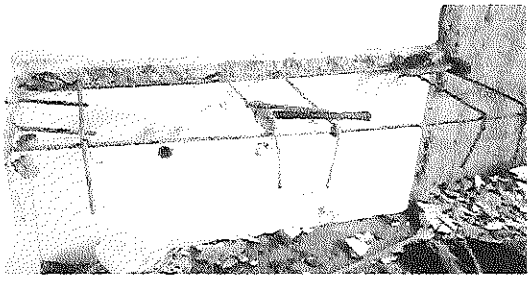ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.
10.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	426,94	13.1	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m2	119,70
							
13.2	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	8,00	13.3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	13,00
							
13.4	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	2,00	13.5	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	2,00
							
13.6	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	2,00	13.7	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	130,40
							

REGISTRO FOTOGRAFICO

21 DE MAYO DE 2026 AL 21 DE JULIO DE 2026

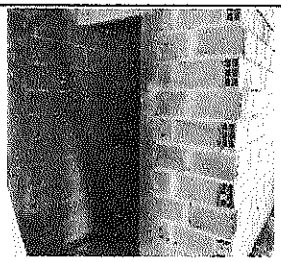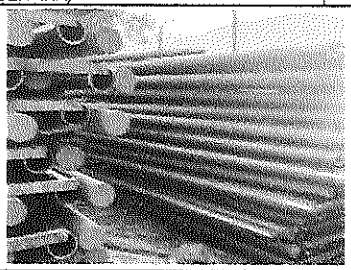ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
13.8	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	159,61	13.10	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	452,15
							
15.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	92,04	15.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	173,88
							
15.15	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	m2	159,61	21.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=3,90MM), (H=2,5m), SEPARACION DE EJES A 150MM, (INCLUYE: TAPA PARA TUBERIA, YEE SOPORTE DE 0.5M, ANCLAJE, CONCERTINA)	m	207,36
							

5201

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

BITÁCORAS DE OBRA

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

5402

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES 21 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 Horas lluvias moderadas

PLAZO ACTUAL	8 HORAS	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS DE CORREA		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presenta nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES- 21 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS MODERADAS

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA CONFORMACION DE ENCOFRADO DE VIGA DE ENTREPISO, EN EL TRANSCURSO DEL DIA SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS LO QUE AFECTA LAS ACTIVIDADES DE OBRA

LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA ESTA ACORDE CON LOS PLANOS Y DISEÑOS APROBADOS POR INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1761 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES 22 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS LLUVIAS FUERTES

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR	1
RESIDENTE	2
MAESTRO	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	8
TOPOGRAFO	0
INSPECTOR SISO	1

EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO: Operación	ESTADO: Mantenimiento
RETROEXCAVADORA	0		
COMPACTADOR TIPO RANA	0		
MEZCLADORA DE CONCRETO	0		
VIBRADOR DE CONCRETO	0		
VOLQUETA	0		

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
Elemento	SI	NO
Cascos	X	
Gafas	X	
Tapabocas	X	
Guantes	X	
Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
ENCOFRADO VIGA ENTREPISOS.		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES- 22 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS DE LLUVIAS FUERTES

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EN HORAS DE LA MAÑANA SE VIERON INTERRUMPIDAS LAS LABORES DE OBRA POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS, SE REINICIA LABORES DE FUNDIDO DE VIGA DE CIMENTACION EN HORAS DE LA TARDE.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

5704

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 23 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 Horas lluvias Moderadas

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGA CANTILEVER		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 23 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 Horas lluvias Moderadas

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las lluvias moderadas durante el dia ocasionaron retrasos en las actividades de obra. El contratista coordino con el encofrado de viga entrepiso, acorde con los diseños aprobados.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

5705

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO 24 Mayo 2026	HORAS DE LLUVIA: Dia Nublado

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	6	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO 24 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: DIA NUBLADO

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY NO TUVO A CABO ACTIVIDADES EN OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 25 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 6 HORAS LLUVIAS FUERTES

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0						\	
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREPISOS		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 25 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 6 HORAS LLUVIAS FUERTES

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL DIA DE HOY SE SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES EN OBRA POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS CON TORMENTA ELECTRICA

LA JORNADA INICIA CON ENCERRADO DE VIGA ENTREPISO PERO DICHA ACTIVIDAD FUE SUSPENDIDA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER BECERRA FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

5209

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: Martes - 26 Mayo 2026	HORAS DE LLUVIA: 2,5 Horas Lluvias Fuertes
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS: DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREPISOS		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MARTES - 26 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2,5 HORAS LLUVIAS FUERTES

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL ENCOFRADO PARA VIGAS DE ENTRE PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ALOJAMIENTOS, DICHO ACTIVIDAD ES SUPERVISADA CONJUNTAMENTE POR LA INTERVENTORIA.

LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN EL TRANSCURSO DEL DIA AFECTAN EL RENDIMIENTO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: Miercoles 27 Mayo 2026	HORAS DE LLUVIA: 4 Horas lluvias Moderadas

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGA ENTREPISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1781 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: Miercoles 27 Mayo 2026	HORAS DE LLUVIA: 4 Horas lluvias Moderadas

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI | NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

El dia de hoy la contratista continua con el suministro de viga entre pisos del edificio de alojamientos, las actividades se realizan acordes con los diseños y planos aprobados por la interventoria zona

Las actividades se ven interrumpidas por las fuertes lluvias presentadas en el transcurso del dia.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

5209

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES 28 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS MODERADAS.

PLAZO ACTUAL	8 MESES.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREPISOS		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1781 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"		OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS		RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA:	JUEVES - 28 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS MODERADAS

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL DIA DE HOY SE REALIZA EL SUMINISTRO TOTAL DE LA LAMINA METAL DECK PARA LA PLACA CONTRA PISO.

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY CONTINUA CON EL ENCARGADO DE VIGAS PARA CONTRAPESAS, LAS LLUVIAS MODERADAS PRESENTADAS EL DIA DE HOY EN SUMA MANERA RETRASAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES 29 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS LLUVIAS FUERTES

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS DE ENTREPISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES- 29 MAYO 2026.	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS LLUVIAS FUERTES

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE VIGAS ENTRE EJES POR LAS LLUVIAS ANTES REGISTRADAS EN HORAS DE LA MAÑANA SE AFECTO EL RENDIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD SE SUSPENDIO ACTIVI DADES EN HORAS DE LA MAÑANA Y SE CONTINUO EN HORAS DE LA TARDE CON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO - 30 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2,5 HORAS LLUVIAS MODERADAS

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS DE ENTREPISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 30 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2,5 Horas lluvias no detenidas

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua las actividades de excavacion de las vigas de cinco ejes, teniendo en cuenta los diseños y planos previamente aprobados por la interventoria

Las lluvias presentadas en horas de la tarde afectan el rendimiento de las actividades realizadas

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a dobfe cara

5712

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO - 31 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS FUERTES

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE		VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: Domingo - 31 Mayo 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 Horas llovio fuerte

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

El dia de Hoy no se llevo a cabo actividades de obra se realizan votaciones presidenciales

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 01 JUNIO 2026 LUNES	HORAS DE LLUVIA: DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	2			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	1			Guantes	X	
OPERARIO		VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR								
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	ENTRE EJES A-C Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER R	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA LLEVA A CABO LA CONFORMACION EN CONCRETO DE LA MITAD DE LA VIGA DE ENTREPISO DESDE EL EJE A-F ENTRE EJES 1-3 SE CONFORMAN LAS VIGAS. EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON UNA ALTURA DE 30 cm Y ANCHOS ESPECIFICADOS EN PLANOS Y ACORDE A DISEÑOS APROBADOS POR LA CORRESPONDIENTE INTERVENTORIA.

LAS VIGAS SE CONFORMAN EN SU PRIMERA MITAD HASTA 45 cm POSTERIORES AL EJE F TERMINADO EN 45°

SE TOMAN LOS CORRESPONDIENTES CILINDROS O MUESTRAS DE CONCRETO PARA SER LLEVADAS AL LABORATORIO DE SUELOS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 02 JUNIO 2026 MARTES	HORAS DE LLUVIA: MAÑANA Y TARDE MUY BIEN

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	EJES A-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NC X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SE CONTINUA CONFORMANDO EL ENCOFRADO DE LA VIGA ENTRE PISOS DEL EJE 6-K ENTRE LOS EJES 1-3.

SE DESISTALAN TESTEROS LATERALES DE LA VIGA ENTRE EJES 1-3 Y EJES A-F. SE LIMPIAN Y SE LUEGO A INSTALAR EN LA VIGA ENTRE PISOS ENTRE LOS EJES 6-K Y EJES 1-3.

AUN NO SE INICIAN ACTIVIDADES EN EL SECTOR CASO BANCO, NO SE AUTORIZA EL INICIO PUES LOS ALOJAMIENTOS ACTUALES ESTAN TODAVIA HABITADOS.

EL CONTRATISTA APLICA AFOR CON MANGUERA A LAS VIGAS CONFORMADAS PARA EL PROCESO DE FRAGUADO.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 03 JUNIO 2026 MIERCOLES	HORAS DE LLUVIA: DIA SOLEADO.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	1			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA CONCRETO 3.000 PS. ENTREPISO	M3	ENTRE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA LLEVANDO A CABO EL ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS Y VIGAS RIOSTRAS DE VIGA ENTRE PISO EJES EL EJE G-K Y EJES 1-3

SE REALIZA SUMINISTRO DE MAMPOSTERIA, ESTE SE ALMACENA CON PLASTICO PARA EVITAR EL DAÑO POR FACTORES CLIMATICOS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 JUNIO 2026 JUEVES	HORAS DE LLUVIA: LLUVIAS 4 HORAS.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA CONCRETO 3.000PSI ENTREPISO	M3	ENTRE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
NC: No Conforme	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO EL ENCOFRADO DE LOS LATERALES DE LA VIGA ENTRE PISOS DE LOS EJES G-K Y ENTRE EJES 1-3. ; A SI MISMO SE CONTINUA INSTALANDO CAMILLA PARA LA CONFORMACION DE LA VIGA

EL ENCOFRADO SE REALIZA CON LA SUPERVICION CONTINUA DE LA INTERVENTORIA Y APROVACION DE LA MISMA.

LAS LLUVIAS FUERTES PRESENTADAS EN HORAS DE LA TARDE OCACIONAN RETRAZOS EN LA ACTIVIDAD

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 05 JUNIO 2026 VIERNES.	HORAS DE LLUVIA: LLUVIA MODERADA 2 HORAS.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos		
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas		
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas		
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes		
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas		
AYUDANTE	8					Alcohol		
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI ENTRE EJES	M3	ENTRE EJES K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO Y
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA CONFORMACION DEL ENCOFRADO DE LA VIGA ENTREPISO UBICADA ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES G-K. LA MADERA PARA EL ENCOFRADO SE UTILIZA LA MISMA DE LA PRIMERA MITAD DE LA VIGA.

LAS LLUVIAS MODERADAS PRESENTADAS EN HORAS DE LA MAÑANA HAN OCASIONADO RETRAZOS EN LA ACTIVIDAD.

LA INTERVENTORIA SUPERVISA CONTINUAMENTE LA ACTIVIDAD EJECUTADA Y APROBANDO LA MISMA.

5718

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 6 JUNIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: LLUVIAS CUENTES 4 HORAS.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA EN CONCRETO 3.000PSI	M3	ENTRE EJES 1-2 Y EJES G-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO		LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI X	NO
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO		SE SOLICITARON ENSAYOS		SI X	NO X
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO		SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SE CONTINUO CON EL ENCOFRADO DE LA VIGA DE ENTRE-PISO ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES G-K, POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, LA ACTIVIDAD SE VIO INTERRUMPIDA, LO QUE DEMANDA DIRECTA OCACIONA RETRASOS EN OBRA

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES

FECHA:	07 JUNIO 2026 DOMINGO	HORAS DE LLUVIA:	3 HORAS LLUVIAS CUENTOS		
PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA				Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
VIGA CONCRETO 3.000 PSI ENTRELAZADO	M3	ENTRE LOS EJES C-K Y EJ 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY POR SER DOMINGO NO SE LLEVO A CABO ACTIVIDADES EN OBRA

5720

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 08 JUNIO 2026. LUNES	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VISA EN CONCRETO 3.000 PSI LENTINE PISO	M3	LENTINE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO			
		C	NC	FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO	
OBSERVACIONES:					

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY ES LUNES FESTIVO, A LO CUAL NO SE LLEVO ACTIVIDADES EN OBRA

SE REALIZO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 9 JUNIO 2026 MARTES.	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	1	X		Botas	X	
AYUDANTE	1					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA EN CONCRETO 3.000PSI ENTREPISO	M3	ENTRE LOS EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO EL ENCOFRADO DE LA VIGA DE ENTREPISO UBICADA ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES E-K, EL DIA DE HOY SE TERMINA EL ENCOFRADO, CON LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE LA MISMA.

SE REALIZA EL SUMINISTRO DE GRAVA 1/2" Y ARENA DE PEÑA PARA CONFORMAR LA VIGA PARA EL DIA DE MAÑANA.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 10 JUNIO 2026 MIERCOLES	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA SOLEADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	1	X		Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	1	X		Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA				Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA CONCRETO 3.000 PSI ENTREPISO	M3	ENTRE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Gaitán

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY CONFORMO UN CONCRETO DE 3.000PSI LAS VIGAS ENTRUBASOS LOCALIZADOS ENTRE LOS EJES 1-3 Y ENTRE EJES G-K, LA DOSIFICACION UTILIZADA PARA EL CONCRETO SE REALIZO POR LABORATORIO Y APROBADA PREVIAMENTE POR LA INTERVENTORIA.

LAS VIGAS CONFORMADAS TIENEN UNA ALTURA DE 30 cm.
EL CONTRATISTA TOMA MUESTRAS DEL CONCRETO MEZCLADO EN OBRA.

SE UTILIZO UN ADHERENTE DE CONCRETOS. SIKA DUR PROMOTOR 32. PARA LAS UNIONES DE LAS VIGAS EN EL EJE G DE 1-3 EJES.

5725

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 11 JUNIO 2026 JUEVES	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA SABADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	2	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
VIGA CONCRETO 3.000 PSI ENTRE PISO	M3	ENTRE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER RB	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY INICIA EL RETIRO DE CONTRALISTAS LATERALES DE LAS VIGAS ENTRE PISOS CONFORMADAS EL DIA DE AYER, ASI MISMO RETIRA CAMILLAS, CERCHAS Y PARALES DE LA VIGAS CONFORMADAS EL 01 DE JUNIO, CON LA PRECAUCION DE APUNTALAR NUEVAMENTE LAS VIGAS Y VOLADIZOS HASTA QUE CUMPLA LOS 14 DIAS.

EL CONTRATISTA CONTINUA HIDRATANDO LOS CONCRETOS DE VIGAS ENTRE PISOS PARA LOGRAR EL CONCRETO CURADO.

5424

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 12 JULIO 2026 VIERNES.	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA SOLEADO

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
DESCOPONADO VIAS ENTRADA.		EJES 1-3 ENTRE EJES A-C.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA Y TERMINA EL DIA DE HOY EL DESENCOFRADO DE LAS VIGAS CONFORMADAS ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES E-K

ASI MISMO EL DIA DE HOY TERMINO DE APUNTALAR LAS VIGAS CONFORMADAS ENTRE LOS EJES 1-3 Y A-E.

EL CONTRATISTA CONTINUA HIDRATANDO CON AGUA DOS 4-5 VECES EN EL DIA LAS VIGAS ENTRE PISO CONFORMADAS

EL DIA DE HOY LLEGO A LA OBRA LA LAMINA METAL DECK

5125

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 13 JUNIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: 2 Horas lluvias Moderadas

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACION METALDECK	M2	EJES 1-3 A EJES A-C.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY INICIO LA INSTALACION DE LA LAMINA METALDECK SOBRE LAS VIGAS DE ENTREPISO LOCALIZADAS ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES A-C.

LA LAMINA SE UBICO 10 cm DEL BORDE EXTERIO DE LAS VIGAS 1 Y 3 Y EN LA VIGA DEL EJE 3 SE TRASLAPA., LA LAMINA SE ASEGURA EN SUS EXTREMOS CON PUNTILLA DE ACERO.

AL DIA DE HOY NO SE HA INTERVENIDO CASA BLANCA PUESTO QUE CONTINUAN OCUPADO LOS ALOJAMIENTOS,

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 14 JUNIO 2026. DOMINGO	HORAS DE LLUVIA: 4 Horas lluvia aislada.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
INSTALACION LAMINA METALDECK	M2	ENTRE EJES 1-3 Y A-C.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER BECERRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY POR SER DOMINGO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA.

5227

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 15 JUNI 2026 LUNES	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
INSTALACION METALDECK	M2	EJES 1-3 A EJES A-G	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
RESIDENTE DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY POR SER LUNES FESTIVO NO SE LLEVA ACABO ACTIVIDADES EN OBRA, SE REALIZO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 16 JUNIO 2026. MARTES.	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
INSTALACION METALDECK	M2	ENTRE EJES 1-3 Y EJE A-C.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Gaitán

EL CONTRATISTA CONTINUA LA INSTALACION DE METALDEC EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES A-G, SE INICIA LA INSTALACION DE DUCTOS ELECTRICOS Ø 1/2 Y 3/4", SE INICIA EL MONTAJE DE MALLA ELECTRO SOLDADA. FY 5000 CON TRASLAPO ENTRE MALLAS DE 30cm

EL CONTRATISTA CONTINUA LA HIDRATACION DE LAS VIGAS ENTRE PISOS CON AGUA DE 4 A 5 VECES POR DIA.

5424

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 JUNIO 2026 Miercoles	HORAS DE LLUVIA: 4 Horas
PLAZO ACTUAL: 8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Malla electrosoldada Fy 5000	Kg	EJES 1-3 A EJES A-E		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	
C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA
NC: No Conforme	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA INSTALACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA FY 5000, SE INSTALAN PASANTES Ø 4" - Ø 2" SANITARIOS, PREVIA LOCALIZACION ACORDE CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA E HIDRAULICOS

ASI MISMO SE INSTALA DUCTO Ø1"1/4 DE PRESION PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR EJE 1-3 A EJE A-G.

SE INSTALA FORMALETA MADERA AL PERIMETRO DE LA PLACA.

LAS ANTERIORES ACTIVIDADES SE REALIZARON ACORDE A PLANOS Y DISEÑOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.

EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTO LLUVIAS FUERTES QUE OCACIONARON RENDIMIENTOS BAJOS DE LAS ACTIVIDADES EN DESARROLLO

5930

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**FORMATO LIBRO DE BITÁCORA**		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	**Version:04**	**Vigencia: 10-01-2025**

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 **DE** 2025	**CONTRATO DE OBRA No.** 1683 **DE** 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	**OBJETO:** "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	**RESIDENTE:** JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 18 JUNIO 2026 JUEVES	**HORAS DE LLUVIA:** 9 DIA SOLEADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	**DIAS TRANSCURRIDOS**		**DIAS PENDIENTES**	

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	2	X		Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	1	X		Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8	PLUMA	1	X		Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
PLACA ENTREPISO 3.000 PSI	M3	EJES 1-3 A EJES A-C.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforma	JENNIFER BECERRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONFORMA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3,000 PSI EL TRAMO DE PLACA ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES A-G CON UN ESPESOR DE 10cm

PARA EL PROCESO SE UTILIZO UNA PLUMA PARA IZAR EL CONCRETO 2 MEZCLADORAS DE 1 1/2 BTS.

HASTA EL DIA DE HOY NO SE HAN INICIADO LABORES DE CONSTRUCCIÓN EN CASA BLANCA PUES AUN ESTA HABITADA.

EL CONTRATISTA TOMO MUESTRA DEL CONCRETO FABRICADO EN OBRA PARA ANALIZAR LA RESISTENCIA A LA COMPRECION EN EL LABORATORIO

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 19 JUNIO 2026 VIERNES	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	9					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
MALLA ELECTRO SOLDADA 5.000	KG	CENTRO EJES 1-3 Y EJES G-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER B	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Gaitán

EL CONTRATISTA CONTINUA LA INSTALACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA EN EL TRAMO PARA CONFORMAR PLACA ENTRE PISO DEL SECTOR UBICADO ENTRE LOS EJE 1-3 Y EJE G-K. A SI MISMO CONTINUA LA INSTALACION DE (PA) LAMINAS METALDECK EN EL MISMO TRAMO

EL DIA DE HOY SE SUMINISTRO CEMENTO A LA OBRA Y MATERIALES AGREGADOS COMO ARENA DE PEÑETO Y GRAVA. 1/2

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 20 JUNIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: 0 NUBLADO
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
INSTALACION METALDECK	M2	ENTRE EJES 1-3 Y EJES G-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SE CONTINUA LA INSTALACION DE LAMINA METALDECK PARA PLACA ENTREPISOS DEL TRAMO UBICADO ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES G-K. APOYANDOLA SOBRE LAS VIGAS CONFORMADAS DE ENTREPISO, DICHA LAMINA SE AJUSTA CON PUNTILLA A 10CM DEL BORDE EXTERNO DE LOS EJES DE VIGAS 1 Y 3 Y EN O SOBRE LA VIGA EJE 2 SE TRASLAPA LA LAMINA.

A SI MISMO SE CONTINUA INSTALANDO MALLA ELECTRO SOLDADA F'y 5000. SOBRE LA PLACA METALICA METALDECK.

5733

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 21 JUNIO 2026 DOMINGO	HORAS DE LLUVIA: lluvia esporadica 1 H.

PLAZO ACTUAL	8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LAMINA METALDECK	M2			

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA NO TUVO A CARGO ACTIVIDADES POR SER DOMINGO.

EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION.

5934

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 22 JUNIO 2026 LUNES	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA SOLEADO
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Malla electrosoldada Fy 5000	Kg	EJES 1-3 A EJES G-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI \	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO
OBSERVACIONES:			

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	
C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA
NC: No Conforme	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SE CONTINUA REALIZANDO ACTIVIDADES PARA INSTALACION DE METALDECK Y MALLA ELECTRO SOLDADA Fy 5000 QUE SE TRASLAPA 30cm EN CADA SENTIDO.

EL CONTRATISTA INSTALA NIMPLES O PASANTES DE Ø 4" Y 2" DE TUBERIA SANITARIA. UBICADA EN EL SECTOR BAÑOS HOMBRES Y MUJERES.

EL DIA DE HOY SE PERMITE INTERVENIR EL PISO 01 DE EL EDIFICIO CASA BLANCA, EL SEGUNDO NIVEL CONTINUA HABITADO Y UNA VEZ SE TERMINE EL PRIMER NIVEL SE PODRA INICIAR EL SEGUNDO NIVEL.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	**OBJETO:** "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	**RESIDENTE:** JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 23 JUNIO 2026. MARTES	**HORAS DE LLUVIA:** DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
DEMOLICION PISO BALDOSIN	M2	EDIFICACION EXISTENTE	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA INICIA EL DIA DE HOY CON EL DESMONTE DE ARMARIOS. Y DEMOLICION DE PISOS EN EL EDIFICIO CASA BLANCA.

SE CONTINUA INSTALANDO LA MALLA ELECTROSOLDADA FY 5.000 CON TRASLAPE 30cm UBICADA ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES 6-K.

SE INICIA DESMONTE DE CIELO RAZO EN LA EDIFICACION EXISTENTE (CASA BLANCA) PRIMER PISO.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Puerto Gaitán

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES

FECHA:	24 JUNIO 2026 Miercoles	HORAS DE LLUVIA:	Dia soleado.

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Malla electrosoldada C-y 5000	Kg	ENTRE EJES 1-3 y EJES 6-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	Si	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

HOY SE CONTINUA INSTALANDO LA MALLA ELECTROSOLDADA EN LA NUEVA EDIFICACION PARA LA SEGUNDA PARTE DE LA PLACA ENTREPISO ENTRE LOS EJES 1-3 Y ENTRE EJES G-K

ASI MISMO SE INSTALAN EL ENCOFRADO LATERAL DE LA PLACA, SE DEJA INSTALADA LA BOMBA PARA EL DIA DE MAÑANA QUE SE PLANTEA CONFORMAR LA PLACA EN CONCRETO.

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA DESINSTALACION DE CIELO RASO, DESMONTE DE ARMARIOS, DEMOLICION DE PISOS EN EL EDIFICIO CASA BLANCA

5752

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 25 JUNIO 2026 JUEVES	HORAS DE LLUVIA: NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	2	X		Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	1	X		Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	19	pluma	1	X		Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
RESIDENTE DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY SE CONFORMA LA SEGUNDA MITAD DE LA PLACA ENTRE PISO DEL EJE 1-3 AL EJE 6-K. EN CONCRETO 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO.

LA PLACA SE CONFORMA DE ESPESOR TOTAL 10cm, EN LA CONFORMACION DE DICHA PLACA SE UTILIZA 2 MEZCLADORAS CONCRETO Y UNA PLUMA PARA IZAR EL CONCRETO AL 2DO PISO

POR LA CANTIDAD DE PERSONAL NECESARIO, SE SUSPENDE POR EL DIA DE HOY. LAS DEMOLICIONES EN LA EDIFICACION EXISTENTE.

5488

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 26 JUNIO 2026 VIERNES	HORAS DE LLUVIA: NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA	0							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
DEMOLICION PISOS.	M3	EDIFICIO EXISTENTE.		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY NO SE LLEVO A CABO ACTIVIDAD DE OBRA POSTERIOR A MEDIO DIA

EN LA MAÑANA SE NOTIFICO ENCOFRADO DE PLACA DE (CONTRAPISO) ENTREPISO.

SE CONTINUO CON DEMOLICION DE PISOS Y DESMONTE DE CIELO RAZO EN EL EDIFICIO EXISTENTE.

SE SOLICITO POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL LA SUSPENCION DE LABORES, TEMPORALMENTE HASTA EL DIA 29 JUNIO POR REALIZACION DEL 37° FESTIVAL DE LA CACHAMA, POR FLUJO SIGNIFICATIVO DE PERSONAL DENTRO DE LA INSTITUCION QUE AFECTARIA LABORES Y SITUACION DE SEGURIDAD.

5239

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 27 JUNIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: lluvia parciales 2
PLAZO ACTUAL: 8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Gaitán

El Dia de Hoy No se laboro, por solicitud de suspension temporal de obra por parte de la Policia Nacional hasta el dia 30 de junio reinicio de labores.

5740

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 28 JUNIO 2026 DOMING.	HORAS DE LLUVIA: lluvias fuertes 4.
PLAZO ACTUAL: 8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA	0							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

JENNIFER B

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
RESIDENTE DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

El Dia de Hoy se solicito a cabo labores de obras por solicitud de suspension provicional realizada por la policia nacional dando inicio el dia 30 de junio

5741

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 29 JUNIO 2026 LUNES	HORAS DE LLUVIA: 6. LLUVIAS TODO EL DIA
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos		
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas		
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas		
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes		
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas		
AYUDANTE	10					Alcohol		
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA: SI / NO		LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA: SI / NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD: SI / NO		SE SOLICITARON ENSAYOS: SI / NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI / NO		SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES: SI / NO		

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY NO SE LABORO, POR SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA, REALIZADA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL, PARA DAR REINICIO HASTA EL DIA 30 JUNIO 2026.

5742

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 30 JUNIO 2026 MARTES	HORAS DE LLUVIA: 4. LLUVIAS FUERTE

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	8			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	8			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ACERO REFUERZO CY 4.800	KG	EDIFICIO ALOJAMIENTO NIVEL NIVEL 02	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA REANUDA ACTIVIDADES EL DIA DE HOY POSTERIOR A LA SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL REALIZADA POR LA POLICIA NACIONAL DEBIDO AL 37° FESTIVAL DE LA COCHUANA. EN PTO GAITAN.

SE INICIA EL AMARRE, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO NUEVO DE ALOJAMIENTO. LA CONFORMACION DE REFUERZO SE REALIZA CONFORME A LO DISPUESTO EN PLANOS ESTRUCTURALES Y APROBADO POR INTERVENTORIA.

DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EN EL EDIFICIO EXISTENTE LA DEMOLICION DE PISOS, DESMONTE DE SANITARIOS Y DESMONTE DE CIELO RASO.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 01 JULIO 2026 MIERCOLES	HORAS DE LLUVIA: DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR								
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
DEMOLICION MANUAL MURO	M2	ALOJAMIENTOS EXISTENTES	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL CONTRATISTA CONTINUA LLEVANDO A CABO EL DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS DE CASA BLANCA, DEMOLICION DE PISOS Y MUROS., DESMONTE DE CIELO RASOS ASI COMO EL DESMONTE DE CIELO.

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL FIGURADO Y AMARRE DE REFUERZO PARA COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL DE ALOJAMIENTOS NUEVOS, SE REALIZO EL AMARRE DE ACERO DE REFUERZOS CONFORME A LOS PLANOS ESTRUCTURALES SUMINISTRADOS POR LA INTERVENTORIA.

ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 02 JULIO JUEVES	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
DESMONTES PISOS Y BANCOS	ML	ALOJAMIENTOS ANTIGUOS.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY CONTINUA CON LA INSTALACION

DE MAMPOSTERIA PARA DIVICIONES DE LOS ALOJAMIENTOS EN EL PRIMER PISO DE CASA BLANCA, ASI MISMO CONTINUA CON LA DEMOLICION Y DESMONTE DE VENTANAS EN EL PRIMER PISO

POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN HORAS DE LA MAÑANA EL CONTRATISTA SE VE AFECTADO EN EL RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA CONFORMACION DE COLUMNAS Y VIGAS DE PLACA DE CUBIERTA.

5747

ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 23 JUNIO 2026 VIERNES	HORAS DE LLUVIA: 7:00 - A - 11:00 A.M.
PLAZO ACTUAL: 3 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
MURO EN BLOCK CERCA #4	M2	ALOJAMIENTOS NUEVOS.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

5748

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
ALCALDÍA DE PUERTO CASTILLA META	Infraestructura			Puerto Castilla
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY LA CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO ACTIVIDADES EN CASA BLANCA, DEMOLICION DE MUROS Y PISOS.

SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE COLUMNAS ACORDE CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN EL PRIMER PISO DE LOS ALCANTARILLADOS NUEVOS, SE COLOCA VARILLA 6mm EN LA Y HILADAS, SE REALIZA PERFORACION CON TALADRO PARA EL ANCLAJE DE VARILLAS 1/2" PARA COLUMNETAS EN LA MAMPOSTERIA.

LAS FOTOS PRESENTADAS RETRATAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 JULIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: 5 HORAS DE 6:00 AM A 10:30 AM DE 2:00 PM A 3:00 PM

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
MURO EN BLOQUE ELEVACION #4	M2	ALOJAMIENTOS NUEVOS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	Infraestructura			Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN LOS ALOJAMIENTOS ANTIGUOS (CASO BLANCO) REALIZA ANCLAJES CON VARILLA 1/2" PARA COLUMNETAS, CON PASO CADA 20CM 1/4" SE CONFORMAN VIGUETAS Ø3/8" CON ESTRIBOS 1/4 C/20CM

SE CONTINUA REALIZANDO LA CONFORMACION DE COLUMNAS EN ACERO REFUERZO PARA EL SEGUNDO NIVEL (CAMARAS ACERO REFUERZO)

LAS ACTIVIDADES DE OBRA SIGUEN AFECTADAS POR LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON

5751

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 05 JULIO 2026 DOMINGO	HORAS DE LLUVIA: 4 Horas lluvia

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos		
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas		
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas		
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	3			Guantes		
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas		
AYUDANTE	10					Alcohol		
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL DIA DE HOY NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA POR SER DOMINGO, SE LLEVO A CABO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 06 JULIO 2026 LUNES	HORAS DE LLUVIA: DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
ACERO REFUERZO FY 420 N/MM2	Kg	ALOJAMIENTOS NUEVOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA DEMOLICION DE ENCHAPE PARED EN ALOJAMIENTO ANTIGUO (CASA BLANCA) CONTINUA ENCOFRANDO VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CASA BLANCA.

SE CONTINUA CON EL AMARRE Y CONFORMACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL EN LOS ALOJAMIENTOS NUEVOS.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN EL PRIMER NIVEL DE LOS ALOJAMIENTOS NUEVOS, ACORDE CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DETALLES ESTRUCTURALES APROBADOS POR INTERVENTORIA.

5955

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 07 Julio 2026 Martes	HORAS DE LLUVIA: 2 Horas lluvias moderadas.

PLAZO ACTUAL	8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Demolicion Pared Ceramica	M2	Alojamientos Antiguos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL CONTRATISTA CONTINUA EL DESMONTE DE ENCHAPE DE PISO SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MAMPOSTERIA Y ENCAMADO DE VIGUETAS Y COLUMNETAS PARA MAMPOSTERIA EN LOS ALOJAMIENTOS EXISTENTES PRIMER NIVEL (CASA BLANCA

SE CONTINUA CON EL AMARRE - FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LOS ALOJAMIENTOS NUEVOS. ACORDE A LOS PLANOS ESTRUCTURALES. DEBIDAMENTE APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.

SE CONTINUA INSTALANDO MAMPOSTERIA EN EL PRIMER NIVEL DE LOS ALOJAMIENTOS. NUEVOS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 08 JULIO 2026 MIERCOLES	HORAS DE LLUVIA: 1 Hora

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	2			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA	0							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
COLUMNAS CONCRETO 3.000 PSI	M3	ALOJAMIENTOS MUJERES	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL CONTRATISTA CONFORMA VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ELABORADO EN OBRA PARA LA MAMPOSTERIA DEL PRIMER NIVEL DE ALOJAMIENTOS ANTIGUOS (CASA BLANCA)

EL CONTRATISTA INICIA EL MONTAJE DE CANASTAS EN ACERO DE REFUERZO PARA LAS COLUMNAS DEL NIVEL 02 DE ALOJAMIENTOS NUEVOS

SE INICIA EL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CON VARILLA 5/8" Y CICLO 3/8" PARA VIGAS DE CUBIERTA SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES APROBADOS POR INTERVENTORIA.

5284

ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 09 JULIO 2026 JUEVES	HORAS DE LLUVIA: 3H DIA SOMNOLIENTO NUEVO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	2	MEZCLADORA DE CONCRETO	1			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	1			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	19					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
COLUMNAS CONCRETO 3.000 PSI	M3	ALOJAMIENTOS NUEVOS 2 PISO	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme

NC: No Conforme

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
RESIDENTE DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL CONTRATISTA CONFORMO EN CONCRETO DE 3.000 PSI COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL EJE 1-A, EJE 2-A, EJE 3-A

SE CONTINUA CONFORMANDO VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA LA MAMPOSTERIA DEL NIVEL II DE ALOJAMIENTOS ANTIGUOS (CASA BLANCA) ACORDE CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS

SE CONTINUA CON EL AMARRE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CUBIERTA EN VARILLA 5/8 Y EJES 3/8 SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 10 JUNIO 2026 VIERNES.	HORAS DE LLUVIA: NINGUNO 1 HORA

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	1	X		Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	1	X		Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ACERO ARGOLLADO FY 420 N.O	Kg	ALOJAMIENTOS NUEVOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ALCALDÍA DE PUERTO SANTANDER	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL FIGURADO, AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CONFORMACION DE VIGAS DE CORBIATA EN VARILLA 5/8" Y FLEJE 1/4" SEGUN DISEÑOS ESTRUCTURALES.

EL CONTRATISTA CONFORMA EL DIA DE HOY 4 COLUMNAS, EJE 1-C EJE 2-C. EJE 3-B Y EJE 2-D. EN CONCRETO DE 3.000PSI

SE INICIA LA INSTALACION DE DUCTOS CONDUIT PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, CAJAS, SB00 Y CAJAS DE CIRCUITOS. EN MUROS DEL PRIMER PISO DE ALOJAMIENTOS ANTIGUOS. (CASA BLANCA)

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META"	**OBJETO:** "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 11 JULIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: 0 SOLEADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	1	X		Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	1	X		Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
COLUMNAS EN CONCRETO 3.000	M3	ALOJAMIENTOS NUEVOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	Infraestructura			Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA TOMA MUESTRAS DEL CONCRETO PARA LAS COLUMNAS CONFORMADAS Y EN TOTAL UBICADAS EN LOS EJES. EJE 2-D, EJE 3-E, EJE 1-F, EJE 2-F, EJE 3-F EJE 3-E, EJE 2-H. PARA EL SEGUNDO NIVEL DE ALOJAMIENTOS NUEVOS. SE CONFORMARON EN CONCRETO DE 3.000 PSI
EL CONTISTA, CONTINUA INSTALANDO CAJAS PARA TOMA CORRIENTES, C. INTERRUPTORES Y CAJAS DE CIRCUITOS, ASI COMO TUBERIA CONDUIT. EN LOS ALOJAMIENTOS ANTIGUOS (CASA BLANCA) PRIMER NIVEL.

EL CONTRATISTA CONTINUA EL ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CUBIERTA EN ACERO 5/8" Y 3/8 SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

5765

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 12 JULIO 2026 DOMINGO	HORAS DE LLUVIA: 4 HORAS.

PLAZO ACTUAL	2 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
OPERARIO		VOLQUETA				Botas		
AYUDANTE						Alcohol		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
				C	NC
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL DIA DE HOY ES DOMINGO, EL CONTRATISTA NO REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.

5767

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 13 JUNIO 2025 LUNES	HORAS DE LLUVIA: 0 SOLEADO.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	1	X		Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	1	X		Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI	173	ALOJAMIENTOS NUEVOS.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL DIA DE HOY ES FESTIVO, EL CONTRATISTA CONFORMO EN CONCRETO DE 3.000 PSI LAS COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL E LOS ALOJAMIENTOS NUEVOS. ENTRE LOS EJES.

EJE 1-H, EJE 1-I, EJE 2-I, EJE 1-K, EJE 2-K, EJE 3-K
EJE 3-J.

CONCLUYENDO DE ESTA MANERA LAS COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL CON ALTURA 2,65 Y SECCION 30cm x 30cm.

5769

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	**OBJETO:** "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	**RESIDENTE:** JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 14 JULIO 2026 MARTES	**HORAS DE LLUVIA:** 2 H. NIVEL TRANSCURSO

PLAZO ACTUAL	3 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
DEMOLICION MANUAL MURO INCOMP	ML	ALOJAMIENTOS ANTIGUOS.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL CONTRATISTA DESENCOFRA LAS COLUMNAS CONFORMADAS EL DIA ANTERIOR, Y LAS CUBRE CON PAPEL VINILPEL PARA EL FRAGUADO

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE MUROS EN EL EDIFICIO CASA BLANCA EN EL PRIMER PISO., SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE ENCHAPES EN PARED.

EL CONTRATISTA INICIA PEGA DE MAMPOSTERIA EN EL PRIMER PISO DE ALOJAMIENTOS NUEVOS, SEGUN PLANOS ARQUITECTONICOS.

5791

ALCALDIA DE PUERTO GAITAN META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 15 JULIO 2026 MIERCOLES	HORAS DE LLUVIA: 4 H SE PRESENTA LLUVIAS DE 8:00 AM - 11:00 AM Y 1:00 PM A 3:00 PM

PLAZO ACTUAL	8 MESES.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA				Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA				Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
MURO EN FILERA #4	M2	CASA BLANCA Y ALOJ. NUEVOS.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA INSTALACION DE MURO FIBRA EN EL PRIMER PISO DE LOS ALOJAMIENTOS NUEVOS, SEGUN PLANOS ARQUITECTONICOS., SE PEGA MAMPOSTERIA A NIVEL DE 4 HILADAS.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE FIBRA #4 EN EL SECTOR DE CASA BLANCA EN E PRIMER PISO.

ASI MISMO SE CONTINUA LA DEMOLICION DE MUROS Y PISOS. EN EL PISO 01 DEL CASA BLANCA.

5773

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 16 JULIO 2026 JUEVES.	HORAS DE LLUVIA: 3HORAS LLUVIA DE 2AM A 7:00AM

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
MURO MEDIA #4	M2	CASA BLANCA Y ALOJAMIENTOS NUEVOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

5794

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
ALCALDIA DE PUERTO CARTAGENA	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SE CONTINUA CON LA OBRA DE MAMPOSTERIA E LADRILLO PEGA #4, TENIENDO ENCUENTA LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DE ALOJAMIENTOS NUEVOS Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES EL CONTRATISTA PEGA MAMPOSTERIA HASTA EL 4 HILADA DE LADRILLO

EL CONTRATISTA CONTINUA APAÑETANDO LA PARTE INTERIOR DE LOS MUROS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CASA BLANCA. Y ASI MISMO CONTINUA LA DEMOLICION DE ENCHAPES EN MURO.

EL DIA DE HOY EN HORAS DE LA TARDE SE SUMINISTRO ACERO DE REFUERZO 4MM, 3/8, 1CORTE Y VARILLA DE 1/4 PARA COLUMNETAS Y VIGUETAS EN MAMPOSTERIA.

LAS LLUVIAS OCACIONADAS EN HORAS DE LA TARDE OCASIONAN BAJOS RENDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 JULIO 2026 VIERNES	HORAS DE LLUVIA: 1 Hora lluvia 12:45 pm A 2:00 PM

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
MURO FILA # 4	M2	CASA BLANCA Y ALOJAMIENTO NUEVO	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY SE INICIA EL CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CONFORMACION DE VIGUETAS Y COLUMNETAS DEL PISO 01 DEL SECTOR ALOJAMIENTOS NUEVOS.

SE CONTINUA CON LA MAMPOSTERIA EN LADRILLO FLEXO #4 PARA LA CONFORMACION DE MURO EN EL PRIMER PISO DE ALOJAMIENTOS NUEVOS., SE INSTALAN 2 VARILLAS CMAL A LA ALTURA DE 4 HILADAS DE LADRILLO, SE COLOCA MEZCLA DE PEGA Y SE CONTINUA INSTALANDO LADRILLO

SE CONTINUA PAÑETANDO LA MAMPOSTERIA UBICADO EN EL EDIFICIO CASA BLANCA SEGUN PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL DIA DE HOY LLEGO EL PEDIDO DE CANOAS, CUCHARA, PARALES PARA CONFORMACION DE VIGA ENTRE PISOS.

5277

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 18 JULIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: 5 Horas lluvias fuertes.

PLAZO ACTUAL	8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	9					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
PAÑETE MURO INTERIOR 1:4	M2	ALOJAMIENTO EXISTENTE CB	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
ALCALDÍA DE PUERTO SANTANDER	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA INICIA EL MONTAJE DE CAMILLA, ANDAMIOS, PO-RALES Y CERCHAS PARA SOPORTAR EL ACERO DE REFUERZO DE LA LOSA DE CUBIERTA.

SE CONTINUA CON UN FRENTE REALIZANDO EL PAÑETE DE LOS MUROS INTERIORES DEL EDIFICIO CASA BLANCA
EL CONTRATISTA INSTALA EL ACERO DE REFUERZO PARA LAS COLUM. NETAS EN VARIOS PUNTOS DEL EDIFICIO NUEVO DE ALOJAMIENTOS. COLOCA TRAMOS DE 30cm CON VARILLA DE 1/2" ANCLADOS CON EPOXICO EN LA PLACA DE PISO, UBICADOS SEGÚN CORRESPONDA EN PLANOS. ; CON FLEJES 1/4 CADA 30cm Y 2 VARILLAS 1/2"

SE CONTINUA CON LA PEGA DE LADRILLO FLEXA #4 EN EL EDIFICIO NUEVO DE ALOJAMIENTOS PRIMER PISO.

SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES POR LO QUE SE SUSPENDIO LA ACTIVIDAD DE ENCOFRADO PARA LA VIGA DE CUBIERTA POR EL RIESGO DE CAMPOS ELECTRICOS (RAYOS) Y DESLIZAMIENTO POR LLUVIAS EN LA FORMALETA.

5279

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 JULIO 2026 DOMINGO	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR								
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER BECERRA	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA NO REALIZO ACTIVIDADES EN OBRA YA QUE ES DOMINGO.

5481

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 20 JUNIO 2026. LUNES.	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS Llovio 1:00 la tarde.

PLAZO ACTUAL	3 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	✓	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	✓	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	✓	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	✓	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	✓	
AYUDANTE	10					Alcohol	✓	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
				C	NC
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI ✓	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI ✓	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI ✓	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO ✓
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO ✓	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO ✓

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

5782

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY ES FESTIVO 20 DE JULIO DIA DE LA INDEPENDENCIA A LO CUAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA TENIENDO EN CUENTA POR DICHOS QUE SE LABORO INTERNAMENTE EN UNA ESTACION DE POLICIA

5783

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 21 JULIO 2026 MARTES	HORAS DE LLUVIA: DIA SOLEADO

PLAZO ACTUAL	3 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ACERO REFUERZO FY 420 M.P.	Kg	ALOJAMIENTOS NUEVOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY CONTINUO LLEVANDO A CABO EL MONTAJE DE CAMILLAS, CERCHAS Y PANALES PARA EL SOPORTE DE BASE DE EL ACERO DE REFUERZO DE LA VIGA DE CIMENTACION

ASI MISMO SE CONTINUO CON EL CORTE, DOBLADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO.

SE CONTINUA CON LA PEGA DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO FISCAL #4 PARA CONFORMAR MUROS DEL PRIMER PISO DE LOS ALOJAMIENTOS NUEVOS.

SE FUNDEN COLUMNETAS PARA MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE 3.000PSI

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE PAÑETE INTERIOR 1:4. EN LOS ALOJAMIENTOS EXISTENTES PISO 01.

SABS

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

NÓMINA DEL PERSONAL

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

NIT 902,011,453-2

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Datos del Afiliado		Nove			DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R	DIAS	SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 8192573	GAITAN GAITAN VICENTE			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1006946002	GALINDO GAITAN YESID			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 17340851	GUTIERREZ VEGA MARTIN OMAR	X		16	933.816	132.851	1.066.667	37.353	37.353	74.705	991.961	
CC 1101450750	VERBEL SOLIS DAVID	X		17	992.180	141.154	1.133.333	39.687	39.687	79.374	1.053.959	
CC 1121852433	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES			30	3.558.750	-	3.558.750	142.350	142.350	284.700	3.274.050	
CC 1121863524	JENNY PAOLA FERIA TRIANA			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121867537	YONLI YULIETH LOZANO GONZALEZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121884993	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1122144736	MARGIE DANIELA HERRERA PAEZ		X	5	291.818	41.516	333.333	11.673	11.673	23.345	309.988	
CC 1124992965	GALINDO NARIÑO JUAN RAMON	X		17	992.180	249.095	1.241.275	39.687	39.687	79.374	1.161.900	
CC 1125549456	JUAN MARTIN BOLIVAR GAITAN			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 17310424	GONZALO BECERRA MEJIA			30	1.750.905	249.095	2.000.000	-	70.036	70.036	1.929.964	
CC 74857071	DAGOBERTO CORTES			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 80166369	MARCOS DIDIER DELGADILLO DELGADILLO			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 86008125	AGUSTIN AGUILAR GONZALEZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
PT 1824421	MARTINEZ GIL ROBINSON GREGORIO	X		17	992.180	141.154	1.133.333	-	39.687	39.687	1.093.646	
CC 86055645	OSCAR ALEXANDER PATIÑO PEREZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1193092733	RIVERA MARTINEZ BRAYAN STEVEN			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 93372770	SEGUNDO ROA CRUZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
					30.522.887	3.944.004	34.466.691	1.111.184	1.220.907	2.332.092	32.134.600	

PROYECTO:

CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ
T.P 187,220-T
CONTADOR

ELABORO

CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ
T.P 187,220-T
CONTADOR

APROBO

INGRID MARYORY GARCIA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITAN

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

NIT 902,011,453-2

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Datos del Afiliado		Nove			DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R	DIAS	SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1125004759	GALINDO MARIÑO RUBEN	X		6	350.181	49.819	400.000	14.007	14.007	28.014	371.986	
CC 1124820136	AMAYA BARRERA EDGAR	X		6	350.181	49.819	400.000	14.007	14.007	28.014	371.986	
CC 8192573	GAITAN GAITAN VICENTE			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1006946002	GALINDO GAITAN YESID			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 17340851	GUTIERREZ VEGA MARTIN OMAR			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1101450750	VERBEL SOLIS DAVID			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121852433	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES			30	3.558.750	-	3.558.750	142.350	142.350	284.700	3.274.050	
CC 1121863524	JENNY PAOLA FERIA TRIANA			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121867537	YONLI YULIETH LOZANO GONZALEZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121884993	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1124992965	GALINDO NARIÑO JUAN RAMON			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1125549456	JUAN MARTIN BOLIVAR GAITAN			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 17310424	GONZALO BECERRA MEJIA			30	1.750.905	249.095	2.000.000	-	70.036	70.036	1.929.964	
CC 74857071	DAGOBERTO CORTES			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 80166369	MARCOS DIDIER DELGADILLO DELGADILLO			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 86008125	AGUSTIN AGUILAR GONZALEZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
PT 1824421	MARTINEZ GIL ROBINSON GREGORIO			30	1.750.905	249.095	2.000.000	-	70.036	70.036	1.929.964	
CC 86055645	OSCAR ALEXANDER PATIÑO PEREZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1193092733	RIVERA MARTINEZ BRAYAN STEVEN			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
PT 1755999	MARTINEZ GIL AVARO LUIS	X		2	116.727	16.606	133.333	4.669	4.669	9.338	123.995	
CC 93372770	SEGUNDO ROA CRUZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
					34.141.224	4.350.859	38.492.083	1.225.577	1.365.649	2.591.226	35.900.858	

PROYECTO:

CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ
T.P 187,220-T
CONTADOR

ELABORO

CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ
T.P 187,220-T
CONTADOR

APROBO

INGRID MARYORY GARCIA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

艾贝思（天津）钢铁有限公司
IBC (TIANJIN) INDUSTRIAL CO.,LTD

产品质量证明书
QUALITY CERTIFICATE

天津南开区高新信息产业C座 808室 邮编 300384
RM 808 BUILDING C,HITECH INFORVATION PLAZA
NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA 300384 TEL: 022-85397228

CUSTOMER NAME/客户名称： ARCOE S.A.S

COMMODITY/品名： ANNEALED WIRE

SPEC/规格： SAE 1006

CERTIFICATE NO./质保证书号： IBC250320F25

DATE OF ISSUE/开证： MAR.20,2025

INVOICE NO./发票号： IUS-202502-005

SIZE 规格	BATCH NO. 批号	BAGS 袋数	NET Weight 重量 (TONS)	CHEMICAL ANALYSIS化学成分 %					MECHANICAL PROPERTIES/物理性能			
				C	Si	Mn	P	S	T.S (Mpa)	EL(%)	180° Cold Bending B.T	SURFACE
1.47MM	D25-031510	136	136	0.05	0.038	0.32	0.024	0.020	364	31.5	OK	GOOD
TOTAL		136	136									
SURVEYOR TO	NOTES T.S : Tensile Strength/拉伸强度 EL : Elongation/延伸率									Inspector 检验员		
	WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE. 兹证明本表所列产品，均按标准进行制造及试验，并且符合规范之要求											

Scanned with CamScanner

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO
Dirección: CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO
Teléfono: 6713424

Fecha Impresión: 2026/05/17
Nro.Remisión: 187358497

Nro.Informe: 173528
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018772	1468	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018774	1465	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018782	1465	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018784	1485	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018828	1404	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018829	1505	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018830	1478	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001901F	1458	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019446	1875	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019447	1462	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019448	1455	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019451	1455	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001952J	1448	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001961K	1462	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001961L	1465	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001961P	1445	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001964C	1438	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019725	1448	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.



Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8007443	BNS001964C	0.26	0.99	0.014	0.23	0.019	0.022	0.210	0.070	0.20	0.003	0.46
C8007443	BNS0019725	0.27	0.92	0.012	0.25	0.024	0.025	0.230	0.070	0.16	0.004	0.46
C8007443	BNS001952J	0.27	0.92	0.014	0.25	0.026	0.032	0.230	0.070	0.25	0.003	0.45
C8007443	BNS001961K	0.26	0.99	0.014	0.23	0.019	0.022	0.210	0.070	0.20	0.003	0.46
C8007443	BNS001961L	0.26	0.99	0.014	0.23	0.019	0.022	0.210	0.070	0.20	0.003	0.46
C8007443	BNS001961P	0.26	0.99	0.014	0.23	0.019	0.022	0.210	0.070	0.20	0.003	0.46
C8007443	BNS0019446	0.27	0.96	0.013	0.23	0.022	0.022	0.210	0.070	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0019447	0.27	0.96	0.013	0.23	0.022	0.022	0.210	0.070	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0019448	0.27	0.96	0.013	0.23	0.022	0.022	0.210	0.070	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0019451	0.27	0.96	0.013	0.23	0.022	0.022	0.210	0.070	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS001901F	0.28	0.91	0.014	0.22	0.027	0.027	0.220	0.070	0.20	0.004	0.46
C8007443	BNS0018828	0.26	0.98	0.015	0.21	0.025	0.028	0.230	0.060	0.20	0.003	0.45
C8007443	BNS0018829	0.26	0.98	0.015	0.21	0.025	0.028	0.230	0.060	0.20	0.003	0.45
C8007443	BNS0018830	0.26	0.98	0.015	0.21	0.025	0.028	0.230	0.060	0.20	0.003	0.45
C8007443	BNS0018772	0.28	0.90	0.015	0.22	0.032	0.030	0.250	0.080	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0018774	0.28	0.90	0.015	0.22	0.032	0.030	0.250	0.080	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0018782	0.28	0.90	0.015	0.22	0.032	0.030	0.250	0.080	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0018784	0.28	0.90	0.015	0.22	0.032	0.030	0.250	0.080	0.21	0.004	0.46

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8007443	BNS001964C	476	622	18.56	SinGrieta	1.31	20260513
C8007443	BNS0019725	480	631	16.40	SinGrieta	1.32	20260514
C8007443	BNS001952J	500	660	15.29	SinGrieta	1.32	20260513
C8007443	BNS001961K	476	622	18.56	SinGrieta	1.31	20260513
C8007443	BNS001961L	476	622	18.56	SinGrieta	1.31	20260513
C8007443	BNS001961P	476	622	18.56	SinGrieta	1.31	20260513
C8007443	BNS0019446	489	647	15.82	SinGrieta	1.32	20260512
C8007443	BNS0019447	489	647	15.82	SinGrieta	1.32	20260512
C8007443	BNS0019448	489	647	15.82	SinGrieta	1.32	20260512
C8007443	BNS0019451	489	647	15.82	SinGrieta	1.32	20260512
C8007443	BNS001901F	505	674	16.45	SinGrieta	1.34	20260511
C8007443	BNS0018828	481	641	15.96	SinGrieta	1.33	20260510
C8007443	BNS0018829	481	641	15.96	SinGrieta	1.33	20260510
C8007443	BNS0018830	481	641	15.96	SinGrieta	1.33	20260510
C8007443	BNS0018772	490	649	15.25	SinGrieta	1.32	20260509
C8007443	BNS0018774	490	649	15.25	SinGrieta	1.32	20260509
C8007443	BNS0018782	490	649	15.25	SinGrieta	1.32	20260509
C8007443	BNS0018784	490	649	15.25	SinGrieta	1.32	20260509

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Angulo Resalte
		mm	Kg/m	mm	mm	°
C8007443	BNS001964C	6.08	0.560	0.57	2.34	53
C8007443	BNS0019725	6.10	0.563	0.57	2.34	53
C8007443	BNS001952J	6.06	0.564	0.53	2.32	53
C8007443	BNS001961K	6.08	0.560	0.57	2.34	53
C8007443	BNS001961L	6.08	0.560	0.57	2.34	53
C8007443	BNS001961P	6.08	0.560	0.57	2.34	53
C8007443	BNS0019446	6.06	0.564	0.53	2.15	53
C8007443	BNS0019447	6.06	0.564	0.53	2.15	53
C8007443	BNS0019448	6.06	0.564	0.53	2.15	53
C8007443	BNS0019451	6.06	0.564	0.53	2.15	53
C8007443	BNS001901F	6.07	0.563	0.49	2.22	50
C8007443	BNS0018828	6.07	0.562	0.61	2.15	55
C8007443	BNS0018829	6.07	0.562	0.61	2.15	55
C8007443	BNS0018830	6.07	0.562	0.61	2.15	55
C8007443	BNS0018772	6.02	0.565	0.52	2.30	53
C8007443	BNS0018774	6.02	0.565	0.52	2.30	53
C8007443	BNS0018782	6.02	0.565	0.52	2.30	53
C8007443	BNS0018784	6.02	0.565	0.52	2.30	53

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

5793

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONDUIT

Fabricado por **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia: **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 979 (2021)

Plásticos. Tubos y curvas de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC rígido) para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico

Plastics. Unplasticized poly (vynil chloride) (PVC-U) pipes and bends for conduits housing and protecting

SECTOR ICS 29.120.10 - 83.080,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-3
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1977-03-30	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ANAB

F-PS-028
Versión 00

Powered by CamScanner

CSA
INGENIERIA LTDA

Nit. 900.301.388-9

II°C022.05574

CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO EN EL CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS, SUELOS Y ASFALTOS PARA PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL

Villavicencio, 13 de febrero de 2026

LAB-026-0415

Señor(es):
LADRILLERA DEL META SA
Ciudad

PROYECTO: Muestras para control de calidad
CONTENIDO: Ensayo de resistencia a la Compresión

Cordial saludo,

A continuación, adjuntamos los resultados de las pruebas de los bloques de arcilla enviados al laboratorio para realizarle el ensayo de resistencia a la compresión. Las muestras se determinaron como mampostería de perforación horizontal.

Anexamos formato de laboratorio, especificando el elemento, días de curado, fecha de ensayo, absorción, contenido de humedad, densidad, área neta y valor de resistencia del espécimen.

En cuanto a la absorción por unidad, la norma establece que no debe exceder el 16% por lo que las muestras cumplen.

Estos ensayos se han realizado con la Norma Técnica ICONTEC NTC 4017 - 4024 - 4026 – 4076 y corresponden exclusivamente a las muestras analizadas en Laboratorio.

En espera de sus comentarios y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

GINA LILIANA CUERO RODRIGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO

Powered by CamScanner

CSA INGENIERIA S.A.S

UNIDADES (BLOQUES Y LADRILLOS) DE CONCRETO Y ARCILLA, PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL

Codigo:PML-F73
Fecha:01.11.2015
Version 1

CLIENTE: LADRILLERA DEL METASAS

PROYECTO: MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD

UBICACION: MUNICIPIO DE LLANOGRANDE, DEPARTAMENTO DEL META

ESPECIFICACIONES: RESISTENCIA A COMPRESIÓN

NORMA TECNICA: NTC-637 - 4026 - 4076

Descripción	Nº de Ladrillos	Fecha Fundida	Dias de Curado	Fecha de Rotura	Peso muestra Seca (grs)	Peso Saturado (grs)	Peso Inmersión (grs)	Peso muestra seca (grs)	Absorcion Ab/Kg/m3	Absorcio Ab %	Contde Hum %	Densidad Kg/m3	Altura promedio cms	Area cm2	Carga Aplicada	Resistencia Kg/cm2	Resistencia PSI	Resistencia Mpa
BLOQUE #5	1	31-ene	14	13-feb	4430	4965	2720	4410	226,54	11,2	4,0	2018,3	20,00	103,25	2370	23,3	3353	2,6
STANDAR	2	31-ene	14	13-feb	4430	4955	2695	4340	230,23	11,4	2,0	2018,5	20,20	105,44	2369	19,5	283,4	2,0
12X20X30					PROMEDIO					11,3		2018,5				22,9	3273	2,3
BLOQUE #4	1	31-ene	13	13-feb	3550	3975	2170	3530	213,84	11,0	2,5	1933,4	20,00	90,25	3646	40,4	577,1	4,0
LLANERITO	2	31-ene	13	13-feb	3540	3950	2095	3533	186,97	9,3	3,0	2030,0	19,90	88,14	2318	32,7	467,6	3,3
9X20X30					PROMEDIO					10,2		1981,7				36,6	522,4	3,7
BLOQUE #48	1	2-feb	11	13-feb	3550	4410	2375	3950	226,64	11,6	0,0	1941,0	22,30	91,26	2317	25,4	362,7	2,5
BOGOTA	2	2-feb	11	13-feb	3970	4360	2340	3953	210,78	10,9	4,7	1935,3	22,00	92,73	1372	14,8	211,4	1,5
9X22X31					PROMEDIO					11,3		1938,7				20,1	287,0	2,0

Yoban Bermudez U.
Laboratorista

Gina Liliana Cuero Rodriguez
Director Técnico

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	UNIDADES (BLOQUES Y LADRILLOS) DE CONCRETO Y ARCILLA, PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	Código: LAB-026 Fecha: 01.11.2016 Versión: 1

CLIENTE	LADRILLERA DEL META S.A.S
PROYECTO	MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
OBSERVACIONES	RESISTENCIA A COMPRESIÓN
NORMA TECNICA	NTC 4017 - 4024 - 4026 - 4076

Descripción	N° de Ladrillos	Fecha Fundida	Días de Curado	Fecha de Rotura	Peso muestra llegada (grs)	Peso Saturado (grs)	Peso Inmersión (grs)	Peso muestra seca (grs)	Absorción As Kg/m3	Absorción As %	Cont de Hum %	Densidad Kg/m3	Altura promedio cms	Area neta cm2	Carga Aplicada	Resistencia Kg/cm2	Resistencia PSI	Resistencia Mpa
BLOQUE # 4 STANDAR 10X20X30	1	2-feb	11	13-feb	3960	4405	2355	3950	221,95	11,5	2,2	1926,8	20,00	102,50	2722	26,6	379,4	2,7
	2	2-feb	11	13-feb	3950	4340	2400	3940	206,19	10,2	2,5	2030,9	20,00	97,00	3093	31,9	455,5	3,2
							PROMEDIO			10,8		1978,9				29,2	417,4	2,9

Laboratorista
Yoban Bermudez U.

Director Técnico
Gina Liliana Cuero Rodriguez

Cualquier copia o alteración de este documento sin autorización de CSA Ingeniería y Laboratorios S.A.S. será sancionada según la ley 23 de 1982

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**	Fecha Impresión	**25/11/08**	Informe N°:	**134279**
Dirección:	**CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**	No. Remisión:	**187266409**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**6713424**	Página:	**1 de 6**	Centro:	**Centro Planta Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P *	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V *
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158416	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.16	0.019	0.012	0.45	0.167	0.053	0.130	0.004
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.92	0.15	0.012	0.012	0.46	0.183	0.051	0.128	0.004

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Mo *
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158416	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	0.041
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	0.019

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO** Fecha Impresión **25/11/08** Informe N°: **134279**
Dirección: **CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO** No. Remisión: **187266409** Informe Ant N°:
Teléfono: **6713424** Página: **2 de 6** Centro: **Centro Planta Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158416	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	476	628	16	SinGrieta	1.32	20251022
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	489	624	17	SinGrieta	1.28	20251021

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.

No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**
Dirección: **CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**
Teléfono: **6713424**

Fecha Impresión **25/11/08**
No. Remisión: **187266409**
Página: **3 de 6**

Informe N°: **134279**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Planta Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158416	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	1.561	1.15	3.9	10.4
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	1.530	0.92	3.6	10.4

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.

No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social:	**Ternium Colombia S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**890932389-8**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**	Fecha Impresión	**25/11/08**	Informe N°:	**134279**
Dirección:	**CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**	No. Remisión:	**187266409**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**6713424**	Página:	**4 de 6**	Centro:	**Centro Planta Manizales**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte °
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158416	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	60

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Composición Química: NTC 5192: 2024 Num. 9.1.2 (ASTM E415) NTC 5231: 2024
* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 NTC 3353: 2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2024
* Doblado: NTC 2289:2020 Num. 10, NTC 3353: 2024, Num. 15, NTC 1:2024
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**
Dirección: **CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**
Teléfono: **6713424**

Fecha Impresión **25/11/08** Informe N°: **134279**
No. Remisión: **187266409** Informe Ant N°:
Página: **5 de 6** Centro: **Centro Planta Manizales**

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% C	± 0.009935 %
% Mn	± 0.0125 %
% Si	± 0.0200 %
% S	± 0.0021 %
% P	± 0.0013 %
% Cr	± 0.0145 %
% Ni	± 0.0071 %
% Cu	± 0.0098 %
% V	± 0.0009 %
% Nb	± 0.0005 %
% Mo	± 0.0035%
Resistencia a la Fluencia	± 7.46 MPA
Resistencia a la Tracción	± 6.32 MPA
Alargamiento	± 0.42 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 2 %
Espaciamiento	± 1 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**	Fecha Impresión	**25/11/08**	Informe N°:	**134279**
Dirección:	**CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**	No. Remisión:	**187266409**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**6713424**	Página:	**6 de 6**	Centro:	**Centro Planta Manizales**

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Angulo de Resalte	± 0.16 °
Peso metro (masa)	± 0.72%

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROALCO Bekaert	INFORME DE ENSAYO DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO	FO-01-11
		VERSION	8

INFORME DE ENSAYO N°
DCEM 036 2026

FECHA DE ELABORACION
11/02/2026

OC	CLIENTE	CIUDAD
NA	GYJ FERRETERIAS SAS	VILLAVICENCIO
PRODUCTO :	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,50mm X 25Kg	

CODIGO DEL PRODUCTO:	270095	N° FACTURA	FABQ-26776
		DESARROLLO:	NA
		FICHA TÉCNICA :	FT-PL-10

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS							
ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE ÁREA (%)	OVALIDAD	
	N/A	1,50 +/- 0,02	Max 42	NO APLICA	NO APLICA	MAX 0,02	

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
117	25	2925

OBSERVACIONES :

Material libre de Radiactividad.

Jesús herrera.

REALIZO : auxiliar de calidad proalco bekaert
CONTROL CALIDAD

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO
Dirección: CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO
Teléfono: 6713424

Fecha Impresión: 2026/04/30
Nro.Remisión: 187349721

Nro.Informe: 170400
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001503C	1997	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001503D	1997	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001503E	1955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513J	1979	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513K	1985	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513L	1961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513M	1985	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513N	1973	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513P	1961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513Q	2003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513R	2003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513S	1985	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS0015181	1955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS0015195	1967	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS0015196	1961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS0015197	1979	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8001348	BNS0015181	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS0015195	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS0015196	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS0015197	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513J	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513K	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513L	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513M	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513N	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513P	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513Q	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513R	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513S	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001503C	0.28	0.87	0.016	0.25	0.025	0.027	0.230	0.080	0.19	0.003	0.46
C8001348	BNS001503D	0.28	0.87	0.016	0.25	0.025	0.027	0.230	0.080	0.19	0.003	0.46
C8001348	BNS001503E	0.28	0.87	0.016	0.25	0.025	0.027	0.230	0.080	0.19	0.003	0.46

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001348	BNS0015181	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS0015195	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS0015196	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS0015197	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513J	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513K	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513L	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513M	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513N	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513P	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513Q	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513R	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513S	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001503C	473	613	17.4	SinGrieta	1.29	20260429
C8001348	BNS001503D	473	613	17.4	SinGrieta	1.29	20260429
C8001348	BNS001503E	473	613	17.4	SinGrieta	1.29	20260429

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Angulo Resalte
		mm	Kg/m	mm	mm	°
C8001348	BNS0015181	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS0015195	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS0015196	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS0015197	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513J	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513K	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513L	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513M	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513N	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513P	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513Q	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513R	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513S	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001503C	7.93	0.951	0.79	2.47	50
C8001348	BNS001503D	7.93	0.951	0.79	2.47	50
C8001348	BNS001503E	7.93	0.951	0.79	2.47	50

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Hierro 3/8

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 03.03.2026
HORA: 13:06:32
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60 REPORTE: *14921
CLIENTE: ARCOE S.A.S. PLACA: GQW887 ORDEN DE ENTREGA: 8091291458

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES				
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res mm	Anc.Vena mm	Ang Grado
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420	1,25	14,00		0,527		0,38		45,00
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540					6,70		3,60	

Lote	Peso Kg	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res mm	Anc.Vena mm	Ang Grado
B67059-26	33.407,00	0,28	1,12	0,023	0,011	0,17	0,000	0,084	0,014	0,017	0,003	0,018	0,464	622,12	439,30	1,42	17,50	B	0,547	6,18	0,63	2,45	55,00

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad,

Firma Autorizada: ING WILLIAN FERNANDO VIANCHA VALDERRAMA
Coordinador Calidad Productos, Química e Instrumental
Firma Autorizada vigente a partir de: 05.08.2025

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900,034,102

CLL 7 # 37 A 05

Sello de Calidad — NTC 5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

Sello con Reglamento Técnico — Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada


FQ1201 Fecha Rev:18-12-17 Version: 1

Fecha de Emision : 30/03/2026
Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	3597-1
Referencia de Malla	XX-159
Diámetro de Grafil Long:	5,5
Diamentro de Grafil Transv:	5,5
Fecha de Producción de la Malla	30/03/2026
Fecha de recepcion de muestra	30/03/2026
Fecha de Ensayo	30/03/2026

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA

N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	14.261	Grafil
2	12.990	Grafil
3	14.077	Grafil
4	11.436	Grafil
5		
Promedio	13.191	
Requisito de Norma NTC 5806 N° 8.3	5.726	U (KN)
CUMPLE (SI/NO)	SI	6,66

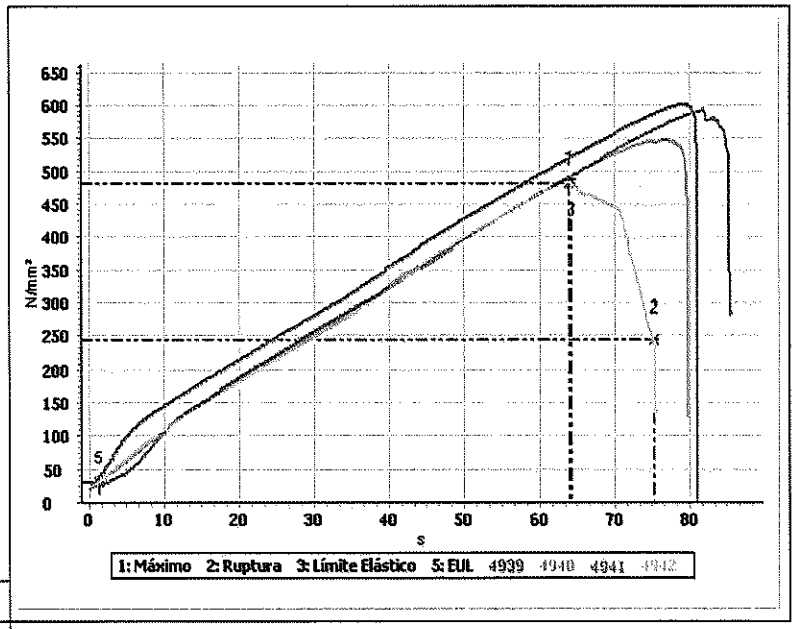

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)

TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)

TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.980	6.000	SI
Tranversales	2.340	2.350	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°11)

	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	151	150	SI
Transversales	150	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)

TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	80	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Tranversales	40	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales			
Temperatura promedio °C	22.7	Humedad Relativa promedio (%HR)	44.0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900 034 102-8 Propiedad:

Realizó
Juliana Cuervo Soler
LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

Sello de Calidad — NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Sello de cumplimiento técnico — Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 1/04/2026

Cliente:

Características de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5239
Diametro de Grafil (mm)	5,5
Lote	2891
Fecha de Fabricación	26/02/2026
Fecha de recepcion de la muestra	26/02/2026
Fecha de Ensayo	26/02/2026
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

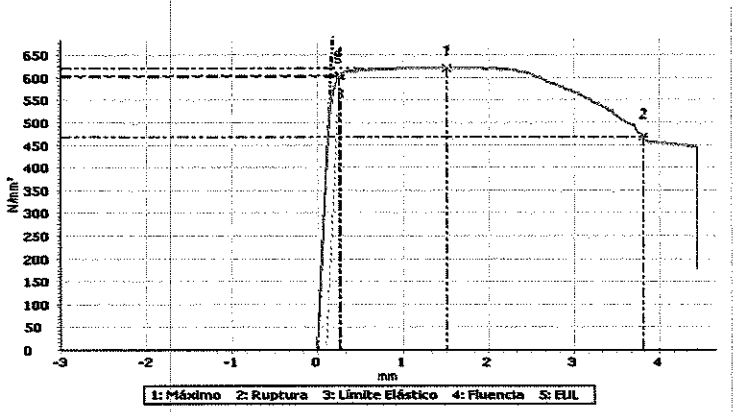

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	20.1			Humedad relativa (HR%)	45,0		
				MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	Nominal	5,5	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	5,5	5,5	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	187	177,27	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,25	0,34	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm).	0,0045	4,62 a 7,24	5,79	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.).	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Mín 45°	52	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Mín 25%	26	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,0045	Mín 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	621	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	601	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza:

Juliana Cuervo Soler

LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:

CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AM FERRETERÍA
ANDRES MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

Sello de Calidad — NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 1/04/2026

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5250
Diametro de Grafil (mm)	5,5
Lote	2895
Fecha de Fabricación	2/03/2026
Fecha de recepcion de la muestra	2/03/2026
Fecha de Ensayo	2/03/2026
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

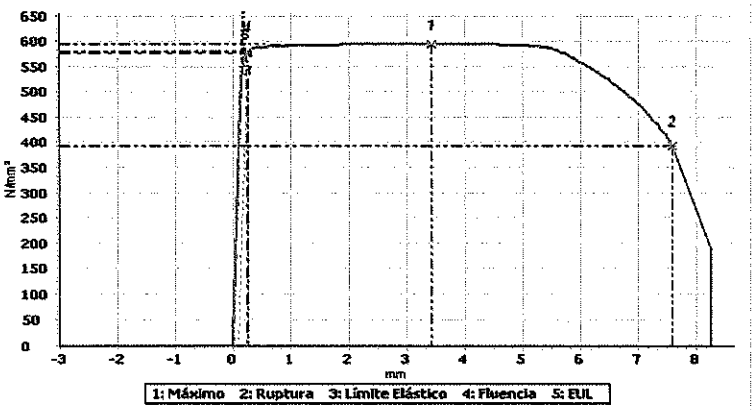

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	20,1			Humedad relativa (HR%)		48,0	
				MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	Nominal	5,5	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	5,5	5,5	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	187	178,42	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,25	0,32	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm).	0,0045	4,62 a 7,24	5,79	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.).	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Mín 45°	50	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Mín 25%	26	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,0045	Mín 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	594	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	576	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA ANDRES MARTINEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza:

LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:

CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

5805

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900.034.102
CLL 7 # 37 A 05

NTC 5808
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

Resolución 0277 de 2015
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldados con grafil


REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

FQ1201 | Fecha Rev:18-12-17 | Version: 1

Fecha de Emision : 27/03/2026
Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	3594-1
Referencia de Malla	XX-188
Diámetro de Grafil Long:	6,0
Diamentro de Grafil Transv:	6,0
Fecha de Producción de la Malla	27/03/2026
Fecha de recepcion de muestra	27/03/2026
Fecha de Ensayo	27/03/2026

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA		
N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	15.744	Soldadura
2	18.188	Grafil
3	17.883	Grafil
4	16.803	Grafil
5		
Promedio	17.155	
Requisito de Norma NTC 5806 N° 8.3	6.814	U (KN)
CUMPLE (SI/NO)	SI	6,66

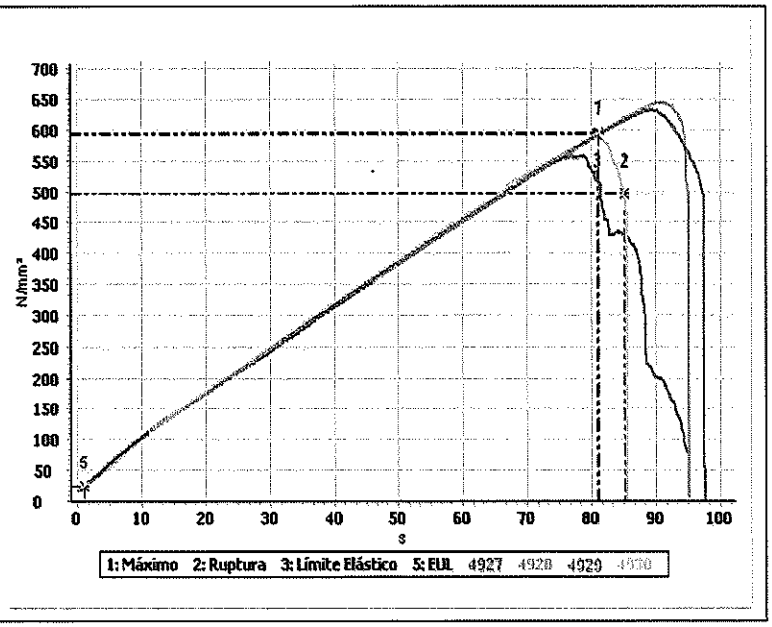

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)			
TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)			
TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.980	6.000	SI
Tranversales	2.340	2.350	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°11)			
	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	150	150	SI
Transversales	150	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)				
TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	80	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Tranversales	40	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales			
Temperatura promedio °C	22.0	Humedad Relativa promedio (%HR)	41,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900 034 102 Aprobado

Realizó
Juliana Cuervo Soler
LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

Sello de Calidad — NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 31/03/2026

Cliente:

Características de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5321
Diametro de Grafil (mm)	8,0
Lote	2916
Fecha de Fabricación	25/03/2026
Fecha de recepcion de la muestra	25/03/2026
Fecha de Ensayo	25/03/2026
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

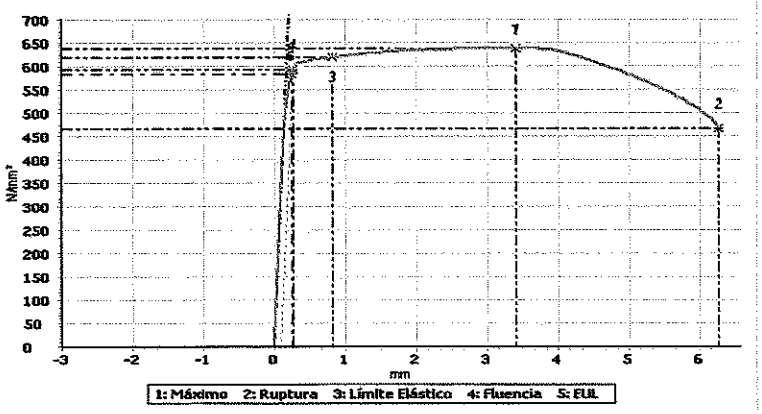

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	22,1			Humedad relativa (HR%)		47,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	8	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	8,0	8,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	395	375,75	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,36	0,40	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm).	0,0045	4,62 a 7,24	6,34	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.).	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Mín 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Mín 25%	33	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,0045	Mín 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	639	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	583	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza:

Juliana Cuervo Soler

LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:

CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

5806

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900.034.102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 31/03/2026

Cliente:

Características de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5324
Diametro de Grafil (mm)	6,0
Lote	2917
Fecha de Fabricación	26/03/2026
Fecha de recepcion de la muestra	26/03/2026
Fecha de Ensayo	26/03/2026
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

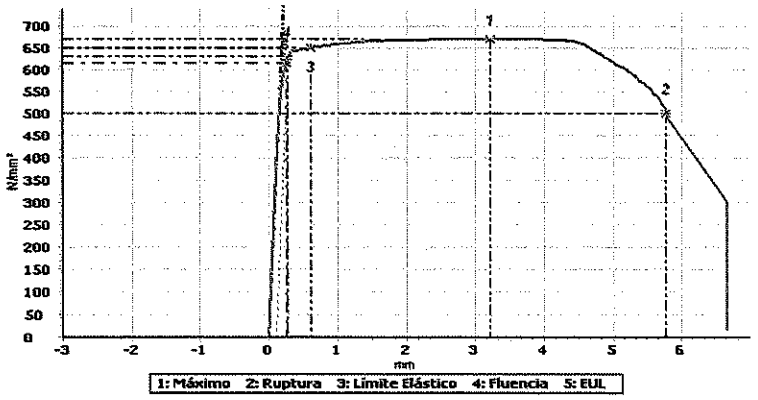

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	20,1			Humedad relativa (HR%)		43,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	6	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	6,0	6,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	222	210,82	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,27	0,37	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm).	0,0045	4,62 a 7,24	6,15	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.).	0,056	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Mín 45°	50	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Mín 25%	26	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,0045	Mín 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de Imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	671	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	615	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza:

LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:

CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

5809

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA DURAFORT ALCANTARILLADO

Fabricado por **CELTA S.A.S.** en la **Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, COLOMBIA,** identificada con **número de NIT 800.164.590-1**

Manufactured by **CELTA S.A.S.** in the **Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, COLOMBIA,** identificada con **número de NIT 800.164.590-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5055 (2018)

Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno
Poly(vinyl chloride) (PVC) profile gravity sewer pipe and fittings based on controlled inside diameter
SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER395916
Certificate

Fecha de Aprobación	2015-06-12	**Fecha Última Modificación:**	
Approval Date		Last Modification Date	
Fecha del Ultimo Vencimiento	2024-04-19	**Fecha de Restauración:**	2024-10-11
Last Expiration Date		Restoration Date	
Fecha del Próximo Vencimiento	2030-04-18		
Next Expiration Date			

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ANAB

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA A PRESIÓN

Fabricado por: CELTA S.A.S.: Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by: CELTA S.A.S.: Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Plásticos. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series)

SECTOR ICS: 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate.

Certificado: CSC-0002-1
Certificate

Fecha de Aprobación:	1975-12-05	Fecha Última Modificación:	
Approval Date:		Last Modification Date:	
Fecha de Renovación:	2023-09-01	Fecha de Vencimiento:	2029-08-31
Renewal Date:		Expiration Date:	

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec

ANAB

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: ARCOE SOACHA COP
Dirección: CR 17 30 80 SUR FRENTE A INDUM SOACHA
Teléfono: 7216638

Fecha Impresión: 2026/03/25
Nro.Remisión: 187322977

Nro.Informe: 163144
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0030087	1564	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO003083U	2067	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8001349	BFO0030087	0.29	1.20	0.000	0.22	0.011	0.014	0.01	0.01	0.01	0.001	0.49
C8001349	BFO003083U	0.29	1.19	0.000	0.22	0.008	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.49

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
		MPa	MPa	%			
C8001349	BFO0030087	472	626	17.68	SinGrieta	1.33	20260305
C8001349	BFO003083U	477	622	17.73	SinGrieta	1.30	20260307

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Angulo Resalte °
C8001349	BFO0030087	10.10	1.510	0.80	3.82	50
C8001349	BFO003083U	10.10	1.547	0.82	4.17	50

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROALCO EL RECREO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ALAMBRE GALVANIZADO SUAVE	CÓDIGO	FO-01-199
		VERSIÓN	5
		Nº DE PÁGINAS	1 de 1

DECLARACIÓN

El alambre galvanizado suave fabricado y suministrado por la Productora de Alambres Colombianos - Proalco S.A.S., cumple con los siguientes requisitos técnicos:

CALIBRE (BWG)	DIAMETRO (mm)	TOLERANCIA DIAMETRO (mm)	MASA MÍNIMA DE RECUBRIMIENTO DE ZINC (g/m²)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÁXIMA (kgf/mm²)
14	2,11	± 0,04	40	42
13,5	2,25	± 0,04	40	42
13	2,40	± 0,04	40	42
12,5	2,50	± 0,04	40	42
12	2,77	± 0,04	40	42
11	3,05	± 0,04	40	42
10,5	3,25	± 0,04	40	42
9	3,76	± 0,04	40	42
8	4,19	± 0,04	40	42
6	5,15	± 0,04	40	42

PROALCO EL RECREO COPIA NO CONTROLADA Sistema de Documentación

"Las copias impresas son sólo válidas garantizando su actualización con sello original del sistema documental"

ENVIADO DESDE EL SISTEMA DOCUMENTAL PARA EL CLIENTE ARCOE SAS VILLAVICENCIO

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

ENSAYOS/LABORATORIOS

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

LABORATORIO RAMCODES
INGENIERIA Y ENSAYOS

LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES,CONCRETOS Y PAVIMENTOS

VERSIÓN	001
CODIGO	F-CON-001
FECHA DE VIGENCIA	1/01/2017

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CON-RAMW-01

ESPECIFICACION/NORMA	INV E-410-13 Y NTC 673-10

PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
DIRIGIDO A:	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT:	902011453-2	FECHA DE ENTREGA:	domingo, 21 de junio de 2026
CONTACTO:	ING. GONZALO BECERRA	CELULAR:	313 8756145	CORREO:	utingepoliciagaitan@gmail.com
DESCRIPCION:	MUESTRAS ELABORADAS EN OBRA	MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META


No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (Mpa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
RAJ-1	ZAPATAS UBICADAS EN LOS EJES 2-C, 3-B, 3-F, 1-F	f'c 3000 PSI	21	--	15-may.-26	8	23-may-26	103	3855	8253	2.3	164.1	2,897	20.3	96.6%	3
						14	29-may-26	155	13275	18774	2.3	394.4	3,037	21.3	101.2%	3
						28	12-jun-26	155	13068	18784	2.3	453.9	3,520	24.6	117.3%	2
RAJ-2	COLUMNAS PLANTA 01 UBICADOS EN LOS EJES 1-A, 2-A, 3-A, 3-B, 1-C	f'c 3000 PSI	21	--	20-may.-26	7	27-may-26	102	3750	8134	2.3	180.9	3,239	22.7	108.0%	3
						14	3-jun-26	155	13195	18945	2.3	440.5	3,433	24.0	114.4%	4
						28	17-jun-26	155	12870	18903	2.2	525.5	4,049	28.3	135.0%	3
RAJ-3	VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE 1 AL 3 Y EJE A,B,C - E,D - F,G - H, J-I, K	f'c 3000 PSI	21	--	18-may.-26	7	25-may-26	101	3725	8012	2.3	130.9	2,364	16.5	78.8%	3
						14	1-jun-26	101	3726	8012	2.3	135.9	2,455	17.2	81.8%	4
						28	15-jun-26	101	3721	8012	2.3	165.2	3,001	21.0	100.1%	3
RAJ-4	COLUMNAS PLANTA 01 UBICADOS EN LOS EJES 1-D, 2-D, 1-K,3-K	f'c 3000 PSI	21	--	26-may.-26	7	2-jun-26	154	13090	18677	2.3	435.9	3,400	23.8	113.3%	4
						14	9-jun-26	155	13101	18869	2.3	496.4	3,832	26.8	127.7%	4
						28	**23-jun-26**	**103**	**3730**	**8252**	**2.2**	**275.0**	**4,865**	**34.0**	**161.8%**	3
RAJ-5	VIGA	f'c 3000 PSI	21	--	7-jun.-26	7	14-jun-26	103	3449	8350	2.2	200.8	3,502	24.5	116.7%	3
						14	**21-jun-26**	**155**	**13028**	**18918**	**2.3**	**559.2**	**4,306**	**30.1**	**143.5%**	3
						28	5-jul-26									

REVISO Y APROBO:

Ing. Ingrid Aranguren Bejarano

Especialista en Diseño y Construcción de Vías y Aeropistas

*Este informe no es válido, sin la firma y sello original.

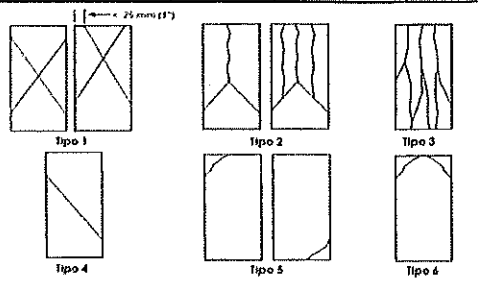

5814

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

INFORME SST

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

INFORME MENSUAL SST – PARCIAL No. 2
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"

PERIODO:
21 DE MAYO DE 2026 AL 21 DE JULIO DE 2026

PUERTO GAITÁN-META

ELABORÓ	APROBÓ
MAIRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES	**INGRID MARYORI GARCIA FONSECA**
PROF. EN SALUD OCUPACIONAL	R/L UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Descripción del proyecto 4
2.1. Localización del proyecto 4
2.2. Generalidades 5
2.3. Alcance del contrato de obra 6
2.4. Población beneficiada 7
3. Información del contrato de obra 8
4. Gestión SYSO / Seguridad y salud en el trabajo (SST) 9
4.1. Objetivos 9
4.1.1 Objetivo general 9
4.1.2 Objetivos específicos 9
4.2. Desarrollo de actividades en HSEQ 10
4.3. Control de maquinaria y equipos 27
4.4. Condiciones climáticas 30
4.5. Relación personal de obra (profesional, técnico, operativo) 30
5. Conclusiones 34
6. Anexos 35

TABLAS

Tabla 1. Localización del proyecto 4
Tabla 2. Alcance contrato de obra 7
Tabla 3. Información del contrato de obra 8
Tabla 4. Listado de maquinaria movilizada en la obra. 28
Tabla 5. Relación de personal Mayo 32
Tabla 6. Relación de personal junio 34

1. Introducción

El presente informe HSEQ corresponde al periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2026 y el 21 de julio de 2026, para lo cual se requiere la verificación e identificación de las condiciones de riesgo con las que el trabajador se va a encontrar en el desarrollo de su labor, implementando las buenas prácticas, implementando conocimientos, y velando por la seguridad y salud de los trabajadores que se van a contratar para la ejecución del proyecto.

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito fundamental la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus actividades laborales, promoviendo entornos de trabajo seguros y saludables. En la actualidad, este enfoque se extiende a todas las profesiones y oficios, buscando que el trabajo se adapte a las capacidades del trabajador y no que el trabajador se exponga a condiciones que afecten su integridad física o mental.

El presente informe se fundamenta en las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, orientadas a la planeación, organización y estructuración del sistema HSEQ, así como a la identificación preliminar de las condiciones de riesgo que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto. Lo anterior permite establecer las medidas preventivas necesarias, aplicar buenas prácticas y garantizar condiciones seguras para el personal que será vinculado en las etapas posteriores de la obra.

El principal objetivo del sistema HSEQ es la identificación y control de peligros que puedan afectar tanto a los trabajadores como a personal ajeno a la obra, fortaleciendo el compromiso con la seguridad, la salud y el cumplimiento normativo, y asegurando la correcta implementación del sistema de gestión durante el desarrollo del proyecto.

La Unión Temporal Inge Policía Gaitán mantiene un firme compromiso con la protección de la salud y la seguridad de su población trabajadora, mediante la evaluación continua y la mitigación de los riesgos presentes en las áreas de trabajo, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, reconoce que la participación y el compromiso de los trabajadores son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Descripción del proyecto

2.1. Localización del proyecto

El proyecto objeto del contrato 1683 de 2025 se encuentra localizada en el municipio de Puerto Gaitán-Meta. En la siguiente tabla un resumen de la ubicación del municipio.

Tabla 1. Localización del proyecto

Puerto Gaitán Meta	
País:	Colombia
Región:	Orinoquía
Departamento:	Meta
Ubicación:	Lat. N. 3° 05' y 4° 08' Log. O. 71° 05' y 72° 30'
Altitud:	149 msnm
Superficie:	17.536 km²
Temperatura media:	27 °C
Fundación:	1932
Población:	46.689 habitantes

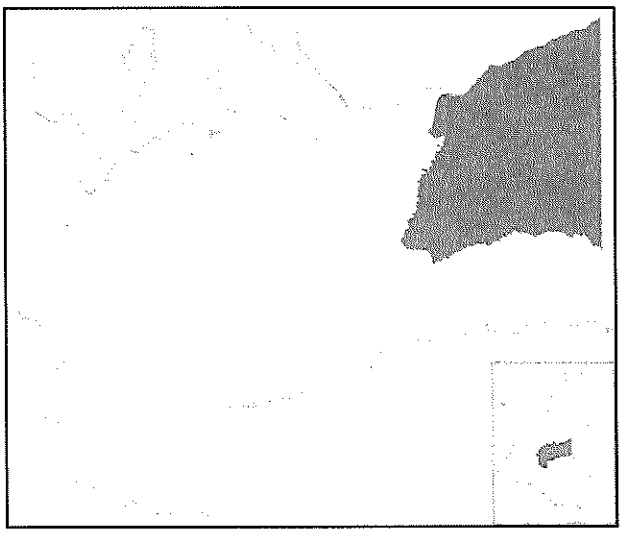


Ilustración 1. Localización general del municipio de Puerto Gaitán.

El proyecto se ubicará en la Estación de Policía del Municipio de Puerto Gaitán Meta (Zona Urbana). El trazado urbano es ordenado, con vías pavimentadas y accesos funcionales, aunque aún persisten sectores con déficit de servicios. En la cabecera se concentra la mayor parte de la población y la infraestructura estatal, incluyendo comandos de la Fuerza Pública. Estas condiciones justifican la necesidad de intervenir y fortalecer la Estación de Policía, garantizando capacidad operativa y cobertura adecuada ante el crecimiento poblacional y la complejidad del entorno.

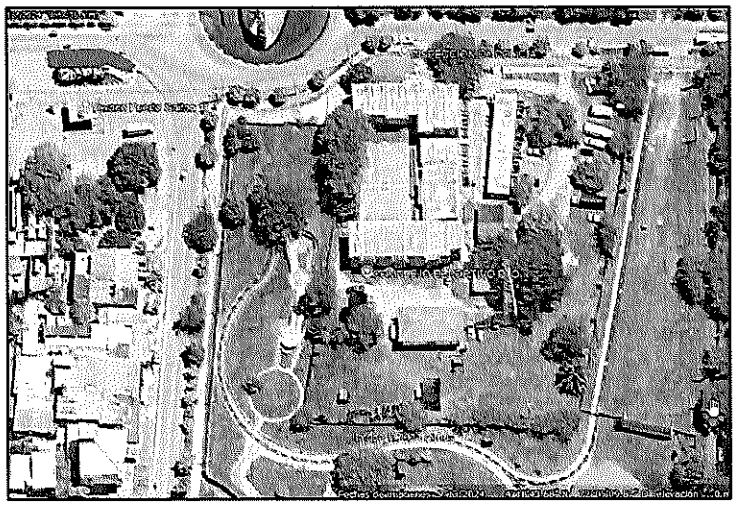


Ilustración 2. Localización del proyecto, imagen tomada de Google Earth.

2.2. Generalidades

El proyecto tiene como objetivo la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin de superar las deficiencias físicas y funcionales que actualmente limitan el cumplimiento de las funciones misionales de la Policía Nacional. La intervención se fundamenta en un diagnóstico técnico que evidencia deterioro estructural, insuficiencia de espacios, fallas en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal.

Puerto Gaitán es un municipio de alta relevancia estratégica debido a su crecimiento demográfico, desarrollo agroindustrial y ubicación cercana a corredores de movilidad interdepartamental, lo cual ha incrementado las exigencias en materia de seguridad y control territorial. En este contexto, el proyecto busca dotar a la institución de una infraestructura moderna, funcional y acorde con las dinámicas urbanas y sociales del territorio.

La propuesta contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la rehabilitación del edificio "Casa Blanca" destinado

a vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos, fortalecer la seguridad física de la estación y optimizar la capacidad operativa institucional.

El proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia institucional y responsabilidad fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia policial y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán.

2.3. Alcance del contrato de obra

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio, mediante la construcción de una edificación de dos (2) niveles destinada a nuevos alojamientos con capacidad para albergar hasta ciento doce (112) personas, la rehabilitación integral del edificio denominado Casa Blanca, con capacidad para cuatro (4) grupos familiares, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio, y la demolición y posterior construcción de un nuevo cerramiento perimetral, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y control del recinto policial.

A continuación, se muestra el alcance del contrato el cual consta de 23 capítulos enfocados a satisfacción del objeto contratado.

Tabla 2. Alcance contrato de obra

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS	
1	PRELIMINARES	$ 4.198.624,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 80.230.348,00
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 417.501.889,00
4	RED DE PRESION	$ 10.903.310,00
5	RED SANITARIA	$ 34.354.320,00
6	RED PLUVIAL	$ 11.900.456,00
7	RED CONTRA INCENDIOS	$ 1.014.054,00
8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 141.083.078,00
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO	$ 13.938.854,00
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 565.737.574,00

11	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 46.128.228,00
12	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 378.485.102,00
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	
13	DEMOLICION Y DESMONTE	$ 41.757.891,00
14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 37.303.929,00
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 223.371.272,00
16	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 144.145.763,00
17	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 8.154.912,00
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA	
18	PRELIMINARES	$ 714.444,00
19	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS	$ 57.497.172,00
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO	
20	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	$ 34.412.024,00
21	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 814.593.767,00
	OTROS	
22	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 75.936.264,00
23	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 119.989.209,00
	VALOR TOTAL	**$ 4.306.277.668,00**

2.4. Población beneficiada

El proyecto beneficia de manera directa al personal de la Policía Nacional que presta servicio en el municipio de Puerto Gaitán, al proporcionar una infraestructura moderna, funcional y segura que mejora las condiciones de alojamiento, operación y bienestar laboral. De manera indirecta, la iniciativa impacta positivamente a la comunidad del municipio, al fortalecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al orden público y al desarrollo social del territorio.

3. Información del contrato de obra

Tabla 3. Información del contrato de obra

Número del proceso:	LP-SI-010-2025
Tipo de contrato:	Obra Publica
Número del contrato:	1683 del 2025
Fecha del contrato:	03 de diciembre de 2025

Objeto:	Construcción, adecuación y mejoramiento de la estación de policía del municipio de puerto Gaitán - meta
Contratista:	Union Temporal Inge Policía Gaitan
Nit:	902.011.453-2
Representante legal:	Ingrid Maryori García Fonseca C.C. No. 1.121.837.768 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	utingepoliciagaitan@gmail.com
Contratante:	Municipio de Puerto Gaitán Alcalde municipal LUIS CÉSAR PÉREZ GAITÁN C.C. No. 1.122.120.037 de ACACIAS - META
Interventoría:	Unión Temporal Inter policía 2025
Nit:	902.014.419-5
Representante legal:	Diego Armando Cardoso Guerrero C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	Utinterpolicia2025@gmail.com
Valor:	Cuatro mil trescientos seis millones doscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte ($4.306.277.668,00)
Plazo inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Supervisor:	Christian Julián Fernández Reyes CC. 1.124.823.789 de Puerto Gaitan - Meta Secretario de infraestructura
Fecha del acta de inicio:	18 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	17 de agosto de 2026

4. Gestión SYSO / Seguridad y salud en el trabajo (SST)

Durante el periodo del presente informe, en el marco de la ejecución del proyecto, se desarrollaron actividades de estructura de concreto y aceros de refuerzo. En este contexto, la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SYSO / SST) estuvo orientada a la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales asociados a dichas actividades, en cumplimiento de los lineamientos HSEQ establecidos contractualmente y los requisitos definidos por la interventoría.

Las acciones implementadas durante el periodo incluyeron la planificación y seguimiento de las medidas preventivas, la elaboración y aplicación de la documentación HSEQ, así como la socialización de procedimientos seguros de trabajo para las actividades ejecutadas, con el

fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el personal en obra y prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales.

4.1. Objetivos

4.1.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Temporal responsable del proyecto, alineado con los requisitos HSEQ establecidos por la interventoría y la normativa vigente, garantizando condiciones seguras y controladas para el personal que será vinculado durante la ejecución del contrato.

4.1.2 Objetivos especificos

- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Promover condiciones de trabajo que favorezcan el bienestar físico y mental de los trabajadores.
- Fomentar la concientización sobre la mitigación de impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto.
- Garantizar el control de los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución de la obra, conforme a los lineamientos del plan ambiental aplicable.

4.2. Desarrollo de actividades en HSEQ


Durante el periodo comprendido del presente informe, se desarrollaron actividades operativas en campo correspondientes a la excavación, relleno y compactación manual, estructura de concreto y aceros de refuerzo, las cuales fueron ejecutadas bajo los lineamientos del Sistema de Gestión HSEQ, con el fin de garantizar condiciones seguras de trabajo, control de los aspectos ambientales y cumplimiento de los criterios de calidad establecidos para el proyecto.
De manera paralela a la ejecución de las actividades, se realizó la elaboración, organización y aplicación de los formatos HSEQ, así como la planeación y seguimiento de las medidas de control necesarias para la adecuada gestión de los riesgos asociados a cada una de las actividades desarrolladas en campo.

Entre las actividades HSEQ implementadas durante el periodo evaluado se destacan:

- Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos asociados a las actividades ejecutadas.
- Socialización de procedimientos seguros de trabajo y medidas preventivas con el personal en obra.
- Verificación del uso adecuado de elementos de protección personal (EPP).
- Control y seguimiento a las condiciones de seguridad durante la ejecución de las labores.

Los formatos y registros asociados a estas actividades se anexan a continuación (los siguientes registros se anexan al final de documento de manera clara):

TP-HSEQ-FOR-009 INDUCCION A PERSONAL

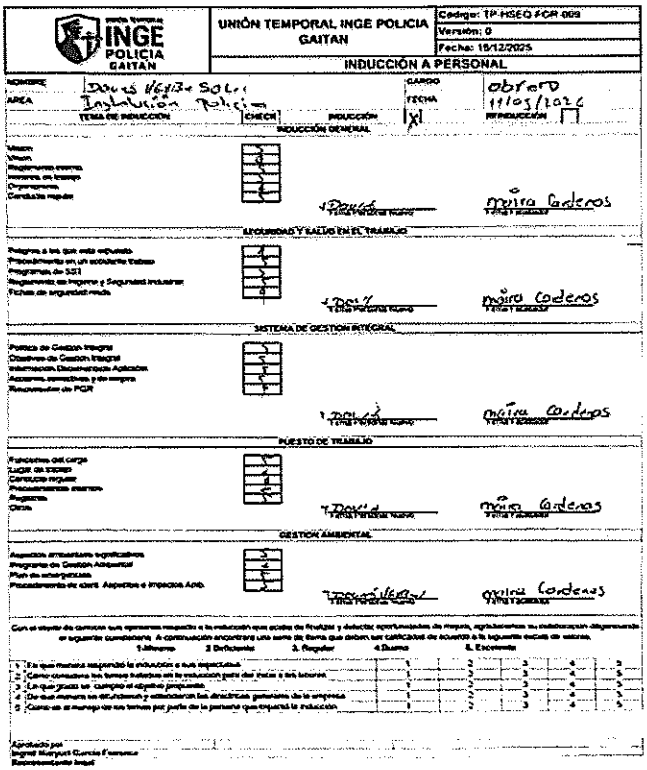
UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Codigo: TP-HSEQ-FOR-009
Version: 0
Fecha: 15/12/2025

INDUCCIÓN A PERSONAL

TP-HSEQ-FOR-010 ENTREGA DOTACION Y EPP

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN | UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN | Código: TP-HSEQ-FOR-010 | Versión: 0 | Fecha: 18/12/2025

ENTREGA DOTACIÓN Y EPP

DATOS PERSONALES

NOMBRES: Juan
APELLIDOS: Salcedo Moreno
IDENTIFICACION: 1124992965
CARGO: Ayudante

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Overol Seguridad	L	1	22/12/2026
Botas punta	41	1	22/12/2026
Gafas oscuras	U	1	22/12/2026
Botas de Seguridad	38	1	22/12/2026
Pantalon Jean	34	1	22/12/2026
Camisa manga larga	M	2	22/12/2026

OBSERVACIONES: /

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCION SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR, ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DESTINADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, ESTOY EN LA OBLIGACIÓN DE SOLDA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

ENTREGADO | RECIBIDO

TP-HSEQ-FOR-012 REGISTRO ASISTENCIA DIARIA


UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

REGISTRO ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META" | FECHA: 21-05-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Yeison Salcedo	Ay	7:00		4:30		-
2	Juan Salcedo	Ayudante	7:00		4:30		-
3	Angelo Murcia	Ay	7:00	Angelo	4:30	Angelo	-
4	Edinson	Ay	7:00	Edinson	4:30	Edinson	-
5	Juan Camilo Arias	Ay	7:00		4:30		-
6	Jonathan Mur.	Ay	7:00		4:30		-
7	Segundo Tovar	Ay	7:00		4:30		-
8	Juan Pablo R	Maestro	7:00		4:30		-
9	Yeison Largo G	Ay	7:00		4:30		-
10	Ingeniero	Ing	7:00		4:30		-
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TP-HSEQ-FOR-013 REGISTRO ASISTENCIA CHARLAS DE SEGURIDAD

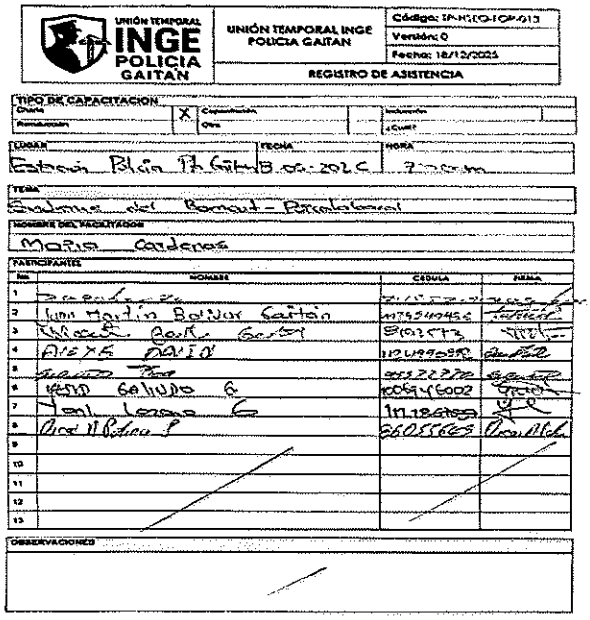

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN — UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN — Código: TP-HSEQ-FOR-013 — Versión: 0 — Fecha: 18/12/2025 — REGISTRO DE ASISTENCIA

TIPO DE CAPACITACIÓN: Charla [X] — Capacitación — Inducción — Otra — ¿Cuál?

LUGAR: Estación Policía Th. Gaitán — FECHA: 8-09-2025 — HORA: 7:00 a.m.


TEMA: Síndrome del Manguito Rotatorio

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Maria Cardenas

No.	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Juan Martin Bolivar Gaitán	1145140456	[illegible]
3	[illegible]	9101773	[illegible]
4	ALEXIS DAVID	1120492898	[illegible]
5	[illegible]	1122277[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	1006946002	[illegible]
7	[illegible]	1117186[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	86055663	[illegible]
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES:

TP-HSEQ-FOR-015 MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

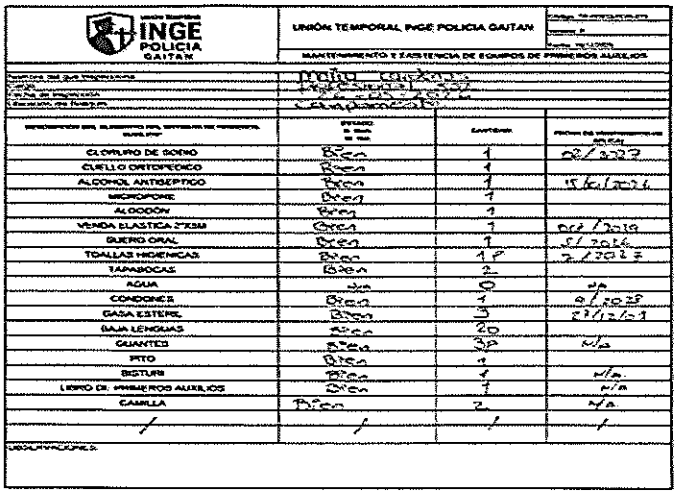

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN


MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Maria Cardenas

ELEMENTO	ESTADO (Bien / Mal / No tiene)	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (MES)
CLORURO DE SODIO	Bien	1	02/2027
CUELLO ORTOPEDICO	Bien	1	
ALCOHOL ANTISEPTICO	Bien	1	15/01/2026
MICROPOROSO	Bien	1	
ALGODÓN	Bien	1	
VENDA ELASTICA 2"X5M	Bien	1	oct/2019
SUERO ORAL	Bien	1	01/2026
TOALLAS HIGIENICAS	Bien	1P	2/2027
TAPABOCAS	Bien	2	
AGUA	No	0	No
CONDONES	Bien	1	01/2025
GASA ESTERIL	Bien	3	27/12/27
BAJA LENGUAS	Bien	20	
GUANTES	Bien	3P	N/a
PITO	Bien	1	
BISTURI	Bien	1	N/a
LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS	Bien	1	N/a
CAMILLA	Bien	2	N/a
/	/	/	/

OBSERVACIONES:

TP-HSEQ-FOR-016 INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

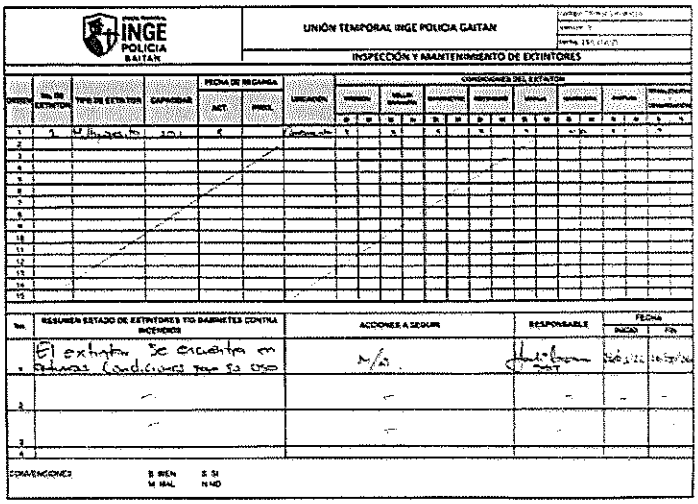

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O BARRILETES CONTRA INCENDIOS	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	El extintor se encuentra en buenas condiciones para su uso	N/A			
2	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–
4					

COMPROMISO: B: BIEN S: SI M: MAL NO

TP-HSEQ-FOR-017 FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-017

Versión: 0

Fecha: 18/12/2025

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ÁREA: Construcción Alojamientos

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yesid Patiño Gaitan

CÉDULA: 1006916002

FECHA: 18-05-2026

CARGO: Ayudante de Obra

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FV	VA	ESTADO: BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A					PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS			
1	Tapabocas	Buena			X			
2	Casco seguridad	Buena			X			
3	Tapa oidos							
4	Gafas de Seguridad	Buena			X			
B					PROTECCIÓN PARA MIEMBROS			
1	Guantes Caucho	Buena			X			
2	Guantes Carnaza							
3	Guantes Vaqueta							
4	Guantes precisión							
C					ROPA DE TRABAJO			
1	Capuchón	Buena			X			
2	Camibuso	Buena			X			
3	Pantalón Jean	Buena			X			
4	Calzado	Buena			X			

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-DOC-001
		Versión: 0
		Fecha: 31/12/2025
	INFORME MENSUAL SST – PARCIAL No. 2	

TP-HSEQ-FOR-018 INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-018
		Versión: 0
		Fecha: 19/11/2025
	INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS	

FECHA 13-05-2026 HORA 8:00 am
AREA Condiciones Alrededores Policia

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICA A	B	C	OBSERVACIONES
	RIESGO ELECTRICO							
1	Los tomacorrientes, cables , fichas ,interruptores, tacos , cajas y acometidas se encuentran buen estado	X						
2	Los tomacorrientes estan identificados segun voltaje	X						
3	Las cajas de controles electricos tienen tapa	X						
4	Las cajas de controles y tomacorrientes se encuentran organizados y señalizados	X						
5	Cuida polo a tierra en maquinas y equipos.	X						
6	Los equipos electricos o tomacorrientes estan protegidos a proveedores de agua	X						
7	Se realiza inspeccion y mantenimiento a las cables e instalaciones eléctricas	X						
8	Los cables se encuentran entubados o en canaleta	X						
	RIESGO LOCATIVO / INSTALACIONES LOCATIVAS							
1	Los pasos y pasillos están libres de materiales innecesarios, cables electricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales	X						
2	Se encuentran en orden las herramientas	X						
3	Se ha demarcado el area de deposito de residuos	X						
4	Las areas de circulacion peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos	X						
5	Se han recogido al final del trabajo los residuos generados	X						
6	Fueron dispuestos los residuos en lonas o canecas	X						
8	Las areas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas	X						
9	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado	X						
10	El tipo y numero de extintores ausentes son los necesarios para la labor que se realiza	X						
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION								
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION								

CONVENCIONES S SI , N NO A Grado de Acción Inmediata
B Grado de Acción Preixta
C Grado de Acción Posterior

TP-HSEQ-FOR-019 INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-019
		Versión: 0
		Fecha: 19/11/2025
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA Inge Policia
ACTIVIDAD Condiciones Alrededores
AREA A INSPECCIONAR Obra Civil
FECHA 13/05/26 HORA 9:00 am

	HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se usa adecuada al trabajo	X			
2	Se encuentra en buen estado	X			
3	Se guardan y portan adecuadamente	X			
4	Los mangos de martillos no presentan grietas, astillas y estan firmemente adheridos.	X			
5	Se usan prensas de banco para sujetarlas	X			
	HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los arcosos no presentan su cabeza rota hongo	X			
2	Los cinceles se encuentran afilados	X			
3	Las limas disponen de sus mangos, y no estan rotas o sucias	X			
4	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos			X	
5	Las cinchuras disponen de mangos y fundas			X	
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Se emplea el martillo adecuado segun lo exige	X			
2	Sus caras y bordes estan en buen estado	X			
3	Su mango no esta quemado, astillado ni roto	X			
	HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN LLAVES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas		X		
2	Se observan en la llave muelas y palancas		X		
3	Se dispone de llaves para golpear.		X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o desmontadas.		X		
5	La herramienta para electricistas cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y sus protección frecuentemente		X		
6	La partes y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado		X		
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.	X			
	HERRAMIENTAS ELECTRICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las herramientas tengan las advertencias segun el riesgo (humedad, vapores)	X			
2	Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	X			
3	Estan limpias y lubricadas.	X			
4	Tiene sus guardas.	X			
5	Poseen palomillas dobles o cuentan a tierra por enchufe de tres pines	X			
6	El cable o enchufe no presentan cortes	X			
7	En las taladros se observe el mandil con golpes	X			


8	Dispone en luz o se ha reducido su tamaño para labores nocturnas	X			
9	Se almacenan las puntas y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X			
	HERRAMIENTAS NEUMATICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X	
2	Se emplean EPP s de acuerdo con la herramienta empleada			X	
3	Se sujeta a las presiones indicadas			X	
4	La herramienta es desgrapada al terminar.			X	
	HERRAMIENTAS POR DETACIÓN	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	El personal es avanzado	X			
2	Emplean los EPP's	X			
3	Es descargada y almacenada	X			
4	Su volumen es graves no hay presión			X	
	OTROS ¿CUALES?	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**

ACCIONES DE MEJORA :

FIRMA ALMACENISTA

FIRMA INSPECTOR HSEQ

TP-HSEQ-FOR-011 INSPECCION ENTREGA DE EPP

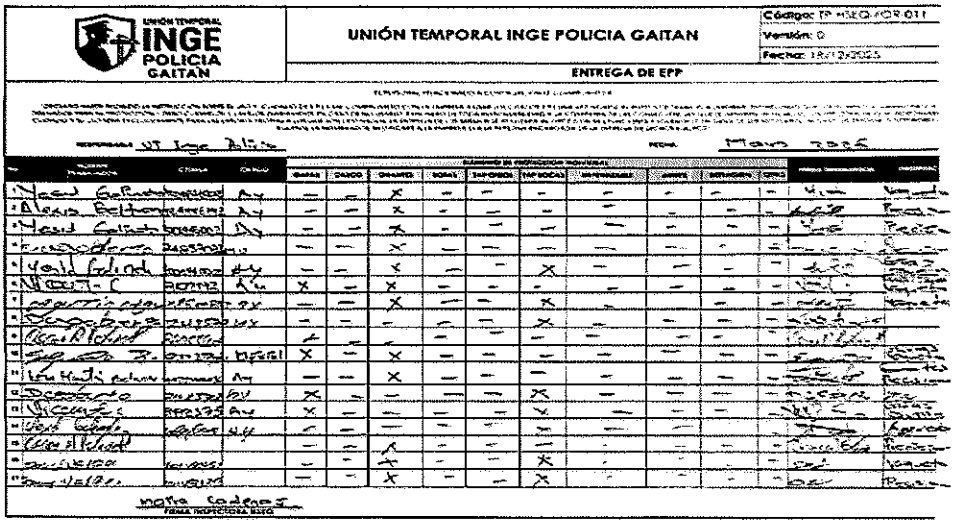

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

ENTREGA DE EPP

TP-HSEQ-FOR-023 INSPECCION PREOPERACIONALES



UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SST EN ACTIVIDADES




Fotografía 1. Supervisión actividades de demolición




Fotografía 2. Demolicion de columnas de concreto



Fotografía 3. Supervisión acompañamiento de actividades

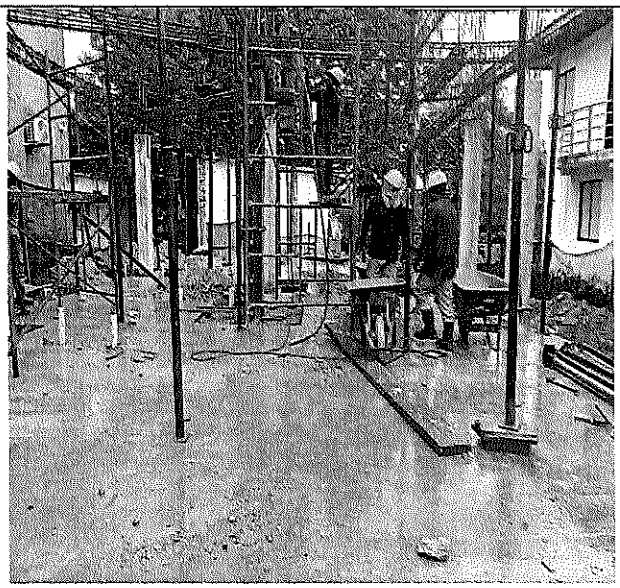

Fotografía 4. Fundida de columnas de concreto en obra

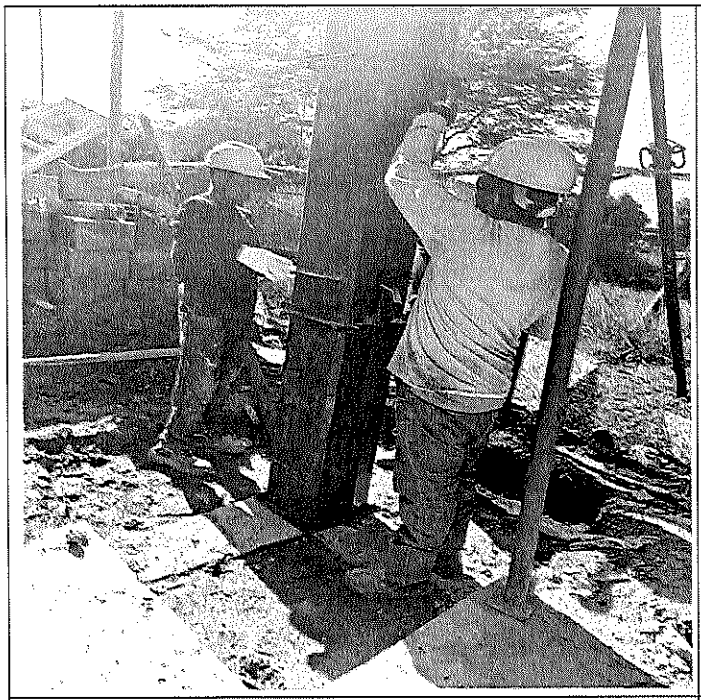

Fotografía 5. Supervisión en actividades de encofrado con formaletas metalicas




Fotografía 6. Supervisión en actividades de pre alistado de mezcla de concreto.




Fotografía 7. Descargue de material a obra




Fotografía 8. Retiro de formaletas metálicas de columnas

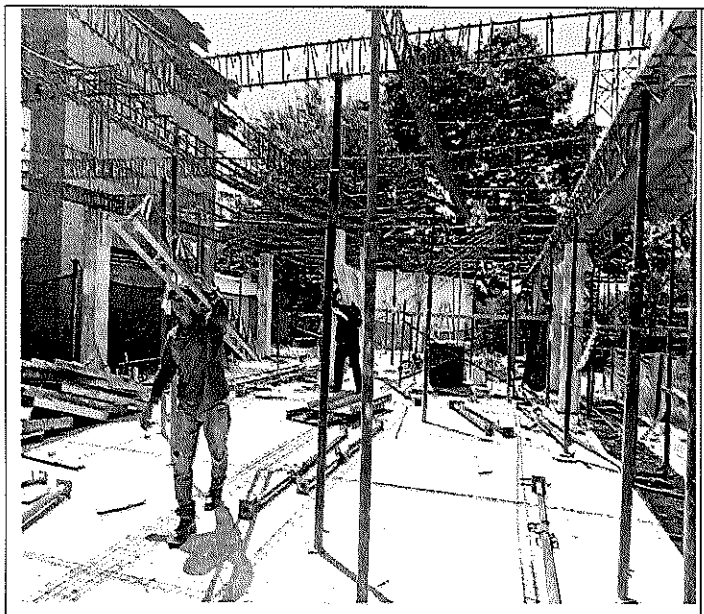

Fotografía 9. Traslado de materiales a obra

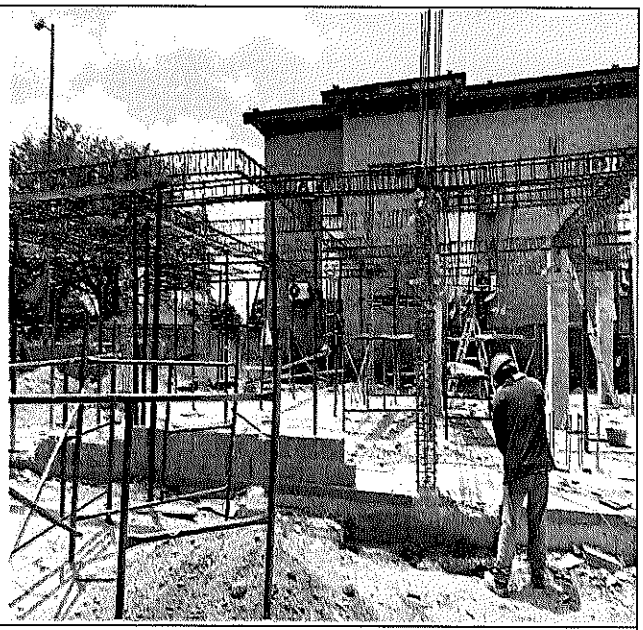


Fotografía 10. Supervisión actividades en obra

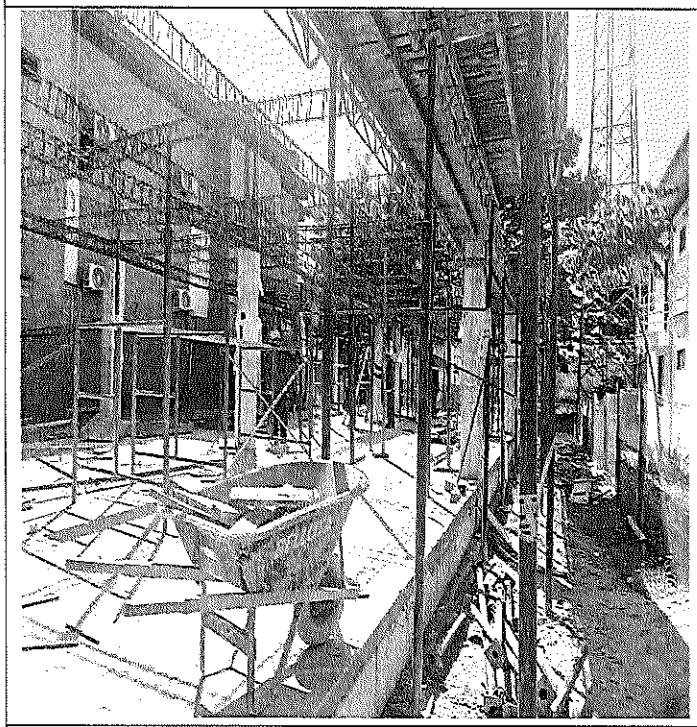


Fotografía 11. Supervisión actividades en obra




Fotografía 12. Supervisión actividades en obra

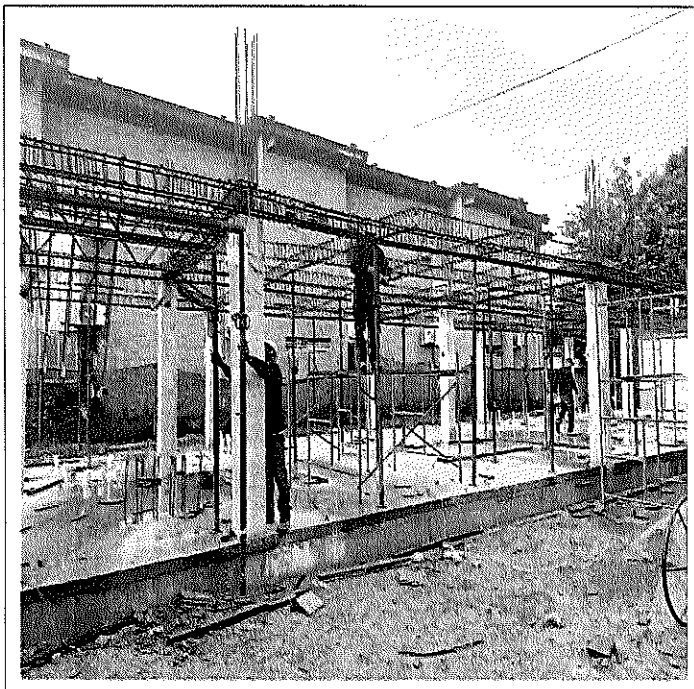


Fotografía 13. Supervisión actividades de fomaletas de vigas áreas en obra

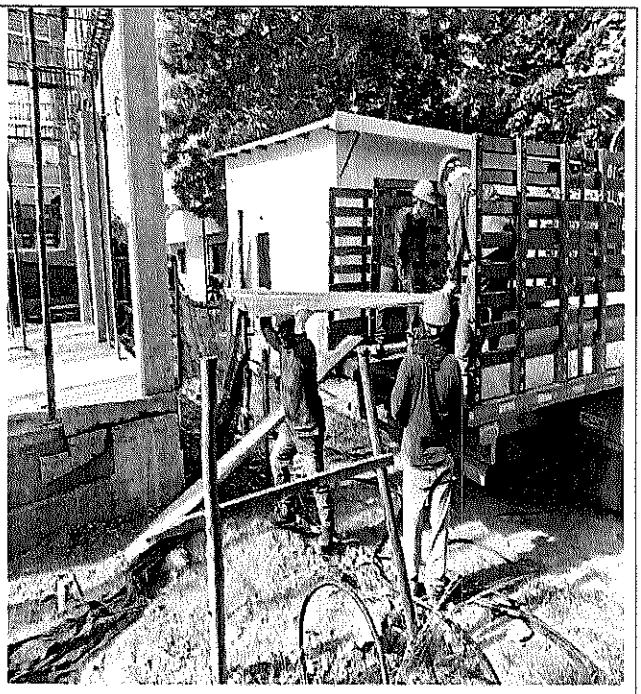

Fotografía 14. Descarga de material a obra

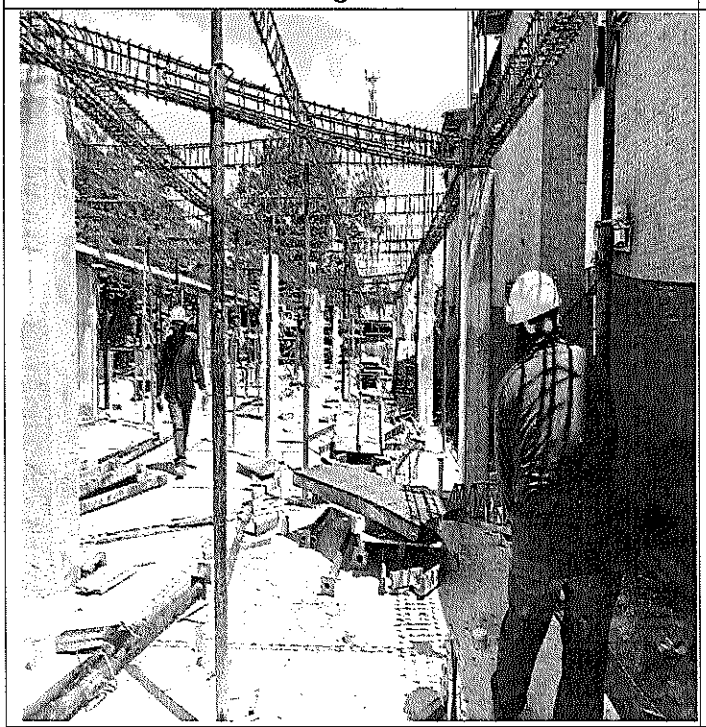

Fotografía 15. Supervisión actividades de fromaleta en vigas aereas.

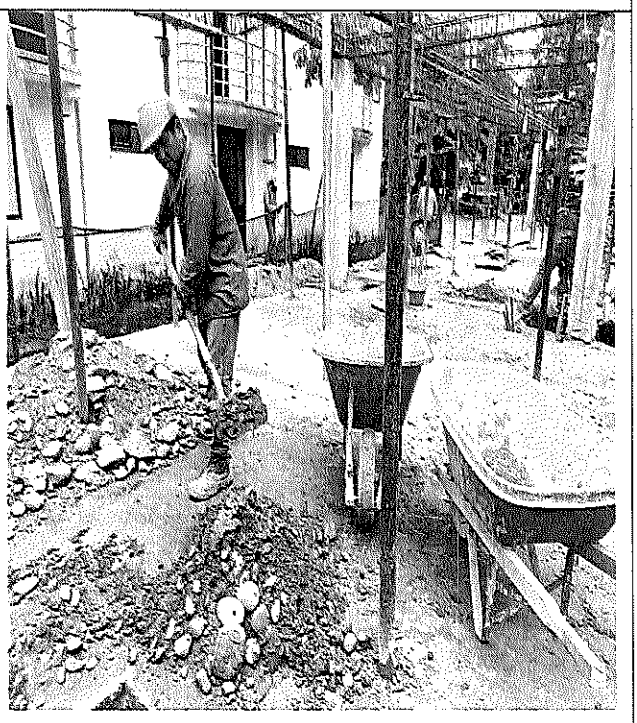


Fotografía 16. Supervisión limpieza y recogida de relleno


REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA



Fotografía 1. Camilla

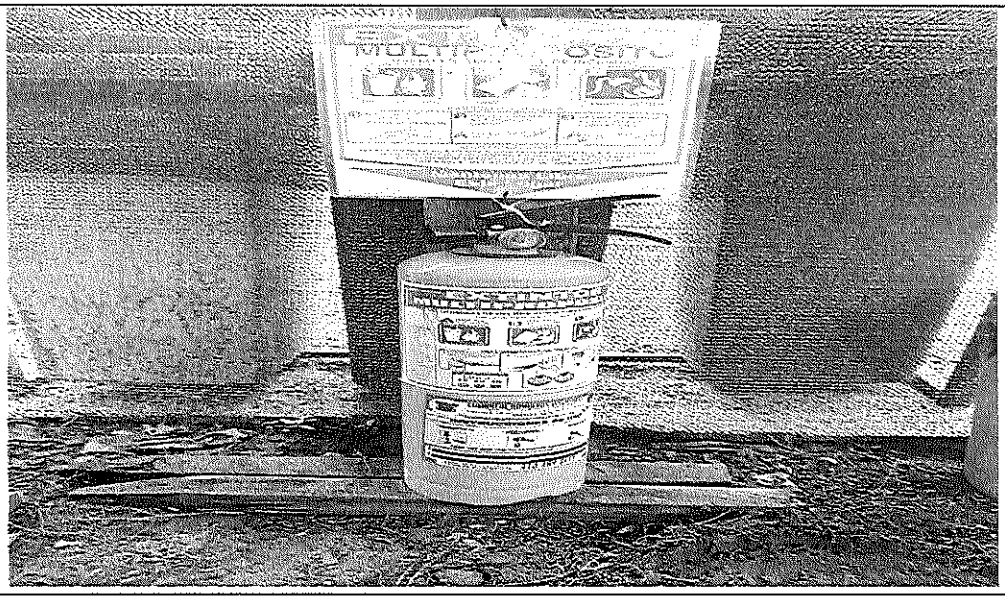

Fotografía 2. Extintor

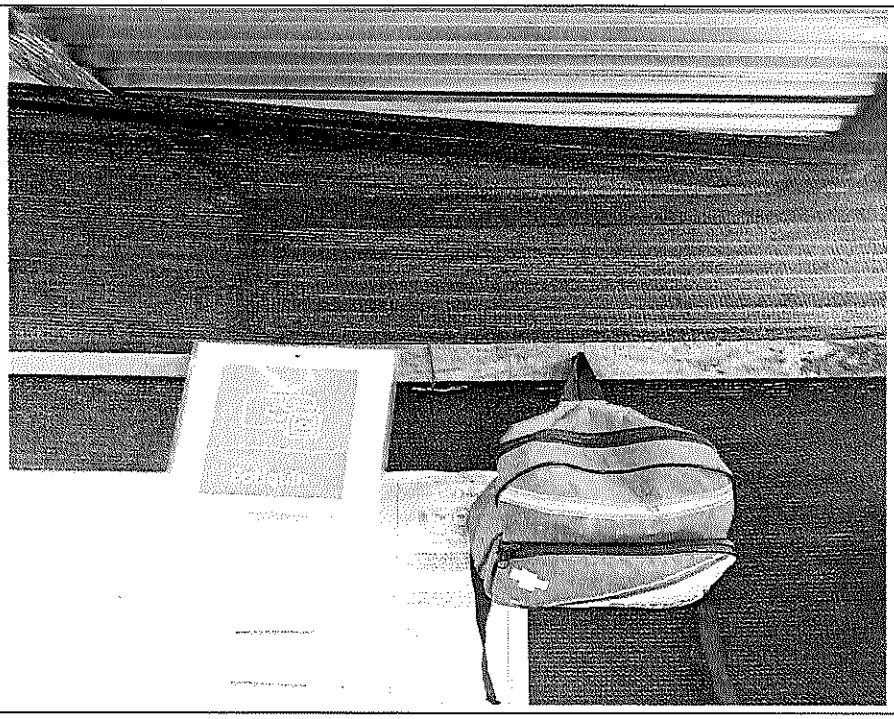


Fotografía 3. Botiquín


REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP



Fotografía 1. Firma de Entrega EPP

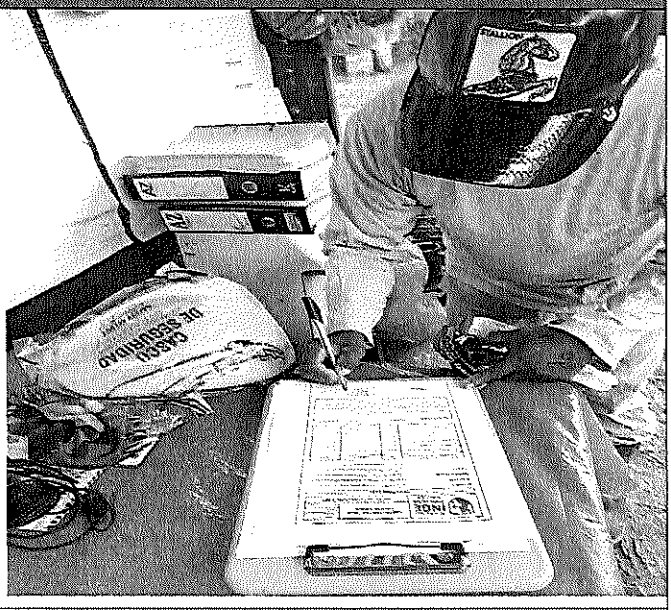


Fotografía 2. Firma de Entrega dotación

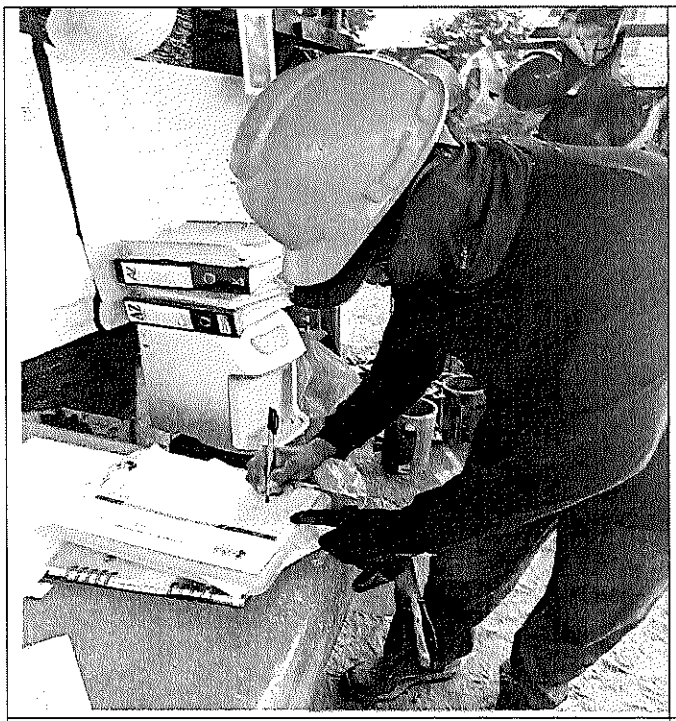

Fotografía 3. Registro de Entrega de epp al personal






Fotografía 4. Entrega de dotación

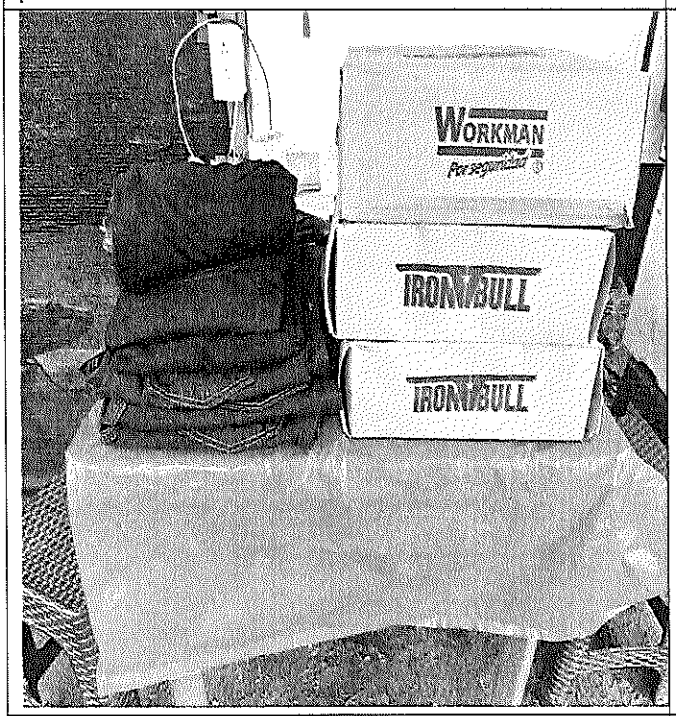


Fotografía 5. Entrega de dotación



Fotografía 6. Entrega de epp

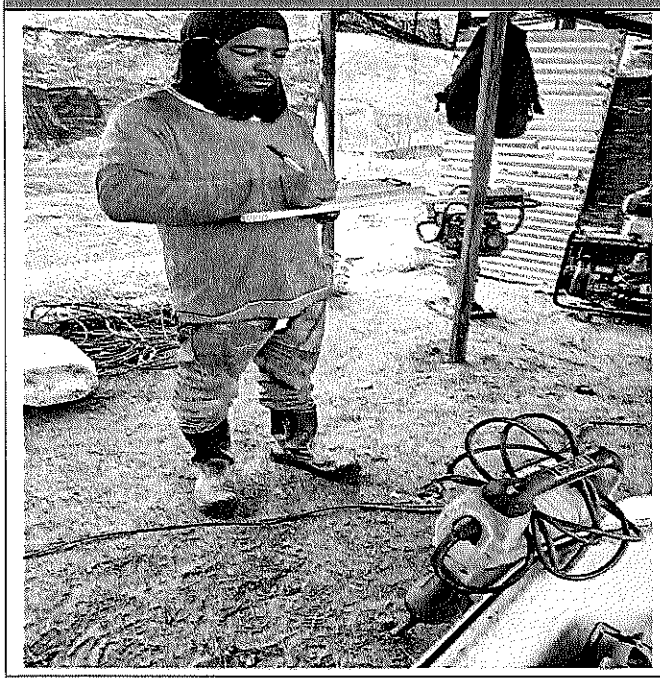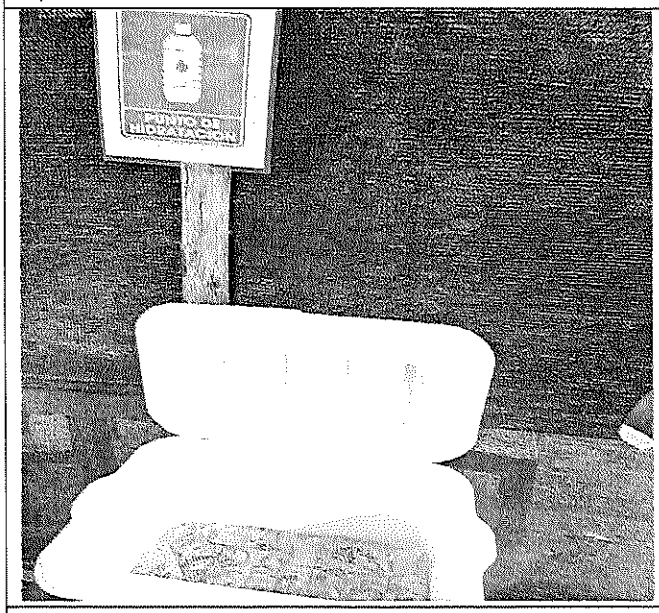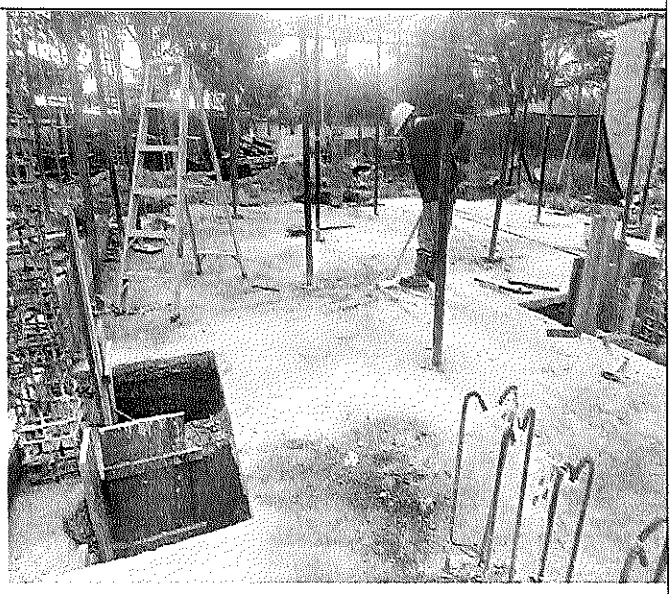
REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACION	
	
Fotografía 1. Inspecciones pre operacionales	Fotografía 2. Letreros de prevención e información
	
Fotografía 3. Punto de Hidratacion	Fotografía 4. Organización de material en áreas de trabajo

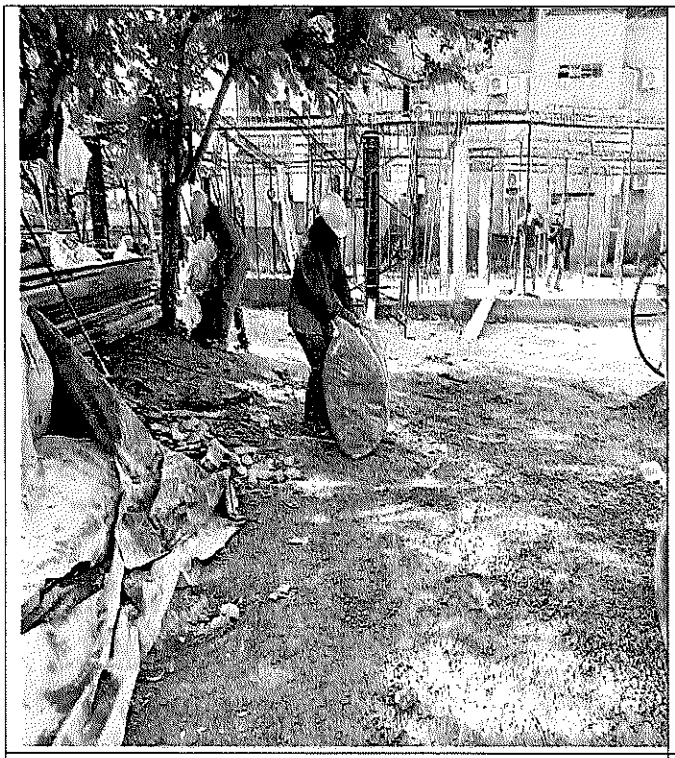

Fotografía 5. Orden y aseo lugar de trabajo



Fotografía 6. Protección de material con plástico

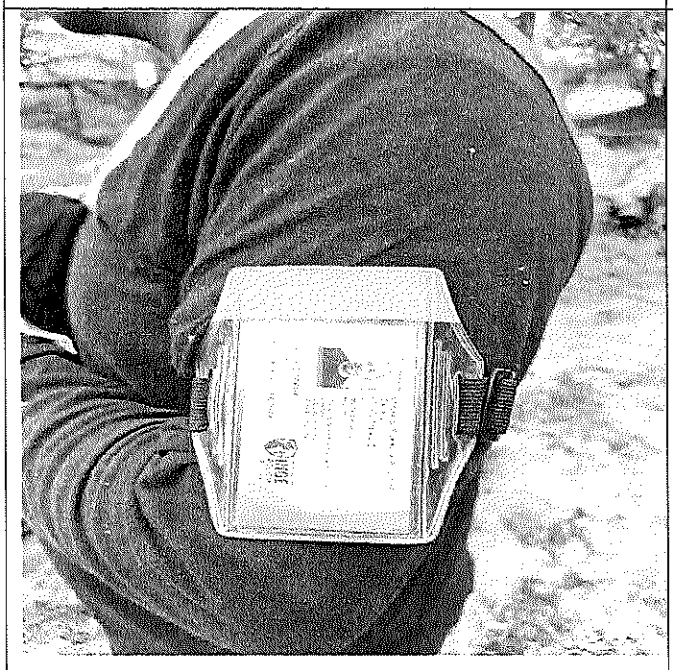


Fotografía 7. Carnetizacion al personal de obra




Fotografía 8. Señalización punto ecológico en obra.


REGISTRO FOTOGRAFICO DE CHARLA

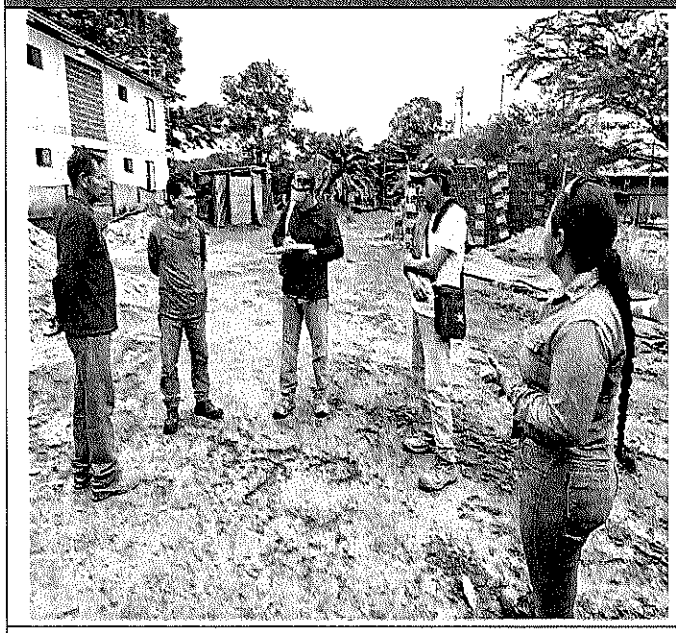


Fotografía 1. Charla -calistenia

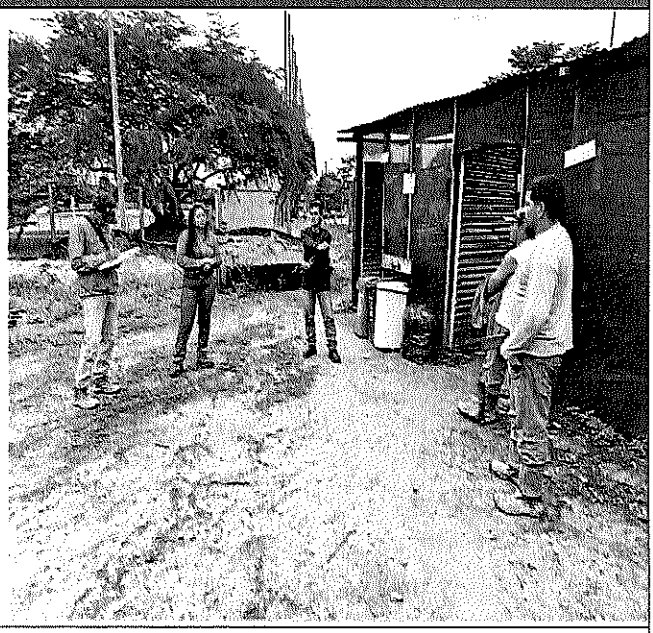


Fotografía 2. Asistencia Charla

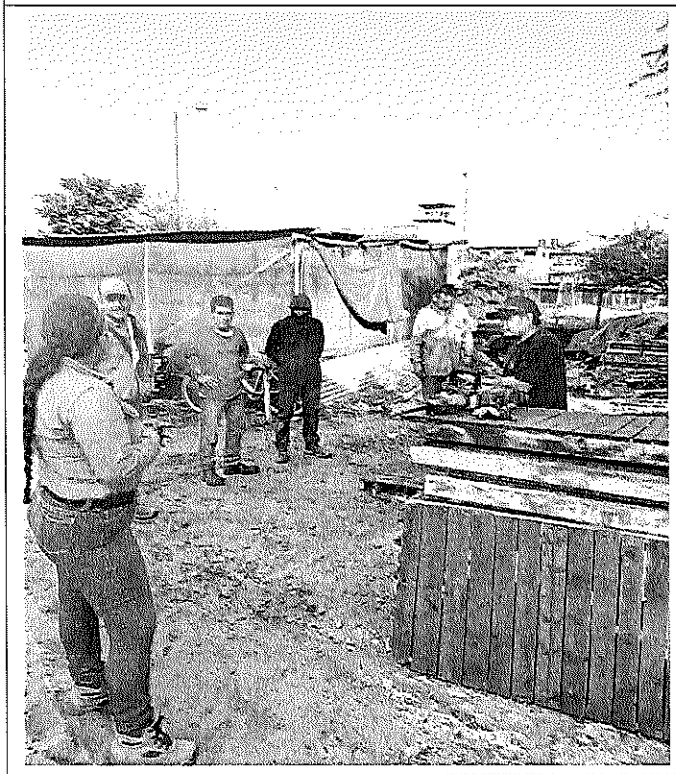


Fotografía 3. Asistencia Charla

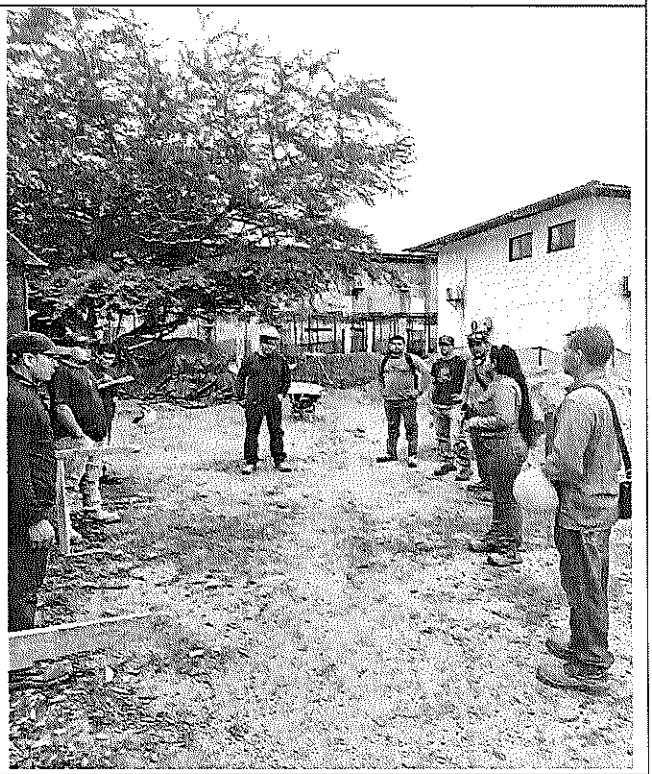


Fotografía 4. Asistencia Charla

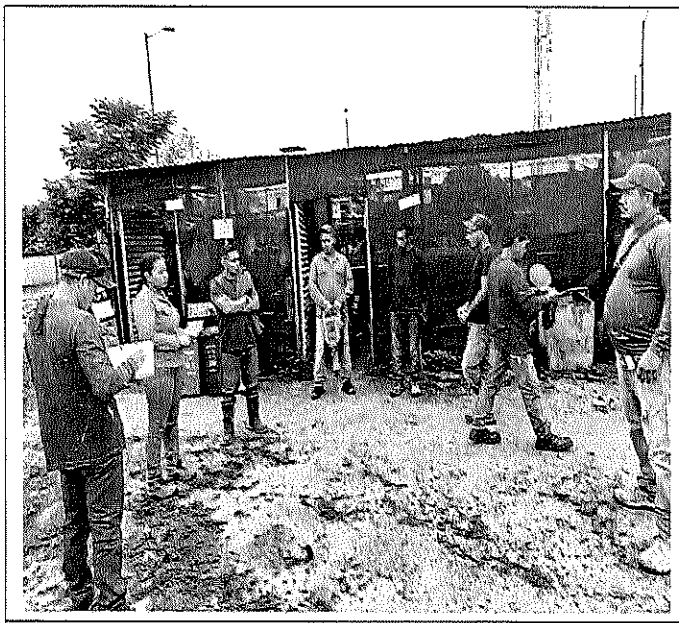


Fotografía 5. Permisos de trabajo

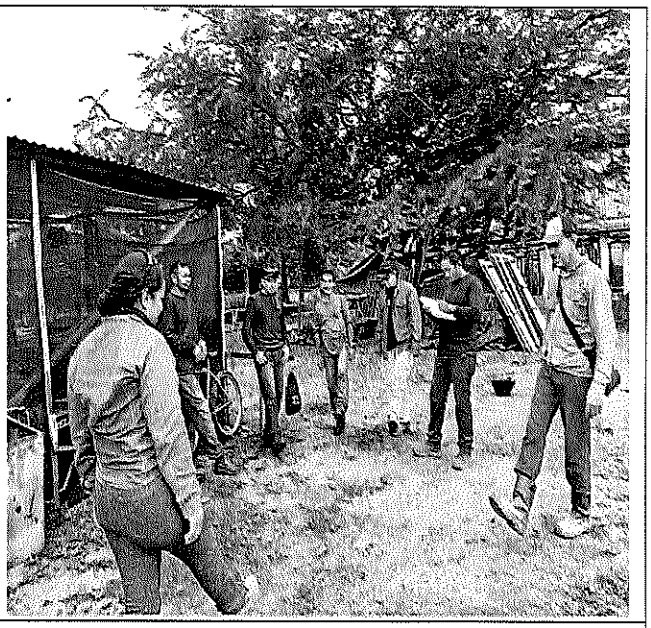

Fotografía 6. - calistenia

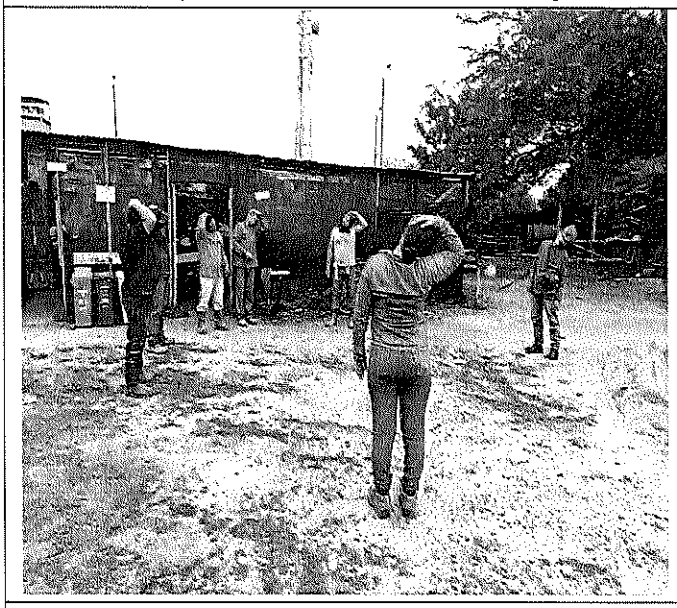

Fotografía 7. Asistencia Charla- calestenia

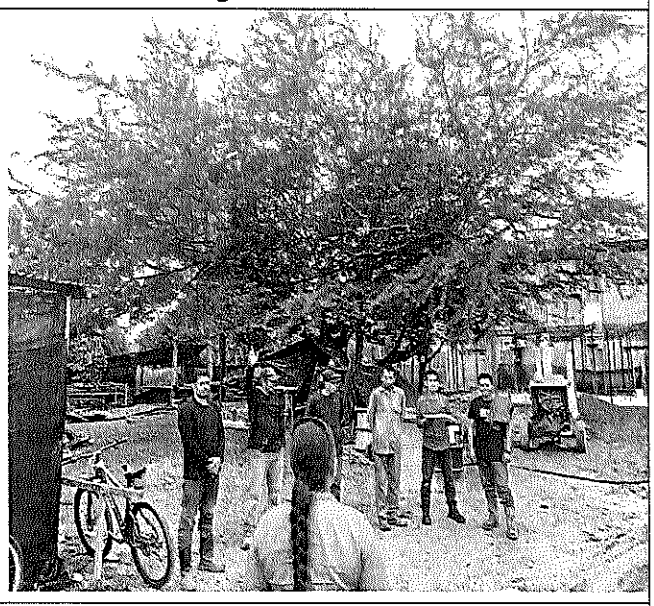

Fotografía 8. Asistencia Charla

4.3. Control de maquinaria y equipos

Durante el periodo comprendido del presente informe, y en el marco de la ejecución de las actividades de localización y replanteo, excavación, relleno y compactación manual, estructura de concreto y acero de refuerzo, se realizó el control y seguimiento a la maquinaria,

equipos y herramientas utilizadas en el proyecto, garantizando condiciones seguras de operación y cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión HSEQ.





La maquinaria empleada durante el periodo correspondió a volqueta sencilla, las cuales fueron inspeccionadas previamente a su uso, verificando su adecuado estado mecánico, la operatividad de los sistemas de seguridad y el cumplimiento de las recomendaciones técnicas del fabricante. Así mismo, se verificó que los operadores contaran con la capacitación y autorización correspondiente para la operación de los equipos.

Adicionalmente, se realizó control al uso de herramienta menor, verificando su correcto estado y promoviendo prácticas seguras durante su utilización, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad del personal en obra.

Tabla 4. Listado de maquinaria movilizada en la obra.

ITEM	MAQUINARIA-VEHICULO-HTA-EQUIPOS	UND	CANT
1	PULIDORA 7"1/2 y 4 1/2	UND	2
2	VIBRO CONCRETO	UND	1
3	MEZCLADORA	UND	1
4	PLANTA ELECTRICA	UND	1
5	VOLQUETA	UND	1
6	CANGURO	UND	1
7	TALADRO	UND	2

Todos y cada uno de los equipos empleados el desarrollo y ejecución de las actividades descritas en este informe, se sometían a la respectiva inspección pre-operacional con la periodicidad requerida.

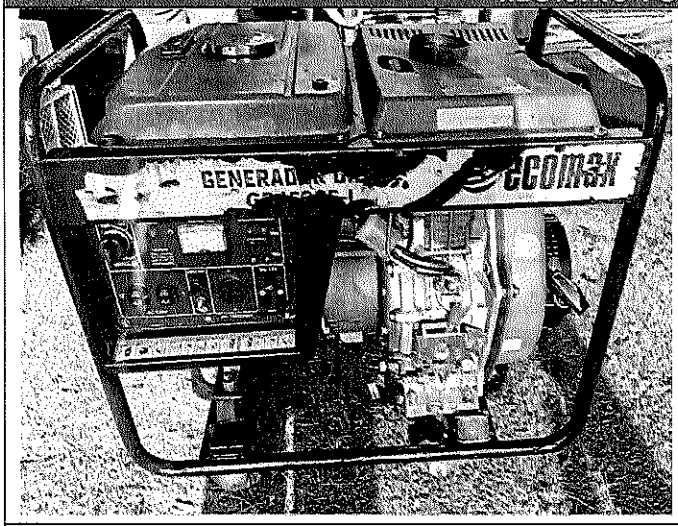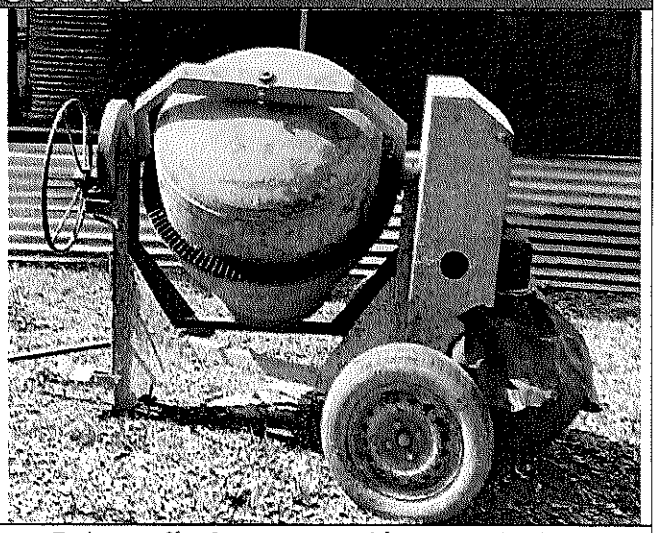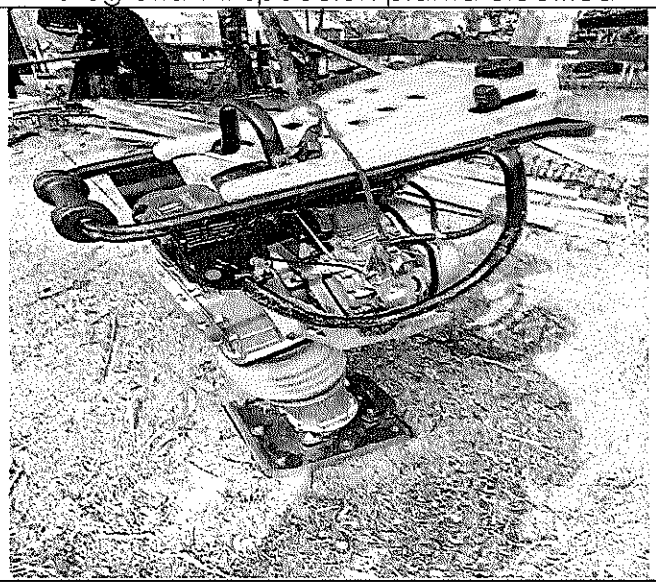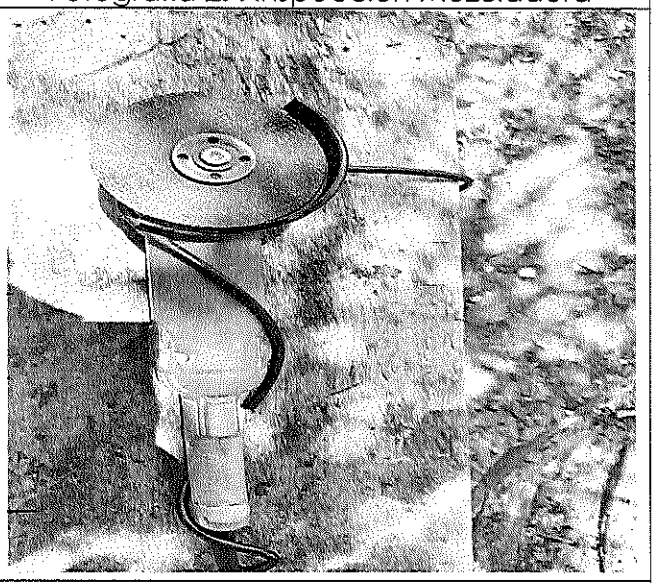REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Fotografía 1 Inspección planta electrica	Fotografía 2. . Inspección Mezcladora
	
Fotografía 3. Inspección de Canguro	Fotografía 4. Inspección pulidora

4.4. Condiciones climáticas

Durante el periodo evaluado se presentaron condiciones climáticas que afectaron el desarrollo de actividades. El seguimiento climático quedó consignado en el formato de control de lluvias.

4.5. Relación personal de obra (profesional, técnico, operativo)

De acuerdo con las necesidades del proyecto y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

PERIODO 01/05/26 – 31/05/26

PERSONAL PROFESIONAL						
CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. T.P.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA NO.
Director de Obra	Gonzalo Becerra Mejia	17.310.424	N/A	EPS Sanitas	Sura	1082108229
Residente de Obra	Jennifer Andrea Becerra Morales	1.121.852.433	Colpensiones	EPS Sanitas	Sura	1082108229
Profesional en Salud Ocupacional	Mayra Alejandra Cardenas Lesmes	1.121.884.993	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1082108229
Topografo	Marcos Didier Delgadillo Delgadillo	80.166.369	Porvenir	Capital Salud	Sura	1082108229
Ingeniera Ambiental	Jenny Paola Feria Triana	1.121.863.524	Protección	Sanitas	Sura	1082108229

Aux. Administrativo	Brayan Steven Rivera Martinez	1.193.092.733	Porvenir	EPS Sanitas	Sura	1082108229
Aux. Residente de Obra	Margie Daniela Herrera Paez	1.122.144.736	Proteccion	Famisanar	Sura	1082108229
Aux. Profesional SST	Yonli Yulieth Lozano Gonzalez	1.121.867.537	Colfondos	Famisanar	Sura	1082108229
Maestro Obra	Oscar Alexander Patiño Perez	86.055.645	Colfondos	Famisanar	Sura	1082108229
Oficial	Segundo Roa	93.372.770	Porvenir	Nueva eps	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Agustin Aguilar Gonzalez	86.008.125	Porvenir	Famisanar	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Dagoberto Cortes	74.857.071	Porvenir	Capital salud	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Juan Martin Bolivar Gaitan	1.125.549.456	Porvenir	Nueva EPS	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Vicente Gaitan Gaitan	8.192.573	Protección	EPS Mallamas	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Yesid Galindo Gaitan	1.006.946.002	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1082108229

Ayudante de Obra	David Verbel Solis	1.101.450.750	Colpensiones	Famisanar	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Robinson Matinez Gil	PPT 1824421	No	Nueva eps	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Juan Ramon Galindo Nariño	1.124.992.965	Proteccion	Mallamas	Sura	1082108229

Tabla 5. Relación de personal Mayo

PERIODO 01/06/26 – 30/06/26

PERSONAL PROFESIONAL						
CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. T.P.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA NO.
Director de Obra	Gonzalo Becerra Mejia	17.310.424	N/A	EPS Sanitas	Sura	1082984046
Residente de Obra	Jennifer Andrea Becerra Morales	1.121.852.433	Colpensiones	EPS Sanitas	Sura	1082984046
Profesional en Salud Ocupacional	Mayra Alejandra Cardenas Lesmes	1.121.884.993	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1082984046
Topografo	Marcos Didier Delgadillo Delgadillo	80.166.369	Porvenir	Capital Salud	Sura	1082984046

Ingeniera Ambiental	Jenny Paola Feria Triana	1.121.863.524	Protección	Sanitas	Sura	1082984046
Aux. Administrativo	Brayan Steven Rivera Martinez	1.193.092.733	Porvenir	EPS Sanitas	Sura	1082984046
Auxiliar Ingeniero Residente	Martin Omar Gutierrez Vega	17.340.851	Porvenir	Salud total	Sura	1082984046
Aux. Profesional SST	Yonli Yulieth Lozano Gonzalez	1.121.867.537	Colfondos	Famisanar	Sura	1082984046
Maestro Obra	Oscar Alexander Patiño Perez	86.055.645	Colfondos	Famisanar	Sura	1082984046
Oficial	Segundo Roa	93.372.770	Porvenir	Nueva eps	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Agustin Aguilar Gonzalez	86.008.125	Porvenir	Famisanar	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Dagoberto Cortes	74.857.071	Porvenir	Capital salud	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Juan Martin Bolivar Gaitan	1.125.549456	Porvenir	Nueva EPS	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Vicente Gaitan Gaitan	8.192.573	Porvenir	Mallamas eps	Sura	1082984046

Ayudante de Obra	Yesid Galindo Gaitan	1.006.946.002	Porvenir	Nueva eps	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	David Verbel Solis	1.101.450.750	Colpensiones	Famisanar	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Robinson Martinez Gil	PPT 1824421	N/A	Nueva eps	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Juan Ramon Galindo Nariño	1.124.992.965	Proteccion	Mallamas	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Edgar Reinaldo Amaya Barrera	1124820136	Porvenir	Pijaos salud	Sura	1082984046
Ayudante de Obra	Ruben Dario Galindo Mariño	1125004759	Porvenir	Mallamas	Sura	1082984046
Oficial de obra	Alvaro Martinez Gil	PPT 1755999	N/A	Nueva Eps	Sura	1082984046

Tabla 6. Relación de personal junio

Nota: El contratista de obra se abstiene de presentar el pago de seguridad social del mes JULIO 2026, en razón a lo preceptuado en el Decreto 1273 del 23 de julio de 2028, Articulo 3.2.7.6 Plazos. Entendiendo que la obligación del pago es mes vencido.

5. Conclusiones

Durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2026 y el 21 de julio de 2026, el proyecto avanzó conforme a la planificación establecida, desarrollando actividades de fundida de elementos tales como zapatas, columnas, placas, escaleras y demás, así como también demolición generales en casa blanca, construcción de muros, pañete, plomería hidrosanitaria.

Las actividades ejecutadas se desarrollaron garantizando condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, mediante la identificación y control de los riesgos asociados, el seguimiento a la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas, y la aplicación de medidas preventivas que permitieron prevenir incidentes y accidentes laborales durante el periodo evaluado.

En materia ambiental, se implementó un manejo adecuado de los residuos sólidos, mediante la segregación en la fuente, disposición temporal y control de los residuos generados, minimizando los impactos ambientales asociados a la ejecución de las actividades en obra.
En conclusión, la gestión HSEQ durante el periodo evaluado fue efectiva y conforme a los requisitos contractuales y normativos, sentando bases sólidas para el desarrollo seguro, ordenado y ambientalmente responsable de las siguientes fases del proyecto.

6. Anexos

- Formatos HSEQ registrados en campo.

MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES
Resolución No. 3036 de 2015
Profesional SST
Union Temporal Inge Policía Gaitan
Nit. 902.011.453-2

5849

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	David Vega Solano	CARGO	obrero
AREA	Instalación Policia	FECHA	11/05/2026

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN	CHECK	REINDUCCIÓN
			X	

INDUCCIÓN GENERAL

Misión
Visión
Reglamento Interno
Horarios de trabajo
Organigrama
Conducto regular

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: mayra Cardenas

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto
Procedimiento en un accidente trabajo
Programas de SST
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Fichas de seguridad msds

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: mayra Cardenas

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Política de Gestión Integral
Objetivos de Gestión Integral
Información Documentada Aplicable
Acciones correctivas y de mejora
Responsable de PQR

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: mayra Cardenas

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo
Lugar de trabajo
Conducto regular
Procedimientos internos
Registros
Otros:

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: mayra Cardenas

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientaes significativos
Programa de Gestión Ambiental
Plan de emergencias
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: mayra Cardenas

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores.

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4.Bueno 5. Excelente

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Cómo considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplió el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa	1	2	3	4	5
5	Cómo es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por
Ingrid Maryori Garcia Fonseca
Representante legal

Powered by CamScanner

5850

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	Robinson Martinez	CARGO	Ayudante
AREA	Instalacion Estacion Policia.	FECHA	11/02/2026

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN	CHECK	REINDUCCIÓN
			X	

INDUCCIÓN GENERAL

Misión	5
Visión	5
Reglamento interno	5
Horarios de trabajo	5
Organigrama	5
Conducto regular	5

Robinson — Firma Personal Nuevo

Moira Cardenas — Firma Facilitador

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto	4
Procedimiento en un accidente trabajo	5
Programas de SST	5
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	5
Fichas de seguridad cracia	4

Robinson — Firma Personal Nuevo

Moira Cardenas — Firma Facilitador

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Política de Gestión Integral	5
Objetivos de Gestion Integral	5
Informacion Documentada Aplicable	5
Acciones correctivas y de mejora	4
Responsable de PQR	5

Robinson — Firma Personal Nuevo

Moira Cardenas — Firma Facilitador

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo	5
Lugar de trabajo	5
Conducto regular	5
Procedimientos internos	5
Registros	4
Otros	

Robinson — Firma Personal Nuevo

Moira Cardenas — Firma Facilitador

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientales significativos	5
Programa de Gestión Ambiental	5
Plan de emergencias	4
Procedimiento de ident. Aspectos e impactos Amb	5

Robinson — Firma Personal Nuevo

Moira Cardenas — Firma Facilitador

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores.

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4 Bueno 5. Excelente

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Cómo considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplio el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa	1	2	3	4	5
5	Como es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por
Ingrid Maryori Garcia Fonseca
Representante legal

Powered by CamScanner

5851

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	Juan Roman Galindo Nariño	CARGO	Ayudante O.
AREA	Detectives Narinate Policia	FECHA	12-05-2026

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN	

INDUCCIÓN GENERAL

Misión	5
Visión	4
Reglamento Interno	5
Horarios de trabajo	4
Organigrama	4
Conducto regular	4

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto	5
Procedimiento en un accidente trabajo	5
Programas de SST	5
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	5
Fichas de seguridad msds	4

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Política de Gestión Integral	5
Objetivos de Gestión Integral	5
Información Documentada Aplicable	4
Acciones correctivas y de mejora	4
Responsable de PQR	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo	5
Lugar de trabajo	4
Conducto regular	4
Procedimientos internos	4
Registros	5
Otros:	

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientaes significativos	5
Programa de Gestión Ambiental	5
Plan de emergencias	4
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.	4

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores.

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4.Bueno 5. Excelente

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Como considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplio el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa	1	2	3	4	5
5	Como es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por
Ingrid Maryori Garcia Fonseca
Representante legal

Powered by CamScanner

5852

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES David

APELLIDOS Veibel Solis

IDENTIFICACION 1101450750.

CARGO Ayudante de obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Camibuso manga larga	XL	1	28/05/2026
Pantalon Jean	34	1	28/05/2026
Botas de seguridad	41	1	28/05/2026

OBSERVACIONES: /

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES David

APELLIDOS Verbel Solis.

IDENTIFICACION 1101450750.

CARGO Ayudante de obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Camiseo Naranja	L	1	11/05/2026
Gantes de Prestacion		1	11/05/2026
Gantes vaqueta		1	11/05/2026
Gafas oscuras.		1	11/05/2026
Casco de Seguridad.		1	11/05/2026
/	/	/	/
	/	/	/

OBSERVACIONES: /

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Mario Cardenas
ENTREGADO

David Verbel 1101450750
RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES	Robinson
APELLIDOS	Martinez G.
IDENTIFICACION	Ccn. 1824421.
CARGO	Ayudante de obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Camibuso Manga larga	M	1.	11/05/2026
Gorra tapeta		1	11/05/2026
Gafas de Seguridad		1	11/05/2026
Casco de Seguridad.		1	11/05/2026
Tapa oidos Orejón.		1	11/05/2026
/	/	/	/
	/	/	/

OBSERVACIONES:

/

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO. EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Mayra Cardenas
ENTREGADO

Robinson 1824421
RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Robinson

APELLIDOS Martinez G.

IDENTIFICACION PPT. 1024421.

CARGO Ayudante de obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Camibuso Manga larga	M	1	28/05/2026
Pantalon Jean	32	1	28/05/2026
Botas de Seguridad	39	1	28/05/2026

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO. EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Yadi Lorena G
ENTREGADO

ROBINSON MARTINEZ
RECIBIDO

Powered by CamScanner

5856

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Juan

APELLIDOS Galindo Mariño.

IDENTIFICACION 1124992965

CARGO Ayudante.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Casco Seguridad	U	1	12/05/2026
Gafas Ocupacional	U	1	12/05/2026
Gafas oscuras.	U	1	12/05/2026
Botas de Seguridad	38	1.	28/05/2026
Pantalon Jean	34	1.	28/05/2026
Camibuso manga larga	M	2	28/05/2026

OBSERVACIONES: /

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

5857

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Sigifredo

APELLIDOS Roa

IDENTIFICACION Cruz C. 93.277.720.

CARGO Oficial

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Camibuzo manga larga	L	1	11/05/2026
Pantalon Jeans	32	1	19/05/2026

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Mirra Cardenas
ENTREGADO

Sigifredo Roa
RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-MSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES	Oscar Alexander
APELLIDOS	Patiño Peret
IDENTIFICACION	86055645.
CARGO	Maestro de Obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Buso Manga Larga	L	1	11-05-2026
Buso Manga Larga	XL	1	28/05/2026

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Yeni Lozano G.
ENTREGADO

Oscar Alexander P.
RECIBIDO

Powered by CamScanner

5359

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Yesid Eduardo Gaitán

APELLIDOS

IDENTIFICACION 1006946004

CARGO Ayudante de Obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Camibuso Largo.	L	2	4/05/2026
Botas de Seguridad	39	1.	4/05/2026
Pantalon Jean	36	1	27/05/2026
—	-	-	-
—	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

OBSERVACIONES:

/

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO. EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Mira Cadenas
ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: [illegible] Versión: 1 Fecha: [illegible]
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	2-05-2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Segundo Roa	o/p	7:00	Segundo	1:00pm	Segundo R.	—
2	Escobar M a c	pv	7:00	Escobar	1:00pm	Escobar	—
3	ALEXIS ONVI.	AY	7:00	[illegible]	1:00pm	[illegible]	—
4	Juan Martin Bolivar	A.Y.	7:00	[illegible]	1:00pm	[illegible]	—
5	Vicente Cano	AYI	7:00	[illegible]	1:00pm	[illegible]	—
6	Yonli Lizoo G	Aux 351	7:00	[illegible]	11:00am	[illegible]	—
7	Marque Herrera	Aux Rel	7:00	[illegible]	14:00	[illegible]	—
8	Oscar A Rolon P	maestro	7:00	Oscar A Rolon P	1:00	Oscar A Rolon P	—
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN						Código: [illegible]
							Versión: 5
							Fecha: [illegible]
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA						
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"					FECHA:	4-05-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	ALEXIS DAVID	AN	7:00		4:30		—
2	Luis Alberto Rodriguez	A.T.	7:00		4:30		—
3	Vicente Cortes	AY.	7:00		4:30		—
4	Sergio Bea	Ofc	7:00		4:30		—
5	Agustin Agudelo	AY	7:00		4:30		—
6	Idbian Alvarez	OL.	7:00		4:20		—
7	Jorge Cabrera	NV	7:00		4:30		—
8	Maryie Herrera	Aux Bol	7:00		4:00		—
9	Yoni Lorano G	Aux esi	7:00		4:00		—
10	Oscar A Pabon	Maestro	7:00		4:30		—
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: [illegible] Versión: 2 Fecha: [illegible]
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"			FECHA:	5/05/2026	
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Luis Hugo Rodriguez	Ay.	7:00		4:30		—
2	Vicente Cote	Ay.	7:00		4:30		—
3	ALEXANDER	AN	7:00		4:30		—
4	Agustin Cabrera	AX	7:00		4:30		—
5	Adrian Suarez	OL	7:00		4:30		—
6	Eduardo Roa	OP	7:00		4:30		—
7	Maicol Herrera	Ay Res	7:00		4:30		—
8	Luis Lozano G	Aux 551	7:00		4:30		—
9	Oscar A Polanco P	Maestro	7:00		4:30		—
10	Gilberto	Ay	7:00		4:30		—
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"			FECHA:	6-05-2026	
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	ALEXIS DAVID	AY	7:00AM		4:30pm		-
2	YESID GALINDO G.	AY	7:00AM		4:30		-
3	Juan Martín Bolívar	A.Y.	7:00am		4:30		-
4	Miguel Gal	AY.	7:00am		4:30		-
5	Segundo Ro	Op.	7:00am		4:30		-
6	Agustín Agudelo	AY	7:00am		4:30		-
7	Fabian Alvarez	Dr.	7:00am		4:35		-
8	Porfirio C	AY	7:00am		4:30		-
9	Yoni Lozano G	Aux Pol	7:00am		4:00		-
10	Mayre Herrera	Aux Pol	7:00		4:00		-
11	Oscar Patiño	Maestro	7:00		4:30		-
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: [illegible] Versión: 0 Fecha: 19/12/2023
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	7-05-2024
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	[illegible]	[illegible]	7.00	[illegible]	4:00	[illegible]	—
2	[illegible]	[illegible]	7.00	[illegible]	4:30	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
4	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:00	[illegible]	—
5	[illegible]	[illegible]	7.00	[illegible]	4:00	[illegible]	—
6	[illegible]	[illegible]	7.00	[illegible]	4:00	[illegible]	—
7	[illegible]	[illegible]	7.00	[illegible]	4:00	[illegible]	—
8	[illegible]	[illegible]	7.00	[illegible]	4:00	[illegible]	—
9	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:00	[illegible]	—
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	2-05-2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Yonl. Lozano G	SST	7:00		4:00pm		—
2	Segoberto C	HY	7:00		4.30		—
3	Juan Martin Bolivar	A.Y.	7:00		4.30		—
4	Vicente Leal.	HY	7:00		4:30		—
5	ALEXIS DAVID	AY	7.00		4:30		—
6	Segundo Roa	Ayo	7:00		4:30		—
7	JESID GALINDO G	HY	7:00		4:30		—
8	Oscar Pelaez	Maestro	7:00		4:30		—
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"			FECHA:	9-05-2026	
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Yesid Eduardo G.	A.Y.	7:00		4:30.		-
2	Vicente Bolton	A.Y.	7.00		4:30		-
3	[illegible]	A.Y.	7.00		4:30		-
4	Juan Martin Bolivar	A.Y.	7.00		4:30		-
5	ALEXIS DAVID	A.Y	7:00		4:30		-
6	[illegible]	O.P.	7.00		4:30		-
7	Yal Isaac G	Ay 551	7:00		4:30		-
8	Marque Henrique	Ay Rel	7:00		4:30		-
9	[illegible]	Arestro.	7:00		4:30		-
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	16-05-2026	
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Vicente baiton	DY	7:00		1:00		-
2	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	1:00	[illegible]	-
3	Juan Galindo	Ayudante	7:00		1:00		-
4	Segundo Paz	ofp	7:00		1:00		-
5	Juan Martin Bolivar	A.T.	7:00		1:00		-
6	[illegible]	OT	7:00		1:00		-
7	Robinson	AY	7:00		1:00		-
8	Agustin [illegible]	AY	7:00		1:00		-
9	Oscar Pabon	maestro	7:00		1:00		-
10	Yoli Lorano G	Ayudante	7:00		11:00		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: [illegible]
		Versión: 0
		Fecha: [illegible]
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 15-05-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan Galindo Narino	Ayudante	7:00		4:30		-
2	Vicente Cuello	A-1	7:00		4:30		-
3	Oscar Alberto P.	Maestro	7:00		4:30		-
4	Agustin aguilar	AY	7:00		4:00		-
5	Dagoberto	AY	7:00		4:30		-
6	Robinson	AY	7:00		4:30		-
7	David Vergel	AY	7:00		4:30		-
8	Yesid Galindo	AY	7:00		4:30		-
9	Juan Martin Bolivar	A1	7:00		4:30		-
10	Yuli Lorano G	Ax SST	7:00		4:00		-
11	Manuel Herrera	Ax Res	7:00		4:00		-
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	20-05-2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Eugenio Bay	Obr	7:00	Eugenio	4:30	Eugenio	—
2	Yesid Galindo	AY.	7:00	Yesid	4:30	Yesid	—
3	Juan Galindo Nuevo	Ayudante	7:00		4:30		—
4	Agustin Agudelo	AY	7:00	Agustin	4:30	Agustin	—
5	Robinson	AY	7:00	Robinson	4:30	Robinson	—
6	Juan Martin Bolivar	A.Y.	7:00	Juan Martin	4:30	Juan Martin	—
7	David Verbel Sol.	AY	7:00	David	4:30	David	—
8	Oscar Alfonso	Maestro	7:00	Oscar Alfonso	4:30	Oscar Alfonso	—
9	Daguberto	AY	7:00	Daguberto	4:30	Daguberto	—
10	Yonli Urrea C	Mae Sol	7:00	Yonli	4:00	Yonli	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	21-05-2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	YESID GALINDO	RM	7:00		4:30		-
2	Juan Colmenares	Ayudante	7:00		4:30		-
3	Angel Aguilar	AY	7:00		4:30		-
4	ROBINSON	AY	7:00		4:30		-
5	Juan Martin Echeverry	A.T.	7:00		4:30		-
6	DAVID VERGARA SOLIS	AY	7:00		4:30		-
7	Segundo Bonilla	Ofp	7:00		4:30		-
8	Oscar A Patiño P.	Maestro	7:00		4:30		-
9	Yeison Lozano G	AUX SST	7:00		4:00		-
10	Dagoberto	AY	7:00		4:30		-
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: TP-HSEQ-FOP-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	11-05-2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Vicente Gaitan	Ay.	7:00		4:30		—
2	YESID GALINDO	Ay.	7:00		4:30		—
3	Segundo Rey	of.	7:00		4:30		—
4	Sargento	Sy	7:00		4:30		—
5	Juan Martin Bolivar	Ayy.	7:00		4:30		—
6	Oscar A. Patiño	Maestro	7:00		4:30		—
7	Agustin Aguilar	Alx	7:00		4:30		—
8	Yonli Lozano G	Auxiliar	7:00		4:00 pm		—
9	Mayle Herrera	Aux Rs	7:00		4:00		—
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: TP-HSEQ-FOR-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	12-05-2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Sigmer Rojas R	ofo	7:00		4:30		—
2	Vicente Cala		7:00		4:30		—
3	Agustin Agudelo	AY	7:00		4:30		—
4	Yaique Herrera	Aux Ros	7:00		4:30		—
5	Yoni Lozano C	Aux SST	7.00		4:00		—
6	Oscar Pedraza	maestro	7:00		4:30		—
7	Deyaberth V.		7:00		4:30		—
8	Yoni Lozano C	Aux SST	7:00		4:00		—
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN						Código: IP-HSEQ-FOR-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA						
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"					FECHA:	13-05-2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Eduardo Roa	Ayd.	7:00		4:00		-
2	Vicente Cruz		7:00		4:00		-
3	Yesid Galindo G	Ay	7:00		4:00		-
4	Dagoberto C	Ay	7:00		4:00		-
5	Agustin Aguilar	Ay	7:00		4:00		-
6	Oscar A Bolaños P		7:00		4:00		-
7	Maiyie Henao	Ay	7:00		4:00		-
8	Yonl Lizcano G	Ay Sst	7:00		4:00		-
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: TP-HSEQ-FOR-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	16-05-2025
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Vicente Gaitan	My	7:00		4:30		-
2	Eugenio Ro	Ayu	7:00	Eugenio R.	4:30	Eugenio R.	-
3	Agustin Aguilar	Ay	7:00		4:30		-
4	Dagoberto	Ay	7:00		4:30		-
5	Mayle Henao	Ay	7:00		4:00		-
6	Oscar Alfaro		7:00	Oscar Alfaro	4:30	Oscar Alfaro	-
7	Yonli Lozano G	Ax 551	7:00		4:00		-
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: TP-HSEQ-FOR-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	19-05-2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan Martin Bolivar G.	A.Y.	7:00		4:30		-
2	Segundo Roa	ayf	7:00	Segundo R.	4:30	Segundo R.	-
3	Dargobertio C.	A.Y	7:00		4:30		-
4	Vicente Horton	AY	7:00		4:30		-
5	David Velasquez	AY	7:00	David	4:30		-
6	Robinson	AY	7:00	Robin	4:30	Robin	-
7	Oscar A Reyes P.	Maestro	7:00	Oscar A Reyes	4:30		-
8	Yuli Lorano G	Auxiliar	7:00		4:00		-
9	Agustin Aguilar	AY	7:00		4:30		-
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOP-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 22-05-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Yesid Gallardo	Dy.	7:00		4:30		—
2	Segundo Rey	Ayb	7:00		4:30		—
3	Robinson	Ay	7:00		4:30		—
4	David Vera	Ay	7:00		4:30		—
5	Juan Martin Bolaños	A.Y.	7:00		4:30		—
6	Yoni Lozano G	Aux SS1	7:00		4:00pm		—
7	Oscar Molina	Maestro	7:00		4:30		—
8	Dagoberto	PV	7:00		4:30		—
9	Agustin Aguilar	Ay	7:00		4:30		—
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: IP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 23-05-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Eduardo Roa	Op	7:00	Eduardo	1:00 Pm	Eduardo	—
2	Robinson	AY	7:00	Robinson	1:00 Pm	Robinson	—
3	Yesid Galindo	OY	7:00		1:00 Pm		—
4	Juan Martín Bolívar	A.T.	7:00		1:00 Pm		—
5	Yan Isaac G	AX 351	7:00		1:00 Pm		—
6	Oscar Abogo	Maestro	7:00		1:00 Pm		—
7	Dagoberto	AY	7:00		1:00 Pm		—
8	Agustín Aguilar C	AY	7:00		1:00 Pm		—
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

#¡DESCONOCIDO!	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: [illegible]
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 2 - 05 - 2026.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
2	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
3	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
4	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
5	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
6	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
7	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
8	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:00pm	[illegible]	—
9	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30pm	[illegible]	—
10	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:30pm	[illegible]	—
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

#¡DESCONOCIDO!	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: [illegible]
		Versión: 0
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 18/12/2025
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 26-05-2026.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Segundo Mag	Of.	7:00	Segundo M.	4:30	Segundo	-
2	Yesid Galindo	Ay.	7:00	Yesid	4:30	Yesid	-
3	Juan Galindo Nuñez	Ayudante	7:00		4:30		-
4	[illegible]	A Y	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	-
5	Vicente Cortes	Ay.	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	-
6	[illegible]	Ay	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	-
7	Juan Martin Bolaños	A.Y.	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	-
8	ROBINSON MARTINEZ	A Y	7:00.	ROBINSON	4:30	ROBINSON	-
9	York Lozano G	Apoyo SST	7:00	York L	4:00	York L.	-
10	Oscar A Pabon	Maestro	7:00	Oscar A Pabon	4:30	Oscar A Pabon	-
11	Agustin Aguilar	Ay.	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	-
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

#¡DESCONOCIDO!	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: [illegible]
		Versión: 0
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 18/12/2025

PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA:	27-05-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	[illegible]	Ayo	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
2	[illegible]	A y	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
3	[illegible]	Ay.	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
4	[illegible]	19 y	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
5	[illegible]	19 y.	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
6	[illegible]	19 y	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
7	[illegible]	A.y.	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
8	ROBINSON MARTINEZ	A y	7:00	ROBINSON	4:30	ROBINSON	—
9	[illegible]	Aux 557	7:00	[illegible]	4:00	[illegible]	-
10	[illegible]	Maestro.	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
11	[illegible]	Ay.	7:00	[illegible]	4:30	[illegible]	—
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: TP-HSEQ-FOP-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	28-05-2026.
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Eduardo Bar	aseo	7:00		4:30		—
2	Miguel Cano	Ay.	7:00		4:30		—
3	[illegible]	Ay	7:00		4:30		—
4	Juan Galindo Nuñez	Mensajero	7:00		4:30		—
5	Robinson	Ay	7:00	Robinson	4:30	Robinson	—
6	Yesid Galindo	Ay.	7:00		4:30		—
7	Juan Martin Bolivar	Ay.	7:00		4:30		—
8	Oscar Patiño P.	Maestro	7:00		4:30		—
9	Yair Lozano G	Aux SST	7:00		4:00		—
10	Agustin Aguilera	Ay.	7:00		4:30		—
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

#¡DESCONOCIDO!	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-REG-FOR-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 29-05-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan Galindo Nuñez	Ayudante	7:00		4:30		—
2	Dover Uribe Sgto.	Ayotonic	7:00		4:30		—
3	Vicente Beltr.	A-Y	7:00		4:30		—
4	Dargoberto C	AY	7:00		4:30		—
5	Juan Martín Bolivar	A.Y.	7:00		4:30		—
6	Robinson Martinez	A Y	7:00	Robinson	4:30	Robinson	—
7	Segundo Roa	ofo	7:00		4:30		—
8	Yuli Lozano G	Auxiliar	7:00		4:00		—
9	Oscar Alfonso P	Maestro	7:00		4:30		—
10	Agustín Aguilar.	Ayu.	7:00		4:30		—
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN						Código: [illegible]
							Versión: 0
							Fecha: [illegible]
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA						
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	30-05-2016	

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Yonl. Lozano G	SST	7:00		1:00		—
2	ROBINSON MARTINEZ	A Y	7:00	ROBINSON	1:00	ROBINSON	-
3	David VELASCO SOLIS	A Y	7:00	David	1:00	David	-
4	Segundo Rios	Oficios	7:00	Segundo R.	1:00		-
5	Ricardo Gaitan	A Y	7:00		1:00		-
6	Juan Galindo Naran.	A y	7:00		1:00		-
7	Juan Martin Bolivar	A. Y.	7:00		1:00		-
8	Desaberto C	A Y	7:00	Desaberto	1:00	Desaberto	-
9	Oscar A Patiño R.	Maestro	7:00	Oscar A Patiño	1:00	Oscar A Patiño	-
10	Agustin Aguilar G	A Y	7:00		1:00		-
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

5884

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	4-05-2026	7.00 am

TEMA
Orden y Aseo en Obra.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yanis Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Segundo Roa	93392770	
2	Jean Hurtado Policia Gaitan	1122544456	
3	JESID GALINDO GAITAN		
4	Vicente Gaitan Gaitan	8925173	
5	ALEXIS DAVID	1124190992	
6	Duvaberto C	24852071	
7	Edwin Alvarez.	1124227488	
8	Agustin Agudelo G	86008127	
9	Oscar Pedraza	80556615	
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estación Policia	5-05-2026	7:00 am

TEMA
Importancia de Respetar Señales de Seguridad

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yon Leon G

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	ALEXIS DAVID	1124990292	
2	YESID GALINDO GAITAN	1006946001	
3	Juan Martin Bolivar Gaitán	1125549456	
4	Vicente Leon	8191253	
5	Segundo Roa C	93372770	
6	Agustin Aguilar G	86.008.127	
7	Fabian Alvarez	1121922788	
8	Desiderio C	7485202	
9	Miguel Herrera	1122144136	
10	Oscar A Rojas P.	86055615	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cual?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones Estación Policía	6-05-2026	9:00 am

TEMA

Riesgo Electrico baja tension.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Maira Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Agustin Aguilar G	8600847	
2	(ESTD GAITANDO GAITAN	1006946002	
3	Vfcante Gaitan Gaitan	8192573	
4	Dagoberto C	2148570	
5	Juan Mauricio Bolivar Estacion	1122554794456	
6	Eduardo Roa	93372710	
7	Oscar Alfonso R.	80055615	
8	Yuli Lozano G	1121962537	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5887

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** IP-HSEQ-FOR-011 **Versión:** 0 **Fecha:** 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	2/05/2026	7:00 am

TEMA
Cultura de Seguridad

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yonli Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Agustín Aguilar E	86008195	
2	Vicente Gaitan	8191573	
3	Juan Martín Bolívar Gaitán	1125549456	
4	ALEXANDER	1121999978	
5	Segundo Paz	93332778	
6	Segobiano C	7185320	
7	Oscar H Patiño	86035605	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: [illegible]
	Versión: 0
	Fecha: 18/12/2025
REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION

Charla		Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones Estación Policía	7-05-2026	7:00 am

TEMA

Riesgo Mecánico

NOMBRE DEL FACILITADOR

María Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	UESD GOLFO DE URABA	1006460021	[illegible]
3	Patrullero Gaitan Gaitan	892513	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Juan Mauricio Bolivar Gaitán	1125544956	[illegible]
6	[illegible]	95392710	[illegible]
7	[illegible]	9605560	[illegible]
8	[illegible]	1214567537	[illegible]
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOP-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Estación Policía Pto Gaitán	18-05-2026	7:00 am

TEMA

Sindrome del Burnout - Psicolaboral.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Maria Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	
2	Juan Martin Bolivar Gaitán	1123549456	
3	[illegible]	8102573	
4	ALEXIS DAVID	1124996992	
5	[illegible]	93372770	
6	[illegible]	1006946002	
7	[illegible]	1117867559	
8	Oscar Nelson P	86055669	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5890

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	9-05-2026	7:00 am

TEMA

Enfermedades Transmitidas por vectores.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yenli Isaac C

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Yesid Galindo Gaitán	1006946002	
2	Vicente Gaitan Gaitan	8912573	
3	Dargabeth Mac	21857071	
4	Juan Martín Bolivar Gaitán	1125549456	
5	ALEXIS DAVID	1124990992	
6	Segundo Ros G	93372770	
7	Maigie Herrera.	1122144136	
8	Oscar H Patiño	86055615	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla		Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cual?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones	11-05-2026	7:00 am

TEMA

Riesgos de Herramientas manuales y Electricas

NOMBRE DEL FACILITADOR

Mayra cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Nicolas Gaitan	8101573	
2	YEIID BOLIVAR GAITAN	1006946002	
3	Eduardo Tao E.	9537210	
4	Diego Lozano C	7185701	
5	Juan Martin Bolivar Gaitán	1125541456	
6	DAVID USMA SAU	1101450756	
7	Oscar Nieto N.	80055645	
8	AGUSTIN AGUILAR O	8600895	
9	Maiye Herrera.	1121114136	
10	Yonli Lozano G	1143625537	1143625537
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	15-05-2026	7:00 am

TEMA
Separación en la fuente (codigo de colores).

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yanli Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Juan Salvador Navia	1124992961	
2	Vicente Gaitan Gaitan	81912573	
3	Oscar Mahecha	80055605	
4	Agustin Aguilar C	85029195	
5	Dagoberto C	4U185701	
6	Robinson	1824422	
7		1121470795	
8	Yoid Salvador Gaitan	1006940008	
9	Juan Martin Bolivar Gaitan	1125549456	
10	Maryer Hern	1122144736	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: IP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	16-05-2026	1:00 pm

TEMA

Importancia del uso de la Protección Auditiva

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yenl. Lorena G

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Vicente Gaitan Gaitan	892593	
2	Duvaberto C	1085202	
3	Juan Eduardo Navia	1124992965	
4	Eduardo Roa	93332270	
5	Juan Martin Bolivar Gaitan	1123549456	
6	David Ortiz Solis	1014505550	
7	Robinson martinez	1824422	
8	Agustin Aguilar G	86 on 2 M.S	
9	Yeiro Eduardo Galindo Galindo Cedula	1006716002	
10	Osca Alfonso R	86055645	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

/

Powered by CamScanner

5894

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-013
	Versión: 0
	Fecha: 18/12/2025
REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otra		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Policía Estación	29-05-2026	7:00am

TEMA

Atención de Emergencias

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yeli Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Juan Galindo Jaimo	1124992965	
2	David Ventura Solis	1101450750	
3	Vicente Gaitan	8191573	
4	[illegible]	1085071	
5	Juan Martin Bolivar. C.	1125549456	
6	Robinson Martinez	1824421	Robinson
7	Yeid Galindo Gaitan	[illegible]	
8	Segundo Roa	93372770	
9	Oscar Patiño	86055605	
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5895

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	12-05-2026	7:00 am

TEMA
Uso de Hojas de Seguridad (MSDS)

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yenit Lozano G

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Eyuma Tique G.	93372770	
2	Vincent Cecil	8192743	
3	Agustín Aguilar G	86008125	
4	Oscar A Patiño P	86055605	
5	Maicol Herrera	1122144236	
6	[illegible]	1082578[illegible]	
7	David Ureña Solis	1101450750	
8	Juan Hendy Bolivar	1125549456	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5896

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Bella.	13-05-2026.	7:00 am.

TEMA
Proveion de Riesgos Biologicos.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yonli Lozano G

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Eduardo Tapa	93372770	Eduardo
2	Vicente Gaitan Gaitan	8192573	
3	YESID GALINDO GAITAN	1069946002	
4	Dagoberto C	7185787	
5	Agustin Aguilar G	86002125	
6	Oscar Alfaro D.	86035869	Oscar Alfaro D.
7	Mayre Herrera	1121447136	
8	David Ramirez Solo	1101 [illegible] 25	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5897

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla		Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	14-05-2026	7:00 am

TEMA
Límites de Velocidad y Estado Psicofísico. PESV.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yenli Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Vicente Gaitan Gaitan	8192573	
2	Eduardo Roa Cruz	93372770	
3	Agustin Aguilar L	86078R5	
4	Diego Ortiz C	1.118.570.770	
5	Mayte Herrera	1122144136	
6	Oscar A Patiño	86056645	
7	David Vera Sol.	101 458 256	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Dilatación Estación Policía.	19-05-2026	7:00 am

TEMA
Importancia de la Hidratación.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Maira Cardenas.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Juan Martin Bolivar Gaitán	1125549456	
2	Eduardo Bonilla	93372270	
3	Sneeberger C	1121572071	
4	Vicente Gaitan Gaitan	8982513	
5	David Verbel Solis	1101430250	
6	Robinson Martinez	1824421	
7	Oscar A Bolivar P.	86055615	
8	Yoli Lozano G	1143623224	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5849

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones Estación Policía	21-05-2026	7:00 am.

TEMA
Golpes y Atropellamientos.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yeah Lopez G

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	YEID GALINDO	1006946002	
2	Juan Galindo Marin	1144992965	
3	Martin Aguilar G	86005825	
4	ROBINSON	1824427	
5	Juan Martin Bolivar G.	1125549456	
6	Eugenio Roy Soler.	93772220	
7	Oscar A Patiño M.	86055645	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	22-05-2026	7:00 am

TEMA
Ruido laboral y Proteccion Auditiva.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yeni Lozano C

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	YESID GALINDO GAITAN	1069460062	
2	Siguenza Roa	93372270	
3	Robinson	1824427	Robinso
4	David Ayala Sol.	1101451756	
5	Juan Martin Bolivar Gerencia	1125549456	
6	Oscar A Soto P.	86055645	
7	Deisobert	7185720	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion de Policia	23-05-2026	7:00 a.m.

TEMA
Normas Basicas de seguridad.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yon P. Lozano G

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Segundo Poca	93372770	
2	Robinson	1824421	
3	David Ucaris Sol.	1045075.	
4	(PESL 6) Golimolo Gaitán	1006946002	
5	Juan Martin Bolivar Gaitan	1123549456	
6	Oscar H Pinto	86055645	
7	Odobaldo C	1185720	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5902

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: IP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	25-05-2026	7:10 am

TEMA
fatiga laboral.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Maria Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Eduardo Roa	93372770	
2	Yesid Galindo Gaitán	1006946002	
3	Juan Galindo Nuñez	1124992965	
4	Vicente Cuellar	8101573	
5	Diego [illegible]	7168576	
6	Juan Hunter Bolivar	1125549456	
7	Robinson Martinez	PPT. 1824011	
8	Yesid Galindo Gaitán	1006946002	
9	Oscar A Patiño	86055605	
10	David Vera Sali	1101 450 755	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: IP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	26-05-2026	7:00 am

TEMA
Prevencion de lecciones por Sobrecuertos.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Maria Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Siguero Roa.	93372770	Siguero
2	Yesid Galindo Gaitán	1006946032	
3	Juan Galindo Nuño	1104192965	
4	David Vera Sol.	1061450750	
5	Vicent Quiroz	91081573	
6	Juan Hurtado Bolivar G.	1122554456	
7	Robinson Martinez	1824421	Robinson
8	Oscar A Pedroza N.	86035645	
9	Sebastian C	1085207	
10	Yonh Lozano G.	1121867537	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	27-05-2026	7:05 am.

TEMA
Uso seguro de Escaleras Portatiles.

NOMBRE DEL FACILITADOR
moiso Cardenas.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Segundo Roa G	93372770	Segundo
2	Vicente Cuesta	8192573	
3	Dagobertoc	7218570 71	Dagoberto
4	Juan Eduardo Nariño	1124924 65	
5	Robinson	1824424	Robinson
6	Ulsio Eduardo G	1069 4600	
7	Juan Martin Bolivey	1125549456	
8	Oscar A Patino C	86055665	Oscar A Patino
9	David Vera Sol.	1101 450 73	David
10	Yoali Lizcano G	1121367537	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5905

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	28-05-2026	7:00am

TEMA
Seguridad Vial / normas de Transito.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yali Lozada C.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Juan Galindo Nariño	1124992965	
2	Vicente Gaitan Gaitan	8991573	
3	Donaldo C	7018570	
4	Eduardo Tapa	93372730	
5	Robinson Martinez	1824421	Robin
6	David Vera Sol	1101450751	
7	Juan Martin Bolivar Gaitan	1925549456	
8	Edgar Tin Agudelo G	88098125	
9	Yhid Galindo Gaitán	1006946002	
10	Oscar A Patiño P.	86055609	Oscar Patiño
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	30-05-2026	7:00 am.

TEMA

Manejo Manual de Cargas.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yonli Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	ROBINSON MARTINEZ	1824421	Robinson
2	David Nelson Sch.	1101450756	
3	Segundo Toa	83727770	
4	Vicente Barton	81925 73	
5	Juan Galindo Noriño	1124992965	
6	Juan Martin Bolivar C.	1125549456	
7	Agustín Aguilar G	86002125	
8	Dagoberto C	7485706 91	
9	Oscar A Patiño P	86055605	
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5902

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-015 Versión: 0 Fecha: 19/12/2025
	MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	

Nombre del que Inspecciona	Mira Cardenas
Cargo	Profesional SST
Fecha de Inspección	26-05-2026
Ubicación del Botiquín	campamento.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
CLORURO DE SODIO	Bien	1	02/2027
CUELLO ORTOPEDICO	Bien	1	
ALCOHOL ANTISEPTICO	Bien	1	15/01/2026
MICROPORE	Bien	1	
ALGODÓN	Bien	1	
VENDA ELASTICA 2"X5M	Bien	1	Oct/2019
SUERO ORAL	Bien	1	5/2026
TOALLAS HIGIENICAS	Bien	1P	2/2027
TAPABOCAS	Bien	2	
AGUA	N/A.	0	N/A
CONDONES	Bien	1	9/2028
GASA ESTERIL	Bien	3	27/12/01
BAJA LENGUAS	Bien	20	
GUANTES	Bien	3P	N/A
PITO	Bien	1	
BISTURI	Bien	1	N/A.
LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS	Bien	1	N/A
CAMILLA	Bien.	2	N/A.
/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-SGI-016	
Versión: 0	
Fecha: 12/12/2025	

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

ORDEN	No. DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR															
				ACT.	PROX.		PRESION		BELLO/ GARANTÍA		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		SEÑALIZACION / DEMARCACION	
							B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N	S	N
1	1	Multiproposito	10L	X		Ambiente	X		X		X		X		X		n/a		X		✓	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O GABINETES CONTRA INCENDIOS	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIO	FIN
1	El extintor se encuentra en optimas Condiciones para su uso.	N/A.	SST	26/03/26	26/03/26
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4					

CONVENCIONES: B: BIEN S: SI M: MAL N: NO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Construccion Alojamientos
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yesid Galindo Gaitan
CEDULA: 1006946002

FECHA: 18-05-2026.
CARGO: Ayudante de Obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	ESTADO BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A		PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS						
1	Tapabocas	Buena.			X			
2	Casco seguridad	Buena			X			
3	Tapa oídos							
4	Gafas de Seguridad	Buena			X			
B		PROTECCIÓN PARA MIEMBROS						
1	Guantes Caucho	Bueno			X			
2	Guantes Carnaza							
3	Guantes Vaqueta							
4	Guantes precisión							
C		ROPA DE TRABAJO						
1	Capuchón	Buena			X			
2	Camibuso	Buena			X			
3	Pantalón Jean	Buena			X			
4	Calzado	Buena.			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Construcción Alojamientos.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Vicente Gaitan Gaitan
CEDULA: 9192573
FECHA 27-05-2026
CARGO: Ayudante de Obra

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	F.V	N/A	ESTADO BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.					PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OIDOS			
1	Tapabocas	Buena			X			
2	Casco seguridad	Buena			X			
3	Tapa oídos	Buena			X			
4	Gafas de Seguridad	Buena			X			
B.					PROTECCIÓN PARA MIEMBROS			
1	Guantes Caucho							
2	Guantes Carnaza	Buena			X			
3	Guantes Vaqueta							
4	Guantes precisión							
C.					ROPA DE TRABAJO			
1	Capuchón							
2	Camibuso	Buena			X			
3	Pantalón Jean	Buena			X			
4	Calzado	Buena			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Ayudante de Obra

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juan Martin Bolivar Gaitan

FECHA: 23-05-2026

CEDULA: 1125599456

CARGO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	F.V	N/A	ESTADO BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A					PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OIDOS			
1	Tapabocas	Bueno			X			
2	Casco seguridad	Bueno			X			
3	Tapa oídos							
4	Gafas de Seguridad	Bueno			X			
B					PROTECCIÓN PARA MIEMBROS			
1	Guantes Caucho							
2	Guantes Carnaza							
3	Guantes Vaqueta							
4	Guantes precisión	Bueno			X		X	Se le realizar reposicion EPP.
C					ROPA DE TRABAJO			
1	Capuchón	Bueno			X			
2	Camibuso	Bueno			X			
3	Pantalón Jean	Bueno			X			
4	Calzado	Bueno.			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Captación Alejandrías

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Agustín Agudelo González

FECHA: 23-05-2026.

CEDULA: 86008125

CARGO: Ayudante de obra.

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	F.V	N/A	ESTADO BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A	PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OIDOS							
1	Tapabocas				✓			
2	Casco seguridad	Bueno			✓			
3	Tapa oídos				✓			
4	Gafas de Seguridad	Buena			✓			
B	PROTECCIÓN PARA MIEMBROS							
1	Guantes Caucho							
2	Guantes Carnaza							
3	Guantes Vaqueta	Bueno			✓			
4	Guantes precisión							
C	ROPA DE TRABAJO							
1	Capuchón	Buena			✓			
2	Camibuso	Buena			✓			
3	Pantalón Jean	Bueno			✓			
4	Calzado	Bueno.			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: IP-HSEQ-FOR-017 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

AREA: Construccion Alquimerka
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Oscar Patiño
CEDULA: 86055645.

FECHA: 23/05/2026
CARGO: Maestro de obra

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	ESTADO: BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.					PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OIDOS			
1	Tapabocas			X				
2	Casco seguridad	-			X			Usar correctamente el casco.
3	Tapa oidos			X				
4	Gafas de Seguridad	Bueno.			X			
B					PROTECCIÓN PARA MIEMBROS			
1	Guantes Caucho							
2	Guantes Carnaza							
3	Guantes Vaqueta	Buena			X			
4	Guantes precisión							
C.					ROPA DE TRABAJO			
1	Capuchón	Buena						
2	Camibuso	Buena						
3	Pantalón Jean	Buena						
4	Calzado	Bueno.						

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-018
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS	

FECHA: 13-05-2026 HORA: 8:00 am
ÁREA: Construcción Alojamiento - Policía

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICA A	B	C	OBSERVACIONES
	RIESGO ELECTRICO							
1	Los terminales, cables , tomas ,interruptores, tacos , cajas y acometidas se encuentran buen estado	X						
2	Los tomacorrientes están identificados según voltaje.	X						
3	Las cajas de controles eléctricos tienen tapa.	X						
4	Las cajas de controles y tomacorrientes se encuentran despejadas y señalizadas.	X						
5	Existe polo a tierra en máquinas y equipos.	X						
6	Los equipos eléctricos o tomacorrientes están protegidos a proyecciones de agua.	X						
7	Se realiza inspección y mantenimiento a los cables e instalaciones eléctricas.	X						
8	Los cables se encuentran entubados o en canaleta.	X						
	RIESGO LOCATIVO / INSTALACIONES LOCATIVAS							
1	Los pisos y pasillos están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.	X						
2	Se encuentran en orden las herramientas	X						
3	Se ha demarcado el area de deposito de residuos	X						
4	Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos.	X						
5	Se han recojido al final del trabajo los residuos generados	X						
6	Fueron dispuestos los residuos en bolsas o canecas	X						
8	Las areas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas	X						
9	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado	X						
10	El tipo y numero de extintores existentes son los necesarios para la labor que se realiza	X						

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Maira Cardenas

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION: Dagoberto C

CONVENCIONES: S:SI , N NO A: Grado de Acción Inmediata
B : Grado de Acción Pronta
C: Grado de Acción Posterior

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-018
		Versión: 0
		Fecha 18/12/2025
	INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS	

FECHA: 30/05/2026 HORA: 10:00 am
ÁREA: Alojamiento Contratista Policía

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICA A	B	C	OBSERVACIONES
	RIESGO ELECTRICO							
1	Los terminales, cables , tomas ,interruptores, tacos , cajas y acometidas se encuentran buen estado	X						
2	Los tomacorrientes están identificados según voltaje.	X						
3	Las cajas de controles eléctricos tienen tapa.	X						
4	Las cajas de controles y tomacorrientes se encuentran despejadas y señalizadas.	X						
5	Existe polo a tierra en máquinas y equipos.	X						
6	Los equipos eléctricos o tomacorrientes están protegidos a proyecciones de agua.	X						
7	Se realiza inspección y mantenimiento a los cables e instalaciones eléctricas.	X						
8	Los cables se encuentran entubados o en canaleta.	X						
	RIESGO LOCATIVO / INSTALACIONES LOCATIVAS							
1	Los pisos y pasillos están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.	X						
2	Se encuentran en orden las herramientas	X						
3	Se ha demarcado el area de deposito de residuos	X						
4	Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos.	X						
5	Se han recojido al final del trabajo los residuos generados	X						
6	Fueron dispuestos los residuos en bolsas o canecas	X						
8	Las areas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas	X						
9	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado	X						
10	El tipo y numero de extintores existentes son los necesarios para la labor que se realiza.	X						

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Yelli Lozano G

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION :

CONVENCIONES: S:SI , N:NO A: Grado de Acción Inmediata
B : Grado de Acción Pronta
C: Grado de Acción Posterior

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-013 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA: Inge Policia — AREA A INSPECCIONAR: Obra Civil

ACTIVIDAD: Construcción Mejoramiento — FECHA: 22/05/26 HORA: 9:00 am

	HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se usa adecuada al trabajo	X			
2	Se encuentra en buen estado	X			
3	Se guardan y portan adecuadamente	X			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X			
5	Se usan prensas de banco para sujetarlas	X			
	HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo.	X			
2	Los cinceles se encuentran afiliados.	X			
3	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias.	X			
4	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos.			X	
5	Los cuchillos disponen de mangos y fundas.			X	
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor.	X			
2	Sus caras y bordes están en buen estado.	X			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo.	X			
	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN-LLAVES	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.		X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas.		X		
3	Se dispone de llaves para golpear.		X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.		X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.		X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado.		X		
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.	X			
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores).	X			
2	Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	X			
3	Están limpias y lubricadas.	X			
4	Tiene sus guardas.	X			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
6	El cable o enchufe no presentan daños.	X			
7	En los taladros se observa el mandil con golpes.	X			

Powered by CamScanner

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños.	X			
9	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeadas.	X			
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	
2	Se emplean EPP's de acuerdo con la herramienta empleada.			✓	
3	Se trabaja a las presiones indicadas.			X	
4	La herramienta es descargada al terminar.			X	
HERRAMIENTAS POR DOTACIÓN		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	El personal es autorizado.	X			
2	Emplean los EPP's	X			
3	Es descargada y almacenada	X			
4	Su sistema de disparo es bajo presión			X	
OTROS: ¿CUÁLES?		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		

ACCIONES DE MEJORA :

Oscar Pedro
FIRMA ALMACENISTA

Maira Cardenas
FIRMA INSPECTOR HSEQ

Powered by CamScanner

5918

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-019 Versión: 0 Fecha: 13/12/2024
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA: Inge Policia — AREA A INSPECCIONAR: Almacen

ACTIVIDAD: Construccion Mejoramiento — FECHA: 15/05/26 HORA: 10:00 am

	HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se usa adecuada al trabajo	X			
2	Se encuentra en buen estado	X			
3	Se guardan y portan adecuadamente	X			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adhendos	X			
5	Se usan prensas de banco para sujetarlas	X			
	HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X			
2	Los cinceles se encuentran afilados	X			
3	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X			
4	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			X	
5	Los cuchillos disponen de mangos y fundas.			X	
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor.	X			
2	Sus caras y bordes están en buen estado.	X			
3	Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo.	X			
	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN-LLAVES	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.			X	
2	Se observan en la llave huellas y palancas.			X	
3	Se dispone de llaves para golpear.			X	
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.			X	
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.			X	
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			X	
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.			X	
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las herramientas según las adecuadas según el nesgo (humedad, vapores).	X			
2	Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	X			
3	Están limpias y lubricadas.	X			
4	Tiene sus guardas	X			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
6	El cable o enchufe no presentan daños.	X			
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X			

Powered by CamScanner

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X			
9	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeadas	X			
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X	
2	Se emplean EPP's de acuerdo con la herramienta empleada			X	
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X	
4	La herramienta es descargada al terminar			X	
HERRAMIENTAS POR DOTACIÓN		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	El personal es autorizado	X			
2	Emplean los EPP's	X			
3	Es descargada y almacenada	X			
4	Su sistema de disparo es bajo presión			X	
OTROS: ¿CUÁLES? _____		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		

ACCIONES DE MEJORA :

Oscar Alfonso P.
FIRMA ALMACENISTA

Maira Cardenas
FIRMA INSPECTOR HSEQ

Powered by CamScanner

5920

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-
		Versión: 0
		Fecha: 08/03/2026
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	

PROYECTO Inge Policia Gaitan SEMANA DEL 15 AL 26 DE 05-2026.
MARCA: Toyomos XP. SERIAL: #1.

ITEM	CONCEPTO	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		15/05/26		19/5/26		21/05/26		22/05/26		24/05/26		25/05/26		26/05/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	X		X		X		X		X		X		X	
	MEDIDOR DE ACEITE	X		X		X		X		X		X		X	
	TAPA DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X		X	
	BUJIA	X		X		X		X		X		X		X	
	TUBO DE ESCAPE	X		X		X		X		X		X		X	
	GUARDA DE LOS PIÑONES	X		X		X		X		X		X		X	
	CHOQUE	X		X		X		X		X		X		X	
	YOYO	X		X		X		X		X		X		X	
	ACELERADOR	X		X		X		X		X		X		X	
	VOLANTE DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X		X	
	MOTOR	X		X		X		X		X		X		X	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X		X	
	TAPON DE ACEITE	X		X		X		X		X		X		X	
	TORNILLOS EN GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
	GUARDA DE LOS PIÑONES	X		X		X		X		X		X		X	
	TAPA PROTECTORA MOTOR	X		X		X		X		X		X		X	
	TAMBOR	X		X		X		X		X		X		X	
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	X		X		X		X		X		X		X	
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X		X	
	ENGRASE EN GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
	BALINERAS	X		X		X		X		X		X		X	
	FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X		X		X		X		X		X		X	
	PINTURA	X		X		X		X		X		X		X	
	ASEO	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	OPERADOR	Dago		Dago		Dago		Dago		Dago		Dago		Dago	
	SUPERVISOR SST	Maira C		Maira C		Maira C		Maira C		Maira C		Maira C		Maira C.	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOP-020
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y TALADRO	

AREA Construcción Alojamiento Policía TRABAJO A REALIZAR : Percutor SERIE: HE 11253.

HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	7-05-26		8-05-26		12/05/26		19/05/26		21/05/26		23/05/26		28/05/26		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NOMBRE: PULIDORA															
Carcasa															
Interruptor de gatillo															
Bloqueo del eje															
Mango Auxiliar															
Mango Principal															
Eje															
Guarda															
Estado general de alimentador															
Clavija de conexión a tierra															
Escobillas															
Rodamientos															
Extension electrica															
Platos															
Clavija polarizada															
Disco															
Otros:															
NOMBRE : TALADRO															
Interruptor de gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Clavija de conexión a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Clavija polarizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cable y conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mango Auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mango Principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Broca	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Victor Argote

Powered by CamScanner

5972

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código TP-HSEQ-FOP-
	Versión 0
	Fecha 18/04/2026
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA CIRCULAR	

CORTADORA : #1 MARCA Incco RPM 4300 min OPERADOR Agustín Agudelo

PRY Dique Reteca - Gaitan. SEMANA DEL 05/05/2026 16/05/2026.

ITEM	CONCEPTO	Fecha 5/05/26		Fecha 09/05/26		Fecha 11/05/26		Fecha 15/05/26		Fecha 19/05/26		Fecha 15/06/26		Fecha 16/05/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estructura en buen estado(sin golpes o fisuras)	X		X		X		X		X		X		X	
	Partes firmes y sin piezas sueltas	X		X		X		X		X		X		X	
	disco sin grietas ni deformaciones	X		X		X		X		X		X		X	
	Disco correctamentamente ajustado	X		X		X		X		X		X		X	
	Disco de diametro adecuado para madera	X		X		X		X		X		X		X	
	Guarda de seguridad funcional	X		X		X		X		X		X		X	
	Interruptor en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Boton de apagado operativo	X		X		X		X		X		X		X	
	Clabes sin cortes o empate	X		X		X		X		X		X		X	
	Enchufe en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Conexión segura a la red	X		X		X		X		X		X		X	
	Material asegurado correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
	Funcionamiento sin ruidos extraños	X		X		X		X		X		X		X	
	Sin vibraciones anormales	X		X		X		X		X		X		X	
	Area limpia y ordenada	X		X		X		X		X		X		X	
	Personal usa correctamente los epp	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)														
	SUPERVISOR HSE														

apto para su uso

No apto para su uso

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código TP-HSEQ-FOP-
		Versión 0
		Fecha 18/02/2026
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL ROTOMARTILLO	

TALADRO No. #2. MARCA Dosch. RPM 1900. OPERADOR Robinson Martinez.

PRY Inge Policia Gaitan. SEMANA DEL 20/05/26 AL 26/05/2026

ITEM	CONCEPTO	FECHA 20/05/26		FECHA 21/05/26		FECHA 22/05/26		FECHA 23/05/26		FECHA 24/05/26		FECHA 25/05/26		FECHA 26/05/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de velocidad variable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del portabrocas SDS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de control avance/reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del botón de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del selector de modos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango lateral multiposición	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Robinson		Robinson		Robinson		Robinson		Robinson		Robinson		Robinson	
	SUPERVISOR HSE							Mairu C				Mairu C		Mairu C	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOP-
	Versión: 0
	Fecha: 18/02/2026
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL ROTOMARTILLO	

TALADRO No. 1 MARCA Ingco RPM 1400 m/m OPERADOR David Yohel Solis

PRY Inge Policia Gaitan SEMANA DEL 11/05/26 AL 21/05/2026

ITEM	CONCEPTO	FECHA 12/05/26		FECHA 13/05/26		FECHA 15/05/26		FECHA 16/05/26		FECHA 19/05/26		FECHA 20/05/26		FECHA 21/05/26.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de velocidad variable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del portabrocas SDS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de control avance/reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del botón de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del selector de modos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango lateral multiposición	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)														
	SUPERVISOR HSE														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

5425

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Codigo TP-HSEQ-FOR-
		Version 0
		Fecha 18/02/2026
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO	

MARCA: Bosch SEMANA DEL 21/05/2026 AL 30/05/2026

REFERNCIA: #1. SERIAL #01.

ITEM	CONCEPTO	Fecha 21/5/26		Fecha 22/05/26		Fecha 24/05/26		Fecha 25/05/26		Fecha 26/05/26		Fecha 27/05/26		Fecha 30/05/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable de ignición (tiraflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la aguja vibrante (sin fisuras, grietas, costras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de sistema de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del motor eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del botón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TÉCNICO)														
	SUPERVISOR HSE														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-28
	Versión: 0
	Fecha: 18/12/2025
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO	

MARCA: Bosch SEMANA DEL 13/05/2026 AL 22/05/2026

REFERENCIA: H1. SERIAL 1601

ITEM	CONCEPTO	FECHA 13/05/26		FECHA 15/05/26		FECHA 18/05/26		FECHA 19/05/26		FECHA 20/05/26		FECHA 21/05/26		FECHA 22/05/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable de ignición (tiraflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la aguja vibrante (sin fisuras, grietas, costras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de sistema de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del motor eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del botón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TÉCNICO)														
	SUPERVISOR HSE														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

5927

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código TP-HSEQ-FOR-
	Versión 0
	Fecha. 18/04/2026
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA CIRCULAR	

CORTADORA: #1. MARCA Incco RPM 4800rpm OPERADOR Angela Aguilar G.

PRY Inge Policia Gaitan SEMANA DEL 19 AL 16/05/2026

ITEM	CONCEPTO	Fecha. 19/05/26		Fecha 20/05/26		Fecha 22/05/26		Fecha 23/05/26		Fecha 25/05/26		Fecha 26/05/26		Fecha. 27/05/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estructura en buen estado(sin golpes o fisuras)	X		X		X		X		X		X		X	
	Partes firmes y sin piezas sueltas	X		X		X		X		X		X		X	
	disco sin grietas ni deformaciones	X		X		X		X		X		X		X	
	Disco correctamentamente ajustado	X		X		X		X		X		X		X	
	Disco de diametro adecuado para madera	X		X		X		X		X		X		X	
	Guarda de seguridad funcional	X		X		X		X		X		X		X	
	Interruptor en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Boton de apagado operativo	X		X		X		X		X		X		X	
	Clabes sin cortes o empate	X		X		X		X		X		X		X	
	Enchufe en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Conexión segura a la red	X		X		X		X		X		X		X	
	Material asegurado correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
	Funcionamiento sin ruidos extraños	X		X		X		X		X		X		X	
	Sin vibraciones anormales	X		X		X		X		X		X		X	
	Area limpia y ordenada	X		X		X		X		X		X		X	
	Personal usa correctamente los epp					X		X		X		X		X	
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)														
	SUPERVISOR HSE	Maira C		Maira C		Maira C.								Maira C	

apto para su uso

No apto para su uso

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-26 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CANGURO	

PROYECTO Dpc Policia Gaitan. SEMANA DEL 20/04/26 AL 26 DE abril-2026

MARCA: Temping Romer SERIAL: SG80K

ITEM	CONCEPTO	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		20/04/26		21/04/26		22/04/26		23/04/26		25/04/26		26/04/26		27/04/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	X		X		X		✓		X		X		X	
	Control de fugas	X		X		X		X		X		X		X	
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del embrague	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del resorte	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de la superficie del apisonador	X		X		X		X		X		X		X	
	El personal cuenta con los epp	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Juan G		Juan G		Juan G		Juan G		Juan G		Juan G		Juan G	
	SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

5924

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-019
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA: OT Inge Policia. AREA A INSPECCIONAR: Contactor Alojamientos.

ACTIVIDAD: Retiro de formaletas FECHA: 13-06-16 HORA: 8:30 am

	HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se usa adecuada al trabajo	X			
2	Se encuentra en buen estado	X			
3	Se guardan y portan adecuadamente	X			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X			
5	Se usan prensas de banco para sujetarlas	X			
	HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo.	X			
2	Los cinceles se encuentran afilados.	X			
3	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias.	X			
4	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos.			X	
5	Los cuchillos disponen de mangos y fundas.			X	
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor.	X			
2	Sus caras y bordes están en buen estado.	X			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo.	X			
	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN-LLAVES	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.		X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas.		X		
3	Se dispone de llaves para golpear.		X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.		X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.		X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado.		X		
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.	X			
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores).	X			
2	Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	X			
3	Están limpias y lubricadas.	X			
4	Tiene sus guardas.	X			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
6	El cable o enchufe no presentan daños.	X			
7	En los taladros se observa el mandil con golpes.	X			

Powered by CamScanner

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños.	X			
9	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeadas.	X			
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X	
2	Se emplean EPP's de acuerdo con la herramienta empleada			X	
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X	
4	La herramienta es descargada al terminar.			X	
HERRAMIENTAS POR DOTACIÓN		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	El personal es autorizado.	X			
2	Emplean los EPP's	X			
3	Es descargada y almacenada	X			
4	Su sistema de disparo es bajo presión			X	
OTROS: ¿CUÁLES? _____		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		

ACCIONES DE MEJORA :

FIRMA ALMACENISTA

FIRMA INSPECTOR HSEQ

Powered by CamScanner

5931

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-019
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA: Inge Policia — AREA A INSPECCIONAR: Construccion Alojamiento

ACTIVIDAD: Amarre de formaletas. — FECHA: 23/06/26 HORA: 9:00 am

	HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se usa adecuada al trabajo	✓			
2	Se encuentra en buen estado	✓			
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	✓			
5	Se usan prensas de banco para sujetarlas	✓			
	HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓			
2	Los cinceles se encuentran afiliados.	✓			
3	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias.	✓			
4	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			✓	
5	Los cuchillos disponen de mangos y fundas.			✓	
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor.	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado.	✓			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo.	✓			
	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN-LLAVES	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.		✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas.		✓		
3	Se dispone de llaves para golpear.		✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.		✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.		✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado.		✓		
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.	✓			
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores).	✓			
2	Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	✓			
3	Están limpias y lubricadas.	✓			
4	Tiene sus guardas.	✓			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓			
6	El cable o enchufe no presentan daños.	✓			
7	En los taladros se observa el mandil con golpes.	✓			

Powered by CamScanner

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños.	✓			
9	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeadas.	✓			
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	
2	Se emplean EPP's de acuerdo con la herramienta empleada			✓	
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓	
HERRAMIENTAS POR DOTACIÓN		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	El personal es autorizado.	✓			
2	Emplean los EPP's	✓			
3	Es descargada y almacenada	✓			
4	Su sistema de disparo es bajo presión			✓	
OTROS: ¿CUÁLES?		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		

ACCIONES DE MEJORA :

1006946002
FIRMA ALMACENISTA

Maira Cardenas.
FIRMA INSPECTOR HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-011
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DE EPP	

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTRATACION SE COMPROMETE A:

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.I Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.I EN LA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXIMIRÉ DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑÍA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD. LOS EPP ESTÁN BAJO MI RESPONSABILIDAD, CUIDADO Y SU USO SERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE SON DESTINADOS. LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ ACORDE CON MIS FUNCIONES Y SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO. EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS EQUIPOS YA NOMBRADOS, NOTIFICARÉ A LA EMPRESA O A LA PERSONA ENCARGADA DE LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS"

RESPONSABLE Inge Policía. FECHA: Junio 2026

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL										FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
				GAFAS	CASCO	GUANTES	BOTAS	TAP OIDOS	TAP BOCAS	IMPERMEABLE	ARNES	DOTACION	OTRO		
1	Juan Hurtado Bolivar	1123594945	A.T.	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—		Caucho
2	Juan Gabriel Nava	1140845165	AY.	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Caucho
3	Eduardo R	7172222	of	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Gafas Transparentes
4	Oscar H Ruiz	86055645	Maestro	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—		G Transparentes Guantes Vaqueta
5	Yesid Gallo	1006961661	Of	X	—	X	—	—	X	—	—	—	—		Gafas Transparentes Guantes Nitrilo
6	Robinson	88274421	A y	—	—	X	—	X	X	—	—	—	—		G caucho
7	Vicente Gaitan	8192173	Ay.	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—	Robinson	Guantes Caucho
8	Agustin	8192173	AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
9	Oscar H Ruiz	86055645	Maestro	—	—	—	—	—	—	—	—	Overoles Talla XL	—		
10	Vicente	8192173	A.y	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
11	Daguberto Suarez		AY	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	G. vaqueta Gafas	
12	Vicente	8192173	Ay	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Transparentes
13	Daguberto	7465821	AY	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—		
14	Juan Tamayo	1075849446	A.y.	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Gafas
15	Yesid Bolivar	1075849446	AY	X		X	—	—	—	—	—	—	—		guante
16	Daguberto Sol.	1101150782	AY			X	—	—	—	—	—	—	—		Doble
17	Vicente G	8192173	Ay	X		X	—	—	—	—	—	—	—		Precisiva

Mira Cardenas
FIRMA INSPECTORA HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-011
Versión: 0
Fecha: 18/12/2025

ENTREGA DE EPP

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE COMPROMETE A

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.I.'S Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.I.'S A FIN DE PRESENTARME AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR DEBIDAMENTE DOTADO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DE MANERA ADECUADA EN CASO DE NO USARLO O EXTRAVIARLO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑÍA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN POR MI SALUD. LOS EPP'S QUE LA EMPRESA ENTREGUE SON DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE SON DESTINADOS. LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ ACORDE CON LAS FUNCIONES Y SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO. EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO DE LOS EQUIPOS LA NOTIFICARÉ A LA EMPRESA O A LA PERSONA ENCARGADA DE LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS"

RESPONSABLE: Inge Policia

FECHA: Junio 2026

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL										FIRMA	HUELLA
				GAFAS	CASCO	GUANTES	BOTAS	TAP OIDOS	TAP BOCAS	IMPERMEABLE	ARNES	DOTACION	OTRO		
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Vaqueta
2	[illegible]	[illegible]	A-1	X	—	X	—	—	—	—	—	—		[illegible]	Pregion
3	Victor Edit	[illegible]	A-1	X	—	X	[illegible]	—	—	—	—		—	[illegible]	Vaqueta
4	ROBINSON MARTINEZ	1829421	A.V	—	—	X	—	—	—	—	—		—	[illegible]	Pregion
5	[illegible]	[illegible]	Oficial	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Vaqueta
6	[illegible]	[illegible]	A.V.	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Vaqueta
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	X							—	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Vaqueta
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															

[illegible]
FIRMA INSPECTORA HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Ruben Dario

APELLIDOS Galindo Mariño.

IDENTIFICACION 1125004759.

CARGO Ayudante de Obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Guantes Nitrilo	-	1 P.	25-06-2026
Gafas Oscuros.	-	1.	25-06-2026
Casco Seguridad.	-	1.	25-06-2025
Tapaoidos Inserción	-	1	25-06-2026
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Mario Cardenas
ENTREGADO

1125004759
RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOP-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES	Alvaro.
APELLIDOS	Martinez Gil.
IDENTIFICACION	PPT. 1755999
CARGO	Oficial de obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Casco de Seguridad	-	1	25-05-2026
Gafas oscuras	-	1	25-06-2026
Guantes vaqueta.	-	1	25-06-2026
Tapa oidos Inserción	-	1	25-06-2026
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

OBSERVACIONES:

/

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO. EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Mario Cardenas
ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

5431

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Edgar Ronaldo.

APELLIDOS Amaya Borrero.

IDENTIFICACION 1124820136.

CARGO Ayudante de obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Casco de Seguridad.	-	1	25-06-2026
Gafas de vaqueta.	-	1	25-06-2026
Gafas oscuras	-	1	25-06-2026
Tapabocas Desechables	-	1	25-06-2026
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

OBSERVACIONES:

/

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXIONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Mairy Cardenas.
ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	Alvaro Martinez Gil	CARGO	Oficial obra.
AREA	Construccion y Mejoramiento Instalaciones	FECHA	25-06-2026

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN	X	REINDUCCIÓN	

INDUCCIÓN GENERAL

Mision
Vision
Reglamento Interno
Horarios de trabajo
Organigrama
Conducto regular

Maira Cadenas
Firma Personal Nuevo

Alvaro
Firma Facilitador

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto
Procedimiento en un accidente trabajo
Programas de SST
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Fichas de seguridad msds

Maira Cadenas
Firma Personal Nuevo

Alvaro
Firma Facilitador

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Política de Gestion Integral
Objetivos de Gestión Integral
Información Documentada Aplicable
Acciones correctivas y de mejora
Responsable de PQR

Maira Cadenas
Firma Personal Nuevo

Alvaro
Firma Facilitador

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo
Lugar de trabajo
Conducto regular
Procedimientos internos
Registros
Otros

Maira Cadenas
Firma Personal Nuevo

Alvaro
Firma Facilitador

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientales significativos
Programa de Gestión Ambiental
Plan de emergencias
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.

Maira Cadenas
Firma Personal Nuevo

Alvaro
Firma Facilitador

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores.

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4.Bueno 5. Excelente

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Como considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores.	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplió el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa.	1	2	3	4	5
5	Como es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por
Ingrid Maryori Garcia Fonseca
Representante legal

Powered by CamScanner

5939

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	Edgar Reinaldo Amaya Bayona.	CARGO	Ayudante obra.
AREA	Construcion y Mejoramiento	FECHA	25-06-2026

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN	CHECK	REINDUCCIÓN	

INDUCCIÓN GENERAL

Misión	5
Visión	5
Reglamento interno	5
Horarios de trabajo	5
Organigrama	5
Conducto regular	5

Firma Personal Nuevo: maira Cadenas — Firma Facilitador

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto	5
Procedimiento en un accidente trabajo	5
Programas de SST	5
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	5
Fichas de seguridad msds	5

Firma Personal Nuevo: maira Cadenas — Firma Facilitador

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Política de Gestión Integral	5
Objetivos de Gestión Integral	5
Información Documentada Aplicable	5
Acciones correctivas y de mejora	5
Responsable de PQR	5

Firma Personal Nuevo: maira Cadenas — Firma Facilitador

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo	5
Lugar de trabajo	5
Conducto regular	5
Procedimientos internos	5
Registros	5
Otros:	

Firma Personal Nuevo: maira Cadenas — Firma Facilitador

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientaes significativos	5
Programa de Gestión Ambiental	5
Plan de emergencias	5
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.	5

Firma Personal Nuevo: maira Cadenas — Firma Facilitador

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores:

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4.Bueno 5. Excelente

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Cómo considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores.	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplió el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa.	1	2	3	4	5
5	Cómo es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por
Ingrid Maryori Garcia Fonseca
Representante legal

Powered by CamScanner

5940

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	Ruben Dario Galindo Mariño	CARGO	Ayudante obra
AREA	Construccion, Mejoramiento Viviendas	FECHA	25-06-2026

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN	X	REINDUCCIÓN	

INDUCCIÓN GENERAL

Misión	5
Visión	4
Reglamento interno	5
Horarios de trabajo	5
Organigrama	5
Conducto regular	5

maira Cardenas
Firma Personal Nuevo

Firma Facilitador

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto	4
Procedimiento en un accidente trabajo	4
Programas de SST	5
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	5
Fichas de seguridad msds	4

maira Cardenas
Firma Personal Nuevo

Firma Facilitador

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Política de Gestión Integral	4
Objetivos de Gestión Integral	5
Información Documentada Aplicable	5
Acciones correctivas y de mejora	5
Responsable de PQR	4

maira Cardenas
Firma Personal Nuevo

Firma Facilitador

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo	5
Lugar de trabajo	5
Conducto regular	5
Procedimientos internos	5
Registros	4
Otros:	

maira Cardenas.
Firma Personal Nuevo

Firma Facilitador

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientaes significativos	5
Programa de Gestión Ambiental	4
Plan de emergencias	5
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.	5

maira Cardenas
Firma Personal Nuevo

Firma Facilitador

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores:

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4.Bueno 5. Excelente

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Cómo considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores.	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplio el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa	1	2	3	4	5
5	Cómo es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por
Ingrid Maryon Garcia Fonseca
Representante legal

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-016	
Versión: 0	
Fecha: 18/12/2025	

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

ORDEN	No. DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR													
				ACT.	PROX.		PRESION		SELLO/ GARANTÍA		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		SEÑALIZACION / DEMARCACIÓN	
							B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N	S	N
1	#1	MJ Espasib	10 L		10/07	Corredor	✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O GABINETES CONTRA INCENDIOS	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIO	FIN
1	En condiciones optimas para su uso.	N/A.	Jhon Romero.	23-06-26	25-06-26.
2					
3					
4					

CONVENCIONES: B: BIEN S: SI
M: MAL N:NO

Powered by CamScanner

5942

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Codigo: TP-HSEQ-FOR-018
		Version: 0
		Fecha: 16/12/2025
	INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS	

FECHA 16-06-2026 HORA 10:00 am
ÁREA Instituto de Alojamientos Retención Policía

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICA A	B	C	OBSERVACIONES
	RIESGO ELECTRICO							
1	Los terminales, cables , tomas ,interruptores, tacos cajas y acometidas se encuentran buen estado	✓						
2	Los tomacorrientes están identificados segun voltaje	✓						
3	Las cajas de controles eléctricos tienen tapa	✓						
4	Las cajas de controles y tomacorrientes se encuentran despejadas y señalizadas	✓						
5	Existe polo a tierra en máquinas y equipos	✓						
6	Los equipos eléctricos o tomacorrientes están protegidos a proyecciones de agua	✓						
7	Se realiza inspección y mantenimiento a los cables e instalaciones eléctricas.	✓						
8	Los cables se encuentran entubados o en canaleta.	✓						
	RIESGO LOCATIVO / INSTALACIONES LOCATIVAS							
1	Los pisos y pasillos están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales	✓						
2	Los pisos y pasillos están limpios y secos.	✓						
3	Los pisos y pasillos están señalizados y demarcados	✓						
4	Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos.	✓						
5	Los techos están limpios y libres de goteras.	✓						
6	Se ha realizado limpieza y mantenimiento a las luminarias y lámparas.	✓						
8	Las barandas de seguridad están en buen estado.	✓						
9	Se evidencia Higiene y limpieza de las instalaciones de la IPS	✓						
10	Se reportan oportunamente los daños que puedan generar peligro	✓						

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION : Maira Cardenas

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION : Sgto. Rios Leon

CONVENCIONES S SI , N NO A: Grado de Acción Inmediata
B Grado de Acción Pronta
C Grado de Acción Posterior

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-018
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS	

FECHA: 26-06-2026 HORA 1:00 Pm
ÁREA: Construccion, Mejoramiento Instalaciones.

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICA A	B	C	OBSERVACIONES
	RIESGO ELECTRICO							
1	Los terminales, cables , tomas ,interruptores, tacos , cajas y acometidas se encuentran buen estado	X						
2	Los tomacomentes están identificados según voltaje.	X						
3	Las cajas de controles eléctricos tienen tapa.	X						
4	Las cajas de controles y tomacomientes se encuentran despejadas y señalizadas.	X						
5	Existe polo a tierra en máquinas y equipos.	X						
6	Los equipos eléctricos o tomacomientes están protegidos a proyecciones de agua.	X						
7	Se realiza inspección y mantenimiento a los cables e instalaciones eléctricas.	X						
8	Los cables se encuentran entubados o en canaleta.	X						
	RIESGO LOCATIVO / INSTALACIONES LOCATIVAS							
1	Los pisos y pasillos están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.	X						
2	Los pisos y pasillos están limpios y secos.	X						
3	Los pisos y pasillos están señalizados y demarcados.	X						
4	Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos.	X						
5	Los techos están limpios y libres de goteras.	X						
6	Se ha realizado limpieza y mantenimiento a las luminarias y lámparas.	X						
8	Las barandas de seguridad están en buen estado.	X						
9	Se evidencia Higiene y limpieza de las instalaciones de la IPS	X						
10	Se reportan oportunamente los daños que puedan generar peligro.	X						

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION : Maira Cardenas.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION : David Vergel Solis

CONVENCIONES: S:SI , N:NO A: Grado de Acción Inmediata
B : Grado de Acción Pronta
C: Grado de Acción Posterior

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-015 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	

Nombre del que Inspecciona	Maira Cardenas.
Cargo	Profesional SST.
Fecha de Inspección	26-05-2026.
Ubicación del Botiquín	Campamento.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
CLORURO DE SODIO	Bien	1	02-/2027
CUELLO ORTOPEDICO	Bien	1	
ALCOHOL ANTISEPTICO	Bien	1	15/10/2026
MICROPORE	Bien	1	
ALGODÓN	Bien	1	
VENDA ELASTICA 2"X5M	Bien	1	Oct/2029
SUERO ORAL	Bien	1	5/2029.
TOALLAS HIGIENICAS	Bien	1p.	7/2027
TAPABOCAS	Bien	2	
AGUA	N/A.	0	N/A
CONDONES	Bien	1	9/2028
GASA ESTERIL	Bien	3	27/09/01.
BAJA LENGUAS	Bien	20	
GUANTES	Bien	3p	N/n
PITO	Bien	1	
BISTURI	Bien	1	N/A
LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS	Bien	1	N/A
CAMILLA	Bien	2.	N/a
	/	/	/
	/	/	/

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Construcción Alojamiento.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Agustín Aguilar Gonzalez.
CEDULA: 86058125.

FECHA: 23-06-2026
CARGO: Ayudante de Obra.

					ESTADO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.					PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS			
1	Tapabocas	Buena			✓			
2	Casco seguridad	Buena			✓			
3	Tapa oídos		✓					
4	Gafas de Seguridad	Buena				✓		Reposición de EPP.
B					PROTECCIÓN PARA MIEMBROS			
1	Guantes Caucho			✓				
2	Guantes Carnaza			✓				
3	Guantes Vaqueta	Buena				✓		
4	Guantes precisión			✓				
C.					ROPA DE TRABAJO			
1	Capuchón	Buena			✓			
2	Camibuso	Buena			✓			
3	Pantalón Jean	Buena			✓			
4	Calzado	Buena			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: IP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

AREA: Construccion Alojamientos
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Dagoberto Cortes.
CEDULA: 74857071.

FECHA: 20-06-2026.
CARGO: Ayudante de obra.

					ESTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.		PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS						
1	Tapabocas	Bien			✓			
2	Casco seguridad	Bien			✓			
3	Tapa oídos	Bien			✓			
4	Gafas de Seguridad	Bien			✓			
B		PROTECCIÓN PARA MIEMBROS						
1	Guantes Caucho			✓				
2	Guantes Carnaza			✓				
3	Guantes Vaqueta	Bien			✓			
4	Guantes precisión			✓				
C.		ROPA DE TRABAJO						
1	Capuchón	Bien			✓			
2	Camibuso	Bien			✓			
3	Pantalón Jean	Bien			✓			
4	Calzado	Bien			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Construcciones Alojamientos. FECHA 19-05-2025.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Vicente Gaitan Gaitan

CEDULA: 8192573. CARGO: Ayudante de obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	ESTADO BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A					PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS			
1	Tapabocas	Buena			✓			
2	Casco seguridad	Buena			✓			
3	Tapa oídos	Buena			✓			
4	Gafas de Seguridad	Buena						
B					PROTECCIÓN PARA MIEMBROS			
1	Guantes Caucho							
2	Guantes Carnaza							
3	Guantes Vaqueta	Mala.				✓		Reposición de EPP.
4	Guantes precisión							
C.					ROPA DE TRABAJO			
1	Capuchón	Buena			✓			
2	Camibuso	Buena			✓			
3	Pantalón Jean	Buena			✓			
4	Calzado	Buena			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Construcción Alojamientos.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: David Verbel Soto
CEDULA: 1101450250.

FECHA 20-06-2026.
CARGO: Ayudante de obra.

				ESTADO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.					PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS			
1	Tapabocas	Buena.			✓			
2	Casco seguridad	Buena			✓			
3	Tapa oídos	Buena.			✓			
4	Gafas de Seguridad	Buena.			✓			
B					PROTECCIÓN PARA MIEMBROS			
1	Guantes Caucho			✓				
2	Guantes Carnaza			✓				
3	Guantes Vaqueta			✓				
4	Guantes precisión	Buena			✓			
C.					ROPA DE TRABAJO			
1	Capuchón			✓				
2	Camibuso	Buena			✓			
3	Pantalón Jean	Buena			✓			
4	Calzado	Buena			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Construcción alojamientos
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Martinez Gil Robinson
CEDULA: PPT. 1824421.

FECHA: 23-06.2026
CARGO: Ayudante de obra.

					ESTADO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.					PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS			
1	Tapabocas			✓				
2	Casco seguridad	Buena.						
3	Tapa oídos			✓				
4	Gafas de Seguridad	Buena.						
B					PROTECCIÓN PARA MIEMBROS			
1	Guantes Caucho			✓				
2	Guantes Carnaza	Buen.			✓			
3	Guantes Vaqueta			✓				
4	Guantes precisión			✓				
C.					ROPA DE TRABAJO			
1	Capuchón	Buena			✓			
2	Camibuso	Buena			✓			
3	Pantalón Jean	Buena			✓			
4	Calzado	Buena.			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

AREA: Construcción Alojamiento.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juan Ramon Galindo Nariño.
CEDULA: 1124992965.

FECHA: 19-06-2026.
CARGO: Ayudante de obra.

				ESTADO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.					PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS			
1	Tapabocas			✓				
2	Casco seguridad	Bueno			✓			
3	Tapa oídos			✓				
4	Gafas de Seguridad	Bueno			✓			
B					PROTECCIÓN PARA MIEMBROS			
1	Guantes Caucho			✓				
2	Guantes Carnaza			✓				
3	Guantes Vaqueta	Bueno			✓			
4	Guantes precisión			✓				
C.					ROPA DE TRABAJO			
1	Capuchón	Bueno			✓			
2	Camibuso	Bueno			✓			
3	Pantalón Jean	Bueno			✓			
4	Calzado	Bueno			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

AREA: Construccion Alojamiento.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Segundo Ioa Cruz.
CEDULA: 93372770.

FECHA 23-06-2026.
CARGO: Oficial de Obra.

					ESTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.		PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS						
1	Tapabocas			✓				
2	Casco seguridad	Buena.			✓			
3	Tapa oídos			✓				
4	Gafas de Seguridad	Buena			✓			
B		PROTECCIÓN PARA MIEMBROS						
1	Guantes Caucho	Buena			✓			
2	Guantes Carnaza			✓				
3	Guantes Vaqueta	Buena			✓			
4	Guantes precisión			✓				
C.		ROPA DE TRABAJO						
1	Capuchón	Buena.			✓			
2	Camibuso	Buena			✓			
3	Pantalón Jean	Buena			✓			
4	Calzado	Buena.			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Construccion Alojamiento
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juan Martin Bolivar Gaitan
CEDULA: 1122559456

FECHA: 20-06-2026
CARGO: Ayudante de Obra.

					ESTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.		PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS						
1	Tapabocas	Buena.		✓	✓			
2	Casco seguridad	Buena			✓			
3	Tapa oídos			✓				
4	Gafas de Seguridad	Buena				✓		Se les realizo reposicion de Epp.
B		PROTECCIÓN PARA MIEMBROS						
1	Guantes Caucho							
2	Guantes Carnaza							
3	Guantes Vaqueta	Buena			✓			
4	Guantes precisión							
C.		ROPA DE TRABAJO						
1	Capuchón	Buena			✓			
2	Camibuso	Buena			✓			
3	Pantalón Jean	Buena			✓			
4	Calzado	Buena.			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Construccion Alojamientos.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yesid Eulindo Gaitan
CEDULA: 1006946002.

FECHA: 19-06-2026.
CARGO: Ayudante de obra.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	ESTADO BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.		PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS						
1	Tapabocas			✓				
2	Casco seguridad	Buena			✓			
3	Tapa oídos	Buena			✓			
4	Gafas de Seguridad	Buena			✓			
B		PROTECCIÓN PARA MIEMBROS						
1	Guantes Caucho			✓				
2	Guantes Carnaza			✓				
3	Guantes Vaqueta	Buena			✓			
4	Guantes precisión			✓				
C.		ROPA DE TRABAJO						
1	Capuchón	Buena			✓			
2	Camibuso	Buena			✓			
3	Pantalón Jean	Buena			✓			
4	Calzado	Buena			✓			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: _____ FECHA 23-06-2026.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Oscar Alexander Patiño Perez. CARGO: Maestro obra.

CEDULA: 86.055645.

					ESTADO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.		PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS						
1	Tapabocas			✓				
2	Casco seguridad	Bueno			✓			
3	Tapa oídos			✓				
4	Gafas de Seguridad	Mala			✓			Usar correctamente las gafas S.
B		PROTECCIÓN PARA MIEMBROS						
1	Guantes Caucho			✓				
2	Guantes Carnaza		✓	✓				
3	Guantes Vaqueta		✓	✓				
4	Guantes precisión	Buena.			✓			
C.		ROPA DE TRABAJO						
1	Capuchón	Buena			✓			
2	Camibuso	Buena			✓			
3	Pantalón Jean	Buena			✓			
4	Calzado	Buena			✓			

FALTA JUNIO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	Elkin Fabian Zambrano Alvarez	CARGO	Oficial obra.
AREA	Instalacion Estacion Policia.	FECHA	20-07-2026

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN	X

INDUCCIÓN GENERAL

Misión	5
Visión	5
Reglamento interno	4
Horarios de trabajo	5
Organigrama	4
Conducto regular	4

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: Moira Cardenas

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto	5
Procedimiento en un accidente trabajo	4
Programas de SST	4
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	4
Fichas de seguridad msds	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: Moira Cardenas

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Política de Gestión Integral	5
Objetivos de Gestión Integral	5
Información Documentada Aplicable	4
Acciones correctivas y de mejora	4
Responsable de PQR	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: Moira Cardenas

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo	5
Lugar de trabajo	5
Conducto regular	4
Procedimientos internos	4
Registros	5
Otros:	

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: Moira Cardenas

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientaes significativos	5
Programa de Gestión Ambiental	5
Plan de emergencias	4
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.	4

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: Moira Cardenas.

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores:

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4.Bueno 5. Excelente

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Cómo considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores.	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplió el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa.	1	2	3	4	5
5	Cómo es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por
Ingrid Maryori Garcia Fonseca
Representante legal

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Jhon Ailey

APELLIDOS Charamavi Gaitan

IDENTIFICACION 1151450848

CARGO ayudante de obra

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Busso manga larga	S	1	18-07-2026
Pantalon Jans	32.	1	18-07-2026
Gantes Precision		1	18-07-2026
Casco de Seguridad		1	18-07-2026
Gafas oscuras		1	18-07-2026

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

mayra Cardenas
ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Elkin Fabian

APELLIDOS Zabaro Alvarez.

IDENTIFICACION 1121922788

CARGO Oficial de dep.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Camibuso manga larga	L	1.	20-07-2026
Gafas de Seguridad		1	20-07-2026
Guantes de Precision		1	20-07-2026
Casco de Seguridad		1	20-07-2026

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO. EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD

Maira Cardenas
ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

5958

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-019
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA: UT Inge Policia — AREA A INSPECCIONAR: Almacen

ACTIVIDAD: Construccion Alojamientos. — FECHA: 14-07-26 HORA: 9:00 am

	HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se usa adecuada al trabajo	X			
2	Se encuentra en buen estado	X			
3	Se guardan y portan adecuadamente	X			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X			
5	Se usan prensas de banco para sujetarlas.	X			
	HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo.	X			
2	Los cinceles se encuentran afiliados.	X			
3	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias.	X			
4	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos.			X	
5	Los cuchillos disponen de mangos y fundas.			X	
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor.	X			
2	Sus caras y bordes están en buen estado.	X			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo.	X			
	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN-LLAVES	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.			X	
2	Se observan en la llave huellas y palancas.			X	
3	Se dispone de llaves para golpear.			X	
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.			X	
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.			X	
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado.			X	
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.			X	
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores).	X			
2	Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	X			
3	Están limpias y lubricadas.	X			
4	Tiene sus guardas.	X			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
6	El cable o enchufe no presentan daños.	X			
7	En los taladros se observa el mandil con golpes.			X	

Powered by CamScanner

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños.		X		
9	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeadas.		X		
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado.			X	
2	Se emplean EPP's de acuerdo con la herramienta empleada.			X	
3	Se trabaja a las presiones indicadas.			X	
4	La herramienta es descargada al terminar.			X	
HERRAMIENTAS POR DOTACIÓN		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	El personal es autorizado.			X	
2	Emplean los EPP's			X	
3	Es descargada y almacenada			X	
4	Su sistema de disparo es bajo presión			X	
OTROS: ¿CUÁLES? _____		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
ACCIONES DE MEJORA :					

FIRMA ALMACENISTA

FIRMA INSPECTOR HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-011	
Versión: 0	
Fecha: 18/12/2025	

ENTREGA DE EPP

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE COMPROMETE A:

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E P I Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E P I CADA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑÍA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD. LOS EPP ESTÁN BAJO MI RESPONSABILIDAD. CUIDADO Y SU USO SERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE SON DESTINADOS. LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ ACORDE CON LAS FUNCIONES Y SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO. EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS EQUIPOS YA NOMBRADOS, NOTIFICARÉ A LA EMPRESA O A LA PERSONA ENCARGADA DE LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS".

RESPONSABLE: Inge Policía. FECHA: Julio 2026.

No	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL										FIRMA TRABAJADOR	ENTREGA EPP
				GAFAS	CASCO	GUANTES	BOTAS	TAP OIDOS	TAP BOCAS	IMPERMEABLE	ARNES	BOHACINA	CHEQ		
1	David Verbel y Solis	1064[illegible]528	AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
2	Edgar Arnaiza	1[illegible]2	ob	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
3	Yesid Galindo	1[illegible]	ob	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
4	Juan Galindo	1[illegible]	ob	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
5	Juan Bolivar	1[illegible]	A.Y	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
6	Alvaro Martinez	1[illegible]	OFC	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
7	Yesid Galindo	[illegible]	AY	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
8	Oscar Verbel S	1[illegible]	AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	DA. Verbel	Vaqueta
9	Alvaro Martinez	1[illegible]	OFC	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
10	Edwin Alvarez	1[illegible]	Of	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Precisión
11	Eduardo B	[illegible]	Oficial	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Cargos Transitorios
12	Escobar	1[illegible]	AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta Precisión
13	Juan Ary G.	1[illegible]	AY.	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Precisión
14	Vicente Ort	[illegible]	AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Precisión
15	Robinson Martinez	1[illegible]	AY	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—	Robinson	Precisión
16	Juan Bolivar		AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaqueta
17	Dagoberto Cuello		AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Dagoberto	Vaqueta

Mairo Cardenas
FIRMA INSPECTORA HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-011
Versión: 0
Fecha: 18/12/2025

ENTREGA DE EPP

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE COMPROMETE A:

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.I Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.I UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR, ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXIONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑÍA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD. LOS EPP ESTÁN BAJO MI RESPONSABILIDAD. CUIDADO Y SU USO SERA EXCLUSIVAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE SON DESTINADOS. LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ ACORDE CON MIS FUNCIONES Y SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO, EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS EQUIPOS YA NOMBRADOS. NOTIFICARÉ A LA EMPRESA O A LA PERSONA ENCARGADA DE LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS".

RESPONSABLE: UT Inge Policía. FECHA: Julio 2026

No	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL										FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
				GAFAS	CASCO	GUANTES	BOTAS	TAP OIDOS	TAP BOCAS	IMPERMEABLE	ARNES	DOTACION	OTRO		
1	Dagoberto Cortes	79857071	A X.	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	Dagoberto	Cambio C
2	Dagoberto Cortes	79857071	A y			X	—	—	—	—	—	—	—	Dagoberto	Vaqueta.
3	[illegible]	93377200	Oficial	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Cambio Precisión
4	Oscar Patiño	96055[illegible]	Maestro	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Oscar Patiño	Exp transferido Cambio Precisión
5	Dagoberto Cortes	79857071	A y.	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Dagoberto	Vaqueta. Precisión
6	David Bernal Solis	1101910738	A y	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	David Bernal	Vaqueta.
7	Augusto Agudelo G	86009125	A y	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	[illegible]	Cambio Segunda T:42
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															

FIRMA INSPECTORA HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-020
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y TALADRO	

AREA: Alojamientos obra civil. TRABAJO A REALIZAR: Corte Hierro, Alambre SERIE: Bosch 9"

HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NOMBRE: PULIDORA															
Carcasa	X		X		X		X		X		X		X		Uso correcto de la guarda de Seguridad de la Pulidora.
Interruptor de gatillo	X		X		X		X		X		X		X		
Bloqueo del eje	X		X		X		X		X		X		X		
Mango Auxiliar	X		X		X		X		X		X		X		
Mango Principal	X		X		X		X		X		X		X		
Eje	X		X		X		X		X		X		X		
Guarda	X		X		X		X		X		X		X		
Estado general de alimentador	X		X		X		X		X		X		X		
Clavija de conexión a tierra	X		X		X		X		X		X		X		
Escobillas	X		X		X		X		X		X		X		
Rodamientos	X		X		X		X		X		X		X		
Extension electrica	X		X		X		X		X		X		X		
Platos	X		X		X		X		X		X		X		
Clavija polarizada	X		X		X		X		X		X		X		
Disco	X		X		X		X		X		X		X		
Otros:															
NOMBRE: TALADRO															
Interruptor de gatillo															
Clavija de conexión a tierra															
Clavija polarizada															
Cable y conexiones eléctricas															
Mandril															
Mango Auxiliar															
Mango Principal															
Broca															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Agustin Aguilar

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-020 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y TALADRO	

AREA Almacenes obra civil TRABAJO A REALIZAR: Corte Arena, Hierro SERIE: Tal- 2426556250. d"

HERRAMIENTA	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NOMBRE: PULIDORA															
Carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Interruptor de gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bloqueo del eje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mango Auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mango Principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Eje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general de alimentador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Clavija de conexión a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escobillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Rodamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extension electrica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Platos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Clavija polarizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Otros:															
NOMBRE : TALADRO															
Interruptor de gatillo															
Clavija de conexión a tierra															
Clavija polarizada															
Cable y conexiones eléctricas															
Mandril															
Mango Auxiliar															
Mango Principal															
Broca															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION. Yuri Galindo Gaitán

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** IP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 10/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

AREA: Construcción Alojamientos
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yesid Galindo Gaitan
CEDULA: 1006946002

FECHA: 21-07-2026
CARGO: Ayudante obra

	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	ENTREGA		ESTADO			RECOMENDACIONES
			FECHA	N/A	BUENO	MAL	REGULAR	
	PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS							
1	Tapabocas	Bueno			X			
2	Casco seguridad	Bueno			X			
3	Tapa oidos						X	
4	Gafas de Seguridad					X		Se le entrega reposición Gafas
	PROTECCIÓN PARA MIEMBROS							
1	Guantes Caucho	Bueno		X				
2	Guantes Carnaza			X				
3	Guantes Vaqueta	Bueno					X	
4	Guantes precisión			X				
	ROPA DE TRABAJO							
1	Capuchón	Bueno			X			
2	Camibuso	Bueno			X			
3	Pantalón Jean	Bueno			X			
4	Calzado	Bueno.			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** IP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Instalación Policía
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Fatima Perez
CEDULA: 36055645

FECHA: 21-07-2026
CARGO: Maestra Obra

			ESTADO					
1	Tapabocas			X				
2	Casco seguridad	Buena			X			
3	Tapa oidos							
4	Gafas de Seguridad	Buena			X			
1	Guantes Caucho			X				
2	Guantes Camaza	Buena			X			
3	Guantes Vaqueta			X				
4	Guantes precisión			X				
1	Capuchón							
2	Camibuso	Buena			X			
3	Pantalón Jean	Buena			X			
4	Calzado	Buena			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones Estación Policía	1-07-2026	7:00 am

TEMA
Trabajo seguro durante condiciones climaticas adver

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yoni Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Segundo Rodriguez	93372770	
2	Miguel Cueto	8192773	
3	Juan Salud Nuñez	1124992965	
4	Ruben Galindo M.	1125004759	
5	Alvaro Martinez Gil	1255999	
6	Robinson Martinez	1824426	
7	Yesid Galindo Gaitán	1006946002	
8	Dagoberto C	7085721	
9	Edgar Amaury Barrera	1124820736	
10	Juan Manuel Bolivar Garcia	1125544456	
11	David Ventura Sol.	1014530256	
12	Agustin Aguilar G	86098165	
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5469

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Batallon Policia	2-07-2026	7:00 am

TEMA
Fatiga laboral y Prevencion de accidentes

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yali Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Oscar Mendoza P.	88055615	
2	Alvaro Martinez Gil	17559 99	
3	Jorge Alberto G	7485071	
4	Mccook Cort.	8192573	
5	Segundo Roa G.	95372770	
6	Robinson Martinez	1824421	
7	David Herrera Soto	1101450750	
8	Yesid Galindo G	1006949502	
9	Juan Manuel Bolivar G.	1125549456	
10	Agustin Aguilar G	8100818	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: [illegible]
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitacion		Induccion	
Reinduccion		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estación Policía	3-07-2026	7:00 am

TEMA

Hidratacion y prevencion de golpe de calor

NOMBRE DEL FACILITADOR

Main Cadenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Alvaro Martinez Gil	1755999	
2	Robinson Martinez	18244 21	Robinson
3	Vicente Fuente	8192573	
4	Juan Carlos Nuñez	1124992965	
5	Ruben Colmenares M.	1123004959	
6	Edgar Amaya Bermudez	1124820136	
7	Dagoberto C	7665207	
8	Segundo Roa	93372780	Segundo.
9	David Vergel Sols	1101450756	
10	Yesid Galindo Gaitán	1006946002	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	4-07-2026	7:00 am

TEMA

Consumo de alcohol y drogas en el trabajo

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yoli Lorena G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Alvaro Martinez Gil	17559 99	
2	Robinson Martinez	1824421	Robinson
3	Vicente Cuello	1192673	
4	Oscar Eduardo Ramirez	1124992965	
5	Yulber Eduardo Mariño	1125004959	
6	Edgar Arroyo Barrera	1124826756	
7	Dagoberto C	7165707	
8	Eugenio Tovar G	93372770	
9	David Ramirez Solis	1104450250	
10	Yesid Galindo	1006916002	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5970

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	6-07-2026	7:000m

TEMA

Prevencion de accidentes con vehiculos y equipos moviles

NOMBRE DEL FACILITADOR

Mario Cadena

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Robinson Martinez	1824421	Robinson
2	Vicente Cuellar	8101253	
3	Dagoberto C	2[illegible]53	
4	Juan Camilo Bohorquez	1025544456	
5	Agusto Aguilar C	86008[illegible]	
6	Edgar Ba C	933227720	
7	David Vargas Solis	1101457250	
8	Juan Galindo	1121491961	
9	Yesid L. Callejas	1006246001	
10	Alvaro Martinez Gil	1755999	
11	Adrian Galindo Mojica	1725004759	
12	Edgar Arroyo Bayona	1124820736	
13	Jairo Lozano C	1121567537	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	7-01-2026	7:05 am

TEMA

Plan de Emergencia y Evacuación

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yeni Lozano C

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Alfredo Rea C	93372220	
2	Daniel Vera Sol	1104450253	
3	Juan Bohorquez	1125544454	
4	Yesid Galindo Gaitan.	1006916002	
5	Nicolas Cuta	8192573	
6	Edgar Araya Barrera	1124826736	
7	Robinson Martinez	1824423	
8	Juan Galvis Marin	1124992967	
9	Yulbén Galindo Marín	1125004759	
10	Agustin Aguja C.	86038253	
11	Jorgeberto C	7118570?1	
12	Alvaro Martinez Gil	1755999	
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	✓	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cual?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones Estación Policía	9-07-1026	7:00 am

TEMA

Cultura de seguridad Cuidarse y Cuidar a los compañeros

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yeni Lorano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Eduardo Ruiz G.	98372270	Eduardo
2	ROBINSON MARTINEZ	1824421	Robinson
3	Alvaro Martinez Gil	1755999	
4	David [illegible] Soto	101.05.725	
5	Meert Court.	8892593	
6	[illegible]	[illegible]	
7	Ufrid Galindo	1006946088	
8	[illegible] Aguila	86001122	
9	Jhony Arley Escalon	1514506 45	
10	Johan Daniel	1124927468	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones Estación Policía	9-09-2026	7:00 am

TEMA

Comunicación efectiva en obra

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yeni Lozano G

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	ROBINSON MARTINEZ	1824422	Robinson
2	Segundo Roa C.	93372770	Segundo
3	Juan Martin Bolivar	1125544456	
4	Vicente Cortes	8192593	
5	David [illegible] Sol.	1101450251	
6	Alvaro Manjarez Gil	17559999	
7	Yesid Galindo Cardoen	1006946002	
8	Edgar [illegible]	1124820736	
9	Daoberto C	71857071	Daoberto
10	Agustin Aguilar G	85008125	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

5924

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones fabrica Bldg	10-02-2026	7:00 am

TEMA
Riesgos de trabajar cerca de electricidad

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yon Lozano G

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Marcelo Cueto	8192573	
2	Juan Bolivar	1125549456	
3	Dagoberto C	2148520431	
4	Yesid Galindo G	1056946002	
5	Segundo Roa B	93332220	
6	Agustin Aguilar G	86082?.	
7	Alvaro Martinez G	1755999	
8	David Uribe Solis	1101452825	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner
