	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N/A **Contratista:**

Contrato de Interventoría No. 1965 DE 2024 **Interventoría:** CONSORCIO AMV CARFIN

Objeto Contrato de Obra:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

INFORME MENSUAL No. 23 **MES O PERIODO:** 01 AL 31 MAYO 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N/A
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización de los tramos de intervención para AMV-G4		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		5
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA DE LAS EMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**		12
3.1	Información general de los contratos		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA (EMPRESAS DE MATENIMIENTO RUTINARIO)**		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	16
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	16
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	16
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	16
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	17
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	17
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	17
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		17
4.9.1	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	17
4.9.2	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	17
4.9.3	• Seguimiento Programa de Inversiones		17
4.9.4	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	17
4.9.5	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	17
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		18
5.1	Descripcion general del contrato		18
5.2	Descripción de las actividades ejecutadas por parte de la AMV G4		19
5.3	Informes especialistas y profesionales		21
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		21
5.5	Informe matriz de riesgos.		21
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		21
5.7	Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		21
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		21
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	21
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	21
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	22
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	22
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	22
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		22
6.6.1	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	22 22
6.6.2	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	22
6.6.3	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	22
6.6.4	• Informacion Gestion Socio Ambiental		22
6.6.5	• Obras en ejecucion en las vias		22
7	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**		27
8	**ANEXOS**		33
8.1	Indicadores		
8.2	Informes Semanales	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
8.3	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
8.4	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
8.5	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
8.6	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
8.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
8.8	Plan de Inversion de Anticipo		
8.9	Informe Inversion y Buen Manejo de Anticipo		
8.10	Acta de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
8.11	Acta de Reunion	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
8.12	Informe de Capacitacion - Informe SISO		
8.13	Matriz de Riesgos Consorcio AMV Carfin		
8.14	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
8.15	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
8.16	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
8.17	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
8.18	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.19	Registro fotográfico Recorridos viales, Seguimiento a contratos y del avance de las obras en la via		
8.20	Registro fotográfico de las actividades realizadas por las Empresas de Mantenimiento Rutinario		
	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0753 del 12 de Marzo de 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO AMV CARFIN
NIT: 901.839.313-0

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL META

CONSORCIO AMV CARFIN

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 3

CONTRATO 1965-2024

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 23

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- GUAVIARE

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Iván Darío Peñaloza Suescun *Ingeniero Residente* *M.P No. 54202-164359 NTS* *Vilma Juliana Angarita Becerra* *Ingeniero Auxiliar 1* *M.P No 54202-333643-NTS* *María Alejandra Olaya Castro* *Ingeniera Auxiliar 2* *M.P. No. 091037-0663355 CND*	*Ing. Yency Lorena Cabanzo* *Supervisor Territorial Meta* *M.P No 25202-349248 CND*	*Ing. Leidy Viviana Huertas Pasive* *Director Territorial Meta* *M.P No 25202-238888 CND*
Fecha 1-junio-2026	*Fecha 1-junio-2026*	*Fecha 1-junio-2026*

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1 Localización de los tramos de intervención para AMV-G4 4
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 5
2.3 Inventario y estado inicial de las vías 6
2.4 Características técnicas del proyecto 7
3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA DE LAS EMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 12
3.1 Información general de los contratos 12
3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes 15
3.3 Seguimiento a Ítems No Previstos 15
3.4 Estado de avance y acciones por parte de la Administración Vial 16
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA (EMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO) 16
4.1 Informe semanal 16
4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 16
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 16
4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 16
4.5 Estado general del tiempo 16
4.6 Resumen ensayos de Laboratorio. 17
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. 17
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra 17
4.9 Otros documentos de seguimiento mensual. 17
4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 17
4.9.2 Seguimiento programa de Obra 17
4.9.3 Seguimiento programa de Inversiones 17
4.9.4 Actas de Comité de Obra 17
4.9.5 Actas de Reunión 17
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18
5.1 Descripción general del contrato 18
5.2 Descripción de las actividades ejecutadas por parte de la AMV G4 en el presente periodo. 19

5.3 Informes especialistas y profesionales.....21

5.4 Informe del programa Anual de Caja – PAC.....21

5.5 Informe matriz de riesgos.....21

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.....21

5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.....21

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 21

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 21

6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 21

6.3 Información financiera y presupuestal del contrato de interventoría. 22

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría 22

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. 22

6.6 Otros documentos seguimiento mensual. 22

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. 22

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 22

6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas.....22

6.6.4 Información Gestión Socio Ambiental. 22

6.6.5 Obras en ejecución en las vías.....22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

ANEXOS 33

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detallan las actividades realizadas por la administración vial grupo 4 (AMV -G4), a cargo del CONSORCIO AMV CARFIN, mediante el contrato de consultoría No. 1965 – 2024, adjudicado a través del proceso de selección de concurso de méritos CMA-DEO-SGI-137-2023 con una duración de veintinueve (29) meses a partir de la orden de inicio, el día 5 de julio del 2024 y con fecha de finalización el día 31 de julio del 2026.

Los contratos de obra de las empresas de mantenimiento rutinario a cargo de la AMV-G4 Guaviare, tienen una duración de 29 meses a partir de la orden de inicio, el día 29 mayo del año 2024 para las empresas: "EMANVIACOL Ltda.", "EMTRASERVIG SAS", "CONSTRUCAMINOS VIAL Ltda.", y el 1 de junio del 2024 para la empresa: "CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y SAS", con fecha de terminación para los 4 contratos de EMR es el día 31 de julio del 2026.

La administración vial tiene a cargo la supervisión, y seguimiento, del desarrollo de las actividades contratadas dentro del objeto de cada contrato de obra:

- Empresa de Mantenimiento Vial los Colonos Ltda., "EMANVIACOL Ltda.", Contrato 1705 de 2024. Ruta 7506, Calamar – San José del Guaviare, sector PR 0+0000 al PR 45+0000.
- Empresa de Trabajadores al Servicio del Guaviare SAS, "EMTRASERVIG SAS", Contrato 1698 de 2024. Ruta 7506, Calamar – San José del Guaviare, sector PR 45+0000 al PR 73+0600. Ruta 6507, San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico, sector PR 0+0000 al PR 17+0000.
- Mantenimiento y Construcciones Viales los Correcaminos Ltda., "CONSTRUCAMINOS VIAL Ltda." Contrato 1711 de 2024. Ruta 6507, San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico, sector PR 17+0000 al PR 62+0000.
- Construcciones y Mantenimiento Vial LA y SAS, Contrato 1740 de 2024. Ruta 6507, San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico, sector PR 62+0000 al PR 102+0600.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización de los tramos de intervención para AMV-G4

La administración vial grupo-4 - Guaviare, está a cargo de la ruta 6507 desde el PR 00+0000 al PR 102+0600 San José del Guaviare - Cruce a Puerto Rico y de la ruta 7506 desde el PR 00+0000 al PR 73+0600 Calamar - San José del Guaviare.

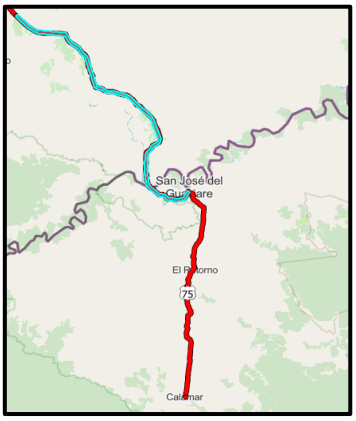


Ilustración 1 Tramos de intervención; Ruta 6507 en color azul; Ruta 7506 en color rojo.

CÓDIGO	VIA	SECTOR	TOTAL
6507	San José del Guaviare - Cruce Puerto Rico	San José de Guaviare - Cruce Puerto Rico, PR 0+0000 – PR 102+0600	101.32
7506	Calamar - San José del Guaviare	Calamar - San José del Guaviare, PR 0+0000 – PR 73+0600	73.46
		Subtotal	174.78 Km

Tabla 1 Longitudes de sectores a cargo.

Las vías a cargo de esta administración vial son de gran relevancia, ya que conectan los departamentos del Guaviare y del Meta, facilita y el transporte de carga y/o pasajeros entre los dos departamentos, y es la conexión hacia Bogotá D.C. la capital del país. Esto ha tenido un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de los residentes de la región y ha contribuido a la generación de empleo y desarrollo. El Puente Nowen (Ruta 6507) PR 16+0010 - PR 16+0924, cruza el Río Guaviare y conecta a los departamentos del Meta y del Guaviare.

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El tramo de la Ruta 7506 Calamar - San José del Guaviare se encuentra en el Departamento del Guaviare. Este tramo inicia en el municipio de Calamar, pasa por el municipio de El Retorno y concluye en el municipio de San José del Guaviare.

RUTA 7506: TRONCAL DE LA ORINOQUIA		
MUNICIPIO	***PR INICIAL***	***PR FINAL***
CALAMAR	*PR 00+0000*	*PR 21+0170*
EL RETORNO	*PR 21+0170*	*PR 54+0930*
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	*PR 54+0930*	*PR 73+0600*

Tabla 2 Zona de influencia de los municipios dentro de la ruta 7506.

El tramo de la Ruta 6507, San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico, se extiende en un 83% en el sur del departamento del Meta, mientras que el 27% restante se extiende al Norte del departamento del Guaviare:

RUTA 6507: TRONCAL AL LLANO		
MUNICIPIO	***PR INICIAL***	***PR FINAL***
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	*PR 00+0000*	*PR 16+0383*
PUERTO CONCORDIA	*PR 16+0383*	*PR 59+0505*
PUERTO RICO	*PR 59+0505*	*PR 84+0171*
PUERTO LLERAS	*PR 84+0171*	*PR 102+0600*

Tabla 3 Zona de influencia de los municipios dentro de la ruta 6507.

2.3 Inventario y estado inicial de las vías

Basados en los registros de la gestión vial previa y mediante recorridos por parte de la administración vial -G4 se recopila información sobre el estado inicial de las vías:

RUTA 6507			
PR inicial	PR final	Longitud Km	Tipo de superficie
0+0000	16+0010	15,84	P-6: Concreto simple con varillas de transferencia
16+0010	21+0032	5,122	P-1: Mezcla asfáltica en caliente
21+0032	29+0878	8,786	P-6: Concreto simple con varillas de transferencia
29+0878	102+0600	71,572	P-1: Mezcla asfáltica en caliente

Tabla 4 Inventario estado de la ruta 6507

RUTA 7506			
PR inicial	PR final	Longitud Km	Tipo de superficie
0+0000	+0016	0,016	NP-1: En afirmado
0+0016	+0841	0,825	P-6: Concreto simple con varillas de transferencia
0+0841	1+0880	0,997	P-1: Mezcla asfáltica en caliente
1+0880	26+0744	24,421	NP-1: En afirmado
26+0744	27+0109	0,325	P-6: Concreto simple con varillas de transferencia
27+0109	33+0818	6,607	NP-1: En afirmado
33+0818	34+0048	0,241	P-1: Mezcla asfáltica en caliente
34+0048	34+0098	0,05	NP-1: En afirmado
34+0098	35+0993	1,895	P-1: Mezcla asfáltica en caliente
35+0993	36+0212	0,219	NP-1: En afirmado
36+0212	37+0249	1,037	P-1: Mezcla asfáltica en caliente
37+0249	37+0566	0,317	NP-1: En afirmado
37+0566	42+0986	5,273	P-1: Mezcla asfáltica en caliente
42+0986	43+0201	0,215	NP-1: En afirmado
43+0201	45+0330	2,089	P-1: Mezcla asfáltica en caliente
45+0330	46+0195	0,907	P-6: Concreto simple con varillas de transferencia
46+0195	46+0563	0,368	NP-1: En afirmado
46+0563	73+0600	26,767	P-1: Mezcla asfáltica en caliente

Tabla 5 Inventario estado inicial de la ruta 7506

2.4 Características técnicas del proyecto

Ruta 6507 San José Del Guaviare – Cruce De Puerto Rico

De acuerdo con los registros en campo por parte de la administración se identifica lo siguiente:

- La vía no presenta bermas, mayormente su configuración es en terraplén, con zonas verdes a nivel de la base de este, hay presencia discontinua de cunetas, las obras de drenaje en la vía se comprenden de alcantarillas y box, se presentan daños menores de erosión en la zona lateral y en las obras de drenaje (Cunetas y disipadores de energía).
- PR 00+0000 y el PR 16+0010 (entrada al puente Nowen) vía en pavimento rígido se encuentra en buen estado, condiciones regulares de señalización vertical y horizontal.
- PR 16+0924 – PR 21+0032 El tramo comprendido entre el PR 16+0924 (Puente Nowen) y el PR 21+0032 (Puerto Concordia), el pavimento flexible se encuentra en buenas condiciones y la señalización vertical y horizontal en regular estado.
- PR 21+0032 – PR 29+878 en el paso nacional de Puerto Concordia el pavimento rígido se encuentra en buen estado de manera general. Entra PR 21+0032 - PR 23+0500 la señalización vertical y horizontal se encuentra en mal estado. Entre PR 26+0900 – PR 27+0140 en el carril izquierdo (El viso), hay presencia de grietas longitudinales en las losas de concreto del pavimento rígido, al parecer debido a falta de confinamiento del terraplén de la calzada de la vía.
- PR 29+0878 y el PR 102+0600 presenta un pavimento flexible, PR 29+0878 con las siguientes situaciones puntuales: Entre PR 34+0550 presenta un pavimento flexible en buen estado, señalización vertical en buen estado y señalización horizontal en regular estado. Entre PR 34+0550-PR 82+000, pavimento flexible con presencia de baches mayormente. Entre PR 82+0000 - PR 93+0000, se encuentran baches y hundimientos del pavimento flexible considerables en los dos carriles de la vía. Entre Del PR 93+0670-PR 102+0600, no hay presencia de baches ni hundimientos considerables en el pavimento flexible, pero el pavimento flexible se encuentra con daño estructural piel de cocodrilo.

Estado de los puentes de la ruta:

- ***PR 6+358 – PR 6+374 Puente Caño La María:*** longitud 15.7 mt. Presenta patologías de grietas en bloque en el tablero del pavimento rígido, para este período en la evaluación estructural visual se observan fisuras en la infraestructura de la losa del carril izquierdo del Puente cerca al estribo de salida.
- **PR 6+405,6 al PR 6+410 Pontón la María:** presenta grieta longitudinal (Unión Aleta derecha con estribo de entrada -descole).
- **PR 12+040 – PR 12+056 Puente Caño Negro 1**: longitud 16.7 mt.
- ***PR 12+250- PR 1+267 Puente Caño Negro 2:*** longitud 17 mt. Requiere instalación de barandas metálicas.
- ***PR 16+010 – PR 16+ 925 Puente Nowen:*** longitud 914.44 mt Requiere reparación de barandas metálicas lado izquierdo 2 en el lado izquierdo PR 16+0698 – PR 16+0936 y 3 en el lado derecho:

PR 16+0011 – PR 16+0115 – PR 16+0700, pintura en color amarillo reflectiva con microesferas de las 2 barandas, con sand - blasting al 70%, y aplicación de anticorrosivo, pintar las líneas de borde color blanco reflectivo y sobre el eje de la vía color amarillo reflectivo.

- **PR 41+300 - PR 41+341 Puente Guarupayas:** longitud 40.4 mt. Requiere la reposición de la baranda metálica del puente sobre el lado derecho en una longitud de 19.00 m del PR 41+0300 – PR 41+0319, pintada en color amarillo reflectante. A reponer: 1 terminal para la defensa con sus correspondientes tornillos de cabeza redonda y arandelas cuadradas para su fijación a la punta de la defensa metálica. Tramo sin defensa metálica derecha: PR 41+0283 – PR 41+0300, en una longitud de 17.00 m.
- ***PR 48+0167- PR 48+194 Puente Palomas:*** longitud 26.5 mt la última intervención en consultoría fue durante los meses de octubre y noviembre del 2023 el contratista de consultoría realizó actividades de patología del concreto y extracción de núcleos para realizar estudios y diseños de rehabilitación de acuerdo con la orden de servicios No. 7 contrato INVIAS No. 1723 de 2022 con objeto: "Ejecución de actividades y productos requeridos para el fortalecimiento y apoyo técnico especializado del INVÍAS, mediante el modelo de fábrica de diseños y estudios técnicos, de acuerdo con las especificaciones definidas por la entidad"; I. Diagnóstico estructural, Estudios y diseños de las intervenciones necesarias en la superestructura del puente paloma, ubicado en el sector san José del Guaviare - Cruce a Puerto Rico PR 48+166, Municipio de Puerto Concordia, Departamento del Meta. El tránsito en el puente palomas se encuentra habilitado a 1 solo carril (lado derecho) debido al estado del puente (fallo del cable 2 en la viga No. 3; el carril izquierdo) hasta su reparación, para este contrato desde el día 29 de julio del 2024 se mantiene la señalización temporal vertical con la actividad de vigilancia de la E.M.R Construcaminos Ltda. De lunes a domingo, el día 22 de marzo del 2024 la AMV-G4 anterior, radica formatos diligenciados: INSPECCIÓN NIVEL 2- INVENTARIO - V2.3 con sus respectivos registros fotográficos y se da cumplimiento del memorando individual con No. Radicado: 2024I-VBOG-009009 Fecha: 2024-02-23 16:18:45, 1110400 de la gestión de riesgo INVIAS Bogotá D.C., información requerida para la reparación de Puente Palomas PR 48+0166 mediante contrato de obra; dando cumplimiento del memorando individual con No 2024I-VBOG-009009 Fecha: 2024-02-23 16:18:45, 1110400 de la gestión de riesgo INVIAS Bogotá D.C. El día martes 22 de octubre del 2024, se realiza visita técnica con el Ing. HENRY MANTTILLA enviado por INVIAS, planta central en donde realiza observaciones y recomendaciones entre ellas: Instalar reductores de velocidad antes y después del puente, realizar chequeos de precisión con comisión de topografía al puente, instalar los reductores de velocidad, el día 31 de enero del 2025 radica informe y presupuesto para la instalación de los reductores de velocidad y señalización vertical, actualmente el puente se encuentra bajo contrato de obra (Mantenimiento) No. 3987 de 2024 UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, el cual dio inicio el 6 de noviembre de 2024. Dentro del alcance de este contrato se encuentra el mantenimiento del Puente Las Palomas, se espera la reparación del cable de acero anclado al estribo y la instalación de 2 reductores de velocidad con señalización vertical, aún no se ha iniciado intervenciones de reparación. la AMV-G4 Consorcio AMV CARFIN ha realizado ha realizado cuatro seguimientos topográficos en los días 5 de abril, 12-13 de mayo del 2025; 21 de agostos de 2025, 14 de noviembre de 2025, para el registro y control del comportamiento de movimientos que se esté presentando en la superestructura y estribos del puente, con el fin de ser una ayuda al ingeniero estructural que lo examine y pueda dar unas directrices encaminadas a la solución del problema existente, Se solicitó autorización para

la visita del especialista estructural de la Administración vial, se realizó la visita el 10 de marzo de 2026, para obtener bajo un conocimiento técnico cuales estudios y que actividades se requieren para mejorar su condición, para que basado en los informes se pueda solicitar presupuestos y contratación para la rehabilitación del puente.

- **PR 54+0850 Pontón,** defensa metálica izquierda averiada**;** Requiere la reposición de: Dos tramos de defensa metálica sobre el margen izquierdo de la vía: 1er tramo antes del guarda-ruedas y el 2do tramo después del guarda-ruedas en sentido Cruce a Puerto Rico - San José del Guaviare de alto 0.33 m en una longitud total de 10,00 m + 16,00 m=26,00 m.
- **PR 59+300 – PR 59+352 Puente Pororio:** longitud 51.30 mt. Requiere protección contra socavación de las dos pilas, en caudal bajo se evidencia exposición de micropilotes. anteriormente fue mitigado en la pila 2 mediante la colocación de bolsacretos los cuales han cedido en las hiladas superiores. hay daño en la defensa metálica sobre el margen izquierdo de la vía debido a presentarse el accidente, en una longitud de 38 m, para la afectación de 10 tramos de 4 m c/u y 10 parales dobles que la anclan al suelo, la AMV-G4 con la EMR Construcaminos realizan el retiro de la parte averiada que aumenta el riesgo de accidentalidad. Se solicitó autorización para la visita del especialista estructural de la Administración vial, se realizó la visita el 10 de marzo de 2026, para obtener bajo un conocimiento técnico cuales estudios y que actividades se requieren para mejorar su condición, para que basado en los informes se pueda solicitar presupuestos y contratación para la rehabilitación del puente.
- **PR 89+310 -– PR 89+342 Puente La Torre:** longitud 32.15 mt. Requiere reposición de junta No. 2 de salida (elastomérica en neopreno).

Ruta 7506 Calamar - San José Del Guaviare

De acuerdo con los registros en campo por parte de la administración se identifica lo siguiente:

- La vía no presenta bermas, mayormente su configuración es en terraplén, con zonas verdes a nivel de la base de este, hay presencia discontinua de cunetas, las obras de drenaje en la vía se comprenden de alcantarillas y box, se presentan daños menores de erosión en la zona lateral y en las obras de drenaje (Cunetas y disipadores de energía).
- PR 00+0000 - PR 00+0016 vía en afirmado.
- PR 00+0016 - PR 00+0841 vía en Pavimento Rígido paso urbano Calamar.
- PR 00+00841 - PR 01+0880 vía en Pavimento flexible paso urbano Calamar.
- PR 1+880 – PR 26+744 vía en afirmado.
- PR 26+744 – PR 27-109 vía en Pavimento Rígido paso urbano La Libertad.
- PR 27-109 – PR 32+790 vía en afirmado.
- PR 32+790 - PR 33+414 vía en Pavimento flexible.
- PR 33+414 – PR 33+818 vía en afirmado.
- PR 33+818 – PR 36+050 vía en Pavimento flexible.
- PR 36+050 – PR 36+250 vía en afirmado.
- PR 36+250 – PR 37+300 vía en Pavimento flexible.
- PR 37+300 – PR 37+410 vía en afirmado.

- PR 37+410 – PR 45+330 vía en Pavimento flexible.
- PR 45+330 – PR 46+162 vía en Pavimento Rígido paso urbano El Retorno.
- PR 46+162 – PR 46+563 vía en afirmado.
- PR 46+563 – PR 73+600 vía en Pavimento flexible.
- PR 46+0150: paso restringido a máximo 20 toneladas (puente tipo ACROW DDR2) Punete modular instalado el 8 noviembre de 2017
- La AMV-G4 realiza seguimiento al Box-Coulvert del PR 68+1036 que detonaron cargas explosivas el día 27 de febrero del 2025, y se presenta presupuesto para reconstrucción.
- **PR 69+0606 - PR 73+0600:** Tramo de pavimento flexible en mal estado, este tramo es vulnerable a la presencia continua de formación de baches debido al alto deterioro del pavimento flexible: PR 69+0606-PR 70+0093; PR 71+0375-PR 71+0860; PR 71+0918-PR 72+0168; PR 72+0750-PR 73+0600, la vía se encuentra bajo contrato de obra No. 976 del 2021 “mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la troncal de la Orinoquía (San José – El retorno – Calamar) en el departamento del Guaviare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” en ejecución de pavimentación desde el año 2021 hasta el año 2030, el consorcio de obra DSC con Nit No. 901476773-6, se ha realizado parcheo con mezcla asfáltica en caliente MDC-19 con este contrato entre PR 72+0750-PR 73+0600 del 15 al 17 de julio del 2024. Y por medio de insumos de la AMV Consorcio AMV CARFIN los días 28,30 de julio 2025.

Estado de los puentes de la ruta:

- **PR 02+0022 – PR 02+0033 Puente Calamar**: longitud 10.5 mt. Requiere ampliación, rediseño estructural y mejoramiento de aproches.
- **PR 11+0283 – PR 11+0295 Puente Caño Bálsamo 1**: longitud 12.4 mt. Requiere ampliación, rediseño estructural y mejoramiento de aproches.
- **PR 16+0248 – PR 16+259 Puente Caño Damas**: longitud 12.4 mt. Requiere ampliación, rediseño estructural y mejoramiento de aproches.
- **PR 26+0479 -PR 26+594 Puente Caño Platanales**: longitud 15 mt. Requiere ampliación, rediseño estructural y mejoramiento de aproches. (Posible intervención con el contrato 976-2021). Se solicitó autorización para la visita del especialista estructural de la Administración vial, se realizó la visita el 10 de marzo de 2026, para obtener bajo un conocimiento técnico cuales estudios y que actividades se requieren para mejorar su condición, para que basado en los informes se pueda solicitar presupuestos y contratación para la rehabilitación del puente.
- **PR 29+0492 – PR 29+0463 Puente Caño Potosí:** longitud 20.7 mt Requiere ampliación, rediseño estructural, (Posible intervención con el contrato 976-2021).
- **PR 33+0662 – PR 33+0676 Puente Caño Raya:** longitud 14.2 mt Requiere ampliación, rediseño estructural, (Posible intervención con el contrato 976-2021).
- **PR 36+0144 – PR 36+0155 Puente Caño Choapo:** longitud 11 mt Requiere ampliación, rediseño estructural, en Intervención con el contrato 976-2021 en el año 2026.
- **PR 37+0437 – PR 37+0448 Puente Caño Grueso:** inicialmente con longitud 10.6 mt. Habilitado para un carril. Demolido y se realiza Intervención con el contrato 976-2021 en el año 2025
- **PR 43+0155 – PR 43+0166 Puente Caño Canoa:** inicialmente con longitud 10.85 mt. Habilitado para un carril. Demolido y se realiza Intervención con el contrato 976-2021 en el año 2025 longitud: 21 mt.

- **PR 46+0172 – PR 46+0202 Puente Caño Grande:** longitud 30.00 mt. La losa del puente esta destruida, se realizó la instalación de puente modular provisional (puente militar) puente tipo ACROW DDR2 paso restringido a máximo 20 tonelada, instalado el 8 noviembre de 2017 mediante contrato de obra No. 976 del 2021.
- **PR 46+0325 – PR 46+336 Puente Caño Lagos**: longitud 10.70 mt. Requiere ampliación, rediseño estructural y mejoramiento de aproches. Actualmente no presenta barandas.
- **PR 46+0436 – PR 46+446 Puente Caño Loco:** longitud 10.20 mt. Requiere ampliación, rediseño estructural y mejoramiento de aproches. Actualmente no presenta barandas.
- **PR 50+0114 - PR 50+0129 Puente caño trueno**: longitud 15.00 mt. averiada 1 sección de la baranda metálica izquierda.
- **PR 54+0671 - PR 54+0681 Puente caño Hobo**: longitud 10.30 mt.
- **PR 56+0268 - PR 56+0279 Puente caño La Leona**: longitud 10.80 mt.
- **PR 63+0405 - PR 63+0416 Puente La Fuga**: longitud 10.80 mt. Se solicitó autorización para la visita del especialista estructural de la Administración vial, se realizó la visita el 10 de marzo de 2026, para obtener bajo un conocimiento técnico cuales estudios y que actividades se requieren para mejorar su condición, para que basado en los informes se pueda solicitar presupuestos y contratación para la rehabilitación del puente.
- **PR 69+0332 - PR 69+0343 Puente Agua Bonita**: longitud 10.40 mt.

RESUMEN HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA VÍA DEL PR 46+0553 - PR 69+0590:

La gobernación del Guaviare, a través del contrato de obra 921/2020 cuyo objeto es “Pavimentación de la vía 7506, que comunica a los municipios de San José del Guaviare y El Retorno – Etapa, Guaviare”, se intervino el tramo comprendido entre el PR 55+0585 al PR 69+0080, donde realizó la construcción de un pavimento asfaltico, obras de arte y el puente Agua Bonita. Al mismo se le realizo una adición con recursos aportados por el INVIAS a través del convenio interadministrativo 1217/2020 que tiene como alcance la pavimentación de 4.49 km en concreto flexible, entre el PR 55+0585 al PR 60+0080.

La gobernación del Guaviare, a través del contrato de obra No. 1425/2021 cuyo objeto es “PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 7506 QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL RETORNO – ETAPA - 2, GUAVIARE”, realizó la construcción de pavimento flexible entre el PR 46+0585 al PR 55+0585, construcción de obras de drenaje, señalización horizontal y vertical y la construcción del puente Caño Trueno.

Mantenimiento Rutinario en las rutas 7506 y 6507

Los contratos de mantenimiento rutinario tienen contrato adjudicado hasta el 31 de julio del 2026, con orden de inicio para las Empresas de Mantenimiento Rutinario: EMANVIACOL LTDA., EMTRASERVIG S.A.S, CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA Y CONSTRUCCIONES del 29 de mayo del 2024; y para la Empresa de Mantenimiento Rutinario MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S del 1 de junio del 2024.

Las rutas se encuentran distribuidas en cinco tramos para el mantenimiento rutinario a cargo de las microempresas:

1. SECTOR 7506 CALAMAR – EL RETORNO: PR 00+0000 - PR 45+0000- **EMANVIACOL LTDA.**

2. SECTOR 7506 EL RETORNO - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE: PR 45+0000 AL PR 73+0600- **EMTRASERVIG SAS**.

3. SECTOR 6507 SECTOR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – PUERTO CONCORDIA: PR 00+0000-PR 17+0000- **EMTRASERVIG SAS.**

4. SECTOR 6507 PUERTO CONCORDIA - PUERTO RICO PR 17+0000-PR 62+0000- **CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA.**

5. SECTOR 6507 PUERTO RICO – CRUCE DE PUERTO RICO PR 62+0000-PR 102+0600 – **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y SAS.**

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA DE LAS EMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Se presenta la información general de cada uno de los contratos de mantenimiento rutinario a cargo la Administración Vial Grupo AMV 4:

3.1 Información general de los contratos

- **EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. – EMANVIACOL**

CONTRATO DE OBRA / MANTENIMIENTO RUTINARIO	
CONTRATO:	1705 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOSLTDA. – EMANVIACOL LTDA.
NIT:	900.934.892-6
REPRESENTANTE LEGAL	NILSON RODRIGO SÁNCHEZ HUERTAS
IDENTIFICACIÓN	97.612.185 de San José del Guaviare, Guaviare
DIRECCIÓN	Casco Urbano El Retorno - Guaviare.
TELÉFONO	3160424493
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR 0+0000 - PR 45+0000. LOTE 6.
LOCALIZACIÓN:	SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE,PR 00+0000 - PR 45+0000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.836.705.500,00 Incluido IVA
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE MAYO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	29 MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PÓLIZA DE GARANTÍA No	PÓLIZA CUMPLIMIENTO 620-47-99400005834

VIGENCIA	14-05-2024 AL 31-07-2029
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No:	PÓLIZA No. 620-74-994000012287
VIGENCIA	14-05-2024 AL 31-07-2026
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NUMERO PROCESO SECOP II	LP- DEO-SGI-100-2023

- **EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – "EMTRASERVIG SAS"**

CONTRATO DE OBRA / MANTENIMIENTO RUTINARIO	
CONTRATO:	1698 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – EMTRASERVIG SAS
NIT:	900.969.035-1.
REPRESENTANTE LEGAL	JHON ALEXANDER LOAIZA HERNÁNDEZ
IDENTIFICACIÓN	6.429.420 expedida en Riofrio
DIRECCIÓN	San José del Guaviare.
TELÉFONO	3185161223
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR 45+0000 - PR 73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 0+0000 - PR 17+0000. LOTE 5.
LOCALIZACIÓN:	SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DEL PR 45+0000 AL PR 73+0600, SECTOR 6507 SECTOR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO PR 00+0000-PR 17+0000.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.840.323.100 Incluido IVA
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE MAYO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	29 MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PÓLIZA DE GARANTÍA No	PÓLIZA CUMPLIMIENTO 620-47-99400005832
VIGENCIA	14-05-2024 AL 31-07-2029
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No:	PÓLIZA No. 620-74-994000012282

VIGENCIA	14-05-2024 AL 31-07-2026
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NUMERO PROCESO SECOP II	LP- DEO-SGI-100-2023

- **MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA. – "CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA."**

CONTRATO DE OBRA / MANTENIMIENTO RUTINARIO	
CONTRATO:	1711 DE 2024
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA
NIT:	900.969.035-1.
REPRESENTANTE LEGAL	NÉSTOR BETANCOURT BETANCOURT
IDENTIFICACIÓN	17.331.334 expedida en Villavicencio
DIRECCIÓN	Puerto Concordia.
TELÉFONO	3112685546
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 17+0000 - PR 62+0000 LOTE 7"
LOCALIZACIÓN:	SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO PR 17+0000-PR 62+0000.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.791.675.900 Incluido IVA
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE MAYO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	29 MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PÓLIZA DE GARANTÍA No	PÓLIZA CUMPLIMIENTO 620-47-994000052838
VIGENCIA	14-05-2024 AL 31-07-2029
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No:	PÓLIZA No. 620-74-994000012286
VIGENCIA	10-05-2024 AL 31-07-2026
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NUMERO PROCESO SECOP II	LP- DEO-SGI-100-2023

- **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S.**

CONTRATO DE OBRA / MANTENIMIENTO RUTINARIO	
CONTRATO:	1740 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S. - TRIUNFO VIAL S.A.S.
NIT:	900.936.712-8
REPRESENTANTE LEGAL	RUBÉN ÁVILA
IDENTIFICACIÓN	9.620.232 expedida en Guayata
DIRECCIÓN	Puerto Concordia.
TELÉFONO	3114954306
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 – PR 102+0600. LOTE 10.
LOCALIZACIÓN:	SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 – PR 102+0600
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.632.025.500 Incluido IVA
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	29 MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PÓLIZA DE GARANTÍA No	PÓLIZA CUMPLIMIENTO 620-47-994000052844
VIGENCIA	15-05-2024 AL 31-07-2029
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No:	PÓLIZA No. 620-74-994000012286
VIGENCIA	15-05-2024 AL 31-07-2026
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NUMERO PROCESO SECOP II	LP- DEO-SGI-100-2023

3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

Se presentan en el anexo 1. Indicadores, el resumen de las actividades realizadas por las 4 EMR en el periodo del presente informe.

3.3 Seguimiento a Ítems No Previstos

Para el Presente contrato No aplica la creación de ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones por parte de la Administración Vial

En el Presente periodo, los contratos de mantenimiento rutinario para las cuatro (4) empresas de mantenimiento rutinario ejecutaron un avance de obra de 100% de los indicadores programados, durante el periodo se Presentó la dificultad por lluvias, La AMV-G4 elabora las actas de obra de las 4 EMR para este periodo.

Ver anexo 1: Indicadores.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA (EMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO)

4.1 Informe semanal

La AMV-G4, realizó el seguimiento de las actividades de mantenimiento rutinario de cada una de las empresas, para el Presente periodo, registrando la información en los formatos de seguimiento semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3 en donde se evidencia el desempeño de las actividades (Programadas) que desarrollan en el avance general de los contratos, incluyendo el registro fotográfico, verificación la información de las actividades través de los recorridos viales de las Rutas asignadas: 6507 y 7506.

Ver anexo 2: Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-3- Informe Semanal.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, registrando el control diario a cada uno de los contratos de mantenimiento rutinario a cargo de la AMV G4, para el presente periodo.

Ver anexo 3: Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-4- Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, se relacionan a todos los integrantes de cada una de las empresas que ejecutan los trabajos de mantenimiento rutinario, para este período.

Ver anexo 4: Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra de las EMRs.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, se relacionan todos los movimientos financieros de las actas mensuales de pago y saldos de los registros presupuestales de los contratos de obra, que se realizan durante la ejecución de los contratos de mantenimiento rutinario a cargo de la AMV G4.

Ver anexo 5: Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe Financiero (Control)

4.5 Estado general del tiempo

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, se registra diariamente el estado del tiempo en cada uno de los sectores en donde las empresas realizan los trabajos de mantenimiento rutinario para el presente periodo.

Ver anexo 6: Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado General del Tiempo

4.6 Resumen ensayos de Laboratorio.

No aplica. Los trabajos que realizan las empresas de mantenimiento no requieren de ensayos de laboratorio.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, se presenta el seguimiento a las garantías de cada contrato en el presente periodo.

Ver anexo 7: Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento de Garantías y Seguros Contrato de obra.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra

No aplica. Los contratos de mantenimiento rutinario no requieren de un plan de calidad.

4.9 Otros documentos de seguimiento mensual.

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

No aplica, los contratos de las EMR no presentan anticipos.

Ver anexo 8: MINFRA-MN-IN-2-FR-1 Plan de inversión de anticipo. No aplica.

Ver anexo 9: MINFRA-MN-IN-2-FR-2 Informe de inversión y buen manejo de anticipo. No aplica.

4.9.2 Seguimiento programa de Obra

No aplica. Los contratos de mantenimiento rutinario no tienen un programa de inversiones.

4.9.3 Seguimiento programa de Inversiones

No aplica. Los contratos de mantenimiento rutinario no tienen un programa de inversiones.

4.9.4 Actas de Comité de Obra

- Para los contratos de EMR no se realizan actas de comité, sin embargo, entre la AMV y le D.T. Meta, se realiza comité técnico en instalaciones de la dirección territorial Meta en la ciudad de Villavicencio.

4.9.5 Actas de Reunión

- Para este período:
  - No se realizaron reuniones en las instalaciones de la sede de la administración vial.

- Ver anexo 11: Registro MEPI-MN-IN-14-FR-2-Acta de reunión (N-A).

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Descripción general del contrato

A continuación, se presenta resumen de la información del contrato de consultoría de la AMV G4:

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL	
CONTRATO:	1965 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV CARFIN: INTEGRANTES 1. CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA NIT: 19183135 50% 2. INGENIERÍA ARGOS SAS NIT: 860046102-1- 25% 3. FERNÁNDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS FERDINCO SAS NIT: 900871862-3- 25%
NIT.	901.839.313-0
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.
LOCALIZACIÓN:	RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE -CRUCE A PUERTO RICO - RUTA 7506 CALAMAR-EL RETORNO-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.050.284.952,00 IVA INCLUIDO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE JULIO DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	29 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE JULIO DE 2026
EJECUTADO ACUMULADO:	10.87 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	31 DE JULIO DE 2026
PÓLIZA DE GARANTÍA No	PÓLIZA No. 21-44-101443272 anexo 2
VIGENCIA	12-06-2024 AL 23-08-2029
N° PROCESO SECOP II:	CMA-DEO-SGI-137-2023

5.2 Descripción de las actividades ejecutadas por parte de la AMV G4 en el presente periodo.

Actividades de Rutina Mensual:

- Recorridos viales con toma de registro fotográfico semanales a las rutas 6507 San José del Guaviare – cruce a Puerto Rico y 7506 Calamar – San José del Guaviare.
- Verificación de las actividades realizadas y en ejecución de las empresas de mantenimiento rutinario semanalmente.
- Informes semanales y mensual de sitios críticos y emergencias reportados a la Dirección Territorial Meta.
- Informes semanales e informe mensual de actividades ejecutadas por las EMR acompañado de su registro fotográfico.
- Reportes de accidentes sucedidos, en las Rutas 6507 San José del Guaviare – cruce a Puerto Rico y 7506 Calamar – San José del Guaviare.
- Informe mensual de accidentalidad del presente periodo.
- Toma de datos de campo para actualizar criterio técnico en el informe trimestral de las rutas 6507 San José del Guaviare – cruce a Puerto Rico y 7506 Calamar – San José del Guaviare.
- Para el presente periodo se realiza la verificación en vía de los elementos de protección personal de las EMR a cargo de las rutas 6507 y 7506 por parte de la SISO de la AMV-G4, Mantenimiento y almacenamiento de los EPP, Inspección a extintores de los vehículos y botiquín, mantenimiento PR eventivo de los vehículos, verificación de herramientas y equipos y su estado, uso adecuado del uniforme y verificación del trabajador en el puesto de trabajo. Como dato adicional las 4 EMR están pagando un Seguro de Vida colectivo.
- Para el presente periodo se realiza la verificación del pago de planillas de aportes sociales de las EMR a cargo de las rutas 6507 y 7506 por parte de la SISO de la AMV-G4.
- Capacitación mensual a los integrantes de las 4 empresas de mantenimiento rutinario de la AMV-G4, realizada el día 22 de mayo del 2026.
- Radicación de las actas de costos de las EMR y el acta de costos de la AMV-G4.
- Atención a los memorandos remitidos por la dirección territorial meta.

Actividades diferentes a la Rutina Mensual:

- De la estructuración para asignación de recursos para la ruta 6507, se está en la espera de la contratación, donde se atenderán afectaciones criticas especialmente los hundimientos, donde se realiza el cambio de estructura de pavimento en las capas de asfalto y base, para atender los más significativos entre los cuales se encuentran en el carril izquierdo en: PRs 82+434; 83+820; 84+344; 84+407; 84+989; 85+144; 85+185; 85+216; 86+253; 87+443; 87+575; 88+144; 93+650, hundimientos sobre el carril derecho: PRs 82+208; 84+414; 85+185; 85+224, siendo definidos los sitios de intervención por la interventoría designada y contratista de obra.
- Se tiene aprobación de compra de insumos para: A) instalación de hitos con demarcación y horizontal más tachas reflectivas en dos instituciones educativas en ruta 6507, B) compra de asfalto para bacheo

en la ruta 6507. Se ha hecho la compra de insumos y se esta en espera de la llegada de estos para su instalación.

- El día 4 de mayo se coordina con la EMT Emtraservig el retiro de un árbol caído en la ruta 7506 PR 65+200. Que afectaba el carril izquierdo.
- El día 4 de mayo se remite archivos con información de canteras cercanas a la ruta 6507 y 7506 con la documentación adjunta que se tenia de ellas a la ing. Yency Lorena Cabanzo Sánchez al email ycabanzo@invias.gov.co
- El día 4 de mayo se remite archivos con información de accidentalidad en las rutas 6507 y 7506 a atencionciudadano@invias.gov.co con copia a los ingenieros: Claudia Yaneth Acero Alvarez <cacero@invias.gov.co>, Leidy Viviana Huertas Pasive <lvhuertasp@invias.gov.co>, Yency Lorena Cabanzo Sánchez ycabanzo@invias.gov.co y japaezh@invias.gov.co
- El día 4 de mayo se remite archivos con información de las actas de costos de la Administración Vial y de las Empresas de Mantenimiento Rutinario.
- El día 10 de mayo se asiste a la reunión virtual, mesa de trabajo Nº 2 relacionada con los resultados preliminares, presentada por el contratista CONSORCIO INCOPT LÍMITES 2025. Contrato de Consultoría No. PA-315-2025, cuyo objeto es “Realizar auditorías e inspecciones de seguridad vial, así como la revisión y evaluación de límites de velocidad en vías urbanas, rurales y pasos urbanos del territorio nacional, específicamente en la Zona 4”. Correspondiente a las metas establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV 2022–2031) y el Plan Estratégico de la ANSV 2022–2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que se desarrollaron entre el PR 0+000 al PR 8+000 de la ruta 6507.
- El día 13 de mayo se asiste a la reunión virtual 1 de trasferencia de conocimientos sobre el Permiso de uso de derecho de vías y otros.
- El día 15 de mayo se asiste a la reunión virtual, mesa de trabajo Nº 3 relacionada con los resultados preliminares, presentada por el contratista CONSORCIO INCOPT LÍMITES 2025. Contrato de Consultoría No. PA-315-2025, cuyo objeto es “Realizar auditorías e inspecciones de seguridad vial, así como la revisión y evaluación de límites de velocidad en vías urbanas, rurales y pasos urbanos del territorio nacional, específicamente en la Zona 4”. Correspondiente a las metas establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV 2022–2031) y el Plan Estratégico de la ANSV 2022–2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que se desarrollaron entre el PR 0+000 al PR 8+000 de la ruta 6507. Y se remite la información de la matriz de hallazgos vía email.
- El día 14 de mayo se remite información sobre la revisión de las resoluciones de cierres viales por emergencias en los corredores a la ingeniera Andrea Carolina Restrepo Albarello arestrepoa@invias.gov.co.
- El día 15 de mayo se remite el informa quincenal de sitios críticos a las ingenieras Andrea Carolina Restrepo Albarello <arestrepo@invias.gov.co>, Leidy Viviana Huertas Pasive <lvhuertasp@invias.gov.co>, Yency Lorena Cabanzo Sánchez <ycabanzo@invias.gov.co> ,"fsuarez@invias.gov.co" <fsuarez@invias.gov.co>.
- El día 20 de mayo se asiste a la reunión virtual 2 de trasferencia de conocimientos sobre Concepto Técnico de Ubicación de Estación de Servicios.
- El día 27, 28 y 29 de mayo se realiza acompañamiento a funcionarios de INVIAS planta central del área de prensa y comunicaciones en las rutas 6507 y 7506, como puentes con la comunidad y las obras en ejecución en estas rutas.

- Se supervisa Los días 13, 14, 20 y 26 de mayo del 2026, las actividades de instalación de hitos viales, tachas retrorreflectivas y demarcación de línea central y de borde sobre la Institución Educativa Puerto Iris – corregimiento El Viso entre los PR 26+0450 al PR 27+0500 de la Ruta 6507 (San José del Guaviare – Cruce PuertoRico). Y los días 20 y 25 de mayo del 2026, se desarrollaron actividades de instalación de hitos viales sobre la Institución Educativa El Retiro entre los PR 09+0564 al PR 09+0676 de la Ruta 6507 (San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico) financiado con el recurso de insumos de la Administración vial con las EMR EMTRASERVIG S.A.S. y CONSTRUCAMINOS LTDA.

5.3 Informes especialistas y profesionales
No aplica para el presente periodo.

5.4 Informe del programa Anual de Caja – PAC
No aplica para el presente periodo.

5.5 Informe matriz de riesgos.
Ver anexo 13: Matriz de Riesgos Consorcio AMV CARFIN para este período.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría
No aplica para el presente mes.

5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.
No aplica, no fue solicitado para el presente período.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Para el presente período, se diligencia en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se relacionan la disposición diaria de los vehículos adscritos a la administración vial, así como también los implementos de la oficina.

Ver anexo 14 Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
Se diligencia para este período el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, se encuentra relacionado el personal que labora para la AMV G4, presentando un ingeniero residente, dos ingenieros auxiliares (1 y 2), dos conductores, una SISO y una auxiliar administrativa, donde la jornada laboral es de lunes a viernes de 8:00 am – 6:00 pm, con plena disponibilidad de la AMV-G4, para atender eventos que se llegara a presentar: En atención de emergencias y de accidentalidad de lunes a domingo.

El formato adjunto contiene toda la información del pago de aportes a parafiscales y aportes durante este periodo.

Ver anexo 15 Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

6.3 Información financiera y presupuestal del contrato de interventoría.

Todos los movimientos financieros desde el 5 de julio hasta la fecha; los valores de las actas, valores mensuales, valor del IVA y demás movimientos, se presentan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, no se solicitó anticipo para este contrato.

Ver anexo 16 Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y presupuestal Contrato de Interventoría.

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría

La información sobre el seguimiento a las garantías contractuales del contrato de administración vial No. 1965 del 2024, se encuentran consignadas en:

Ver anexo 17 Registro MINFRA-MN-IN-15-FR-13 Seguimiento a las garantías (Interventoría).

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

No aplica, el contrato de interventoría no requiere plan de calidad.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual.

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo.
No aplica. Para este contrato de Administración Vial.

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado
No aplica.

6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas
No aplica.

6.6.4 Información Gestión Socio Ambiental.
El contrato de administración vial, al ser uno de consultoría, no establece la necesidad de incluir un elemento socio ambiental; como tampoco tienen este componente los contratos de obra de mantenimiento rutinario.

6.6.5 Obras en ejecución en las vías
Se relacionan los contratos desarrollados durante el periodo contractual de la actual AMV.

RUTA RN 6507 San José del Guaviare – Cruce a Puerto Rico:

Contrato 2936 DE 2024: Este contrato atendió la necesidad de cambio de carpeta asfáltica en la ruta 6507 entre el PR 91+695 al PR 91+800 con lona longitud de 105 m intervenidos en el ancho total de la banca 7.30 metros y un espesor de 10 centímetros. Mediante el fresado y retiro de la capa de asfalto existente y la instalación de la nueva capa de asfalto.

CONTRATO DE OBRA RUTA 6507	
CONTRATO:	2936 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL NUEVO HORIZONTE
NIT.	800.118.159-2
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – CRUCE PUERTO RICO – YE DE GRANADA, RUTA 6507 Y 6508 DEPARTAMENTO DEL META –GUAVIARE.
LOCALIZACIÓN:	RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – CRUCE A PUERTO RICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.267.251.223
VALOR ADICIONAL	$ 117.748.777 DEL 21 de noviembre de 2024
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.385.000.000
FECHA DE INICIACIÓN:	9 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 ENERO DE 2025
SUSPENSIÓN 1	26 DE DICIEMBRE DEL 2024 HASTA 13 DE NERO DEL 2025
SUSPENSIÓN 2	16 DE ENERO DEL 2025 HASTA 01 DE MARZO DEL 2025
PRORROGA 2	HASTA EL 08 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA-MODIFICACIÓN No. 1	PRORROGA 1 HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2024

C***ontrato 3987 DE 2024:*** mediante este contrato de espera poder realizar el mantenimiento para puente Palomas PR 48+0166-PR 48+0192, a la fecha no se ha realizado actividades de obra en esta ubicación:

CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO DE PUENTES MONTO AGOTABLE	
CONTRATO:	3987 DE 2024
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL
NIT.	901.871.845-1
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.

LOCALIZACIÓN:	RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – CRUCE A PUERTO RICO INCLUYE PUENTE PALOMAS PR 48+0166-PR 48+0192.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.149.720.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 19.149.720.000,00
FECHA DE INICIACIÓN:	06/11/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31/12/2024 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	MONTO AGOTABLE.
SUSPENSIÓN	
PRORROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.

C***ontrato 1425 DE 2025:*** Mediante este contrato realiza el reemplazo de la estructura de pavimento (base y asfalto) en los hundimientos más críticos entre el PR 34+000 y PR 94+000.

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	1425 de 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO IMPRIMACIÓN
NIT.	901.973.546
OBJETO:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – CRUCE PUERTO RICO RUTA 6507 DEPARTAMENTO DEL META.
LOCALIZACIÓN:	RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – CRUCE A PUERTO RICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.953’247.759
VALOR ADICIONAL	$ 00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.953’247.759
FECHA DE INICIACIÓN:	20/10/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31/12/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025.
SUSPENSIÓN	
PRORROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025.

C***ontrato 1727 DE 2025:*** en este contrato se desarrolló en la ruta 6507, se realizó la construcción de resaltos en el sector del SENA PR10+975 y PR11+158, y en el sector del colegio San José Obrero PR2+016 y PR2+155.

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	1727 de 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIGAVI ZOMAZ SAS
NIT.	901.677.384
OBJETO:	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y/O DISPOSITIVOS DE CONTROL EN LAS VÍAS CÓDIGO 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE DE PUERTO RICO, 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 65AMTC ACCESO A GRANADA Y 65A02
LOCALIZACIÓN:	RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – CRUCE A PUERTO RICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 119’731.920,46
VALOR ADICIONAL	$ 00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 119’731.920,46
FECHA DE INICIACIÓN:	31/10/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31/12/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025.
SUSPENSIÓN	
PRORROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025.

RUTA RN 7506 CALAMAR – SAN JOSÉ DEL GUAVIARE:

***Contrato No. 976 de 2021*:** Este contrato s desarrolla en la ruta 7506, tiene como meta la instalación de la estructura de pavimento, instalación de asfalto, entre el PR 21+000 al PR 45+320, con el reemplazo de obras de drenajes (alcantarillas y box Coulvert), construcción de filtro y cunetas, y la intervención de los puentes dentro del sector.

CONTRATO DE OBRA RUTA 7506	
CONTRATO:	976 DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC
NIT.	901.476.773-6
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.
LOCALIZACIÓN:	RUTA 7506 SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 179.689.019.569
VALOR ADICIONAL	$ 18.311.743.031,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 198.000.762.600,00
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE JUNIO DE 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	114 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	01 JULIO DE 2030
SUSPENSIÓN	REINICIA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2025
PRORROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	31 AGOSTO DEL 2030

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RUTA 7506, CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

- El contrato No. 976/2021 se encuentra en ejecución con vigencia hasta el año 2030, busca la construcción de estructura de pavimento y pavimento flexible, entre PR 21+000 y el PR 45+320, por el momento se han realizado actividades entre el PR 32+790 y el PR 45+320, las cuales han sido sectorizada con tramos discontinuos entre afirmado y pavimento terminado. Se construyeron como nuevos los puentes de Caño Canoa en el PR 43+155, y Palo Grueso en el PR 37+437 en el año 2025. El 25 de febrero se inicia actividades de obra para el año 2026, en el mes de abril se inicia trabajos de ampliación del puente Caño Choapo en el PR 36+144, en el mes de mayo se instala subbase y base entre PR 32+000 y el PR 33+000.
- El Box Coulvert en el PR 68+0970 se considera como sitio critico debido a las averías ocasionadas por la detonación de artefactos explosivos el día 27 de febrero del 2025, no pudo ser atendido mediante ningún contrato existente en 2025, se remitió presupuesto de intervención para su reemplazo para presupuesto 2026, a la fecha no ha salido proceso de contratación.
- El pavimento flexible se encuentra en mal estado y afecta la transitabilidad normal: Del PR 69+0590 – PR 73+0600, mediante contrato de obra No. 976 del 2021 solo se realiza parcheo temporal de este sector. El cual debe ser reemplazado, se han remitido tres presupuestos sectorizados solicitando la intervención mediante contrato de obra con las vigencias 2026, a la fecha no ha salido proceso de contratación.
- PR 01+0880 hasta el PR 24+000 los sectores de afirmado se encuentran en regular estado, del PR 24+000 al PR 33+0000 se encuentra en buen estado de transitabilidad por la conformación realizada en el sector, mediante contrato No. 976 del 2021.
- PR 25+0070 margen izquierdo de la vía frecuentemente en época invernal se presenta socavación.
- PR 46+0585 al PR 69+0080, el pavimento flexible se encuentra en muy buen estado como las obras de arte: Obras de drenaje, señalización horizontal y vertical.
- Registro de sectores intervenidos por contratos


Tipo de actividad	Avance general	Contrato-estado
Afirmado	PR 0+000 – PR 0+016	976-2021 -en ejecución
Pavimento rígido	PR 0+016 – PR 0+841	976-2021 -en ejecución
Pavimento flexible	PR 0+841 - PR 1+880	976-2021 -en ejecución
Afirmado	PR 1+880 – PR 26+744	976-2021 -en ejecución
Pavimento rígido	PR 26+744 – PR 27-109	976-2021 -en ejecución
Afirmado	PR 27-109 – PR 32+790	976-2021 -en ejecución
Pavimento flexible	PR 32+790 - PR 33+414	976-2021 -en ejecución
Afirmado	PR 33+414 – PR 33+818	976-2021 -en ejecución
Pavimento flexible	PR 33+818 – PR 36+050	976-2021 -en ejecución
Afirmado	PR 36+050 – PR 36+250	976-2021 -en ejecución
Pavimento flexible	PR 36+250 – PR 37+300	976-2021 -en ejecución
Afirmado	PR 37+300 – PR 37+410	976-2021 -en ejecución
Pavimento flexible	PR 37+410 – PR 45+000	976-2021 -en ejecución

Pavimento flexible	PR 45+000 – PR 45+330	921-2020 -terminado
Pavimento rígido	PR 45+330 – PR 46+162	921-2020 -terminado
Afirmado	PR 46+162 – PR 46+563	921-2020 -terminado
Pavimento flexible	PR 46+563 – PR 69+609	921-2020 -terminado
Pavimento flexible	PR 69+609 – PR 73+600	Sin información
Cunetas	PR 34+557 – PR 35+000 margen Izquierda PR 36+700 – PR 36+800 margen Izquierda PR 38+029 – PR 38+926 margen Izquierda PR 39+453 – PR 39+686 margen Izquierda PR 39+798 – PR 40+080 margen Izquierda PR 40+197 – PR 40+735 margen Izquierda PR 40+885 – PR 41+085 margen Izquierda PR 41+199 – PR 42+974 margen Izquierda PR 43+203 – PR 43+402 margen Izquierda PR 43+535 – PR 43+624 margen Izquierda PR 43+707 – PR 43+780 margen Izquierda PR 48+614 – PR 48+797 margen Izquierda PR 49+008 – PR 49+387 margen Izquierda PR 50+534 – PR 50+726 margen Izquierda PR 67+440 – PR 67+510 margen Izquierda PR 34+619 – PR 34+887 margen derecha PR 36+740 – PR 36+863 margen derecha PR 36+540 – PR 36+600 margen derecha PR 36+740 – PR 36+863 margen derecha PR 38+024 – PR 39+453 margen derecha PR 39+798 – PR 40+340 margen derecha PR 40+430 – PR 40+763 margen derecha PR 40+968 – PR 40+057 margen derecha PR 41+199 – PR 42+044 margen derecha PR 43+203 – PR 43+704 margen derecha PR 43+945 – PR 44+666 margen derecha PR 48+365 – PR 48+797 margen derecha PR 49+008 – PR 49+366 margen derecha PR 50+400 - PR 50+668 margen derecha	976-2021 -en ejecución

- Resumen de accidentalidad registrado en la ruta durante el presente contrato de AMV:

CANTIDAD DE ACCIDENTES Según Mes	POR AÑO 2024	2025	2026
Enero		3	2
Febrero		5	1
Marzo		2	1
Abril		6	
Mayo		2	1
Julio	3		
Agosto	1	2	
Septiembre	2	1	
Octubre	3	4	
Diciembre	1		
Total general	**10**	**25**	**5**

- Resumen de accidentalidad según el PR, se aprecia una mayor frecuencia dentro del PR 70, posiblemente debido a la manga de coleo, es un sector de tramo recto, sin obstáculos visuales, sin iluminación artificial.

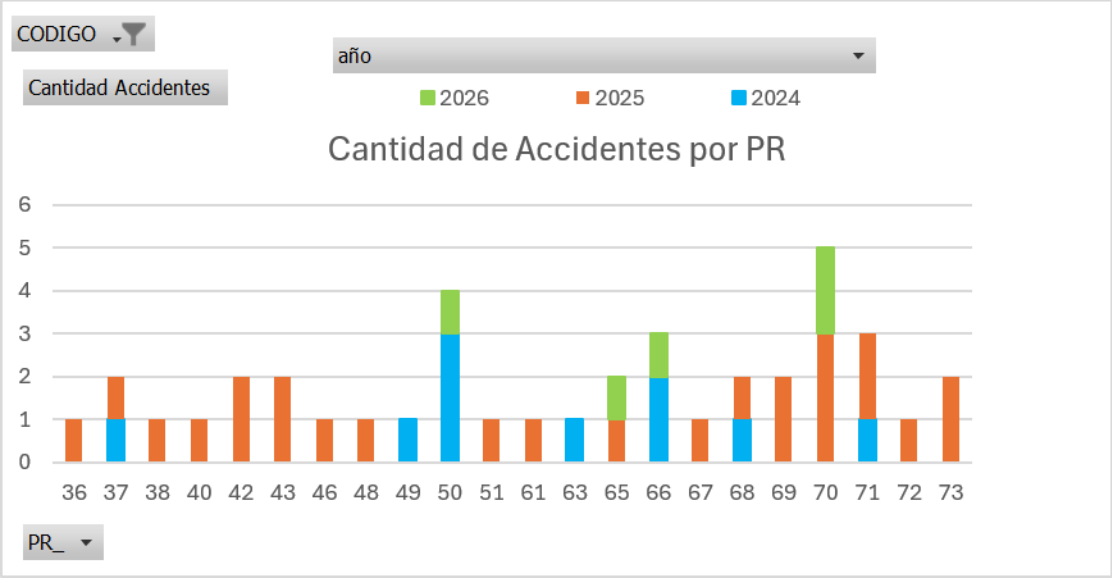


PR	FECHA	DIA SEMANA	HORA	HERIDOS	MUERTOS
70+0095	23/03/2025	Domingo	1:00 p. m.	1	0
70+0766	17/10/2025	Viernes	6:20 p. m.	1	0
70+0687	18/10/2025	Sabado	1:00 p. m.	1	0
70+0611	9/01/2026	Viernes	12:57 p. m.	1	0
70+0200	9/02/2026	Lunes	1:05 a. m.	1	0

RUTA 6507, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO.

- Se realizó demarcación de líneas de borde entre PR 0+000 a PR 5+000 en julio y agosto 2025, y del PR 5+000 al PR 7+00 y del PR 9+000 al PR 10+400 en noviembre de 2025, quedando en muy buen estado desde el PR 0+000 al PR 10+400, mediante el rublo de insumos de la AMV.
- Se realizó demarcación de la doble líneas de centro entre PR 1+000 a PR 1+500 con instalación de tachas reflectivas en noviembre de 2025, quedando en muy buen estado desde el PR 0+000 al PR 10+400, mediante el rublo de insumos de la AMV.
- Se realiza con la EMR CONSTRUCAMINOS LTDA. para mejorar la seguridad vial en la Institución Educativa Puerto Iris – corregimiento El Viso entre los PR 26+0450 al PR 27+0500 de la Ruta 6507 (San José del Guaviare – Cruce PuertoRico) la demarcación de línea central y de borde, con instalación de tachas reflectivas los días 13 y 14 de mayo del 2026; La instalación de hitos viales los días 20 y 26 de mayo del 2026. Y con la EMR EMTRASERVIG S.A.S. para mejorar la seguridad vial en la Institución Educativa El Retiro entre los PR 09+0564 al PR 09+0676 de la Ruta 6507 (San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico) la instalación de hitos viales los días 20 y 25 de mayo del 2026, mediante el rublo de insumos de la AMV.
- Puente Palomas PR 48+0160 Ruta 6507, la AMV-G4 realiza ha realizado cuatro seguimientos de topografía en los días 5 de abril, 12-13 de mayo del 2025; 21 de agostos de 2025, 14 de noviembre de 2025, para el registro y control del comportamiento de movimientos que se esté presentando en la superestructura y estribos del puente, con el fin de ser una ayuda al ingeniero estructural que lo examine y pueda dar unas directrices encaminadas a la solución del problema existente, Se solicitó autorización para la visita del especialista estructural de la Administración vial, se realizó la visita el 10 de marzo de 2026, para obtener bajo un conocimiento técnico cuales estudios y que actividades se requieren para mejorar su condición, para que basado en los informes se pueda solicitar presupuestos y contratación para la rehabilitación del puente, se presenta informe del especialista el 25 de mayo de 2026 al supervisor del contrato de AMV.
- Puente Pororio del PR 59+0477 – PR 59+0529, se evidencia por socavación bajo las dos pilas, con exposición de los micropilotes. Se solicitó autorización para la visita del especialista estructural de la Administración vial, se realizó la visita el 10 de marzo de 2026, para obtener bajo un conocimiento técnico cuales estudios y que actividades se requieren para mejorar su condición, para que basado en los informes se pueda solicitar presupuestos y contratación para la rehabilitación del puente, se presenta informe del especialista el 25 de mayo de 2026 al supervisor del contrato de AMV.
- En la Ruta 6507, la vía en general se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad para los usuarios. Sin embargo, hay presencia de baches y hundimientos del PR 34+0550-PR 93+0670, los cuales una parte fueron atendidos mediante contrato 1425 de 2025 que realizó el cambio de estructura de pavimento y la instalación de asfalto, se encuentra en proceso de estructuración nuevos recursos para continuar atendiendo estos daños en la estructura de la vía.
- Resumen de accidentalidad registrado en la ruta durante el presente contrato de AMV:

CANTIDAD DE ACCIDENTES Según Mes	POR_AÑO 2024	2025	2026
Enero		1	6
Febrero		1	4
Marzo		2	1
Abril		2	3
Mayo		6	1
Junio		4	
Julio	5	4	
Agosto	2	2	
Septiembre		3	
Octubre	2	1	
Noviembre	7	1	
Diciembre	7	2	
Total general	**23**	**29**	**15**

- Resumen de accidentalidad según el PR, se aprecia una mayor frecuencia dentro del PR 1 que es generalmente un tramo recto de pocas curvas; PR 2 en el sector se presenta bastante curvas y también se encuentra la Institución Educativa San José Obrero; PR 6, en el sector se presenta bastante curvas y también se encuentra un restaurante, y el caño la María; PR 30 es un sector de tramo recto, sin obstáculos visuales, sin iluminación artificial; PR 59 en la salida del puente Pororio se marca una curva cerrada, y se presentan volcamientos por exceso de velocidad.

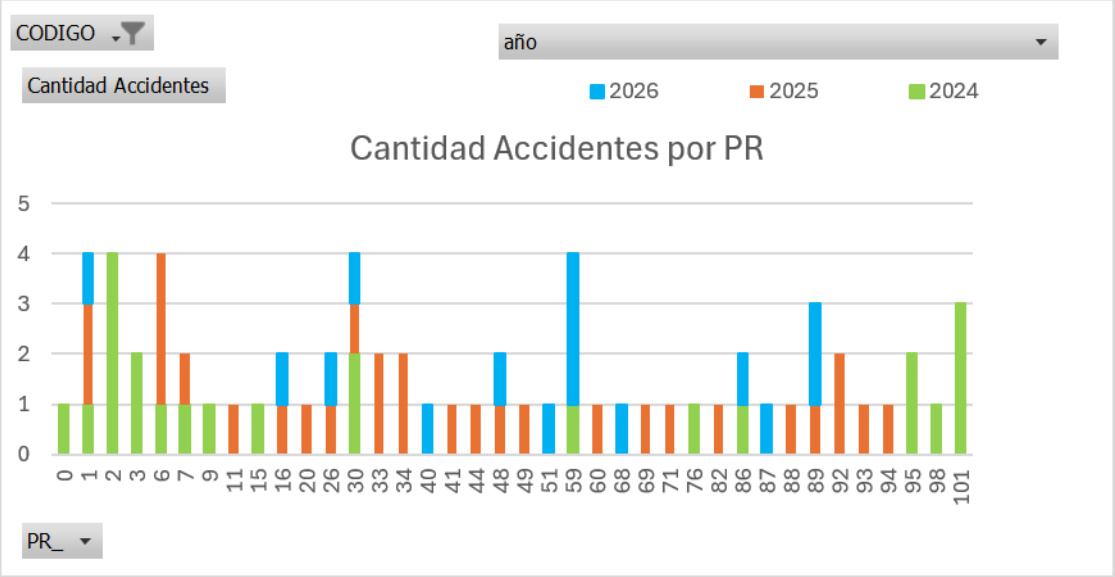

CONSORCIO AMV CARFIN
NIT: 901.839.313-0

PR	FECHA	DIA SEMANA	HORA	HERIDOS	MUERTOS
01+0000	21/07/2024	Domingo	2:30 p. m.	0	0
01+0050	2/04/2025	Miercoles	1:00 a. m.	1	0
01+0162	3/09/2025	Miercoles	6:00 a. m.	1	0
1+0700	4/02/2026	Miercoles	4:40 p. m.	0	0

PR	FECHA	DIA SEMANA	HORA	HERIDOS	MUERTOS
02+0166	21/07/2024	Domingo	5:20 p. m.	4	0
02+0050	10/08/2024	Sabado	7:30 a. m.	1	1
02+0166	20/10/2024	Domingo	5:10 a. m.	3	0
02+0160	7/11/2024	Jueves	8:15 a. m.	2	0

PR	FECHA	DIA SEMANA	HORA	HERIDOS	MUERTOS
06+0700	15/11/2024	Viernes	9:20 p. m.	1	0
06+0200	15/03/2025	Sabado	6:00 p. m.	4	0
06+0200	9/08/2025	Sabado	4:30 p. m.	1	1
06+0100	15/08/2025	Viernes	8:30 p. m.	1	0

PR	FECHA	DIA SEMANA	HORA	HERIDOS	MUERTOS
30+0900	25/11/2024	Lunes	1:15 p. m.	33	0
30+0860	3/12/2024	Martes	3:50 p. m.	2	0
30+0283	25/06/2025	Miercoles	5:00 a. m.	0	0
30+0467	22/01/2026	Jueves	11:00 a. m.	0	0

PR	FECHA	DIA SEMANA	HORA	HERIDOS	MUERTOS
59+0650	27/11/2024	Miercoles	8:00 p. m.	1	0
59+0630	13/01/2026	Martes	9:00 p. m.	1	0
59+0540	29/01/2026	Jueves	6:00 a. m.	1	0
59+0630	6/04/2026	Lunes	11:00 a. m.	0	0

ANEXOS

ANEXO 1

INDICADORES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. – EMANVIACOL LTDA.
PERIODO: MAYO DE 2026

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

ACTIVIDAD Rocería y desmonte manual
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **13** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR010+000	PR045+000	X	X	36700	13	12	2823,08 m/dia	

ACTIVIDAD Recolección de basuras: Limpieza de Bermas afirmadas
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **5** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR000+000	PR045+000	X	X	58	5	12	11,6 u/dia	

ACTIVIDAD Poda, corte y/o retiro de árboles
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR000+000	PR010+000	X	X	35	1	12	35 u/dia	

ACTIVIDAD Despeje de derrumbes
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m3				
PR042+800	PR042+800	X	X					

ACTIVIDAD Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR041+800	PR045+000	X	X	1500	1	12	1500 1500/dia	

ACTIVIDAD
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **0** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	#N/D				

ACTIVIDAD
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **0** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	#N/D				

ACTIVIDAD
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **0** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	#N/D				

ACTIVIDAD
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **0** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	#N/D				

ACTIVIDAD Vigilancia
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **31** DIAS DE 31

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR000+000	PR045+000	X	X	31	31	12	1 u/dia	

ACTIVIDAD Capacitación
SECTOR SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **1** DIAS DE 31

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR000+000	PR045+000			1	1		1 u/dia	

OBSERVACIONES

Nilson Rodrigo S.

Nombre: NILSON RODRIGO SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal
C.C. No. 97.612.185 de San José del Guaviare
Contratista

Vo.Bo.
Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – EMTRASERVIG SAS

PERIODO: MAYO DE 2026

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5.

ACTIVIDAD Rocería y desmonte manual
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **6** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR045+000	PR066+000	X	X	21000	6	12	3500 m/dia	

ACTIVIDAD Poda, corte y/o retiro de árboles
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **6** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR000+000	PR015+850	X	X	261	5	12	52,2 u/dia	
PR065+200	PR065+200	X	X	1	1	12	1 u/dia	

ACTIVIDAD Limpieza de calzada
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR000+000	PR000+400	X	X	800	1	12	800 m/dia	

ACTIVIDAD Atención Emergencias
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **2** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR015+850	PR015+850	X	X	1	1	12	1 u/dia	
PR065+200	PR065+200	X	X	1	1	12	1 u/dia	

ACTIVIDAD Limpieza barandas de puentes
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR016+010	PR016+924	X	X	120	1	12	120 m/dia	

ACTIVIDAD Instalacion de hitos viales
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **2** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR009+800	PR009+800	X	X	42	2	12	21 u/dia	

ACTIVIDAD Recolección de basuras: Limpieza de Bermas afirmadas
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **4** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR006+000	PR017+000	X	X	21	4	12	5,25 u/dia	

ACTIVIDAD Parcheo
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR006+400	PR006+400	X	X	1	1	12	1 u/dia	

ACTIVIDAD reubicacion de señales
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR001+000	PR002+000	X	X	4	1	12	4 u/dia	

ACTIVIDAD aplome de señales
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **2** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR001+000	PR002+000	X	X	5	1	12	5 u/dia	
PR046+000	PR047+000	X	X	4	1	12	4 u/dia	

ACTIVIDAD Vigilancia
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **31** DIAS DE 31

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR045+000	PR073+600	X	X	31	31	12	1 u/dia	
PR000+000	PR017+000	X	X	31	31	12	1 u/dia	

ACTIVIDAD Capacitación
SECTOR SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **0** DIAS DE 31

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR000+000	PR017+000							

OBSERVACIONES

Firma JHON LOAIZA
Nombre: JHON ALEXANDER LOAIZA HERNANDEZ
Representante Legal
C.C. No. 6.429.420 de Riofrio – Valle
Contratista

Vo.Bo.
Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA - CONSTRUCAMINOS LTDA
PERIODO: MAYO DE 2026

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000 LOTE 7

ACTIVIDAD Poda, corte y/o retiro de árboles
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **3** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR019+000	PR022+000	X	X	50	1	12	50 u/dia	
PR056+400	PR056+450	X	X	40	1	12	40 u/dia	
PR060+000	PR061+000	X	X	20	1	12	20 u/dia	

ACTIVIDAD Limpieza de obras de más de 0,60 m2 de sección (Box coulvert y alcantarillas)
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **4** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR017+000	PR042+000	X	X	61	4	12	15,25 u/dia	

ACTIVIDAD Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR019+000	PR022+000	X	X	200	1	12	200 m/dia	

ACTIVIDAD Limpieza de calzada
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR026+500	PR027+500	X	X	1000	1	12	1000 m/dia	

ACTIVIDAD Instalación tachas reflectivas
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR026+500	PR027+500	X	X	198	1	12	198 u/dia	

ACTIVIDAD Demarcación vial
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR026+500	PR027+500	X	X	3000	1	12	3000 m/dia	

ACTIVIDAD Rocería y desmonte manual
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **5** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR047+000	PR062+000	X	X	15050	5	12	3010 m/dia	

ACTIVIDAD Instalacion de hitos viales
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **2** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR026+500	PR027+500	X	X	22	2	12	11 u/dia	

ACTIVIDAD Vigilancia
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **31** DIAS DE 31

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR017+000	PR062+000	X	X	31	31	12	1 u/dia	

ACTIVIDAD Capacitación
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **1** DIAS DE 31

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR017+000	PR062+000	X	X	1	1	12	1 u/dia	

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: NÉSTOR BETANCOURT BETANCOURT
Representante Legal
C.C. No. 17.331.334 de Medina (C/marca)
Contratista

Vo.Bo.
Ing.IVÁN DARÍO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S. - TRIUNFO VIAL S.A.S.
PERIODO: MAYO DE 2026

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

ACTIVIDAD Limpieza de obras de más de 0,60 m2 de sección (Box coulvert y alcantarillas)
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **15** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR062+000	PR088+000	X	X	138	10	12	13,8 u/dia	
PR089+000	PR102+600	X	X	70	5	12	14 u/dia	

ACTIVIDAD Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **13** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR062+000	PR102+600	X	X	63000	13	12	4846,15 m/dia	
	PR102+600							

ACTIVIDAD Recolección de basuras: Limpieza de Bermas afirmadas
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **4** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR062+000	PR102+600	X	X	40	4	12	10 u/dia	

ACTIVIDAD Rocería y desmonte manual
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR099+000	PR102+600	X	X	3600	1	12	3600 m/dia	

ACTIVIDAD Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **1** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	m				
PR073+000	PR075+000	X	X	30	1	12	30 m/dia	

ACTIVIDAD
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **0** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	#N/D				

ACTIVIDAD
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **0** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	#N/D				

ACTIVIDAD
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD **0** DIAS DE 21

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	#N/D				

ACTIVIDAD Vigilancia
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **31** DIAS DE 31

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR062+000	PR102+600	X	X	31	31	12	1 u/dia	

ACTIVIDAD Capacitación
SECTOR SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: **1** DIAS DE 31

PR		LADO DE LA VIA		LONG	DIAS	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	u				
PR062+000	PR102+600	X	X	1	1	12	1 u/dia	

OBSERVACIONES

RUBEN AVILA

Nombre: RUBÉN AVILA
Representante Legal
C.C. No. 9.620.232
Contratista

Vo.Bo.
Ing.IVÁN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

ANEXO 2
Informes Semanales
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-3



CONSORCIO AMV CARFIN
NIT: 901.839.313-0

Informe Semanal No. 115
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Calle21 N 23-45 Barrio Bello Horizonte de San José Del Guaviare – Cel: 3164936102 - 3188692809
Email: consorcioamvcarfin@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

SEMANA No.: 115 del 1/05/2026 al 7/05/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. - EMANVIACOL LTDA
INTEGRANTES:	(N/A)
CONTRATO No.	1705 del 2024
FECHA DE INICIO:	29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 1.936.705.500,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.936.705.500,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No.	1965 de 2024
FECHA DE INICIO:	5/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ANTICIPO:	N.A
VALOR AMORTIZADO:	N.A
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.543.450.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.226.551.763,44	79,47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.226.551.763,44	79,47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.142.560.000,00	74,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N.A	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.931.935,48	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.931.935,48	0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.151.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,52

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 87%
Meta Física Ejecutada %: 87%
Avance o Atraso Físico %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO	Km	45	1/05/2026	7/05/2026	Prog	39			39	86,67%
						Ejec	39			39	86,67%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias.
Recoleccion de basuras: PR00+0000 al PR35+0000
Recoleccion de escombros: PR34+0600 al PR35+0400
Roceria y desmonte manual: PR41+0000 al PR45+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR00+0000 al PR45+0000
Recoleccion de basura : PR35+0000 al PR45+0000
Roceria y demsonte manual PR21+0000 al PR37+0000

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

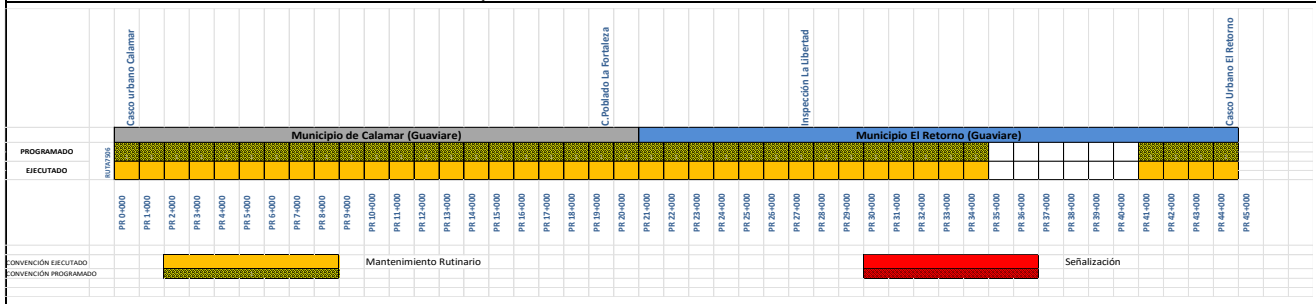

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - RECOLECCION DE BASURA PR00+0000 AL PR15+0000 / RUTA 7506



DURANTE - RECOLECCION DE BASURA PR00+0000 AL PR15+0000 / RUTA 7506



DESPUES - RECOLECCION DE BASURA PR00+0000 AL PR15+0000 / RUTA 7506



ANTES - RECOLECCION DE BASURA PR15+0000 AL PR27+0000 / RUTA 7506



DURANTE - RECOLECCION DE BASURA PR15+0000 AL PR27+0000 / RUTA 7506



DESPUES - RECOLECCION DE BASURA PR15+0000 AL PR27+0000 / RUTA 7506



ANTES - RECOLECCION DE ESCOMBROS PR34+0600 AL PR35+0400 / RUTA 7506



DURANTE - RECOLECCION DE ESCOMBROS PR34+0600 AL PR35+0400 / RUTA 7506



DESPUES - RECOLECCION DE ESCOMBROS PR34+0600 AL PR35+0400 / RUTA 7506



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR41+0000 AL PR45+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR41+0000 AL PR45+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR41+0000 AL PR45+0000 / RUTA 7506

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN**
Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 115 del 1/05/2026 al 7/05/2026 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL META. SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600 / 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000), 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS - EMTRASERVIG SAS
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No. 1698 del 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE INICIO: 29/05/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No. 1965 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.546.490.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.238.530.365,59	80,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.238.530.365,59	80,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.144.760.000,00	74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.959.032,26	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.959.032,26	0,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.294.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,52

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 17,78%
Meta Física Ejecutada %: 13,33%
Avance o Atraso Físico %: -4,44%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1 (6507)	Tramo y/o sector 2 (7506)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45,6	1/05/2026	7/05/2026	Prog	8,0			8	17,78%
					Ejec	6,0			6,0	13,33%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000),
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	7	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias, Rutas RN6507 y RN7506
Desmonte manual: PR00+0000 al PR06+0000 (RN6507)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR45+0000 al PR73+0600 (RN7506) Y PR00+0000 al PR17+0000 (RN6507)
Rocería y desmonte manual: PR45+0000 al PR66+0000 (RN7506)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

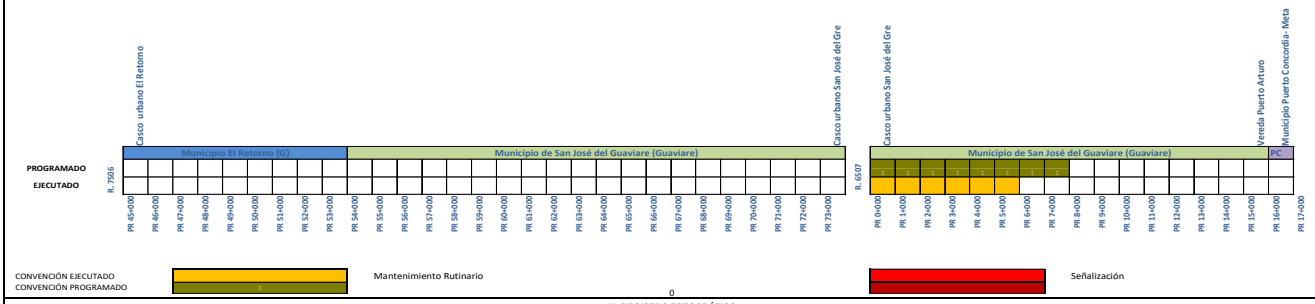

CONVENCIÓN EJECUTADO
CONVENCIÓN PROGRAMADO
1
Mantenimiento Rutinario
0
Señalización

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - DESMONTE MANUAL PR00+0000 AL PR02+0000 / RUTA 6507



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR00+0000 AL PR02+0000 / RUTA 6507



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR00+0000 AL PR02+0000 / RUTA 6507



ANTES - DESMONTE MANUAL PR02+0000 AL PR03+0300 / RUTA 6507



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR02+0000 AL PR03+0300 / RUTA 6507



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR02+0000 AL PR03+0300 / RUTA 6507



ANTES - DESMONTE MANUAL PR03+0300 AL PR05+0000 / RUTA 6507



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR03+0300 AL PR05+0000 / RUTA 6507



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR03+0300 AL PR05+0000 / RUTA 6507



ANTES - DESMONTE MANUAL PR05+0000 AL PR06+0000 / RUTA 6507



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR05+0000 AL PR06+0000 / RUTA 6507



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR05+0000 AL PR06+0000 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN**
Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 7 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 115 del 1/05/2026 al 7/05/2026. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000. LOTE 7.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA. – CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No. 1711 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.791.675.900,00
FECHA DE INICIO: 29/05/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.791.675.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No. 1965 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.505.610.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1.207.469.139,78 — 80,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.207.469.139,78 — 80,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ 1.114.520.000,00 — 74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N.A — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: N.A — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: N.A — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N.A — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 12.615.806,45 — 0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 12.615.806,45 — 0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 66.485.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,49
Acumulado:	0,53

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 641.183.876,20 — 15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 641.183.876,20 — 15,83%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 68,89%
Meta Física Ejecutada %: 55,56%
Avance o Atraso Físico %: -13,33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45	1/05/2026	7/05/2026	Prog	31			31	68,89%
					Ejec	25,0			25	55,56%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	7 (Día)	5 (Mes)	2026 (Año)


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias rutas RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.
Limpieza de alcantarillas (61 unidades): PR17+0000 al PR42+0000
Limpieza de cunetas revestidas: PR17+0000 al PR42+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias Ruta RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.
Desmonte manual y poda de arboles: PR25+0000 al PR27+0000
Demarcacion vial e instalacion de tachas: PR25+0000 al PR27+0000

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

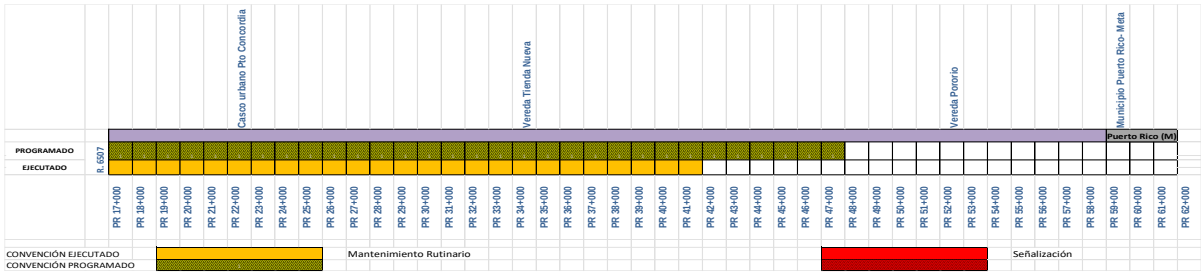

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR37+0000 AL PR42+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR37+0000 AL PR42+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR37+0000 AL PR42+0000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR30+0000 AL PR37+00000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR30+0000 AL PR37+00000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR30+0000 AL PR37+00000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR23+0000 AL PR30+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR23+0000 AL PR30+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR23+0000 AL PR30+0000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR17+0000 AL PR23+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR17+0000 AL PR23+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR17+0000 AL PR23+0000 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **Ing. IVAN MAURICIO PEÑALOZA SUESCUN**
Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 114 del 1/05/2026 al 7/05/2026 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+0000 - PR 102+0600).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S.		
INTEGRANTES:		(N/A)	
CONTRATO No.	1740 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE INICIO:	1/06/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN		
INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%		
CONTRATO No.	1965 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	N.A
		VALOR AMORTIZADO:	N.A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.371.450.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.096.921.290,32	79,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.096.921.290,32	79,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.015.220.000,00	74,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.491.290,32	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.491.290,32	0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 60.559.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,63
Acumulado:	0,58

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 84%
Meta Física Ejecutada %: 84%
Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	40,6	1/05/2026	7/05/2026	Prog	34			34	83,74%
					Ejec	34			34	83,74%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+000 - PR 102+0600).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	7	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias PR62+0000 al PR102+0600.


Rocería y desmonte manual: PR99+0000 al PR102+0600

Recoleccion de basuras: PR62+0000 al PR92+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias: PR62+0000 al PR102+0600

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

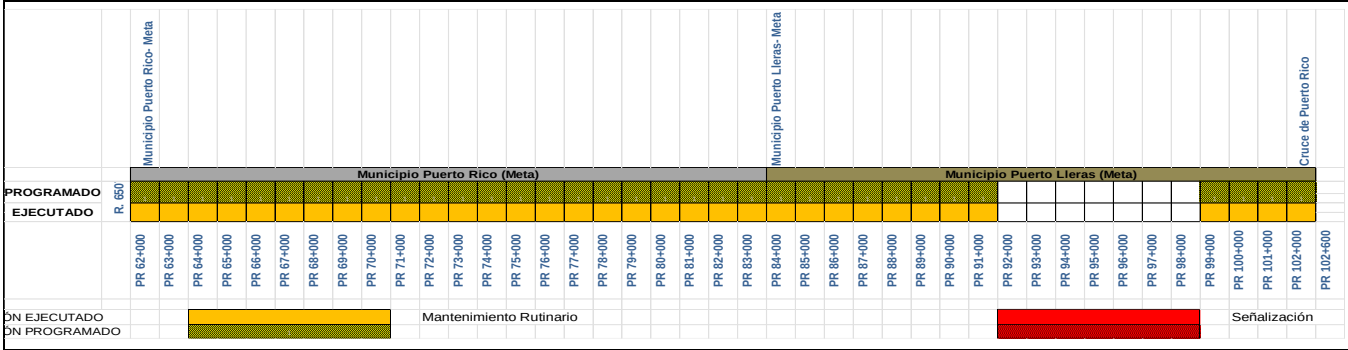

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR99+0000 AL PR102+0600 / RUTA 6507



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR99+0000 AL PR102+0600 / RUTA 6507



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR99+0000 AL PR102+0600 / RUTA 6507



ANTES - RECOLECCION DE BASURAS PR62+0000 AL PR72+0000 / RUTA 6507



DURANTE - RECOLECCION DE BASURAS PR62+0000 AL PR72+0000 / RUTA 6507



DESPUES - RECOLECCION DE BASURAS PR62+0000 AL PR72+0000 / RUTA 6507



ANTES - RECOLECCION DE BASURAS PR72+0000 AL PR82+0000 / RUTA 6507



DURANTE - RECOLECCION DE BASURAS PR72+0000 AL PR82+0000 / RUTA 6507



DESPUES - RECOLECCION DE BASURAS PR72+0000 AL PR82+0000 / RUTA 6507



ANTES - RECOLECCION DE BASURAS PR82+0000 AL PR92+0000 / RUTA 6507



DURANTE - RECOLECCION DE BASURAS PR82+0000 AL PR92+0000 / RUTA 6507



DESPUES - RECOLECCION DE BASURAS PR82+0000 AL PR92+0000 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN**

Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**



CONSORCIO AMV CARFIN
NIT: 901.839.313-0

Informe Semanal No. 116
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Calle21 N 23-45 Barrio Bello Horizonte de San José Del Guaviare – Cel: 3164936102 - 3188692809
Email: consorcioamvcarfin@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 116 del 8/05/2026 al 14/05/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. - EMANVIACOL LTDA	INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES:	(N/A)	INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No.	1705 del 2024	CONTRATO No.	1965 de 2024
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	FECHA DE INICIO:	5/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 1.936.705.500,00	VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.936.705.500,00	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	N.A
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	N.A
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.543.450.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.239.483.698,92	80,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.239.483.698,92	80,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.142.560.000,00	74,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.931.935,48	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.931.935,48	0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.151.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,52

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 51%
Meta Física Ejecutada %: 51%
Avance o Atraso Físico %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO	Km	45	8/05/2026	14/05/2026	Prog	23			23	51,11%
						Ejec	23			23	51,11%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14	5	2026
	(Día / Mes / Año)		


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias.
Roceria y desmonte manual: PR22+0500 al PR41+0000
Recoleccion de basura: PR35+0000 al PR45+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR00+0000 al PR45+0000
Desmonte manual: PR01+0000 al PR27+0000

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

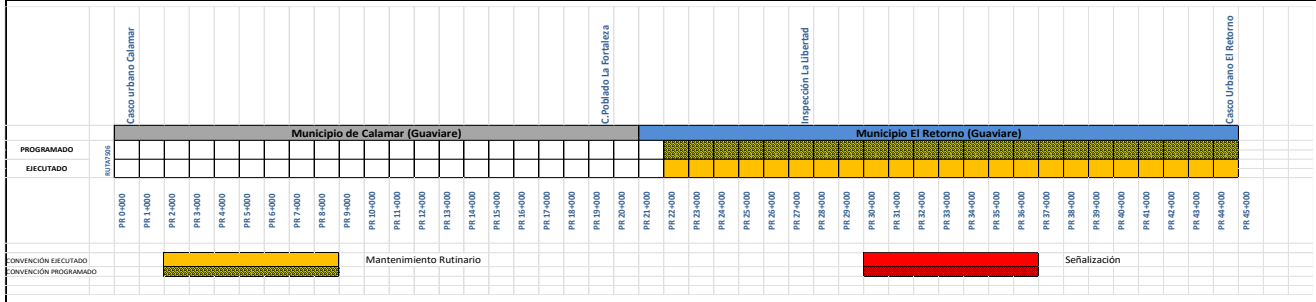

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR37+0000 AL PR41+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR37+0000 AL PR41+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR37+0000 AL PR41+0000 / RUTA 7506



ANTES - RECOLECCION DE BASURA PR35+0000 AL PR45+0000 / RUTA 7506



DURANTE - RECOLECCION DE BASURA PR35+0000 AL PR45+0000 / RUTA 7506



DESPUES - RECOLECCION DE BASURA PR35+0000 AL PR45+0000 / RUTA 7506



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR33+0000 AL PR37+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR33+0000 AL PR37+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR33+0000 AL PR37+0000 / RUTA 7506



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR27+0000 AL PR33+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR27+0000 AL PR33+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR27+0000 AL PR33+0000 / RUTA 7506

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14	5	2026
		(Día / Mes / Año)	



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR22+0500 AL PR27+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR22+0500 AL PR27+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR22+0500 AL PR27+0000 / RUTA 7506

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN** Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 116 del 8/05/2026 al 14/05/2026 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL META. SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600 / 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000), 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS - EMTRASERVIG SAS
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No. 1698 del 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE INICIO: 29/05/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No. 1965 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.546.490.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.251.489.397,85	80,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.251.489.397,85	80,92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.144.760.000,00	74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.959.032,26	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.959.032,26	0,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.294.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,51

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 33,33% — Avance o Atraso Físico %: 4,44%
Meta Física Ejecutada %: 37,78%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1 (6507)	Tramo y/o sector 2 (7506)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45,6	8/05/2026	14/05/2026	Prog	15,0			15	33,33%
					Ejec	17,0			17,0	37,78%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000),
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias, Rutas RN6507 y RN7506
Roceria y desmonte manual: PR51+0000 al PR66+0000 (RN7506)
Limpieza de bermas pavimentadas: PR00+0000 al PR00+0400 (RN6507)
Retiro de arbol caido: PR15+0850 (RN6507)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR45+0000 al PR73+0600 (RN7506) Y PR00+0000 al PR17+0000 (RN6507)
Roceria y desmonte manual: PR45+0000 al PR51+0000 (RN7506)
Instalacion de hitos viales: PR09+0850

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

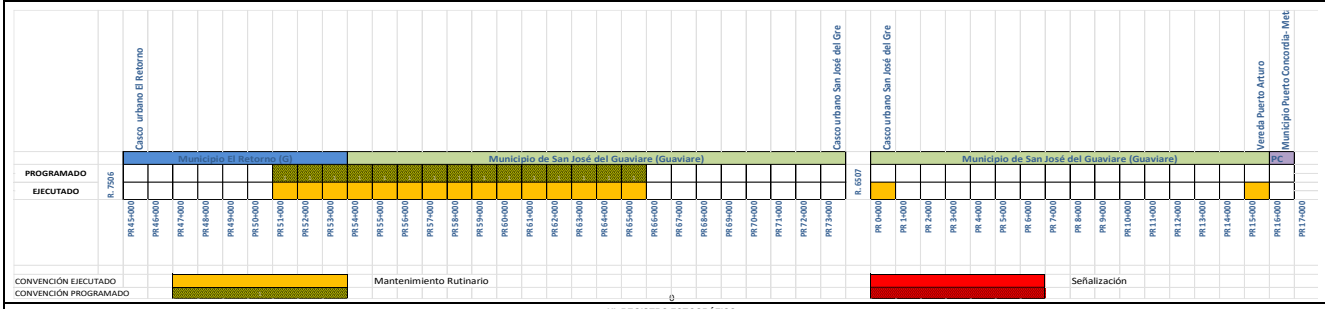

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS PR00+0000 AL PR00+0400 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS PR00+0000 AL PR00+0400 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS PR00+0000 AL PR00+0400 / RUTA 6507



ANTES - RETIRO DE ABROL CAIDO PR15+0850 / RUTA 6507



DURANTE - RETIRO DE ABROL CAIDO PR15+0850 / RUTA 6507



DESPUES - RETIRO DE ABROL CAIDO PR15+0850 / RUTA 6507



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR59+0000 AL PR63+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR59+0000 AL PR63+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR59+0000 AL PR63+0000 / RUTA 7506



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR55+0000 AL PR59+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR55+0000 AL PR59+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR55+0000 AL PR59+0000 / RUTA 7506

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14	5	2026
		(Día / Mes / Año)	



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR51+0000 AL PR55+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR51+0000 AL PR55+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR51+0000 AL PR55+0000 / RUTA 7506

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** FIRMA NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN** Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 14 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 116 del 8/05/2026 al 14/05/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000. LOTE 7.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA. – CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No. 1711 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.791.675.900,00
FECHA DE INICIO: 29/05/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.791.675.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No. 1965 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.505.610.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1.220.084.946,24 — 81,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.220.084.946,24 — 81,04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ 1.114.520.000,00 — 74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N.A — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: N.A — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: N.A — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N.A — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 12.615.806,45 — 0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 12.615.806,45 — 0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 66.485.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 641.183.876,20 — 15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 641.183.876,20 — 15,83%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,49
Acumulado:	0,53

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 4,44% — Avance o Atraso Físico %: 2,22%
Meta Física Ejecutada %: 6,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45	8/05/2026	14/05/2026	Prog	2			2	4,44%
					Ejec	3,0			3	6,67%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias rutas RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.
Desmonte manual: PR60+0000
Limpieza de bermas pavimentadas: PR26+0000 al PR27+0000
Demarcacion de linea central y de borde: PR26+0450 al PR27+0500
Instalacion de tachas retroreflectivas: PR26+0500 al PR27+0500

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias Ruta RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

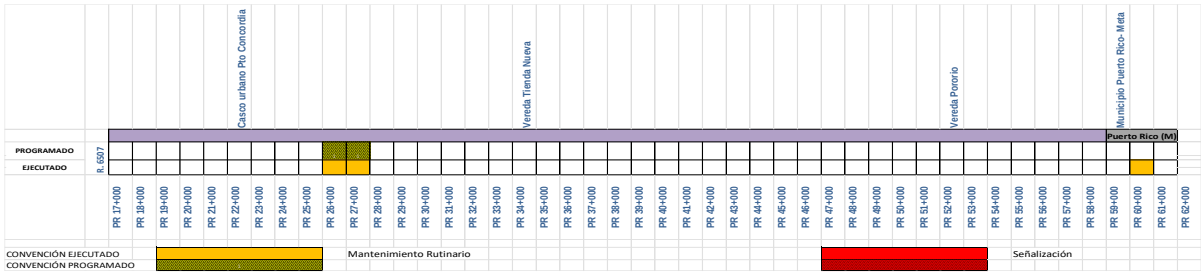

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - DESMONTE MANUAL Y PODA DE ARBOLES PR60+0000 / RUTA 6507



DURANTE - DESMONTE MANUAL Y PODA DE ARBOLES PR60+0000 / RUTA 6507



DESPUES - DESMONTE MANUAL Y PODA DE ARBOLES PR60+0000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS PR26+0000 AL PR27+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS PR26+0000 AL PR27+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS PR26+0000 AL PR27+0000 / RUTA 6507



ANTES - DEMARCACION DE LINEA CENTRAL Y BORDE PR26+0450 AL PR27+0500 / RUTA 6507



DURANTE - DEMARCACION DE LINEA CENTRAL Y BORDE PR26+0450 AL PR27+0500 / RUTA 6507



DESPUES - DEMARCACION DE LINEA CENTRAL Y BORDE PR26+0450 AL PR27+0500 / RUTA 6507



ANTES - INSTALACION DE TACHAS RETROREFLECTIVAS PR26+0500 AL PR27+0500 / RUTA 6507



DURANTE - INSTALACION DE TACHAS RETROREFLECTIVAS PR26+0500 AL PR27+0500 / RUTA 6507



DESPUES - INSTALACION DE TACHAS RETROREFLECTIVAS PR26+0500 AL PR27+0500 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **Ing. IVAN MAURICIO PEÑALOZA SUESCUN**
Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 115 del 8/05/2026 al 14/05/2026 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+0000 - PR 102+0600).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S.		
INTEGRANTES:		(N/A)	
CONTRATO No.	1740 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE INICIO:	1/06/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN		
INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%		
CONTRATO No.	1965 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	N.A
		VALOR AMORTIZADO:	N.A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.371.450.000,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.108.412.580,65	80,82%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.108.412.580,65	80,82%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.015.220.000,00	74,03%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.491.290,32	0,84%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.491.290,32	0,84%	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 60.559.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,63
Acumulado:	0,58

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30%
Meta Física Ejecutada %: 30%
Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	40,6	8/05/2026	14/05/2026	Prog	12			12	29,56%
					Ejec	12			12	29,56%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+000 - PR 102+0600).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias PR62+0000 al PR102+0600.

Recoleccion de basuras: PR92+0000 al PR102+0600


Limpieza de alcantarillas (17 unidades) y box culverts (37 unidades): PR91+0000 al PR102+0600

Limpieza de cunetas revestidas (24000 m): PR91+0000 al PR102+0600

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias: PR62+0000 al PR102+0600

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

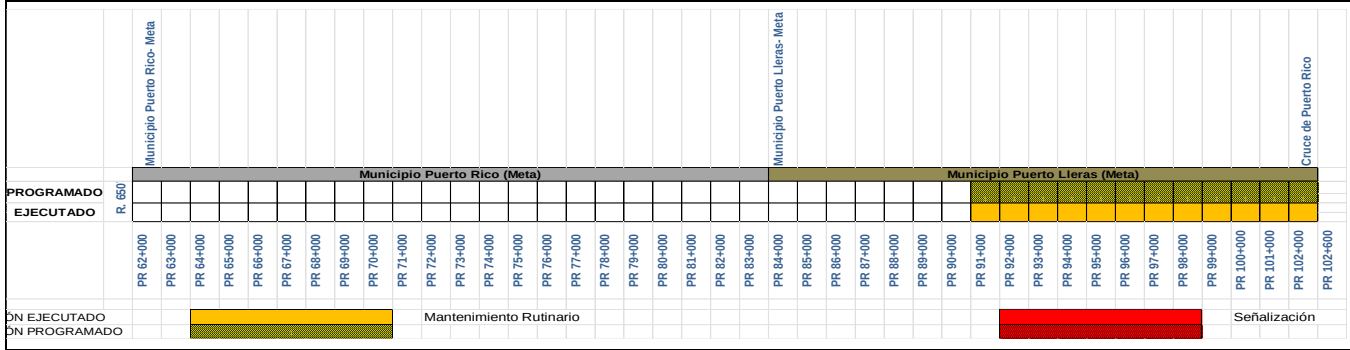

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - RECOLECCION DE BASURAS PR92+0000 AL PR102+0600 / RUTA 6507



DURANTE - RECOLECCION DE BASURAS PR92+0000 AL PR102+0600 / RUTA 6507



DESPUES - RECOLECCION DE BASURAS PR92+0000 AL PR102+0600 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT PR99+0000 AL PR102+0600 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT PR99+0000 AL PR102+0600 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT PR99+0000 AL PR102+0600 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT PR97+0000 AL PR99+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT PR97+0000 AL PR99+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT PR97+0000 AL PR99+0000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR94+0000 AL PR97+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR94+0000 AL PR97+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR94+0000 AL PR97+0000 / RUTA 6507

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14	5	2026
		(Día / Mes / Año)	



ANTES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR91+0000 AL PR94+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR91+0000 AL PR94+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR91+0000 AL PR94+0000 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN**

Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

p



CONSORCIO AMV CARFIN
NIT: 901.839.313-0

Informe Semanal No. 117
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Calle21 N 23-45 Barrio Bello Horizonte de San José Del Guaviare – Cel: 3164936102 - 3188692809
Email: consorcioamvcarfin@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 117 del 15/05/2026 al 21/05/2026. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. - EMANVIACOL LTDA	INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES:	(N/A)	INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No.	1705 del 2024	CONTRATO No.	1965 de 2024
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	FECHA DE INICIO:	5/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 1.936.705.500,00	VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.936.705.500,00	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ANTICIPO:	$	VALOR ANTICIPO:	N.A
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	N.A
SALDO POR AMORTIZAR:	$	SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.543.450.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.252.415.634,41	81,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.252.415.634,41	81,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.142.560.000,00	74,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.931.935,48	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.931.935,48	0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.151.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,51

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 58%
Meta Física Ejecutada %: 60%
Avance o Atraso Físico %: 2,22%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO	Km	45	15/05/2026	21/05/2026	Prog	26			26	57,78%
						Ejec	27			27	60,00%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias.
Roceria y desmonte manual: PR19+0000 al PR22+0500
Desmonte manual: PR00+0000 al PR27+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR00+0000 al PR45+0000
Desmonte manual: PR27+0000 al PR45+0000

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

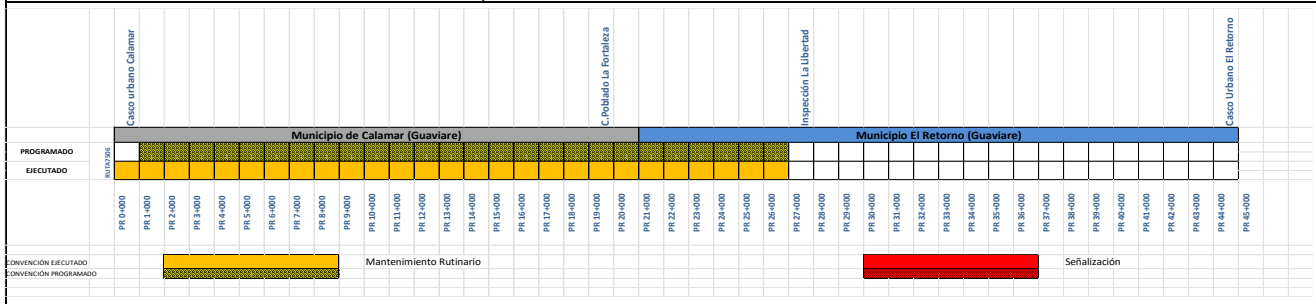

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR19+0000 AL PR22+0500 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR19+0000 AL PR22+0500 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR19+0000 AL PR22+0500 / RUTA 7506



ANTES - DESMONTE MANUAL PR00+0000 AL PR10+0000 / RUTA 7506



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR00+0000 AL PR10+0000 / RUTA 7506



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR00+0000 AL PR10+0000 / RUTA 7506



ANTES - DESMONTE MANUAL PR10+0000 AL PR18+0000 / RUTA 7506



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR10+0000 AL PR18+0000 / RUTA 7506



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR10+0000 AL PR18+0000 / RUTA 7506



ANTES - DESMONTE MANUAL PR18+0000 AL PR27+0000 / RUTA 7506



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR18+0000 AL PR27+0000 / RUTA 7506



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR18+0000 AL PR27+0000 / RUTA 7506

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula Profesional No.: 54202-164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 117 del 15/05/2026 al 21/05/2026 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL META. SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600 / 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000), 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS - EMTRASERVIG SAS
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No.: 1698 del 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE INICIO: 29/05/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No.: 1965 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.546.490.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.264.448.430,11	81,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.264.448.430,11	81,76%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.144.760.000,00	74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.959.032,26	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.959.032,26	0,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.294.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,51

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 15,56%
Meta Física Ejecutada %: 20,00%
Avance o Atraso Físico %: 4,44%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1 (6507)	Tramo y/o sector 2 (7506)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45,6	15/05/2026	21/05/2026	Prog	7,0			7	15,56%
					Ejec	9,0			9,0	20,00%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000),
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	21	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias, Rutas RN6507 y RN7506
Roceria y desmonte manual: PR45+0000 al PR51+0000 (RN7506)
Perforaciones (126 unidades) para instalacion de hitos: PR09+0564 al PR09+0676 (RN6507)
Recoleccion de basuras: PR06+0000 (RN6507)
Limpieza de barandas del Puente Nowen (120 m):PR16+0010 (RN6507)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR45+0000 al PR73+0600 (RN7506) Y PR00+0000 al PR17+0000 (RN6507)
Instalacion de hitos viales: PR09+0564 al PR09+0676 (RN6507)
Manteniemiento rutinario al Puente Nowen: PR16+0010 (RN6507)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

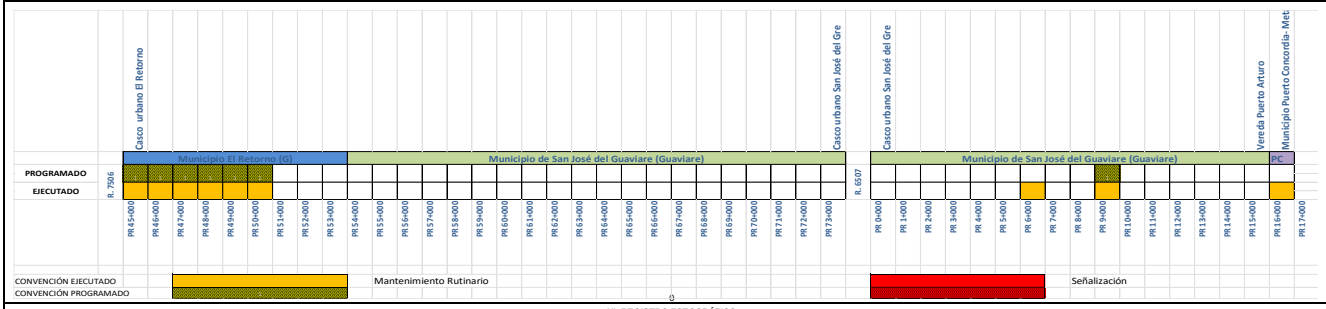

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR48+0000 AL PR51+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR48+0000 AL PR51+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR48+0000 AL PR51+0000 / RUTA 7506



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR45+0000 AL PR48+0000 / RUTA 7506



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR45+0000 AL PR48+0000 / RUTA 7506



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR45+0000 AL PR48+0000 / RUTA 7506



ANTES - PERFORACIONES PARA INSTALACION DE HITOS PR09+0564 AL PR09+0676 / RUTA 6507



DURANTE - PERFORACIONES PARA INSTALACION DE HITOS PR09+0564 AL PR09+0676 / RUTA 6507



DESPUES - PERFORACIONES PARA INSTALACION DE HITOS PR09+0564 AL PR09+0676 / RUTA 6507



ANTES - RECOLECCION DE BASURAS PR06+0000 / RUTA 6507



DURANTE - RECOLECCION DE BASURAS PR06+0000 / RUTA 6507



DESPUES - RECOLECCION DE BASURAS PR06+0000 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA FIRMA NOMBRE: Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN Matrícula Profesional No.: 54202-164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 117 del 15/05/2026 al 21/05/2026 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000. LOTE 7.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA. – CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No. 1711 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.791.675.900,00
FECHA DE INICIO: 29/05/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.791.675.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No. 1965 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.505.610.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1.232.700.752,69 — 81,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.232.700.752,69 — 81,87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ 1.114.520.000,00 — 74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N.A — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: N.A — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: N.A — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N.A — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 12.615.806,45 — 0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 12.615.806,45 — 0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 66.485.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 641.183.876,20 — 15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 641.183.876,20 — 15,83%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,49
Acumulado:	0,52

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 17,78%
Meta Física Ejecutada %: 17,78%
Avance o Atraso Físico %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45	15/05/2026	21/05/2026	Prog	8			8	17,78%
					Ejec	8,0			8	17,78%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias rutas RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.
Desmonte manual: PR54+0200 al PR56+0400
Limpieza de obras hidraulicas: PR19+0000 al PR22+0000
Perforaciones (63 unidades) para histacion de hitos viales: PR27+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias Ruta RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.
Instalacion de hitos viales PR27+0000

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

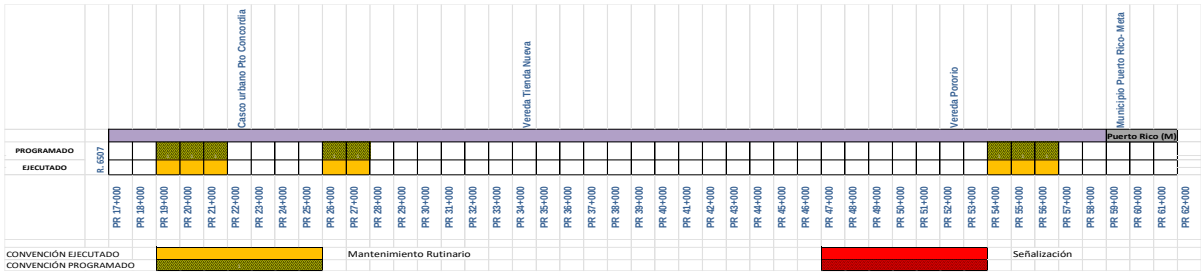

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - LIMPIEZA DE OBRAS HIDRAULICAS PR19+0000 AL PR22+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE OBRAS HIDRAULICAS PR19+0000 AL PR22+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE OBRAS HIDRAULICAS PR19+0000 AL PR22+0000 / RUTA 6507



ANTES - DESMONTE MANUAL PR56+0400 / RUTA 6507



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR56+0400 / RUTA 6507



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR56+0400 / RUTA 6507



ANTES - PERFORACIONES PARA INSTALACION DE HITOS PR27+0000 / RUTA 6507



DURANTE - PERFORACIONES PARA INSTALACION DE HITOS PR27+0000 / RUTA 6507



DESPUES - PERFORACIONES PARA INSTALACION DE HITOS PR27+0000 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: **Ing. IVAN MAURICIO PEÑALOZA SUESCUN**
Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 116 del 15/05/2026 al 21/05/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+0000 - PR 102+0600).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S.		
INTEGRANTES:		(N/A)	
CONTRATO No.	1740 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE INICIO:	1/06/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN		
INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%		
CONTRATO No.	1965 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	N.A
		VALOR AMORTIZADO:	N.A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.371.450.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.119.903.870,97	81,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.119.903.870,97	81,66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.015.220.000,00	74,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.491.290,32	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.491.290,32	0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 60.559.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,63
Acumulado:	0,57

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 32%
Meta Física Ejecutada %: 32%
Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	40,6	15/05/2026	21/05/2026	Prog	13			13	32,02%
					Ejec	13			13	32,02%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+000 - PR 102+0600).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias PR62+0000 al PR102+0600.


Limpieza de alcantarillas (34 unidades) y box culverts (49 unidades): PR62+0000 al PR73+0000 y PR89+0000 al PR91+0000

Limpieza de cunetas revestidas (24000 m): PR62+0000 al PR73+0000 y PR89+0000 al PR91+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias: PR62+0000 al PR102+0600

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

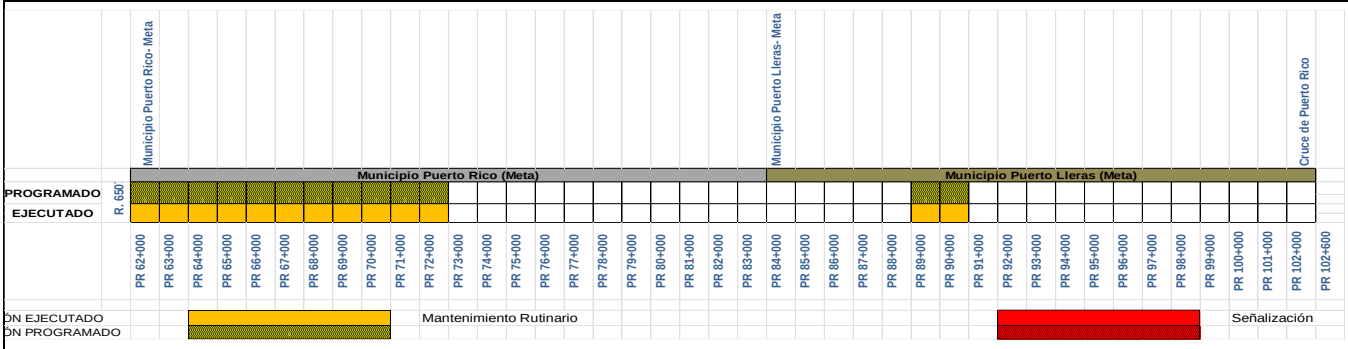

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR89+0000 AL PR91+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR89+0000 AL PR91+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR89+0000 AL PR91+0000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR62+0000 AL PR65+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR62+0000 AL PR65+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR62+0000 AL PR65+0000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR65+0000 AL PR70+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR65+0000 AL PR70+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR65+0000 AL PR70+0000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR70+0000 AL PR73+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR70+0000 AL PR73+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR70+0000 AL PR73+0000 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN**

Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

0



CONSORCIO AMV CARFIN
NIT: 901.839.313-0

Informe Semanal No. 118
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Calle21 N 23-45 Barrio Bello Horizonte de San José Del Guaviare – Cel: 3164936102 - 3188692809
Email: consorcioamvcarfin@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

SEMANA No.: 118 del 22/05/2026 al 28/05/2026. Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. - EMANVIACOL LTDA
INTEGRANTES:	(N/A)
CONTRATO No.	1705 del 2024
FECHA DE INICIO:	29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 1.936.705.500,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.936.705.500,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No.	1965 de 2024
FECHA DE INICIO:	5/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ANTICIPO:	N.A
VALOR AMORTIZADO:	N.A
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.543.450.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.265.347.569,89	81,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.265.347.569,89	81,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.142.560.000,00	74,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N.A	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.931.935,48	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.931.935,48	0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.151.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,51

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 31%
Meta Física Ejecutada %: 33%
Avance o Atraso Físico %: 2,22%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO	Km	45	22/05/2026	28/05/2026	Prog	14			14	31,11%
						Ejec	15			15	33,33%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	5	2026
		(Día / Mes / Año)	


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias.
Desmonte manual: PR27+0000 al PR41+0000
Despeje de derrumbe: PR42+0050 al PR42+0150
Limpieza de cuentas revestidas (1500m): PR41+0800 al PR45+0000
Asistencia a capacitacion SISO AMV: "Trabajo seguro en la via"

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR00+0000 al PR45+0000

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

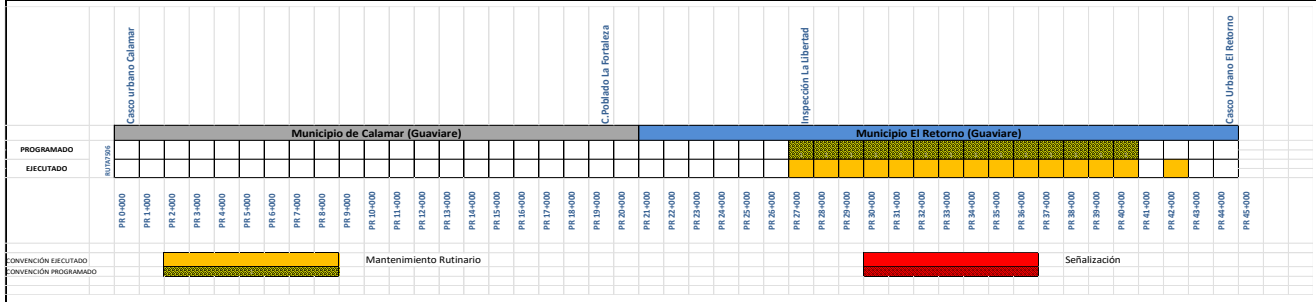

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



DURANTE - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



DESPUES - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



ANTES - DESPEJE DERRUMBE PR42+0050 AL PR42+0150 / RUTA 7506



DURANTE - DESPEJE DERRUMBE PR42+0050 AL PR42+0150 / RUTA 7506



DESPUES - DESPEJE DERRUMBE PR42+0050 AL PR42+0150 / RUTA 7506



ANTES - DESMONTE MANUAL PR31+0000 AL PR36+0150 / RUTA 7506



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR31+0000 AL PR36+0150 / RUTA 7506



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR31+0000 AL PR36+0150 / RUTA 7506



ANTES - DESMONTE MANUAL PR36+0150 AL PR37+0400 / RUTA 7506



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR36+0150 AL PR37+0400 / RUTA 7506



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR36+0150 AL PR37+0400 / RUTA 7506

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	5	2026
		(Día / Mes / Año)	



ANTES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR41+0800 AL PR45+0000 / RUTA 7506



DURANTE - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR41+0800 AL PR45+0000 / RUTA 7506



DESPUES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR41+0800 AL PR45+0000 / RUTA 7506

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN** Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 118 del 22/05/2026 al 28/05/2026. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL META. SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600 / 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000), 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS - EMTRASERVIG SAS
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No.: 1698 del 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE INICIO: 29/05/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No.: 1965 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.546.490.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.277.407.462,37	82,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.277.407.462,37	82,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.144.760.000,00	74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.959.032,26	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.959.032,26	0,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.294.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,50

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 37,78% — Avance o Atraso Físico %: 17,78%
Meta Física Ejecutada %: 55,56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1 (6507)	Tramo y/o sector 2 (7506)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45,6	22/05/2026	28/05/2026	Prog	17,0			17	37,78%
					Ejec	25,0			25,0	55,56%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000),
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias, Rutas RN6507 y RN7506
Instalacion de hitos viales (41 unidades): PR09+0564 al PR09+0676 (RN6507)
Recoleccion de basuras: PR07+0500 al PR17+0000 (RN6507)
Asistencia a capacitacion SISO AMV: "Trabajo seguro en la vía"

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR45+0000 al PR73+0600 (RN7506) Y PR00+0000 al PR17+0000 (RN6507)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

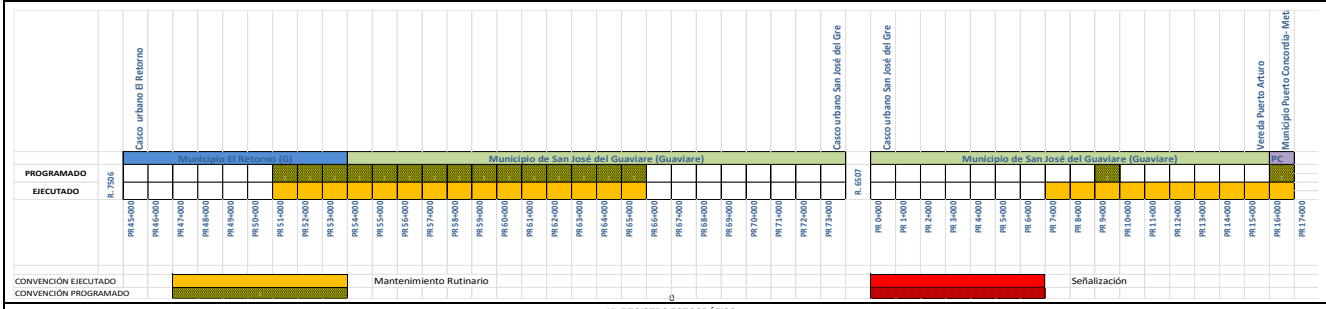

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



DURANTE - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



DESPUES - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



ANTES - INSTALACION DE HITOS VIALES PR09+0564 AL PR09+0676 / RUTA 6507



DURANTE - INSTALACION DE HITOS VIALES PR09+0564 AL PR09+0676 / RUTA 6507



DESPUES - INSTALACION DE HITOS VIALES PR09+0564 AL PR09+0676 / RUTA 6507



ANTES - RECOLECCION DE BASURAS PR12+0000 AL PR17+0000 / RUTA 6507



DURANTE - RECOLECCION DE BASURAS PR12+0000 AL PR17+0000 / RUTA 6507



DESPUES - RECOLECCION DE BASURAS PR12+0000 AL PR17+0000 / RUTA 6507



ANTES - RECOLECCION DE BASURAS PR10+0500 AL PR12+0000 / RUTA 6507



DURANTE - RECOLECCION DE BASURAS PR10+0500 AL PR12+0000 / RUTA 6507



DESPUES - RECOLECCION DE BASURAS PR10+0500 AL PR12+0000 / RUTA 6507

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	5	2026
		(Día / Mes / Año)	



ANTES - RECOLECCION DE BASURAS PR07+0500 AL PR10+0500 / RUTA 6507



DURANTE - RECOLECCION DE BASURAS PR07+0500 AL PR10+0500 / RUTA 6507



DESPUES - RECOLECCION DE BASURAS PR07+0500 AL PR10+0500 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN** Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 118 del 22/05/2026 al 28/05/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000. LOTE 7.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA. – CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No. 1711 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.791.675.900,00
FECHA DE INICIO: 29/05/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.791.675.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No. 1965 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.505.610.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1.245.316.559,14 — 82,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.245.316.559,14 — 82,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ 1.114.520.000,00 — 74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N.A — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: N.A — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: N.A — %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N.A — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 12.615.806,45 — 0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 12.615.806,45 — 0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 66.485.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,49
Acumulado:	0,51

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 641.183.876,20 — 15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 641.183.876,20 — 15,83%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 26,67%
Meta Física Ejecutada %: 26,67%
Avance o Atraso Físico %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45	22/05/2026	28/05/2026	Prog	12			12	26,67%
					Ejec	12,0			12	26,67%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	5	2026
		(Día / Mes / Año)	


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias rutas RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.
Roceria y desmonte manual: PR51+0000 al PR62+0000
Instalacion de hitos viales: PR27+0000
Asistencia a capacitacion SISO AMV: "Trabajo seguro en la vía"

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias Ruta RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

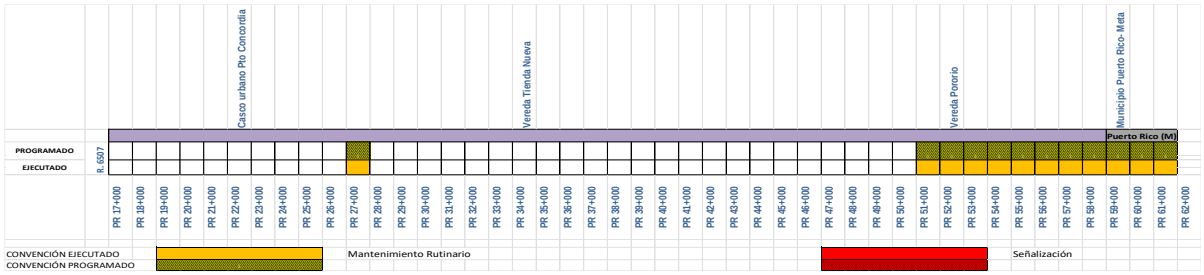

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



DURANTE - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



DESPUES - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR59+0000 AL PR62+0000 / RUTA 6507



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR59+0000 AL PR62+0000 / RUTA 6507



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR59+0000 AL PR62+0000 / RUTA 6507



ANTES - INSTALACION DE HITOS VIALES PR27+0000 / RUTA 6507



DURANTE - INSTALACION DE HITOS VIALES PR27+0000 / RUTA 6507



DESPUES - INSTALACION DE HITOS VIALES PR27+0000 / RUTA 6507



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR55+0000 AL PR59+0000 / RUTA 6507



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR55+0000 AL PR59+0000 / RUTA 6507



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR55+0000 AL PR59+0000 / RUTA 6507

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	5	2026
		(Día / Mes / Año)	



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PRS1+0000 AL PR55+0000 / RUTA 6507



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PRS1+0000 AL PR55+0000 / RUTA 6507



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PRS1+0000 AL PR55+0000 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: **Ing. IVAN MAURICIO PEÑALOZA SUESCUN** Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 117 del 22/05/2026 al 28/05/2026 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+0000 - PR 102+0600).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S.		
INTEGRANTES:	(N/A)		
CONTRATO No.	1740 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE INICIO:	1/06/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN		
INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%		
CONTRATO No.	1965 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	N.A
		VALOR AMORTIZADO:	N.A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.371.450.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.131.395.161,29	82,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.131.395.161,29	82,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.015.220.000,00	74,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.491.290,32	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.491.290,32	0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 60.559.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,63
Acumulado:	0,57

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 22%
Meta Física Ejecutada %: 22%
Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	40,6	22/05/2026	28/05/2026	Prog	9			9	22,17%
					Ejec	9			9	22,17%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+000 - PR 102+0600).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	5	2026
		(Día / Mes / Año)	


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias PR62+0000 al PR102+0600.
Limpieza de alcantarillas (36 unidades) y box culverts (18 unidades): PR73+0000 al PR82+0000
Limpieza de cunetas revestidas (160000m): PR73+0000 al PR82+0000
Asistencia a capacitacion SISO AMV: "Trabajo seguro en la via"

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias: PR62+0000 al PR102+0600

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

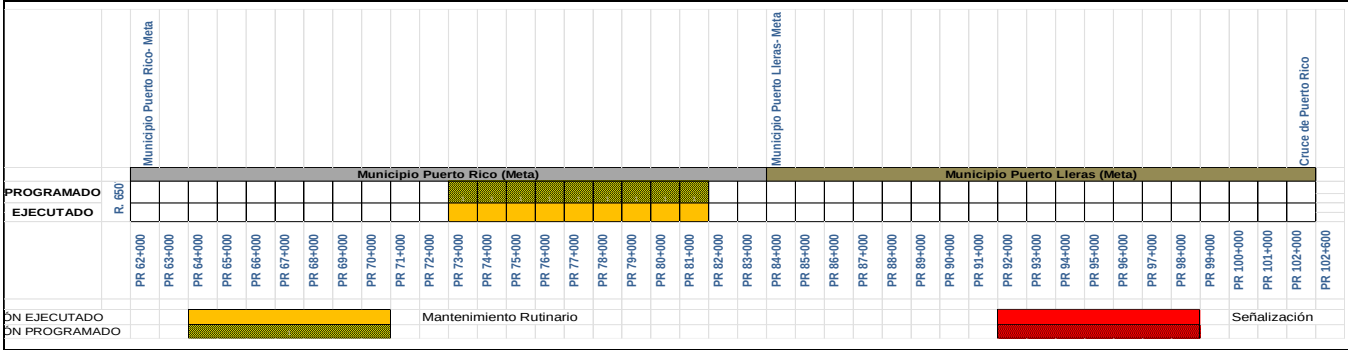

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



DURANTE - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



DESPUES - ASISTENCIA A CAPACITACION SISO AMV: "TRABAJO SEGURO EN LA VIA"



ANTES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR73+0000 AL PR75+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR73+0000 AL PR75+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR73+0000 AL PR75+0000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR75+0000 AL PR77+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR75+0000 AL PR77+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR75+0000 AL PR77+0000 / RUTA 6507



ANTES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR77+0000 AL PR79+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR77+0000 AL PR79+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR77+0000 AL PR79+0000 / RUTA 6507

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	5	2026
		(Día / Mes / Año)	



ANTES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR79+0000 AL PR82+0000 / RUTA 6507



DURANTE - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR79+0000 AL PR82+0000 / RUTA 6507



DESPUES - LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR79+0000 AL PR82+0000 / RUTA 6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** FIRMA NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN** Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

p



CONSORCIO AMV CARFIN
NIT: 901.839.313-0

Informe Semanal No. 119
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Calle21 N 23-45 Barrio Bello Horizonte de San José Del Guaviare – Cel: 3164936102 - 3188692809
Email: consorcioamvcarfin@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 119 del 29/05/2026 al 31/05/2026. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. - EMANVIACOL LTDA	INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES:	(N/A)	INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No.	1705 del 2024	CONTRATO No.	1965 de 2024
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	FECHA DE INICIO:	5/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 1.936.705.500,00	VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.936.705.500,00	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	N.A
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	N.A
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 595.238.000	$ 764.408.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.543.450.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.270.889.627,96	82,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.270.889.627,96	82,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.142.560.000,00	74,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.542.258,06	0,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.542.258,06	0,36%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.151.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,50

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 9%
Meta Física Ejecutada %: 9%
Avance o Atraso Físico %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO	Km	45	29/05/2026	31/05/2026	Prog	4			4	8,89%
						Ejec	4			4	8,89%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ENTRE EL PR 00+000-45+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias.
Desmonte manual: PR41+0000 al PR45+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR00+0000 al PR45+0000

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

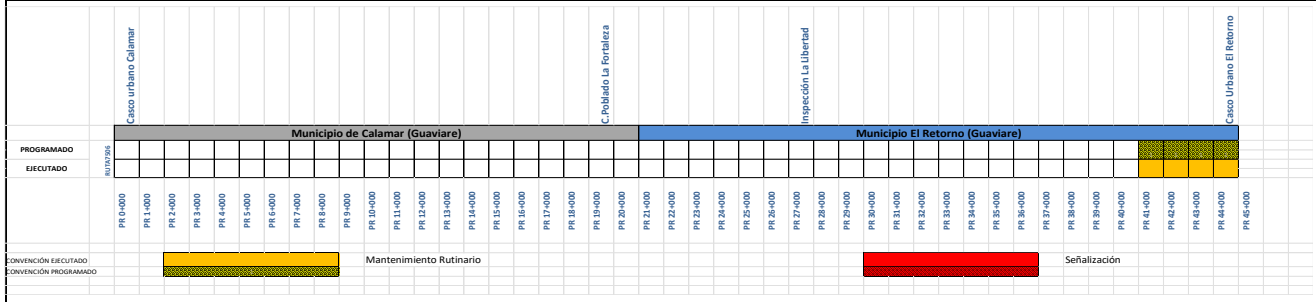

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - DESMONTE MANUAL PR41+0000 AL PR45+0000 R7506



DURANTE - DESMONTE MANUAL PR41+0000 AL PR45+0000 R7506



DESPUES - DESMONTE MANUAL PR41+0000 AL PR45+0000 R7506

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula Profesional No.: 54202-164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 119 del 29/05/2026 al 31/05/2026 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL META. SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600 / 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000), 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS - EMTRASERVIG SAS
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No. 1698 del 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE INICIO: 29/05/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.840.323.100,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN
INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%
CONTRATO No. 1965 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 596.428.000	$ 765.836.400
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.546.490.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.282.961.333,33	82,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.282.961.333,33	82,96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.144.760.000,00	74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.553.870,97	0,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.553.870,97	0,36%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 68.294.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,45
Acumulado:	0,50

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 4,44% — Avance o Atraso Físico %: 0,00%
Meta Física Ejecutada %: 4,44%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1 (6507)	Tramo y/o sector 2 (7506)	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45,6	29/05/2026	31/05/2026	Prog	2,0			2	4,44%
					Ejec	2,0			2,0	4,44%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 00+000 - PR 17+000),
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 7506 CALAMAR-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (PR 45+000 - PR73+600)
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias, Rutas RN6507 y RN7506

Reubicacion y aplome de señales verticales (6 unidades): PR01+0100 al PR01+0950 (RN6507) y PR46+0500 al PR46+0700 (RN7506)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias del PR45+0000 al PR73+0600 (RN7506) Y PR00+0000 al PR17+0000 (RN6507)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

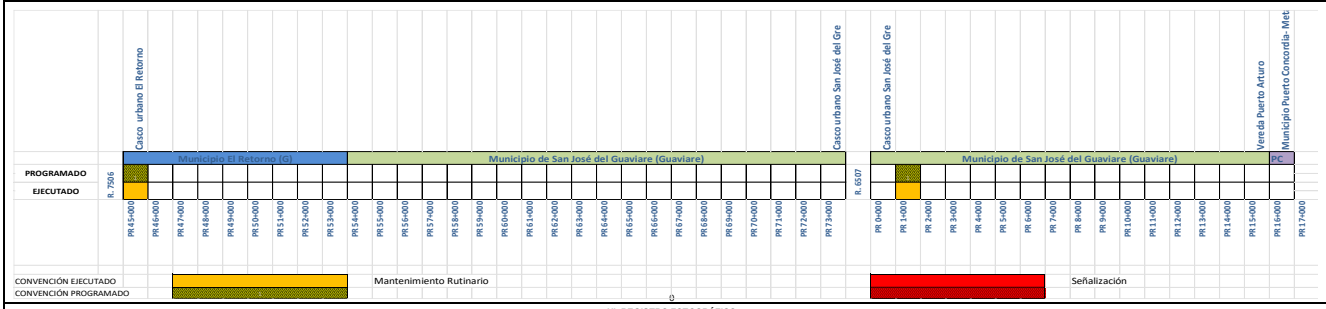

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - REUBICACION Y APLOME DE SEÑALES PR01+0100 AL PR01+0950 R6507



DURANTE - REUBICACION Y APLOME DE SEÑALES PR01+0100 AL PR01+0950 R6507



DESPUES - REUBICACION Y APLOME DE SEÑALES PR01+0100 AL PR01+0950 R6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
	Matrícula Profesional No.: 54202-164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

SEMANA No.: 119 del 29/05/2026 al 31/05/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000. LOTE 7.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA. – CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA

INTEGRANTES: (N/A)

CONTRATO No. 1711 de 2024

FECHA DE INICIO: 29/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

VALOR INICIAL: $ 1.791.675.900,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 1.791.675.900,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

INTEGRANTES: CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%

CONTRATO No. 1965 de 2024

FECHA DE INICIO: 5/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00

VALOR ANTICIPO: N.A

VALOR AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 580.720.000	$ 745.558.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.505.610.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1.250.723.333,33 83,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.250.723.333,33 83,07%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ 1.114.520.000,00 74,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: N.A %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: N.A %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: N.A %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: N.A %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 5.406.774,19 0,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 5.406.774,19 0,36%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 66.485.300,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 641.183.876,20 15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 641.183.876,20 15,83%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,49
Acumulado:	0,51

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 8,89%
Meta Física Ejecutada % 8,89%
Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	45	29/05/2026	31/05/2026	Prog	4			4	8,89%
					Ejec	4,0			4	8,89%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 17+000 - PR 62+000).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias rutas RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.
Roceria y desmonte manual: PR47+0000 al PR51+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias Ruta RN6507 PR17+0000 al PR62+0000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

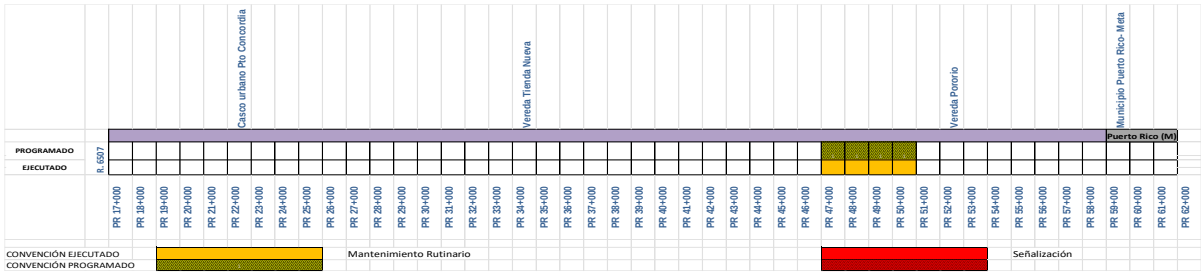

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR47+0000 AL PR51+0000 RN6507



DURANTE - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR47+0000 AL PR51+0000 RN6507



DESPUES - ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR47+0000 AL PR51+0000 RN6507

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: **Ing. IVAN MAURICIO PEÑALOZA SUESCUN**
Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 118 del 29/05/2026 al 31/05/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+0000 - PR 102+0600).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE INTEGRALMENTE PRETENDEN MANTENER, RECUPERAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO VIAL RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD Y OPERACIÓN DEL TRANSITO EN LA VÍA. LAS LABORES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SON TODAS DE CARÁCTER MANUAL, INCLUYENDO LA REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES QUE PUDIERAN PRESENTARSE Y DEBERÁN GARANTIZAR QUE SE REMUEVA DE MANERA MANUAL TODO AQUEL MATERIAL QUE NO SEA CONVENIENTE PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LOS CORREDORES VIALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S.		
INTEGRANTES:		(N/A)	
CONTRATO No.	1740 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE INICIO:	1/06/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.632.025.500,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO AMV CARFIN		
INTEGRANTES:	CARLOS ANGEL PEREA 50%, INARGOS SAS 25% Y FERDINCO SAS 25%		
CONTRATO No.	1965 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.284.952,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	N.A
		VALOR AMORTIZADO:	N.A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 528.955.000	$ 679.156.800
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.046.468.204	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ (641.183.876)	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.371.450.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.136.320.000,00	82,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.136.320.000,00	82,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.015.220.000,00	74,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N.A	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N.A	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N.A	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.924.838,71	0,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.924.838,71	0,36%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 60.559.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 641.183.876,20	15,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Abril de 2026
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 ABRIL DE 2026
VALOR FACTURA: $ 98.830.018,84

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,63
Acumulado:	0,56

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 7%
Meta Física Ejecutada %: 7%
Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM	40,6	29/05/2026	31/05/2026	Prog	3			3	7,39%
					Ejec	3			3	7,39%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- CRUCE PUERTO RICO (PR 62+000 - PR 102+0600).
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	11
Camioneta	0,00	1
Total		12

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: N/A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES/A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Disponibilidad de personal para vigilancia, atención de accidentes y emergencias PR62+0000 al PR102+0600.


Limpieza de alcantarillas (8 unidades) y box culverts (9 unidades): PR82+0000 al PR85+0000

Limpieza de cunetas revestidas (1000 m): PR82+0000 al PR85+0000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Disponibilidad para atención de accidentes y emergencias: PR62+0000 al PR102+0600

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

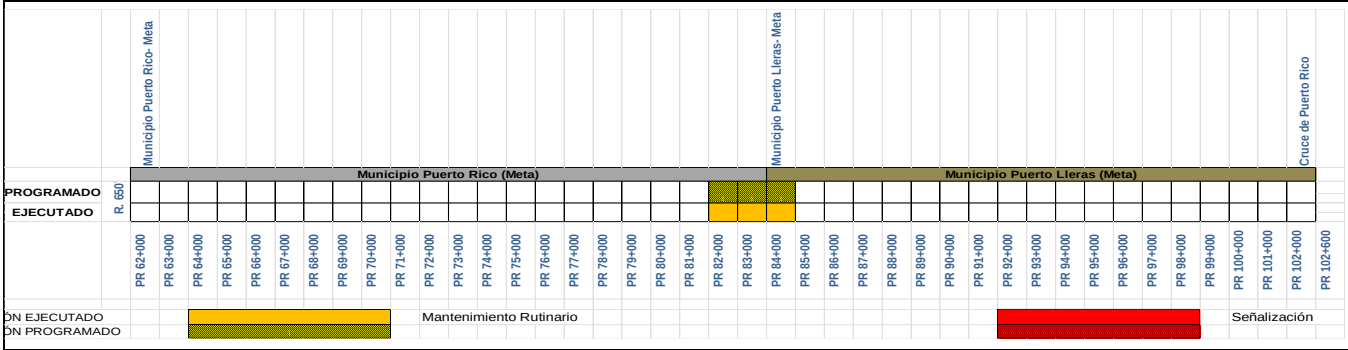

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR82+0000 AL PR85+0000



DURANTE - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR82+0000 AL PR85+0000



DESPUES - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS PR82+0000 AL PR85+0000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **Ing. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN**

Matrícula Profesional No.: **54202-164359 NTS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

ANEXO 3

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Registro MEPI-MN1-ION-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.

CONTRATO No. 1705 **DE** 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. – EMANVIACOL LTDA.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1965 de 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO AMV CARFIN

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES MAYO DE 2026																													
DESCRIPCION	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	SHINDAIWA/2019			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
CAMIONETA	LUV D MAX /2011			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
HERRAMIENTAS MENORES				A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
TOTAL ACTIVO				**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**
TOTAL EN REPARACIÓN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL INACTIVO				**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	403	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	273	68%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	130	32%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Nilson Rodrigo S.

Nombre: NILSON RODRIGO SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal
C.C. No. 97.612.185 de San José del Guaviare
Contratista

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.

CONTRATO No. 1698 **DE** 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – EMTRASERVIG SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1965 de 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO AMV CARFIN

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES MAYO DE 2026																													
DESCRIPCION	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	SHINDAIWA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	SHINDAIWA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
CAMIONETA	NISSAN NP 300/2012			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
HERRAMIENTAS MENORES				A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
TOTAL ACTIVO				**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**
TOTAL EN REPARACIÓN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL INACTIVO				**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	403	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	273	68%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	130	32%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

JHON LOAIZA

JHON ALEXANDER LOAIZA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL - EMTRASERVIG SAS
C.C. No. 6.429.420 de Riofrio – Valle
Contratista

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000

CONTRATO No. 1711 **DE** 2024 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA - CONSTRUCAMINOS LTDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1965 de 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO AMV CAREFIN

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES MAYO DE 2026																													
DESCRIPCION	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
CAMIONETA	JAC/2016			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
HERRAMIENTAS MENORES				A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
TOTAL ACTIVO				**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**
TOTAL EN REPARACIÓN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL INACTIVO				**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	403	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	273	68%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	130	32%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: NÉSTOR BETANCOURT BETANCOURT
Representante Legal
C.C. No. 17.331.334 de Medina (C/marca)
Contratista

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.

CONTRATO No. 1740 **DE** 2024 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S. - TRIUNFO VIAL S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1965 de 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO AMV CARFIN

MAQUINARIA Y EQUIPO				DIAS DEL MES MAYO DE 2026																														
DESCRIPCION	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	HUSQVARNA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
GUADAÑAS	SHINDAIWA/2020			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
CAMIONETA	NISSAN D22/2008			A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
HERRAMIENTAS MENORES				A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
TOTAL ACTIVO				**12**	**0**	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**
TOTAL EN REPARACIÓN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL INACTIVO				**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	372	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	252	68%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	120	32%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

RUBEN AVILA

Nombre: RUBÉN AVILA
Representante Legal
C.C. No. 9.620.232
Contratista

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 4

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Registro MEPI-MN1-ION-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1705 **DE** 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. – EMANVIACOL LTDA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMCAJA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	C.C.	CARGO	SALARIO	DIAS	DIAS DEL MES MAYO DE 2026																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
MORA ROSO OSNEIDER ANDRES	1.006.783.231	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS CM	**6021663069**	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
MONTOYA MOTATO JOHANA ANDREA	1.122.237.358	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS CM	6021663069	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
QUINTERO CHIVATA DEIMER ALEXANDER	1.122.237.667	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
ACOSTA GOMEZ JESUS ANTONIO	17.386.389	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
CUBIDES ALFONSO JAIME WILLIAM	18.235.516	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
AVILA DAZA JOSE DEL CARMEN	18.235.769	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
QUINTERO AREVALO JOSE ARTURO	18.235.847	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
PEÑA DIAZ VALERIANO	18.236.122	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
PEÑA ARDILA JUVERNEL	5.771.739	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 61.000	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	INCAPACIDAD ENFE
GORDILLO CUESTA PABLO ENRIQUE	7.334.056	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
AVILA CARDENAS CARLOS ARMANDO	79.858.716	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 36.600	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
SANCHEZ HUERTAS NILSON RODRIGO	97.612.185	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 73.200	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	231001-COLFONDOS	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	VACACIONES
MUENTES PUCHE PEDRO JUAN	98.652.208	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMANVIACOL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663069	$ 70.100	231001-COLFONDOS	6021663069	$ 280.200	$ 70.100	0	0	

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Nilson Rodrigo S.

Nombre: NILSON RODRIGO SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal
C.C. No. 97.612.185 de San José del Guaviare
Contratista

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matricula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1698 **DE** 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – EMTRASERVIG SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMCAJA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	C.C.	CARGO	SALARIO	DIAS	DIAS DEL MES MAYO DE 2026																																			Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
ROMERO RODRIGUEZ WEIMAR	1.006.702.402	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS CM	6021663751	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
LADINO PINO LUZ ANDREA	1.122.237.695	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	230201-PROTECCION	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
RAMIREZ CARRILLO JAVIER	17.265.733	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	230201-PROTECCION	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
SANCHEZ RICARDO ALFREDO	17.266.596	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
NIÑO SUAREZ YOVANNI	18.235.711	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
LOAIZA HERNANDEZ JHON ALEXANDER	6.429.420	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
LEON GUTIERREZ EUDES DE JESUS	6.433.260	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
RIOS SANCHEZ JHON JAIRO	86.030.463	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
SANCHEZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO	97.611.514	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
NIÑO MONTENEGRO LIBARDO	97.613.957	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS CM	6021663751	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
JARAMILLO MONTOYA JOSE JAIR	9.765.046	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
BUITRAGO GARCIA ALEJANDRO	9.817.459	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EMTRASERVIG	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021663751	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021663751	$ 280.200	$ 70.100	0	0	

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

JHON LOAIZA

JHON ALEXANDER LOAIZA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL - EMTRASERVIG SAS
C.C. No. 6.429.420 de Riofrio – Valle
Contratista

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1711 **DE** 2024
CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA - CONSTRUCAMINOS LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026
PROYECTO: SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1965 de 2024
INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMCAJA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	C.C.	CARGO	SALARIO	DIAS	DIAS DEL MES MAYO DE 2026																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
SANCHEZ CASTRILLON ALEXIS	1.007.512.160	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
CRUZ HELVER HERNANDO	1.118.166.168	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
ALARCON PULIDO FIDELINO	1.119.180.327	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
GUTIERREZ MARTINEZ DENNIS ESPERANZA	1.120.925.229	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
PERILLA GUZMAN EYDER	1.121.820.840	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
SANCHEZ SALGADO ALIRIO	17.265.593	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
GUTIERREZ CONTRERAS JOSE BENJAMIN	17.314.165	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
BETANCOURT BETANCOURT NESTOR	17.331.334	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
RIVERA RANGEL RODRIGO	17.389.634	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
BARRAGAN JESUS MEDARDO	18.221.443	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	230301-PORVENIR	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
SANCHEZ MARTINEZ CARLOS ARTURO	18.222.900	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
MENDOZA GUZMAN EDINSO GREGORIO	78.299.946	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCAMINOS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	6021676535	$ 70.100	25-14 COLPENSIONES	6021676535	$ 280.200	$ 70.100	0	0	

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: NESTOR BETANCOURT BETANCOURT
Representante Legal
C.C. No. 17.331.334 de Medina (C/marca)
Contratista

Firma
Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1740 **DE** 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S. - TRIUNFO VIAL S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM META

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	C.C.	CARGO	SALARIO	DIAS	DIAS DEL MES MAYO DE 2026																																			Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
LOZANO GUTIERREZ CESAR FABIAN	1.006.737.925	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2331785324	$ 70.100	230301-PORVENIR	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
PRECIADO MORENO FERNEY	1.006.903.379	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2331785324	$ 70.100	230301-PORVENIR	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
MORENO SOLER JORGE IVAN	1.099.546.056	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS CM	2331785324	$ 70.100	230301-PORVENIR	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
MONTOYA GALLEGO CARLOS ALBERTO	1.120.357.612	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SALUD TOTAL	2331785324	$ 70.100	230301-PORVENIR	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
CARDONA RAMIREZ WALTER ESNEIDER	1.121.416.851	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS CM	2331785324	$ 70.100	230301-PORVENIR	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
MARROQUIN BOLAÑOS CRISTIAN DAVID	1.121.417.416	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	CCFC55 CAJACOPI	2331785324	$ 70.100	230301-PORVENIR	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
POLANCO SANCHEZ DIEGO FERNANDO	1.121.419.585	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 61.000	V	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2331785324	$ 70.100	230301-PORVENIR	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	INCAPACIDAD ENFE
LARRAHONDO JHON FAVER	17.265.673	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 52.900	V	EPS037-NUEVA EPS	2331785324	$ 70.100	COLPENSI	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	VACACIONES
GALINDO MIRANDA JOSE IVAN	17.353.476	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	2331785324	$ 70.100	COLPENSI	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
ZAMORA HUERTAS MARTHA JANETH	52.468.396	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS037-NUEVA EPS	2331785324	$ 70.100	230201-PROTECCION	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	
AVILA RUBEN	9.620.232	SOCIO	1.750.905	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TRIUNFO VIAL	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EPS002-SALUD TOTAL	2331785324	$ 70.100	COLPENSI	2331785324	$ 280.200	$ 70.100	0	0	

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Ruben Avila

Nombre: RUBÉN AVILA
Representante Legal
C.C. No. 9.620.232
Contratista

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 5

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Registro MEPI-MN1-ION-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1 6 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1705 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. – EMANVIACOL LTDA.

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439424	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	595.238.000,00	$ -
2025	178625	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	764.408.400,00	$ -
2026	348826	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	477.059.100,00	$ 379.057.046,66
				TOTAL		$ 1.836.705.500,00	$ 379.057.046,66

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.836.705.500,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
						2024									
1	ACTA 1	MAYO - JUNIO 2024	$ 50.020.000,00	$ 9.503.800,00	$ 59.523.800,00	$ -	$ 59.523.800,00	$ -		$ 535.714.200,00	$ 1.777.181.700,00		X		
2	ACTA 2	29 -30 JUNIO 2024	$ 3.334.666,67	$ 633.586,67	$ 3.968.253,34	$ -	$ 3.968.253,34	$ -		$ 531.745.946,66	$ 1.773.213.446,66		X		
3	ACTA 3	JULIO 2024	$ 50.020.000,00	$ 9.503.800,00	$ 59.523.800,00	$ -	$ 59.523.800,00	$ -		$ 472.222.146,66	$ 1.713.689.646,66		X		
4	ACTA 4	AGOSTO 2024	$ 50.020.000,00	$ 9.503.800,00	$ 59.523.800,00	$ -	$ 59.523.800,00	$ -		$ 412.698.346,66	$ 1.654.165.846,66		X		
4	ACTA 5	SEPTIEMBRE 2024	$ 50.020.000,00	$ 9.503.800,00	$ 59.523.800,00	$ -	$ 59.523.800,00	$ -	439424	$ 353.174.546,66	$ 1.594.642.046,66		X		
4	ACTA 6	OCTUBRE 2024	$ 50.020.000,00	$ 9.503.800,00	$ 59.523.800,00	$ -	$ 59.523.800,00	$ -		$ 293.650.746,66	$ 1.535.118.246,66		X		
7	ACTA 7	NOVIEMBRE 2024	$ 50.020.000,00	$ 9.503.800,00	$ 59.523.800,00	$ -	$ 59.523.800,00	$ -		$ 234.126.946,66	$ 1.475.594.446,66		X		
8	ACTA 8	DICIEMBRE 2024	$ 50.020.000,00	$ 9.503.800,00	$ 59.523.800,00	$ -	$ 59.523.800,00	$ -		$ 174.603.146,66	$ 1.416.070.646,66		X		
						2025							X		
9	ACTA 9	ENERO 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -	439424	$ 110.902.446,66	$ 1.352.369.946,66		X		
10	ACTA 10	FEBRERO 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -		$ 47.201.746,66	$ 1.288.669.246,66		X		
11	ACTA 11	MARZO 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -	439424 - 178625	$ 747.909.446,66	$ 1.224.968.546,66		X		
12	ACTA 12	ABRIL 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -		$ 684.208.746,66	$ 1.161.267.846,66		X		
13	ACTA 13	MAYO 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -	178625	$ 620.508.046,66	$ 1.097.567.146,66		X		
14	ACTA 14	JUNIO 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -		$ 556.807.346,66	$ 1.033.866.446,66		X		
15	ACTA 15	1 al 31 de julio de 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -		$ 493.106.646,66	$ 970.165.746,66		X		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **1 6 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1705 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. – EMANVIACOL LTDA.

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439424	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	595.238.000,00	$ -
2025	178625	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	764.408.400,00	$ -
2026	348826	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	477.059.100,00	$ 379.057.046,66
				TOTAL		$ 1.836.705.500,00	$ 379.057.046,66

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.836.705.500,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

16	ACTA 16	1 al 31 de agosto de 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -		$ 429.405.946,66	$ 906.465.046,66		X		
17	ACTA 17	1 al 30 de septiembre de 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -		$ 365.705.246,66	$ 842.764.346,66		X		
18	ACTA 18	1 al 31 de octubre de 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -	178625	$ 302.004.546,66	$ 779.063.646,66		X		
19	ACTA 19	1 a 30 noviembre de 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -		$ 238.303.846,66	$ 715.362.946,66		X		
20	ACTA 20	1 al 31 de diciembre de 2025	$ 53.530.000,00	$ 10.170.700,00	$ 63.700.700,00	$ -	$ 63.700.700,00	$ -		$ 174.603.146,66	$ 651.662.246,66		X		
21	ACTA 21	1 al 31 de enero de 2026	$ 57.270.000,00	$ 10.881.300,00	$ 68.151.300,00	$ -	$ 68.151.300,00	$ -		$ 106.451.846,66	$ 583.510.946,66		X		
22	ACTA 22	1 al 28 de febrero de 2026	$ 57.270.000,00	$ 10.881.300,00	$ 68.151.300,00	$ -	$ 68.151.300,00	$ -		$ 38.300.546,66	$ 515.359.646,66		X		
23	ACTA 23	1 al 31 de marzo de 2026	$ 57.270.000,00	$ 10.881.300,00	$ 68.151.300,00	$ -	$ 68.151.300,00	$ -	178625 - 348826	$ 447.208.346,66	$ 447.208.346,66				Registro 178625 por: $38'300.546,66 Registro 348826 por: $29'850.753,34
24	ACTA 24	1 al 30 de abril de 2026	$ 57.270.000,00	$ 10.881.300,00	$ 68.151.300,00	$ -	$ 68.151.300,00	$ -	348826	$ 379.057.046,66	$ 379.057.046,66				
25	ACTA 25	1 al 31 de mayo de 2026	$ 57.270.000,00	$ 10.881.300,00	$ 68.151.300,00	$ -	$ 68.151.300,00	$ -		$ 2.147.611.246,66	$ 310.905.746,66				
TOTALES			**$ 1.282.184.666,67**	**$ 243.615.086,67**	**$ 1.525.799.753,34**	**$ -**	**$ 1.525.799.753,34**	**$ -**		**$ 2.147.611.246,66**	**$ 310.905.746,66**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-8 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: **1 6 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1705 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. – EMANVIACOL LTDA.

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439424	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	595.238.000,00	$ -
2025	178625	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	764.408.400,00	$ -
2026	348826	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	477.059.100,00	$ 379.057.046,66
TOTAL						$ 1.836.705.500,00	$ 379.057.046,66

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.836.705.500,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.282.184.666,67	$ 243.615.086,67	**$ 1.525.799.753,34**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	**N/A**
AJUSTES	N/A	N/A	**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
VALOR TOTAL	$ 1.282.184.666,67	$ 243.615.086,67	**$ 1.525.799.753,34**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Nilson Rodrigo S.

Nombre: NILSON RODRIGO SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal
C.C. No. 97.612.185 de San José del Guaviare
Contratista

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1 6 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1698 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – EMTRASERVIG SAS

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439524	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	596.428.000,00	$ -
2025	189125	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	765.836.400,00	$ -
2026	432126	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	478.058.700,00	$ 379.550.500,00
				TOTAL		$ 1.840.323.100,00	$ 379.550.500,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.840.323.100,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
						2024									
1	ACTA 1	MAYO - JUNIO 2024	$ 50.120.000,00	$ 9.522.800,00	$ 59.642.800,00	$ -	$ 59.642.800,00	$ -		$ 536.785.200,00	$ 1.780.680.300,00		X		
2	ACTA 2	29 -30 JUNIO 2024	$ 3.580.000,00	$ 680.200,00	$ 4.260.200,00	$ -	$ 4.260.200,00	$ -		$ 532.525.000,00	$ 1.776.420.100,00		X		
3	ACTA 3	JULIO 2024	$ 50.120.000,00	$ 9.522.800,00	$ 59.642.800,00	$ -	$ 59.642.800,00	$ -		$ 472.882.200,00	$ 1.716.777.300,00		X		
4	ACTA 4	AGOSTO 2024	$ 50.120.000,00	$ 9.522.800,00	$ 59.642.800,00	$ -	$ 59.642.800,00	$ -		$ 413.239.400,00	$ 1.657.134.500,00		X		
4	ACTA 5	SEPTIEMBRE 2024	$ 50.120.000,00	$ 9.522.800,00	$ 59.642.800,00	$ -	$ 59.642.800,00	$ -	439524	$ 353.596.600,00	$ 1.597.491.700,00		X		
4	ACTA 6	OCTUBRE 2024	$ 50.120.000,00	$ 9.522.800,00	$ 59.642.800,00	$ -	$ 59.642.800,00	$ -		$ 293.953.800,00	$ 1.537.848.900,00		X		
7	ACTA 7	NOVIEMBRE 2024	$ 50.120.000,00	$ 9.522.800,00	$ 59.642.800,00	$ -	$ 59.642.800,00	$ -		$ 234.311.000,00	$ 1.478.206.100,00		X		
8	ACTA 8	DICIEMBRE 2024	$ 50.120.000,00	$ 9.522.800,00	$ 59.642.800,00	$ -	$ 59.642.800,00	$ -		$ 174.668.200,00	$ 1.418.563.300,00		X		
						2025									
9	ACTA 9	ENERO 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -	439524	$ 110.848.500,00	$ 1.354.743.600,00		X		
10	ACTA 10	FEBRERO 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -		$ 47.028.800,00	$ 1.290.923.900,00		X		
11	ACTA 11	MARZO 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -	439524 - 189125	$ 749.045.500,00	$ 1.227.104.200,00		X		
12	ACTA 12	ABRIL 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -		$ 685.225.800,00	$ 1.163.284.500,00		X		
13	ACTA 13	MAYO 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -		$ 621.406.100,00	$ 1.099.464.800,00		X		
14	ACTA 14	JUNIO 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -	189125	$ 557.586.400,00	$ 1.035.645.100,00		X		
15	ACTA 15	1 al 31 de julio de 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -		$ 493.766.700,00	$ 971.825.400,00		X		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **1 6 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1698 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – EMTRASERVIG SAS

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439524	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	596.428.000,00	$ -
2025	189125	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	765.836.400,00	$ -
2026	432126	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	478.058.700,00	$ 379.550.500,00
				TOTAL		$ 1.840.323.100,00	$ 379.550.500,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.840.323.100,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

16	ACTA 16	1 al 31 de agosto de 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -		$ 429.947.000,00	$ 908.005.700,00		X		
17	ACTA 17	1 al 30 de septiembre de 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -		$ 366.127.300,00	$ 844.186.000,00		X		
18	ACTA 18	1 al 31 de octubre de 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -	189125	$ 302.307.600,00	$ 780.366.300,00		X		
19	ACTA 19	1 a 30 noviembre de 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -		$ 238.487.900,00	$ 716.546.600,00		X		
20	ACTA 20	1 al 31 de diciembre de 2025	$ 53.630.000,00	$ 10.189.700,00	$ 63.819.700,00	$ -	$ 63.819.700,00	$ -		$ 174.668.200,00	$ 652.726.900,00		X		
21	ACTA 21	1 al 31 de enero de 2026	$ 57.390.000,00	$ 10.904.100,00	$ 68.294.100,00	$ -	$ 68.294.100,00	$ -		$ 106.374.100,00	$ 584.432.800,00		X		
22	ACTA 22	1 al 28 de febrero de 2026	$ 57.390.000,00	$ 10.904.100,00	$ 68.294.100,00	$ -	$ 68.294.100,00	$ -		$ 38.080.000,00	$ 516.138.700,00		X		
23	ACTA 23	1 al 31 de marzo de 2026	$ 57.390.000,00	$ 10.904.100,00	$ 68.294.100,00	$ -	$ 68.294.100,00	$ -	189125 - 432126	$ 447.844.600,00	$ 447.844.600,00		X		Registro 189125 por: $38'080.000 Registro 432126 por: $30'214.100
24	ACTA 24	1 al 30 de abril de 2026	$ 57.390.000,00	$ 10.904.100,00	$ 68.294.100,00	$ -	$ 68.294.100,00	$ -	432126	$ 379.550.500,00	$ 379.550.500,00				
25	ACTA 25	1 al 31 de mayo de 2026	$ 57.390.000,00	$ 10.904.100,00	$ 68.294.100,00	$ -	$ 68.294.100,00	$ -		$ 2.151.579.500,00	$ 311.256.400,00				
TOTALES			**$ 1.284.930.000,00**	**$ 244.136.700,00**	**$ 1.529.066.700,00**	**$ -**	**$ 1.529.066.700,00**	**$ -**		**$ 2.151.579.500,00**	**$ 311.256.400,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **1 6 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1698 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – EMTRASERVIG SAS

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439524	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	596.428.000,00	$ -
2025	189125	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	765.836.400,00	$ -
2026	432126	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	478.058.700,00	$ 379.550.500,00
				TOTAL		$ 1.840.323.100,00	$ 379.550.500,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.840.323.100,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.284.930.000,00	$ 244.136.700,00	**$ 1.529.066.700,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	**N/A**
AJUSTES	N/A	N/A	**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
VALOR TOTAL	$ 1.284.930.000,00	$ 244.136.700,00	**$ 1.529.066.700,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

JHON LOAIZA

JHON ALEXANDER LOAIZA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL - EMTRASERVIG SAS
C.C. No. 6.429.420 de Riofrio – Valle
Contratista

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1 6 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1711 DE 2024

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA - CONSTRUCAMINOS LTDA

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2026

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000 LOTE 7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	456524	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	580.720.000,00	$ -
2025	200225	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	745.558.800,00	$ -
2026	402926	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	465.397.100,00	$ 369.523.900
				TOTAL		$ 1.791.675.900,00	$ 369.523.900,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.791.675.900,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
						2024									
1	ACTA 1	MAYO - JUNIO 2024	$ 48.800.000,00	$ 9.272.000,00	$ 58.072.000,00	$ -	$ 58.072.000,00	$ -		$ 522.648.000,00	$ 1.733.603.900,00		X		
2	ACTA 2	29 -30 JUNIO 2024	$ 3.485.714,29	$ 662.285,71	$ 4.148.000,00	$ -	$ 4.148.000,00	$ -		$ 518.500.000,00	$ 1.729.455.900,00		X		
3	ACTA 3	JULIO 2024	$ 48.800.000,00	$ 9.272.000,00	$ 58.072.000,00	$ -	$ 58.072.000,00	$ -		$ 460.428.000,00	$ 1.671.383.900,00		X		
4	ACTA 4	AGOSTO 2024	$ 48.800.000,00	$ 9.272.000,00	$ 58.072.000,00	$ -	$ 58.072.000,00	$ -		$ 402.356.000,00	$ 1.613.311.900,00		X		
4	ACTA 5	SEPTIEMBRE 2024	$ 48.800.000,00	$ 9.272.000,00	$ 58.072.000,00	$ -	$ 58.072.000,00	$ -	456524	$ 344.284.000,00	$ 1.555.239.900,00		X		
4	ACTA 6	OCTUBRE 2024	$ 48.800.000,00	$ 9.272.000,00	$ 58.072.000,00	$ -	$ 58.072.000,00	$ -		$ 286.212.000,00	$ 1.497.167.900,00		X		
7	ACTA 7	NOVIEMBRE 2024	$ 48.800.000,00	$ 9.272.000,00	$ 58.072.000,00	$ -	$ 58.072.000,00	$ -		$ 228.140.000,00	$ 1.439.095.900,00		X		
8	ACTA 8	DICIEMBRE 2024	$ 48.800.000,00	$ 9.272.000,00	$ 58.072.000,00	$ -	$ 58.072.000,00	$ -		$ 170.068.000,00	$ 1.381.023.900,00		X		
						2025									
9	ACTA 9	ENERO 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -	456524	$ 107.938.100,00	$ 1.318.894.000,00		X		
10	ACTA 10	FEBRERO 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -		$ 45.808.200,00	$ 1.256.764.100,00		X		
11	ACTA 11	MARZO 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -	456524 -	$ 729.237.100,00	$ 1.194.634.200,00		X		
12	ACTA 12	ABRIL 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -		$ 667.107.200,00	$ 1.132.504.300,00		X		
13	ACTA 13	MAYO 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -		$ 604.977.300,00	$ 1.070.374.400,00		X		
14	ACTA 14	JUNIO 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -	200225	$ 542.847.400,00	$ 1.008.244.500,00		X		
15	ACTA 15	1 al 31 de julio de 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -		$ 480.717.500,00	$ 946.114.600,00		X		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **1 6 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1711 DE 2024

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA - CONSTRUCAMINOS LTDA

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2026

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000 LOTE 7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	456524	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	580.720.000,00	$ -
2025	200225	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	745.558.800,00	$ -
2026	402926	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	465.397.100,00	$ 369.523.900
				TOTAL		$ 1.791.675.900,00	$ 369.523.900,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.791.675.900,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

16	ACTA 16	1 al 31 de agosto de 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -		$ 418.587.600,00	$ 883.984.700,00		X		
17	ACTA 17	1 al 30 de septiembre de 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -		$ 356.457.700,00	$ 821.854.800,00		X		
18	ACTA 18	1 al 31 de octubre de 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -	200225	$ 294.327.800,00	$ 759.724.900,00		X		
19	ACTA 19	1 al 30 noviembre de 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -		$ 232.197.900,00	$ 697.595.000,00		X		
20	ACTA 20	1 al 31 de diciembre de 2025	$ 52.210.000,00	$ 9.919.900,00	$ 62.129.900,00	$ -	$ 62.129.900,00	$ -		$ 170.068.000,00	$ 635.465.100,00		X		
21	ACTA 21	1 al 31 de enero de 2026	$ 55.870.000,00	$ 10.615.300,00	$ 66.485.300,00	$ -	$ 66.485.300,00	$ -		$ 103.582.700,00	$ 568.979.800,00				
22	ACTA 22	1 al 28 de febrero de 2026	$ 55.870.000,00	$ 10.615.300,00	$ 66.485.300,00	$ -	$ 66.485.300,00	$ -		$ 37.097.400,00	$ 502.494.500,00				
23	ACTA 23	1 al 31 de marzo de 2026	$ 55.870.000,00	$ 10.615.300,00	$ 66.485.300,00	$ -	$ 66.485.300,00	$ -	200225 - 402926	$ 436.009.200,00	$ 436.009.200,00				Registro 200225 por: $37'097.400 Registro 402926 por: $29'387.900
24	ACTA 24	1 al 30 de abril de 2026	$ 55.870.000,00	$ 10.615.300,00	$ 66.485.300,00	$ -	$ 66.485.300,00	$ -	402926	$ 369.523.900,00	$ 369.523.900,00				
TOTALES			**$ 1.195.085.714,29**	**$ 227.066.285,71**	**$ 1.422.152.000,00**	**$ -**	**$ 1.422.152.000,00**	**$ -**		**$ 369.523.900,00**	**$ 369.523.900,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **1 6 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1711 DE 2024

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA - CONSTRUCAMINOS LTDA

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2026

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000 LOTE 7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	456524	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	580.720.000,00	$ -
2025	200225	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	745.558.800,00	$ -
2026	402926	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	465.397.100,00	$ 369.523.900
			TOTAL			$ 1.791.675.900,00	$ 369.523.900,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.791.675.900,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.195.085.714,29	$ 227.066.285,71	**$ 1.422.152.000,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	**N/A**
AJUSTES	N/A	N/A	**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
VALOR TOTAL	$ 1.195.085.714,29	$ 227.066.285,71	**$ 1.422.152.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: NÉSTOR BETANCOURT BETANCOURT
Representante Legal
C.C. No. 17.331.334 de Medina (C/marca)
Contratista

Firma
Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1 6 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1740 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S. - TRIUNFO VIAL S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439924	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	528.955.000,00	$ -
2025	206125	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	679.156.800,00	$ -
2026	402626	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	423.913.700,00	$ 340.363.800
				TOTAL		$ 1.632.025.500,00	$ 340.363.800,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.632.025.500,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
2024															
1	ACTA 1	JUNIO 2024	$ 44.450.000,00	$ 8.445.500,00	$ 52.895.500,00	$ -	$ 52.895.500,00	$ -		$ 476.059.500,00	$ 1.579.130.000,00		X		
2	ACTA 2	JULIO 2024	$ 44.450.000,00	$ 8.445.500,00	$ 52.895.500,00	$ -	$ 52.895.500,00	$ -		$ 423.164.000,00	$ 1.526.234.500,00		X		
3	ACTA 3	AGOSTO 2024	$ 44.450.000,00	$ 8.445.500,00	$ 52.895.500,00	$ -	$ 52.895.500,00	$ -		$ 370.268.500,00	$ 1.473.339.000,00		X		
4	ACTA 4	SEPTIEMBRE 2024	$ 44.450.000,00	$ 8.445.500,00	$ 52.895.500,00	$ -	$ 52.895.500,00	$ -	439924	$ 317.373.000,00	$ 1.420.443.500,00		X		
4	ACTA 5	OCTUBRE 2024	$ 44.450.000,00	$ 8.445.500,00	$ 52.895.500,00	$ -	$ 52.895.500,00	$ -		$ 264.477.500,00	$ 1.367.548.000,00		X		
4	ACTA 6	NOVIEMBRE 2024	$ 44.450.000,00	$ 8.445.500,00	$ 52.895.500,00	$ -	$ 52.895.500,00	$ -		$ 211.582.000,00	$ 1.314.652.500,00		X		
7	ACTA 7	DICIEMBRE 2024	$ 44.450.000,00	$ 8.445.500,00	$ 52.895.500,00	$ -	$ 52.895.500,00	$ -		$ 158.686.500,00	$ 1.261.757.000,00		X		
2025															
8	ACTA 8	ENERO 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -	439924	$ 102.090.100,00	$ 1.205.160.600,00		X		
9	ACTA 9	FEBRERO 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -		$ 45.493.700,00	$ 1.148.564.200,00		X		
10	ACTA 10	MARZO 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -	439924 - 206125	$ 668.054.100,00	$ 1.091.967.800,00		X		
11	ACTA 11	ABRIL 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -		$ 611.457.700,00	$ 1.035.371.400,00		X		
12	ACTA 12	MAYO 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -		$ 554.861.300,00	$ 978.775.000,00		X		
13	ACTA 13	JUNIO 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -	206125	$ 498.264.900,00	$ 922.178.600,00		X		
14	ACTA 14	1 al 31 de julio de 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -		$ 441.668.500,00	$ 865.582.200,00		X		
15	ACTA 15	1 al 31 de agosto de 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -		$ 385.072.100,00	$ 808.985.800,00		X		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1 6 2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1740 DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S. - TRIUNFO VIAL S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439924	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	528.955.000,00	$ -
2025	206125	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	679.156.800,00	$ -
2026	402626	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	423.913.700,00	$ 340.363.800
				TOTAL		$ 1.632.025.500,00	$ 340.363.800,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.632.025.500,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

16	ACTA 16	1 al 30 de septiembre de 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -		$ 328.475.700,00	$ 752.389.400,00		X		
17	ACTA 17	1 al 31 de octubre de 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -	206125	$ 271.879.300,00	$ 695.793.000,00		X		
18	ACTA 18	1 a 30 noviembre de 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -		$ 215.282.900,00	$ 639.196.600,00		X		
19	ACTA 19	1 al 31 de diciembre de 2025	$ 47.560.000,00	$ 9.036.400,00	$ 56.596.400,00	$ -	$ 56.596.400,00	$ -		$ 158.686.500,00	$ 582.600.200,00		X		
20	ACTA 20	1 al 31 de enero de 2026	$ 50.890.000,00	$ 9.669.100,00	$ 60.559.100,00	$ -	$ 60.559.100,00	$ -		$ 98.127.400,00	$ 522.041.100,00		X		
21	ACTA 21	1 al 28 de febrero de 2026	$ 50.890.000,00	$ 9.669.100,00	$ 60.559.100,00	$ -	$ 60.559.100,00	$ -		$ 37.568.300,00	$ 461.482.000,00		X		
22	ACTA 22	1 al 31 de marzo de 2026	$ 50.890.000,00	$ 9.669.100,00	$ 60.559.100,00	$ -	$ 60.559.100,00	$ -	206125 - 402626	$ 400.922.900,00	$ 400.922.900,00		X		Registro 206125 por: $37'568.300 Registro 402626 por: $22'990.800
23	ACTA 23	1 al 30 de abril de 2026	$ 50.890.000,00	$ 9.669.100,00	$ 60.559.100,00	$ -	$ 60.559.100,00	$ -	402626	$ 340.363.800,00	$ 340.363.800,00				
24	ACTA 24	1 al 31 de mayo de 2026	$ 50.890.000,00	$ 9.669.100,00	$ 60.559.100,00	$ -	$ 60.559.100,00	$ -		$ 1.911.830.200,00	$ 279.804.700,00				
TOTALES			**$ 1.136.320.000,00**	**$ 215.900.800,00**	**$ 1.352.220.800,00**	**$ -**	**$ 1.352.220.800,00**	**$ -**		**$ 1.911.830.200,00**	**$ 279.804.700,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1 6 2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1740 DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S. - TRIUNFO VIAL S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439924	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	528.955.000,00	$ -
2025	206125	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	679.156.800,00	$ -
2026	402626	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	423.913.700,00	$ 340.363.800
				TOTAL		$ 1.632.025.500,00	$ 340.363.800,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.632.025.500,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.136.320.000,00	$ 215.900.800,00	**$ 1.352.220.800,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	**N/A**
AJUSTES	N/A	N/A	**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
VALOR TOTAL	$ 1.136.320.000,00	$ 215.900.800,00	**$ 1.352.220.800,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Ruben Avila

Nombre: RUBÉN AVILA
Representante Legal
C.C. No. 9.620.232
Contratista

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 6

Estado General del Tiempo

Registro MEPI-MN1-ION-15-FR-100

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-100		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	1	DE	1

FECH **1** **6** **2026**
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1705 **DE** 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA. – EMANVIACOL LTDA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **1965 de 2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DIAS DEL MES MAYO DE 2026**																													
	01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	20	12	20	24	20	20	24	24	24	24	16	20	24	20	24	20	24	24	20	24	16	24	20	24	24	24	20	24	24	24	24	676
Lluvias moderadas	4	8	4		4						8	4		4		4			4		4		4				4					56
Lluvias intensas		4				4															4											12
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Nilson Rodrigo S.

Nombre: NILSON RODRIGO SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal
C.C. No. 97.612.185 de San José del Guaviare
Contratista

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-100		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	1	DE	1

FECHA **1** **6** **2026**
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1698 **DE** 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – EMTRASERVIG SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **1965 de 2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DIAS DEL MES MAYO DE 2026**																													
	01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	12	20	16	20	16	24	24	24	20	12	20	24	16	16	16	24	16	20	20	12	24	16	24	20	20	20	16	20	24	24	604
Lluvias moderadas		8	4	8	4	4				4	12	4		8	8	4		8	4	4	8		8		4	4	4	8	4			124
Lluvias intensas		4				4										4					4											16
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

JHON LOAIZA

JHON ALEXANDER LOAIZA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL - EMTRASERVIG SAS
C.C. No. 6.429.420 de Riofrio – Valle
Contratista

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-100		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	1	DE	1

FECHA **1** **6** **2026**
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1711 **DE** 2024 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA - CONSTRUCAMINOS LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **1965 de 2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DIAS DEL MES MAYO DE 2026**																													
	01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	12	24	20	24	16	24	24	24	24	12	20	24	24	16	20	24	24	20	20	12	24	20	24	24	20	24	24	20	24	24	660
Lluvias moderadas		8		4		4						4			8	4			4				4			4			4			48
Lluvias intensas		4				4					12									4	12											36
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: NÉSTOR BETANCOURT BETANCOURT
Representante Legal
C.C. No. 17.331.334 de Medina (C/marca)
Contratista

Firma
Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-100		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	1	DE	1

FECHA **1 6 2026** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1740 **DE** 2024 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S. - TRIUNFO VIAL S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **1965 de 2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DIAS DEL MES MAYO DE 2026**																														
	01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	12	24	20	24	24	24	24	24	24	16	20	24	24	24	20	24	24	20	24	12	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	692
Lluvias moderadas		8		4							8	4				4			4		4		4									40
Lluvias intensas		4																			8											12
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Ruben Avila

Nombre: RUBÉN AVILA
Representante Legal
C.C. No. 9.620.232
Contratista

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Matrícula No. 54202164359 NTS
INGENIERO RESIDENTE - AMV G4

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 7
Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Registro MEPI-MN1-ION-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 1705 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA – "EMANVIACOL LTDA"

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000. LOTE 6.

FECHA DE INICIO: 29/05/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.836.705.500,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.836.705.500,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1965-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 183.670.550,00	14	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**N.A.**						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 367.341.100,00	14	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 551.011.650,00	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052834

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21,23%	$ 390.000.000,00	14	5	2024	31	7	2026
Otros		**N.A.**						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012287 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 183.670.550,00	29	5	2024	20	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**N.A.**						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 367.341.100,00	29	5	2024	20	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**						
Calidad del servicio	30,00%	$ 551.011.650,00	31	7	2026	20	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052834

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21,23%	$ 390.000.000,00	29	5	2024	20	8	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012287 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Residente: CONSORCIO AMV CARFIN
Matrícula Profesional No. 54202164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 1698 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS – "EMTRASERVIG SAS"

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 7506 CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600; 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000. LOTE 5.

FECHA DE INICIO: 29/05/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.840.323.100,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.840.323.100,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1965-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 184.032.310,00	14	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**N.A.**						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 368.064.620,00	14	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 552.096.930,00	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052832

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21,19%	$ 390.000.000,00	14	5	2024	31	7	2026
Otros		**N.A.**						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012282 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 184.032.310,00	29	5	2024	20	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**N.A.**						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 368.064.620,00	29	5	2024	20	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**						
Calidad del servicio	30,00%	$ 552.096.930,00	31	7	2026	20	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052832

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21,19%	$ 390.000.000,00	29	5	2024	20	8	2026
Otros		**N.A.**						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012282 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Residente: CONSORCIO AMV CARFIN
Matrícula Profesional No. 54202164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 1711 DE 2024 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA – "CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA"

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000 LOTE 7"

FECHA DE INICIO: 29/05/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.791.675.900,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.791.675.900,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1965-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 179.167.590,00	10	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**N.A.**						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 358.335.180,00	10	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 537.502.770,00	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052838

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21,77%	$ 390.000.000,00	10	5	2024	31	7	2026
Otros		**N.A.**						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012286 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 179.167.590,00	29	5	2024	20	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**N.A.**						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 358.335.180,00	29	5	2024	20	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**						
Calidad del servicio	30,00%	$ 537.502.770,00	31	7	2026	20	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052838

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21,23%	$ 390.000.000,00	31	7	2026	20	8	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012286 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Residente: CONSORCIO AMV CARFIN
Matrícula Profesional No. 54202164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 1740 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 6507 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600. LOTE 10.

FECHA DE INICIO: 1/06/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.632.025.500,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.632.025.500,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1965-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV CARFIN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 163.202.550,00	15	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**N.A.**						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 326.405.100,00	15	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 489.607.650,00	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052844

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	23,90%	$ 390.000.000,00	15	5	2024	31	7	2026
Otros		**N.A.**						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012285 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 163.202.550,00	1	6	2026	20	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**N.A.**						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 326.405.100,00	1	6	2026	20	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**						
Calidad del servicio	30,00%	$ 489.607.650,00	31	7	2026	20	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052844

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	23,90%	$ 390.000.000,00	31	7	2026	21	8	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012285 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Residente: CONSORCIO AMV CARFIN
Matrícula Profesional No. 54202164359 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8

Plan de inversión de anticipo

Registro MINFRA-MN-IN-2-FR-1

N/A

ANEXO 9

Informe de inversión y buen manejo de anticipo

Registro MINFRA-MN-IN-2-FR-2

N/A

ANEXO 10

Registro MEPI-MN-IN-14-FR-1

Acta de Comité de Obra

N/A

ANEXO 11

Registro MEPI-MN-IN-14-FR-2

Acta de Reunión

N/A

ANEXO 12

Informe de Capacitación

Informe mensual SISO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECTORA SISO: MARIA VICTORIA MARTINEZ MEDINA

01 – 31 MAYO DEL 2026
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE

LUGAR: GUAVIARE
FECHA DEL INFORME: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026
RESPONSABLE: INSPECTORA SISO

1. DESARROLLO

El presente informe corresponde a la ejecución de las actividades del mes de mayo del año 2026, Siguiendo con el diseño del plan de trabajo con la AMV CARFIN- G4, con el fin de generar estrategias y medidas para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con los lineamientos normativos vigentes.

1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este ejercicio práctico es vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad del Ing. Residente, Ing. Auxiliares, personal administrativo y de los integrantes de las empresas de Mantenimiento Rutinario, en la cual se observa el estado actual de las diferentes áreas, equipos de E.P.P y herramientas, para efectuar acciones correctivas y así minimizar la exposición a los diferentes factores de riesgo que puede conllevar a incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales en el mantenimiento rutinario de los tramos de vía asicados a cada contratista.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las condiciones que pueden presentar riesgo y puedan generar posibles incidentes y/o accidentes de trabajo.
- Prevenir riesgos ocasionados por la falta de equipos E.P.P y si los hay en qué estado están buscando la seguridad de los colaboradores y operarios.
- Incentivar la cultura una cultura de prevención entre los empleados.

Empresas de Mantenimiento Rutinario inspeccionadas

- Empresa de Mantenimiento Vial los Colonos Ltda., “EMANVIACOL Ltda.”, Contrato 1705 de 2024. Ruta 7506, Calamar – San José del Guaviare, sector PR0+0000 al PR45+0000.

- Empresa de Trabajadores al Servicio del Guaviare SAS, “EMTRASERVIG SAS”, Contrato 1698 de 2024. Ruta 7506, Calamar – San José del Guaviare, sector PR45+0000 al PR73+0600. Ruta 6507, San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico, sector PR0+0000 al PR17+0000.


- Mantenimiento y Construcciones Viales los Correcaminos Ltda., “CONSTRUCAMINOS VIAL Ltda.” Contrato 1711 de 2024. Ruta 6507, San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico, sector PR17+0000 al PR62+0000.

- Construcciones y Mantenimiento Vial LA y SAS, (Triunfo vial) Contrato 1740 de 2024. Ruta 6507, San José del Guaviare – Cruce Puerto Rico, sector PR62+0000 al PR102+0600.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01– 31 MAYO DEL 2026

VISITA DE INSPECCIÓN A EMR	Descripción
	Los días 25 y 26 de mayo del presente año, se realizaron las visitas de inspección a las vías 6507 y 7506, con el fin de verificar cumplimiento de actividades contractuales de los EMRS, verificando porte adecuado del uniforme, botas de bioseguridad, Elementos de protección personal, asistencia de los trabajadores a sus puestos de trabajo. También se realizó la inspección a los vehículos que están al servicio de las empresas, donde se verificó documentación al día, mantenimiento preventivo del mismo y la funcionalidad de cada una de sus partes.



INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO** **INFORME DE VERIFICACIÓN** **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**	CONSORCIO AMV CARFIN

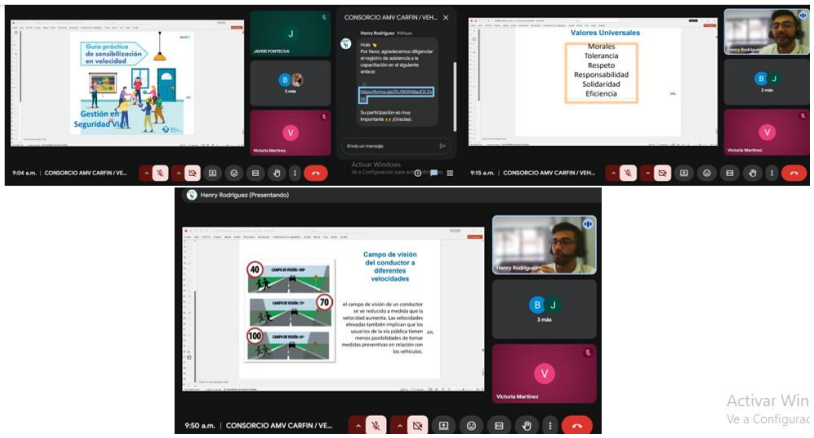CAPACITACIÓN ARL SURA	**Descripción**
	El día 15 de mayo se realizó una capacitación por parte de la ARL SURA, dirigida a todos los conductores del CONSORCIO con el fin de sensibilizarlos en velocidad, ya que la velocidad es uno de los factores de riesgo más importante en la ocurrencia de accidentes de tránsito, ya que influye directamente en la capacidad de reacción del conductor, la distancia de frenado y la gravedad de las consecuencias en caso de un incidente.

CAPACITACIÓN	**Descripción**
	El día 22 de mayo se realizó la capacitación a los EMR, la cual se llamó <u>TRABAJO SEGURO EN LA VIA.</u> Todas las actividades realizadas en mantenimiento rutinario vial, exponen a los trabajadores a diversos riesgos, tales como atropellamientos, colisiones, caídas al mismo nivel, exposición a condiciones climáticas diversas y contacto con equipos y maquinaria. Por esta razón es fundamental fortalecer los conocimientos y habilidades del personal mediante capacitaciones que promuevan comportamientos seguros y la aplicación de medidas preventivas durante la ejecución de las labores.

DIAPOSITIVAS DE LA CAPACITACIÓN	**Descripción**
	Se diseñaron las diapositivas para presentar en medio de la capacitación y dar a entender y conocer mejor la idea principal de la capacitación. Esta capacitación es fundamental porque garantiza que los trabajadores conozcan los riesgos a los cuales están expuestos en su ambiente laboral, y como identificar y reportar peligros.


INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO** **INFORME DE VERIFICACIÓN** **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**	CONSORCIO AMV CARFIN

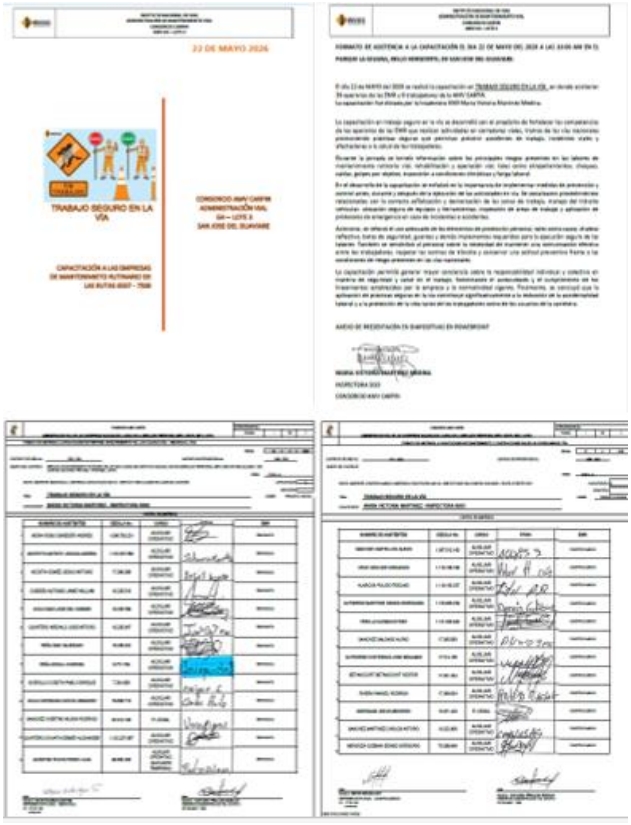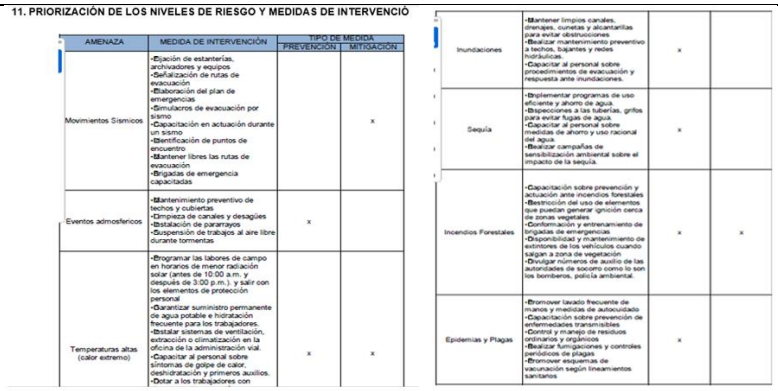INFORME DE CAPACITACIÓN	**Descripción**
	Es importante realizar el informe de capacitación porque permite evidenciar, evaluar y mejorar los procesos formativos dentro de la empresa, especialmente en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y tambien sirve como soporte documental ante auditorias internas, externas o visitas del Ministerio del trabajo y la ARL, demostrando que la empresa cumple con las obligaciones establecidad en el sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SG-SST).
PLAN DE EMERGENCIAS	**Descripción**
	Se está realizando los avances en el plan de emergencias ya que su estructura organizada, permite prevenir, controlar y responder de manera oportuna ante situaciones de emergencia que puedan afectar a las personas, las instalaciones, el medio ambiente o la operación de una empresa.

Se realiza este informe con el fin de presentar los registros de la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad del personal de la oficina y de los integrantes de las empresas de mantenimiento rutinario, y del cumplimiento de actividades realizadas desde el área. Se realiza, supervisión, seguimiento y control a los compromisos establecidos en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo por los contratistas de mantenimiento rutinario de vías EMANVIACOL, EMTRASERVIG, TRIUNFO VIAL Y

CONSTRUCAMINOS, y funcionarios del CONSORCIO AMV CARFIN.

Se cumple con funciones propias del SG-SST de la AMV CONSORCIO CARFIN, como lo son inspecciones, capacitación, diseño de formatos aplicados al mismo.



María Victoria Martínez Medina
INSPECTORA SISO – AMV

ANEXO 13

Matriz de riesgos Consorcio AMV Carfin

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL CONSORCIO AMV CARFIN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCESO:	TODOS LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE LA AMV CARFIN	**ELABORADO POR:**	MARIA VICTORIA MARTINEZ MEDINA INSP. SISO	**FECHA DE ELACTUALIZACIÓN:**	13/03/2025
CANTIDAD DE TRABAJADORES	7 — 1. TRES INGENIEROS CIVILES (Un Ing. Residente y dos Ing. Auxiliares) 2. UNA SISO 3. UNA AUX. ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 4. DOS CONDUCTORES	**REVISADO POR:**	YENNY ELIA CANTOR SUAREZ INGENIERA - GERENTE	**FECHA DE REVISIÓN:**	27/08/2024

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE CARFIN

Proceso	Zona / Lugar	Actividades	Tareas	Rutinario (Si o No)	Peligro		Efectos posibles	Controles existentes			Evaluación del riesgo							Valoración del riesgo	Criterios para establecer controles			Medidas Intervención				
					Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (ND X NE)	Interpretación del nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NR) e intervención	Interpretación del NR	Aceptabilidad del riesgo	Nro. de expuestos	Peor consecuencia	Existencia Requisito Legal Específico asociado (Si o No)	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos, señalización, advertencia	Equipos / elementos de protección personal
					Virus (covid 19)	Biológico	Daño leve		Jabón antibacterial, desinfectante de manos para el protocolo de lavado de manos	vacunación frente al Covid 19		1	0	Bajo	10	0	IV	Aceptable	3	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 692 del 2022	No	No	No	•Suministro de agua potable •jabón antibacterial y/o desinfectante de manos.	N/A El virus se encuentra controlado en el Departamento.
					Iluminación (por exceso en jornada laboral de 8:00 - 5:00 pm)	Fisico	Daño leve				6	3	18	Alto	10	180	II	No aceptable o aceptable con control específico	3	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2400 de 979 art. 07	No	Cambiar luminarias a luz blanca neutra o fria, entre los 4000 K a 5000 K, que simule la uz del día.	No	1. Capacitación o actividades de promoción y prevención sobre fatiga visual, estrés y jaquecas ocasionados por exceso de luz en el puesto de trabajo. 2. Promoción y Prevención de como controlar las fuentes de deslumbramiento y resplandor de los computadores manejando la luz y efecto de reflejo de los computadores.	
					Temperaturas extremas (calor)	Fisico	Daño medio				10	2	20	Muy alto	25	500	I	No Aceptable	3	Lesiones o enfermedades graves con incapacidad laboral temporal	Resolución 2400 de 979 art. 64	No			Capacitación en Riesgo físico por temperatura extrema: Identificación, Valoración y su medición	EPP para calor por fuertes rayos solares.
					Material Particulado (En oficina y Recorridos viales, exceso de polvo)	Químico	Daño leve		ventanas de los vehiculos cerradas en medio del recorrido, polisombra en las rejas de la oficina)		2	3	6	Medio	10	60	III	Mejorable	3	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad		No	No	No	1. Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. 2. Valoraciones medico Laborales. y exámenes complementarios. 3. Programa de Epp. 4. Programa de Inspecciónes.	Uso de EPP (Protección respiratoria)

ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO VIAL (INGENIEROS CIVILES RESIDENTES)	OFICINA DEL CONSORCIO CARFIN, VIAS NACIONALES DEL CRUCE DE PUERTO RICO META - CALAMAR	Administración, Dirigir, organizar, planificar, Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la Dirección Territorial Meta, hacia las EMR EMANVIACOL, EMTRASERVIG, CONSTRUCAMINOS Y TRIUNFO VIAL.	Informes diarios, semanales, mensuales y trimestrales, mentener la plataforma hermes 2 INVIAS actualizada, informes de accidentalidad y emergencias, atenderlas.	Si	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo)	Psicosocial	Daño leve				6	3	18	Medio	10	180	III	No aceptable o aceptable con control específico	3	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	1. Aplicación del examen psicosocial. 2. Capacitación, entrenamiento y/o talleres para el fortalecimiento de competencias administrativas, sociales y personales tales como: desarrollo de habilidades para la coordinación de personal, procesos de inducción y entrenamiento, liderazgo motivacional, trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertividad, manejo del conflicto y la negociación, fomento de la creatividad para la solución de problemas, administración efectiva del tiempo. 3. Promoción de la salud en ambientes laborales (tabaquismo, alcoholismo, nutrición), seguridad basada en valores, manejo del estrés, motivación para la autogestión, auto cuidado, autoestima, etc.	
					Condiciones de la tarea (carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistema de control, definición de roles, monotonía, Trabajo de alta responsabilidad etc.).	Psicosocial	Daño leve				6	3	18	Medio	10	180	III	No aceptable o aceptable con control específico	3	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	1. Aplicación del examen psicosocial. 2. Capacitación, entrenamiento y/o talleres para el fortalecimiento de competencias administrativas, sociales y personales tales como: desarrollo de habilidades para la coordinación de personal, procesos de inducción y entrenamiento, liderazgo motivacional, trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertividad, manejo del conflicto y la negociación, fomento de la creatividad para la solución de problemas, administración efectiva del tiempo. 3. Promoción de la salud en ambientes laborales (tabaquismo, alcoholismo, nutrición), seguridad basada en valores, manejo del estrés, motivación para la autogestión, auto cuidado, autoestima, etc.	
					Posturas prolongadas y mantenidas en posición sedente	Biomecánico	Daño medio			Se realizan Pausas activas una vez por semana.	6	3	18	Muy alto	25	450	II	No aceptable o aceptable con control específico	3	Lesiones o enfermedades graves con incapacidad laboral temporal	Ley 378 de 1997; Resolución 2400 de 1979	No	No	No	•Inspección y análisis a los puestos de trabajo de manera periódica. •Programa de pausas activas. •emplear reposapiés para hacer cambios de posturas. •Capacitar a los trabajadores sobre ergonomía, posturas adecuadas para trabajar frente al computador, Higiene Postural.	•Aumentar la periodicidad de las pausas activas.
					Movimientos repetitivos (digitación)	Biomecánico	Daño leve			Se realizan Pausas activas una vez por semana.	6	2	12	Alto	10	120	III	No aceptable o aceptable con control específico	3	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Ley 378 de 1997; Resolución 2400 de 1979	No	No	No	•Inspección y análisis a los puestos de trabajo de manera periódica. •Programa de pausas activas. •emplear reposapiés para hacer cambios de posturas. •Capacitar a los trabajadores sobre ergonomía, posturas adecuadas para trabajar frente al computador, Higiene Postural.	•Aumentar la periodicidad de las pausas activas.
					Accidentes de Transito (Durante los recorridos viales en las rutas 6507-7506)	Condiciones de seguridad	Daño Extremo		1.Mantenimiento preventivo de los autos. 2.Conductores capacitados para el cargo.		2	3	6	Muy alto	60	360	II	No aceptable o aceptable con control específico	3	Incapacidad permanente parcial o invalidez	Resolución 40595 del 2022; Ley 2251 del 2022	No	No	No	Capacitacion frente al riesgo donde se reifeje normas de seguridad vial, manejo defensivo, prevención en la distracción, Programa de cero tolerancia a la conducción bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Si transita como peatón, piense y observe. Divulgación de la politica de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, politica de seguridad vial y politica de regulación vial.	

					Publico (de orden publico)	Condiciones de seguridad	Daño medio				6	2	12	Muy alto	10	120		No aceptable o aceptable con control específico	3	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad		No	No	No	Promover cultura de autocuidado, conocer la ruta de desplazamiento e indagar si es segura su salida, tener clara agenda de las actividades a desarrolar, Comunicar al equipo de trabajo los lugares donde se va a desplazar, •Comportarse de una manera que no ponga en peligro su persona y su seguridad, o la de los demás, •Informar de cualquier incidente de seguridad, de manera oportuna.	
					Precipitaciones (lluvias torrenciales, vendavale, en los recorridos viales)	Fenomenos Naturales	Daño leve			chaqueta impermeable con capucha reflectiva de INVIAS.	6	2	12	Muy alto	10	120	I	No aceptable o aceptable con control específico	3	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	Capacitación o actividades de promoción y prevención sobre el autocuidado y como actuar frente a vendavales y lluvias torrenciales.	EPP para lluvias
					Virus (covid 19)	Biológico	Daño leve		Jabón antibacterial, desinfectante de manos para el protocolo de lavado de manos	vacunación frente al Covid 19		1	0	Bajo	10	0	IV	Aceptable	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 692 del 2022	No	No	No	•Suministro de agua potable •jabón antibacterial y/o desinfectante de manos.	N/A El virus se encuentra controlado en el Departamento.
					Iluminación (por exceso en jornada laboral de 8:00 - 5:00 pm)	Fisico	Daño leve				6	3	18	Alto	10	180	II	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2400 de 979 art. 07	No	Cambiar luminarias a luz blanca neutra o fria, entre los 4000 K a 5000 K, que simule la uz del día.	No	1. Capacitación o actividades de promoción y prevención sobre fatiga visual, estrés y jaquecas ocasionados por exceso de luz en el puesto de trabajo. 2. Promoción y Prevención de como controlar las fuentes de deslumbramiento y resplandor de los computadores manejando la luz y efecto de reflejo de los computadores.	
					Material Particulado (En oficina y Recorridos viales, exceso de polvo)	Quimico	Daño leve		ventanas de los vehiculos cerradas en medio del recorrido		2	3	6	Medio	10	60	III	Mejorable	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad		No	No	No	1. Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. 2. Valoraciones medico Laborales. y exámenes complementarios. 3. Programa de Epp. 4. Programa de Inspecciónes.	Uso de EPP (Protección respiratoria)
					Gestión organizacional (estilo de mando, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).	Psicosocial	Daño leve				10	3	30	Muy alto	10	300	II	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	1. Aplicación del examen psicosocial. 2. Capacitación, entrenamiento y/o talleres para el fortalecimiento de competencias administrativas, sociales y personales tales como: desarrollo de habilidades para la coordinación de personal, procesos de inducción y entrenamiento, liderazgo motivacional, trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertividad, manejo del conflicto y la negociación, fomento de la creatividad para la solución de problemas, administración efectiva del tiempo. 3. Promoción de la salud en ambientes laborales (tabaquismo, alcoholismo, nutrición), seguridad basada en valores, manejo del estrés, motivación para la autogestión, auto cuidado, autoestima, etc.	

INPECCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	OFICINA DEL CONSORCIO CARFIN, VIAS NACIONALES DEL CRUCE DE PUERTO RICO META - CALAMAR	Evaluar los riesgos laborales, mediante la identificación de los factores de riesgo, la vigilancia del ambiente laboral y los posibles efectos a la salud del trabajador. Proponer las medidas correctivas necesarias cuando se detectan condiciones que pueden alterar el estado de salud.	Todo lo que se estipula en la Resolucion 0312 del 2019, en cuanto a estandares minimos del SG-SST en empresas con menos de 50 trabajadores con nivel de riesgo IV Y V, Seguimiento y control a los operarios de las diferentes EMR, llenar matrices, funciones del área de Talento Humano, diligenciamiento de formatos entre otros.	Si	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo)	Psicosocial	Daño leve				6	3	18	Medio	10	180	III	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	1. Aplicación del examen psicosocial. 2. Capacitación, entrenamiento y/o talleres para el fortalecimiento de competencias administrativas, sociales y personales tales como: desarrollo de habilidades para la coordinación de personal, procesos de inducción y entrenamiento, liderazgo motivacional, trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertividad, manejo del conflicto y la negociación, fomento de la creatividad para la solución de problemas, administración efectiva del tiempo. 3. Promoción de la salud en ambientes laborales (tabaquismo, alcoholismo, nutrición), seguridad basada en valores, manejo del estrés, motivación para la autogestión, auto cuidado, autoestima, etc.	
					Condiciones de la tarea (carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistema de control, definición de roles, monotonía, Trabajo de alta responsabilidad etc.).	Psicosocial	Daño leve				6	3	18	Medio	10	180	III	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	1. Aplicación del examen psicosocial. 2. Capacitación, entrenamiento y/o talleres para el fortalecimiento de competencias administrativas, sociales y personales tales como: desarrollo de habilidades para la coordinación de personal, procesos de inducción y entrenamiento, liderazgo motivacional, trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertividad, manejo del conflicto y la negociación, fomento de la creatividad para la solución de problemas, administración efectiva del tiempo. 3. Promoción de la salud en ambientes laborales (tabaquismo, alcoholismo, nutrición), seguridad basada en valores, manejo del estrés, motivación para la autogestión, auto cuidado, autoestima, etc.	
					Posturas prolongadas y mantenidas en posición sedente	Biomecánico	Daño medio			Se realizan Pausas activas una vez por semana.	6	3	18	Muy alto	25	450	II	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades graves con incapacidad laboral temporal	Ley 378 de 1997; Resolución 2400 de 1979	No	No	No	•Inspección y análisis a los puestos de trabajo de manera periódica. •Programa de pausas activas. •emplear reposapiés para hacer cambios de posturas. •Capacitar a los trabajadores sobre ergonomía, posturas adecuadas para trabajar frente al computador, Higiene Postural.	•Aumentar la periodicidad de las pausas activas.
					Movimiento repetitivo (digitación)	Biomecánico	Daño leve			Se realizan Pausas activas una vez por semana.	6	2	12	Alto	10	120	III	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Ley 378 de 1997; Resolución 2400 de 1979	No	No	No	•Inspección y análisis a los puestos de trabajo de manera periódica. •Programa de pausas activas. •emplear reposapiés para hacer cambios de posturas. •Capacitar a los trabajadores sobre ergonomía, posturas adecuadas para trabajar frente al computador, Higiene Postural.	•Aumentar la periodicidad de las pausas activas.
					Locativo superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel)	Condiciones de seguridad	Daño leve			Botas de Seguridad	2	4	8	Muy alto	10	80	II	Mejorable	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Ley 378 de 1997 y Resolucion 2400	No	No	No	1. Señalización 2. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones del Consorcio.	Uso de EPP (Botas de Seguridad)
					Accidentes de Transito (Durante los recorridos viales en las rutas 6507-7506)	Condiciones de seguridad	Daño Extremo		1.Mantenimiento preventivo de los autos. 2.Conductores capacitados para el cargo.		2	3	6	Muy alto	60	360	II	No aceptable o aceptable con control específico	1	Incapacidad permanente parcial o invalidez	Resolución 40595 del 2022; Ley 2251 del 2022	No	No	No	Capacitacion frente al riesgo donde se reifeje normas de seguridad vial, manejo defensivo, prevención en la distracción, Programa de cero tolerancia a la conducción bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Si transita como peatón, piense y observe. Divulgación de la politica de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, politica de seguridad vial y politica de regulación vial.	
					Publico (de orden publico)	Condiciones de seguridad	Daño medio				6	2	12	Muy alto	10	120		No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad		No	No	No	Promover cultura de autocuidado, conocer la ruta de desplazamiento e indagar si es segura su salida, tener clara agenda de las actividades a desarrolar, Comunicar al equipo de trabajo los lugares donde se va a desplazar, •Comportarse de una manera que no ponga en peligro su persona y su seguridad, o la de los demás, •Informar de cualquier incidente de seguridad, de manera oportuna.	

					Precipitaciones (lluvias torrenciales, vendavale, en los recorridos viales)	Fenomenos Naturales	Daño leve			chaqueta impermeable con capucha reflectiva de INVIAS.	6	2	12	Muy alto	10	120	I	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	Capacitación o actividades de promoción y prevención sobre el autocuidado y como actuar frente a vendavales y lluvias torrenciales.	EPP para lluvias
CONDUCTORES	OFICINA DEL CONSORCIO CARFIN, VIAS NACIONALES DEL CRUCE DE PUERTO RICO META - CALAMAR	Manipular, supervisar y transportar al personal del Consorcio CARFIN por carretera de acuerdo con las normas en vigor y las instrucciones o programa de servicio, además de realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo y la reparación de averías simples en ruta.	Conducir el vehículo asignado por la institución cumpliendo con las normas de tránsito, velando por la seguridad de las personas asignadas para su traslado, diligenciar bitacoras, llevar un control del kilometraje recorrido diariamente, estar pendiente del mantenimiento preventivo de los vehículo.	Si	Virus (covid 19)	Biológico	Daño leve		Jabón antibacterial, desinfectante de manos para el protocolo de lavado de manos	vacunación frente al Covid 19		1	0	Bajo	10	0	IV	Aceptable	2	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 692 del 2022	No	No	No	•Suministro de agua potable •jabón antibacterial y/o desinfectante de manos.	N/A El virus se encuentra controlado en el Departamento.
					Temperaturas extremas (calor)	Fisico	Daño medio				10	2	20	Muy alto	25	500	I	No Aceptable	2	Lesiones o enfermedades graves con incapacidad laboral temporal	Resolución 2400 de 979 art. 64	No			Capacitación en Riesgo físico por temperatura extrema: Identificación, Valoración y su medición	EPP para calor por fuertes rayos solares.
					Gases (vehiculos)	Quimico	Daño leve	Mantenimiet o preventivo y periodico a los vehiculos (disminuye la emision de gases)			6	3	18	Alto	10	180		No aceptable o aceptable con control específico		Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2400 de 979 art. 64, resolución 0762 del 2022	No	No	No	Mantenimiento preventivo a los vehiculos, Capacitación a los conductores en como ayudar a disminuir la emisión de gases de los vehiculos.	
					Material Particulado (En oficina y Recorridos viales, exceso de polvo)	Quimico	Daño leve		ventanas de los vehiculos cerradas en medio del recorrido		2	3	6	Medio	10	60	III	Mejorable	2	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad		No	No	No	1. Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. 2. Valoraciones medico Laborales. y exámenes complementarios. 3. Programa de Epp. 4. Programa de Inspecciónes.	Uso de EPP (Protección respiratoria)
					Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).	Psicosocial	Daño leve				6	3	18	Medio	10	180	III	No aceptable o aceptable con control específico	2	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	1. Aplicación del examen psicosocial. 2. Capacitación, entrenamiento y/o talleres para el fortalecimiento de competencias administrativas, sociales y personales tales como: desarrollo de habilidades para la coordinación de personal, procesos de inducción y entrenamiento, liderazgo motivacional, trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertividad, manejo del conflicto y la negociación, fomento de la creatividad para la solución de problemas, administración efectiva del tiempo. 3. Promoción de la salud en ambientes laborales (tabaquismo, alcoholismo, nutrición), seguridad basada en valores, manejo del estrés, motivación para la autogestión, auto cuidado, autoestima, etc.	
					Condiciones de la tarea (carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistema de control, definición de roles, monotonía, Trabajo de alta responsabilidad etc.).	Psicosocial	Daño leve				6	3	18	Medio	10	180	III	No aceptable o aceptable con control específico	2	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	1. Aplicación del examen psicosocial. 2. Capacitación, entrenamiento y/o talleres para el fortalecimiento de competencias administrativas, sociales y personales tales como: desarrollo de habilidades para la coordinación de personal, procesos de inducción y entrenamiento, liderazgo motivacional, trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertividad, manejo del conflicto y la negociación, fomento de la creatividad para la solución de problemas, administración efectiva del tiempo. 3. Promoción de la salud en ambientes laborales (tabaquismo, alcoholismo, nutrición), seguridad basada en valores, manejo del estrés, motivación para la autogestión, auto cuidado, autoestima, etc.	
					Posturas prolongadas y mantenidas en posición sedente	Biomecánico	Daño medio			Se realizan Pausas activas una vez por semana.	6	2	12	Muy alto	25	300	II	No aceptable o aceptable con control específico	2	Lesiones o enfermedades graves con incapacidad laboral temporal	Ley 378 de 1997; Resolución 2400 de 1979	No	No	No	•Inspección y análisis a los puestos de trabajo de manera periódica. •Programa de pausas activas. •emplear reposapiés para hacer cambios de posturas. •Capacitar a los trabajadores sobre ergonomía, posturas adecuadas para trabajar frente al computador, Higiene Postural.	•Aumentar la periodicidad de las pausas activas.

					Locativo superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel)	Condiciones de seguridad	Daño leve			Botas de Seguridad	2	4	8	Muy alto	10	80	II	Mejorable	2	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Ley 378 de 1997 y Resolucion 2400	No	No	No	1. Señalización 2. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones del Consorcio.	Uso de EPP (Botas de Seguridad)
					Accidentes de Transito (Durante los recorridos viales en las rutas 6507-7506)	Condiciones de seguridad	Daño Extremo		1.Mantenimiento preventivo de los autos. 2.Conductores capacitados para el cargo.		2	3	6	Muy alto	60	360	II	No aceptable o aceptable con control específico	2	Incapacidad permanente parcial o invalidez	Resolución 40595 del 2022; Ley 2251 del 2022	No	No	No	Capacitacion frente al riesgo donde se relfeje normas de seguridad vial, manejo defensivo, prevención en la distracción, Programa de cero tolerancia a la conducción bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Si transita como peatón, piense y observe. Divulgación de la politica de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, politica de seguridad vial y politica de regulación vial.	
					Publico (de orden publico)	Condiciones de seguridad	Daño medio				6	2	12	Muy alto	10	120		No aceptable o aceptable con control específico	2	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad		No	No	No	Promover cultura de autocuidado, conocer la ruta de desplazamiento e indagar si es segura su salida, tener clara agenda de las actividades a desarrolar, Comunicar al equipo de trabajo los lugares donde se va a desplazar, •Comportarse de una manera que no ponga en peligro su persona y su seguridad, o la de los demás, •Informar de cualquier incidente de seguridad, de manera oportuna.	
					Precipitaciones (lluvias torrenciales, vendavale, en los recorridos viales)	Fenomenos Naturales	Daño leve			chaqueta impermeable con capucha reflectiva de INVIAS.	6	2	12	Muy alto	10	120	I	No aceptable o aceptable con control específico	2	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	Capacitación o actividades de promoción y prevención sobre el autocuidado y como actuar frente a vendavales y lluvias torrenciales.	EPP para lluvias
					Virus (covid 19)	Biológico	Daño leve		Jabón antibacterial, desinfectante de manos para el protocolo de lavado de manos	vacunación frente al Covid 19		1	0	Bajo	10	0	IV	Aceptable	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 692 del 2022	No	No	No	•Suministro de agua potable •jabón antibacterial y/o desinfectante de manos.	N/A El virus se encuentra controlado en el Departamento.
					Iluminación (por exceso en jornada laboral de 8:00 - 5:00 pm)	Fisico	Daño leve				6	3	18	Alto	10	180	II	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2400 de 979 art. 07	No	Cambiar luminarias a luz blanca neutra o fria, entre los 4000 K a 5000 K, que simule la uz del día.	No	1. Capacitación o actividades de promoción y prevención sobre fatiga visual, estrés y jaquecas ocasionados por exceso de luz en el puesto de trabajo. 2. Promoción y Prevención de como controlar las fuentes de deslumbramiento y resplandor de los computadores manejando la luz y efecto de reflejo de los computadores.	
					Material Particulado (En oficina y Recorridos viales, exceso de polvo)	Quimico	Daño leve		ventanas de los vehiculos cerradas en medio del recorrido, polisombra en las rejas de la oficina)		2	3	6	Medio	10	60	III	Mejorable	3	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad		No	No	No	1. Procedimiento de induccion, reinduccion y capacitaciones. 2. Valoraciones medico Laborales. y exámenes complementarios. 3. Programa de Epp. 4. Programa de Inspecciónes.	Uso de EPP (Protección respiratoria)
					Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).	Psicosocial	Daño leve				6	3	18	Medio	10	180	III	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	1. Aplicación del examen psicosocial. 2. Capacitación, entrenamiento y/o talleres para el fortalecimiento de competencias administrativas, sociales y personales tales como: desarrollo de habilidades para la coordinación de personal, procesos de inducción y entrenamiento, liderazgo motivacional, trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertividad, manejo del conflicto y la negociación, fomento de la creatividad para la solución de problemas, administración efectiva del tiempo. 3. Promoción de la salud en ambientes laborales (tabaquismo, alcoholismo, nutrición), seguridad basada en valores, manejo del estrés, motivación para la autogestión, auto cuidado, autoestima, etc.	

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	OFICINA DEL CONSORCIO CARFIN	Archivar, controlar y mantener la información contable y las cuentas de la empresa. Procesar la mayoría de las facturas, manteniendo el orden de la gestión.	Atender la logística de las reuniones pendientes, Recibir y enviar documentos, Ordenar archivos, demas finciones designadas por los jefes.	Si	Condiciones de la tarea (carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistema de control, definición de roles, monotonía, Trabajo de alta responsabilidad etc.).	Psicosocial	Daño leve				6	3	18	Medio	10	180	III	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	1. Aplicación del examen psicosocial. 2. Capacitación, entrenamiento y/o talleres para el fortalecimiento de competencias administrativas, sociales y personales tales como: desarrollo de habilidades para la coordinación de personal, procesos de inducción y entrenamiento, liderazgo motivacional, trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertividad, manejo del conflicto y la negociación, fomento de la creatividad para la solución de problemas, administración efectiva del tiempo. 3. Promoción de la salud en ambientes laborales (tabaquismo, alcoholismo, nutrición), seguridad basada en valores, manejo del estrés, motivación para la autogestión, auto cuidado, autoestima, etc.	
					Posturas prolongadas y mantenidas en posición sedente	Biomecánico	Daño medio			Se realizan Pausas activas una vez por semana.	6	3	18	Muy alto	25	450	II	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades graves con incapacidad laboral temporal	Ley 378 de 1997; Resolución 2400 de 1979	No	No	No	•Inspección y análisis a los puestos de trabajo de manera periódica. •Programa de pausas activas. •emplear reposapiés para hacer cambios de posturas. •Capacitar a los trabajadores sobre ergonomía, posturas adecuadas para trabajar frente al computador, Higiene Postural.	•Aumentar la periodicidad de las pausas activas.
					Movimientos repetitivos (digitación)	Biomecánico	Daño leve			Se realizan Pausas activas una vez por semana.	6	2	12	Alto	10	120	III	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Ley 378 de 1997; Resolución 2400 de 1979	No	No	No	•Inspección y análisis a los puestos de trabajo de manera periódica. •Programa de pausas activas. •emplear reposapiés para hacer cambios de posturas. •Capacitar a los trabajadores sobre ergonomía, posturas adecuadas para trabajar frente al computador, Higiene Postural.	•Aumentar la periodicidad de las pausas activas.
					Locativo superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel)	Condiciones de seguridad	Daño leve			Botas de Seguridad	2	4	8	Muy alto	10	80	II	Mejorable	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Ley 378 de 1997 y Resolucion 2400	No	No	No	1. Señalización 2. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones del Consorcio.	Uso de EPP (Botas de Seguridad)
					Publico (de orden publico)	Condiciones de seguridad	Daño medio				6	2	12	Muy alto	10	120		No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad		No	No	No	Promover cultura de autocuidado, conocer la ruta de desplazamiento e indagar si es segura su salida, tener clara agenda de las actividades a desarrolar, Comunicar al equipo de trabajo los lugares donde se va a desplazar, •Comportarse de una manera que no ponga en peligro su persona y su seguridad, o la de los demás, •Informar de cualquier incidente de seguridad, de manera oportuna.	
					Precipitaciones (lluvias torrenciales, vendavale, en los recorridos viales)	Fenomenos Naturales	Daño leve			chaqueta impermeable con capucha reflectiva de INVIAS.	6	2	12	Muy alto	10	120	I	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 2646 del 2008, Resolución 2404 del 2019 y la Resolución 2764 del 2022 - Aplicación de la bateria de Riesgo psicosocial a los trabajadores.	No	No	No	Capacitación o actividades de promoción y prevención sobre el autocuidado y como actuar frente a vendavales y lluvias torrenciales.	EPP para lluvias
		Realizar el aseo de las áreas asignadas,			Virus (covid 19)	Biológico	Daño leve		Jabón antibacterial, desinfectante de manos para el protocolo de lavado de manos	vacunación frente al Covid 19		1	0	Bajo	10	0	IV	Aceptable	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Resolución 692 del 2022				•Suministro de agua potable •jabón antibacterial y/o desinfectante de manos.	N/A El virus se encuentra controlado en el Departamento.
					Bacterias	Biológico	Daño leve		Jabón antibacterial, desinfectante de manos para el protocolo de lavado de manos		6	3	18	Alto	10	180	II	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Ley 9 de 1979; Resolución 2400 1979; Decreto 1843 de 1991				•Limpiar frecuentemente para eliminar fuentes de alimentos y lugares que puedan brindarles refugio a animales. •Usar desinfectactes para los utiles de aseo que esa en cada una de sus funciones.	Uso adecuado de EPP tales como Guantes, tapabocas, uniforme antifluidos, delantal desechable o de plastico, zapatos antideslizantes.
					Polvos orgánicos inorgánicos (manejo de cloro en polvo, jabón en polvo)	Quimico	Daño leve			Uso de EPP	2	2	4	Alto	10	40	II	Mejorable	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	NTC 5131	No	No	no	Capacitación sobre el uso adecuado de EPP, Capacitación sobre el manjo de elementos quimicos de aseo, disoluciones del cloro y cantidades permisibles.	Uso adecuado de EPP tales como Guantes, tapabocas, uniforme antifluidos, delantal desechable o de plastico, zapatos antideslizantes.

Servicios Gnerales (contratista 1 dia por semana)	Área de cocina, baños, y demas instalaciones de la SED	garantizando óptimas condiciones de limpieza y la disponibilidad para su próximo uso, de acuerdo con los procedimientos establecidos.	Asear, limpiar,lavar, cocinar, organizar entre otros.	Si	Posturas prolongadas y mantenidas.	Biomecánico	Daño medio				10	2	20	Muy alto	25	500	II	No Aceptable	1	Lesiones o enfermedades graves con incapacidad laboral temporal	Ley 378 de 1997; Resolución 2400 de 1979				•Rotación o alternancia de las tareas, de forma que se utilicen distintos grupos musculares en las sucesivas tareas de limpieza. • Realizar examen medico ocupacional periodico.	• Cambiar escobas, traperos y limpiapolvo por unos que tenganl mangos telecospicos que permiten adaptación de las dimensiones antropometricas del trabajador. • Capacitacitación de como usar los elementos de aseo si realizar torcedura tronco y posicion del tronco a la hora de realizar sus tareas. •Aumentar periodicidad de pausas activas.
					Movimientos repetitivos (limpiar, barrer, trapear)	Biomecánico	Daño leve			Se realizan Pausas activas una vez por semana.	6	2	12	Alto	10	120	III	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Ley 378 de 1997				•Rotación o alternancia de las tareas, de forma que se utilicen distintos grupos musculares en las sucesivas tareas de limpieza. • Realizar examen medico ocupacional periodico. • Capacitación en ahorro postural.	•Realizar pausas de de 10/15 minutos por cada dos horas de trabajo. • Cambiar escobas, traperos y limpiapolvo por unos que tenganl mangos telecospicos que permiten adaptación de las dimensiones antropometricas del trabajador. • Capacitacitación de como usar los elementos de aseo si realizar torcedura tronco y posicion del tronco a la hora de realizar sus tareas. •Aumentar periodicidad de pausas activas.
					Locativo superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel.	Condiciones de seguridad	Daño leve				10	4	40	Muy alto	10	400	II	No aceptable o aceptable con control específico	1	Lesiones o enfermedades leves que no requieren incapacidad	Ley 378 de 1997 y Resolucion 2400				1. Señalización 2. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones del Consorcio.	•EPP, zapatos antideslizantes.

ELABORADO POR: MARIA VICTORIA MARTINEZ MEDINA

CARGO: INSPECTGOR SISO

No. DE LICENCIA: 95-071 DE 2021

REVISADO POR: YENNY ELIA CANTOR SUAREZ

CARGO: INGENIERA - GERENTE

ANEXO 14
Equipo y vehículos Contrato de Interventoría
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 4/05/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 **PROYECTO:** RUTA 6507 - RUTA 7506

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1965-2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO AMV CARFIN

CONTRATO DE OBRA No. 1698, 1705, 1711, 1740 DE 2024. **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA - "EMANVIACOL LTDA"
EMPRESA DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GUAVIARE SAS - "EMTRASERVIG SAS"
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES LOS CORRECAMINOS LTDA - "CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA"
EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL LA Y S.A.S.

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA RENAULT DUSTER DYNAMIQU	(KJW181) 1998 c. c / AÑO 2015	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
CAMIONETA SSANGYONG KORANDOC	(DOK683) 1998 c. c / AÑO 2015	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
OFICINA		A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I
EQUIPO DE OFICINA		A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma:
Ing.IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Residente: CONSORCIO AMV CARFIN
Matrícula Profesional No. 54202164359 NTS

Firma
Nombre: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No: 25202-349248 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 15
Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No.: NO APLICA **CONTRATISTA:** NO APLICA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---

ANEXO 16
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No: NA **CONTRATISTA:** NA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o	Indicar si es Contrato Principal o No. De	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	544924	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	RECURSOS PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.405.284.328,00	$ -
2025	172425	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	RECURSOS PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.589.794.304,00	$ 948.610.427,80
2026						$ 1.055.206.320,00	
			TOTAL			$ 4.050.284.952,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.284.952

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 1.405.284.328,00	$ 4.050.284.952,00		
1	DEL 05 AL 31 JULIO 2024	$ 64.600.016,00	$ 12.274.003,04	$ 76.874.019,04				R.P. No. 544924 DEL 17-06-2024	$ 1.328.410.308,96	$ 3.973.410.932,96		
2	DEL 01 AL 31 AGOSTO 2024	$ 70.942.120,00	$ 13.479.002,80	$ 84.421.122,80					$ 1.243.989.186,16	$ 3.888.989.810,16		
3	DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	$ 70.787.230,00	$ 13.449.573,70	$ 84.236.803,70					$ 1.159.752.382,46	$ 3.804.753.006,46		
4	DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2024	$ 73.116.220,00	$ 13.892.081,80	$ 87.008.301,80					$ 1.072.744.080,66	$ 3.717.744.704,66		
5	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024	$ 70.804.740,00	$ 13.452.900,60	$ 84.257.640,60					$ 988.486.440,06	$ 3.633.487.064,06		
6	DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2024	$ 73.295.200,00	$ 13.926.088,00	$ 87.221.288,00					$ 901.265.152,06	$ 3.546.265.776,06		
						AÑO 2025						
7	DEL 01 AL 31 ENERO 2025	$ 76.147.250,00	$ 14.467.977,50	$ 90.615.227,50				R.P. No. 544924 DEL 17-06-2024	$ 810.649.924,56	$ 3.455.650.548,56		
8	DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	$ 75.307.950,00	$ 14.308.510,50	$ 89.616.460,50					$ 721.033.464,06	$ 3.366.034.088,06		
9	DEL 01 AL 31 MARZO 2025	$ 78.957.400,00	$ 15.001.906,00	$ 93.959.306,00					$ 627.074.158,06	$ 3.272.074.782,06		
10	DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	$ 80.355.400,00	$ 15.267.526,00	$ 95.622.926,00					$ 531.451.232,06	$ 3.176.451.856,06		
11	DEL 01 AL 31 MAYO 2025	$ 80.956.500,00	$ 15.381.735,00	$ 96.338.235,00					$ 435.112.997,06	$ 3.080.113.621,06		
12	DEL 01 AL 30 JUNIO 2025	$ 75.340.400,00	$ 14.314.676,00	$ 89.655.076,00					$ 345.457.921,06	$ 2.990.458.545,06		
13	DEL 01 AL 31 JULIO 2025	$ 77.332.200,00	$ 14.693.118,00	$ 92.025.318,00					$ 253.432.603,06	$ 2.898.433.227,06		
14	DEL 01 AL 31 AGOSTO 2025	$ 109.148.550,00	$ 20.738.224,50	$ 129.886.774,50					$ 123.545.828,56	$ 2.768.546.452,56		
15	DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	$ 75.688.500,00	$ 14.380.815,00	$ 90.069.315,00					$ 33.476.513,56	$ 2.678.477.137,56		
16	DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2025	$ 79.531.100,00	$ 15.110.909,00	$ 94.642.009,00				R.P. No. 544924 DEL 17-06-2024 y R.P. No. 172425 DEL 19-03-2025	$ 1.528.628.808,56	$ 2.583.835.128,56		DE RP No. 544924 ES $ 33.476.513,56 Y DE RP No. 172425 ES $ 61.165.6495,44
17	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025	$ 84.341.400,00	$ 16.024.866,00	$ 100.366.266,00				R.P. No. 172425 DEL 19-03-2025	$ 1.428.262.542,56	$ 2.483.468.862,56		
18	DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2025	$ 75.725.700,00	$ 14.387.883,00	$ 90.113.583,00					$ 1.338.148.959,56	$ 2.393.355.279,56		
19	DEL 01 AL 31 ENERO 2026	$ 81.648.956,00	$ 15.513.301,64	$ 97.162.257,64					$ 1.240.986.701,92	$ 2.296.193.021,92		
20	DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026	$ 81.648.956,00	$ 15.513.301,64	$ 97.162.257,64					$ 1.143.824.444,28	$ 2.199.030.764,28		
21	DEL 01 AL 31 MARZO 2026	$ 80.994.956,00	$ 15.389.041,64	$ 96.383.997,64					$ 1.047.440.446,64	$ 2.102.646.766,64		
22	DEL 01 AL 30 ABRIL 2026	$ 83.050.436,00	$ 15.779.582,84	$ 98.830.018,84					$ 948.610.427,80	$ 2.003.816.747,80		
23	DEL 01 AL 31 MAYO 2026	$ 103.876.236,00	$ 19.736.484,84	$ 123.612.720,84					$ 824.997.706,96	$ 1.880.204.026,96		
	TOTALES	$ 1.823.597.416,00	$ 346.483.509,04	$ 2.170.080.925,04				,	$ 824.997.706,96	$ 1.880.204.026,96		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 1.001.355.216,00	$ 190.257.491,04	$ 1.191.612.707,04
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 371.905.660,00	$ 70.662.075,40	$ 442.567.735,40
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	$ 19.117.000,00	$ 3.632.230,00	$ 22.749.230,00
-			
VALOR TOTAL	$ 1.823.597.416,00	$ 346.483.509,04	$ 2.170.080.925,04

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ING. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Ingeniero Residente Administracion Vial
Matrícula No. 54202164359 NTS

Firma
Nombre: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 25202-349248 CND

ANEXO 17
Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **1/06/2026**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1965-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AMV CARFIN

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 5/07/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento.	10,00%	$ 405.028.495,20	12	6	2024	23	2	2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	N.A.	N.A	-	-	-	-	-	-
Calidad del servicio	30,00%	$ 1.215.085.485,60	31	7	2026	31	1	2029
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	20,00%	$ 810.056.990,40	12	6	2024	23	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No 21-44-101443272

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 5/07/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento.	10,00%	$ 405.028.495,20	12	6	2024	23	2	2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	N.A.	N.A	-	-	-	-	-	-
Calidad del servicio	30,00%	$ 1.215.085.485,60	31	7	2026	31	1	2029
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	20,00%	$ 810.056.990,40	12	6	2024	23	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No 21-44-101443272

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/08/2024

OBSERVACIÓN: NO SE HAN SUSCRITO ACTAS DE ADICIONES, ACTAS MODIFICACIONES, ACTAS DE PRÓRROGAS Ó SUSPENSIONES.
SE REALIZO ACLARACION EN LAS POLIZAS CON SEGUROS DEL ESTADO S.A. CON FECHA DEL 13 DE AGOSTO DE 2024, "NUMERO DE
CONTRATO 1965 DE 2024".

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ING. IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN
Residente AMV Grupo 4 de Interventoría
Matricula profesional No.: 54202164359 NTS

Firma

Nombre: ING. YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No: 25202-349248 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18
Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

MINISTERIO DEL TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3.

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — FECHA **31** **05** **2026**

DIRECCION TERRITORIAL META

RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

CONTRATISTAS DE OBRA: EMANVIACOL LTDA / EMTRANSERVIG SAS / CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA / TRIUNFO VIAL SAS

CONTRATOS DE OBRA No.: 1705, 1711, 1740, 1698 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO AMV CARFIN — **CONTRATO No.** 1965 DE 2024

SUPERVISOR CONT. DE INTERVEN. ING. YENCY LORENA CABANZO — **PERIODO** 01-31 Mayo/2026

CARTA		RADICACION		REMITENTE	DESTINATARIO	ENTIDAD / EMPRESA	ASUNTO
FECHA	CONSECUTIVO	FECHA	No.				
ENVIADOS							
4-may-26		4-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	LEYDI HUERTAS	D.T META	Actas de costos del periodo abril de 2026, contrato AMV 1695-2024 y EMRs 1705-2024;1698-2024,1711-2024, 1740-2024
4-may-26		4-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	Factura EMR Emanviacol contrato 1705-2024
4-may-26		4-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	Actas de costos No. 22 Periodo Abril 2026 AMV Cto 1965-2024 CORREGIDA
4-may-26		4-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO Y LEYDI HUERTAS	D.T META	Actas mes Abril actualizadas EMRs y AMV
4-may-26		4-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	ACTA DE MODIFICACION No.3 AMVG4 (PROYECCION PRELIMINAR)
4-may-26		4-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	INVIAS	TERRITORIAL META	Entrega de informe de accidentalidad mes de abril 2026, ruta 6507 y ruta 7506
4-may-26		4-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	D.T META	Base de datos para fuente de materiales
5-may-26		5-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	D.T META	INFORMACIÓN PRORROGA Y ADICIÓN CTOS MTO RUT
5-may-26		5-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	MEMORANDO ADICION AMV
6-may-26		6-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	FABIAN ANDRES ORTIZ CABANZO	D.T META	Respuesta a: Solicitud información sobre implementación de nuevas tecnologías en proyectos a cargo del Invías
6-may-26		6-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO Y LEYDI HUERTAS	D.T META	Informe mensual Nº 22 correspondiente al mes de abril del 2026 de la AMV-G4
6-may-26		6-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	Radicación envio de presupuesto box coulvert R7506 PR68+1036
6-may-26		6-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	EDWIN SMYTH BRANDON TORRES MONROY	CONSTRUCTORA ORION	RESPUESTA A: SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA Y PERMISO PARA DESMONTE DE DEFENSA
7-may-26		7-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS AMV-G4 GUAVIARE D.T META FEB-27-2025

RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

CONTRATISTAS DE OBRA: EMANVIACOL LTDA / EMTRANSERVIG SAS / CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA / TRIUNFO VIAL SAS

CONTRATOS DE OBRA No.: 1705, 1711, 1740, 1698 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO AMV CARFIN **CONTRATO No.** 1965 DE 2024

SUPERVISOR CONT. DE INTERVEN. ING. YENCY LORENA CABANZO **PERIODO** 01-31 Mayo/2026

CARTA		RADICACION		REMITENTE	DESTINATARIO	ENTIDAD / EMPRESA	ASUNTO
FECHA	CONSECUTIVO	FECHA	No.				
7-may-26		7-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	ACTUALIZACION DE MATRIZ DE SITIOS CRITICOS AMV-G4 GUAVIARE A 5 DE FEBRERO DEL 2025
7-may-26		7-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	Informe y presupuesto del Box-Coulvert averiado en el PR68+0970 Ruta 7506 Calamar - San José del Guaviare PR00+0000-PR73+0600.
7-may-26		7-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	Presentación presupuesto necesidades Ruta 7506 PR68+1036
7-may-26		7-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	1. RED NACIONAL
12-may-26		12-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	ARCHIVOS DE ANSV
13-may-26		13-may-23		CONSORCIO AMV CARFIN	EDWIN ROMERO-YENCY LORENA CABANZO	D.T META	MATRIZ HALLAZGOS REVISADA
14-may-26		14-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	AIV CONSULTORIA ZONA 4	INVIAS	Matriz de hallazgos revisada de la ruta 6507.
15-may-26		15-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	ANDREA CAROLINA RESTREPO - YENCY LORENA CABANZO.	D.T META	Remisión informe quincenal sitios críticos
15-may-26		15-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	AIV CONSULTORIA ZONA 4	INVIAS	Re: matriz de hallazgos y formato observaciones de la ruta 6507.
19-may-26		19-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	Ajuste acta del mes de abril 2026 EMR Construcaminos
20-may-26		20-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
21-may-26		21-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	Solicitud actualización cuenta bancaria contrato 1740 de 2024

RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

CONTRATISTAS DE OBRA: EMANVIACOL LTDA / EMTRANSERVIG SAS / CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA / TRIUNFO VIAL SAS

CONTRATOS DE OBRA No.: 1705, 1711, 1740, 1698 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO AMV CARFIN **CONTRATO No.** 1965 DE 2024

SUPERVISOR CONT. DE INTERVEN. ING. YENCY LORENA CABANZO **PERIODO** 01-31 Mayo/2026

CARTA		RADICACION		REMITENTE	DESTINATARIO	ENTIDAD / EMPRESA	ASUNTO
FECHA	CONSECUTIVO	FECHA	No.				
25-may-26		25-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	Entrega de informes del Especialista en Estructuras visita a puente Palomas y Pororio en la ruta 6507, y puente La Fuga y Platanales en ruta 7506
26-may-26		26-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	anexo fotográfico respuesta CAC-038-2026
26-may-26		26-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	LEYDI HUERTAS	D.T META	Informe instalación de hitos viales, tachas y pintura R6507
26-may-26		26-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	MARCO ANTONIO LOMBANA HERRERA	JEFE POLICIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEGUV SAN JOSE DEL GUAVIARE	Respuesta a solicitud de informacion
27-may-26		27-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	CORONEL BENITEZ	BRIGADA 22 DE SELVA-EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	Solicitud de permiso para operación y sobrevuelo de dron en corredores viales nacionales Ruta 6507 y Ruta 7506.
29-may-26		29-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	Memorial de responsabilidad ingeniero especialista y AVAL AMV
29-may-26		29-may-26		CONSORCIO AMV CARFIN	YENCY LORENA CABANZO	SUPERVISOR D.T META	ACTA PARCIAL DE COSTOS No. 23 PERIODO MAYO 2026 CTO AMV 1965 DE 2024

RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

CONTRATISTAS DE OBRA: EMANVIACOL LTDA / EMTRANSERVIG SAS / CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA / TRIUNFO VIAL SAS

CONTRATOS DE OBRA No.: 1705, 1711, 1740, 1698 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO AMV CARFIN **CONTRATO No.** 1965 DE 2024

SUPERVISOR CONT. DE INTERVEN. ING. YENCY LORENA CABANZO **PERIODO** 01-31 Mayo/2026

CARTA		RADICACION		REMITENTE	DESTINATARIO	ENTIDAD / EMPRESA	ASUNTO
FECHA	CONSECUTIVO	FECHA	No.				
RECIBIDOS							
2-may-26		2-may-26		JHON LOAIZA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Factura Abr - 2026 FEES - 75 - Comprobante Recibido Siif - CTO 1698 - 2024 EMTRASERVIG S.A.S.
2-may-26		2-may-26		EMANVIACOL	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Factura Abr FECO - 71 - Comprobante Recibido Siif - EMANVIACOL LTDA
2-may-26		2-may-26		TRIUNFO VIAL	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Factura Abr FELY - 70 - Comprobante Recibido Siif - CTO 1740-2024 TRIUNFO VIAL
2-may-26		2-may-26		CONSTRUCAMINOS	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Factura Abr 2026 FECO - 68 - Comprobante Recibido Siif - CTO 1711-2024 CONSTRUCAMINSO VIAL LTDA
4-may-26		4-may-26		FABIAN ANDRES ORTIZ	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Envió MEMORANDO CIRCULAR 2026I-VBOG-030230 - Reporte Semanal No. 18 de 2026 Puentes a cargo del INVIAS
4-may-26		4-may-26		YENCY LORENA CABANZO	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Respuesta a: Acta de costos del periodo abril de 2026, contrato AMV 1965-2024
4-may-26		4-may-26		TRIUNFO VIAL S.A.S	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Contenedor Factura Abr FELY - 70 - Comprobante Recibido Siif - CTO 1740-2024 TRIUNFO VIAL
4-may-26		4-may-26		EMANVIACOL LTDA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Contenedor Factura Abr FECO - 71 - Comprobante Recibido Siif - EMANVIACOL LTDA
4-may-26		4-may-26		CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Contenedor Factura Abr 2026 FECO - 68 - Comprobante Recibido Siif - CTO 1711-2024 CONSTRUCAMINSO VIAL LTDA
4-may-26		4-may-26		EMTRASERVIG S.A.S	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Contenedor Factura Abr - 2026 FEES - 75 - Comprobante Recibido Siif - CTO 1698 - 2024 EMTRASERVIG S.A.S.
4-may-26		4-may-26		INVIAS	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Resultado Radicación de Solicitud
5-may-26		5-may-26		YENCY LORENA CABANZO	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: INFORMACIÓN PRORROGA Y ADICIÓN CTOS MTO RUT
5-may-26		5-may-26		INVIAS	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Resultado Radicación de Solicitud
5-may-26		5-may-26		YENCY LORENA CABANZO	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: MEMORANDO ADICION AMV
5-may-26		5-may-26		ANDREA CAROLINA RESTREPO	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: Participación "Procedimientos de Permisos Sobre la Infraestructura a Cargo del INVIAS"
5-may-26		5-may-26		FABIAN ANDRES ORTIZ	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: Participación "Procedimientos de Permisos Sobre la Infraestructura a Cargo del INVIAS"
6-may-26		6-may-26		FABIAN ANDRES ORTIZ	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Solicitud información sobre implementación de nuevas tecnologías en proyectos a cargo del Invías
6-may-26		6-may-26		ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE SITIOS CRÍTICOS EN EXCEL (FRECUENCIA QUINCENAL)

RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

CONTRATISTAS DE OBRA: EMANVIACOL LTDA / EMTRANSERVIG SAS / CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA / TRIUNFO VIAL SAS

CONTRATOS DE OBRA No.: 1705, 1711, 1740, 1698 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO AMV CARFIN **CONTRATO No.** 1965 DE 2024

SUPERVISOR CONT. DE INTERVEN. ING. YENCY LORENA CABANZO **PERIODO** 01-31 Mayo/2026

CARTA		RADICACION		REMITENTE	DESTINATARIO	ENTIDAD / EMPRESA	ASUNTO
FECHA	CONSECUTIVO	FECHA	No.				
6-may-26		6-may-26		CONSTRUCTORA ORION	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA Y PERMISO PARA DESMONTE DE DEFENSA
6-may-26		6-may-26		INVIAS	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Resultado Radicación de Solicitud
6-may-26		6-may-26		JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RECORDATORIO URGENTE: Documentación para prórroga contratos AMV - Vigencia 2026 [Memorando circular 2026I-VBOG-030454]
8-may-26		8-may-26		FABIAN ANDRES ORTIZ	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Envió MEMORANDO CIRCULAR 2026I-VBOG-032659 - Reporte Semanal No. 19 de 2026 Puentes a cargo del INVIAS
14-may-26		14-may-26		JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: AMV - SGI - ACTA DE COSTOS No. 22 PERIODO ABRIL 2026 - CTO 1965-2024 ADMINISTRACIÓN VIAL 4 DT MET; CONSORCIO AMV CARFIN; RP172425; 20; 98830018,84
14-may-26		14/5/202		JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 24 PERIODO ABRIL 2026 - CTO 1705-2024 DT MET; EMANVIACOL LTDA; RP348826; 20; 68151300
14-may-26		14-may-26		ANDREA CAROLINA RESTREPO	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	ACTUALIZACIÓN CIERRES VIALES
15-may-26		15-may-26		ANDREA CAROLINA RESTREPO	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	ENTRENGA APU´S INVICOSTOS
15-may-26		15-may-26		LUIS ZULETA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Falta de mantenimiento en la vias nacionales rutas 7506 y 6507
15-may-26		15-may-26		EDWIN JAIR ROMERO BURGOS	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Envio MEMORANDO CIRCULAR 2026I-VBOG-035370 - Reporte Semanal No. 20 de 2026 Puentes a cargo del INVIAS
20-may-26		20-may-26		ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: Solicitud Pieza Gráfica Uso de la aplicación Survey123 para la gestión del riesgo 27-05-2026
21-may-26		21-may-26		ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	LINK REUNION DE CAPACITACIÓN SURVEY 27 MAYO 2026
21-may-26		21-may-26		YENCY LORENA CABANZO	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: Solicitud actualización cuenta bancaria contrato 1740 de 2024
21-may-26		21-may-26		NEIL NELSON NIEVES	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Transferencia de conocimiento sesión No 3. Concepto Técnico de Ubicación de Estación de Servicios.
21-may-26		21-may-26		JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 23 PERIODO ABRIL 2026 - CTO 1740-2024 DT MET; TRIUNFO VIAL S.A.S; RP402626; 20; 60559100
21-may-26		21-may-26		JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 24 PERIODO ABRIL 2026 - CTO 1711-2024 DT MET; CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA; RP402926; 20; 66485300
22-may-26		22-may-26		NEIL NELSON NIEVES	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Cambio de fecha última sesión Permiso de uso de derecho de vías y otros – PMT
23-may-26		23-may-26		MARCO ANTONIO LOMBANA	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Solicitud Informacion

RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

CONTRATISTAS DE OBRA: EMANVIACOL LTDA / EMTRANSERVIG SAS / CONSTRUCAMINOS VIAL LTDA / TRIUNFO VIAL SAS

CONTRATOS DE OBRA No.: 1705, 1711, 1740, 1698 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO AMV CARFIN **CONTRATO No.** 1965 DE 2024

SUPERVISOR CONT. DE INTERVEN. ING. YENCY LORENA CABANZO **PERIODO** 01-31 Mayo/2026

CARTA		RADICACION		REMITENTE	DESTINATARIO	ENTIDAD / EMPRESA	ASUNTO
FECHA	CONSECUTIVO	FECHA	No.				
25-may-26		25-may-26		ANDREA CAROLINA RESTREPO	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	VISOR DE PAGOS INVIAS
25-may-26		25-may-26		EDWIN JAIR ROMERO BURGOS	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Envio MEMORANDO CIRCULAR 2026I-VBOG-037748 - Reporte Semanal No. 21 de 2026 Puentes a cargo del INVIAS
26-may-26		26-may-26		ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	REPROGRAMACIÓN CAPACITACIÓN SURVEY 123 3 JUNIO 2026
27-may-26		27-may-26		INVIAS	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Resultado Radicación de Solicitud
27-may-26		27-may-26		RENE ALEXANDER MATEUS	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	RV: acta abril
27-may-26		27-may-26		STEFANNY BRIGITTE URIBE	IVAN DARIO PEÑALOZA	CONSORCIO AMV CARFIN	Alcance requerimiento radicado 2026S-VMET-034997



Firma

Nombre: **IVAN DARIO PEÑALOZA SUEZCUN**

Residente: CONSORCIO AMV CARFIN

Matrícula No.: 54202-164359 NTS

CONSORCIO AMV CARFIN
NIT: 901.839.313-0

ANEXO 19

Registro Fotográfico Recorridos Viales para Seguimiento de Contratos y Avance de Obras en la Vía

Calle21 N 23-45 Barrio Bello Horizonte de San José Del Guaviare – Cel: 3164936102 - 3188692809
Email: consorcioamvcarfin@gmail.com



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR36+144
Intervencion Puente Caño Choapo.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR36+144
Intervencion Puente Caño Choapo.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR36+144
Intervencion Puente Caño Choapo.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR36+144
Intervencion Puente Caño Choapo.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR36+144
Intervencion Puente Caño Choapo.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR36+144
Intervencion Puente Caño Choapo.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con base para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Ruta 7506 Contrato 976-2021 PR32 Intervencion con crudo rio para estructura de via.



Capacitacion a EMR por la AMV



Capacitacion a EMR por la AMV



Capacitacion a EMR por la AMV



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Demarcación PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación detachas PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación detachas PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación detachas PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación detachas PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación detachas PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR26+500 a 27+500.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR9+564 a 9+676.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR9+564 a 9+676.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR9+564 a 9+676.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR9+564 a 9+676.



Ruta 6507 Instalación de hitos PR9+564 a 9+676.




Ruta 6507 Instalación de hitos PR9+564 a 9+676.



Acompañamiento a Prensa y Comunicaciones de Planta Cantral



Acompañamiento a Prensa y Comunicaciones de Planta Cantral

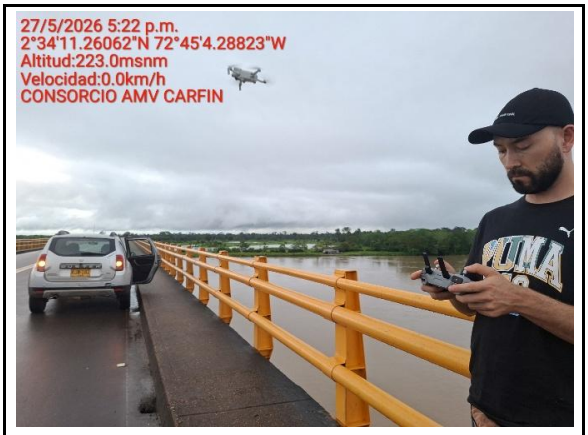

Acompañamiento a Prensa y Comunicaciones de Planta Cantral



Acompañamiento a Prensa y Comunicaciones de Planta Cantral



Acompañamiento a Prensa y Comunicaciones de Planta Cantral



Acompañamiento a Prensa y Comunicaciones de Planta Cantral



Tapa huecos ruta 6507 PR6+400



Tapa huecos ruta 6507 PR6+400



Tapa huecos ruta 6507 PR6+400



Tapa huecos ruta 6507 PR6+400



Tapa huecos ruta 6507 PR6+400



Tapa huecos ruta 6507 PR6+400
