Certificado de Aportes

Se certifica que EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO identificado(a) con CC 1022363189 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	447375556	9507536452	E	2026-07-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$7,000,000	$1,120,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$7,000,000	$487,200
CCF	COMPENSAR	30	4%	$7,000,000	$280,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$7,000,000	$280,000

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 09:42.

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIME EDUARDO FLOREZ BLANCO identificado(a) con CC 7165748 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$6,405,000	$1,024,800
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$6,405,000	$445,800
CCF	COMFABOY	30	4%	$6,405,000	$256,200
EPS	SANITAS	30	4%	$6,405,000	$256,200

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:19.

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDI NAYIVE LOPEZ BARRETO identificado(a) con CC 53043823 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$6,405,000	$1,024,800
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$6,405,000	$445,800
CCF	COMPENSAR	30	4%	$6,405,000	$256,200
EPS	SANITAS	30	4%	$6,405,000	$256,200

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:20.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PAULA VALENTINA CARLOS MARTINEZ identificado(a) con CC 1070989207 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,351,330	$696,300
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$4,351,330	$302,900
CCF	COMPENSAR	30	4%	$4,351,330	$174,100
EPS	FAMISANAR	30	4%	$4,351,330	$174,100

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:19.

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN DAVID HERREÑO DUARTE identificado(a) con CC 1101756190 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,675,000	$588,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$3,675,000	$255,800
CCF	COMPENSAR	30	4%	$3,675,000	$147,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,675,000	$147,000

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:20.

Certificado de Aportes

Se certifica que GILBERTO MUETE VILLAIZAN identificado(a) con CC 80246161 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	6	16%	$735,000	$117,600
ARL	SEGUROS BOLIVAR	6	6.96%	$735,000	$51,200
CCF	COMPENSAR	6	4%	$735,000	$29,400
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	6	4%	$735,000	$29,400

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:21.

Certificado de Aportes

Se certifica que IVAN ANDRES PINILLA CORTES identificado(a) con CC 80174574 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	447375556	9507536452	E	2026-07-03													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	25	16%	$2,631,495	$421,100
AFP	COLFONDOS	5	16%	$526,299	$84,300
ARL	SEGUROS BOLIVAR	25	6.96%	$2,631,495	$183,200
ARL	SEGUROS BOLIVAR	5	0%	$526,299	$0
CCF	COMPENSAR	25	4%	$2,631,495	$105,300
CCF	COMPENSAR	5	4%	$526,299	$21,100
EPS	COMPENSAR	25	4%	$2,631,495	$105,300
EPS	COMPENSAR	5	4%	$526,299	$21,100

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 09:41.

Certificado de Aportes

Se certifica que JEIMMY NIBELLI AMEZQUITA ACOSTA identificado(a) con CC 1033725638 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	447375556	9507536452	E	2026-07-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,120,000	$499,200
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$3,120,000	$16,300
CCF	COMPENSAR	30	4%	$3,120,000	$124,800
EPS	COMPENSAR	30	4%	$3,120,000	$124,800

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 09:40.

Revisión Pago Planilla Mes de Mayo - Periodo 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE		2,026	$ 1.750.905							REVISIÓN PARAFISCALES : Junio										
CANTIDAD	PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DÍAS TRABAJADOS	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA - DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA DÍAS TRABAJADOS	40% DEL VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL	SALUD PATRONAL 8,5%	SALUD TRABAJADOR 4%	PENSION PATRONAL 12%	PENSION TRABAJADOR 4%	TOTAL IBC PARAFISCALES	CAJA DE COMPENSACIÓN 4%	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 3%	SENA 2%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	30	$ 10.400.000,00	50%	$ 5.200.000,00	$ 5.200.000,00		$ 7.000.000,00	$ 595.000,00	$ 280.000,00	$ 840.000,00	$ 280.000,00	$ 7.000.000,00	$ 280.000,00	N.A	N.A	$ 7.000.000,00	6,96%	$ 487.200,00
1	RESIDENTE EDE INTERVENTORIA	JAIME EDUARDO FLOREZ BLANCO	30	$ 6.405.000,00	100%	$ 6.405.000,00	$ 6.405.000,00		$ 6.405.000,00	$ 544.400,00	$ 256.200,00	$ 768.600,00	$ 256.200,00	$ 6.405.000,00	$ 256.200,00	N.A	N.A	$ 6.405.000,00	6,96%	$ 445.800,00
1	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES	LEIDI NAYIVE LOPEZ BARRETO	30	$ 6.405.000,00	100%	$ 6.405.000,00	$ 6.405.000,00		$ 6.405.000,00	$ 544.400,00	$ 256.200,00	$ 768.600,00	$ 256.200,00	$ 6.405.000,00	$ 256.200,00	N.A	N.A	$ 6.405.000,00	6,96%	$ 445.800,00
1	PROFESIONAL INGENIERO DE APOYO	PAULA VALENTINA CARLOS MARTINEZ	30	$ 4.351.330,00	100%	$ 4.351.330,00	$ 4.351.330,00		$ 4.351.330,00	$ 369.900,00	$ 174.100,00	$ 522.200,00	$ 174.100,00	$ 4.351.330,00	$ 174.100,00	N.A	N.A	$ 4.351.330,00	6,96%	$ 302.900,00
1	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN DAVID HERREÑO DUARTE	30	$ 3.675.000,00	100%	$ 3.675.000,00	$ 3.675.000,00		$ 3.675.000,00	$ 312.400,00	$ 147.000,00	$ 441.000,00	$ 147.000,00	$ 3.675.000,00	$ 147.000,00	N.A	N.A	$ 3.675.000,00	6,96%	$ 255.800,00
1	COMISION DE TOPOGRAFIA	IVAN ANDRES PINILLA CORTES	30	$ 3.475.000,00	50%	$ 1.737.500,00	$ 1.737.500,00		$ 3.157.794,00	$ 268.400,00	$ 126.300,00	$ 378.900,00	$ 126.300,00	$ 3.157.794,00	$ 126.300,00	N.A	N.A	$ 3.157.794,00	6,96%	$ 219.800,00
1	COMISION DE TOPOGRAFIA	JEIMMY NIBELLI AMEZQUITA ACOSTA	30	$ 2.200.000,00	50%	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00		$ 3.120.000,00	$ 265.200,00	$ 124.800,00	$ 374.400,00	$ 124.800,00	$ 3.120.000,00	$ 124.800,00	N.A	N.A	$ 3.120.000,00	6,96%	$ 217.200,00

Contrato N° : ICCLI-CTO-226-2026

Visto bueno interventoria LEIDI NAYIVE LOPEZ BARRETO

Fecha: 10/07/2026

Anexo 21. Certificado del Revisor Fiscal – Interventoría

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL

CONSORCIO INTERPROVINCIA

NIT 902.021.551-9

CERTIFICAN QUE:

A la fecha, el **CONSORCIO INTERPROVINCIA**, Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 07 días del mes de julio del 2026.


Atentamente,

LUZ ANDREA FAJARDO C.
Representante Legal
CONSORCIO INTERPROVINCIA

YOHANA ALEXANDRA AVILA M.
Contadora
T.P 198620-T

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.461.611
FAJARDO CORREDOR
APELLIDOS
LUZ ANDREA
NOMBRES
FIRMA

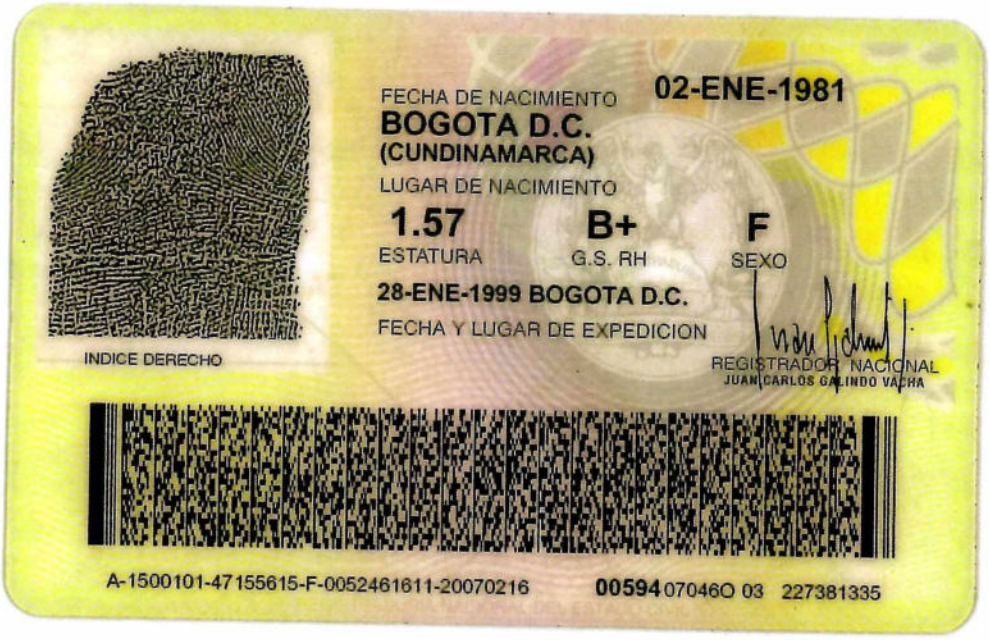
INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
28-ENE-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-1500101-47155615-F-0052461611-20070216 00594 07046O 03 227381335



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 53114069

AVILA MORALES
APELLIDOS

YOHANA ALEXANDRA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1984
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

25-OCT-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500115-47110252-F-0053114069-20030527 05894 03146P 01 139604076

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

198620-T



YOHANA ALEJANDRA
AVILA MORALES
C.C. 53114069
RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 23/12/2014
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 210906

200253

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D 1 B F 9 A F 9 B 1 1 3 5 9 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOHANA ALEXANDRA AVILA MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53114069 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 198620-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Anexo 22. Comunicados generados

GI-ICCU-0148-2026

Bogotá, D.C., 04 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Respuesta comunicado C-CPTESPEATONALES-ICCU-118
Volqueta SOD 894 para actividades del Contrato

Respetado Ingeniero:

Una vez revisada la documentación remitida mediante la comunicación del asunto, relacionada con la tarjeta de propiedad, manual de operación y mantenimiento, y hoja de vida del equipo destinado para las actividades del contrato, se informa que el siguiente equipo cuenta con la documentación aprobada:

- Volqueta SOD 894 Mack: Serie 1M2AG11C06M041949 SOAT N 92649156600101669 vigente hasta 20/09/2026 Hoja de vida del vehículo, y certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes RUNT No. No. 184136167 vigente hasta 23/09/2026.

No obstante, se precisa que la aprobación de la documentación queda sujeta a eventuales solicitudes de aclaración, ajuste o actualización que puedan derivarse de las observaciones que realice el ICCU.

Lo anterior, para su información y fines pertinentes.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de obra

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: LNL
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0149-2026

Bogotá, D.C., 04 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Requerimiento por incumplimiento en la atención de observaciones y entrega de documentación SST contractual

Respetado Ingeniero:

Como es de su conocimiento, esta Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, remitió la comunicación GI-ICCU-0101-2026 del 15 de mayo de 2026, mediante la cual se realizaron observaciones al Informe Mensual No. 1 – Versión 1 correspondiente a los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y MEV. Así mismo, el 22 de mayo de 2026 se realizó una mesa de trabajo con el fin de aclarar las observaciones realizadas y precisar los ajustes requeridos para la adecuada presentación del informe. En dicha reunión, el contratista manifestó expresamente su compromiso de atender integralmente los requerimientos realizados en la siguiente versión del documento.

Posteriormente, mediante la comunicación C-CPTESVEHICULARES-ICCU-121 del 25 de mayo de 2026, el Consorcio Puentes Vehiculares presentó respuesta a las observaciones realizadas. No obstante, una vez revisada la nueva versión del informe allegada, esta Interventoría evidenció que las observaciones realizadas no fueron subsanadas en su totalidad. En consecuencia, se envió la comunicación GI-ICCU-0120-2026 del 26 de mayo de 2026, mediante la cual se reiteraron las observaciones pendientes y se solicitó su correspondiente subsanación.

Adicionalmente, se recuerda al Contratista que, dentro de las obligaciones contractuales, se encuentra la entrega oportuna y completa de los informes de gestión relacionados con la implementación, seguimiento y control de las actividades y productos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como la entrega de los soportes correspondientes al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución del proyecto.

En este sentido, mediante la comunicación GI-ICCU-0124-2026 del 27 de mayo de 2026, esta Interventoría reiteró al contratista la necesidad de dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales y a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, enfatizando la importancia de contar con la documentación e información necesarias para evidenciar, soportar y verificar la gestión adelantada durante el período. No obstante, a la fecha persisten incumplimientos relacionados con la entrega completa de la información requerida, así como con la atención de las observaciones realizadas. Esta situación dificulta el ejercicio efectivo de las labores de seguimiento, control y verificación contractual, e impide validar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y en la normatividad aplicable.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

Por lo anterior, se solicita al Consorcio Puentes Vehiculares remitir de **manera inmediata** el Informe Mensual No. 1 – Versión 2 correspondiente a los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Ambiental y MEV, atendiendo de forma integral la totalidad de las observaciones y recomendaciones efectuadas. De igual manera, deberá allegar todos los soportes documentales pendientes, incluyendo las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y demás documentos exigidos contractualmente, con el fin de adelantar la correspondiente revisión y trámite ante la Entidad Contratante.

Finalmente, se informa que la reiterada falta de atención a las observaciones realizadas, así como el incumplimiento en la entrega oportuna de los informes de gestión SST y de los soportes de seguridad social, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista. En consecuencia, los atrasos que se deriven de dicha situación serán imputables al Consorcio Puentes Vehiculares, razón por la cual se procederá a informar a la Entidad Contratante para que de inicio a los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

Atentamente,



Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de obra

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Seguros del Estado Póliza de cumplimento No. 11-44-101278559; Carrera 13 No. 96-60 Bogotá D.C
Archivo
Elaboró: LNL
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0154-2026

Bogotá, D.C., 09 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Respuesta comunicado C-CPTESVEHICULARES-ICCU-136
Solicitud informe SST, Ambiental y MEV

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente, se informa que fue recibido el Informe Mensual No. 2 del Componente Técnico, el cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría. Sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente la entrega del Informe Mensual correspondiente a los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Ambiental y MEV, documento que, de acuerdo con las obligaciones contractuales y los plazos establecidos, debía ser radicado a más tardar el 05 de junio de 2026.

Lo anterior, con el fin de adelantar la correspondiente revisión por parte de la Interventoría y su posterior trámite ante la Entidad Contratante. En este sentido, se recomienda verificar que la documentación remitida se encuentre completa, debidamente organizada y acompañada de la totalidad de los soportes exigidos, con el propósito de evitar observaciones, solicitudes de ajuste o devoluciones durante el proceso de revisión.

Finalmente, se solicita remitir de **manera inmediata** el informe pendiente, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y evitar posibles afectaciones en los trámites administrativos asociados al contrato.

Atentamente,



Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de interventoría

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0169-2026

Bogotá, D.C., 16 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Observaciones SST, Ambiental y de Equipos en el seguimiento de actividades de obra en el municipio de Pacho – Sector Zipaquirá – Pacho PR 16+400

Respetado Ingeniero:

Durante la visita de seguimiento y el recorrido realizado el 12 de junio de 2026 a las actividades de atención de emergencias en el municipio de Pacho – Sector Zipaquirá Pacho – PR 16+400, se evidenciaron las siguientes observaciones, las cuales fueron comunicadas oportunamente a los profesionales responsables y registradas en la respectiva bitácora de obra.

Recorrido de Seguimiento y Control SST y Ambiental

Se solicita el acompañamiento y la supervisión de las actividades por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, así como el apoyo y seguimiento a las actividades ambientales correspondientes.

Ambiental – Sector Zipaquirá – Pacho

1. Realizar jornadas periódicas de orden y aseo en las áreas de trabajo, garantizando condiciones adecuadas de limpieza y organización.
2. Gestionar ante la Entidad Contratante, el retiro o la reubicación de materiales que no corresponden al proyecto y que se encuentran dentro del área de intervención.
3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización instalada, implementando mecanismos que garanticen la estabilidad y permanencia de la señalización de proximidad a obra.

Seguridad y Salud en el Trabajo – Sector Zipaquirá – Pacho

1. Reemplazar el botiquín de la retroexcavadora 410: Este elemento debe contar con un sistema de almacenamiento adecuado y disponer de la totalidad de los insumos requeridos y en óptimas condiciones de uso.
2. Suministrar al personal la indumentaria corporativa y los Elementos de Protección Personal (EPP): Estos elementos son necesarios para el desarrollo seguro de las actividades. Durante el recorrido se evidenció personal sin protección respiratoria y sin la indumentaria con los logos de la Entidad Contratante.
3. Realizar una charla de sensibilización sobre el uso obligatorio y permanente de botas y casco de seguridad en todos los frentes de trabajo. Durante la inspección se evidenció personal utilizando tenis y sin casco de seguridad.
4. Adaptar ingresos y salidas seguras de las excavaciones.
5. Socializar con el personal la importancia del uso adecuado de la indumentaria corporativa, evitando la combinación de prendas pertenecientes a otras entidades o empresas.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

6. Suministrar a los auxiliares de tráfico herramientas de comunicación apropiadas que permitan coordinar de manera eficiente y segura el flujo vehicular en las zonas de intervención.
7. Remitir oportunamente a la interventoría la relación de la persona programada para desarrollar la actividad de control de tráfico diurna y nocturna en frente de obra con el respectivo plan de acción para su ejecución.
8. Reforzar la señalización y demarcación de las áreas de trabajo, así como instalar la señalización ocupacional requerida para la prevención de riesgos y la protección de trabajadores y usuarios de la vía.

En el siguiente registro fotográfico se evidencian las situaciones anteriormente descritas.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Adaptar ingresos y salidas seguras de las excavaciones.</td><td>Suministrar botiquín en buen estado y extintor Retro 410</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Suministrar EPP y dotación al personal</td><td>Instalar señalización ocupacional</td></tr>
</table>

Por lo anterior, se solicita al contratista atender las observaciones de **manera inmediata** y remitir un informe con registro fotográfico, donde se evidencie las acciones correctivas tomadas, para revisión por parte de la interventoría. Así mismo, se recuerda al contratista que el profesional SST tienen una dedicación del 100% en el proyecto; no obstante, a la fecha no se ha evidenciado su presencia en campo. En caso de continuar así, se solicitará el cambio del profesional y se informará a la Entidad Contratante para que de inicio a los actos administrativos a los que haya lugar.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de obra

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0175-2026

Bogotá, D.C., 18 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Respuesta comunicado C-CPTESPEATONALES-ICCU-151
Observaciones Informe mensual Seguridad y Salud en el Trabajo SST Ambiental MEV número 2 v1

Respetado Ingeniero:

Una vez revisada la documentación remitida mediante la comunicación del asunto, relacionada con Informe Mensual No. 2 del Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, Ambiental y Maquinaria, Equipos y Vehículos - MEV, se informa que se presentan las siguientes observaciones:

- Ajustar la numeración de la tabla de contenido y la información registrada en el control de versiones del informe.
- Dar respuesta a cada una de las observaciones formuladas de manera organizada y puntual

COMPONENTE SST

1. **PERSONAL SST CONTRATISTA:** Incluir en el informe un ítem que contenga una tabla con la relación del personal de plantilla mínima exigida para el proyecto y el personal efectivamente vinculado durante el período evaluado, indicando nombre, cargo, fecha de ingreso y estado de vinculación.

2. **INGRESOS:** Relacionar en el informe base, los nombres y cargos del personal vinculado.

3. **SEGUIMIENTO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**: Relacionar e incluir el registro en formato PDF y editable de la verificación del pago de planillas de seguridad social del personal.

4. **ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Indicar los frentes de obra intervenidos durante el periodo. Así mismo, en el ítem de inducción, verificar la información, la cual debe coincidir con la cantidad de ingresos e inducción realizadas.

5. **COPASST Y CCL:** En el informe, describir el seguimiento realizado a lo relacionando con los temas abordados e indicar si se reportaron o no quejas

6. **OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG-SST:** Estructurar la tabla de registro permitiendo verificar el avance de los objetivos y metas SST definidos e indicar la participación en cada uno justificando así el porcentaje del periodo.}

7. **CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS:** Indicar las acciones y actividades reprogramadas según el plan de trabajo

8. **MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO:** Relacionar y registrar cuales fueron las actividades de prevención y promoción mencionadas paralelas a los exámenes ocupacionales.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

9. **PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**: Indicar el número de inducciones realizadas, capacitaciones ejecutadas, ATS elaborados, inspecciones preoperacionales efectuadas y número de trabajadores beneficiados durante el período reportado.

10. **DOTACIÓN Y EPP**: Incluir el registro de las inspecciones de dotación y EPP realizada durante el periodo.

11. **PROGRAMA DE INSPECCIONES**: En atención al cumplimiento del 100% de las inspecciones programadas, registrado en el informe, incluir relación de las acciones correctivas implementadas de gestión y seguimiento. Igualmente, relacionar el número de inspecciones programadas y ejecutadas, equipos inspeccionados, hallazgos encontrados, acciones correctivas y preventivas implementadas, responsables, evidenciando el control de riesgos operacionales.

12. **ATS:** Indicar en el informe las actividades específicas a las cuales se les generó el ATS, detallando las tareas cubiertas por cada análisis.

COMPONENTE AMBIENTAL

1. **MANEJO INTEGRAL DE RCD:** Ajustar y verificar el volumen registrado en la Tabla 1. Reporte de Disposición de RCD mayo 2026 y el relacionado en el texto del ítem del informe.

2. **COMPONENTE AMBIENTAL:** Incluir indicadores ambientales cuantificables que permitan demostrar el cumplimiento de metas ambientales conforme al PMA del proyecto.

3. **ACTIVIDADES AMBIENTALES:** Relacionar cantidad de inducciones realizadas.

4. **CONTROL DE VERSIONES:** Ajustar el registro de la versión y la fecha de descripción

ANEXOS

1. **Anexo 1 - Registro de Personal**

- Verificar el registro del formato, completar los espacios en blanco e incluir el PDF firmado por el profesional SST.

2. **Anexo 2 - Documentos de ingreso**

- Adjuntar los certificados de afiliación a EPS, ARL, AFP y CCF con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de expedición. Se reitera que los formatos emitidos por las entidades para trámites internos, consultas o validaciones de servicio no constituyen certificados de afiliación, por lo que se requiere que sea el certificado expedido por cada entidad prestadora de servicio.

- Remitir los documentos de ingreso de manera legible y actualizada: Durante la verificación documental se evidenciaron soportes con deficiencias de legibilidad y documentos desactualizados, limitando la validación de la información
  1. Migdonio Rodríguez Córdoba: Adjuntar certificado de EPS no mayor a 30 días, no formulario de tramite interno de novedades ante la EPS, remitir EL certificado ARL actualizado en la cual se evidencia al trabajador en estado de cobertura (Adjuntar documento de identidad legible)
  2. Hadwin Andres Santana Cuesta: Adjuntar documento de identidad legible e incluir el examen médico ocupacional.
  3. Cesar Tulio Torres Maturana: Adjuntar documento de identidad legible e incluir le examen médico ocupacional.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

4. Cesar Enrique Rodríguez Córdoba: Adjuntar certificado de EPS no mayor a 30 días , no formulario de tramite interno de novedades ante la EPS , remitir certificado ARL actualizado en la cual se evidencia al trabajador en estado de cobertura (Adjuntar documento de identidad legible)

3. Anexo 3 Seguridad social

- Adjuntar las planillas completas de seguridad social correspondientes al período del informe: Durante la verificación documental se evidencian soportes de pago de seguridad social únicamente para algunos trabajadores; sin embargo, se encuentran pendientes 14 soportes de pago, por lo que se requiere remitir la totalidad de las planillas correspondientes al personal vinculado al contrato durante el período evaluado.

  En la verificación de documentación se evidenciaron los soportes de pago de seguridad social para los siguientes trabajadores:

  1. Mora Chipatecua Argemiro – Planilla N.° 86138265, período de cotización mayo.
  2. Hernández Bello Luis Eduardo – Planilla N.° 86141515, período de cotización mayo.
  3. Morales Osso José Alexander – Planilla N.° 86141515. período de cotización mayo.
  4. Moreno Ramírez Gustavo Adolfo – Planilla N.° 86066680. período de cotización mayo.
  5. Moreno Norman Alberto – Planilla N.° 86141515. período de cotización mayo.
  6. Hernández Rodríguez Parmenio – Planilla N.° 86138943. período de cotización mayo.
  7. Alonso Peñuela Uriel – Planilla N.° 86138265. período de cotización mayo.
  8. Díaz Suárez Óscar Iván – Planilla N.° 86139573. período de cotización mayo.
  9. Vásquez Pinzón Roberto – Planilla N.° 86139573. período de cotización mayo

- Remitir los soportes de pago de seguridad social correspondientes a la totalidad del personal reportado para el período objeto de evaluación: Durante la verificación documental se evidencia que no se cuenta con la totalidad de las planillas que permitan validar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de todo el personal vinculado a la ejecución del proyecto.

  1. José armando Ruiz Angarita - Especialista Geotecnia
  2. Adalberto Echeverry Gómez - Especialista Estructuras
  3. Ricardo Sativa Cobos - Director de obra
  4. Rene Borja – Director de obra
  5. Luis Felipe Ardila Velasco Ingeniero Residente
  6. Ivan Javier Giraldo Ingeniero Inspector
  7. Fabio Forero Conductor Volqueta
  8. Luis Alberto Díaz Salcedo Operador Maquinaria
  9. William Javier Huertas Jurado Conductor Volqueta
  10. Díaz Alix Anzola Chavez Topógrafa
  11. Luis Ernesto Aponte Martínez Conductor volqueta
  12. Julio Cesar Alonso Rubiano Conductor Volqueta
  13. Bertulfo de la Oz Montealegre Oficial
  14. Víctor Julián Gaona Díaz Operador
  15. Helminto Montoya Medina Ayudante

- Verificar, se adjunta la planilla de pago correspondiente a Ardila Sánchez Ariosto; sin embargo, este trabajador no se encuentra relacionado en el registro de personal presentado, por lo que se solicita aclarar su vinculación al contrato.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

- Incluir el registro de verificación de pagos de las planillas de seguridad social y adjuntar las planillas correspondientes al período del informe.

4. Anexo 4 - Capacitación

- Describir en el informe las acciones necesarias para garantizar la participación de los trabajadores faltantes y remitir los soportes correspondientes, con el fin de asegurar la divulgación y apropiación de los temas tratados por parte de todo el personal vinculado al proyecto. Durante la verificación de los registros de asistencia de la capacitación sobre COPASST y CCL, se evidenció la participación de 10 trabajadores de un total de 28 vinculados al proyecto.

5. Anexo 5 Entrega de dotación y EPP

- Ajustar y remitir los registros de entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP) de manera individual, teniendo en cuenta que el control y seguimiento de la entrega debe realizarse por cada trabajador.

- Adjuntar los registros de entrega de dotación y EPP de todo el personal.

6. Anexo 6 - Inspecciones

- Adjuntar el registro fotográfico de los equipos de emergencia relacionados en las inspecciones realizadas, con el fin de evidenciar su estado, ubicación y condiciones de operatividad.

- Verificar y ajustar los formatos de inspección presentados, toda vez que se evidencian registros incompletos. Se requiere incluir la totalidad de la información necesaria para garantizar la trazabilidad de la inspección, incluyendo la fecha de ejecución y demás campos aplicables.

- Incluir las inspecciones planeadas definidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la programación establecida para el período evaluado, y remitir los respectivos soportes de ejecución.

7. Anexo 7 - ATS

- Adjuntar los registros de ATS (Análisis de Trabajo Seguro) correspondientes al período evaluado, asegurando que estos sean legibles, completos y debidamente diligenciados.

- Remitir los ATS, que correspondan a la totalidad de los frentes de obra intervenidos durante el período reportado, permitiendo verificar las actividades ejecutadas, los riesgos identificados y las medidas de control implementadas para cada una de ellas.

8. Anexo 8 - Control de vales RCD

- Verificar y ajustar la información reportada respecto a la generación, aprovechamiento y disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) correspondientes al período evaluado. Se evidencia inconsistencia entre el volumen total de RCD reportado como generado (250 m³) y el volumen relacionado en los soportes de disposición y aprovechamiento presentados (245 m³). Adicionalmente, la certificación emitida por la Alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama para la recepción de material de excavación no registra el volumen dispuesto (215 m³), lo que limita la trazabilidad y verificación de las cantidades efectivamente gestionadas.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

- Complementar los soportes que acrediten la destinación, aprovechamiento o reutilización del material entregado, incluyendo los respectivos registros de cantidades, ubicación de los sitios de recepción y evidencias que permitan validar la gestión ambiental realizada, teniendo en cuenta que el sitio receptor utilizado para la adecuación de terrenos no corresponde a un gestor de disposición final.

9. Anexo 9 - Gestión de solicitud de certificaciones RCD

- Complementar la información mediante registros, controles, actas, remisiones u otros soportes que permitan verificar las cantidades efectivamente entregadas y gestionadas durante el período reportado.

10. Anexo 10 Control de materiales

- Realizar la validación y ajuste de la información, de manera que exista trazabilidad y correspondencia entre los soportes aportados y los volúmenes efectivamente utilizados durante el período evaluado.

11. Anexo 11 - Gestión de solicitud de certificaciones Materiales

- Adjuntar los certificados de material correspondientes a la totalidad de los materiales relacionados en la tabla consolidada de materiales utilizados durante el período del informe. Durante la verificación documental, únicamente se evidencia soporte para 26,63 m³ de material MD-19 del proveedor DOBLE A INGENIERIA S.A.S

- Verificar y ajustar el volumen de los vales de materiales reportados y el consolidado registrado.

Por lo anterior, se solicita remitir la subsanación de las observaciones para revisión de la interventoría y trámite ante la Entidad Contratante.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de obra

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: LNL
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0175-2026

Bogotá, D.C., 18 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Respuesta comunicado C-CPTESPEATONALES-ICCU-151
Observaciones Informe mensual Seguridad y Salud en el Trabajo SST Ambiental MEV número 2 v1

Respetado Ingeniero:

Una vez revisada la documentación remitida mediante la comunicación del asunto, relacionada con Informe Mensual No. 2 del Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, Ambiental y Maquinaria, Equipos y Vehículos - MEV, se informa que se presentan las siguientes observaciones:

- Ajustar la numeración de la tabla de contenido y la información registrada en el control de versiones del informe.
- Dar respuesta a cada una de las observaciones formuladas de manera organizada y puntual

COMPONENTE SST

1. **PERSONAL SST CONTRATISTA:** Incluir en el informe un ítem que contenga una tabla con la relación del personal de plantilla mínima exigida para el proyecto y el personal efectivamente vinculado durante el período evaluado, indicando nombre, cargo, fecha de ingreso y estado de vinculación.

2. **INGRESOS:** Relacionar en el informe base, los nombres y cargos del personal vinculado.

3. **SEGUIMIENTO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**: Relacionar e incluir el registro en formato PDF y editable de la verificación del pago de planillas de seguridad social del personal.

4. **ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Indicar los frentes de obra intervenidos durante el periodo. Así mismo, en el ítem de inducción, verificar la información, la cual debe coincidir con la cantidad de ingresos e inducción realizadas.

5. **COPASST Y CCL:** En el informe, describir el seguimiento realizado a lo relacionando con los temas abordados e indicar si se reportaron o no quejas

6. **OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG-SST:** Estructurar la tabla de registro permitiendo verificar el avance de los objetivos y metas SST definidos e indicar la participación en cada uno justificando así el porcentaje del periodo.}

7. **CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS:** Indicar las acciones y actividades reprogramadas según el plan de trabajo

8. **MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO:** Relacionar y registrar cuales fueron las actividades de prevención y promoción mencionadas paralelas a los exámenes ocupacionales.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

9. **PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**: Indicar el número de inducciones realizadas, capacitaciones ejecutadas, ATS elaborados, inspecciones preoperacionales efectuadas y número de trabajadores beneficiados durante el período reportado.

10. **DOTACIÓN Y EPP**: Incluir el registro de las inspecciones de dotación y EPP realizada durante el periodo.

11. **PROGRAMA DE INSPECCIONES**: En atención al cumplimiento del 100% de las inspecciones programadas, registrado en el informe, incluir relación de las acciones correctivas implementadas de gestión y seguimiento. Igualmente, relacionar el número de inspecciones programadas y ejecutadas, equipos inspeccionados, hallazgos encontrados, acciones correctivas y preventivas implementadas, responsables, evidenciando el control de riesgos operacionales.

12. **ATS:** Indicar en el informe las actividades específicas a las cuales se les generó el ATS, detallando las tareas cubiertas por cada análisis.

COMPONENTE AMBIENTAL

1. **MANEJO INTEGRAL DE RCD:** Ajustar y verificar el volumen registrado en la Tabla 1. Reporte de Disposición de RCD mayo 2026 y el relacionado en el texto del ítem del informe.

2. **COMPONENTE AMBIENTAL:** Incluir indicadores ambientales cuantificables que permitan demostrar el cumplimiento de metas ambientales conforme al PMA del proyecto.

3. **ACTIVIDADES AMBIENTALES:** Relacionar cantidad de inducciones realizadas.

4. **CONTROL DE VERSIONES:** Ajustar el registro de la versión y la fecha de descripción

ANEXOS

1. **Anexo 1 - Registro de Personal**

- Verificar el registro del formato, completar los espacios en blanco e incluir el PDF firmado por el profesional SST.

2. **Anexo 2 - Documentos de ingreso**

- Adjuntar los certificados de afiliación a EPS, ARL, AFP y CCF con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de expedición. Se reitera que los formatos emitidos por las entidades para trámites internos, consultas o validaciones de servicio no constituyen certificados de afiliación, por lo que se requiere que sea el certificado expedido por cada entidad prestadora de servicio.

- Remitir los documentos de ingreso de manera legible y actualizada: Durante la verificación documental se evidenciaron soportes con deficiencias de legibilidad y documentos desactualizados, limitando la validación de la información
  1. Migdonio Rodríguez Córdoba: Adjuntar certificado de EPS no mayor a 30 días, no formulario de tramite interno de novedades ante la EPS, remitir EL certificado ARL actualizado en la cual se evidencia al trabajador en estado de cobertura (Adjuntar documento de identidad legible)
  2. Hadwin Andres Santana Cuesta: Adjuntar documento de identidad legible e incluir el examen médico ocupacional.
  3. Cesar Tulio Torres Maturana: Adjuntar documento de identidad legible e incluir le examen médico ocupacional.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

4. Cesar Enrique Rodríguez Córdoba: Adjuntar certificado de EPS no mayor a 30 días , no formulario de tramite interno de novedades ante la EPS , remitir certificado ARL actualizado en la cual se evidencia al trabajador en estado de cobertura (Adjuntar documento de identidad legible)

3. Anexo 3 Seguridad social

- Adjuntar las planillas completas de seguridad social correspondientes al período del informe: Durante la verificación documental se evidencian soportes de pago de seguridad social únicamente para algunos trabajadores; sin embargo, se encuentran pendientes 14 soportes de pago, por lo que se requiere remitir la totalidad de las planillas correspondientes al personal vinculado al contrato durante el período evaluado.

  En la verificación de documentación se evidenciaron los soportes de pago de seguridad social para los siguientes trabajadores:

  1. Mora Chipatecua Argemiro – Planilla N.° 86138265, período de cotización mayo.
  2. Hernández Bello Luis Eduardo – Planilla N.° 86141515, período de cotización mayo.
  3. Morales Osso José Alexander – Planilla N.° 86141515. período de cotización mayo.
  4. Moreno Ramírez Gustavo Adolfo – Planilla N.° 86066680. período de cotización mayo.
  5. Moreno Norman Alberto – Planilla N.° 86141515. período de cotización mayo.
  6. Hernández Rodríguez Parmenio – Planilla N.° 86138943. período de cotización mayo.
  7. Alonso Peñuela Uriel – Planilla N.° 86138265. período de cotización mayo.
  8. Díaz Suárez Óscar Iván – Planilla N.° 86139573. período de cotización mayo.
  9. Vásquez Pinzón Roberto – Planilla N.° 86139573. período de cotización mayo

- Remitir los soportes de pago de seguridad social correspondientes a la totalidad del personal reportado para el período objeto de evaluación: Durante la verificación documental se evidencia que no se cuenta con la totalidad de las planillas que permitan validar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de todo el personal vinculado a la ejecución del proyecto.

  1. José armando Ruiz Angarita - Especialista Geotecnia
  2. Adalberto Echeverry Gómez - Especialista Estructuras
  3. Ricardo Sativa Cobos - Director de obra
  4. Rene Borja – Director de obra
  5. Luis Felipe Ardila Velasco Ingeniero Residente
  6. Ivan Javier Giraldo Ingeniero Inspector
  7. Fabio Forero Conductor Volqueta
  8. Luis Alberto Díaz Salcedo Operador Maquinaria
  9. William Javier Huertas Jurado Conductor Volqueta
  10. Díaz Alix Anzola Chavez Topógrafa
  11. Luis Ernesto Aponte Martínez Conductor volqueta
  12. Julio Cesar Alonso Rubiano Conductor Volqueta
  13. Bertulfo de la Oz Montealegre Oficial
  14. Víctor Julián Gaona Díaz Operador
  15. Helminto Montoya Medina Ayudante

- Verificar, se adjunta la planilla de pago correspondiente a Ardila Sánchez Ariosto; sin embargo, este trabajador no se encuentra relacionado en el registro de personal presentado, por lo que se solicita aclarar su vinculación al contrato.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

- Incluir el registro de verificación de pagos de las planillas de seguridad social y adjuntar las planillas correspondientes al período del informe.

4. Anexo 4 - Capacitación

- Describir en el informe las acciones necesarias para garantizar la participación de los trabajadores faltantes y remitir los soportes correspondientes, con el fin de asegurar la divulgación y apropiación de los temas tratados por parte de todo el personal vinculado al proyecto. Durante la verificación de los registros de asistencia de la capacitación sobre COPASST y CCL, se evidenció la participación de 10 trabajadores de un total de 28 vinculados al proyecto.

5. Anexo 5 Entrega de dotación y EPP

- Ajustar y remitir los registros de entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP) de manera individual, teniendo en cuenta que el control y seguimiento de la entrega debe realizarse por cada trabajador.

- Adjuntar los registros de entrega de dotación y EPP de todo el personal.

6. Anexo 6 - Inspecciones

- Adjuntar el registro fotográfico de los equipos de emergencia relacionados en las inspecciones realizadas, con el fin de evidenciar su estado, ubicación y condiciones de operatividad.

- Verificar y ajustar los formatos de inspección presentados, toda vez que se evidencian registros incompletos. Se requiere incluir la totalidad de la información necesaria para garantizar la trazabilidad de la inspección, incluyendo la fecha de ejecución y demás campos aplicables.

- Incluir las inspecciones planeadas definidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la programación establecida para el período evaluado, y remitir los respectivos soportes de ejecución.

7. Anexo 7 - ATS

- Adjuntar los registros de ATS (Análisis de Trabajo Seguro) correspondientes al período evaluado, asegurando que estos sean legibles, completos y debidamente diligenciados.

- Remitir los ATS, que correspondan a la totalidad de los frentes de obra intervenidos durante el período reportado, permitiendo verificar las actividades ejecutadas, los riesgos identificados y las medidas de control implementadas para cada una de ellas.

8. Anexo 8 - Control de vales RCD

- Verificar y ajustar la información reportada respecto a la generación, aprovechamiento y disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) correspondientes al período evaluado. Se evidencia inconsistencia entre el volumen total de RCD reportado como generado (250 m³) y el volumen relacionado en los soportes de disposición y aprovechamiento presentados (245 m³). Adicionalmente, la certificación emitida por la Alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama para la recepción de material de excavación no registra el volumen dispuesto (215 m³), lo que limita la trazabilidad y verificación de las cantidades efectivamente gestionadas.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

- Complementar los soportes que acrediten la destinación, aprovechamiento o reutilización del material entregado, incluyendo los respectivos registros de cantidades, ubicación de los sitios de recepción y evidencias que permitan validar la gestión ambiental realizada, teniendo en cuenta que el sitio receptor utilizado para la adecuación de terrenos no corresponde a un gestor de disposición final.

9. Anexo 9 - Gestión de solicitud de certificaciones RCD

- Complementar la información mediante registros, controles, actas, remisiones u otros soportes que permitan verificar las cantidades efectivamente entregadas y gestionadas durante el período reportado.

10. Anexo 10 Control de materiales

- Realizar la validación y ajuste de la información, de manera que exista trazabilidad y correspondencia entre los soportes aportados y los volúmenes efectivamente utilizados durante el período evaluado.

11. Anexo 11 - Gestión de solicitud de certificaciones Materiales

- Adjuntar los certificados de material correspondientes a la totalidad de los materiales relacionados en la tabla consolidada de materiales utilizados durante el período del informe. Durante la verificación documental, únicamente se evidencia soporte para 26,63 m³ de material MD-19 del proveedor DOBLE A INGENIERIA S.A.S

- Verificar y ajustar el volumen de los vales de materiales reportados y el consolidado registrado.

Por lo anterior, se solicita remitir la subsanación de las observaciones para revisión de la interventoría y trámite ante la Entidad Contratante.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de obra

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: LNL
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0179-2026

Bogotá, D.C., 19 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Respuesta comunicado C-CPTESPEATONALES-ICCU-150
Aprobación Informe No. 1 - V2 de Gestión SST, Ambiental y Maquinaria, Equipos y Vehículos.

Respetado Ingeniero:

Una vez revisada la documentación remitida mediante la comunicación del asunto, correspondiente al Informe Mensual No. 1 Versión 2 de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Gestión Ambiental y Maquinaria, Equipos y Vehículos (MEV), y en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta Interventoría, se emite concepto de aprobación del informe en referencia.

No obstante, se precisa que la documentación aprobada queda sujeta a eventuales solicitudes de aclaración, complementación, modificación o ajuste que puedan surgir como resultado de las observaciones, requerimientos o revisiones posteriores que realice el ICCU.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de obra

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: LNL
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0179-2026

Bogotá, D.C., 19 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Respuesta comunicado C-CPTESPEATONALES-ICCU-150
Aprobación Informe No. 1 - V2 de Gestión SST, Ambiental y Maquinaria, Equipos y Vehículos.

Respetado Ingeniero:

Una vez revisada la documentación remitida mediante la comunicación del asunto, correspondiente al Informe Mensual No. 1 Versión 2 de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Gestión Ambiental y Maquinaria, Equipos y Vehículos (MEV), y en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta Interventoría, se emite concepto de aprobación del informe en referencia.

No obstante, se precisa que la documentación aprobada queda sujeta a eventuales solicitudes de aclaración, complementación, modificación o ajuste que puedan surgir como resultado de las observaciones, requerimientos o revisiones posteriores que realice el ICCU.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de obra

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: LNL
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0205-2026

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026

Ing. Laura Daniela Nieto Gutierrez
Directora Técnica – Dirección de Caminos
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Recomendación aplicación clausula 14- Multas
Informe de presunto incumplimiento.

Respetado Ingeniero:

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por esta interventoría, al cumplimiento, por parte del contratista de obra, de las obligaciones establecidas en los documentos que rigen el contrato de obra N° ICCU-CTO-214-2026, a continuación, nos permitimos indicar el estado del contrato:

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato:	Obra	**Número:**	ICCU-CTO-214-2026
Objeto: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAME, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO.			
Contratista:	BERNARDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ CON CC 19.221.211 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A CON NIT 830.107.316-4 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 40% CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ SAS CON NIT 900.522.125-7 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 10%		
Valor Actual del contrato:	SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA (COP). M/CTE ($7.168.684.875).		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	12 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
Fecha de inicio del contrato:	17/03/2026	**Fecha de terminación del contrato:**	31/12/2026

CONTROL PROGRAMACION GENERAL DE OBRA		
Plazo del contrato transcurrido	97 días	**Nota:** Datos a corte del día 21 de junio de 2026 reportado en el informe semanal No. 14
Porcentaje programado	8.51%	
Porcentaje ejecutado	7.09%	
Atraso (-) o adelanto (+)	-1.42%	

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

A la fecha se han asignado por parte del ICCU el 58.87% del valor total del contrato, es decir $ 4.219.996.699,94, como se evidencia a continuación:

RELACIÓN LOTE No. 2 - CONTRATO ICCU No. 214-2026	
DATOS GENERALES - CONTRATO	**VALOR TOTAL CON AIU**
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 7.168.684.875,00
VALOR INVERSIÓN OBRAS	$ 3.997.699.800,58
VALOR TOTAL OBRAS TRANSITABILIDAD	$ 222.296.899,36
VALOR TOTAL OBRAS + TRANSITABILIDAD	$ 4.219.996.699,94
Valor Sobrante Contrato A la fecha	$ 2.948.688.175,06

Con respecto al valor de las obras de inversión se informa que este se encuentra distribuidas de la siguiente manera:

No	MUNICIPIO	PROVINCIA	NOMBRE VÍA Y SECTOR	TIPO INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU
1	YACOPÍ	RIONEGRO	Corredor vial que comunica al Municipio Yacopí con la inspección aposentos	Construcción de un Box doble con barandas	$ 621.245.256,54
2	SASAIMA	GUALIVA	Corredor vial que comunica Municipio de Sasaima - con la vereda San Bernardo quebrada Blanca sector chuzo pelado	*Revestimiento de los gaviones *Construcción dado en la parte base de los gaviones protección en concreto ciclópeo	$ 30.819.870,90
3	PACHO	RIONEGRO	Corredor vial que comunica al Municipio de Pacho desde la troncal Rio negro hacia la inspección de Pasuncha - Puente vehicular sobre el rio negro	Construcción Barandas Metálicas	$ 99.292.188,28
4	EL COLEGIO	TEQUENDAMA	Corredor vial departamental que comunica Chuzaca - el portillo a la altura casco urbano municipio El Colegio	Construcción de seis (06) reductores viales	$ 67.919.900,00
5	QUIPILE	TEQUENDAMA	La vía que comunica el municipio de Quipile con el sector de Limonal,	Construcción de gaviones, cunetas filtros	$ 309.429.007,06
6	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	TEQUENDAMA	vía que conduce hacia Santandercito, específicamente en el sector denominado Paso Malo, en el PR 4+500.	Rehabilitación del tramo, se recomienda usar la estructura del pavimento articulado Adicionalmente reparación estructura de drenaje	$ 550.242.123,28
7	TOPAIPÍ	RIONEGRO	se localiza en el sector de Quebrada Honda, en la vía que comunica la inspección de San Antonio Aguilera con la inspección de Pasuncha, en zona limítrofe entre los municipios de Topaipí y Pacho.	Reparación box coulvert y aletas de encole y descole	$ 200.616.438,09
8	GUAYABAL DE SÍQUIMA	MAGDALENA CENTRO	la vía Alpes – Reventones, específicamente en el sector El Trigo.	Construcción filtro para evacuar el agua y el mejoramiento de suelo con rajón, rectificación del alineamiento que se desplazó para recuperar la vía.	$ 94.919.225,00
9	ANOLAIMA	TEQUENDAMA	Anolaima-corralejas PR 6+500 Muro de 15 mts	Construcción de muro de contención con cimentación profunda.	$ 344.962.094,10
10	VILLAGÓMEZ	RIONEGRO	Villagómez - Puente Tabla Vereda Buenavista	Construcción de muro de contención con cimentación profunda.	$ 244.615.735,29
11	NOCAIMA	GUALIVA	Vereda El Volcán, en el municipio de Nocaima.	Construcción de la placa huella ubicada en la vereda El Volcán,	$ 243.061.976,00
12	PACHO	RIONEGRO	SECTTOR LA M, ANTES DE PACHO	Mejoramiento de estructura para asfaltar el tramo en el sector la M	$ 311.155.377,56
13	NOCAIMA	GUALIVA	PUENTE SECTOR LA MOYA	Demolición estructura	$15.000.000,00
14	NOCAIMA	GUALIVA	VEREDA EL VOLCAN	Construcción gaviones	$10.590.000,00
15	ZIPAQUIRÁ	SABANA CENTRO	Troncal del rio negro, vía Zipaquirá – pacho PR16+400	Terminar actividades de la estructura de pavimento	$ 416.915.304,24
16	ZIPAQUIRÁ	SABANA CENTRO	troncal del rio negro, vía Zipaquirá – pacho PR18+100	Terminar actividades de la estructura de pavimento	$416.915.304,24
17	FACATATIVÁ	SABANA OCCIDENTE	Los Micos – Municipio de Facatativá	Solicitud de inicio de actividades de desmonte controlado del Campamento Los Micos – Municipio de Facatativá	$ 20.000.000,00

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

No	MUNICIPIO	PROVINCIA	NOMBRE VÍA Y SECTOR	TIPO INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU
VALOR TOTAL COMPROMETIDO ATENCIÓN EMERGENCIAS					$ 3.997.699.800

Vale la pena aclarar que los valores de los frentes de trabajo son aproximados y corresponde a los presupuestos iniciales, estos están sujetos ajuste una vez se finalice la intervención del frente de trabajo.

El valor de los recursos comprometidos para las obras de transitabilidad corresponde a los siguientes municipios:

No.	MUNICIPIO	PROVINCIA	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU
1001	BITUIMA	MAGDALENA CENTRO	$ 25.105.266
1002	QUIPILE	TEQUENDAMA	$ 6.881.192
1003	LA PALMA	RIONEGRO	$ 37.669.779
1004	SUPATÁ	GUALIVA	$ 25.105.266
1005	SUBACHOQUE	SABANA OCCIDENTE	$ 6.608.880
1006	GUACHETÁ	UBATÉ	$ 23.603.238
1007	TENA	TEQUENDAMA	$ 0
1008	CAPARRAPÍ	BAJO MAGDALENA	$ 1.853.884
1009	LA PALMA	RIONEGRO	$ 12.552.633
1010	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	TEQUENDAMA	$ 66.000.000
1011	VILLETA	GUALIVA	$ 8.458.380
1012	YACOPÍ	RIONEGRO	$ 8.458.380
VALOR TOTAL COMPROMETIDO OBRAS TRANSITABILIDAD			$ 222.296.899

A la fecha el Consorcio Puentes Vehiculares ha tramitado solo el acta de obra No. 01 con corte al 31 de mayo de 2026 por un valor de $ 154.909.778,00 incluido AIU, correspondiente al 2.16% del valor del contrato.

1.1 ESTADO ACTUAL DE CADA UNO DE LOS FRENTES DEL CONTRATO

1.1.1 TRAMO SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA

Las actividades de obra iniciaron el pasado 28 de abril de 2026, a la fecha se tiene un avance del 53.28% con respecto al presupuesto inicial aprobado. Así mismo, se informa que a la fecha, el contratista se encuentra terminando la actividad de lleno en SBG, como se observa a continuación:

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974





Y se avanza con las actividades de construcción de los filtros, como se puede observar





Si bien es cierto se avanza con las actividades de obra, esta interventoría resalta que se han presentado suspensiones de las actividades debido a falta de material en campo.

1.1.2 TRAMO EL COLEGIO

Las actividades de obra iniciaron el pasado 23 de abril de 2026, a la fecha se tiene un avance del 96.20% con respecto al presupuesto inicial aprobado, a la fecha está pendiente realizar las actividades de demarcación horizontal de los resaltos, la cual ya se puede ejecutar teniendo en cuenta que ya se completó un mes desde que se instaló la carpeta asfáltica.

1.1.3 TRAMO YACOPI

Vale la pena aclarar que la intervención de este frente de trabajo se autorizó por parte del ICCU desde el 07 de abril de 2026 y solo hasta el 11 de mayo de 2026 se comenzaron a realizar las actividades de adecuación por parte del contratista, a la fecha se tiene un avance del 5.27% con respecto al presupuesto inicial aprobado; así

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

mismo, se informa que solo realizado las actividades de adecuación de la zona para intervención, las cuales se realizaron entre el 11 y 22 de mayo de 2026.

Durante la semana del 25 al 31 de mayo de 2026 no se realizaron actividades por parte del contratista y solo el 01 de junio de 2026 el Consorcio Puentes Vehiculares manifestó que al momento de la implantación del box coulvert, se evidencio la necesidad de hacer unas obras adicionales debido a la fuerte ola invernal del mes de mayo.

A continuación, se presenta registro fotográfico del estado actual del sitio de la obra:



Esta interventoría aclara que a través de la comunicación GI-ICCU-0155-2026 del 12 de junio de 2026, se programó visita en conjunto con el fin de evaluar las alternativas presentadas en el informa, no obstante, el 18 de junio de 2026 no se contó con la presencia de los profesionales del contrato de obra. Así mismo a través de la comunicación GI-ICCU-0182-2026 se remitió copia del acta levanta con los dueños de los predios y el secretario de infraestructura del municipio de Yacopí.

Adicionalmente, se informa que a través de la comunicación en mención y acorde con lo conversado con el ICCU en la reunión del 18 de junio de 2026, se solicitó al Contratista realizar nuevamente la verificación de la implantación del diseño del box coulvert (planta y perfil) y el levantamiento topográfico aguas arriba y abajo, con el fin de determinar la profundidad de cimentación de la estructura de drenaje y las demás adecuaciones de diseño que puedan requerirse para su construcción. Adicionalmente se solicita presentar a más tardar el 26 de junio de 2026 el informe topográfico correspondiente, junto con las recomendaciones pertinentes en campo al diseño estructural, para revisión de la interventoría y posterior socialización con la Entidad Contratante.

Finalmente, se aclara que la demora en el inicio de las actividades de obra de este frente queda sujeto al levantamiento topográfico y los atrasos que se puedan generar serán imputables al contratista.

1.1.4 TRAMO EL TRIGO VIA ALPE REVENTONES.

Las actividades de obra iniciaron el pasado 21 de mayo de 2026. Con corte al 14 de junio de 2026, se un avance del 90% del avance del frente, hace falta terminar 6ml del filtro para terminar la intervención. Vale la pena aclarar que la intervención de este frente de trabajo se autorizó por parte del ICCU desde el 08 de mayo de 2026.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

Desde el pasado 09 de junio de 2026 no se cuenta con personal en obra para terminar la actividad de filtro. A continuación, se presenta registro fotográfico del estado actual del sitio de la obra:





Por lo tanto, se solicitó al Contratista reactivar el frente de trabajo y finalizar las actividades de obra pendientes con las comunicaciones GI-ICCU-0128-2026 del 28 de mayo de 2026, GI-ICCU-0146-2026 del 04 de junio de 2026 y GI-ICCU-0153-2026 del 09 de junio de 2026. Así mismo, el 24 de junio de 2026 se hizo recorrido por parte de la interventoría y aun no se evidencia personal trabajando.

Si bien es cierto, las actividades se encuentran dentro del tiempo programado, es importante aclarar que los reprocesos o actividades que se puedan generar por falta de personal, materiales o logística del contratista durante la intervención del frente, no serán objeto de pago; adicionalmente el contratista debe garantizar que los frentes de trabajo deben ser intervenidos de manera continua y no de manera intermitente.

1.1.5 TRAMO SASAIMA RECALCE DEL ESTRIBO Y RECUBRIMIENTO MURO GAVIONES

Las actividades de obra iniciaron el pasado 25 de mayo de 2026. Con corte al 14 de junio de 2026, tiene un avance del 38.41% con respecto al presupuesto inicial aprobado. Vale la pena aclarar que la intervención de este frente de trabajo se autorizó por parte del ICCU desde el 08 de mayo de 2026.

A la fecha no se han atendido las observaciones realizadas en obra respecto al componente SST, en donde se resalta la entrega de las planillas de seguridad social de los trabajadores y la entrega de dotación por parte del Contratista para la ejecución de las actividades. Adicionalmente, desde el pasado 09 de junio de 2026 no se evidencia personal en obra, tal como se informó con las comunicaciones GI-ICCU-0131-2026 del 28 de mayo de 2026, GI-ICCU-0150-2026 del 5 de junio de 2026, GI-ICCU-0153-2026 del 9 de junio de 2026 y GI-ICCU-0160-2026 del 12 de junio de 2026

El 17 de junio de 2026 se hizo recorrido por parte de la interventoría y se evidencia que el frente de trabajo continua sin avance, como se observa en el siguiente registro fotográfico:

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974



Así mismo a través de la comunicación GI-ICCU-0193-26, se dio respuesta al contratista a las siguientes justificaciones del atraso en la ejecución de este frente de trabajo:

"(…) Los avances han sido restringidos por los crecientes que se presentan en jornadas de lluvia por aumento de caudal y menor rendimiento para el control y manejo de aguas al momento de fundir los dentellones del primer nivel, adicionalmente bajo estos eventos de fuertes lluvias el personal se resguarda por seguridad. (…)"

Durante los recorridos realizados por la interventoría no se ha evidenciado incremento en el caudal del rio que impida la ejecución de las actividades, al contrario, se evidencia que no se cuenta con material o personal en obra para la ejecución de las mismas.

"(…) La restricción de espacio cercano para acopio de materiales no permite el acopio en mayor volumen de los agregados. (…)"

De conformidad con las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista, no se evidencia justificación válida para el bajo avance o la suspensión de las actividades de obra atribuida a la falta de logística, materiales, equipos o mano de obra. Es responsabilidad exclusiva del Contratista planificar, gestionar, suministrar y mantener oportunamente todos los recursos técnicos, humanos, administrativos y financieros requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual, garantizando la disponibilidad permanente de personal, materiales, maquinaria, equipos y demás insumos necesarios para el cumplimiento de los plazos establecidos.

En consecuencia, las dificultades internas relacionadas con procesos de adquisición, transporte, almacenamiento, contratación de personal o coordinación logística constituyen riesgos propios de la actividad contractual y no pueden ser trasladados a la Entidad Contratante ni una causal que justifique el incumplimiento del cronograma de obra. Por lo anterior, se requiere al Contratista tomar las acciones correctivas necesarias que permitan recuperar los rendimientos programados y dar estricto cumplimiento a las obligaciones pactadas, evitando generar mayores retrasos en la ejecución del contrato.

Adicionalmente los frentes de trabajo deben ser intervenidos de manera continua y no de manera intermitente como se presenta a la fecha.

1.1.6 TRAMO MURO DE CONTENCION ANOLAIMA

El ICCU dio aval para intervención el pasado 08 de mayo de 2026. Las actividades de obra iniciaron 21 de mayo de 2026. Con corte al 21 de junio de 2026, se un avance del 1.63% con respecto al presupuesto inicial aprobado.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

Adicionalmente, esta interventoría se permite manifestar que las actividades de obra se encuentran detenidas desde el 09 de junio de 2026, debido a falta de personal y a que a la fecha no se han subsanado las observaciones SST correspondientes a las excavaciones profundas para la construcción de los caisson.

A continuación, se comparte registro fotográfico del estado actual de la obra con corte al 24 de junio de 2026.





1.1.7 TRAMO PR16+400 VIA ZIPAQUIRA A PACHO

Vale la pena aclarar que las actividades de obra se viabilizaron para intervención a través de la comunicación GI-ICCU-0144-26 del 3 de junio de 2026 y se solicitó iniciar de manera inmediata. No obstante, las actividades de obra iniciaron el pasado 12 de junio de 2026. Con corte al 21 de junio de 2026 se tiene un porcentaje ejecutado de 4.34% respecto al presupuesto inicial aprobado.

A continuación, se comparte registro fotográfico del estado actual de la obra acorde con el recorrido del 25 de junio de 2026.



WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974



1.1.8 TRAMO PR18+100 VIA ZIPAQUIRA A PACHO

El contratista a través de la comunicación C-CPTESPEATONALES-ICCU-154 del 17 de junio de 2026, se comprometió iniciar actividades entre el 01 y 04 de julio de 2026. A través de la comunicación GI-ICCU-0200-2026 del 24 de junio de 2026 se envió la viabilidad del frente de trabajo y se solicito la priorización del mismo.

1.1.9 TRAMO PR23+900 VIA ZIPAQUIRA A PACHO

El ICCU dio aval para intervención el pasado 29 de mayo de 2026. A la fecha no se han iniciado actividades obra. No obstante, el contratista a través de la comunicación C-CPTESPEATONALES-ICCU-154 del 17 de junio de 2026, se comprometió iniciar actividades entre el 06 y 11 de julio de 2026.

1.1.10 TRAMO MURO TOPAIPI

El ICCU dio aval para intervención el pasado 8 de mayo de 2026. el contratista se comprometió inicialmente comenzar con el frente el 27 de mayo de 2026. A la fecha no se han iniciado actividades obra; no obstante, el contratista a través de la comunicación C-CPTESPEATONALES-ICCU-154 del 17 de junio de 2026, se comprometió iniciar actividades entre el 06 y 11 de julio de 2026.

1.1.11 TRAMO VILLAGOMEZ

Esta interventoría informa que el ICCU dio aval para intervención el pasado 8 de mayo de 2026. De acuerdo con el compromiso pactado en el comité de seguimiento del 08 de mayo de 2026, el Consorcio Puentes Vehiculares se comprometió a iniciar este frente el 14 de mayo de 2026. No obstante, a través de la comunicación C-CPTESPEATONALES-ICCU-154 del 17 de junio de 2026, en la cual se indica: *"(…) Está en alistamiento de personal, equipos y materiales, su inicio está programado para la semana del 18 al 20 de junio de 2026 (…)".* Solo hasta el 24 de junio de 2026 se comenzó hacer la adecuación del frente para iniciar las actividades del muro de contención.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

A continuación, se encuentra registro fotográfico del sitio de la obra:





1.1.12 TRAMO QUIPILE - EL LIMONAL

Esta interventoría informa que el ICCU dio aval para intervención el pasado 8 de mayo de 2026. De acuerdo con el compromiso pactado en el comité de seguimiento del 08 de mayo de 2026, el Consorcio Puentes Vehiculares se comprometió a iniciar este frente el 01 de junio de 2026, a la fecha no se han iniciado actividades obra y tampoco se ha allegado documentos del personal y maquinaria que se proyecta tener en campo, para revisión de la interventoría.

No obstante, el contratista a través de la comunicación C-CPTESPEATONALES-ICCU-154 del 17 de junio de 2026, se comprometió iniciar actividades entre el 13 y 18 de julio de 2026.

1.1.13 TRAMO PACHO BARANDAS PUENTE PASUNCHA

Esta interventoría informa que el ICCU dio aval para intervención el pasado 8 de mayo de 2026. De acuerdo con el compromiso pactado en el comité de seguimiento del 08 de mayo de 2026, el Consorcio Puentes Vehiculares se comprometió a iniciar este frente el 15 de junio de 2026, a la fecha no se han iniciado actividades obra y tampoco se ha allegado documentos del personal y maquinaria que se proyecta tener en campo, para revisión de la interventoría.

A continuación, se encuentra registro fotográfico del sitio de la obra:



WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

No obstante, el contratista a través de la comunicación C-CPTESPEATONALES-ICCU-154 del 17 de junio de 2026, se comprometió iniciar actividades entre el 06 y 11 de julio de 2026.

1.1.14 TRAMO ANOLAIMA DEMOLICION SECTOR LA MOYA

Acorde con el comité de seguimiento del 18 de junio de 2026 se informa que se aprobó por parte del ICCU este tramo para intervención, situación que se informó al Consorcio Puentes vehiculares a través de la comunicación GI-ICCU-0185-2026 del 19 de junio de 2026 y se aclaro al contratista que este frente se debe iniciar en el mes de julio de 2026.

1.1.15 TRAMO ANOLAIMA CONSTRUCCION GAVIONES

Acorde con el comité de seguimiento del 18 de junio de 2026 se informa que se aprobó por parte del ICCU este tramo para intervención, situación que se informó al Consorcio Puentes vehiculares a través de la comunicación GI-ICCU-0185-2026 del 19 de junio de 2026 y se aclaró al contratista que este frente se debe iniciar en el mes de julio de 2026.

1.1.16 TRAMO ANOLAIMA CONSTRUCCION PLACA HUELLA

Acorde con el comité de seguimiento del 18 de junio de 2026 se informa que se aprobó por parte del ICCU este tramo para intervención, situación que se informó al Consorcio Puentes vehiculares a través de la comunicación GI-ICCU-0185-2026 del 19 de junio de 2026 y se aclaró al contratista que este frente se debe iniciar en el mes de julio de 2026.

1.1.17 TRAMO DESMONTE FACATATIVA

A través de la comunicación GI-ICCU-0171-2026 y en atención al oficio ICCU-S-2026-0005247 remitido por la Entidad Contratante, mediante el cual se solicitó adelantar el desmonte de la estructura ubicada en el municipio de Facatativá, específicamente en el sector de la antigua estación y paradero del Ferrocarril "Los Micos", dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días calendario contados a partir del 16 de junio de 2026, esta Interventoría se permite informar que se tiene proyectado iniciar actividades el 26 de junio de 2026.

A través de las comunicaciones del listado de anexos o evidencias aportadas de la presente comunicación, se solicitó al contratista se solicita al presentar un plan de contingencia en el cual se indique el personal y maquinaria que se tendrá en los frentes de obra, así como las fechas reales de reactivación, inicio y terminación de los frentes. De igual manera, se requirió incrementar y garantizar la disponibilidad del personal, maquinaria, equipos, materiales e insumos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades programadas, así como implementar y mantener las medidas correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y gestión ambiental, conforme a las obligaciones contractuales y normativas vigentes.

Así mismo, se informa que con la comunicación GI-ICCU-0193-26, se dio respuesta a cada una de las justificaciones del Consorcio Puentes Vehiculares acerca del atraso en la ejecución de las actividades de obra y se solicitó presentar un plan de contingencia a más tardar el 24 de junio de 2026, se informa que a la fecha dicho documento no se ha recibido y por lo tanto, esta interventoría pone en conocimiento de la Entidad Contratante el no cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y se coloca a

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

consideración la implementación de la clausula 14- Multas, para que se lleve a cabo las acciones administrativas a que haya lugar.

II. INFORMACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

2.1 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ATRASO DE OBRA

A continuación, se relaciona, las fechas de inicio de cada uno de los frentes del contrato pactadas por el contratista en los comités de seguimiento, las fechas reales de inicio de ejecución y los porcentajes programados y ejecutados con corte al 21 de junio de 2026:

No	MUNICIPIO	PROVINCIA	TIPO INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% ATRASO	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE FIN PROGRAMADA
1	YACOPÍ	RIONEGRO	Construcción de un Box doble con barandas	EN EJECUCION	11,12%	5,27%	-5,86%	11/05/2026	27/09/2026
2	SASAIMA	GUALIVA	*Revestimiento de los gaviones *Construcción dado en la parte base de los gaviones protección en concreto ciclópeo	EN EJECUCION	61,78%	38,41%	-23,37%	21/04/2026	5/07/2026
3	PACHO	RIONEGRO	Construcción Barandas Metálicas	SIN INICIAR	8,33%	0,00%	-8,33%	15/06/2026	
4	EL COLEGIO	TEQUENDAMA	Construcción de seis (06) reductores viales	EN EJECUCION	100,00%	96,20%	-3,80%	21/04/2026	24/05/2026
5	QUIPILE	TEQUENDAMA	Construcción de gaviones, cunetas filtros	SIN INICIAR	25,00%	0,00%	-25,00%	1/06/2026	
6	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	TEQUENDAMA	Rehabilitación del tramo, se recomienda usar la estructura del pavimento articulado Adicionalmente reparación estructura de drenaje	EN EJECUCION	35,00%	53,28%	18,28%	29/04/2026	20/09/2026
7	TOPAIPÍ	RIONEGRO	Reparación box coulvert y aletas de encole y descole	SIN INICIAR	0,00%	0,00%	0,00%	27/05/2026	
8	GUAYABAL DE SÍQUIMA	MAGDALENA CENTRO	Construcción filtro para evacuar el agua y el mejoramiento de suelo con rajón, rectificación del alineamiento que se desplazó para recuperar la vía.	EN EJECUCION	55,96%	90,00%	34,04%	21/05/206	26/07/2026
9	ANOLAIMA	TEQUENDAMA	Construcción de muro de contención con cimentación profunda.	EN EJECUCION	10,85%	1,63%	-9,23%	25/05/2026	6/09/2026
10	VILLAGÓMEZ	RIONEGRO	Construcción de muro de contención con cimentación profunda.	SIN INICIAR	30,33%	0,00%	-30,33%	22/06/2026	
11	NOCAIMA	GUALIVA	Construcción de la placa huella ubicada en la vereda El Volcán,	EN PROGRAMACION	0,00%	0,00%	0,00%		
12	PACHO	RIONEGRO	Mejoramiento de estructura para asfaltar el tramo en el sector la M	EN PROGRAMACION	0,00%	0,00%	0,00%		
13	NOCAIMA	GUALIVA	Demolición estructura	EN PROGRAMACION	0,00%	0,00%	0,00%		

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

No	MUNICIPIO	PROVINCIA	TIPO INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% ATRASO	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE FIN PROGRAMADA
14	NOCAIMA	GUALIVA	Construcción gaviones	EN PROGRAMACION	0,00%	0,00%	0,00%		
15	ZIPAQUIRÁ	SABANA CENTRO	Terminar actividades de la estructura de pavimento	EN EJECUCION	24,43%	4,34%	-20,09%	5/06/2026	16/08/2026
16	ZIPAQUIRÁ	SABANA CENTRO	Terminar actividades de la estructura de pavimento	EN PROGRAMACION	0,00%	0,00%	0,00%		
17	FACATATIVÁ	SABANA OCCIDENTE	Solicitud de inicio de actividades de desmonte controlado del Campamento Los Micos – Municipio de Facatativá	SIN INICIAR	0,00%	0,00%	0,00%	26/06/2026	26/07/2026

Con respecto a los frentes que se encuentran en proceso de programación esta interventoría, se permite informar que estos frentes se encuentran avalados por el ICCU para intervención, a la fecha se encuentra priorizados y su inicio deberá ser en el mes de julio; no obstante, está pendiente que contratista remita programación de cada uno junto con el plan de contingencia para la atención de los frentes que ya están abiertos. Así mismo, los frentes que están sin iniciar, corresponden aquellos tramos viales que se les dio viabilidad en el mes de mayo de 2026 y que el contratista ha reprogramado se inició en varias ocasiones.

2.2 OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS.

A continuación, se relacionan las obligaciones incumplidas a la fecha:

CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

"(…) 7. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. (…)".

"(…) 8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. (…)".

"(…) 22. El CONTRATISTA deberá implementar el programa de gerencia de proyectos tal como se describe en el numeral 4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS del pliego de condiciones. (…)".

"(…) 23. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. (…)"

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

"(…) 5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. (…)"

"(…) 22. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

23. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.

24. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.(…)"

"(…) 37. Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta.

38. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoría.(…)"

"(…) 42. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto; c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes; y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

43. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

44. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados con la imagen institucional del ICCU. (…)"

"(…) 49. Una vez definido cada proyecto, el programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Interventor y la verificación por parte del ICCU. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo por causas que le sean imputables, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL ICCU. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Interventor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta. (…)"

"(…) 55. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. (…)"

"(…) 58. El contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el ICCU y/o INTERVENTORIA en las que deba presentar informes, ajustes, reparaciones y/o acatar instrucciones que tengan relación directa con la ejecución del contrato y que complementen las obligaciones del presente contrato. (…)"

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

2.3 PREJUICIOS

Atraso en las actividades de obra que se ven reflejados en la imposibilidad de lograr el cumplimiento y la atención de las emergencias de manera oportuna.

2.4 TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS

De conformidad con la Cláusula 14 – Multas del Contrato de Obra y la Resolución 047 del 9 de febrero de 2022, procede la imposición de multas por incumplimiento parcial, en los términos allí previstos.

"(…) En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al contratista, EL ICCU aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 047 del 09 de febrero de 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas dentro de la presente resolución se entienden incorporadas al presente contrato en caso de que apliquen. (…)"

Así mismo, conforme con la Resolución 047 de 2022:

"(…) ARTÍCULO QUINTO – EVENTOS GENERADORES DE MULTAS Y TERMINO DEL CALCULO DE LA MULTA: Para efectos de lo previsto en el artículo 3° de la presente resolución, frente al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, el ICCU procederá a cobrar Multas diarias y sucesivas, por cada día de incumplimiento.

El ICCU impondrá la multa correspondiente desde el día siguiente al que el CONTRATISTA debió dar cumplimiento a la obligación.

El cálculo de la multa se realizará en días calendario y/o corridos. (…)"

PARA CONTRATOS DE OBRA:

A. Los incumplimientos declarados por parte del ICCU generarán la imposición de una multa diaria y sucesiva, equivalente al 0,10% del valor del contrato por cada día de retraso, sin perjuicio de otras responsabilidades que el mismo hecho pueda configurar, en relación con las siguientes obligaciones contractuales incumplidas:

"(…) 3. Presentar los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el ICCU. (…)"

B. Los incumplimientos contractuales declarados por el ICCU tendrán como consecuencia la imposición de una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del valor del contrato por cada día de retraso, sin perjuicio de otras responsabilidades que el mismo hecho pueda configurar, respecto de las siguientes obligaciones contractuales infringidas:

"(…) 1. Iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de iniciación impartida por la dependencia ejecutora del proyecto.(…)"

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

C. Los incumplimientos contractuales declarados por el ICCU tendrán como consecuencia la imposición de una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,20% del valor del contrato por cada día de retraso, sin perjuicio de otras responsabilidades que el mismo hecho pueda configurar, respecto de las siguientes obligaciones contractuales infringidas:

"(…) 1. Entrega y/o avance del Programa de Obra. (…)"

Acorde con lo anterior, se informa que la tasación acorde con la resolución 047 de 2022, es la siguiente:

Valor del contrato	$ 7.168.684.875,00						
Fecha de tasación	25/06/2026						
Resolución 047-2022 Articulo Sexto: MULTAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y/0 CONSULTORIA:	**Obligación incumplida**	**Presunto incumplimiento**	**Frente de trabajo**	**Fecha de inicio del presunto incumplimiento**	**Porcentaje del valor del contrato**	**Días calendario de atraso**	**Valor tasado**
A. Los incumplimientos declarados por parte del ICCU generarán la imposición de una multa diaria y sucesiva, equivalente al 0,10% del valor del contrato por cada día de retraso, sin perjuicio de otras responsabilidades que el mismo hecho pueda configurar, en relación con las siguientes obligaciones contractuales incumplidas:	3. Presentar los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el ICCU.	1. No atender las observaciones SST	SASAIMA - Corredor vial que comunica Municipio de Sasaima -con la vereda San Bernardo quebrada Blanca sector chuzo pelado	9/06/2026	0,10%	17	$ 121.867.643,00
			ANOLAIMA - Anolaima-corralejas PR 6+500 Muro de 15 mts	9/06/2026	0,10%	17	$ 121.867.643,00
			GUAYABAL DE SÍQUIMA - la vía Alpes – Reventones, específicamente en el sector El Trigo.	9/06/2026	0,10%	17	$ 121.867.643,00
B. Los incumplimientos contractuales declarados por el ICCU tendrán como consecuencia la imposición de una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del valor del contrato por cada día de retraso, sin perjuicio de otras responsabilidades que el mismo hecho pueda configurar, respecto de las siguientes obligaciones contractuales infringidas:	1. Iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de iniciación impartida por la dependencia ejecutora del proyecto.	2. No Iniciar actividades en los frentes obra viabilizados y autorizados por el ICCU.	PACHO - Corredor vial que comunica al Municipio de Pacho desde la troncal Rio negro hacia la inspección de Pasuncha - Puente vehicular sobre el rio negro	15/06/2026	0,15%	11	$ 118.283.300,00
			QUIPILE - La vía que comunica el municipio de Quipile con el sector de Limonal,	1/06/2026	0,15%	25	$ 268.825.683,00
			TOPAIPÍ - se localiza en el sector de Quebrada Honda, en la vía que comunica la inspección de San Antonio Aguilera con la inspección de Pasuncha, en zona limítrofe entre los municipios de Topaipí y Pacho.	27/05/2026	0,15%	30	$ 322.590.819,00

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

			VILLAGÓMEZ - Villagómez - Puente Tabla Vereda Buenavista	22/06/2026	0,15%	4	$ 43.012.109,00
C. Los incumplimientos contractuales declarados por el ICCU tendrán como consecuencia la imposición de una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,20% del valor del contrato por cada día de retraso, sin perjuicio de otras responsabilidades que el mismo hecho pueda configurar, respecto de las siguientes obligaciones contractuales infringidas:	1. Entrega y/o avance del Programa de Obra	3. No dar cumplimiento al cronograma de trabajo acordado para la ejecución del frente de obra	YACOPÍ - Corredor vial que comunica al Municipio Yacopi con la inspección aposentos	1/06/2026	0,20%	25	$ 358.434.244,00
			SASAIMA - Corredor vial que comunica Municipio de Sasaima -con la vereda San Bernardo quebrada Blanca sector chuzo pelado	9/06/2026	0,20%	17	$ 243.735.286,00
			EL COLEGIO - Corredor vial departamental que comunica Chuzaca - el portillo a la altura casco urbano municipio El Colegio	24/05/2026	0,20%	33	$ 473.133.202,00
			ANOLAIMA - Anolaima-corralejas PR 6+500 Muro de 15 mts	9/06/2026	0,20%	17	$ 243.735.286,00
			ZIPAQUIRÁ - Troncal del rio negro, vía Zipaquirá – pacho PR16+400	12/06/2026	0,20%	14	$ 200.723.177,00
						TOTAL	$2.638.076.035,00

Sin embargo, según lo que menciona el artículo octavo de la Resolución 047 del 9 de febrero de 2022, que establece:

"(…) **LÍMITE MÁXIMO DE MULTAS:** *El límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al CONTRATISTA, no podrá exceder el 20% del Valor del Contrato.*

Si se llegase a completar el tope señalado, sin que se haya saneado el incumplimiento, el ICCU deberá tomar las medidas que salvaguarden el interés general y los recursos públicos involucrados(…)".

Siendo esto:

Tope 20% del valor del contrato: 20% × $ 7.168.684.875,00= $1.433.736.975,00

Total de multas imponibles (máximo aplicable): $ 1.433.736.975,00

Para efectos de la cuantificación final y sin perjuicio de las tasas diarias aplicables a cada causal conforme a la Resolución 047 de 2022, el total resultante de la tasación no puede exceder el límite máximo previsto en su artículo octavo. En tal sentido, considerando que la sumatoria de multas derivada de los incumplimientos verificados supera el umbral, corresponde aplicar el tope del veinte por ciento (20%) del valor contractual, esto es, MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.433.736.975,00)

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

III. LISTADO DE ANEXOS O EVIDENCIAS APORTADAS

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	RADICADO No.
GI-ICCU-0112-2026	22-may-26	Concepto técnico Sector Paso Malo – San Antonio de Tequendama	ICCU-E-2026-0010014
GI-ICCU-0128-2026	28-may-26	Solicitud de continuidad y reactivación de actividades en los frentes de obra	ICCU-E-2026-0010454
GI-ICCU-0131-2026	28-may-26	Observaciones SST, Ambiental y de Equipos en el seguimiento de actividades de obra en los municipios de Sasaima y Anolaima	ICCU-E-2026-0010416
GI-ICCU-0144-2026	3-jun-26	Comunicaciones ICCU-S-2026-0004862 y ICCU-S-2026-0004864 - Priorización, asignación formal y orden de activación del frente de obra "PR 16+400" en el corredor vial Zipaquirá - Pacho - La Palma. E Informe diseño pavimento articulado, propuesta técnica PR16+400 y PR18+100.	Correo electrónico 03/06/206
GI-ICCU-0146-2026	4-jun-26	Solicitud de inicio de frentes de obra	ICCU-E-2026-0011024
GI-ICCU-0150-2026	5-jun-26	Observaciones Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo durante la construcción de caisson Municipios de Anolaima – Sector Corralejas.	ICCU-E-2026-0011017
GI-ICCU-0153-2026	9-jun-26	Solicitud de reactivación de actividades	ICCU-E-2026-0011204
GI-ICCU-0155-2026	12-jun-26	Solicitud de acompañamiento a visita Box Culvert sector Aposentos - Yacopí	ICCU-E-2026-0011574
GI-ICCU-0159-2026	12-jun-26	Requerimiento de inicio de actividades en frentes liberados y remisión de programación de obra	ICCU-E-2026-0011623
GI-ICCU-0160-2026	12-jun-26	Requerimiento de reactivación inmediata de actividades y cumplimiento de obligaciones contractuales	ICCU-E-2026-0011585
GI-ICCU-0171-2026	16-jun-26	Comunicación ICCU-S-2026-0005247 - Solicitud de inicio de actividades de desmonte controlado del Campamento Los Micos – Municipio de Facatativá.	ICCU-E-2026-0011695
GI-ICCU-0182-2026	19-jun-26	Respuesta comunicación C-CPTESVEHICULARES-ICCU-158 Solicitud topografía verificación Box Culvert sector Aposentos - Yacopí	Correo electrónico 19/06/2026
GI-ICCU-0184-2026	19-jun-26	Solicitud topografía de obra - Troncal del rionegro, vía Zipaquirá – pacho PR16+400	ICCU-E-2026-0012010
GI-ICCU-0185-2026	19-jun-26	Aprobación frentes de obra municipio de Nocaima	ICCU-E-2026-0012024
GI-ICCU-0188-2026	19-jun-26	Solicitud demarcación horizontal vial – El Colegio	ICCU-E-2026-0012059
GI-ICCU-0193-2026	22-jun-26	Respuesta comunicación C-CPTESVEHICULARES-ICCU-154 Solicitud inicio y reactivación frentes de obra	ICCU-E-2026-0012412

En el siguiente link, se encuentra copia de los archivos relacionados en el listado anterior:

https://gavincoing-my.sharepoint.com/personal/reunion_gavincoing_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Freunion%5Fgavincoing%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2F1%2E%20EMERGENCIAS%20ICCU%2FGI%2DICCU%2D0205%2D2026%20INFORME%20PREUNTO%20INCUMPLIMIENTO&ga=1

Por todo lo anterior, se pone a consideración de la Entidad Contratante la implementación de la Cláusula 14 – Multas del Contrato de Obra y el inicio del proceso administrativo a que haya lugar.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de interventoría

Anexo: Lo enunciado en medio magnético
Copia: Archivo
Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez, Representante legal - Consorcio Puentes Vehiculares.
Seguros del Estado Póliza de cumplimento No. 11-44-101278559; Carrera 13 No. 96-60 Bogotá D.C
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0207-2026

Bogotá, D.C., 30 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Observaciones SST, Ambiental y de Equipos en el seguimiento de actividades de obra en los municipios de Pacho Sector Zipaquirá-Pacho PR 16+400 y Villagómez - Sector Puente Tabla.

Respetado Ingeniero:

Durante la visita de seguimiento y el recorrido realizado el 25 de junio de 2026 a las actividades de atención de emergencias en los municipios de Pacho - Sector Zipaquirá-Pacho (PR 16+400) y Villagómez - Sector Puente Tabla, se evidenciaron las siguientes observaciones, las cuales fueron comunicadas oportunamente a los profesionales responsables y registradas en la respectiva bitácora de obra.

Recorrido de Seguimiento y Control SST y Ambiental

Se reitera la necesidad de contar con la presencia permanente del profesional SST y Ambiental en los diferentes frentes de obra, con el fin de fortalecer el seguimiento, control y cumplimiento de los requisitos SST y de gestión ambiental.

Ambiental – Sector Zipaquirá – Pacho

1. Realizar jornadas periódicas de orden y aseo en las áreas de trabajo, garantizando condiciones adecuadas de limpieza y organización.
2. Reiterar al personal la obligación de realizar uso de carpa de los vehículos destinados al transporte de residuos de excavación. Durante el recorrido se evidenció una volqueta sin el respectivo sistema de cubrimiento de la carga.
3. Continuar con el mantenimiento y reposición de la demarcación mediante cinta de peligro en las áreas intervenidas.
4. Adoptar medidas que garanticen la permanencia de la señalización instalada, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, especialmente los efectos del viento en el frente de obra.

Seguridad y Salud en el Trabajo – Sector Zipaquirá – Pacho

1. Instalar señalización ocupacional preventiva e informativa en los diferentes puntos de intervención, de acuerdo con los riesgos identificados.
2. Adoptar medidas de protección para el personal que realiza actividades de apoyo a la excavación y adecuación del frente de trabajo, considerando el riesgo de derrumbe de las excavaciones.
3. Implementar medidas de seguridad que garanticen el ingreso y la salida segura del personal a las áreas excavadas del frente de obra.
4. Suministrar al personal los Elementos de Protección Personal (EPP) complementarios requeridos para la actividad, como botas de caucho y protección respiratoria. Durante la inspección se evidenció personal

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

realizando actividades de retiro de material excavado sin los EPP adecuados y con exposición permanente a material particulado.

5. Reemplazar el botiquín de la retroexcavadora 410: Este elemento debe contar con un sistema de almacenamiento adecuado y disponer de la totalidad de los insumos requeridos y en óptimas condiciones de uso.
6. Suministrar al personal la indumentaria definida para el proyecto según manual de identificación visual de la Entidad.
7. Se reitera que toda la maquinaria y equipos presentes en el frente de obra deben contar con los registros de inspección preoperacionales debidamente diligenciados: Durante el recorrido se evidenció que la retroexcavadora 410 no cuenta con este registro.
8. Remitir oportunamente a la interventoría la relación de la persona programada para desarrollar la actividad de control de tráfico diurna y nocturna en frente de obra con el respectivo plan de acción para su ejecución.

Ambiental – Villa Gómez (Sector Puente Tabla)

1. Fortalecer la señalización preventiva en el frente de obra mediante la instalación de señales de proximidad suficiente y visible, de acuerdo con las condiciones y extensión del área intervenida: Se evidenció la existencia de una única señal de proximidad, la cual resulta insuficiente para advertir oportunamente a los usuarios de la vía y a la comunidad sobre los riesgos asociados a las actividades de obra.
2. Realizar el mantenimiento y reposición de la cinta peligro de manera continua con el fin de garantizar la adecuada delimitación del área de trabajo: Se evidenció deterioro en la demarcación.

Se recuerda al contratista que, dado que el frente de intervención se ubica sobre una vía principal con tránsito permanente, es responsabilidad del Contratista implementar, mantener y conservar en óptimas condiciones la señalización preventiva y la demarcación temporal requeridos durante toda la ejecución de las actividades. Lo anterior, con el fin de garantizar la seguridad del personal de obra, peatones, conductores y demás usuarios de la vía, dando estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales y a la normatividad vigente en materia de seguridad vial según aplique.

Seguridad y Salud en el Trabajo – Villa Gómez (Sector Puente Tabla)

1. Instalar señalización ocupacional preventiva e informativa en los diferentes puntos de intervención, de acuerdo con los riesgos identificados
2. Adecuar el ingresos y salida del personal del área de intervención.
3. Se reitera que toda la maquinaria y equipos presentes en el frente de obra deben contar con los registros de inspección preoperacionales debidamente diligenciados: Durante el recorrido se evidenció que la retroexcavadora CAT 416 no cuenta con este registro.
4. Se reitera los requerimientos realizados mediante la comunicación GI-ICCU-0124-2026 del 27 de mayo de 2026, así como las observaciones realizadas por correo electrónico y WhatsApp a los Profesionales SST y Ambiental del proyecto, respecto al estricto cumplimiento de los requisitos normativos y contractuales relacionados con la afiliación al Sistema de Seguridad Social y la documentación de ingreso del personal.
5. Se recuerda que es responsabilidad del contratista garantizar que todo trabajador cuente con la totalidad de los documentos de vinculación y las afiliaciones vigentes antes de su ingreso al frente de obra. Se recuerda que no se permitirá el ingreso de personal con afiliaciones en trámite, documentación incompleta o en proceso de vinculación. El incumplimiento de este requisito constituye una falta al contrato y a la normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, generando un alto nivel de riesgo para la integridad del trabajador, posibles contingencias legales y económicas para el proyecto, así como evidenciando deficiencias en la gestión de los riesgos laborales por parte del contratista.
6. Implementar los controles necesarios para evitar la reincidencia de esta situación, garantizando que el ingreso del personal a obra se realice únicamente una vez se haya verificado el cumplimiento total de los requisitos de vinculación y seguridad social.
7. Remitir de manera oportuna a la Interventoría la relación del personal programado para ejecutar actividades en obra, junto con la totalidad de la documentación de ingreso y los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

Social, previo al inicio de las labores: Se evidenció al maestro de obra Jorge Argelino Linares Ordoñez con cédula 3.080.559 y al operador Wilson Esteban Rodríguez Muñoz con cédula 1.192.734.551 de la retroexcavadora CAT 416 desarrollando actividades de obra, sin contar con la dotación requerida y sin que la documentación de ingreso hubiera sido radicada previamente ante la Interventoría. Esta situación constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, las cuales establecen la responsabilidad de remitir oportunamente la documentación de vinculación y seguridad social del personal antes de autorizar su ingreso al frente de obra.

8. Implementar de manera inmediata las medidas de seguridad y control de riesgos en el frente de obra correspondiente a la actividad de cimentación del muro, donde se ejecutará la excavación para la construcción de dos caisson de 1,5 m de diámetro y 5 m de profundidad: Durante el recorrido de inspección se evidenció desprendimiento de material en las paredes de la excavación, condición que representa un alto riesgo de atrapamiento para los trabajadores que desarrollen actividades en el área.
9. Se recuerda que toda excavación con una profundidad igual o superior a 1,5 metros debe contar con un análisis previo de riesgos y con las medidas de control correspondientes, tal como entibado, sistemas de estabilización de taludes o cualquier otro método de protección técnicamente adecuado, de acuerdo con las condiciones del terreno y el procedimiento constructivo. Es responsabilidad del contratista garantizar la implementación de estos controles antes del ingreso de personal a la excavación, con el fin de prevenir incidentes y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el siguiente registro fotográfico se evidencian las situaciones anteriormente descritas.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Implementar medidas de seguridad y control de riesgos - Entibado.</td><td>Suministrar dotación e indumentaria del proyecto al personal</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Suministrar EPP y dotación al personal Villa Gómez - Sector Puente Tabla</td><td>Instalar señalización de proximidad y ocupacional Villa Gómez – Sector Puente Tabla</td></tr>
</table>

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

	
Adaptar ingresos y salidas para el personal de las áreas con excavaciones en el Sector Pacho – Zipaquirá PR 16+400	Suministrar botiquín en buen estado

Por lo anterior, se solicita al contratista atender las observaciones de **manera inmediata** y remitir un informe con registro fotográfico, donde se evidencie las acciones correctivas tomadas, para revisión por parte de la interventoría.

Así mismo, se recuerda al contratista que el profesional SST tienen una dedicación del 100% en el proyecto; no obstante, a la fecha no se ha evidenciado su presencia en campo.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de interventoría

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0208-2026

Bogotá, D.C., 30 de junio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Respuesta comunicado C-CPTESPEATONALES-ICCU-164
Documentos de ingreso de personal

Respetado Ingeniero:

Una vez revisada la documentación enviada mediante la comunicación del asunto relacionada con los documentos de ingreso de personal, esta Interventoría informa que los documentos presentados para los siguientes trabajadores registran las observaciones que se relacionan a continuación:

No.	Nombre y apellidos	Cédula	Cargo
1	Carlos Yesid Alvarado Ortiz	1.073.600.903	Ayudante de obra – Controlador de tráfico
2	Juan Camilo Castro Cárdenas	1.073.601.494	Ayudante de obra – Controlador de tráfico

1. Se evidencia inconsistencia en las fechas de la documentación de ingreso, toda vez que el contrato de trabajo fue suscrito el 16 de junio de 2026, mientras que la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) registra fecha del 11 de junio de 2026. Se solicita aclarar y corregir la documentación correspondiente, garantizando la coherencia cronológica del proceso de vinculación e ingreso del trabajador. La fecha de la inducción SST debe ser consistente con la fecha de vinculación laboral, de manera que ambos documentos reflejen adecuadamente el proceso de ingreso.
2. Remitir el certificado de afiliación vigente a la EPS, ya que actualmente solo se adjunta el soporte de registro interno del trámite realizado ante EPS Famisanar, documento que no acredita la afiliación activa de los trabajadores.
3. La notificación de riesgos y la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) correspondientes al ingreso de los trabajadores deben estar debidamente firmadas por el profesional SST aprobado por la Interventoría.
4. Remitir el registro de entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP).

Se recuerda que todos los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo inducciones, notificaciones de riesgos, permisos, formatos y demás registros relacionados con el personal, deben estar debidamente diligenciados y avalados mediante la firma del profesional SST aprobado por la Interventoría.

Por lo anterior, se solicita remitir la documentación requerida y atender las observaciones realizadas, con el fin de continuar con la revisión y trámite ante la Entidad Contratante.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de interventoría
Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: LNL
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

GI-ICCU-0235-2026

Bogotá, D.C., 10 de julio de 2026

Ing. Bernardo Ancizar Ossa Lopez
Representante legal
Consorcio Puentes Vehiculares
Bogota D.C

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-214-2026 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Respuesta comunicado C-CPTESVEHICULARES-ICCU-185
Solicitud Informe mensual Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Ambiental y MEV No. 3

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente, se informa que fue recibido el Informe Mensual No. 3 del Componente Técnico, el cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría. Sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente la entrega del Informe Mensual correspondiente a los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Ambiental y MEV, documento que, de acuerdo con las obligaciones contractuales y los plazos establecidos, debía ser radicado a más tardar el 07 de julio de 2026.

Lo anterior, con el fin de adelantar la correspondiente revisión por parte de la Interventoría y su posterior trámite ante la Entidad Contratante. En este sentido, se recomienda verificar que la documentación remitida se encuentre completa, debidamente organizada y acompañada de la totalidad de los soportes exigidos, con el propósito de evitar observaciones, solicitudes de ajuste o devoluciones durante el proceso de revisión.

Finalmente, se solicita remitir de **manera inmediata** el informe pendiente, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y evitar posibles afectaciones en los trámites administrativos asociados al contrato.

Atentamente,

Edgar Alfonso Aragón Otero
Director de interventoría

Anexo: No Aplica
Copia: Cristian Fabian Torres Garzón – Supervisión – ICCU
Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

Anexo 23. Bitácora de obra.

un (1) maestro, un (1) ayudante.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Mezcladora de concreto (trompo)
ACTIVIDADES.
Excavación manual bajo agua para comunicación de concreto ciclopeo, recalce de estribo.

GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se realizan actividades. (Equipo ocupado no disponible)

Sabado 30 de mayo de 2026.

ANOLAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado seco.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación y perfilado de cajsson para fundir concreto del segundo anillo.

Los demas frentes no adelantan actividades.

Lunes 01 de junio de 2026.

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Clima seco.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, dos (2) ayudantes, un (1) operador, un (1) Conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 DE, vibro compactador Dynapac CA 150P, volqueta.

ACTIVIDADES.

Se suministra, instala y conforma razón para mejoramiento de subrasante.

YACOPI.

Se realiza visita por parte del director de obra, el cual informa que se presenta erosion e inestabilidad de borde vía, costado derecho, sentido Aposentos a Yacopi, ganado por la fuerte ola invernal en la zona y ausencia de obra de contención.

Lo anterior condiciona la construcción del box diseñado en el punto inicial ya replanteado.

Razón por le cual el contratista recomienda dos alternativas.

1- Construcción de muro de contención que sirva de contención del relleno de acceso al box, confine y de estabilidad a la cimentación en la salida aguas abajo del box, se requiere que lleve diseños del muro de contención.

2- Reubicar el box aguas arriba del sitio actual diseñado, aproximademente 25 ml, con nueva ubicación sobre la vía ahora construida.

Para lo anterior se requiere la respectiva socialización con comunidad y el permiso emitido por la alcaldia.

Por parte de Interventoria se socializara la situación planteada por el Contratista a la entidad contratante, para dajimir las acciones

a seguir, para dar continuidad a las obras que se adelantaron en el sector en mención.

* ANOLAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Tiempo seco.
PERSONAL EN OBRA: Sin personal.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
No se ejecutan actividades.

* GACHALA.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intermitentes.
PERSONAL EN OBRA: Sin personal.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
No se ejecutan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se ejecutan actividades

Residente Interventoría

Martes 02 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco, nublado.
PERSONAL DE OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313D2, vibrocompactador Dynapac CA150P, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza el suministro, instalación y conformación de rejón para mejoramiento de sub rasante.
Se acondiciona sendero peatonal sector izquierdo salida San Antonio del Tequendama – Santandercito.

* YACOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
Se adelanta excavación para caisson.
Se fonde anillo No 2 caisson No 2.
* SASAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales
MAQUINARIA Y EQUIPO: Mezcladora de concreto (Trompa
(Trompo)
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación manual bajo agua para
nivel de cimentación
* GUAYABAL DE SIQUIMA
No se ejecutan actividades.

Reidente Interventoría

Miercoles 03 de Junio de 2026

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inspector de obra, un (1)
ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2,
vibrocompactador Dynapac CA 150P, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza suministro, instalación y compac-

mación de material rajón para mejoramiento de sub basente.

* YACOPI.

No se adelantan actividades

* ANOLAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES:

Continua ejecutandose excavación para caisson.

Se funda anillo de caisson No 02.

* SASAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Mezcladora de concreto. (Trompo).

ACTIVIDADES:

Se realiza mezcla para concreto ciclopeo, se instela en cimentación.

Se realiza manejo de aguas con bolsas de tierra.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se ejecutan actividades.

Residente Interventoría

JUEVES 04 de Junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, Un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313D2, vibrocompactador Dynapac CA 150P, volquete.

Se realiza excavación en tramo del sendero peatonal, se suministra e instala material rejón para mejoramiento de suelo y apoyo lateral del talud.
Se realiza reconformación de cepe de sello que presente irregularidades, deformación, tramos con exceso de humedad generando fallos y compactación, de capa de sello.
* YASCOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLDIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones climeticas.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES.
Se termina excavación de anillo caisson y se funde concreto.
Se realiza excavación para le viga.
* DASSIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buen clima.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Mezcledora de concreto.
ACTIVIDADES.
Se termina instalación de concreto ciclopeo para cimentación y protección de estructura existente.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.

Residente Interventoría

FELIPE TABARES

Viernes 05 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias fuertes desde las 12:30m.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2 vibrocompactador Uhel Dynapac CA 150P, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza mejoramiento en la superficie de la capa de sello que presenta irregularidades, material suelto y sin compactar.
La referencia de la geomalla dispuesta en obra es distinta a la propuesta por el contratista y aprobado por interventoria.
El contratista indica que acorde a aclaración suscitada para la especificación de la geomalla a utilizar como refuerzo para estructura de pavimento en el sector de inestabilidad vial PasoMela informan que la geomalla BX 760 es equivalente a la geomalla TR 5000 HF, ambas según las normas de ensayos ASTM para geotextiles.
Por lo anterior se le solicita al Contratista presentar la justificación por parte del especialista con los certificados de calidad que avalan lo expuesto.
Debido a las fuertes lluvias las actividades de obra se terminan a las 2:00pm.
* YACOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
Se presenta personal de obra para no se adelantan actividades.
Se ha solicitado en reiteradas oportunidades

los documentos de afiliación del personal en esta frente de obre, así como la dotación y elementos de seguridad para realizar excavaciones en espacios confinados sin que a la fecha se obtenga respuesta.
Se solicita dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en cuanto a las solicitudes SST realizadas por parte de interventoría.
* SASAIMA.
No se adelantan actividades, no se presenta personal y se evidencia que no disponen de materiales en este frente de obra.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor, un (1) Ingeniero inspector.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:
El Contratista dispone retroexcavadora, volqueta y de personal se encuentra Ingeniero inspector.
No se dispone de la señalización adecuada por lo que se solicita disponer de las señales adecuadas tanto de aproximación como en el sector a intervenir que permitan seguridad tanto para los usuarios de la vía como los trabajadores.
En el frente de obra se encuentra materiales y elementos pertenecientes al anterior contratista por lo que se solicita el

Contratista realizar inventario y demarcar estas zonas para evitar conflictos.

Residente Interventoría

Martes 09 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313D2 vibrocompactador Dynapac CA 25D, volqueta.
ACTIVIDADES:
Comisión de topografía de Interventoría hace presencia en el frente de obra para recopilar información para verificar avance de obras y materiales dispuestos.
Se solicita realizar reconformación de varios sectores de la capa de sello instalada por presentar fallos, humedad y deformación.
Una vez se realizaron los ajustes a la capa de sello se realiza instalación de geomalla Pavco TR 5000 HF, medio calzada.
Se suministra e instala material de sub base en el tramo con refuerzo de geomalla.

* YACOPI
No se adelantan actividades.

* ANOLAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Clima seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, un (1) profesional SST, un (1) ingeniero ambiental, dos (2) oficiales.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES:

Los dos (2) oficiales de obra llegan sobre las 10:00 am y posteriormente llega el profesional SST y el Ing. embrunbl

Se evidencie falta de señalización de materiales preventivos, se debe cubrir adecuadamente la obra, no se dispone de señalización suficiente y adecuada.

Los oficiales de obra no cuentan con dotación adecuada ni EPPS, el nivel que el profesional SST y el ing. embrantal.

Por lo anterior se reitera al Contratista dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales de seguridad y salud en el Trabajo y hasta tanto no se de cumplimiento a todas las observaciones que garantice la ejecución de actividades de obra en condiciones de seguridad, no se autorize ejecución de actividades en este frente de obra, además siendo consistentes se verificaran los demas frentes.

* SABANA.

En el frente de obra no se evidencia personal, no se dispone señalización informativa, los materiales no cuentan con señalización y protección.

Se observan residuos de concreto en los alrededores de la quebrada, por lo que se solicita realizar jornada de limpieza.

No se dispone de elementos que garantizan el acceso al sector en intervención en condiciones seguras.

Se reitera dar cumplimiento a las normas

y especificaciones de seguridad y salud en el trabajo que garanticen seguridad a los trabajadores y habitantes del sector el cual de implementar medidas de protección de la fuente hidrica donde se ejecutan los trabajos.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se ejecutan actividades.

* PACHO PR 16+400

ESTADO DEL TIEMPO: lluvias aisladas todo el dia.

PERSONAL DE OBRA: Un (1) Ingeniero inspector, un(1) ayudante, un(1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta

ACTIVIDADES:

Se realize retiro de escombros en zona para limpieza de caja de alcanterille a demoler.

Residente Interventoria

Miercoles 10 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: buenas condiciones climaticas.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retro excavadora CAT 313 D2. vibrocompactador Dynapac CA 150 P, volqueta.

ACTIVIDADES:

Continua el rajorteamiento de estructura con geomalla Pavco TR 5000 HF, medio calzada, 20 ml.

Se suministra material granular sub-base.

Se conforma y extiende material.

Se atiende visita de técnica para revisar situación que se presenta en vía principal del parque de la inspección Tentehuecito.

* YASCOPI

No se adelantan actividades.

* ANOLAIMA

No se adelantan actividades.

* GASSAIMA

No se adelantan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se adelantan actividades.

* PACHO PR 16+400

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intermitentes.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.

ACTIVIDADES:

Se realiza excavación y limpieza de costado izquierdo vía a Pacho.

Presidente Intervventoría

Ing.

Ingeniero Residente

Jueves 11 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: buenas condiciones climaticas.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un(1) ayudante, un (1) operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA 150P.

ACTIVIDADES:

Se realiza reconformación y compactacion del

salle, si suministre e instele zuomelle de refuerzo TR 5000 HF Pauco, se instele meteriel prenuler subbese en media calzada.

* YACOPI

No se edelenten actividedes.

* ANOLAIMA

No se edelenten actividedes.

* SASAIMA.

No se edelenten actividedes.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: tres (3) ayudentes.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcevadore CASE.

ACTIVIDADES.

Se realize excevación, se suministre protex-til NT 2500, meterrel filtrente pere construcción de un tremo de filtro de 38 ml.

Pendiente de construcción 6 m pere ampel-mer con alcenterille existente.

* PACHO PR 16+400.

ESTADO DEL TIEMPO: Llueves leves en le meñene.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, un(1) ayudente, dos (2) controledores de trefico, un(1) operedor, Un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcevedore Jhon Deere 410, volqueta.

ACTIVIDADES:

Se inicie demolición de ceje de alcenterilla existente.

Residente Interventoria

Viernes 12 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2 vibrocompactador Dynapac CA 150P.
ACTIVIDADES:
Se suministre e instale material granular sub base para conformación de capa según estructura.
* YASCOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA NO
No se adelantan actividades
* CASCAIMA
No se adelantan actividades
* GUAYABAL DE SIQUIMA
NO SE ADELANTAN ACTIVIDADES.
* PACHO PR 16+400
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, un(1) ingeniero residente, un (1) ingeniero director un (1) profesional SST, un (1) ayudante, dos(2) controladores de trafico, un (1) operador, un(1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavador Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:
Los diredores de obra a interventoria recorren el frente de obra para zanjeo compromisos en la ejecucion de las estructuras.
El profesional SST de interventoria realiza

las siguientes observaciones respecto a lo encontrado en obra.

- Reemplazar el botiquin de la retroexcavadora 410. Este elemento debe contar con un sistema de almacenamiento adecuado y disponer de la totalidad de los insumos requeridos en optimas condiciones de uso.
- Suministrar al personal la indumentaria corporativa y los Elementos de Proteccion Personal EPP necesarios para el desarrollo seguro de las actividades. Durante el recorrido se evidencio personal sin proteccion respiratoria y sin la indumentaria correspondiente a la entidad.
- Realizar una charla de sensibilizacion sobre la obligatoriedad del uso permanente de botas y casco de seguridad en todos los frentes de trabajo. Durante la inspeccion se evidencio personal utilizando tenis y sin casco de seguridad.
- Socializar con el personal la importancia del uso adecuado de la indumentaria corporativa, evitando la combinacion de prendas pertenecientes a otras entidades o empresas.
- Suministrar a los auxiliares de trafico herramientas de comunicacion apropiadas que permitan coordinar de manera agil y segura el flujo vehicular en las zonas de intervencion.
- Reforzar la señalizacion y demarcacion de las areas de trabajo, asi como instalar la señalizacion ocupacional requerida para la prevencion de riesgos y la proteccion de trabajadores y usuarios de la via.

Observaciones Ambientales.

- Realizar jornadas periodicas de orden y aseo en las areas de trabajo, garantizando condiciones

adecuadas de limpieza y organización.
· Gestionar ante la entidad competente el retiro o la reubicación de materiales que no correspondan el proyecto y que se encuentren dentro del area de intervención.
· Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización instalada, implementando mecanismos que perentican la estabilidad y permanencia de la señalización de proximidad a obra.
En obra se avanza con la demolición de caja de alcantarillo existente y excavacion de sector aledaño.
* VISITA TECNICA VILLETA.
Se realiza visita tecnica el municipio de Villeta sectores Quebrada Guanabeno-Puente Barrio obrero, Quebrada Prospero-Puente Barrio san borja, Quebrada Meni Bajo-Via Villeta.

Residente Interventoria

Martes 16 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, Vibrocompactador Dynapac CA150P,.
ACTIVIDADES:
No se ejecuten actividades, no se dispone de material sub base granular segun indica

al contratista dibido a las lluvias del fin de semana no se dispacho material de la cantera.
El operador de los equipos no hace presencia en el frante de obra.

* YASCOPI

No se adelantan actividades.

* ANOLASIMA

No se adelantan actividades.

* SASSIMA.

No se adelantan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se adelantan actividades.

* PACHO PR 16+400

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias suaves en la mañana.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:
Suenze demolición de caja de alcantarille existente.

Residente Interventoría

Miercoles 17 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.

ACTIVIDADES:
Se realiza el suministro, conformación y compactación del material subbase granular para conformación capa según estructura.
* YASCOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
No se adelantan actividades.
* SASAIMA
No se adelantan actividades.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias suaves en la mañana.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación para recuperar ancho de vía, se inicia excavación y conformacion para construcción de filtro.

Residente Interventoria

Viernes 19 de Junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: SECO.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313DZ vibrocompectador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Avanza instalación de subbase y renobar para conformación de capa segun estructura.
* YACOPI.
No se adelantan actividades.
Se realiza reunión convocada por la administración municipal, con los propietarios de los predios para exponer las necesidades del proyecto. Las observaciones estan consignadas en acta de la fecha.
El Contratista no asistio a reunion programada.
* ANOLAIMA
No se adelantan actividades
* SASAIMA
No se adelantan actividades
* GUAYABAL DE SIQUINA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, una volqueta.
ACTIVIDADES
Avanza excavación para construcción de filtro, se suministre geotextil NT 2500 pavco, y material granular filtrante.

Residente Interventoria

Viernes 19 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un(1) ayudante, un (1) operador.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Se suministra, conforma y compacta material de sub base granular para conformación de capa. Se acondicionan rampas para habilitar paso por el tramo, según lo solicitado por la administración municipal para garantizar la participación en las elecciones presidenciales.
Se evidencia extracción por nacimiento de agua bajo la estructura de la vía, por lo que se construirá filtro para dar manejo.
* YASCOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
No se adelantan actividades.
* SASAIMA.
No se adelantan actividades.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado, lluvias suaves.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:

Se realiza excavación, suministro de geotextil NT 2500 poco, material granular filtrante, para continuar con la construcción de filtro.

Residente Interventoría.

Lunes. 22 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavacion para construccion de filtro transversal para dar manejo aguas de nacimiento bajo estructura de la via, se suministra geotextil, tubo PVC perforado y material granular filtrante.
* VASCOPI
No se adelantan actividades
* ANOLAIMA
No se adelantan actividades.
* SASAIMA NO se adelantan actividades.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 161+400
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere

410, volquete.
ACTIVIDADES:
Buenas construcción de filtro.
* FACATATIVA:
La empresa tarraz regional Región Trans realiza la entrega del inmueble Estación peradero del Ferro-carril los Micos para desmantelamiento y recuperación de elementos como marcos de puertas y ventanas, puertas y ventanas, mamposteria entre otros, por ser considerado patrimonio de la nación y requiere su rehabilitación y conservación.

Residente Ing

Martes 23 de junio de 2026.
ESTADO
* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones climaticas.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, dos (2) operadores.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313D2, vibro compactador Dynapac CA150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Continua construcción de filtro para control de aguas de nacimiento de agua bajo estructura de la vía, se realiza suministro de geotextil NT2500 Bidim, material granular filtrante y tubería PVC perforada de 4".
Se realiza descapotación de material de sub base para conformación y compactación de la capa en-ual de topografia segun diseño.
Es importante recordar que de estructura en con-

trucción se pazare segun diseño establecido pare lo cubl se solicite control de topogre-fie.
* YASCOPI.
No se edulenten actividades.
* ANOLASIMA.
No se edulenten actividades.
* SASSAIMA
No se edulenten actividades
* GUAYABAL DE SIQUIMA
No se edulenten actividades.
* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Nubledo, lluvias luves.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inzanfuro Inspector, dos (2) controladores de trepico, dos (2) eyudantes, un (1) oparador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadore Jhon Deere 410, volquete.
ACTIVIDADES:
Constinue construcción de filtro costado izquier-do suntido Zipequire-Pecho.
* FACATATIVA.
No se edulenten actividades.

Jaime Flórez
Residente Interventoría.

Felipe Flórez

Miercoles 24 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: buenes condiciones climeticas.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obre, un (1) eyu-dente, dos (2) operadores.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadore CAT 313 D2,

vibrocompactador Dynepac CA15OP, minicargador CAT.
ACTIVIDADES.
Conformación y compactación de material granular sub base.
* YACOPI.
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
No se adelantan actividades.
* SASAIMA.
No se adelantan actividades
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) controladores de trafico, dos (2) ayudantes, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Shon Deere 410, volquete.
ACTIVIDADES:
Se inicia excavación para conformación de estructura de diseño, se evidencia material de subrasante saturado, baja capacidad portante y presencia de arcillas, se retirara material hasta encontrar suelo con mejores condiciones y capacidad para estructura.
* FACATATIVA
No se adelantan actividades.

Residente Interventoría.

Felipe Alzate

Jueves 25 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buen estado del tiempo.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra., un (1) ayudante, dos (2) operadores.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2., vibrocompactador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Continua conformación y compactación de capa sub base granular, se termina conformación de capa. Se solicita progresiva toma de densidades a capa instalada para liberación.
* YACOPI
No se adelantan actividades
* ANOLAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO; N/A.
ACTIVIDADES:
Se realiza demolición de alute de alcantarilla.
* SASAIMA.
No se adelantan actividades.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) ayudantes.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
Se realiza construcción de tramo pendiente de filtro, se suministra geotextil NT 2500 negro, y material granular filtrante.
Pendiente taper longitud total de filtro construido.
Retirar escombros y material de excavación.

* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado, seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos(2) controladores de trafico, dos(2) ayudantes, un(1) operador, un(1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación para encontrar suelo que presente mayores caracteristicas, se profundiza 1.70 m., se realiza suministro de relleno para mejoramiento de subrasante.
Profesional SST y AMBIENTAL de interventoria realiza las siguientes observaciones.
1. Se refiere que todo la maquinaria y equipos deben contar con los registros precoperacionales debidamente diligenciados. Durante el recorrido se evidencia que la retroexcavadora Jhon Deere 410 no cuenta con el registro.
2. Suministrar un botiquin de primeros auxilios en buen estado, con elementos completos que lo componen y garantizando condiciones adecuadas de almacenamiento, orden e higiene.
3. Suministrar al personal los elementos de protección personal (EPP) complementarios requeridos para la actividad, como botas de caucho y protección respiratoria. Durante la inspección se evidencia personal realizando actividades de retiro de material excavado sin los EPP adecuados y con exposición permanente a material particulado.
4. Implementar medidas de seguridad que garanticen el ingreso y salida segura del personal a las areas excavadas del frente de obra.

5. Adopter medides proteccion pere el personel que realice actividedes de apoyo e la excave-ción y edecuación del frente de trebejo, con-siderendo el riesgo de derrumbe de les excave-ciones.
6. Instelar señelizeción ocupacionel preven-tive e informetive en los diferentes puntos de interveneión, de ecuerdo con los riesgos identificedos.
7. Continuer con el mentenimiento y reposicion de le demercación, mediente cinte de peligro en les ereas intervenides.
8. Reiterer el personel le obligeción de reelizer uso del cerpede de los vehiculos destinedos el transporte de residuos de excaveción. Durente el recorrido se evidencie une volqueta sin el respectivo sistema de cubrimiento de cerger
9. Adopter medides que gerenticen le peime-nencie de le señelizeción instelede, teniendo en cuente les condiciones climeticas, especiel-mente los efectos del viento en el frente de obre.
10. Se reitere le necesided de conter con le pre-sencie permenente del profesionel SST y Ambien-tel de los diferentes frentes de obre, con el fin de fortelecer el seguimiento, control y cumplimiento de los requisitos de seguridad, selud en el trebejo y gestión ambientel.

* FASCATATIVA
No se edulenten actividedes.
* VILLAGOMEZ
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) meetro, un (1) oficiel, dos (2) eyudentes, un (1) operedor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 416.
ACTIVIDADES.
Se realiza excavación para cimentación del muro, se perfila talud.
La cimentación del muro se realizara por medio de dos(2) caisson de 5m de profundidad.
Se debe realizar entibado de talud para evitar colapso de este y cierre de vía.
Se solicita dotar el personal de dotación y elementos de protección personal.
Instalar señalización informativa y preventiva que oriente a los usuarios de la vía sobre los trabajos que se ejecutan en la vía.

Jaime Flórez
Residente Interventoría

Felipe Arenas

Viernes 26 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones climaticas.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un(1) ayudante, dos (2) operadores.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Se realiza toma de densidades a capa de sub base granular, se toma muestra de material para rectificar humedad optima.
No se autoriza continuar con colocación de material granular base hasta tanto

no se presentan los resultados de las diligencias.

Se acondicionen rampas de acceso para habilitar paso durante el fin de semana, resguardado por la administración municipal y con autorización del ICCU.

* YACOPI

No se adelantan actividades.

* ANOLAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES:

Avanza demolición de alcantarilla existente.

* SASAIMA

No se adelantan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se adelantan actividades.

* PACHO PR 16+400.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Dos (2) controladores de trafico, dos (2) ayudantes, un (1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.

ACTIVIDADES:

Se realiza suministro de relleno para mejoramiento de sub rasante.

* FACATATIVA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero Inspector, dos (2) ayudantes

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES:

Se inicia con el cerramiento del inmueble.
se tiene acompañamiento de Rutrotrans.

* VILLAGONIEZ.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) maestro, un (1) oficial, dos (2) ayudantes.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
Se realiza anclado para soporte del talud.

Jaime Flórez
Residente Interventoría.

Felipe Flórez

Martes 30 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inspector de obra, un (1) ayudante, dos (2) operadores.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Se acopia material de base granular.

* YACOPI.

No se adelantan actividades

* ANOLAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) oficial, un (1) ayudante
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación manual de caisson 3, se funde anillo de concreto de un tercer anillo.

Se retira agua de la excavación de caisson 1 y 2.

* SASAIMA.

No se adelantan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se adelantan actividades.

* PACHO PR 16+400.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos(2) controladores de transito, dos (2) ayudantes, un(1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.

ACTIVIDADES.

Se realiza excavación para estructura de pavimento articulado.

* FACATATIVA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Un(1) ingeniero residente, un(1) ayudante.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES.

Se termino de ajustar al carramanto.

Se inicia desmonte de ventanas.

* VILLAGOMEZ

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

PERSONAL EN OBRA: Un(1) maestro, un(1) oficial, dos (2) ayudantes.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES.

Excavacion para anillo 1 caisson No 1.

Se ajusta formaleta para anillos.

Residente Interventoria.

Anexo 24. Registro fotográfico de la Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTES JUNIO DE 2026

FRENTE Municipio San Antonio del Tequendama - Paso Malo



Descripción: Demarcación de área de trabajo y maquinaria

FRENTE Municipio Pacho – Vía Zipaquirá



Descripción: Personal identificado con indumentaria del proyecto

FRENTE Municipio Anolaima – Corralejas




Descripción: Demarcación señalización móvil

FRENTE Municipio Pacho – Vía Zipaquirá



Descripción: Actividad retiro de residuos de excavación

FRENTE Municipio Pacho – Vía Zipaquirá

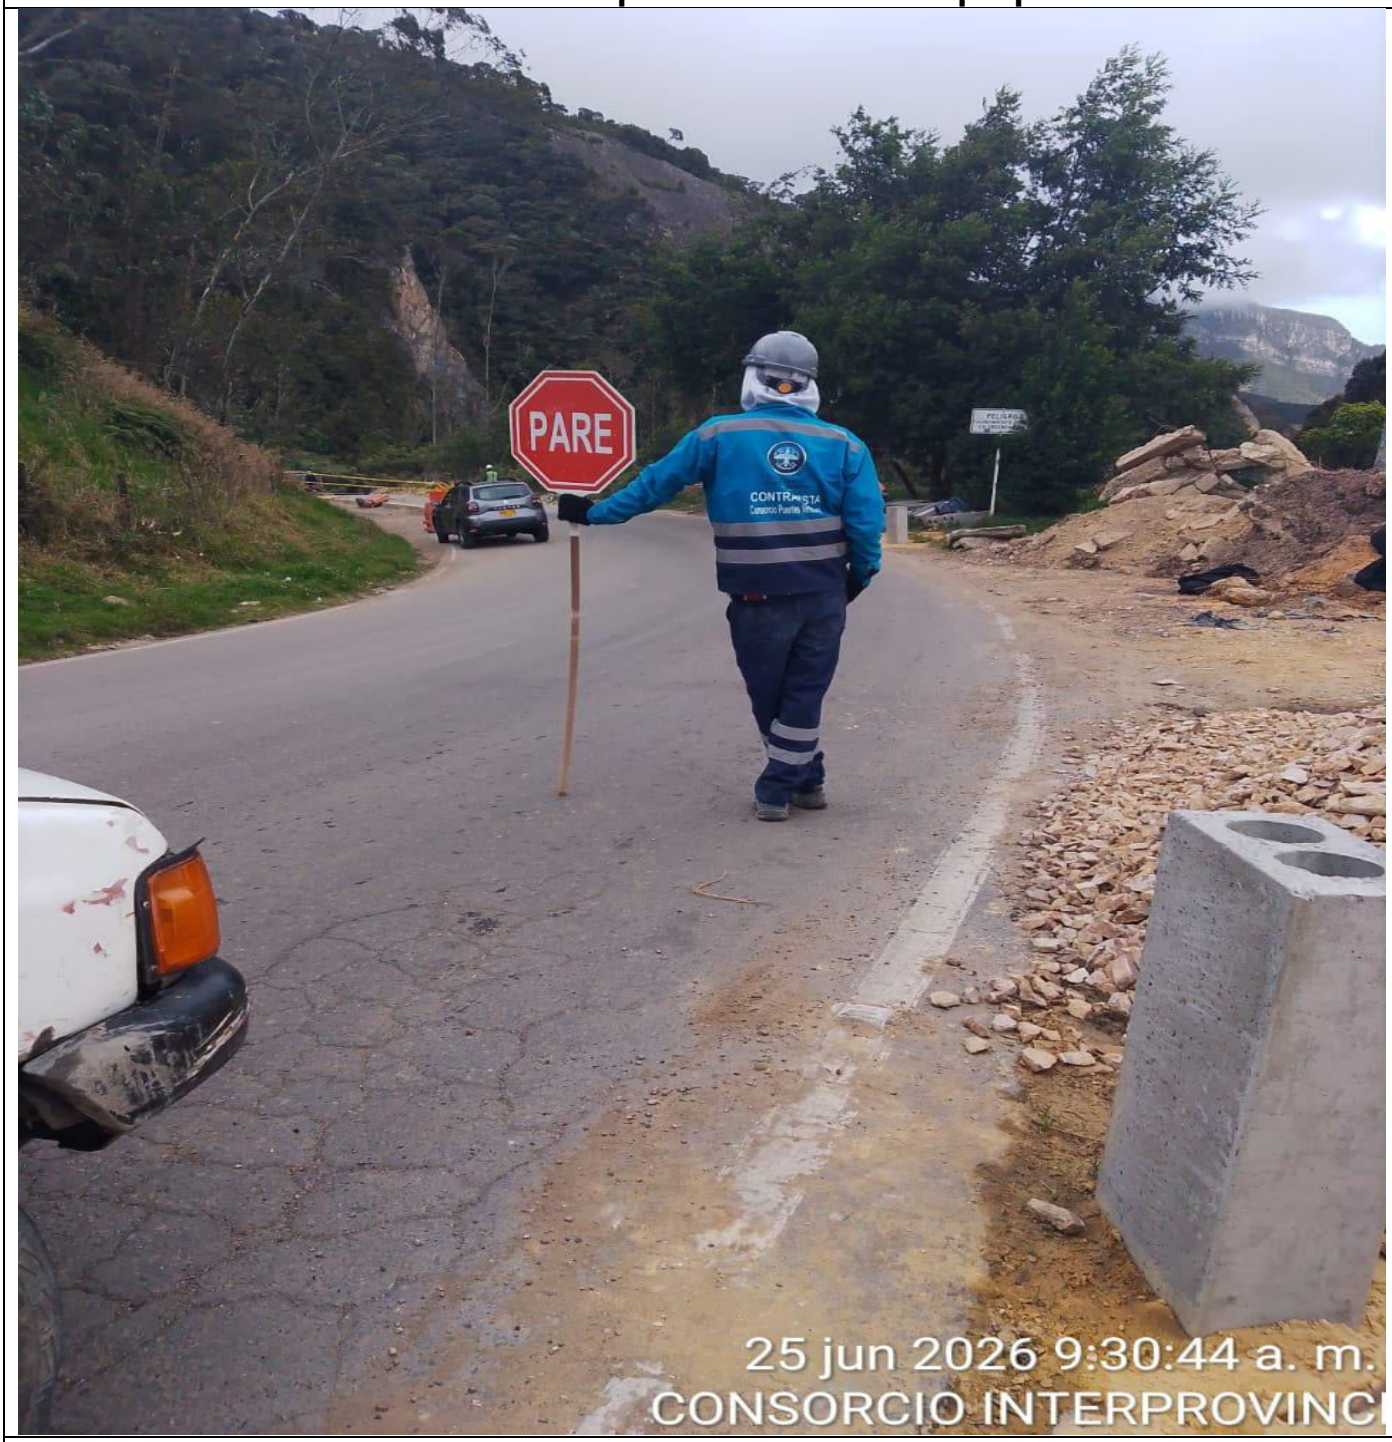

Descripción: Actividad Control de trafico

Anexo 9
Planillas de seguridad social interventoría

Certificado de Aportes

Se certifica que EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO identificado(a) con CC 1022363189 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	447375556	9507536452	E	2026-07-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$7,000,000	$1,120,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$7,000,000	$487,200
CCF	COMPENSAR	30	4%	$7,000,000	$280,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$7,000,000	$280,000

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 09:42.

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIME EDUARDO FLOREZ BLANCO identificado(a) con CC 7165748 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$6,405,000	$1,024,800
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$6,405,000	$445,800
CCF	COMFABOY	30	4%	$6,405,000	$256,200
EPS	SANITAS	30	4%	$6,405,000	$256,200

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:19.

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDI NAYIVE LOPEZ BARRETO identificado(a) con CC 53043823 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$6,405,000	$1,024,800
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$6,405,000	$445,800
CCF	COMPENSAR	30	4%	$6,405,000	$256,200
EPS	SANITAS	30	4%	$6,405,000	$256,200

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:20.

Certificado de Aportes

Se certifica que PAULA VALENTINA CARLOS MARTINEZ identificado(a) con CC 1070989207 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,351,330	$696,300
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$4,351,330	$302,900
CCF	COMPENSAR	30	4%	$4,351,330	$174,100
EPS	FAMISANAR	30	4%	$4,351,330	$174,100

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:19.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN DAVID HERREÑO DUARTE identificado(a) con CC 1101756190 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,675,000	$588,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$3,675,000	$255,800
CCF	COMPENSAR	30	4%	$3,675,000	$147,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,675,000	$147,000

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:20.

Certificado de Aportes

Se certifica que GILBERTO MUETE VILLAIZAN identificado(a) con CC 80246161 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO INTERPROVINCIA NI 902021551

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459753006	9507652299	E	2026-07-07	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	6	16%	$735,000	$117,600
ARL	SEGUROS BOLIVAR	6	6.96%	$735,000	$51,200
CCF	COMPENSAR	6	4%	$735,000	$29,400
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	6	4%	$735,000	$29,400

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 12:21.

Certificado de Aportes

Se certifica que IVAN ANDRES PINILLA CORTES identificado(a) con CC 80174574 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	447375556	9507536452	E	2026-07-03													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	25	16%	$2,631,495	$421,100
AFP	COLFONDOS	5	16%	$526,299	$84,300
ARL	SEGUROS BOLIVAR	25	6.96%	$2,631,495	$183,200
ARL	SEGUROS BOLIVAR	5	0%	$526,299	$0
CCF	COMPENSAR	25	4%	$2,631,495	$105,300
CCF	COMPENSAR	5	4%	$526,299	$21,100
EPS	COMPENSAR	25	4%	$2,631,495	$105,300
EPS	COMPENSAR	5	4%	$526,299	$21,100

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 09:41.

Certificado de Aportes

Se certifica que JEIMMY NIBELLI AMEZQUITA ACOSTA identificado(a) con CC 1033725638 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NI 900916608

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	447375556	9507536452	E	2026-07-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,120,000	$499,200
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$3,120,000	$16,300
CCF	COMPENSAR	30	4%	$3,120,000	$124,800
EPS	COMPENSAR	30	4%	$3,120,000	$124,800

Este certificado se expide el día 2026-07-07 a las 09:40.

Anexo 10
Garantías contrato interventoría

ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GC-FR-06
	GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN**	1
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	**FECHA**	4/03/2025

Tipo de garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	226 DE 2026
Convenio No:	
Resolución No:	
Contratista o responsable:	CONSORCIO INTERPROVINCIA NIT.- 902.021.536-8
Garantía No:	11-44-101278483 ANEXO 7 CUMPLIMIENTO
Garantía emitida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición de la garantía	18 DE JUNIO DE 2026
Fecha de aprobación de la garantía:	25 DE JUNIO DE 2026
Razón de la aprobación:	MODIFICATORIO No. 2

CLASE GARANTÍA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		AÑO	**MES**	**DIA**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
CUMPLIMIENTO	$266.263.025,00	2026	03	17	2027	06	30
SALARIOS	$266.263.025,00	2026	03	17	2029	12	31
CALIDAD DEL SERVICIO	$399.394.537,50	2026	12	31	2031	12	31

Notas u observaciones:

- Se desconoce modificatorio No. 1
- *En atención al concepto C-1582 DE 2025. Expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. (…) Se advierte, que la aprobación de las garantías se realiza integralmente en la plataforma. SECOP II, es decir, no es posible cargar un oficio o un PDF que dé cuenta del cumplimiento de este requisito… el SECOP II habilitara una ventana emergente con los datos de la garantía y el documento anexo... Para aprobar o rechazar la garantía enviada por el Proveedor haga clic en Enviar para aprobación.*

JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
Subdirector Técnico - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU

Proyecto: **Jonathan Fernando López Pachón –** Abogado Externo – Dirección Jurídica – ICCU

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101278483	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	06	2026	17	03	2026	00:00	16	03	2032	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERPROVINCIA	NIT: 902.021.551-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 48 NRO. 101 A - 29	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6012367974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	NIT: 900.258.711-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 26 #51 -53 TR CENTRAL PISO 6	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017491624

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIAS CONVENIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU-CTO-226-2026 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA, RIO NEGRO, UBATE, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO,TEQUENDAME, SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2026	30/06/2027	$266,263,025.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/03/2026	31/12/2029	$266,263,025.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2026	31/12/2031	$399,394,537.50	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS DEJA CONOCIMIENTO DEL MODIFICATORIO No. 2 ACTUALIZAR DEL PLAN DE CARGAS AL CONTRATO No. ICCU 226 DE 2026.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******931,920,587.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GLADYS CASALLAS MARTINEZ	61287	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101278483

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101278483	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	06	2026	17	03	2026	00:00	16	03	2032	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTERPROVINCIA		**NIT: 902.021.551-9**
DIRECCIÓN: CR 48 NRO. 101 A - 29	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6012367974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU		**NIT: 900.258.711-1**
DIRECCIÓN: CALLE 26 #51 -53 TR CENTRAL PISO 6	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017491624

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ING INGENIERIA SAS	890405995-1	50.00
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	900916608-4	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101278483

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101278483, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de JUNIO de 2026

11-44-101278483

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Anexo 11
Actas de comité

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	1/06/2026	**ACTA No.**	7	
HORA DE INICIO:	2:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	3:00 p. m.	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual			
DEPENDENCIA:	Interventoria			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar comité de seguimiento al contrato de atención de emergencias – Lote 2, con el propósito de evaluar su avance técnico, administrativo y contractual, revisar compromisos del comité anterior, definir fechas de inicio de las actividades del frente Zipaquirá - Pacho (PR 16+400 y PR 18+100).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento a compromisos anteriores:

1. Radicar actas de socialización inicio actividades de obra San Antonio, el Colegio y Yacopí: Continua pendiente
2. Entrega overoles con logo del ICCU: Continua pendiente, la interventoría aclara que el contratista no atendido la observación.
3. Inicio actividades de obra Quipile (sector limonal) – Contratista: Continua pendiente.
4. Inicio actividades obra, Villagomez - Contratista: Continua pendiente.
5. Entrega ajuste diseño disipador Yacopí – ICCU: Continua pendiente
6. Inicio actividades de obra corredor vial Zipaquirá - Pacho PR7+600 – Contratista: Continua pendiente
7. Inicio actividades de obra corredor vial Zipaquirá - Pacho sector la M - Contratista: Continua pendiente
8. Recorrido en conjunto para intervención del corredor vial Zipaquirá -. Pacho PR16+400 y PR18+100 - Contratista e Interventoria: Cumplido

Revisión de los sectores PR 16+400 y PR 18+100

Se informó que, durante la visita de campo realizada el 29 de mayo de 2026 en los sectores PR 16+400 y PR 18+100, se evidenciaron deformaciones y fallas en la estructura existente, así como la presencia de materiales acopiados sobre la vía, entre ellos adoquines, arena, cemento y otros elementos pertenecientes al contratista anterior. En este sentido, se expresó preocupación por los posibles inconvenientes que podría generar la permanencia de dichos materiales en el área de intervención, así como por eventuales reclamaciones que pudiera presentar el contratista saliente.

Al respecto, el ICCU indicó que ya fue emitida una comunicación oficial en la que se precisa que el contratista anterior no cuenta con actividades contractuales vigentes en el sector, toda vez que el plazo de ejecución del contrato finalizó y actualmente se adelanta el correspondiente proceso de incumplimiento definitivo. En consecuencia, la Entidad no reconocerá ni tramitará actividades adicionales que eventualmente sean ejecutadas por dicho contratista. Así mismo, se recomendó realizar un registro fotográfico detallado del estado actual y de los materiales presentes en el sitio, con el fin de contar con el debido soporte documental.

Autorización de inicio de intervención PR 16+400

El ICCU informó que, con base en la documentación presentada por el contratista y los resultados de la visita técnica realizada por la Interventoría, se considera viable el inicio de las actividades de intervención en el sector PR 16+400. En este sentido, la Entidad manifestó su disposición para apoyar la movilización de maquinaria y equipos mediante cama baja desde Bogotá hasta el frente de obra, con el propósito de facilitar y agilizar el comienzo de las labores programadas.

Adicionalmente, se reiteró la necesidad de implementar oportunamente la señalización preventiva y las medidas iniciales de manejo y control del tránsito en el sector, garantizando condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios de la vía y para el personal vinculado a la ejecución de las obras, mientras se definen y consolidan los aspectos constructivos de la intervención.

Verificación de dimensiones del tramo afectado

La Interventoría informó que, como resultado de las mediciones realizadas en campo mediante cinta métrica, se estableció que la longitud del tramo afectado en el sector PR 16+400 es de aproximadamente 87 metros lineales, valor que supera la longitud inicialmente reportada en la documentación disponible. En atención a lo anterior, se indicó que será necesario ampliar ligeramente el alcance de la intervención con el fin de garantizar que los cortes y empalmes se ejecuten sobre zonas estructuralmente estables del pavimento existente.

Así mismo, durante la reunión se acordó tomar como referencia preliminar una longitud aproximada de 89 metros lineales para efectos de planeación y programación de las actividades. No obstante, se precisó que dicha longitud deberá ser confirmada y ajustada, de ser necesario, durante el replanteo definitivo y la ejecución de las obras en sitio.

Revisión de propuesta técnica para intervención del PR 16+400

El contratista presentó una propuesta preliminar de intervención, la cual contempla:
- Demolición y reconstrucción de alcantarilla existente.
- Profundización de la estructura hidráulica, debido a que actualmente presenta una cobertura insuficiente.
- Construcción de filtro longitudinal para mejorar el drenaje.
- Recuperación integral de la estructura del pavimento.

Durante la revisión se indicó que la alcantarilla existente presenta una profundidad aproximada de 40 cm respecto a la rasante, condición que habría contribuido a su falla estructural. De igual manera, se destacó la necesidad de reconstruir tanto la tubería como los cabezotes para garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico del sector.

Revisión de estructura de pavimento propuesta

El contratista de obra presentó una propuesta de estructura de pavimento para la intervención, conformada por 30 cm de rajón, 10 cm de sello granular, geotextil de separación, 30 cm de subbase granular, geomalla biaxial, 25 cm de base granular y pavimento articulado en adoquín. De acuerdo con la estimación preliminar realizada por el contratista, el costo de ejecución de esta alternativa asciende aproximadamente a la suma de $416.000.000.

Durante el análisis técnico de la propuesta, el ICCU manifestó que la estructura planteada podría resultar sobredimensionada para una intervención de carácter emergente, cuyo objetivo principal es restablecer y garantizar las condiciones de transitabilidad del corredor vial. En este sentido, el profesional de apoyo de la Entidad solicitó la sustentación técnica de los espesores propuestos mediante información geotécnica, estudios de suelos o resultados de ensayos de capacidad portante (CBR), señalando que actualmente no se dispone de dichos soportes técnicos que permitan validar el diseño planteado.

Como resultado de la discusión, se acordó que el ICCU, en coordinación con la Interventoría, realizará una revisión técnica de las condiciones existentes en los sectores PR 16+400 y PR 18+100, con el fin de definir la alternativa estructural más adecuada y establecer posteriormente la solución constructiva definitiva para la ejecución de las obras. Mientras se adelanta esta revisión, se mantiene la necesidad de ejecutar la reconstrucción de la alcantarilla y las obras de drenaje.

Recomendaciones de la Interventoría

La Interventoría solicitó al contratista presentar formalmente la propuesta técnica correspondiente al manejo de aguas superficiales y subsuperficiales asociadas a la intervención. Lo anterior, con el fin de adelantar la revisión y evaluación correspondiente por parte de la Interventoría y emitir el respectivo concepto técnico previo a su implementación en obra.

Situación presentada en Yacopí – Construcción de Box Culvert

El contratista informó que, durante las actividades de replanteo del Box Culvert, se identificó una condición no prevista en el terreno. De acuerdo con lo expuesto, una parte significativa del área destinada al apoyo de la estructura presenta afectaciones derivadas de procesos de socavación ocasionados por crecientes de la quebrada, generando zonas con material de relleno y sectores que actualmente no cuentan con condiciones adecuadas de soporte.

En atención a esta situación, se expusieron de manera preliminar diversas alternativas técnicas para su análisis, entre las que se encuentran la profundización de la excavación hasta alcanzar estratos competentes, la construcción de estructuras de contención, la implementación de obras de protección mediante gaviones, ajustes en el alineamiento de la estructura proyectada y la evaluación de soluciones hidráulicas alternativas que permitan garantizar la estabilidad y funcionalidad de la intervención.

No obstante, debido a que la información presentada durante la reunión no permitió contar con los elementos técnicos suficientes para efectuar una evaluación integral de las alternativas propuestas, no fue

posible adoptar una decisión definitiva respecto de la solución a implementar.

Por lo anterior, el ICCU solicitó al contratista consolidar y remitir la información técnica correspondiente, incluyendo registro fotográfico detallado, levantamientos y mediciones de campo, cotas, alturas, dimensiones relevantes y el análisis de las diferentes alternativas constructivas evaluadas. Esta información será revisada en una mesa de trabajo específica que permita definir, de manera conjunta entre la Entidad, la Interventoría y el contratista, la solución técnica más adecuada para atender la condición identificada.

Estado de inicio de actividades en Villagómez

El contratista informó que se presentó una novedad relacionada con la disponibilidad del maestro de obra ya que manifestó su decisión de no continuar vinculado al proyecto. Por lo anterior, se indicó que actualmente se adelantan las gestiones necesarias para la vinculación de un nuevo maestro, con el propósito de garantizar la adecuada coordinación de las labores en campo y evitar afectaciones en la programación prevista.

Así mismo, el contratista manifestó que se encuentra evaluando diferentes alternativas para completar el equipo de trabajo requerido e iniciar las actividades de obra en el menor tiempo posible.


CONCLUSIONES

- Se presentan avances en la entrega de diseños y presupuestos, permitiendo proyectar el inicio de varios frentes.
- Persisten algunas limitaciones por maquinaria y personal, aunque ya se definieron fechas tentativas de inicio.
- Se requiere apoyo de los municipios para actividades preliminares.
- Es necesario fortalecer la programación de visitas técnicas para validar condiciones en campo.
- Se reitera la importancia del cumplimiento en la entrega de documentación técnica y administrativa.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Radicar actas de socialización inicio actividades de obra San Antonio, el Colegio y Yacopí	Por definir
Entrega overoles con logo del ICCU	15/05/2026
Inicio actividades de obra Quipile (sector limonal) - Contratista	1/06/2026
Inicio actividades obra, Villagomez - Contratista	14/05/2026
Entrega ajuste diseño disipador Yacopí - ICCU	Por definir
Inicio actividades de obra corredor vial Zipaquirá - Pacho PR7+600 - Contratista	Por definir
Inicio actividades de obra corredor vial Zipaquirá - Pacho sector la M - Contratista	Por definir
Remitir oficialmente a Interventoría y Contratista los documentos relacionados con la desvinculación del contratista anterior - ICCU	Por definir
Presentar formalmente el análisis de manejo de aguas para revisión y aprobación - Contratista	Por definir
Consolidar informe técnico, registro fotográfico y alternativas de solución para el Box Culvert en Yacopí - Contratista	Por definir
Gestionar el personal requerido para iniciar actividades en Villagómez - Contratista	5/06/2026

ASISTENTES:

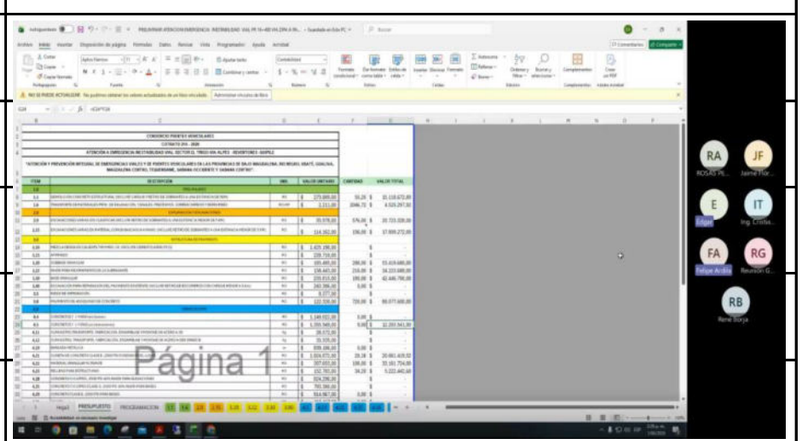NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	SOPORTE DE ASISTENCIA
Cristian Torres	cristian.torres@cundinamarca.gov.co	
Edgar Aragón	earagon@gavinco.com	
Jaime Flórez	residenteconinterprovincia@gmail.com	
Rene Borja	emergencia.obra214@gmail.com	
Felipe Ardila	emergencia.obra214@gmail.com	

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	18/06/2026	ACTA No.	8
HORA DE INICIO:	4:40 pm	HORA FINALIZACIÓN:	5:40 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina ICCU		
DEPENDENCIA:	Interventoría		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar comité de seguimiento al contrato de atención de emergencias - Lote 2, con el propósito de evaluar su avance técnico, administrativo y contractual.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza comité de seguimiento con el fin de revisar el estado de los frentes de obra:

- Se presenta preocupación por parte de la Entidad por la falta de inicio de actividades de obra y la limitada disponibilidad de personal para la ejecución del proyecto.

- El contratista informó que en los municipios de Anolaima, Susaima y Alto del trigo, actualmente se encuentra asignado un solo residente de obra para atender dichos frentes.

A continuación se presenta el estado de cada uno de los frentes.

* Yacopí - Box Culvert: Se realizó visita de obra con el fin de verificar si era posible realizar el traslado del Box, no obstante, no se logró un acuerdo con los dueños del predio. Durante la inspección se evidenció la presencia de una cantidad considerable de material de arrastre. La entidad solicita al contratista presentar un informe con fotos y medidas. La propuesta por parte del contratista es realizar un apique para verificar si el suelo es estable para realizar la estructura. El contratista adelantará el levantamiento topográfico para realizar la implantación del box culvert y verificar que cambios se deben realizar con el fin de definir la estructura. El contratista debe realizar la implantación en planta - perfil.

* Anolaima - Muro de contención: Se informó que el contratista inició las excavaciones para la construcción de los caissons, sin embargo, las actividades fueron suspendidas debido a la falta de personal y a observaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. La interventoría requirió al contratista mejorar la señalización instalada, debido a que se encontraba deteriorada y en malas condiciones, especialmente en el frente de tipoquira - Pacho. De igual manera, se solicitó garantizar el uso adecuado de la indumentaria suministrada por el ICCU y presentar un plan de contingencia para la ejecución de las actividades.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* San Antonio de Tequendama: Se informó que se han presentado avances en la ejecución de las actividades. No obstante, el contratista debe evaluar que se va a realizar con el cabezote de la alcantarilla. Así mismo, debe realizar y revisar el tema de los gaviones y los filtros en ambos costados; así como verificar el estado de la tubería del afloramiento del agua.

* Villagumea - Huila: Por parte del contratista se informó que las actividades iniciarían el 22 de Junio de 2026.

* Nocaima: En este frente de obra se tiene 3 actividades: Construcción de placa huella y construcción de gaviones en la vereda el Volcan y la demolición de estructura de concreto en el puente sobre la Moya.
Se informó que a la fecha no se ha dado inicio a la ejecución de actividades, por lo que se encuentra pendiente la programación de inicio de actividades.

* Tipaquira - Pacho - Sector la M: Se informó que el contratista ya cuenta con la estructura de concreto que se debe realizar en ese punto.

* Facatativa: Se programó visita para el 22 de Junio con el fin de verificar los elementos que deben ser desmontados. Así mismo, se debe remitir el listado del personal que irá.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

CONCLUSIONES

Se da por finalizada la reunión y se dejan compromisos por parte del contratista

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar levantamiento topográfico e implantación del Sur	22/06/2026
Mejorar la señalización en todos los frentes.	26/06/2026
Mejorar la dotación y elementos de EPP.	26/06/2026
Pintura de El Colegio	26/06/2026.
Inicio de actividades - Villagumes	22-06/2026
Visita al frente de Facatativa- los Micos	22-06/2026

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	SOPORTE DE ASISTENCIA
René Borja García	emergencia.cly@gmail.com	
Cristian Fabian Torres Cortón	cristian.torres@cundinamarca.gov.co	
Edgar A. Aragon Otero	earagon@gauinca.com	

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	18-06-2026	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	10:30 am.	HORA FINALIZACIÓN:	12:40 pm.
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Aposentos - Municipio Yacopi		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Exponer a los propietarios de los predios aledaños al box coluvert en construcción la necesidad de implantar aguas arriba la estructura diseñada.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se le expone a la señora Elizabeth Cortez la necesidad de implantar metros arriba al box coluvert por no tener espacio y superficie adecuada en el tramo diseñado, por lo que se requiere mantener la vía alterna y construir el box coluvert en ese sector para garantizar la estabilidad de la obra.
La señora Elizabeth Cortez informo que no esta de acuerdo en ceder mas terreno por lo que sería necesario una compensación economica, por lo anterior monto expuesto.
De igual manera se le informe a la señora Maria Mireya Florido, quien solicite compensación economica por la sección del terreno para la construcción del box coluvert.

CONCLUSIONES

- Se verificara en reunión alternativas existentes.
- Se deja constancia que por parte del Contratisten no hubo acompañamiento a la reunión programada.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:	
COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
N/A.	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Helman Murcia	secplaneacion@tacopi.gov.co	
Juan Camilo Maheche	jmaheche@gmail.com	
Elizabeth Cortes	3127152266	
Wilmar Aguilar - Real	wilmaraguilarreal@Gmail.com	
Maria Mireja Florido Nars	1378240072	Maria Mireja Florido.
Jaime E. Flórez B.	residente con interproximidad	

Anexo 12
Registro fotográfico obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO JUNIO DE 2026

Frente de obra 1 – San Antonio de Tequendama (Cundinamarca)





Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Se finaliza con la instalación de rajón como mejoramiento de la estructura a la finalidad de estabilizar el sector afectado por el hundimiento de la infraestructura. Buenas condiciones climáticas.






Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Se realiza visita de inspección técnica donde se logra evidenciar irregularidades sobre la superficie, no se permite la instalación de geomalla hasta que mejoren la nivelación de la capa de sello.
Se realiza la nivelación de capa sello para la debida instalación de la geomalla. Buenas condiciones climáticas.



Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Se continúa realizando la nivelación y compactación de capa sello para la debida instalación de la geomalla. Se presentan lluvias durante la jornada laboral.



Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Se termina de realizar la nivelación y compactación de capa sello para la debida instalación de la geomalla. Se presentan lluvias durante la jornada laboral.

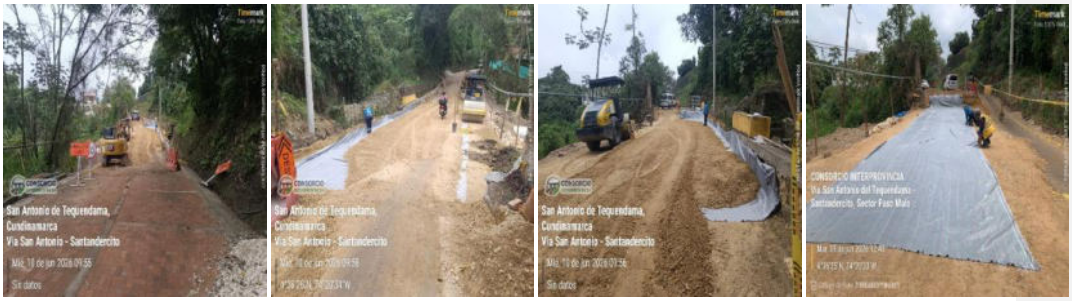




Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Durante la visita de inspección técnica se evidencia instalación de Geomalla y la primera capa de sub-base con un espesor de 15 cm. Material proveniente de la cantera de Soacha. Buenas Condiciones climáticas.





Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Durante la visita de inspección técnica se evidencia instalación de Geomalla y la primera capa de sub-base con un espesor de 15 cm. Material proveniente de la cantera de Soacha. Buenas Condiciones climáticas.

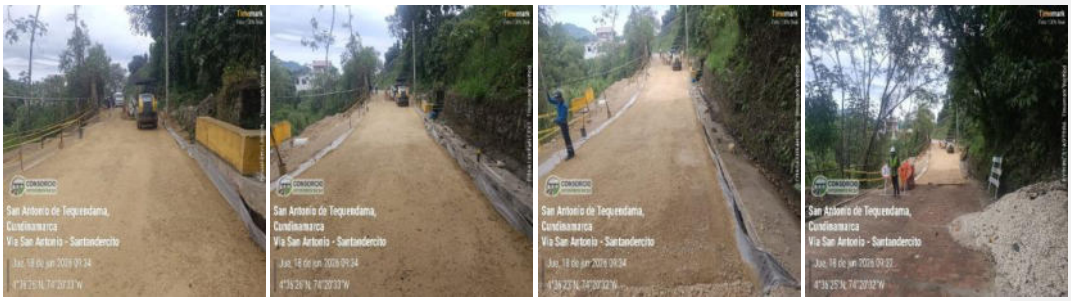



Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Durante la visita de inspección técnica se evidencia instalación de la primera capa de sub-base con un espesor de 15 cm. Material proveniente de la cantera de Soacha. Buenas Condiciones climáticas.

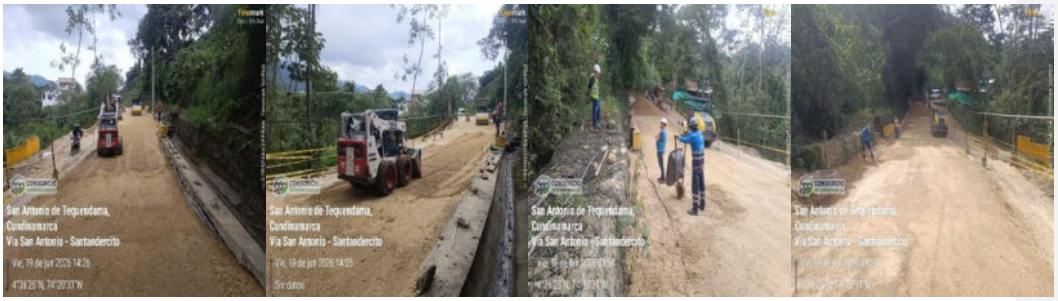

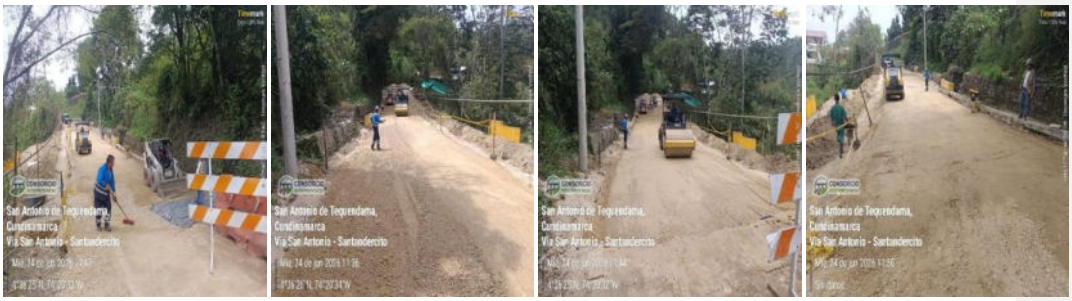



Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Durante la visita de inspección técnica se evidencia instalación de la capa total de sub-base la cual fue conformada y compactada según la nivelación de la topografía dejando una superficie ideal para realizarse los ensayos correspondientes y avanzar con la estructura de la vía. Material proveniente de la cantera de Soacha. Buenas Condiciones climáticas.





Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Se evidencia construcción de filtro transversal para darle manejo al nacimiento de agua encontrado debajo de la vía y evitar alteraciones al tramo intervenido el cual ha sido mejorado con material rajón y se está reconstruyendo en el momento . Buenas condiciones climáticas.



Rehabilitación de vía – San Antonio de Tequendama: Toma de ensayos de compactación a la capa sub-base de 30 cm con la finalidad de validar y liberar la capa instalada y continuar actividades. Buenas condiciones climáticas.


Frente de obra 1 – Anolaima – Corralejas





Vía Anolaima – Corralejas – Muro de contención: Se realiza visita de inspección técnica donde se evidencia la continuidad de la excavación manuela de dos caisson y el avance de fundición de dos anillos. Buenas condiciones climáticas.



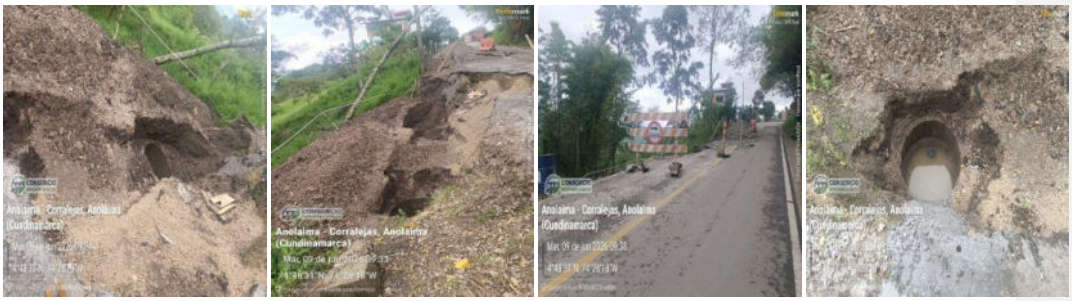

Vía Anolaima – Corralejas – Muro de contención: Se realiza visita de inspección técnica donde no se evidencia el avance de la obra. Además, se observa la falta de señalización en la zona y la falta de dotación y EPP´s a los trabajadores. Por lo que se opta por suspender actividades hasta que sean subsanadas las novedades presentadas. Buenas condiciones climáticas.





Vía Anolaima – Corralejas – Muro de contención: Se realiza visita de inspección técnica donde se logra evidenciar excavación del caisson 3 con dos anillos de sacrificio fundidos. Buenas condiciones climáticas.

Frente de obra 1 – Sasaima – Vereda San Bernardo – Quebrada blanca





Puente entre Sasaima – Vereda San Bernardo – Quebrada Blanca: Se realiza visita de inspección técnica donde se logra evidenciar la continuidad de excavación para la cimentación adecuada de concreto ciclópeo que protegerá la estructura del puente y soporte de los gaviones. Buenas condiciones climáticas.





Puente entre Sasaima – Vereda San Bernardo – Quebrada Blanca: Se realiza visita de inspección técnica donde se logra evidenciar la continuidad de construcción de concreto ciclópeo para proteger la estructura del puente y el soporte de los gaviones. Buenas condiciones climáticas.



Puente entre Sasaima – Vereda San Bernardo – Quebrada Blanca: Se evidencia el cese de actividades, no hay avance de obra y tampoco se evidencia personal en el frente de obra. Buenas condiciones climáticas.

Frente de obra 1 – Corralejas – Alto del Trigo - Filtro





Vía Corralejas – Alto del Trigo – Filtro: Se realiza visita de inspección técnica donde no se evidencia avance de obra en la construcción del filtro. Además, se logra observar acumulación de aguas lluvias la cual se está filtrando por debajo de la vía. Buenas condiciones climáticas.







Vía Corralejas – Alto del Trigo – Filtro: Se realiza visita de inspección técnica donde se evidencia avance en la construcción del filtro para una totalidad de 68 ml quedando por construir 6 ml. Buenas condiciones climáticas.



Vía Corralejas – Alto del Trigo – Filtro: Durante la inspección técnica se evidencia construcción de filtro en su totalidad y quedando pendiente generar el tapado del filtro con material afirmado. Buenas condiciones climáticas.

Frente de obra 1 – Facatativá – Los Micos – Estación Paradero El Ferrocarril

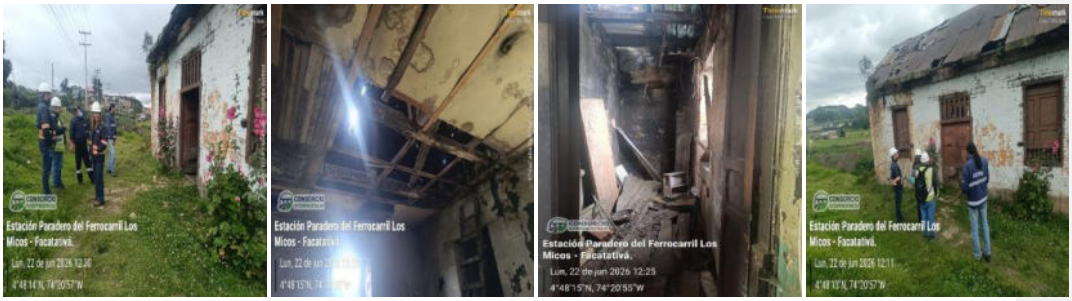

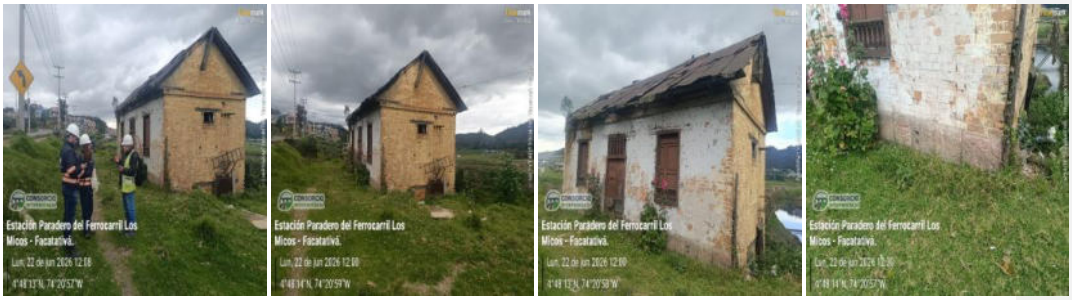

Estación paradero El Ferrocarril – Sector Los Micos – Facatativá: Se realiza una visita de inspección técnica para verificar el estado actual de la estructura existente y dar claridad a los elementos de la estación férrea a conservar, Tales como ventanas, puertas, adoquín, piedras base, partes del telegrafo, vigas de techo y piso en buenas condiciones.



Estación paradero El Ferrocarril – Sector Los Micos – Facatativá: Se realiza una visita de inspección técnica para verificar el avance de obra y se evidencia que el contratista avanza en la construcción del cerramiento garantizando la zona adecuada de intervención. Buenas condiciones climáticas.

Frente de obra 1 Vía Zipaquirá – Pacho – PR 16+400


Comentado [MD1]: Completar descripciones de ser necesario.



Visita técnica de revisión del estado actual del sito. Se evidencia un tramo vial en mal estado lo que requiere intervención en construcción de estructura vial. Además, se evidencia abandono de material como adoquín, bordillo, arena de peña y material filtrante. Buenas condiciones climáticas.



Visita técnica de revisión del estado actual del sito. Se realiza recorrido con el contratista para definir parámetros e iniciar a intervenir el frente de obra a la mayor brevedad Debido al flujo vehicular en la zona no se autorizan actividades hasta contar con una buena señalización y respectivos controladores de tráfico. Buenas condiciones climáticas.

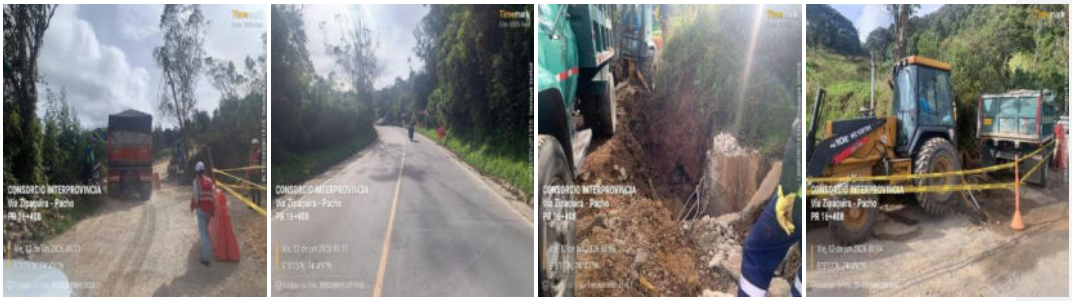



Visita técnica de revisión del estado actual del sito. Se evidencia el inicio de actividades en el frente de obra realizando la excavación con maquinaria para la construcción de un filtro lateral. Durante el recorrido se evidencia señalización la cual debe complementarse para dar visibilidad a la obra y prevenir accidentes. Buenas condiciones.





Visita técnica de revisión del estado actual del sito. Se evidencia construcción de filtro lateral con geotextil y piedra filtro. Buenas condiciones climáticas.



Visita técnica de revisión del estado actual del sito. Se evidencia excavación de fallo sobre la vía el cual es intervenido y mejorado mediante la instalación de material Rajón. Buenas condiciones climáticas.





Visita técnica de revisión del estado actual del sito. Se evidencia avance de obra en la construcción del filtro lateral y la continuación de relleno de material rajón al fallo evidenciado. Buenas condiciones climáticas.

Frente de obra 1 – Yacopí – Vereda Aposentos







Vía que comunica Yacopí – Vereda Aposentos: Durante la visita de inspección técnica se evidencia el trabajo con maquinaria en la adecuación del carreteable nuevo y se valida la necesidad de construir el box culvert metros arriba por no tener el espacio y superficie adecuada. Buenas condiciones climáticas.

}Frente de obra 1 – San Antonio de Tequendama – Vía Parque Principal Santandercito






Visita técnica de revisión del estado actual del sito. Se evidencia deformación de la vía principal (hundimiento)

generado por la tubería de aguas lluvias subterráneo, también se evidencia que el tramo en revisión ya ha sido intervenido con anterioridad. Buenas condiciones climáticas.

Frente de obra 1 – Villeta - Quebrada Guanábano – Batea entre Barrio Obrero - Barrio San Jorge



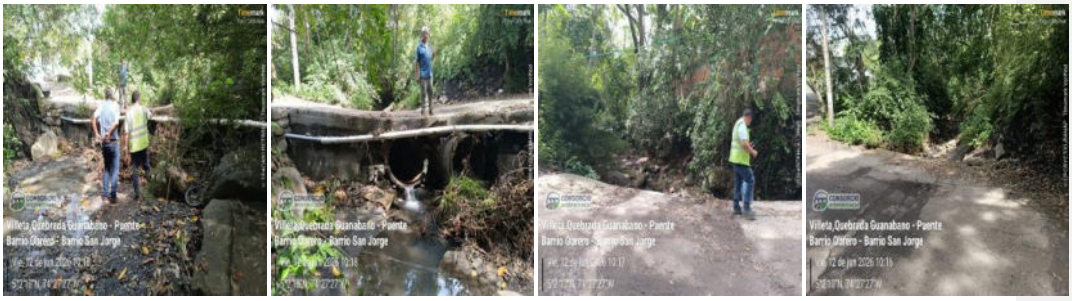

Visita técnica de revisión del estado actual del sito. Se evidencia estructura tipo Batea con dos tubos en concreto de 36” aproximadamente los cuales permiten el paso de la quebrada. El problema se presenta cuando hay crecida de caudal, ocasionando taponamiento de los tubos y además genera que la quebrada se desborde afectando el paso de la comunidad. Buenas condiciones climáticas

Frente de obra 1 – Villeta - Quebrada Prospero – Alcantarilla entre Barrio San Jorge - Barrio San Obrero





Visita técnica de revisión del estado actual del sito. Se evidencia construcción de alcantarilla en buenas condiciones con tubería de 36". El problema surge cuando hay crecida de la quebrada que la tubería no da capacidad para el caudal. Generando que se rebose la quebrada y afectado a la vía terciaria que comunica a los dos barrios. Buenas condiciones climáticas

Frente de obra 1 – Villeta - Quebrada Maní bajo - Vía Villeta con Vereda Maní







Visita técnica de revisión del estado actual del sito: Se evidencia placa huella en excelentes condiciones estructurales que función cómo batea para el paso de la quebrada y, además, se cuenta con un puente de paso peatonal seguro. La problemática registrada , es cuando se presentan lluvias, generando crecida de la quebrada y evitando el paso vehicular. Buenas condiciones climáticas

Frente de obra 1 – Villagómez - Sector Puente Tabla

Comentado [MD2]: Culminar descripciones de ser necesario.



Visita técnica de revisión del estado actual del sito: En el sector no se evidencia logística para inicio de actividades, no hay materiales ni personal, continúan sin atender la solicitud de inicio inmediato. Buenas condiciones climáticas.




Muro de contención – Sector Puente Tabla – Villa Gómez: Durante la visita técnica se evidencia el avance de excavación de base de cimentación, donde se realizará la excavación de dos caisson de 1,5 metros de diámetro con 5 metros de profundidad. El personal aun no cuenta con la dotación adecuada y los elementos de protección personal.



Muro de contención – Sector Puente Tabla – Villa Gómez: Durante la visita técnica de revisión al estado actual de la obra se evidencia armado de acero para construcción de los anillos de seguridad de los caisson; personal sin dotación y elementos de protección personal incompletos. Buenas condiciones climáticas.


Frente de obra 1 – Pacho - Sector Puente Pasuncha

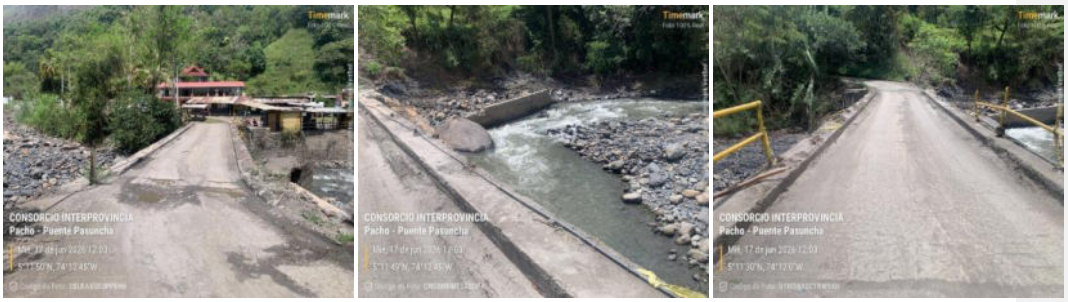

CONSORCIO INTERPROVINCIA	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.**
Informe Mensual de Interventoría No. 03 del 01 de junio al 30 de junio de 2026	

Visita técnica de revisión del estado actual del sito: En el sector no se evidencia logística para inicio de actividades, no hay materiales ni personal, continúan sin atender la solicitud de inicio inmediato. Buenas condiciones climáticas.

Frente de obra 1 Vía Zipaquirá – Pacho – Pr 23+900

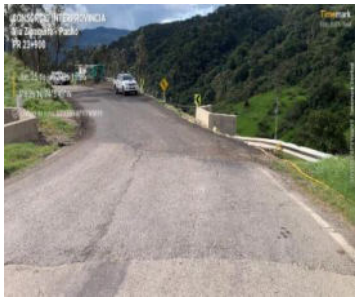



Visita técnica de revisión del estado actual del sito: Se evidencia topografía del contratista realizando levantamiento topográfico de la zona para validad las condiciones en las que se encuentra y poder garantizar la intervención adecuada a la emergencia. Buenas condiciones climáticas.

Frente de obra 1 - Utica – Sector San Roque – Vereda Palacio







Visita técnica de revisión del estado actual del sito: Se evidencia la construcción de un estribo de puente y se requiere de la topografía a mayor brevedad para garantizar con exactitud la construcción del otro estribo para avalar la buena construcción del puente militar el cual es requerido de carácter urgente. Buenas condiciones climáticas.

Anexo 13
Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTES JUNIO DE 2026

FRENTE Municipio San Antonio del Tequendama - Paso Malo



Descripción: Demarcación de área de trabajo y maquinaria

FRENTE Municipio Pacho – Vía Zipaquirá



Descripción: Personal identificado con indumentaria del proyecto

FRENTE Municipio Anolaima – Corralejas




Descripción: Demarcación señalización móvil

FRENTE Municipio Pacho – Vía Zipaquirá



Descripción: Actividad retiro de residuos de excavación

FRENTE Municipio Pacho – Vía Zipaquirá

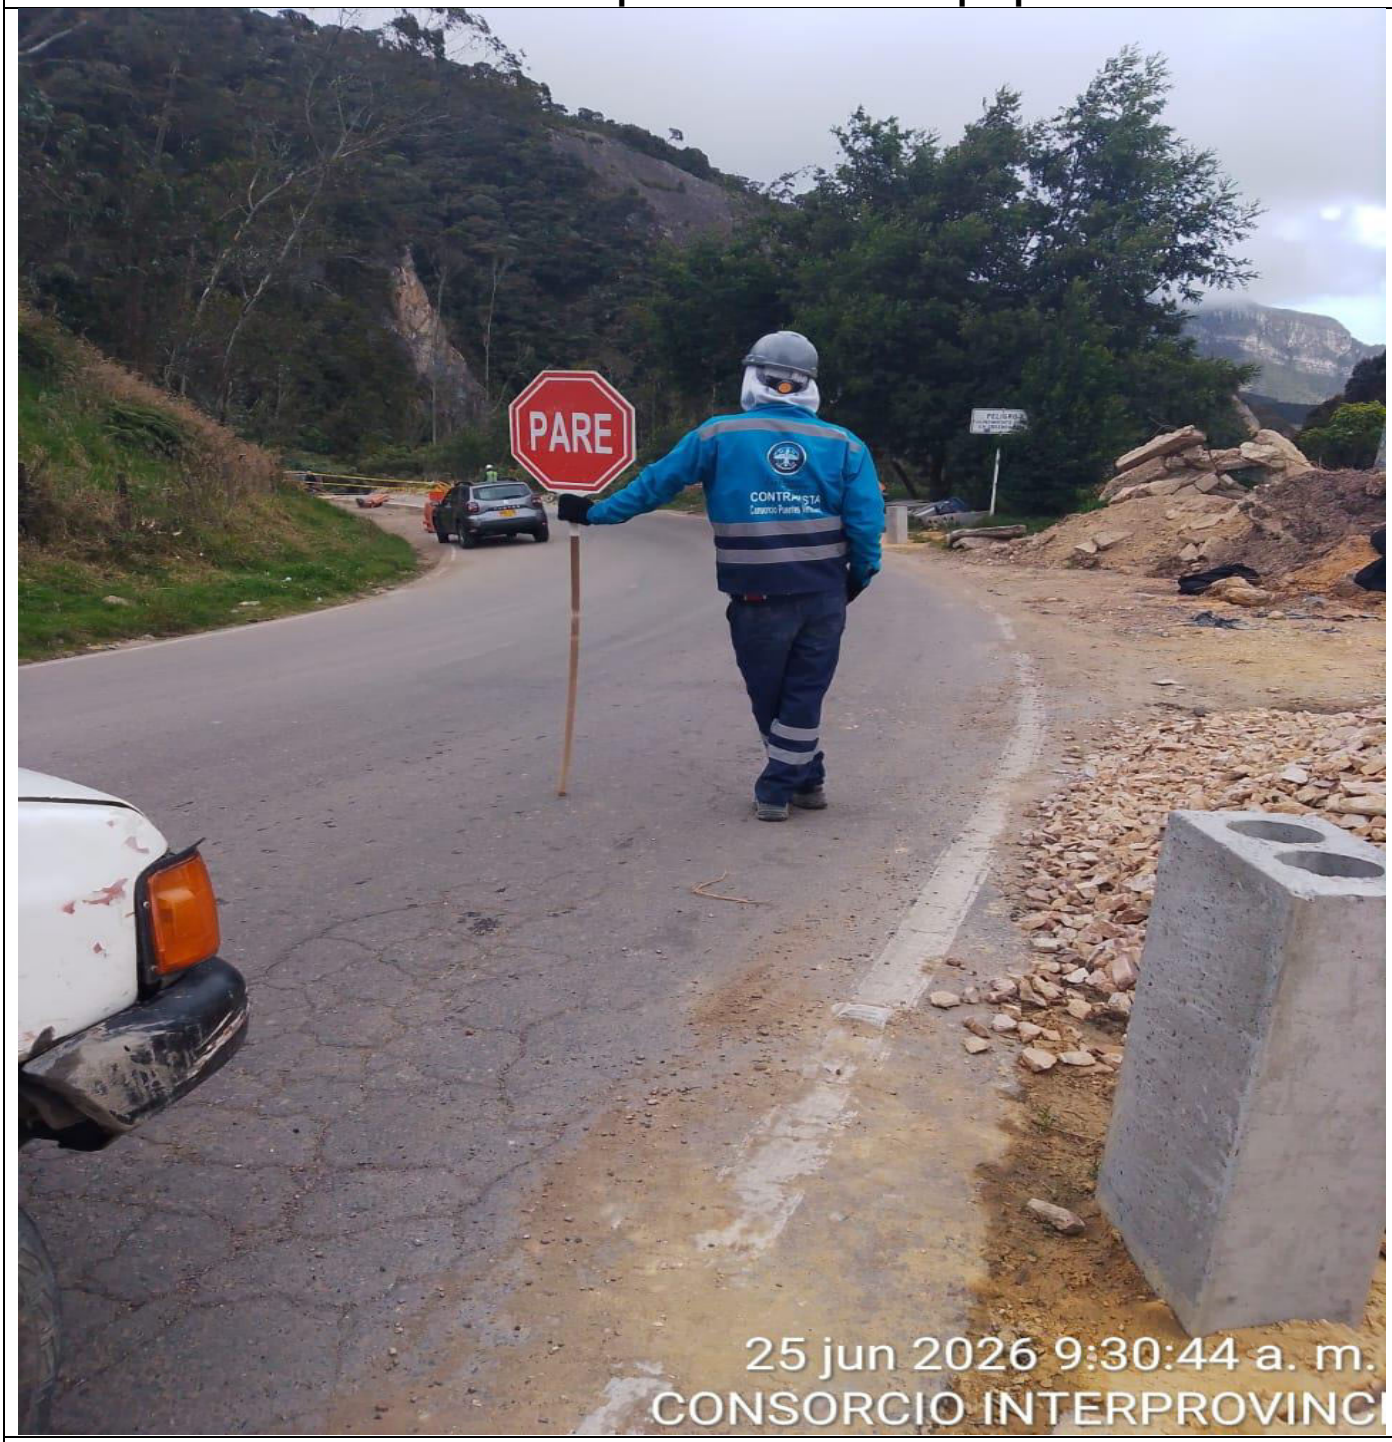

Descripción: Actividad Control de trafico

Anexo 14
Bitácora

un (1) maestro, un (1) ayudante.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Mezcladora de concreto (trompo)
ACTIVIDADES.
Excavación manual bajo agua para comunicación de concreto ciclopeo, recalce de estribo.

GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se realizan actividades. (Equipo ilegible no disponible)

Sabado 30 de mayo de 2026.

ANOLAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado seco.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación y perfilado de cajon para fundir concreto del segundo anillo.

Los demas frentes no adelantan actividades.

Lunes 01 de junio de 2026.

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Clima seco.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, dos (2) ayudantes, un (1) operador, un (1) Conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 DE, vibro compactador Dynapac CA 150P, volqueta.

ACTIVIDADES.
Se suministra, instala y conforma roca para mejoramiento de subrasante.

YACOPI.
Se realiza visita por parte del director de obra, al cual informa que se presenta erosion e inestabilidad de borde via, costado derecho, sentido Aposentos a Yacopi, ganado por la fuerte ola invernal en la zona y ausencia de obra de contencion.
Lo anterior condiciona la construccion del box diseñado en el punto inicial ya replanteado.
Razon por la cual el contratista recomienda dos alternativas.
1- Construccion de muro de contencion que sirva de contencion del relleno de acceso al box, confine y de estabilidad a la cimentacion en la salida aguas abajo del box, se requiere que tambien realice diseños del muro de contencion.
2- Reubicar el box aguas arriba del sitio actual diseñado, aproximadamente 25 ml, con nueva ubicacion sobre la via alterna construida.
Para lo anterior se requiere la respectiva socializacion con comunidad y el permiso emitido por la alcaldia.
Por parte de Interventoria se socializara la situacion planteada por el Contratista a la entidad contratante, para dar

a seguir, para dar continuidad a las obras que se adelantaron en el sector en mención.

* ANOLAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Tiempo seco.
PERSONAL EN OBRA: Sin personal.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
No se ejecutan actividades.

* GACHALA.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intermitentes.
PERSONAL EN OBRA: Sin personal.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
No se ejecutan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se ejecutan actividades

Residente Interventoría

Martes 02 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco, nublado.
PERSONAL DE OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313D2, vibrocompactador Dynapac CA150P, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza el suministro, instalación y conformación de rejón para mejoramiento de sub rasante.
Se acondiciona sendero peatonal sector izquierdo salida San Antonio del Tequendama – Santandercito.

* YACOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
Se adelanta excavación para caisson.
Se fonde anillo No 2 caisson No 2.
* SASAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales
MAQUINARIA Y EQUIPO: Mezcladora de concreto (Trompa
(Trompo)
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación manual bajo agua para
nivel de cimentación
* GUAYABAL DE SIQUIMA
No se ejecutan actividades.

Reh. Residente Interventoría

Miercoles 03 de Junio de 2026

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inspector de obra, un (1)
ayudante, un (1) aparador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2,
vibrocompactador Dynapac CA 150P, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza suministro, instalación y compac-

mación de material rajón para mejoramiento de sub basente.

* YACOPI.

No se adelanten actividades

* ANOLAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES:

Continua ejecutandose excavación para caisson.

Se funde anillo de caisson No 02.

* SASAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Mezcladore de concreto. (Trompo).

ACTIVIDADES:

Se realiza mezcla para concreto ciplopeo, se instela en cimentación.

Se realize manejo de aguas con bolsas de tierra.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se ejecutan actividades.

Residente Interventoría

JUEVES 04 de Junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, Un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313D2, vibrocompactador Dynapac CA 150P, volquete.

Se realiza excavación en tramo del sendero peatonal, se suministra e instala material rejón para mejoramiento de suelo y apoyo lateral del talud.
Se realiza reconformación de capa de sello que presente irregularidades, deformación, tramos con exceso de humedad generando fallos y compactación, de capa de sello.
* YASCOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLDIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones climaticas.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES.
Se termina excavación de anillo caisson y se funde concreto.
Se realiza excavación para la viga.
* DASSIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buen clima.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Mezcladora de concreto.
ACTIVIDADES.
Se termina instalación de concreto ciclopeo para cimentación y protección de estructura existente.
* GUSTAVO DE STQUIMA.
No se adelantan actividades.

Residente Interventoría

FELIPE TIBADEN

Viernes 05 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias fuertes desde las 12:30m.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2 vibrocompactador Uhel Dynapac CA 150P, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza mejoramiento en la superficie de la capa de sello que presenta irregularidades, material suelto y sin compactar.
La referencia de la geomalla dispuesta en obra es distinta a la propuesta por el contratista y aprobado por interventoria.
El contratista indica que acorde a aclaración suscitada para la especificación de la geomalla a utilizar como refuerzo para estructura de pavimento en el sector de inestabilidad vial PasoMela informan que la geomalla BX 760 es equivalente a la geomalla TR 5000 HF, ambas según las normas de ensayos ASTM para geotextiles.
Por lo anterior se le solicita al Contratista presentar la justificación por parte del especialista con los certificados de calidad que avalan lo expuesto.
Debido a las fuertes lluvias las actividades de obra se terminan a las 2:00pm.
* YACOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
Se presenta personal de obra para no se adelantan actividades.
Se ha solicitado en reiteradas oportunidades

los documentos de afiliación del personal en esta frente de obra, así como la dotación y elementos de seguridad para realizar excavaciones en espacios confinados sin que a la fecha se obtenga respuesta.

Se solicita dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en cuanto a las solicitudes SST realizadas por parte de interventoría.

* SASAIMA.

No se adelantan actividades, no se presenta personal y se evidencia que no disponen de materiales en este frente de obra.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se adelantan actividades.

* PACHO PR 16+400.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor, un (1) Ingeniero Inspector.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.

ACTIVIDADES:

El Contratista dispone retroexcavadora, volqueta y de personal se encuentra Ingeniero inspector.

No se dispone de la señalización adecuada por lo que se solicita disponer de las señales adecuadas tanto de aproximación como en el sector a intervenir que permitan seguridad tanto para los usuarios de la vía como los trabajadores.

En el frente de obra se encuentra materiales y elementos pertenecientes al anterior contratista por lo que se solicita el

Contratista realizar inventario y demarcar estas zonas para evitar conflictos.

Residente Interventoría

Martes 09 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313D2 vibrocompactador Dynapac CA 25D, volqueta.
ACTIVIDADES:
Comisión de topografía de Interventoría hace presencia en el frente de obra para recopilar información para verificar avance de obras y materiales dispuestos.
Se solicita realizar reconformación de varios sectores de la capa de sello instalada por presentar fallos, humedad y deformación.
Una vez se realizaron los ajustes a la capa de sello se realiza instalación de geomalla Pavco TR 5000 HF, medio calzada.
Se suministra e instala material de sub base en el tramo con refuerzo de geomalla.

* YACOPI
No se adelantan actividades.

* ANOLAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Clima seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, un (1) profesional SST, un (1) ingeniero ambiental, dos (2) oficiales.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES:

Los dos (2) oficiales de obra llegan sobre las 10:00 am y posteriormente llega el profesional SST y el Ing. embrunbl

Se evidencie falta de señalización de materiales preolares, se debe cubrir adecuadamente la obra, no se dispone de señalización suficiente y adecuada.

Los oficiales de obra no cuentan con dotación adecuada ni EPPs, el nivel que el profesional SST y el ing. embrantal.

Por lo anterior se reitera el Contratista dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales de seguridad y salud en el Trabajo y hasta tanto no se de cumplimiento a todas las observaciones que garantican la ejecución de actividades de obra en condiciones de seguridad, no se autorize ejecución de actividades en este frente de obra, además siendo consistentes se verificaran los demas frentes.

* SABANA.

En el frente de obra no se evidencia personal, no se dispone señalización informativa, los materiales no cuentan con señalización y protección.

Se observan residuos de concreto en los alrededores de la quebrada, por lo que se solicita realizar jornada de limpieza.

No se dispone de elementos que garantican el acceso al sector en intervención en condiciones seguras.

Se reitera dar cumplimiento a las normas

y especificaciones de seguridad y salud en el trabajo que garanticen seguridad a los trabajadores y habitantes del sector el cual de implementar medidas de proteccion de la fuente hidrica donde se ejecutan los trabajos.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se ejecutan actividades.

* PACHO PR 16+400

ESTADO DEL TIEMPO: lluvias aisladas todo el dia.

PERSONAL DE OBRA: Un (1) Ingeniero inspector, un(1) ayudante, un(1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta

ACTIVIDADES:

Se realize retiro de escombros en zona para Impreza de caja de alcanterille a demoler.

Residente Interventoria

Miercoles 10 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: buenas condiciones climaticas.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retro excavadora CAT 313 D2. vibrocompactador Dynapac CA 150 P, volqueta.

ACTIVIDADES:

Continua el rajorteamiento de estructura con geomalla Pavco TR 5000 HF, medio calzada, 20 ml.

Se suministra material granular sub-base.

Se conforma y extiende material.

Se atiende visita de técnica para revisar situación que se presenta en vía principal del parque de la inspección Fontibón.

* YASCOPI

No se adelantan actividades.

* ANOLAIMA

No se adelantan actividades.

* GASSAIMA

No se adelantan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se adelantan actividades.

* PACHO PR 16+400

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias intermitentes.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, un (1) ayudante, un (1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.

ACTIVIDADES:

Se realiza excavación y limpieza de costado izquierdo vía a Pacho.

Presidente Interventoría

Ing.

Ingeniero Residente

Jueves 11 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: buenas condiciones climaticas.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un(1) ayudante, un (1) operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA 150P.

ACTIVIDADES:

Se realiza reconformación y compactacion del

salle, si suministre e instele zuomelle de refuerzo TR 5000 HF Pauco, se instele meteriel prenuler subbese en media calzada.

* YACOPI

No se edelenten actividedes.

* ANOLAIMA

No se edelenten actividedes.

* SASAIMA.

No se edelenten actividedes.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: tres (3) ayudentes.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcevedore CASE.

ACTIVIDADES.

Se realize excevación, se suministre protex-til NT 2500, meterrel filtrente pere construcción de un tremo de filtro de 38 ml.

Pendiente de construcción 6 m pere empelmer con elcenterille existente.

* PACHO PR 16+400.

ESTADO DEL TIEMPO: Llovias leves en le meñene.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, un(1) ayudente, dos (2) controledores de trefico, un(1) operedor, Un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcevedore Jhon Deere 410, volqueta.

ACTIVIDADES:

Se inicie demolición de caja de elcenterilla existente.

Residente Interventoria

2

Viernes 12 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2 vibrocompactador Dynapac CA 150P.
ACTIVIDADES:
Se suministre e instale material granular sub base para conformación de capa según estructura.
* YASCOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA NO
No se adelantan actividades
* CASCAIMA
No se adelantan actividades
* GUAYABAL DE SIQUIMA
NO SE ADELANTAN ACTIVIDADES.
* PACHO PR 16+400
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, un(1) ingeniero residente, un (1) ingeniero director un (1) profesional SST, un (1) ayudante, dos(2) controladores de trafico, un (1) operador, un(1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavador Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:
Los diarios de obra e interventoria recorren el frente de obra para generar compromisos en la ejecucion de las actividades.
El profesional SST de interventoria realiza

las siguientes observaciones respecto a lo encontrado en obra.

- Reemplazar el botiquin de la retroexcavadora 410. Este elemento debe contar con un sistema de almacenamiento adecuado y disponer de la totalidad de los insumos requeridos en optimas condiciones de uso.
- Suministrar al personal la indumentaria corporativa y los Elementos de Proteccion Personal EPP necesarios para el desarrollo seguro de las actividades. Durante el recorrido se evidencio personal sin proteccion respiratoria y sin la indumentaria correspondiente a la entidad.
- Realizar una charla de sensibilizacion sobre la obligatoriedad del uso permanente de botas y casco de seguridad en todos los frentes de trabajo. Durante la inspeccion se evidencio personal utilizando tenis y sin casco de seguridad.
- Socializar con el personal la importancia del uso adecuado de la indumentaria corporativa, evitando la combinacion de prendas pertenecientes a otras entidades o empresas.
- Suministrar a los auxiliares de trafico herramientas de comunicacion apropiadas que permitan coordinar de manera agil y segura el flujo vehicular en las zonas de intervencion.
- Reforzar la señalizacion y demarcacion de las areas de trabajo, asi como instalar la señalizacion ocupacional requerida para la prevencion de riesgos y la proteccion de trabajadores y usuarios de la via.

Observaciones Ambientales.

- Realizar jornadas periodicas de orden y aseo en las areas de trabajo, garantizando condiciones

adecuadas de limpieza y organización.
· Gestionar ante la entidad competente el retiro o la reubicación de materiales que no correspondan el proyecto y que se encuentren dentro del area de intervención.
· Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización instalada, implementando mecanismos que perentican la estabilidad y permanencia de la señalización de proximidad a obra.
En obra se avanza con la demolición de caja de alcantarillo existente y excavacion de sector aledaño.
* VISITA TECNICA VILLETA.
Se realiza visita tecnica el municipio de Villeta sectores Quebrada Guanabeno-Puente Barrio obrero, Quebrada Prospero-Puente Barrio san borja, Quebrada Meni Bajo-Via Villeta.

Residente Interventoria

Martes 16 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, Vibrocompactador Dynapac CA150P,.
ACTIVIDADES:
No se ejecuten actividades, no se dispone de material sub base granular segun indica

al contratista dibido a las lluvias del fin de semana no se dispacho material de la cantera.
El operador de los equipos no hace presencia en el frante de obra.

* YASCOPI

No se adelantan actividades.

* ANOLASIMA

No se adelantan actividades.

* SASAIMA.

No se adelantan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se adelantan actividades.

* PACHO PR 16+400

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias suaves en la mañana.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:
Suenze demolición de caja de alcantarilla existente.

Residente Interventoría

Miercoles 17 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.

ACTIVIDADES:
Se realiza el suministro, conformación y compactación del material subbase granular para conformación capa según estructura.
* YASCOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
No se adelantan actividades.
* SASAIMA
No se adelantan actividades.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias suaves en la mañana.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación para recuperar ancho de vía, se inicia excavación y conformacion para construcción de filtro.

Residente Interventoria

Viernes 19 de Junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: SECO.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313DZ vibrocompectador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Avance instalación de subbase y renobar para conformación de capa segun estructura.
* YACOPI.
No se adelantan actividades.
Se realize reunión convocada por la administración municipal, con los propietarios de los predios para exponer las necesidades del proyecto. Las observaciones estan consignedes en acta de le fecha.
El Contratista no asistio a reunion programada.
* ANOLAIMA
No se adelantan actividades
* SASAIMA
No se adelantan actividades
* GUAYABAL DE SIQUINA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, dn (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, una volqueta.
ACTIVIDADES
Avance excavación para construcción de filtro, se suministre geotextil NT 2500 peuco, y material granular filtrante.

Residente Interventoria

Viernes 19 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un(1) ayudante, un (1) operador.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Se suministra, conforma y compacta material de sub base granular para conformación de capa. Se acondicionan rampas para habilitar paso por el tramo, según lo solicitado por la administración municipal para garantizar la participación en las elecciones presidenciales.
Se evidencia excavación por nacimiento de agua bajo la estructura de la vía, por lo que se construirá filtro para dar manejo.
* YASCOPI
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
No se adelantan actividades.
* SASAIMA.
No se adelantan actividades.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado, lluvias suaves.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:

Se realiza excavación, suministro de geotextil NT 2500 para, material granular filtrante, para continuar con la construcción de filtro.

Residente Interventoría.

Lunes. 22 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inspector de obra, un (1) ayudante, un (1) operador.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavacion para construccion de filtro transversal para dar manejo aguas de nacimiento bajo estructura de la via, se suministra geotextil, tubo PVC perforado y material granular filtrante.
* VASCOPI
No se adelantan actividades
* ANOLAIMA
No se adelantan actividades.
* SASAIMA NO se adelantan actividades.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) ayudantes, dos (2) controladores de trafico, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere

410, volqueta.
ACTIVIDADES:
Buenas construcción de filtro.
* FACATATIVA:
La empresa tarraz regional Región Trans realiza la entrega del inmueble Estación peradero del Ferro-carril los Micos para desmantelamiento y recuperación de elementos como marcos de puertas y ventanas, puertas y ventanas, mamposteria entre otros, por ser considerado patrimonio de la nación y requiere su rehabilitación y conservación.

Residente tn

Martes 23 de junio de 2026.
ESTADO
* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones climaticas.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un (1) ayudante, dos (2) operadores.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313D2, vibro compactador Dynapac CA150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Continua construcción de filtro para control de aguas de nacimiento de agua bajo estructura de la vía, se realiza suministro de geotextil NT2500 Bidim, material granular filtrante y tuberia PVC perforada de 4".
Se realiza descapotacion de material de sub base para conformación y compactación de la capa en-val de topografia segun diseño.
Es importante recordar que de estructura en con

trucción se pazare segun diseño establecido pare lo cubl se solicite control de topogre-fie.

* YASCOPI.

No se edulenten actividades.

* ANOLASIMA.

No se edalenten actividades.

* SASSAIMA

No se edalenten actividades

* GUAYABAL DE SIQUIMA

No se edulenten actividades.

* PACHO PR 16+400.

ESTADO DEL TIEMPO: Nubledo, lluvias luves.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inzanfuro Inspector, dos (2) controladores de trepico, dos (2) eyudantes, un (1) oparador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadore Jhon Deere 410, volquete.

ACTIVIDADES:

Constinue construcción de filtro costado izquier-do suntido Zipequira-Pecho.

* FACATATIVA.

No se edulenten actividades.

Jaime Flórez
Residente Interventoría.

Felipe Alzate

Miercoles 24 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: buenes condiciones climeticas.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obre, un (1) eyu-dente, dos (2) operadores.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadore CAT 313 D2,

vibrocompactador Dynepac CA150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES.
Conformación y compactación de material granular sub base.
* YACOPI.
No se adelantan actividades.
* ANOLAIMA.
No se adelantan actividades.
* SASAIMA.
No se adelantan actividades
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
No se adelantan actividades.
* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos (2) controladores de trafico, dos (2) ayudantes, un (1) operador, un (1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Shon Deere 410, volquete.
ACTIVIDADES:
Se inicia excavación para conformación de estructura de diseño, se evidencia material de subrasante saturado, baja capacidad portante y presencia de arcillas, se retirara material hasta encontrar suelo con mejores condiciones y capacidad para estructura.
* FACATATIVA
No se adelantan actividades.

Residente Interventoría.

Felipe Rozo

Jueves 25 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buen estado del tiempo.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra., un (1) ayudante, dos (2) operadores.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2., vibrocompactador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Continua conformación y compactación de capa sub base granular, se termina conformación de capa. Se solicita progresiva toma de densidades a capa instalada para liberación.
* YACOPI
No se adelantan actividades
* ANOLAIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.
MAQUINARIA Y EQUIPO; N/A.
ACTIVIDADES:
Se realiza demolición de alute de alcantarilla.
* SASAIMA.
No se adelantan actividades.
* GUAYABAL DE SIQUIMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
PERSONAL EN OBRA: Dos (2) ayudantes.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
Se realiza construcción de tramo pendiente de filtro, se suministra geotextil NT 2500 negro, y material granular filtrante.
Pendiente taper longitud total de filtro construido.
Retirar escombros y material de excavación.

* PACHO PR 16+400.
ESTADO DEL TIEMPO: Nublado, seco.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos(2) controladores de trafico, dos(2) ayudantes, un(1) operador, un(1) conductor.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación para encontrar suelo que presente mayores caracteristicas, se profundiza 1.70 m., se realiza suministro de relleno para mejoramiento de subrasante.
Profesional SST y AMBIENTAL de interventoria realiza las siguientes observaciones.
1. Se refiere que todo la maquinaria y equipos deben contar con los registros preoperacionales debidamente diligenciados. Durante el recorrido se evidencia que la retroexcavadora Jhon Deere 410 no cuenta con el registro.
2. Suministrar un botiquin de primeros auxilios en buen estado, con elementos completos que lo componen y garantizando condiciones adecuadas de almacenamiento, orden e higiene.
3. Suministrar al personal los elementos de protección personal (EPP) complementarios requeridos para la actividad, como botas de caucho y protección respiratoria. Durante la inspección se evidencia personal realizando actividades de retiro de material excavado sin los EPP adecuados y con exposición permanente a material particulado.
4. Implementar medidas de seguridad que garanticen el ingreso y salida segura del personal a las areas excavadas del frente de obra.

5. Adopter medides proteccion pere el personel que reelize ectividedes de epoyo e le excevecrón y edecuecrón del frente de trebejo, consideurendo el riesgo de derrumbe de les excevecrones.
6. Instelar señelizecrón ocupecionel preventive e informetive en los diferentes puntos de interuncrón, de ecuerdo con los riesgos identificedos.
7. Continuer con el mentenimiento y reposicion de le demercecrón, mediente cinte de peligro en les erees interuenides.
8. Reiterer el personel le obligecrón de reelizer uso del cerpede de los vehiculos destinedos el transporte de residuos de excevecrón. Durente el recorrido se evidencie une volquete sin el respectivo sistema de cubrimiento de cerger
9. Adopter medides que gerenticen le permenencie de le señelizecrón instelede, teniendo en cuente les condiciones climeticas, especielmente los efectos del viento en el frente de obre.
10. Se reitere le necesided de conter con le presencie permenente del profesionel SST y Ambientel de los diferentes frentes de obre, con el fin de fortelecer el seguimiento, control y cumplimiento de los requisitos de segurided, selud en el trebejo y gestión ambientel.

* FACATATIVA
No se edulenten actividedes.
* VILLAGOMEZ
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) meetro, un (1) oficiel, dos (2) eyudentes, un (1) operedor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 416.
ACTIVIDADES.
Se realiza excavación para cimentación del muro, se perfila talud.
La cimentación del muro se realizara por medio de dos(2) caisson de 5m de profundidad.
Se debe realizar entibado de talud para evitar colapso de este y cierre de vía.
Se solicita dotar el personal de dotación y elementos de protección personal.
Instalar señalización informativa y preventiva que oriente a los usuarios de la vía sobre los trabajos que se ejecutan en la vía.

Jaime Flórez
Residente Interventoría

Felipe Arenas

Viernes 26 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
ESTADO DEL TIEMPO: Buenas condiciones climaticas.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) inspector de obra, un(1) ayudante, dos (2) operadores.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora CAT 313 D2, vibrocompactador Dynapac CA150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Se realiza toma de densidades a capa de sub base granular, se toma muestra de material para rectificar humedad optima.
No se autoriza continuar con colocación de material granular base hasta tanto

no se presentan los resultados de las diligencias.

Se acondicionaron rampas de acceso para habilitar paso durante el fin de semana, resguardado por la administración municipal y con autorización del ICCU.

* YACOPI

No se adelantan actividades.

* ANOLAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Dos (2) oficiales.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES:

Avanza demolición de cuneta de alcantarilla existente.

* SASAIMA

No se adelantan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se adelantan actividades.

* PACHO PR 16+400.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Dos (2) controladores de trafico, dos (2) ayudantes, un (1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deere 410, volqueta.

ACTIVIDADES:

Se realiza suministro de recebo para mejoramiento de sub rasante.

* FACATATIVA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero Inspector, dos (2) ayudantes

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES:

Se inicia con el cerramiento del inmueble.
se tiene acompañamiento de Ruprotrans.

* VILLAGONIEZ.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) maestro, un (1) oficial, dos (2) ayudantes.
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
Se realiza anclado para soporte del telud.

Jaime Flórez
Residente Interventoría.

Felipe Flórez

Martes 30 de junio de 2026.

* SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) Inspector de obra, un (1) ayudante, dos (2) operadores.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador Dynapac CA 150P, minicargador CAT.
ACTIVIDADES:
Se acopia material de base granular.

* YACOPI.

No se adelantan actividades

* ANOLAIMA.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.
PERSONAL EN OBRA: Un (1) oficial, un (1) ayudante
MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.
ACTIVIDADES:
Se realiza excavación manual de caisson 3, se funde anillo de concreto de un tercer anillo.

Se retira agua de la excavación de caisson 1 y 2.

* SASAIMA.

No se adelantan actividades.

* GUAYABAL DE SIQUIMA.

No se adelantan actividades.

* PACHO PR 16+400.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Un (1) ingeniero inspector, dos(2) controladores de transito, dos (2) ayudantes, un(1) operador, un (1) conductor.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Retroexcavadora Jhon Deare 410, volqueta.

ACTIVIDADES.

Se realiza excavación para estructura de pavimento articulado.

* FACATATIVA.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

PERSONAL EN OBRA: Un(1) ingeniero residente, un(1) ayudante.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES.

Se termino de ajustar al carramanto.

Se inicia desmonte de ventanas.

* VILLAGOMEZ

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

PERSONAL EN OBRA: Un(1) maestro, un(1) oficial, dos (2) ayudantes.

MAQUINARIA Y EQUIPO: N/A.

ACTIVIDADES.

Excavacion para anillo 1 caisson No 1.

Se ajusta formaleta para anillos.

Residente Interventoria.
