

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ACOMETIDA DOCIMICILIARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA SEDE DE LA RAMA JUDICIAL DE MAJAGUAL -**	**60 días**	**mié 24/06/26**	**sáb 22/08/26**	
2		**OBRAS CIVILES**	**38 días**	**mié 1/07/26**	**vie 7/08/26**	
3		Corte de piso en concreto con cortadora	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26	56
4		Demolición de pavimento rigido e =entre 0,15 m a 0,20 (inlcuye retiro y acarreo	5 días	vie 3/07/26	mié 8/07/26	3
5		Demolición andén en concreto e = 0,08 m	3 días	vie 3/07/26	lun 6/07/26	3
6		Demolición bordillo en concreto h = 0,15 m	3 días	vie 3/07/26	lun 6/07/26	3
7		Excavación manual en material común	5 días	mié 8/07/26	lun 13/07/26	4;5;6
8		Relleno con material seleccionado compactado rana	3 días	vie 24/07/26	lun 27/07/26	27
9		Construccion de andén concreto 3000 psi e = 0,15 m (incluye	3 días	lun 27/07/26	jue 30/07/26	8
10		Construccion de Bordillo 0.30x0.15 ref 2#3 en concreto 3.000 psi vaciado en sitio incluye conformacion de la superficie de apoyo	3 días	lun 27/07/26	jue 30/07/26	8
11		Fundicion de loza maciza en concreto e = 0.20 m	3 días	lun 27/07/26	jue 30/07/26	8
12		Construccion de caja subterránea estación de bombeo de aguas residuales medidas internas H=1,65 m A=	5 días	lun 13/07/26	vie 17/07/26	7
13		Protección en concreto de tubería	2 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	24
14		Caja de inspección sanitaria 60x60 H <=1,0	3 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	24
15		Desmonte de cielo raso en lámina en yeso	6 días	vie 17/07/26	jue 23/07/26	12
16		Regata	2 días	vie 24/07/26	sáb 25/07/26	15
17		Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y	3 días	dom 26/07/26	mié 29/07/26	16

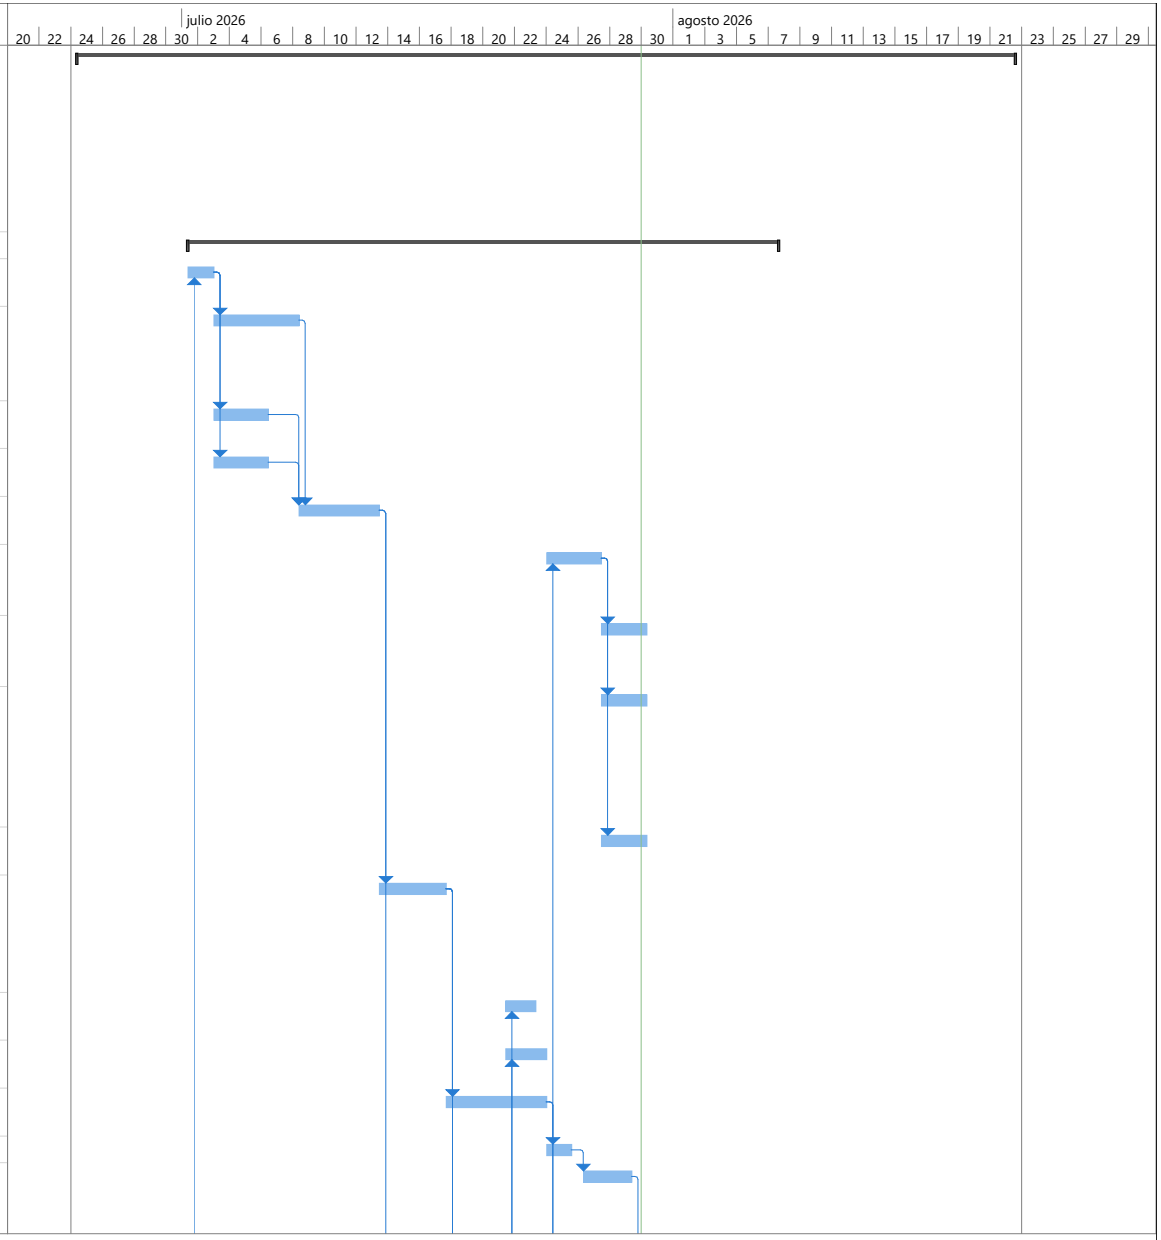

Proyecto: PROGRAMACION AL
Fecha: jue 30/07/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
18		Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla electrosoldada de 6 mm	5 días	mié 29/07/26	lun 3/08/26	17
19		Pañete lineal 1:4	5 días	lun 3/08/26	vie 7/08/26	18
20		Suministro e instalacion de cielo raso en yeso	7 días	vie 24/07/26	jue 30/07/26	15
21		**INSTALACIONES SANITARIA**	**7 días**	**vie 17/07/26**	**vie 24/07/26**	
22		Conexión a red sanitaria existente en PVC sanitaria ø = 4"	2 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	24
23		Condenación red sanitaria existente en PVC sanitaria ø = 4".	2 días	jue 23/07/26	vie 24/07/26	22
24		Suministro e instalación de tubería en PVC sanitaria ø = 4”. Incluye accesorios para su	3 días	vie 17/07/26	mar 21/07/26	12
25		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21	2 días	vie 17/07/26	lun 20/07/26	12
26		Suministro e instalación de tubería PVC Novafort o similar ø = 6”. Incluye accesorios para su correcta instalación	2 días	vie 17/07/26	lun 20/07/26	12
27		Cimentación y atraque de tubería	3 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	24;25;26
28		Válvula de bola PVC tipo pesado roscada ø =2"	1 día	lun 20/07/26	mar 21/07/26	25
29		Unión universal PVC presión SCH 40 roscada	1 día	mar 21/07/26	mié 22/07/26	28
30		Conexión a pozo de inspección	1 día	vie 24/07/26	vie 24/07/26	27
31		**INSTALACIONES ELÉCTRICA**	**6 días**	**vie 17/07/26**	**jue 23/07/26**	
32		Suministro e instalación de tuberia EMT de	3 días	vie 17/07/26	mar 21/07/26	12
33		Suministro e instalación de cable alimentador de Cu libre de halogenos de 2*#6 AWG + 1*#6 AWG + 1*#6 AWG	2 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	32
34		Suministro e instalación de alimentador de electrobomba 1 y 2 en cable de Cu XLP 2*#10 AWG + 1*#10 AWG	2 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	32

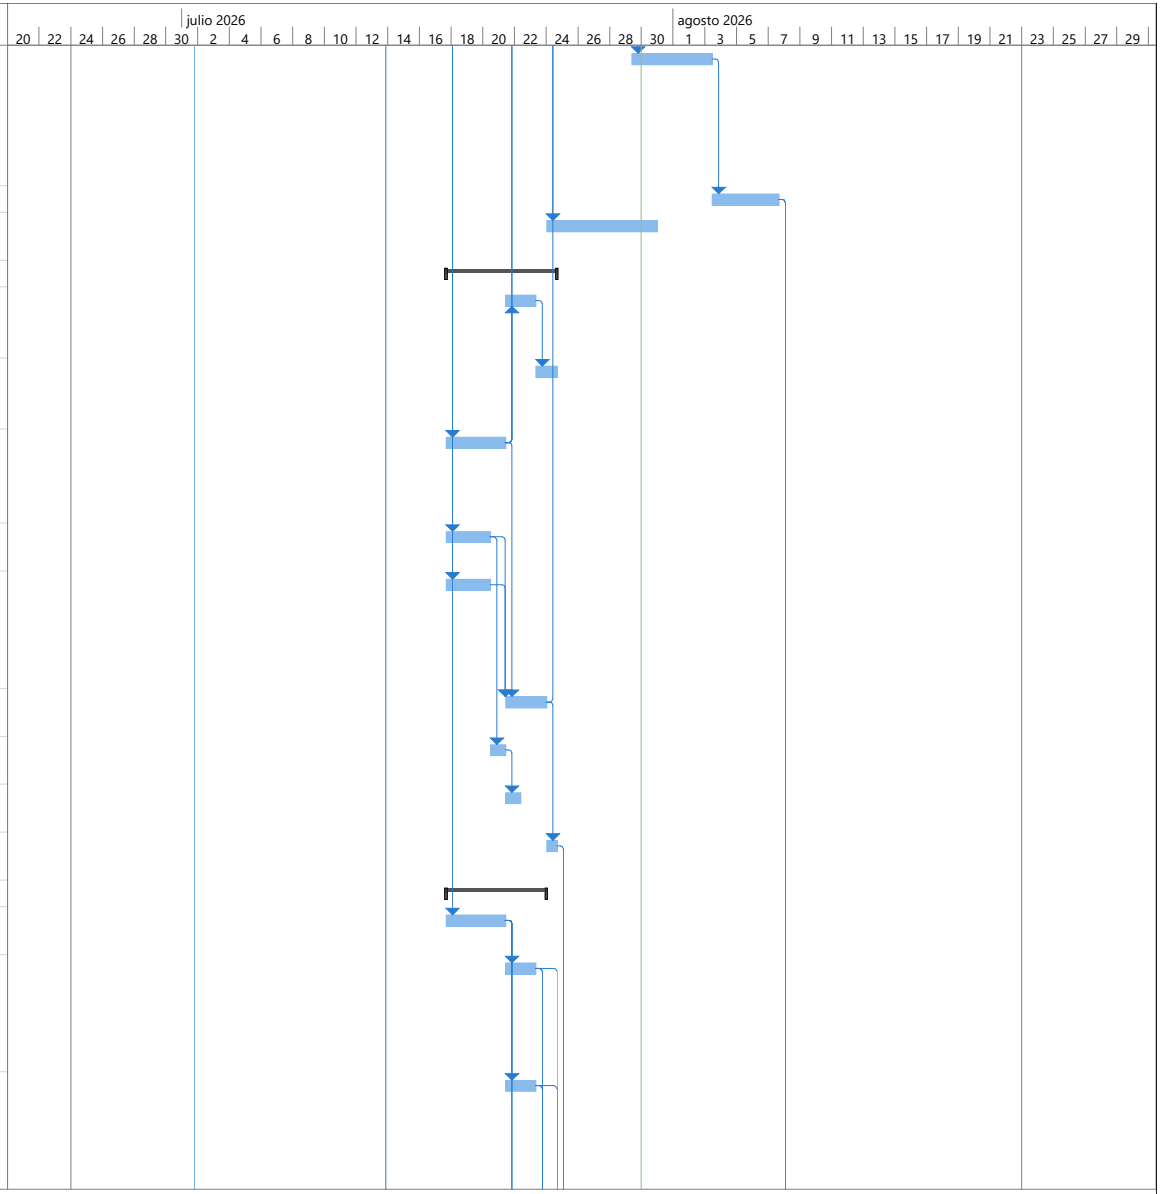

Proyecto: PROGRAMACION AL
Fecha: jue 30/07/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35		Suministro e instalación de conectores tipo gel para empalmes de cables de derivación de calibre 14 a 8 AWG.	1 día	jue 23/07/26	jue 23/07/26	33;34
36		Suministro e instalación de ducto conduit PVC de	2 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	32
37		Suministro e instalación de ducto conduit EMT	2 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	32
38		Suministro e instalación de breaker enchufable de 2*50 A	1 día	jue 23/07/26	jue 23/07/26	33
39		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS**	**5 días**	**vie 24/07/26**	**jue 30/07/26**	
40		Suministro, instalación y puesta en servicio equipo de eyección compuesto por dos bombas trifásicas sumergibles trituradoras cuya profundidad de operación mínima bajo el agua sea de 5m, temperatura del líquido mínimo hasta 40°C, nivel	5 días	vie 24/07/26	jue 30/07/26	30;33;34;38
41		**NO PREVISTOS**	**15 días**	**vie 7/08/26**	**sáb 22/08/26**	
42		Desmonte y reinstalación de unidades condensadoras	3 días	vie 7/08/26	mar 11/08/26	19
43		Suministro e instalación de manto asfáltico termofusionado	3 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	42
44		Nivelación de superficie en mortero 1:3 (301 m²)	4 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	43
45		Suministro e instalación de alimentador Cu libre de halógenos	2 días	vie 7/08/26	lun 10/08/26	19
46		Suministro e instalación de alimentador de electrobombas	2 días	lun 10/08/26	mié 12/08/26	45
47		Caja de inspección eléctrica 60x60xH<1 m	2 días	lun 10/08/26	mié 12/08/26	45
48		Suministro e instalación de breaker enchufable	1 día	mié 12/08/26	jue 13/08/26	46
49		Suministro e instalación de lámparas LED (20	2 días	jue 13/08/26	vie 14/08/26	48
50		Suministro e instalación de lámparas LED panel 120x30 cm	1 día	jue 13/08/26	jue 13/08/26	48
51		Suministro y aplicación de estuco plástico	3 días	mar 18/08/26	jue 20/08/26	44

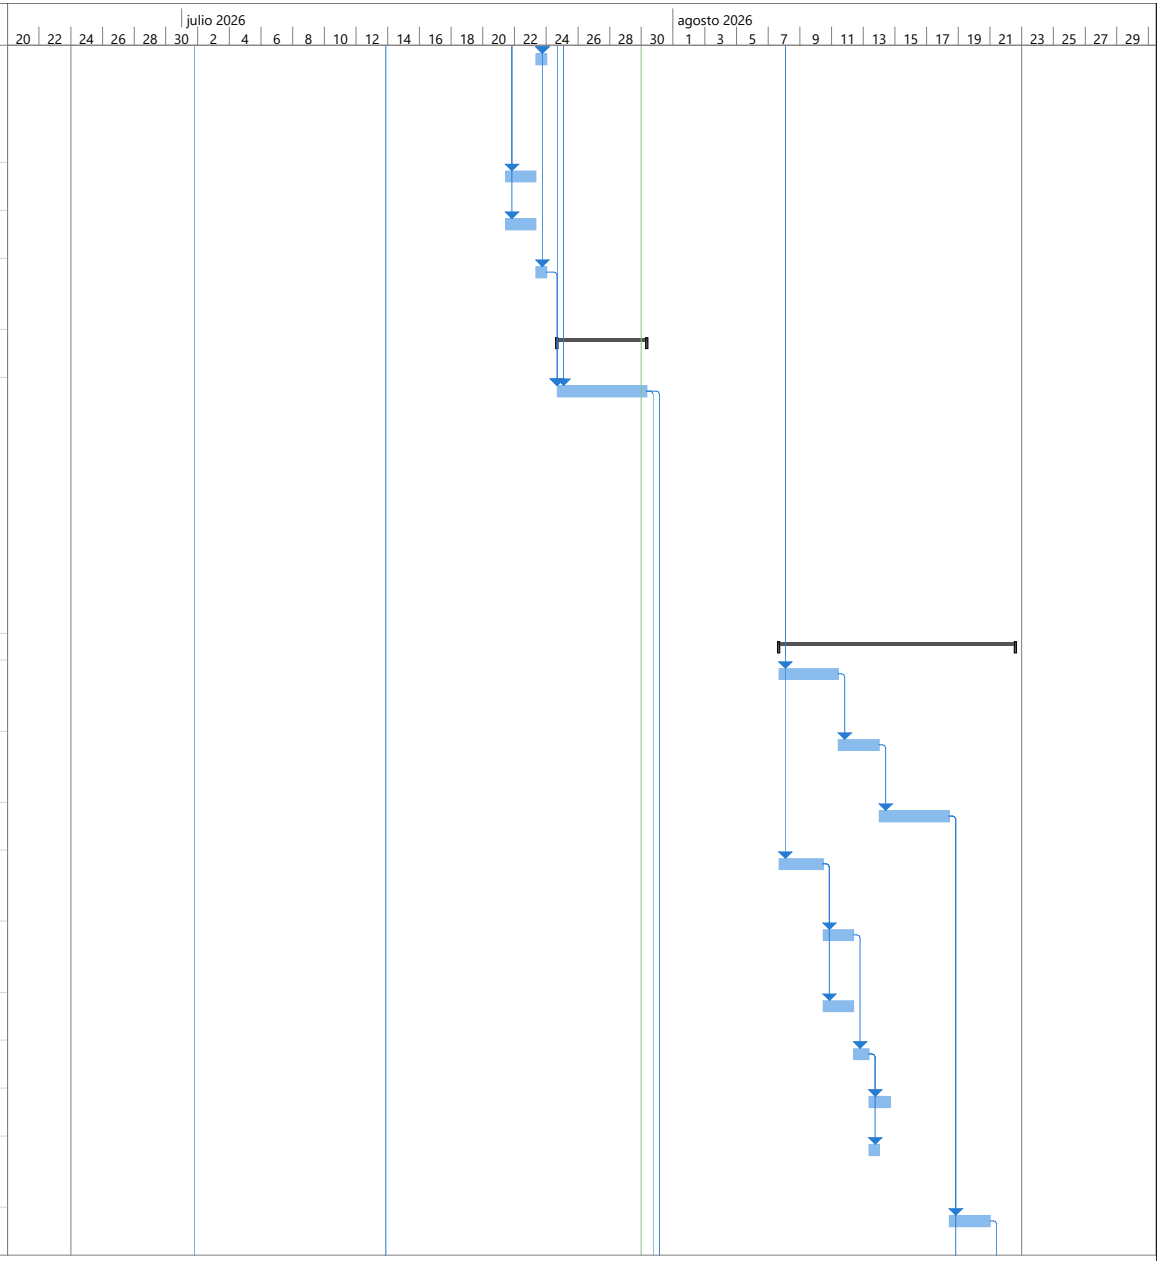

Proyecto: PROGRAMACION AL
Fecha: jue 30/07/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
52		Suministro y aplicación de pintura vinilo (251	2 días	vie 21/08/26	sáb 22/08/26	51
53		Suministro y aplicación de impermeabilizante Aquablock	2 días	mar 18/08/26	jue 20/08/26	44
54		**TRAMITES Y SERVICIOS**	**60 días**	**mié 24/06/2**	**sáb 22/08/2**	
55		Trámite permiso de acometida de alcantarillado (Se reconocera al contratista el valor cobrado por la entidad municipal respecto al tramite, para esto el monto sera variable de acuerdo a la	7 días	mié 24/06/26	mié 1/07/26	
56		Trámite permiso de intervención de espacio público. Incluye elaboración del Plan de Manejo de Tránsito y su implementación con señalización diurna y nocturna	7 días	mié 24/06/26	mié 1/07/26	
57		Servicio de succión para control de aguas de nivel freático contaminada por aguas residuales del alcantarillado municipal y pozo séptico con evacuación al sistema de alcantarillado municipal	17 días	lun 13/07/26	jue 30/07/26	7;40FF
58		Servicio de succión de aguas residuales incluye disposición final en lugar autorizado por la empresa de acueducto y alcantarillado municipal, limpieza de instalaciones sanitarias (incluye cajas de inspección)	3 días	jue 30/07/26	sáb 1/08/26	40
59		PLAN SST	53 días	mié 1/07/26	sáb 22/08/26	56
60		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	53 días	mié 1/07/26	sáb 22/08/26	56

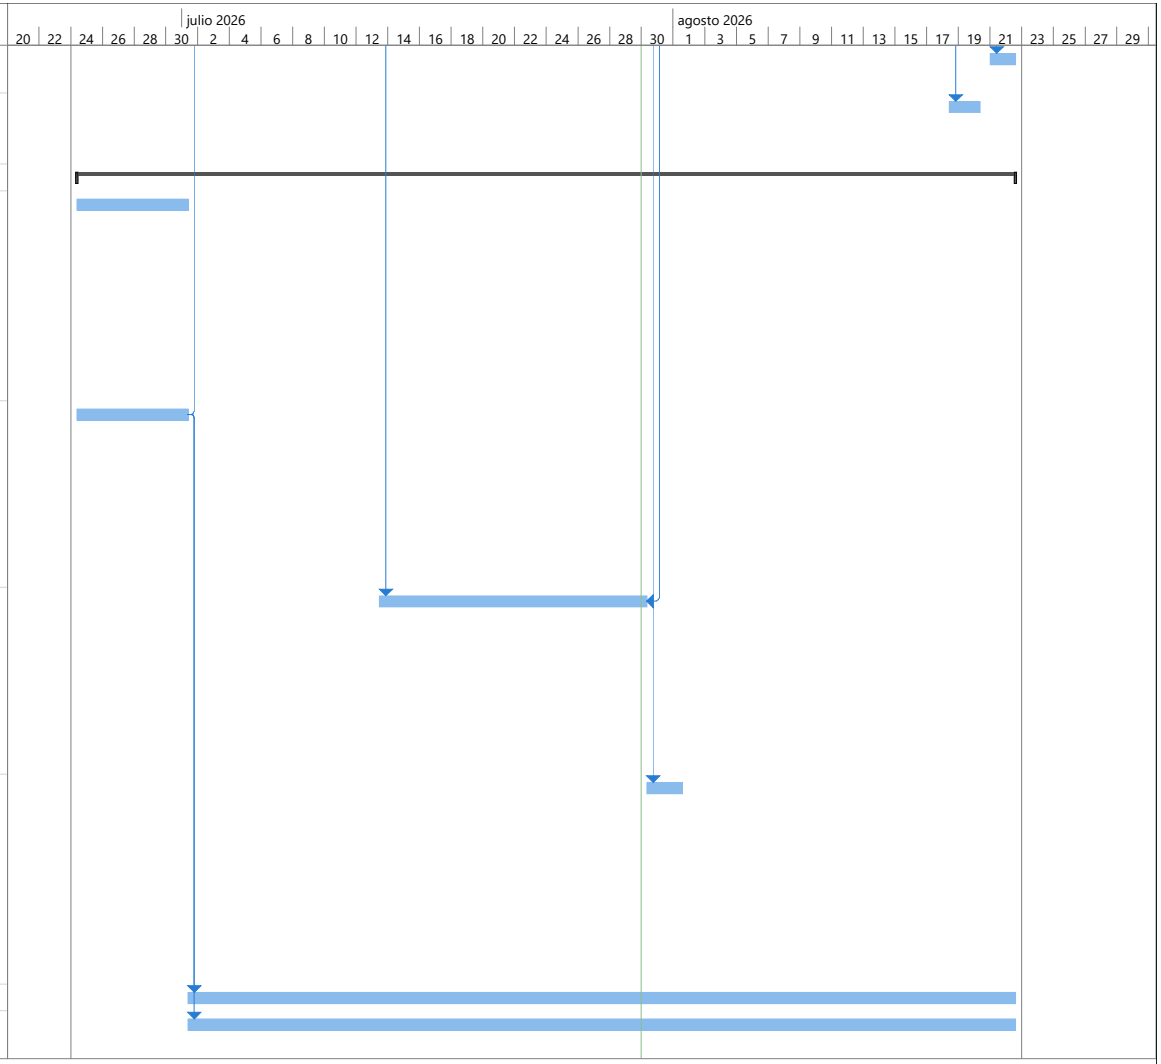

Proyecto: PROGRAMACION AL
Fecha: jue 30/07/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
