INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 62
PERIODO JULIO DE 2026
URIBIA –LA GUAJIRA.

Señores,
DIRECCION DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA.
Periodo:	Del 01 de Julio de 2026 al 31 Julio de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	LP-DT-066-2020		
CONTRATO DE OBRA No.	1009 DE 2021		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDINO 066	NIT:	901477981 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JMV INGENIEROS S.A.S	24%	800095951 - 9
	PROYECTOS Y VÍAS S.A.S.	25%	800119086 - 8
	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S	24%	890932730 - 7
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERÍA S.A.S.	24%	900182018 - 7
	TECCIVIL S.A.S.	1%	830117761 - 1
	GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A	1%	860034551 - 3
	CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	1%	901259571 - 5
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33061	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$ 265.853.856.477 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	$10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.		
ADICIÓN 1:	$10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 275.853.856.477 Incluido IVA		
ANTICIPO	2.4%		
ANTICIPO OTORGADO	$ 11.500.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 7.173.970.610,00		
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR:	$ 4.326.029.390,00		
PLAZO INICIAL:	110 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		

PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS
REANUDACIÓN 1:	23 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN 2:	16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 21 DE MAYO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Recurso No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	469121	54 C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 4.363.070.830	$ -
2021	469121	54 C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 4.641.385.647	$ -
2021	469121	54 C-2402-0600-13-0-2402021-02	$ 104.400.000	$ -
2021	469121	54 C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 4.165.000.000	$ -
2022	268222	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 14.284.000.000	$ -
2022	268222	11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 4.096.000.000	$ -
2022	268222	11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	$ 133.333.333	$ -
2022	760222	20 C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 10.000.000.000	$ -
2023	215923	11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	$ 93.192.823	$ -
2023	215923	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 10.878.807.177	$ -
2023	215923	11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 3.072.000.000	$ -
2023	999323	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	$5.000.000.000	$ -
2024	244624	10 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$11.118.320.000	$ -
2024	244624	10 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02	$2.831.680.000	$ -
2024	244624	10 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	$94.000.000	$ -

2024	903124	10 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$13.000.000.000	$ -
2025	159825	11 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$25.088.000.000	$ -
2026	302926	10 C-2402-0600-13-51102A- 2402021-02	$188.666.667	$ -
2026	302926	10 C-2402-0600-13-51102A- 2402006-02	$2 4.899.333.333	$ 9.207.359.966
TOTAL			$ 138.051.189.810	$ 19.207.359.966

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No. 1	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste P No 2	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No 2	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste P No 3	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No 3	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste P No 4	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste D No 4	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (obra)	$ 60.185.430	$ 439.817	$ -	$ 60.625.247
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (E&D)	$ 300.000.000	$ 57.000.000	$ -	$ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5	$ 1.001.780	$ 7.321	$ -	$ 1.009.101
Acta de Ajuste D No 5	$ 86.279	$ 631	$ -	$ 86.910
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 305.151.023	$ 2.229.950	$ -	$ 307.380.973
Acta de Ajuste P No 6	$ 4.639.328	$ 33.903	$ -	$ 4.673.231

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 7.214.453.093	$ 52.721.003	$ 1.360.216.747	$ 5.906.957.349
Acta de Ajuste P No 7	$ 135.136.133	$ 987.533	$ -	$ 136.123.666
Acta de Ajuste D No 6	$ 602.101	$ 4.400	$ -	$ 606.501
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$ 384.632.498	$ 2.810.776	$ 192.316.249	$ 195.127.025
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 910.877.671	$ 6.656.414	$ 455.438.836	$ 462.095.248
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$ 1.939.415.022	$ 14.172.648	$ 135.759.052	$ 1.817.828.618
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 5.183.649.828	$ 37.880.518	$ 414.691.986	$ 4.806.838.360
Acta de Ajuste D No 7	$ 80.431.253	$ 587.767	$ -	$ 81.019.020
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 3.304.260.771	$ 24.146.521	$ 264.340.862	$ 3.069.068.588
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 4.203.494	$ 798.664	$ -	
Acta de Ajuste D No 8	$ 18.926.637	$ 138.310		$ 19.064.947
Acta de Ajuste D No 9	$ 26.496.596	$ 193.629		$ 26.690.225
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$ 3.104.941.512	$ 22.689.957	$ 248.395.321	$ 2.879.236.148
Acta de Ajuste D No 6	$ 602.101	$ 4.400		$ 606.501
Acta de Ajuste D No 10	$ 122.315.344	$ 893.843		$ 123.209.187
Acta de Ajuste D No 11	$ 448.267.524	$ 3.275.801		$ 451.543.325
Acta de Ajuste D No 12	$ 290.046.283	$ 2.119.569		$ 292.165.852
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$ 3.623.646.251	$ 26.480.492	$ 289.891.700	$ 3.360.235.043
Acta de Ajuste D No 13	$ 303.714.643	$ 2.219.453		$ 305.934.096
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	$ 2.610.147.019	$ 19.074.151	$ 208.811.762	$ 2.420.409.408
PAGA	$ 4.159.949	$ 86.826		$ 4.246.775
Acta de Ajuste D No 14	$ 411.388.771	$ 3.006.303		$ 414.395.074
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$ 2.331.780.845	$ 17.039.937	$ 186.542.468	$ 2.162.278.314
Acta de Ajuste D No 15	$ 308.364.033	$ 2.253.429		$ 310.617.462
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$ 2.730.866.474	$ 19.956.332	$ 218.469.318	$ 2.532.353.488

Acta de Ajuste D No 16	$ 242.147.686	$ 1.769.541		$ 243.917.227
Acta de Ajuste D No 17	$ 301.476.049	$ 2.203.094		$ 303.679.143
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$ 1.664.505.438	$ 12.163.694	$ 133.160.435	$ 1.543.508.697
Acta de Ajuste P No 18	$ 227.474.899	$ 1.662.317		$ 229.137.216
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$ 433.625.741	$ 3.168.803	$ 34.690.059	$ 402.104.485
Acta de Ajuste P No 19	$ 56.219.526	$ 410.835		$ 56.630.361
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	$ 3.384.565.917	$ 24.733.366	$ 270.765.273	$ 3.138.534.010
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	$ 1.620.164.535	$ 11.839.664	$ 129.613.163	$ 1.502.391.036
Acta de Ajuste D No 18	$ 7.045.928	$ 51.489		$ 7.097.417
Acta de Ajuste D No 19	-$ 560.666	-$ 4.097		-$ 564.763
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22	$ 2.443.986.327	$ 17.859.900	$ 195.518.906	$ 2.265.762.558
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 23	$ 1.486.437.508	$ 10.862.428	$ 118.915.001	$ 1.378.384.935
Acta de Ajuste D No 20	$ 567.472.495	$ 4.146.914		$ 571.619.409
Acta de Ajuste D No 21	$ 301.376.853	$ 2.202.369		$ 303.579.222
Acta de Ajuste D No 22	$ 450.367.300	$ 3.291.146		$ 453.658.446
Acta de Ajuste D No 23	$ 300.355.396	$ 2.194.905		$ 302.550.301
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 24	$ 840.448.879	$ 6.141.742	$ 67.235.910	$ 779.354.711
PAGA SOCIAL	$ 72.796.352	$ 337.349		$ 73.133.701
Acta de Ajuste D No 24	$ 194.512.814	$ 1.421.440		$ 195.934.254
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 25	$ 2.681.153.298	$ 19.593.043	$ 214.492.264	$ 2.486.254.077
Acta de Ajuste P No 25	$ 581.496.525	$ 4.249.398		$ 585.745.923
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Ajuste D No 25	-$ 581.188	-$ 4.247	$ 0	-$ 585.435
Acta de Ajuste D No 26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Ajuste D No 27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 28	$ 1.701.256.730	$ 12.432.261	$ 136.100.538	$ 1.577.003.018
Acta de Ajuste D No 28	$ 315.540.681	$ 2.305.874	$ 0	$ 317.846.555
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 29	$ 405.972.753	$ 2.966.724	$ 32.477.820	$ 376.461.657
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 30	$ 540.073.013	$ 3.946.687	$ 43.205.841	$ 500.813.859
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 31	$ 1.686.291.908	$ 12.322.902	$ 134.903.353	$ 1.563.711.457
Acta de Ajuste P No 31	$ 430.863.535	$ 3.148.618		$ 434.012.153
Acta de Ajuste D No 30	$ 4.581.393	$ 33.480		$ 4.614.873
Acta de Ajuste D No 31	$ 14.396.091	$ 105.203		$ 14.501.294
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 32	$ 272.881.308	$ 1.994.133	$ 21.830.505	$ 253.044.936
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 33	$ 482.523.993	$ 3.526.137	$ 38.601.919	$ 447.448.211
E & D	$ 1.155.000.000	$ 219.450.000		$ 1.374.450.000
Acta de Ajuste D No 32	$ 59.925.613	$ 437.918		$ 60.363.351
Acta de Ajuste D No 33	$ 124.598.517	$ 910.528		$ 125.509.045
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 34	$ 702.780.676	$ 5.135.705	$ 56.222.454	$ 651.693.927
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 35	$ 1.058.687.258	$ 7.736.561	$ 84.694.981	981.728.838
Acta de Ajuste D No 34	$ 207.253.703	$ 1.514.546		$ 208.768.249
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 36	$ 540.273.497	$ 3.948.152	$ 43.221.880	$ 208.738.249
Acta de Ajuste D No 35	$ 224.133.500	$ 1.637.899		$ 225.771.399
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 37	$ 770.171.624	$ 5.628.177	$ 61.613.730	714.186.071
Acta de Ajuste D No 36	$ 107.039.625	$ 782.213		$ 107.821.838
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 38	$ 504.869.908	$ 3.689.434	$ 429.139.920	$ 79.419.920
PAGA SOCIAL	$ 67.084.947	$ 361.126	$ 57.022.205	$ 10.423.868
Acta de Ajuste D No 37	$ 161.893.508	$ 1.183.068		$ 163.076.576
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 39	$ 657.008.8529	$ 4.801.216	$ 135.906.812	$ 525.902.933

Acta de Ajuste D No 38	$ 10.291.144	$ 75.205		$ 10.366.349
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 40	$ 1.971.626.161	$ 14.408.037		$ 1.986.034.198
Acta de Ajuste D No 39	$ 18.129.971	$ 132.488		$ 18.262.459
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 41	$ 1.851.747.653	$ 13.532.002	$ 85.793.228	$ 1.779.486.427
Acta de Ajuste D No 30	$ 385.439.709	$ 2.816.675		$ 388.256.384
ANTICIPO 2				**$ 5.000.000.000**
Acta de Ajuste D No 41	$ 441.525.614	$ 3.226.533		$ 444.752.147
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 42	$ 4.992.301.836	$ 36.482.206		$ 5.028.784.042
SOCIAL	$ 78.223.802	$ 362.501		$ 78.586.303
Acta de Ajuste P No 42	$ 1.196.423.796	$ 8.743.097		$ 1.205.166.893
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 43	$ 3.652.445.734	$ 26.690.950		$ 3.679.136.684
Acta de Ajuste P No 43	$ 968.366.314	$ 7.076.523		$ 975.442.837
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 44	$ 554.703.210	$ 4.053.600		$ 558.756.810
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 45	$0.0	$0.0		$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 46	$0.0	$0.0		$0.0
Acta de Ajuste D No 42	$ 5.740.534	$ 41.950		$ 5.782.484
Acta de Ajuste D No 43	-$ 8.453.265	$ 61.774		-$ 8.515.039
Acta de Ajuste D No 44	$ 83.313.972	$ 608.883		$ 83.922.805
Acta de Ajuste D No 45	$0.0	$0.0		$0.0
Acta de Ajuste D No 46	$0.0	$0.0		$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 47	$ 268.570.016	$ 1.962.627		$ 270.532.643

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 48	$ 1.986.934.940	$ 14.519.909	$ 63.959.436	$ 1.937.495.413
Acta de Ajuste D No 47	$ 74.456.108	$ 5 44.102		$ 75.000.210
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 49	$ 1.801.902.003	$ 13.167.745	$ 58.003.225	$ 1 .757.066.523
Acta de Ajuste D No 48	$ 681.370.782	$ 4.979.248		$ 686.350.030
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 50	$ 2 .003.476.140	$ 1 4.640.787	$ 6 4.491.897	$ 1.953.625.030
Acta de Ajuste D No 49	$ 577.923.367	$ 4.223.286		$ 582.146.653
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 51	$ 2.332.956.822	$ 17.048.531	$ 75.097.880	$ 2.274.907.473
Acta de Ajuste D No 50	$ 589.979.441	$ 4.311.388		$ 594.290.829
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 52	$ 3.932.356.574	$ 28.736.452	$ 126.582.558	$ 3.834.510.468
Acta de Ajuste D No 51	$ 8 76.884.797	$ 6.408.004		$ 8 83.292.801
Acta de Ajuste D No 52P	$ 1.488.336.567	$ 10.876.306		$ 1.499.212.873
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 53	$ 2.512.388.202	$ 18.359.760	$ 80.873.776	$ 2.449.874.186
Acta de Ajuste D No 52	$ 2 .759.918	$ 20.169		$ 2.780.087
Acta de Ajuste P No 53	$ 8 93.178.910	$ 6.527.077		$ 899.705.987
Acta de Ajuste D No 53	$ 336.832	$ 2.461		$ 339.293
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 54	$ 3.132.004.325	$ 22.887.724	$ 100.819.219	$ 3.054.072.830
Acta de Ajuste P No 54	$ 1 .156.843.405	$ 8.453.856		$ 1.165.297.261
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 55	$ 3 89.569.741	$ 2 .846.856	$ 12.540.250	$ 379.876.347
Acta de Ajuste P No 55	$ 152.124.498	$ 1.111.679		$ 153.236.177
Acta de Ajuste D No 54	$ 9.269.002	$ 67.735		$ 9.336.737
Acta de Ajuste D No 55	$ 3.870.938	$ 28.288		$ 3.899.226

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 56	$ 2.845.677.82	$ 20.795.338	$ 91.602.369	$ 2.774.870.795
SOCIAL	$ 102.316.050	$ 474.147		$ 1 02.790.197
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 57	$ 1.473.551.755	$ 10.768.263	$ 47.433.631	$ 1.436.886.387
Acta de Ajuste D No 56	$ 993.940.812	$ 7.263.414		$ 1.001.204.226
Acta de Ajuste D No 57	$ 547.650.405	$4.002.061		$ 551.652.466
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 58	$ 1.248.440.888	$ 9.123.222	$ 4 0.187.312	$ 1.217.376.798
DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
TOTAL	**$ 1.248.440.888**	**$ 9.123.222**	**$ 40.187.312**	**$ 1.217.376.798**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No. 002 de 2022 y la interventoría continúan suspendidos al corte del 30 de Julio de 2026, no se presentaron nuevos informes de interventoría ni variaciones en las condiciones de ejecución del proyecto durante el periodo reportado.

En consecuencia, se mantiene el avance registrado previamente por el contratista, evidenciándose un adelanto del 0,28 % respecto de las actividades programadas de obra, conforme se observa en el cuadro adjunto:

GRANDES PARTIDAS	CONTRATADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
EXPLANACIONES	$ 7.925.905.423,0	$ 4.932.921.282,5	$ 6.173.090.204,0	62,24%	77,88%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 87.138.969.630,0	$ 31.783.188.533,7	$ 34.041.623.236,0	36,47%	39,07%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 72.375.323.665,0	$ 26.989.598.415,5	$ 27.216.049.210,0	37,29%	37,60%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 55.721.861.963,0	$ 24.721.536.484,2	$ 23.216.479.938,0	44,37%	41,66%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.770.277.751,0	$ 1.270.738.053,6	$ 613.684.520,0	33,70%	16,28%
TRANSPORTES	$ 4.582.000.000,0	$ 4.189.996.995,5	$ 3.271.412.994,0	91,44%	71,40%
TOTAL	$ 231.514.338.432,0	$ 93.887.979.765,1	$ 94.532.340.102,0	40,55%	40,83%

Al cierre del mes de julio de 2026, el proyecto no presentó modificaciones relevantes en su estado de ejecución, debido a que el contrato de obra y la interventoría entraron en suspensión a partir del 16 de abril de 2026.

Por lo anterior, se mantiene el último avance físico registrado antes de la suspensión contractual, correspondiente al 0,28 %. Así mismo, la Acta de Obra No. 58, correspondiente al periodo ejecutado en marzo de 2026 y por valor de $1.257.564.110,00, fue debidamente revisada, aprobada y radicada ante el INVIAS para el trámite de pago correspondiente.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VR. TOTAL ACUMULADO DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 275.853.856.477**	-
VR. BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 231.514.338.688	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$93.887.979.765,08	40,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$94.532.280.456,00	40,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 644.300.690,92	0,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 115.822.738.111,00	41,99%

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ITEMS	VALOR (MILLONES)	%
Otorgado	$ 11.500.000.000,00	100%
Amortizado	$ 7.173.970.610,00	62%
Saldo	$ 4.326.029.390,00	38%

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO)

Meta física programada %: 42,4 %
Meta física ejecutada %: 42,5 %

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA
22/10/2021	NP1	Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3	147250,91	$ 303.867,00	$ 44.744.691.054,00	36.761,15
22/10/2021	NP2	Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3	121885,35	$ 318.020,00	$ 38.761.979.007,00	28.967,67
22/10/2021	NP3	Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3	77512,95	$ 1.002.812,00	$ 77.730.916.415,00	18.078,53
22/10/2021	NP4	Geotextil BX 50 o similar	m2	976071,43	$ 13.127,00	$ 12.812.889.662,00	220.366
14/01/2022	NP5	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	2373	$ 1.682.190,00	$ 3.991.836.870,00	709,59
14/01/2022	NP6	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	1674	$ 3.770.044,00	$ 6.311.053.656,00	193,26
14/01/2022	NP7	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	m	1111,98	$ 77.932,00	$ 86.658.825,00	513,60
14/01/2022	NP8	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m	m	404	$ 106.496,00	$ 43.024.384,00	258.40
14/01/2022	NP9	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	m	308	$ 159.744,00	$ 49.201.152,00	344
14/01/2022	NP10	Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	m2	22263,70	$ 38.846,00	$ 864.855.654,00	11939,59
4/08/2022	NP11	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	300	$ 1.306.682,00	$ 392.004.600,00	0,00
4/08/2022	NP12	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	850	$ 2.357.951,00	$ 2.004.258.350,00	326,31
4/08/2022	NP13	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	210	$ 2.766.862,00	$ 581.041.020,00	46,62

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA
4/08/2022	NP14	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	650	$ 3.312.344,00	$ 2.153.023.600,00	106,03
4/08/2022	NP15	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	800	$ 5.029.589,00	$ 4.023.671.200,00	287,04
4/08/2022	NP16	Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 cm)	u	1226	$ 711.620,00	$ 872.446.120,00	98,00
4/08/2022	NP17	Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia) doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)	u	80	$ 698.422,00	$ 55.873.760,00	19,00
4/08/2022	NP18	Señal vertical de tránsito tipo informativa (SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV	u	60	$ 711.002,00	$ 42.660.120,00	0,00
4/08/2022	NP19	Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75. Reflectivo tipo IV (75x60cm)	u	400	$ 552.005,00	$ 220.802.000,00	0,00
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024							
3/05/2024	NP20	Enrocado para protección de entregas o revestimiento de cauce con disipadores de energía (Especificación 670.13)	M3	2000	$ 638.812	$1.277.624.000	866,67
3/05/2024	NP21	Protección de taludes con piedra pegada	M2	9.240,00	$119.328	$1.102.590.720	
3/05/2024	NP22	Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con Luz de 30 a 32 metros	M3	462,77	$ 1.372.191	$ 635.008.829,00	16,96
3/05/2024	NP23	Concreto fc=28 MPa para Columna Ø1.50	M3	33,93	$ 1.318.594	$ 44.739.894,00	60,25
3/05/2024	NP24	Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, Diafragma y topes sísmicos	M3	192,04	$ 1.378.655	$ 264.756.906,00	
3/05/2024	NP25	Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, Diafragma y topes sísmicos	M3	77,80	$1.235.506	$ 96.122.367,00	
3/05/2024	NP26	Concreto f'c = 28 MPa, para losa de aproximación.	M3	102,00	$1.221.355	$ 124.578.210,00	
3/05/2024	NP27	Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 Dureza 60	U	32,00	$2.007.896	$ 64.252.672,00	16,00
3/05/2024	NP28	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	U	72,00	$ 600.878	$ 43.263.216,00	
3/05/2024	NP29	Junta elastomérico	ML	96,80	$ 1.823.866	$ 176.550.229,00	
3/05/2024	NP30	Corte de junta, limpieza, colocación de cordón de resguardo y sellos de junta con polipropileno.	ML	600,00	$71.935	$ 43.161.000,00	
3/05/2024	NP31	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 10 y 144" diámetro interior (Especificación 662.13)	ML	115,00	$9.981.731	$1.147.899.065,00	
3/05/2024	NP32	Geomalla Uniaxial de refuerzo para terraplenes reforzados con geo sintéticos	M2	68.600,00	$ 23.233,00	$1.593.783.800,00	
3/05/2024	NP33	Tubería perforada para drenaje de 65 mm (2 1/2")	ML	10.140,53	$40.696,00	$ 412.679.009,00	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/10/2021	Acta de modificación de cantidades No. 1
01/02/2022	Acta de modificación de cantidades No. 2
06/04/2022	Acta de modificación de cantidades No. 3
01/08/2022	Acta de modificación de cantidades No. 4
04/08/2022	Acta de modificación de cantidades No. 5
03/08/2023	Acta de modificación de cantidades No. 6
04/03/2024	Acta de modificación de cantidades No. 7
07/05/2024	Acta de modificación de cantidades No. 8
20/09/2024	Acta de modificación de cantidades No. 9
28/03/2025	Acta de modificación de cantidades No. 10
15/05/2025	Acta de modificación de cantidades No. 11

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIF NACION

FECHA DE RADICACION	NÚMERO DE ACTA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
*2026/03/09	Acta de Obra 57	En tramite
*2026/01/20	Acta de Obra 56D	En tramite
*2026/02/28	Acta de Obra 57D	En tramite
*2026/04/09	Acta de Obra 58	En tramite

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
18/08/2023	1	-	18/08/2023 – 22/08/2023	23/08/2023
16/04/2026	2	-	16/04/2026 – 20/05/2026	21/05/2026
16/04/2026	2	1	16/04/2026 – 30/06/2026	01/07/2026
16/04/2026	2	2	16/04/2026 – 31/08/2026	01/09/2026

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/05/2025		**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 11	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_10_/_2024____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 11.296.318.981,00	400033683 Anexo No. 13	01/06/2021	05/01/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 11.500.000.000.00		01/06/2021	05/01/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$22.592.637.962		01/06/2021	05/01/2026
Estabilidad de la Obra	$33.888.956.943		Nota de vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	
Calidad	$535.500.000			

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 5.648.159.491,00	400033682 Anexo 13	01/06/2021	05/01/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			…

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

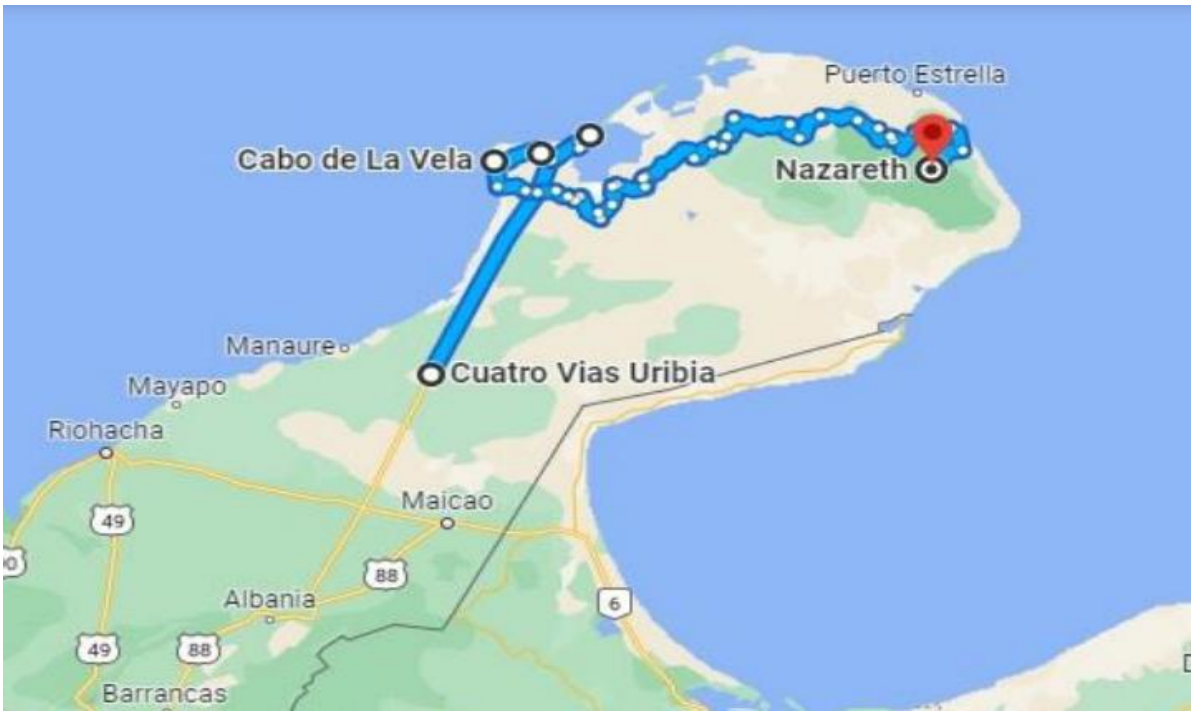

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	CMA-DT-191-2020		
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1005 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191	NIT:	901480409 – 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS S.A.S	40%	901218647 - 8
	GINPROCOL S.A.S	40%	901162700 - 0
	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	10%	900761711 - 8
	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	10%	890929122 - 8
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	DO-GGP 33063	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$19.119.769.140 IVA		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN N:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$19.119.769.140 IVA		
ANTICIPO	6.28%		
ANTICIPO OTORGADO 1:	$ 849.884.570		
ANTICIPO OTORGADO 2:	$ 350.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO 3:	$ 1.160.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.359.884.570,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.484.953.176,94		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 874.931.393,06		
PLAZO INICIAL:	110 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSION 1:	18 de agosto de 2023 – 5 Días		
REANUDACIÓN 1:	23 de agosto de 2023		
SUSPENSIÓN 2:	16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 21 DE MAYO DE 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420521	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	$ 1.604.169.140	$ 0
		C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	$ 95.600.000	$0.40
2022	268422	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 1.486.666.667	$ 0
2023	240623	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	$ 6.807.177	$ 0
	240623	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 949.192.823	$ 0
	993823	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11		$ 0
2024	202524	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	$ 709.680.000	$ 0
	202524	C-2402-0600-13-51102A-2402015-02	10	$ 240.320.000	$ 0
	202524	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	$ 6.000.000	$ 0
	202524	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	$ 2.000.000.000	$ 0
2025	164925	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	$ 1.912.000.000	$ 0,00
2026	302826	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	$1.900.666.667,00	$ 1.594.902.670,00
2026	302826	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	$ 11.333.333,00	$0.0
		TOTAL		**$12.122.435.807,00**	

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 121.448.320,00	$ 23.075.180,80	$ 0,00	$ 144.523.500,80
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 138.869.200,00	$ 26.385.148,00	$ 0,00	$ 165.254.348,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 115.447.760,00	$ 21.935.074,40	$ 0,00	$ 137.382.834,40

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 153.292.720,00	$ 29.125.616,80	$ 0,00	$ 182.418.336,80
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 119.710.440,00	$ 22.744.983,60	$ 59.855.220,00	$ 82.600.203,60
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 148.143.360,00	$ 28.147.238,40	$ 88.886.016,00	$ 87.404.582,40
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 153.695.300,00	$ 29.202.107,00	$ 76.847.650,00	$ 106.049.757,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 147.916.400,00	$ 28.104.116,00	$ 73.958.200,00	$ 102.062.316,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 149.497.600,00	$ 28.404.544,00	$ 74.748.800,00	$ 103.153.344,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 211.693.800,00	$ 40.221.822,00	$ 72.399.279,60	$ 179.516.342,40
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 231.978.841,00	$ 44.075.979,79	$ 82.398.884,32	$ 193.655.936,47
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 159.373.196,00	$ 30.280.907,24	$ 79.686.598,00	$ 109.967.505,24
Acta Mensual de Costos No. 16	$ 160.847.396,00	$ 30.561.005,24	$ 2.412.710,94	$ 188.995.690,30
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 165.328.444,00	$ 31.412.404,36	$ 2.479.926,66	$ 194.260.921,70
Acta Mensual de Costos No. 18	$ 165.588.986,00	$ 31.461.907,34	$ 0,00	$ 197.050.893,34
Acta Mensual de Costos No. 19	$ 150.622.068,13	$ 28.618.192,94	$ 16.985.536,92	$ 162.254.724,15
Acta Mensual de Costos No. 20	$ 106.177.736,71	$ 20.173.769,97	$ 21.235.547,34	$ 105.115.959,34
Acta Mensual de Costos No. 21	$ 141.864.541,00	$ 26.954.262,79	$ 28.372.908,20	$ 140.445.895,59
Acta Mensual de Costos No. 22	$ 142.433.526,00	$ 27.062.369,94	$ 28.486.705,20	$ 141.009.190,74
Acta Mensual de Costos No. 23	$ 134.931.863,00	$ 25.637.053,97	$ 26.986.372,60	$ 133.582.544,37
Acta Mensual de Costos No. 24	$ 144.861.409,00	$ 27.523.667,71	$ 28.972.281,80	$ 143.412.795,00
Acta Mensual de Costos No. 25	$ 157.820.577,00	$ 29.985.909,63	$ 31.564.115,00	$ 156.242.372,00
Acta Mensual de Costos No. 26	$ 155.829.741,00	$ 29.607.651,00	$ 49.865.517,00	$ 135.571.875,00
Acta Mensual de Costos No. 27	$ 52.359.911,00	9.948.383,00	$ 3.742.300,00	$58.565.994,00
Acta Mensual de Costos No. 27A	$ 38.785.088,00	7.369.167,00	$0,00	$46.154.255,00
Acta Mensual de Costos No. 28	$ 132.850.654,00	25.241.624,00	$0,00	$158.092.278,00
Acta de ajustes 26A	$ 18.501.946,00	3.515.370,00	$0,00	$22.017.316,00
Acta de ajustes 27B	$ 6.299.105,00	1.196.830,00	$0,00	$7.495.935,00
Acta de ajustes 27C	$ 4.678.144,00	888.847,00	$0,00	$5.566.991,00
Acta Mensual de Costos No. 29	$ 154.049.459,00	29.269.397,00	$0,00	$183.318.856,00
Acta Mensual de Costos No. 30	$ 161.921.908,00	30.765.163,00	$0,00	$192.687.071,00

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Anticipo $ 350.000.000,00 por Amortizar				
Acta Mensual de Costos No. 31	$ 155.871.458,00	29.615.577,00	$ 10.160.800,36	$175.326.235
Acta Mensual de Costos No. 32	$ 130.941.722,00	24.878.897,00	$ 13094.172,00	$142.726.477
Acta Mensual de Costos No. 33	$ 156.888.762,00	29.808.865,00	$ 15.688.876,00	$171.008.751
Acta Mensual de Costos No. 34	$ 154.216.448,00	29.301.125,00	$ 15.421.645,00	$168.095.928
Acta Mensual de Costos No. 35	$ 154.908.084,00	29.432.536,00	$ 15.490.808,00	$168.849.812
Acta Mensual de Costos No. 36	$ 154.076.844,00	29.274.600,00	$ 77.038.422,00	$106.313.022,00
Acta Mensual de Costos No. 37	$ 151.048.978,00	28.699.306,00	$ 75.524.489,00	$104.223.795
Acta Mensual de Costos No. 38	$ 106.095.725,00	20.158.188,00	$ 74.267.008,00	$51.986.905
Acta Mensual de Costos No. 39	$ 160.635.840,00	30.520.810,00	$ 16.063.584,00	$175.093.066
Acta Mensual de Costos No. 40	$ 163.180.686,00	31.004.330,00	$ 16.318.069,00	$177.866.947
Acta Mensual de Costos No. 41	$ 167.872.460,00	31.895.767,00	$ 20.932.126,64	$178.836.100,36
Anticipo 3 $ 1.160.000.000,00 por Amortizar				
Acta Mensual de Costos No. 42	$ 171.925.686,00	32.665.880,00		$204.591.566,00
Acta Mensual de Costos No. 43	$ 171.874.380,00	32.656.132,00	$ 58.122.880,40	$146.407.631,60
Acta Mensual de Costos No. 44	$ 106.283.452,00	20.193.856,00		$126.477.308,00
Acta Mensual de Costos No. 45	$ 59.168.058.00	11.241.931,00		$70.409.989,00
Acta Mensual de Costos No. 46	$ 38.537.439,00	7.322.113,00	$ 3.853.744,00	$42.005.808,00
Acta Mensual de Costos No. 47	$ 90.153.589,00	17.129.182,00	$ 9.015.359,00	$98.267.412,00
Acta Mensual de Costos No. 48	$ 170.295.316,00	32.356.110,00	$ 25.544.297,00	$177.107.129,00
Acta Mensual de Costos No. 49	$ 174.208.984,00	33.099.707,00	$ 26.131.348,00	$181.177.343,00
Acta Mensual de Costos No. 50	$ 190.781.717,00	36.248.526,00	$ 28.617.258,00	$198.412.985,00
Acta Mensual de Costos No. 51	$ 192.982.796,00	36.666.731,00	$ 28.947.419,00	$200.702.108,00
Acta Mensual de Costos No. 52	$ 196.495.513,00	37.334.147,00	$ 19.649.551,00	$ 214.180.109,00
Acta Mensual de Costos No. 53	$ 191.840.177,00	36.449.634,00	$ 19.184.018,00	$ 209.105.793,00
Acta Mensual de Costos No. 54	$ 1 91.011.788,00	36.292.240,00	$ 19.101.179,00	$ 208.202.849,00
Acta Mensual de Costos No. 55	$ 186.539.330,00	35.442.473,00	$ 35.971.321,00	$ 186.010.482,00

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 56	$ 1 09.356.747,00	20.777.782,00	$ 10.935.675,00	$ 1 19.198.854,00
Acta Mensual de Costos No. 57	$ 181.558.235,00	34.496.065,00	$ 18.155.824,00	$ 197.898.476,00
Acta Mensual de Costos No. 58	$ 167.166.347,00	31.761.606,00	$ 16.716.635,00	$ 182.211.318,00
TOTALES	**$ 8.293.853.376,00**	**$ 1 .575.832.141,00**	**$ 1.519.825.636,94**	**$ 8.349.859.883,64**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Según el informe de interventoría No. 248 de fecha 02 de abril de 2026, para el periodo 27 de Marzo de 2026 al 02 de Abril de 2026, reporta un avance para la interventoría, relacionado a continuación. Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra suspendido desde el 16 de abril de 2026, el avance continua siendo el mismo.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 19.119.769.140,00	100%
TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA	$ 9.983.100.749,13	52.21%
TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA	$ 9.869.685.517,00	51.62%

2.4.1. ANTICIPO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS	VALOR (MILLONES)	%
ANTICIPO 1	$ 849.884.570	**100%**
ANTICIPO 2	$ 350.000.000	
ANTICIPO 3	$ 1.160.000.000	
Otorgado	$ 2.359.884.570	100%
Amortizado	$ 1.399.760.983,94	59%
Saldo	$ 960.123.586,06	41%

2.4.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)

Meta programada %: 52,21%
Meta ejecutada %: 51,62%

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIFF NACION

FECHA RADICACION:	NÚMERO DE ACTA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	ACTA DE COSTO No 58	**EN TRAMITE**
*09/04/2026	ACTA DE COSTO No 58	**EN TRAMITE**

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
18/08/2023	1	-	18/08/2023 – 22/08/2023	23/08/2023
16/04/2026	2	-	16/04/2026 – 20/05/2026	21/05/2026
16/04/2026	2	1	16/04/2026 – 30/06/2026	01/07/2026
16/04/2026	2	2	16/04/2026 – 31/08/2026	01/09/2026

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/10/2021		ACTA MOFICIACION 1	APROBADO SECOP2
30/08/2023		ACTA MOFICIACION 2	APROBADO SECOP2
23/08/2024		ACTA MOFICIACION 3	APROBADO SECOP2
23/07/2024		ACTA MOFICIACION 4	APROBADO SECOP2

2.8.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
1.1 Cumplimiento	$1.021.043.700,70	NB-100164941 ANEXO 10	13/11/2024	31/12/2025
1.2 Buen manejo del anticipo	$2.359.884.570,00		13/11/2024	31/12/2025
1.3 Pago de salarios-prestaciones sociales-indemnizaciones laborales.	$2.042.087.401,40		13/11/2024	31/12/2028
1.4 Calidad del Servicio	$3.063.131.102,10		Nota de Vigencia: Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría.	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024 SECOP2

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el mes de julio de 2026 no se evidenciaron variaciones que permitieran modificar las circunstancias que dieron origen a la suspensión de la ejecución contractual. Las condiciones de seguridad en el área de influencia del proyecto continuaron limitando la posibilidad de reanudar las actividades de obra, manteniéndose vigente la Ampliación No. 2 de la Suspensión No. 02, cuyo término se extiende hasta el 31 de agosto de 2026.

En consecuencia, la ejecución de los contratos de obra e interventoría permaneció suspendida, toda vez que continúan presentes los factores de riesgo asociados a la situación de orden público en el departamento de La Guajira, los cuales impiden garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades previstas en el contrato.

Durante el periodo, la supervisión mantuvo el seguimiento a las condiciones que motivaron la suspensión, verificando que no existieran elementos técnicos, operativos o institucionales que permitieran recomendar el levantamiento anticipado de la medida, manteniéndose como fecha estimada de reanudación el 1 de septiembre de 2026, siempre que para ese momento se evidencien condiciones objetivas que permitan el retorno seguro a las actividades.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante julio de 2026 no se ejecutaron actividades constructivas ni labores de campo, en razón de la suspensión vigente del contrato.

El seguimiento técnico efectuado durante el periodo permitió establecer que las circunstancias que dieron origen a la suspensión continúan sin modificaciones sustanciales, por lo que no existen condiciones que permitan programar el reinicio de las actividades de obra antes del vencimiento del término previsto en la Ampliación No. 2 de la Suspensión No. 02.

En consecuencia, permanecen pendientes las actividades contempladas en el alcance contractual, incluyendo la ejecución de obras complementarias, pruebas técnicas, actividades hidráulicas y demás frentes de trabajo que fueron suspendidos, las cuales deberán ser reprogramadas una vez se autorice formalmente el reinicio del contrato.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el mes de julio de 2026 no se presentaron actuaciones jurídicas que modificaran la situación contractual vigente. La ejecución del contrato continuó desarrollándose bajo los efectos de la Ampliación No. 2 de la Suspensión No. 02, medida previamente formalizada conforme a las disposiciones contractuales y al correspondiente control de legalidad efectuado por la Entidad.

La supervisión mantuvo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suspensión, verificando la conservación de la documentación soporte dentro del expediente contractual y la observancia de las condiciones establecidas en las actas suscritas por las partes.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo se continuó realizando el seguimiento administrativo al estado del contrato, verificando el cumplimiento de las actuaciones derivadas de la suspensión vigente y el adecuado manejo de la información contractual. Así mismo, se mantuvo el control sobre la programación administrativa y financiera del proyecto, considerando que la interrupción temporal de la ejecución continúa generando efectos sobre el cronograma

inicialmente previsto, los cuales deberán revisarse una vez se produzca el reinicio de las actividades.

Igualmente, se adelantó la actualización permanente de los registros documentales asociados al contrato, garantizando la integridad del expediente y la correcta conservación de los documentos que respaldan las actuaciones adelantadas durante el periodo de suspensión.

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Como consecuencia de la suspensión contractual, durante el mes de julio no fue posible desarrollar actividades ambientales, prediales ni sociales en campo.

Desde el componente Ambiental se mantuvo el seguimiento documental a los compromisos adquiridos dentro del proyecto, sin registrarse novedades que modificaran el estado de los trámites existentes.

En materia Predial no se reportaron cambios frente al periodo anterior; sin embargo, continúan las limitaciones de acceso a determinados sectores del corredor vial como consecuencia de las condiciones de seguridad presentes en la región.

Respecto al componente Social, permanecieron suspendidas las actividades de interacción comunitaria, socialización y acompañamiento a las comunidades del área de influencia, debido a que no existen condiciones que permitan desarrollar estas labores de manera segura.

En relación con la Sostenibilidad del proyecto, la suspensión mantiene temporalmente detenida la ejecución de las actividades; no obstante, continúan preservándose los soportes técnicos, administrativos y contractuales necesarios para facilitar la reactivación del proyecto cuando las circunstancias lo permitan.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el mes de julio de 2026 la supervisión concentró sus actividades en el seguimiento integral al estado de la suspensión contractual y al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma. Se verificó la correcta aplicación de las condiciones establecidas en la Ampliación No. 2 de la Suspensión No. 02, efectuando control sobre la documentación contractual, el archivo de las actuaciones administrativas y la actualización de la información registrada en los sistemas institucionales del INVIAS.

Igualmente, se mantuvo comunicación permanente con la interventoría para conocer la evolución de las condiciones que afectan la ejecución del proyecto y realizar seguimiento a cualquier situación que pudiera incidir en una eventual reactivación de las obras.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Mientras permanezca vigente la suspensión contractual, resulta conveniente mantener un esquema de seguimiento periódico que permita evaluar de manera continua las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto y determinar oportunamente si se presentan cambios que hagan viable la reanudación de las actividades. Se considera importante que el contratista continúe adelantando la preparación operativa para el eventual reinicio del contrato, revisando la disponibilidad de recursos, personal, equipos y logística requerida para garantizar una reactivación eficiente una vez finalice el periodo de suspensión.

Por su parte, la interventoría deberá continuar verificando las condiciones que motivaron la medida, manteniendo informada a la Entidad sobre cualquier circunstancia que pueda afectar la programación prevista o requerir la adopción de nuevas decisiones contractuales.

Desde la supervisión se recomienda mantener actualizado el expediente contractual, asegurando que toda la documentación generada durante la suspensión permanezca

debidamente organizada, registrada y disponible para consulta, fortaleciendo la trazabilidad y el control de las actuaciones administrativas.

Finalmente, antes de autorizar el reinicio previsto para el 1 de septiembre de 2026, será necesario efectuar una evaluación conjunta entre la Entidad, la interventoría y el contratista que permita establecer, con base en criterios técnicos y de seguridad, si existen las condiciones necesarias para retomar la ejecución del proyecto, procurando proteger los intereses institucionales y garantizar el desarrollo adecuado de las obras.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por CEBALLOS VEGA JOHN JAIRO

JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
C.C. 84.033.133 DE RIOHACHA
Dirección Territorial Guajira
