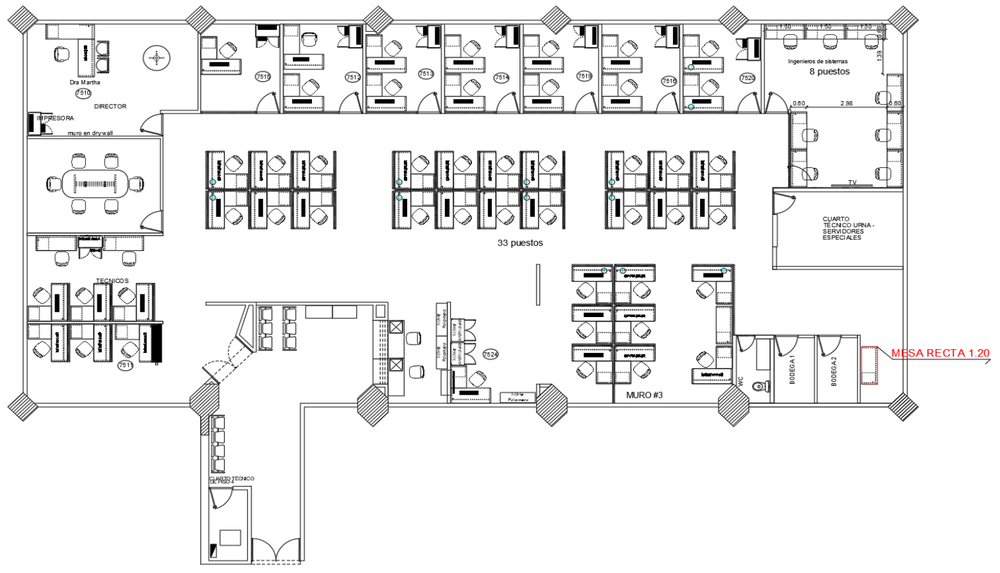
MEMORIAS DE OBRA
CORTE No.12

BOLSA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	CARRERA 8 #12B-82, SEDE BOLSA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**“REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.”**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	12	**FECHA:**	31/05/2026
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,6	**DESCRIPCION ITEM:**	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,00-1,20m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de1-1,20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
Localizacion general - Sede Edificio Bolsa Cra 8 #12B-82, Bogotá	Mesa recta 1.20					1,00	1,00
							
	TOTAL ITEM						**1,00**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Nombre: HOSMAN LECHUGA	Nombre:	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No.12


RECEPCIÓN

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_PALACIO_RECEPCION	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	12	FECHA:	30/05/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	1.6	DESCRIPCION ITEM:	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,00-1,20m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de1-1,20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

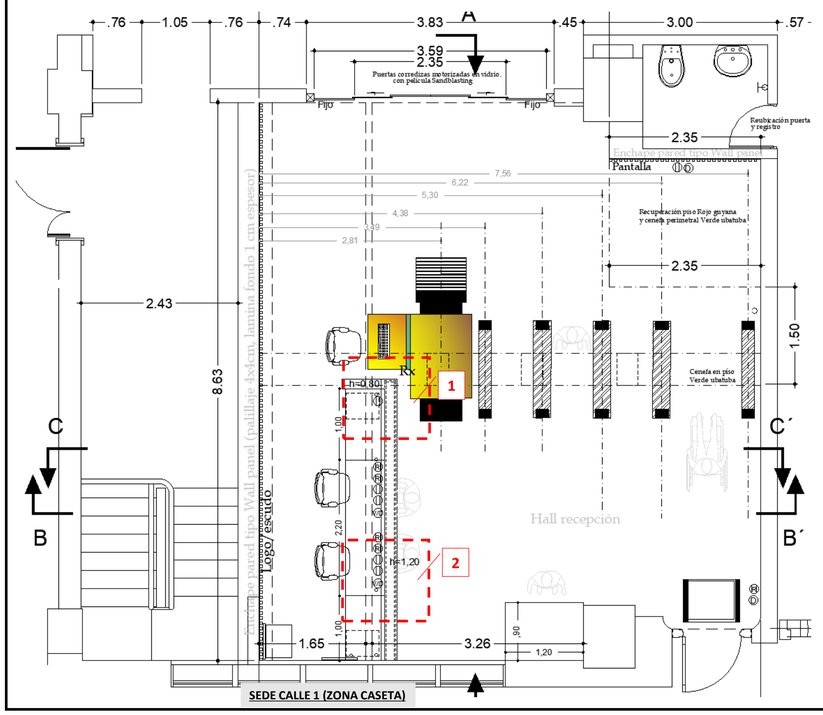

.76
1.05
.76
.74
3.83
A
.45
3.00
.57
3.59
2.35
Puertas corredizas piveterizadas en vidrio. con película Sandblasting
Fijo
Fijo
Resubicación puerta y registro
2.35
Pantalla
7,56
6,22
5,30
4,38
3,39
2,81
Recuperación piso Rojo guyana y cenefa perimetral Verde ubatuba
2.35
2.43
8.63
1.50
Cenefa en piso Verde ubatuba
C
C´
B
B´
R
1
H=0,80
100
100
60
60
60

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	DE_PALACIO_RECEPC	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	12	FECHA:	31/05/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	1.7	DESCRIPCION ITEM:	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Gard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

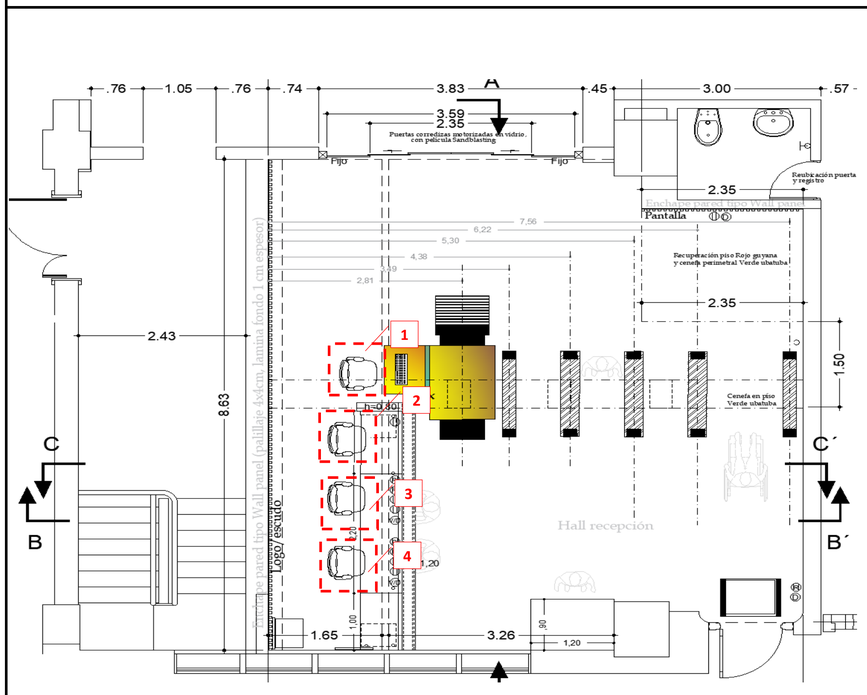

SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PALACIO_RECEPCION						
SILLA TIPO EJECUTIVA					4,00	4,00
TOTAL ITEM						4,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						4,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No.12

CALLE 18

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	**1**

SEDE_ALMACEN_CALLE_18

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**11**	**FECHA:**	**30/05/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**1.08**	**DESCRIPCION ITEM:**	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90




PLANTA GENERAL (PISO 2)

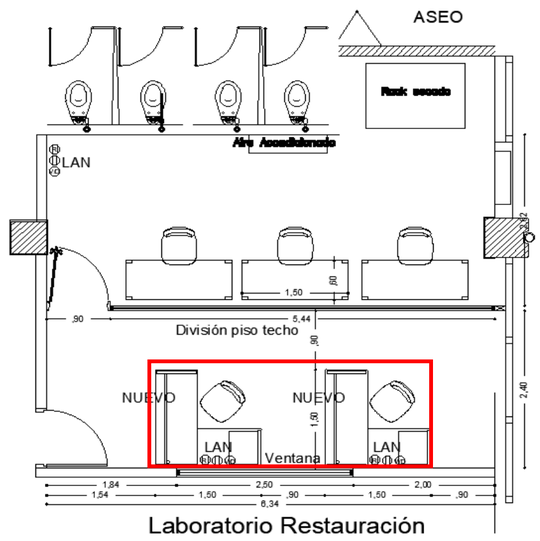


Laboratorio (PISO 2)

PLANTA GENERAL (PISO 3)

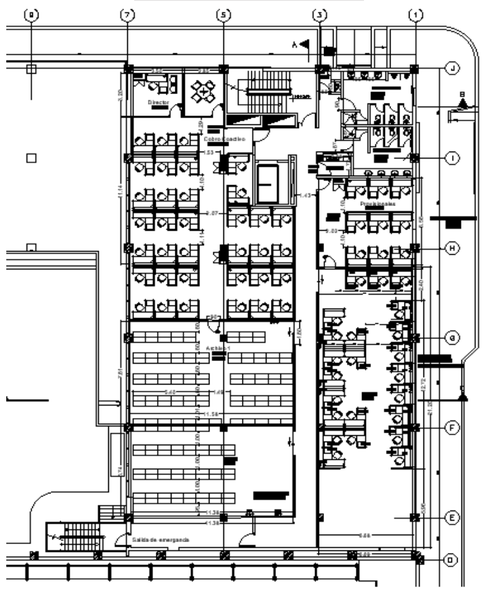

Archivo 1 (PISO 3)

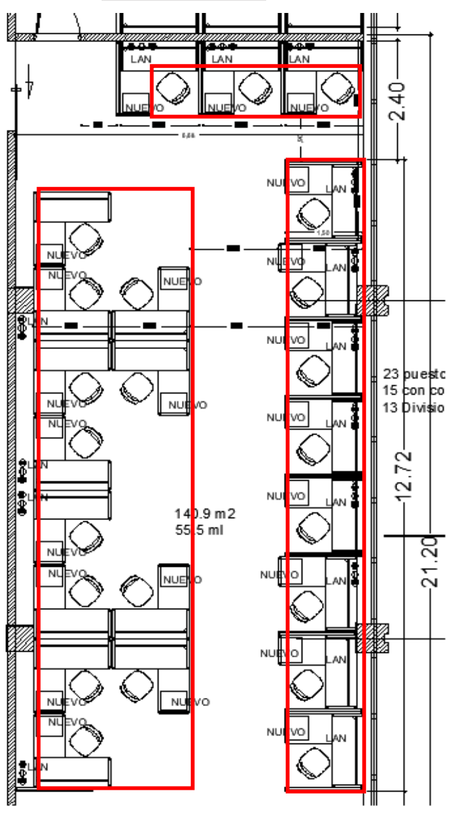

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			PISO 1			
PISO 2 LABORATORIO						
					2,00	2,00
PISO 3 ARCHIVO 1						
					23,00	23,00
					23,00	23,00
TOTAL ITEM						**25,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**25,00**

Firma	Revisó: Firma	Aprobó: Firma	Revisó: Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
