	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	6 DE JULIO DE 2026				
INFORME No.	8	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	7/06/2026	Y EL	6/07/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO.				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	SEIS (06) MESES
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 289.712.052,15
PROCESO No.:	CI-008-2025	FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.:	01310 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	6 DE MAYO DE 2026
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ONZAGA	LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ONZAGA
NIT CONTRATISTA:	890.208.148-5	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
LINK DE PROCESO	<Insertar link del proceso contractual >	APOYO SUPERVISIÓN	SAUL ANTONIO CORTES DURAN - Contratista SPL

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	7/11/2025	7/11/2025	6/05/2026	6 MESES		6/05/2026	Si	Se da inicio a l,as actividades del convenio
Prórroga No. 1	16/03/2026	7/05/2025	6/08/2026	3 MESES		6/08/2026	SI	El municipio solicitó una prórroga por 3 meses por dificultades presentadas
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				**9 MESES**				
% AVANCE FISICO				**75%**				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	400-47-994000111034	25 de marzo de 2026	**2**	**CUMPLIMIENTO**	7/11/2025	6/02/2027	$57.942.410.60
				PAGO DE SALARIOS			
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO			
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**			

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	**ADICIONES**			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 12.601.635,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 277.110.417,15				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				


	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 289.712.052,15					
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00					
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 289.712.052,15					
VALOR PAGADO:	$ 178.867.885,29					
VALOR POR PAGAR:	$ 110.844.166,86					
% POR PAGAR	38,26%					
% AVANCE FINANCIERO	61,74%	TOTAL DE ADICIONES			$	-

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	19 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 83.133.125,00
Acta Parcial No 02	2 DE JULIO DE 2026	$ 83.133.125,29
	APORTES EN ESPECIE DEL MUNICIPIO	$ 12.601.635,00
TOTAL		$ 178.867.885,29

3. CURVA "S"

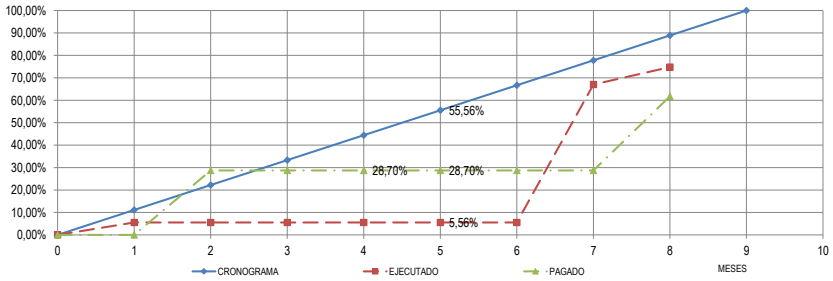

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	11,11%	5,56%	0,00%
2	22,22%	5,56%	28,70%
3	33,33%	5,56%	28,70%
4	44,44%	5,56%	28,70%
5	55,56%	5,56%	28,70%
6	66,67%	5,56%	28,70%
7	77,78%	67,00%	28,70%
8	88,89%	74,77%	61,74%
9	100,00%		

PROGRAMADO	88,89%	
EJECUTADO	74,77%	
ATRASOS	-14,12%	
DESEMPEÑO		0,84
% PAGADO A LA FECHA	61,74%	
Pendiente por Ejecutar total	$	110.844.166,86
% POR CANCELAR A LA FECHA	38,26%	
Índice de avance financiero		0,83

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

La CAS, realizó visita técnica en el sitio de intervención el día 23 de junio de 2026, con el fin de revisar in situ la materialización de la obra.

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

El dia 30 de junio de 2026, la CAS remite observaciones al municipio de Onzaga correspondientes al desembolso No.2

El dia 1 de julio de 2026, el municipio remite las subsanaciones de las observaciones solicitadas por la CAS para el Desembolso No.2 del Convenio


Una vez revisada la información allegada para el Desembolso No.2 del Convenio, se suscribe el Acta Parcial No.2 del Convenio.

En el informe allegado por el Municipio reportan un avance correspondiente al 35% aproximadamente de la ejecución del contrato de obra.


5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>



EVIDENCIA VISITA CAS A ONZAGA




EVIDENCIA VISITA CAS A ONZAGA



EVIDENCIA VISITA CAS A ONZAGA



EVIDENCIA VISITA CAS A ONZAGA



SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DESEMBOLSO 2



ACTA PARCIAL No.2

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

Nombre: SUPERVISOR / INTERVENTOR
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	SAUL ANTONIO CORTES DURAN	CONTRATISTA-SPL	
REVISO:			
V.B:			
