Fecha		
15	JULIO	2026
DD	MM	AA

AREA INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA

OFICINA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA Nº 14 **DEL** 6-jul-26 **AL** 12-jul-26

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 100 DÍAS

SUPERVISON FDLCB DIEGO ARENAS MANRIQUE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

COP-1059-2025

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR

	SEMANA .	**ACUMULADO**
Porcentaje programado	0.43%	3.06%
Valor programado	$ 6,516,884	$ 46,409,870

	SEMANA	**NVO ACUMULADO**
Porcentaje ejecutado	1.57%	2.28%
Valor ejecutado	$ 23,832,599	$ 34,593,036

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR
Contrato No.	COP-1059-2025
Valor inicial	$ 1,515,554,492
Adicion 1	$ -
Valor actualizado	$ 1,515,554,492
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES y DIEZ (10) DÍAS
Fecha de inicio etapa preliminar	23-feb-26
Fecha de inicio etapa de obra	30-jun-26
Fecha de terminacion inicial	1-oct-26
No. de empleos generados	6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Interventor	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S
Contrato Nº	CIN-1091-2025
Valor inicial	$ 151,555,449
Adicion 1	$ -
Valor actualizado	$ 151,555,449
Plazo	SIETE (7) MESES
Fecha de inicio etapa preliminar	23-feb-26
Fecha de inicio etapa de obra	NO APLICA
Fecha de terminacion inicial	1-nov-26
No. de empleos generados	4

B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

Participación en comité de seguimiento integral No.13 el 6 de julio de 2026 de manera virtual
Visita y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista
El día 7 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0130 que tiene por ASUNTO: Remisión de informe semanal 11
El día 1 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0133 que tiene por ASUNTO:Solicitud de cambio de cerramiento
El día 3 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0131 que tiene por ASUNTO: Remisión de plan de calidad
Preparar, convocar y dirigir los comités de seguimiento integral
Elaboración de los informes semanales de interventoría y remisión de los mismos al FDLCB
Elaboración en el avance del informe mensual de interventoría.

ACTIVIDADES DE OBRA y DEL CONTRATISTA DE OBRA

Participación en comité de seguimiento integral No.13 el 6 de julio de 2026 de manera virtual
Se realizarón actividades de demolición de piso de caucho, cerramiento con polisombra verde y alistado de cerramientos M-83 para pintura, Demolición de asfalto de cancha, trasiego y retiro de material de demolición.
El dia 6 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_138 que tiene por asunto: Remisión informe ambiental mensual No.03
El dia 6 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_140 que tiene por asunto: Remisión de cronograma y flujo de inversión subsanados.
El dia 6 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_141 que tiene por asunto: Remisión de informes semanales No.8 y No.9 subsanados
El dia 7 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_142 que tiene por asunto: Remisión informe social mensual No.03
El dia 7 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_143 que tiene por asunto: Remisión de informe semanal No.11
El dia 7 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_144 que tiene por asunto: Remisión informe técnico mensual No.03
El dia 7 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_145 que tiene por asunto: Remisión ficha técnica y certificado malla eslabonada

Fecha		
15	JULIO	2026
DD	MM	AA

AREA INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA

OFICINA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

MANEJO AMBIENTAL - SST

Se envió reportes sobre no generación de RCD para meses de mayo y junio, adicionalmente se adelantan gestiones para Podas en parques de Paticos 1 y Villa Diana

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD

El contratista realiza atención a la comunidad en el Salon comunal del parque Paticos y realiza reunión con los integrantes del comité de deportes, a quienes se les informó sobre la intervención de la cancha y el tipo de material que se va a utilizar, de igualmanera se informa que se debe hacer poda de los arbustos que se encuentran sobre la la malla de cerramiento para poder hacerle mantenimiento.

El contratista mantiene los canales de atención, correo electrónico, línea telefónica y whatsApp, no se han recibido requerimientos de la comunidad y atención personalizada en la Alcaldía de la Localidad.

Se da aprobación del volante de inicio de obra del Barranquitos y el contratista lo remite a la Junta de Acción Comunal, informando que se dará inicio a las actividades de obra y que remita la información a todos los líderes de la zona a traves de whatsApp.

Quince (Día en letras) (15) (Día en números) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el informe) de 2026 (Año de firma del informe)

OBSERVACIONES

Se realizó ajuste a la programación por cambio de actividades y nueva priorización, no obstante y de acuerdo a la programación aprobada se cuenta con un atraso de 1,47%

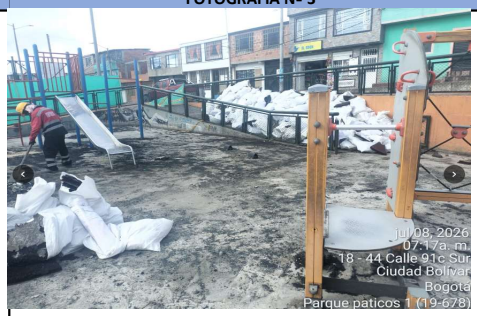
ING. IVAN BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANA No.12**

FRENTE DE TRABAJO : GENERAL

Proyecto	**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025**	**Localización**	**LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR**

Contrato de Obra No.	1059 de 2025	**Contrato de Interventoría No.**	494 de 2024
Contratista:	CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR	**Director de obra:**	MIGUEL ANGEL GUTIERRES CUBILLOS
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S	**Director Interventoría:**	IVAN BARRETO ESQUIVEL
Fecha de Informe:	15/7/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
DEMOLICIÓN DE CANCHA EN ASFALTO	**TRASIEGO Y ACOPIO**	**DEMOLICIÓN DE PISO DE CAUCHO**

YA	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
DEMOLICIÓN DE CANCHA EN ASFALTO	**DEMOLICIÓN DE PISO CAUCHO**	**APLICADO DE ANTICORROSIVO A BARANDA**
