Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	
28	JULIO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA Nº 16 **DEL** 20-jul-26 **AL** 26-jul-26

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 107 DÍAS

SUPERVISON FDLCB DIEGO ARENAS MANRIQUE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

COP-1059-2025

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR

	SEMANA .	ACUMULADO		SEMANA	NVO ACUMULADO
Porcentaje programado	5.86%	25.36%	Porcentaje ejecutado	3.09%	17.86%
Valor programado	$ 88,750,454	$ 384,320,649	Valor ejecutado	$ 46,895,367	$ 270,652,405

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR
Contrato No.	COP-1059-2025
Valor inicial	$ 1,515,554,492
Adicion 1	$ -
Valor actualizado	$ 1,515,554,492
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES y DIEZ (10) DÍAS
Fecha de inicio etapa preliminar	23-feb-26
Fecha de inicio etapa de obra	30-jun-26
Suspensión 1	40 dias
Fecha de terminacion inicial	1-oct-26
No. de empleos generados	6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Interventor	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S
Contrato Nº	CIN-1091-2025
Valor inicial	$ 151,555,449
Adicion 1	$ -
Valor actualizado	$ 151,555,449
Plazo	SIETE (7) MESES
Fecha de inicio etapa preliminar	23-feb-26
Fecha de inicio etapa de obra	NO APLICA
Suspensión 1	40 dias
Fecha de terminacion inicial	1-nov-26
No. de empleos generados	4

B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

Participación en comité de seguimiento integral No.15 el 21 de julio de 2026 virtual

Visita y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista

El día 21 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0141 que tiene por ASUNTO: OBSERVACIONES AL RADICADO CRB-136 INFORME MENSUAL SST N 2

El día 21 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0142 que tiene por ASUNTO: OBSERVACIONES AL RADICADO CRB-147 INFORME MENSUAL SST N 3

El día 21 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0143 que tiene por ASUNTO: APROBACIÓN Y REMISIÓN DE ACTA DE INCLUSIÓN DE NP 2-FIRMADA

El día 21 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0144 que tiene por ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL 13

El día 22 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0145 que tiene por ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES 1-11 CTO-1059-2025

El día 23 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0146 que tiene por ASUNTO:OBSERVACIONES AL INFORME SEMANAL 12

El día 24 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0147 que tiene por ASUNTO: Respuesta a CRB-150 – Apremio No 1

Elaboración en el avance del informe mensual de interventoría.

ACTIVIDADES DE OBRA y DEL CONTRATISTA DE OBRA

Participación en comité de seguimiento integral No.15 el 21 de julio de 2026 de manera virtual

Se realizarón actividades de Recubrimiento en pintura para cancha, Mantenimiento a cerramiento contra Impacto,

El dia 24 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_152 que tiene por asunto: Remisión de informe semanal No.13

El dia 24 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_153 que tiene por asunto: Respuesta a oficio SPLI-CB-477-0138– Subsanación al informe técnico mensual No. 3

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	
28	JULIO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

MANEJO AMBIENTAL - SST

Se envió reportes sobre no generación de RCD para meses de mayo y junio, adicionalmente se adelantan gestiones para Podas en parques de Paticos 1 y Villa Diana

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD:
El contratista realiza contacto con el líder comunal del Barrio barranquitos aclarando que se iniciará con el cerramiento y actividades de obra. 14 de julio de 2026 - el contratista realiza atención a la comunidad con recorrido por los parques Paticos, se coordina con los lideres que usan la cancha una reunión para aclarar el tema de intervención y adecuación de la cancha.

PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:
El contratista realiza atención por los canales de comunicación virtual Correo electrónico , línea telefónica y WhatsApp, el día martes 21 de julio de 2026.
NO hay PQR´S recepcionadas.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Veintiocho (Día en letras) | (28) (Día en números) | días del mes de | JULIO (Mes en que se firma el informe) | de | 2026 (Año de firma del informe)

OBSERVACIONES

De acuerdo a la programación aprobada se cuenta con un atraso de 7,5%

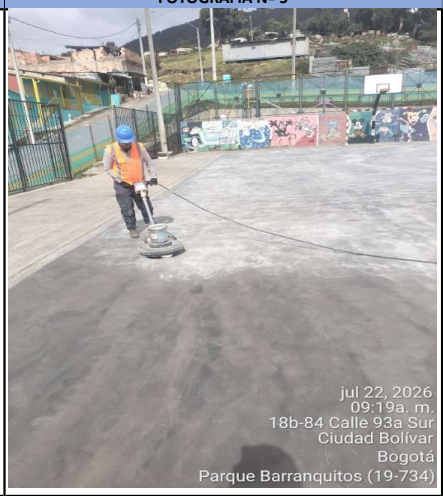
ING. IVÁN BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANA No.12**

FRENTE DE TRABAJO : GENERAL

Proyecto	**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025**	**Localización**	**LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR**

Contrato de Obra No.	1059 de 2025	**Contrato de Interventoría No.**	1091 de 2025
Contratista:	CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR	**Director de obra:**	MIGUEL ANGEL GUTIERRES CUBILLOS
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S	**Director Interventoría:**	IVAN BARRETO ESQUIVEL
Fecha de Informe:	15/7/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
PINTURA DE JUEGO BIOSALUDABLES	**APLICACIÓN DE PINTURA PARA BARANDAS**	**DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN MANUAL**
YA	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
DESMONTE DE JUEGOS PARA CAMBIO	**APLICADO DE NIVELANTE PARA CANCHAS Y LIJADO DE LA CAPA**	**MANTENIMIENTO A GIMASIO BIOSALUDABLE**
