MEMORIAS DE CANTIDADES

UNIÓN TEMPORAL
INTERVENTORIA
SOGAMOSO
2627

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIO No1

CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD	M2
ITEM	1.06	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	
		PAGINA	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	CANT	SUBTOTAL (m2)
SÓTANO TORRE A	33.41	4.80	160.37	1.00	160.37
	36.10	15.40	555.94	1.00	555.94
	35.60	5.90	210.04	1.00	210.04
	40.60	14.60	592.76	1.00	592.76
SÓTANO TORRE B	29.47	13.35	393.42	1.00	393.42
	26.17	27.35	715.75	1.00	715.75

ESQUEMA

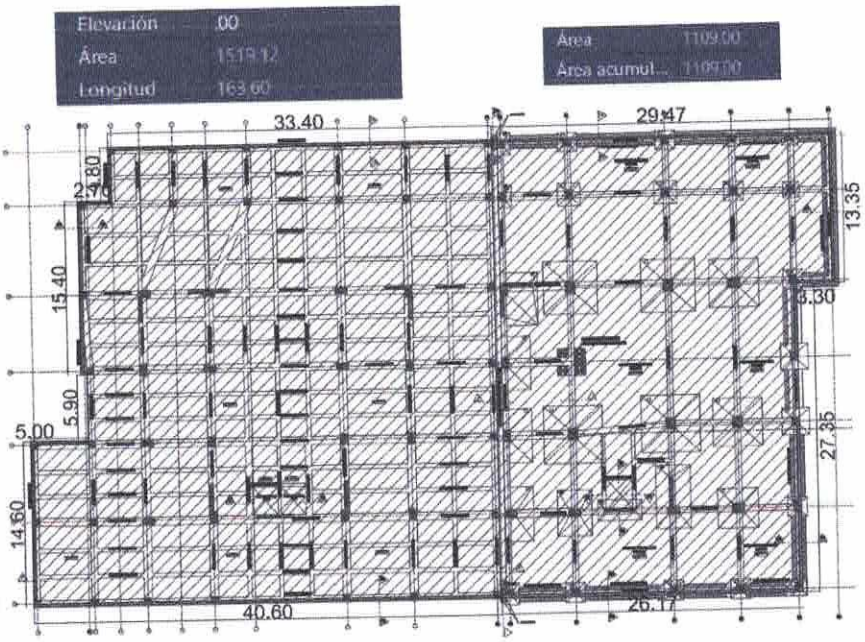

PLANTA CIMENTACION TORRE A
ESCALA 1:75

PLANTA CIMENTACION TORRE B
ESCALA 1:75

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA (M2) Página 1	2628.2873
	TOTAL ACUMULADO LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA (M2)	2628.2873

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	PRELIMINARES		UNIDAD	ML
ITEM	CAP 1 NP 01	Cerramiento Vara Rolliza y teja arquitectonica 2.10Mts Distancia entre Postes 3 Mts		
CERRAMIENTO PERIMETREAL			pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO 1 ML	LARGO 2 ML	CANTIDAD	TOTAL	SUBTOTAL (m2)
1	58.52		1.00	58.52	58.52
2	91.22		1.00	91.22	91.22
3	61.73		1.00	61.73	61.73
4	8.00		1.00	8.00	8.00
5	8.61		1.00	8.61	8.61
6	65.34		1.00	65.34	65.34
7	8.37		1.00	8.37	8.37
8	18.01		1.00	18.01	18.01
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					319.80

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

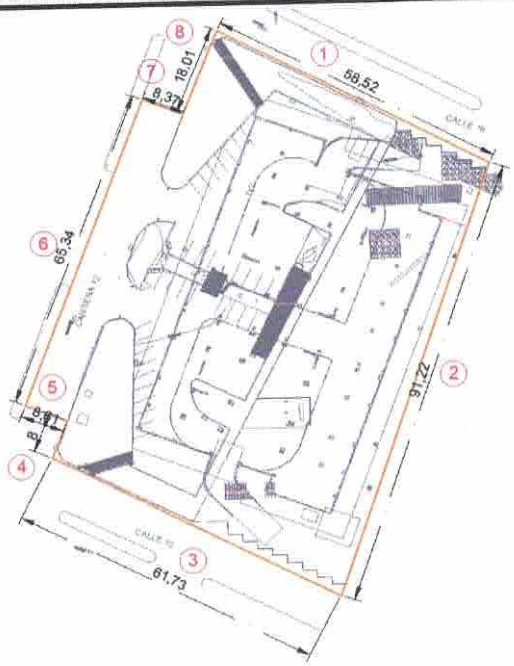

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL Cerramiento Vara Rolliza y teja arquitectonica 2.10Mts Distancia entre Postes 3 Mts (ML) Página 1	319.80
	TOTAL ACUMULADO Cerramiento Vara Rolliza y teja arquitectonica 2.10Mts Distancia entre Postes 3 Mts (ML)	319.80

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	1.07.02	Suministro E Instalación De Estructura Metálica Para Teja De Fibrocemento En Perfil Tipo Perlin P-10-12n	
CAMPAMENTO		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO ML	ANCHO ML	AREA M2	CANT	SUBTOTAL (m2)
ESTRUCTURA TECHO CAMPAMENTO	7.35	4.90	36.0	1	36.0
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					36.0

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

CUBIERTA

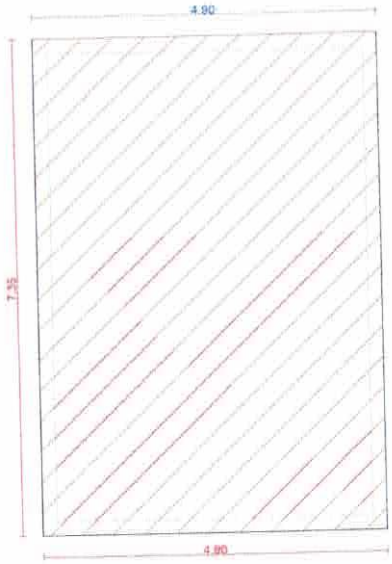

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL Suministro E Instalación De Estructura Metálica Para Teja De Fibrocemento En Perfil Tipo Perlin P-10-12n (m2) Página 1	36.0
	TOTAL ACUMULADO Suministro E Instalación De Estructura Metálica Para Teja De Fibrocemento En Perfil Tipo Perlin P-10-12n (m2)	36.0

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO
VERSION 1		
FECHA		
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	1.07.03	MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM. Piso E = 0.08 M., En Lámina De Fibrocemento De 10 Mm.	
PISO CAMPAMENTO		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO ML	ANCHO ML	AREA M2	CANT	SUBTOTAL (m2)
	7.15	4.50	32.18	1	32.18
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					32.18

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

PLANTA

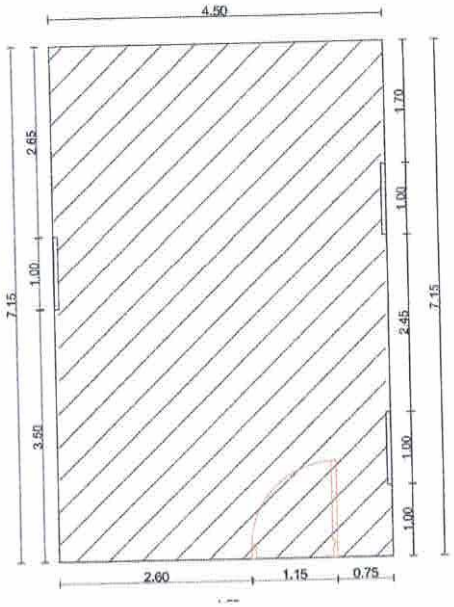

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM. Piso E = 0.08 M., En Lámina De Fibrocemento De 10 Mm. (m2) Página 1	32.18
	TOTAL ACUMULADO MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM. Piso E = 0.08 M., En Lámina De Fibrocemento De 10 Mm. (m2)	32.18

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1


CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	1.07.05	Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Proyectante. (Incluye Vidrio De 5 Mm. Y Herrajes).	
PISO CAMPAMENTO		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO ML	ANCHO ML	AREA M2	CANT	SUBTOTAL (m2)
CAMPAMENTO	1.15	1.00	1.15	3	3.45
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					3.45

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA



FACHADA LATERAL DERECHA

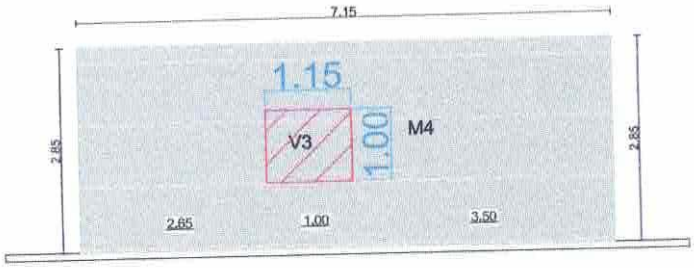

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Proyectante. (Incluye Vidrio De 5 Mm. Y Herrajes). (m2) Página 1	3.45
	TOTAL ACUMULADO Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Proyectante. (Incluye Vidrio De 5 Mm. Y Herrajes). (m2)	3.45

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	1.07.06	Suministro E Instalación De Puerta En Lámina Cal. 18. (Incluye Anticorrosivo). (No Incluye Cerradura).	
PISO CAMPAMENTO		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO ML	ANCHO ML	AREA M2	CANT	SUBTOTAL (m2)
PUERTA CAMPAMENTO	2.25	1.15	2.59	1	2.59
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					2.59

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

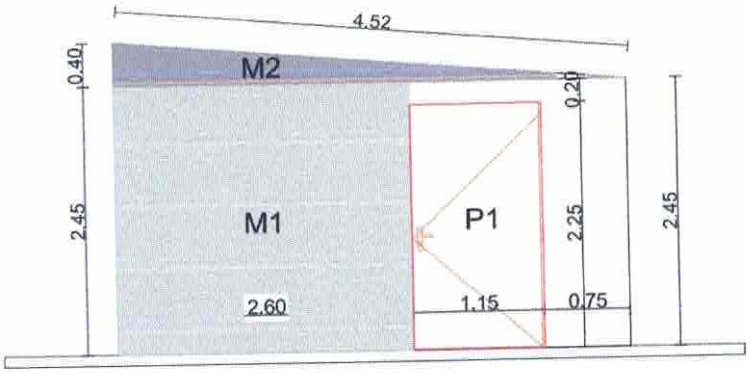

FACHADA PRINCIPAL

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL Suministro E Instalación De Puerta En Lámina Cal. 18. (Incluye Anticorrosivo). (No Incluye Cerradura). (m2) Página 1	2.59
	TOTAL ACUMULADO Suministro E Instalación De Puerta En Lámina Cal. 18. (Incluye Anticorrosivo). (No Incluye Cerradura). (m2)	2.59

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	1.07.07	Suministro E instalación Cubierta en teja fibrocemento N 10	
CUBIERTA CAMPAMENTO		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO ML	ANCHO ML	AREA M2	CANT	SUBTOTAL (m2)
CUBIERTA CAMPAMENTO	7.55	4.90	37.00	1	37.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					37.00

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

CUBIERTA

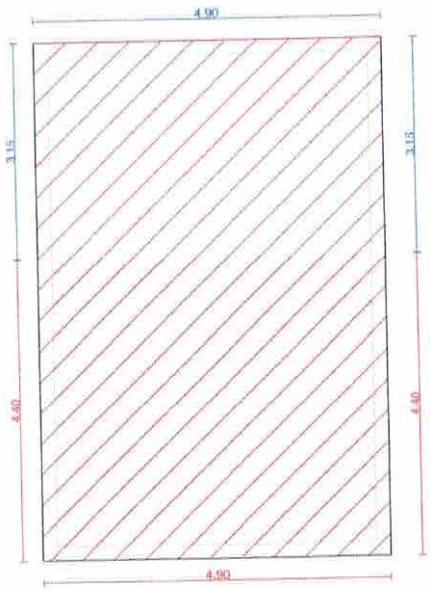

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL Suministro E instalación Cubierta en teja fibrocemento N 10 (m2) Página 1	37.00
	TOTAL ACUMULADO Suministro E instalación Cubierta en teja fibrocemento N 10 (m2)	37.00

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO CONSORCIO CAM SOGAMOSO		VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1


CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	NP 02	MURO UNA CARA, EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM.	
CAMPAMENTO		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO ML	ANCHO ML	AREA M2	CANT	SUBTOTAL (m2)
FACHADA PRINCIPAL	2.60	2.45	6.37	1	6.37
FACHADA PRINCIPAL	2.45	0.75	1.84	1	1.84
FACHADA PRINCIPAL	0.20	1.15	0.23	1	0.23
CUCHILLA FACHADA PRINCIPAL	4.52	0.40	0.90	1	0.90
FACHADA POSTERIOR	4.50	2.45	11.03	1	11.03
CUCHILLA FACHADA POSTERIOR	4.52	0.40	0.90	1	0.90
FACHADA LATERAL DERECHA	2.45	7.15	17.52	1	17.52
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	2.65	7.15	18.95	1	18.95
VENTANAS	-1.00	1.15	-1.15	3	-3.45
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					54.29


DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



FACHADA POSTERIOR



FACHADA LATERAL DERECHA



FACHADA LATERAL IZQUIERDA

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL MURO UNA CARA, EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM. (m2) Página 1	54.29
	TOTAL ACUMULADO MURO UNA CARA, EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM. (m2)	54.29

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO
		VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1


CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	1.08.02	MURO BLOQUE NO. 4 E = 0,10 MTS	
MUROS PERIMETRALES CAMPAMENTO		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONG (m)	ALTO	AREA M2	CANT	SUBTOTAL (m2)
MURO 1	4.80	2.15	10.32	2.00	20.64
MURO 2 (TRIANGULO)	4.80	0.35	0.84	2.00	1.68
(-) PUERTA 1	1.10	2.10	2.31	-1.00	-2.31
FACHADA LAETRAL DERECHA	8.80	2.15	18.92	1.00	18.92
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	8.80	2.50	22.00	1.00	22.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					60.93


DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

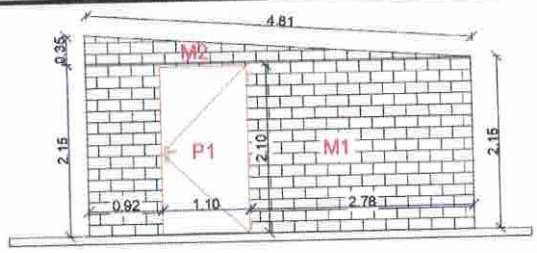


FACHADA PRINCIPAL

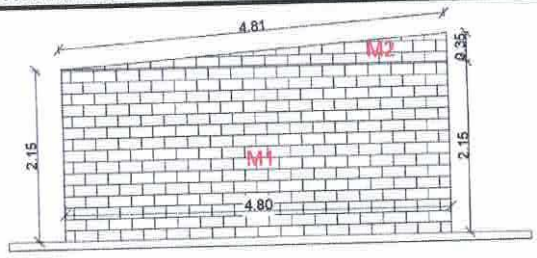


FACHADA POSTERIOR



FACHADA LATERAL DERECHA



FACHADA LATERAL IZQUIERDA

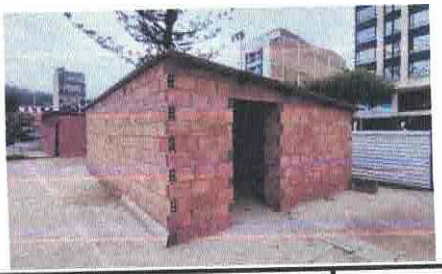



OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL MURO BLOQUE NO. 4 E = 0,10 MTS (m2) Página 1	60.93
	TOTAL ACUMULADO MURO BLOQUE NO. 4 E = 0,10 MTS (m2)	60.93

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	1.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLÍN P-10-12N	
CUBIERTA CAMPAMENTO		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO ML	ANCHO ML	AREA M2	CANT	SUBTOTAL (m2)
ESTRUCTURA METÁLICA	8.80	4.80	42.2	1	42.24
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					42.24

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

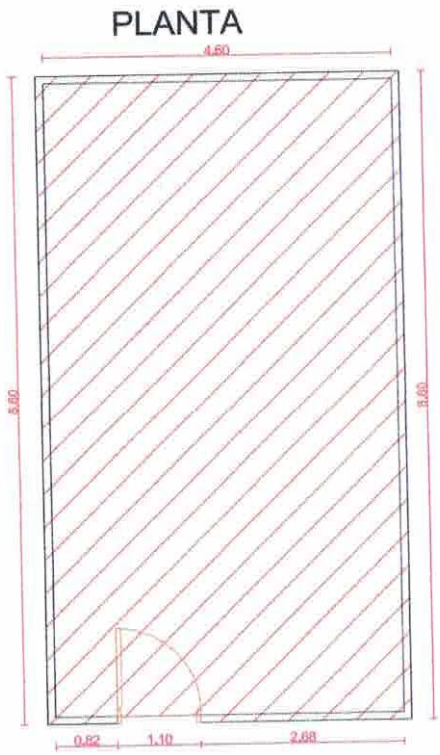





OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLÍN P-10-12N (m2) Página 1	42.24
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLÍN P-10-12N (m2)	42.24

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	1.08.06	Suministro E instalación Cubierta en teja fibrocemento N 10	
CUBIERTA CAMPAMENTO		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO ML	ANCHO ML	AREA M2	CANT	SUBTOTAL (m2)
ESTRUCTURA METÁLICA	8.90	4.84	43.06	1	43.06
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					43.06

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

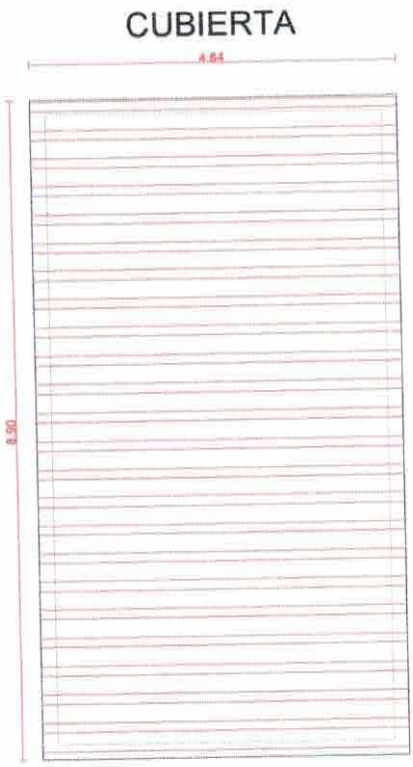





OBSERVACIONES:	SUBTOTAL Suministro E instalación Cubierta en teja fibrocemento N 10 (m2) Página 1	43.06
	TOTAL ACUMULADO Suministro E instalación Cubierta en teja fibrocemento N 10 (m2)	43.06

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CAMPAMENTO	UNIDAD	m2
ITEM	1.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO) (NO INCLUYE CERRADURA)	

ACCESO CAMPAMENTO — pagina 1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONG (m)	ALTO	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL (m2)
Puerta Metálica 1.5X2.2 Mts	1.10	2.10		1.00	2.31
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					2.31

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

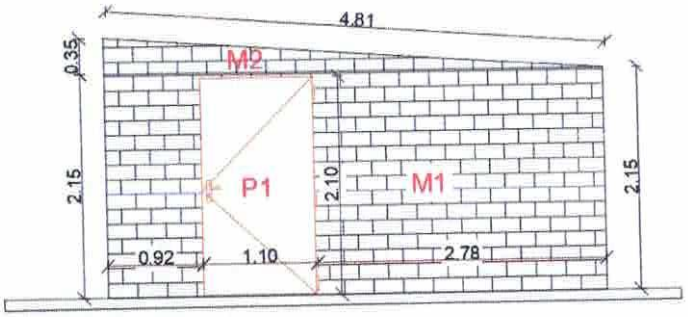



FACHADA PRINCIPAL

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO) (NO INCLUYE CERRADURA) (m2) Página 1	2.31
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO) (NO INCLUYE CERRADURA) (m2)	2.31

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO / Sogamoso	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ		8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD	MES
ITEM	1.09	BAÑOS PROVISIONALES	
BAÑOS PORTATILES		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	unidades			meses	CANT
BAÑO PORTATIL	2.00			18.00	36.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					36.00

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA





OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL BAÑOS PROVISIONALES (MES) Página 1	36.00
	TOTAL ACUMULADO BAÑOS PROVISIONALES (MES)	36.00

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	EXCAVACIONES	UNIDAD	M3
ITEM	CAP 2 NP 01	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS ENTERRADOS EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	
MUROS DE CONTENCION		pagina	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANT	SUBTOTAL
cimineto visto costado calle 16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					1.00

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

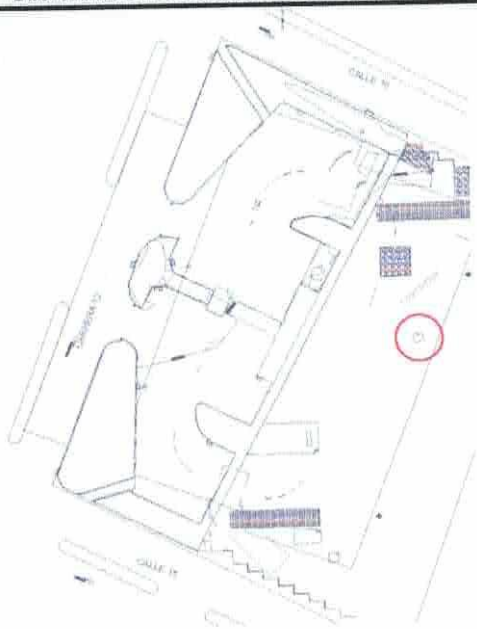

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS ENTERRADOS EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (M3) Página 1	1.00
	TOTAL ACUMULADO DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS ENTERRADOS EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (M3)	1.00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ		8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	EXCAVACIONES	UNIDAD	M3
ITEM	CAP 2 NP 02	EXCAVACIÓN DE CORTES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANT * Factor Expansión 30%	SUBTOTAL
Eje 3 - Eje 15, Eje A-Eje G	59.37	40.70	3.25	1.0	10209.12
Eje A- Eje C , Eje 1-Eje 3	14.60	7.50	3.25	1.0	462.64
Eje C -Eje F , Eje 2-Eje 3	2.70	21.36	3.25	1.0	243.66
Eje 15-Eje 16 , Eje E, Eje G	3.13	12.90	3.25	1.0	170.59
Eje 3-Eje 10 , Eje A-Eje G	33.30	40.70	1.85	1.0	3259.52
Eje A- Eje C , Eje 1-Eje 3	14.60	7.30	1.85	1.0	256.32
Eje C -Eje F , Eje 2-Eje 3	2.80	21.40	1.85	1.0	144.11
Rampa Parqueadero 15%	21.00	5.50	3.15	2.0	472.97
Talud 60° Eje A	66.47	2.94	5.10	1.0	648.81
Talud 60° Eje G	65.29	2.94	5.10	1.0	637.29
Talud 60° Eje 1 y Eje 15	40.70	2.94	5.10	2.0	794.54
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					17,299.59

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

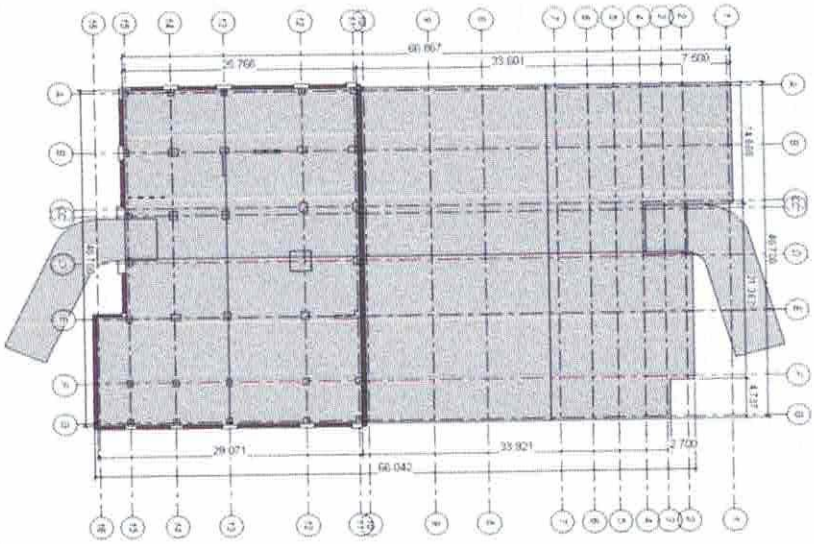

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL EXCAVACIÓN DE CORTES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (M3) Página CANTIDADES	17299.59
	TOTAL ACUMULADO EXCAVACIÓN DE CORTES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (M3)	17299.59

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO CONSORCIO CAM SOGAMOSO		VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	EXCAVACIONES	UNIDAD	M3
ITEM	CAP 2 NP 02	EXCAVACIÓN DE CORTES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	

REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUBTOTAL
Viga Cimentación 30X 65		20.39	0.30	0.65	1	5.17
Viga Cimentación 50X65		311.89	0.50	0.65	1	131.77353
Viga Cimentación 70X85		29.05	0.70	0.85	1	22.47018
Viga Cimentación 50X155		40.20	0.50	1.55	1	40.50150
Zapata Tipo 1		1.40	1.40	1.60	4	16.30720
Zapata Tipo 2		1.70	1.70	1.60	8	48.08960
Zapata Tipo 3		2.00	2.00	1.60	2	16.64000
Zapata Tipo 4		2.40	2.40	1.60	2	23.96160
Zapata Tipo 5		2.50	4.80	1.60	3	74.88000
Zapata Tipo 6		3.50	3.50	1.60	1	25.48000
Zapata Tipo 7		4.20	4.20	1.75	2	80.26200
Zapata Tipo 8		4.70	4.70	1.75	2	100.50950
Zapata Tipo 9		5.10	5.10	1.90	2	128.48940
Zapata Tipo 10		1.10	2.00	1.60	3	13.72800
Zapata Tipo 11		1.80	3.80	1.60	1	14.22720
Zapata Tipo 12		3.00	5.55	1.60	1	34.63200
Zapata Tipo 13		3.20	4.70	1.60	1	31.28320
Zapata Tipo 14		4.00	3.00	1.60	1	24.96000
Muerto en Concreto Ciclópeo		2.40	2.40	2.30	1	17.22240
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						650.67

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

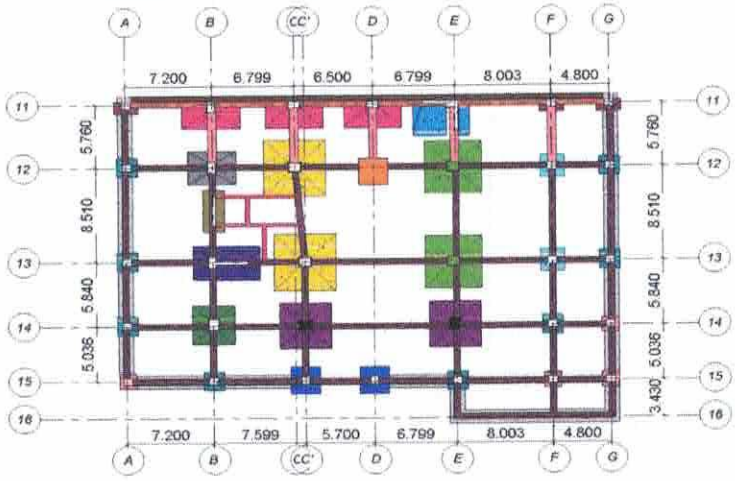

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL EXCAVACIÓN DE CORTES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (M3) Página CANTIDADES	650.67
	TOTAL ACUMULADO EXCAVACIÓN DE CORTES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (M3)	17950.26

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO / Sogamoso	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO
		VERSION 1
		FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	EXCAVACIONES	UNIDAD	M2
ITEM	CAP 2 NP 03	SUMINISTRO E INSTALACION CASETON ICOPOR ALTA DENSIDAD H=1.12ml	

CIMENTACIÓN EDIFICIO A — pagina 1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANT	SUBTOTAL
CASETON CIM EDIF. A VARIOS				1.00	1009.46
					0.00
					0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					1,009.46

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

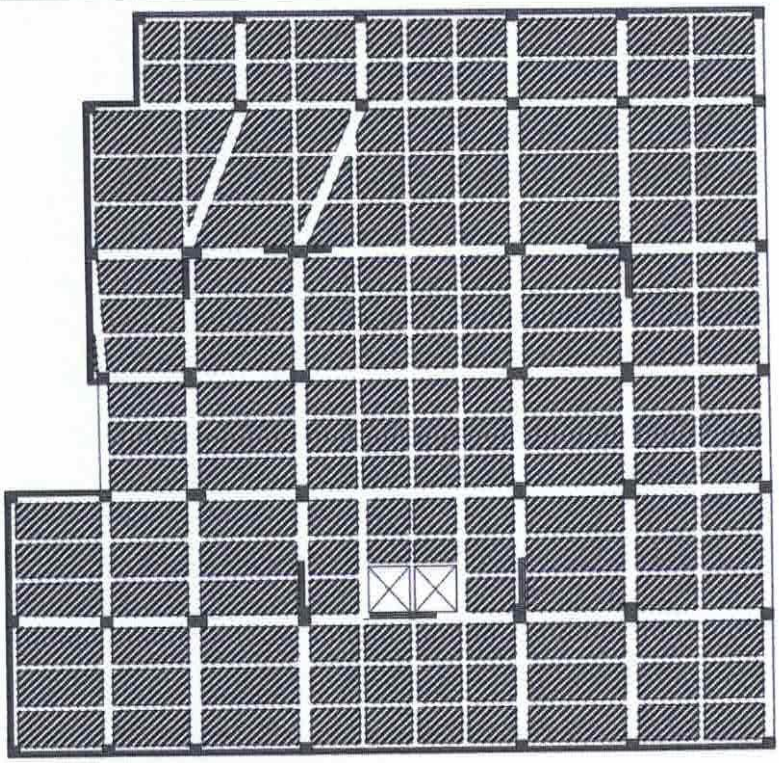

Geometria	
Elevación	.00
Área	*VARIOS*
Área acumul...	1009.46

1009.46 M2

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION CASETON ICOPOR ALTA DENSIDAD H=1.12ml (M2) Página 1	1009.46
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACION CASETON ICOPOR ALTA DENSIDAD H=1.12ml (M2)	1009.46

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO
VERSION 1		
FECHA		
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	EXCAVACIONES	UNIDAD	M2
ITEM	CAP 2 NP 04	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	

CIMENTACIÓN EDIFICIO A — pagina 1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONG (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	CANT	SUBTOTAL
CIM EDIF. A	33.40	4.80	160.32	1.00	160.32
CIM EDIF. A	36.10	15.40	555.94	1.00	555.94
CIM EDIF. A	35.60	5.90	210.04	1.00	210.04
CIM EDIF. A	40.60	14.60	592.76	1.00	592.76
			0.00	1.00	0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					1,519.06

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

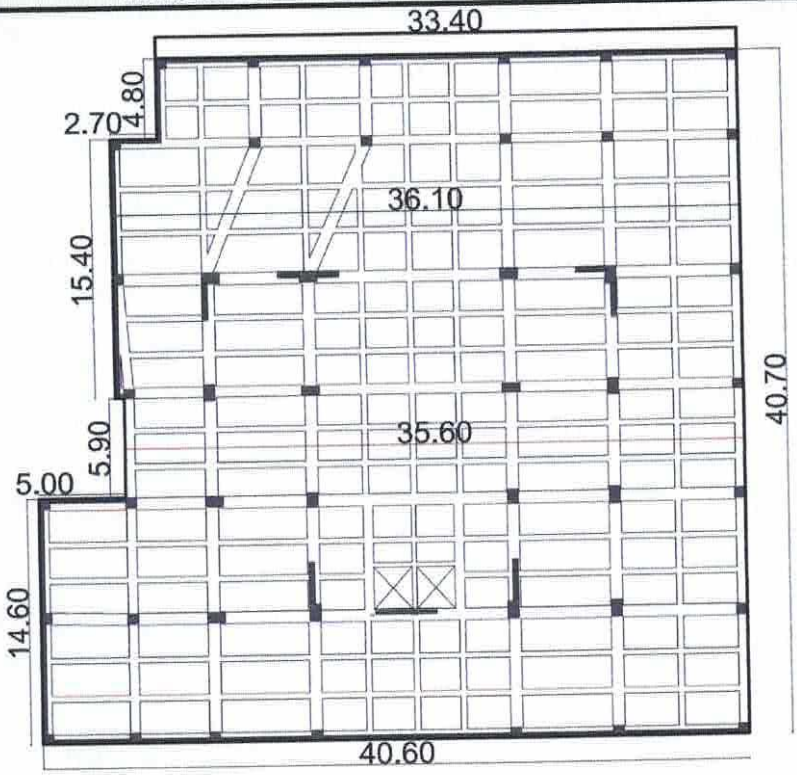

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) (M2) Página 1	1519.06
	TOTAL ACUMULADO SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) (M2)	1519.06

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CIMENTACIÓN EDIFICIO A	UNIDAD	ML
ITEM	CAP 2 NP 05	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	

CIMENTACIÓN EDIFICIO A — pagina 1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	ITEM	LONG (m)		CANT	SUBTOTAL
CIMENTACIÓN TORRE A DILATACIONES	1	31.16		1.00	31.16
	2	38.16		1.00	38.16
	3	36.41		1.00	36.41
	4	34.25		1.00	34.25
	5	34.97		1.00	34.97
	6	37.90		1.00	37.90
	7	33.49		1.00	33.49
	8	30.56		1.00	30.56
	9	29.84		1.00	29.84
	10	32.00		1.00	32.00
	11	34.10		1.00	34.10
	12	26.45		1.00	26.45
	13	33.26		1.00	33.26
	14	64.29		1.00	64.29
	15	54.80		1.00	54.80
	16	55.05		1.00	55.05
	17	66.73		1.00	66.73
	18	56.76		1.00	56.76
	19	33.33		1.00	33.33
	20	30.40		1.00	30.40
	21	29.68		1.00	29.68
	22	29.73		1.00	29.73
	23	48.50		1.00	48.50
	24	28.42		1.00	28.42
	25	25.69		1.00	25.69
	26	52.30		1.00	52.30
	27	33.73		1.00	33.73
	28	26.47		1.00	26.47
	29	32.39		1.00	32.39
	30	30.13		1.00	30.13
	31	36.21		1.00	36.21
	32	34.86		1.00	34.86
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					1,202.02

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

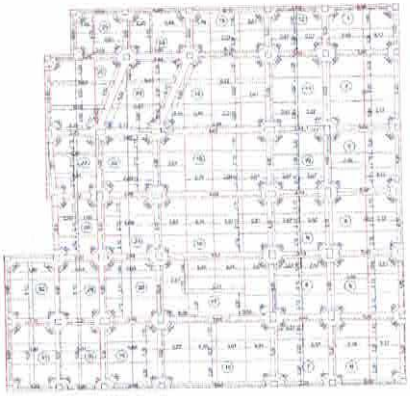

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. (ML) Página 1	1202.02
	TOTAL ACUMULADO CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. (ML)	1202.02

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO / Sogamoso	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ		8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1


CAPITULO:	CIMENTACIÓN EDIFICIO B	UNIDAD	ML
ITEM	CAP 2 NP 05	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	

CIMENTACIÓN EDIFICIO B — pagina 2

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	ITEM	LONG (m)		CANT	SUBTOTAL
CIMENTACIÓN TORRE B ROMBOS COLUMNAS Y PANTALLAS	1	21.35		1.00	21.35
	2	30.20		1.00	30.20
	3	25.51		1.00	25.51
	4	34.74		1.00	34.74
	5	57.57		1.00	57.57
	6	33.75		1.00	33.75
	7	31.64		1.00	31.64
	8	34.60		1.00	34.60
	9	36.10		1.00	36.10
	10	61.41		1.00	61.41
	11	36.85		1.00	36.85
	12	27.67		1.00	27.67
	13	35.65		1.00	35.65
	14	44.95		1.00	44.95
	15	76.03		1.00	76.03
	16	39.97		1.00	39.97
	17	42.70		1.00	42.70
	18	33.58		1.00	33.58
	19	33.20		1.00	33.20
	20	31.93		1.00	31.93
	21	32.72		1.00	32.72
	22	36.68		1.00	36.68
	23	27.38		1.00	27.38
corte placa existente cerramiento	23A	91.22		1.00	91.22
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					**957.40**

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

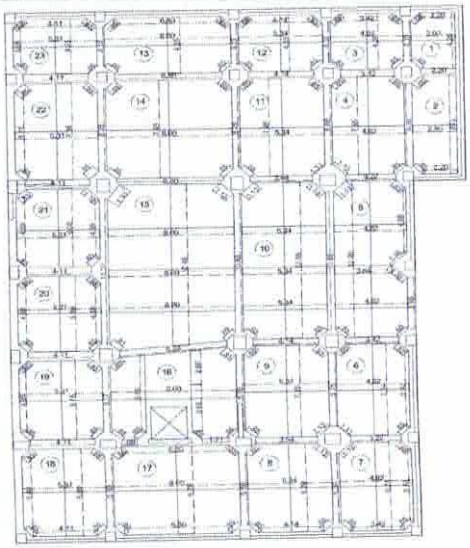

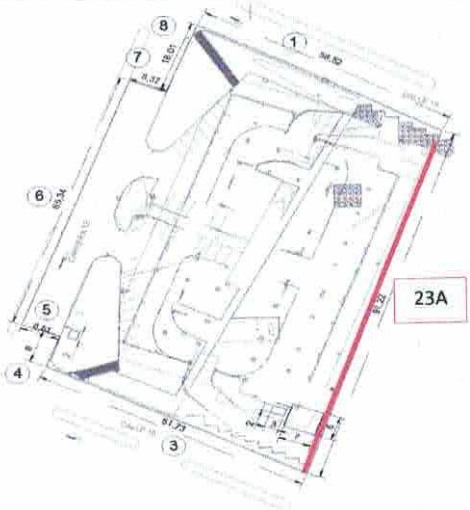

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. (ML) Página 2	957.40
	TOTAL ACUMULADO CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. (ML)	2159.42

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ		8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CIMENTACIÓN EDIFICIO A	UNIDAD	ML
ITEM	CAP 2 NP 06	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	

CIMENTACIÓN EDIFICIO A — pagina 1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	ITEM	LONG (m)		CANT	SUBTOTAL
CIMENTACIÓN TORRE A DILATACIONES	1	31.16		1.00	31.16
	2	38.16		1.00	38.16
	3	36.41		1.00	36.41
	4	34.25		1.00	34.25
	5	34.97		1.00	34.97
	6	37.90		1.00	37.90
	7	33.49		1.00	33.49
	8	30.56		1.00	30.56
	9	29.84		1.00	29.84
	10	32.00		1.00	32.00
	11	34.10		1.00	34.10
	12	26.45		1.00	26.45
	13	33.26		1.00	33.26
	14	64.29		1.00	64.29
	15	54.80		1.00	54.80
	16	55.05		1.00	55.05
	17	66.73		1.00	66.73
	18	56.76		1.00	56.76
	19	33.33		1.00	33.33
	20	30.40		1.00	30.40
	21	29.68		1.00	29.68
	22	29.73		1.00	29.73
	23	48.50		1.00	48.50
	24	28.42		1.00	28.42
	25	25.69		1.00	25.69
	26	52.30		1.00	52.30
	27	33.73		1.00	33.73
	28	26.47		1.00	26.47
	29	32.39		1.00	32.39
	30	30.13		1.00	30.13
	31	36.21		1.00	36.21
	32	34.86		1.00	34.86
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					1,202.02

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

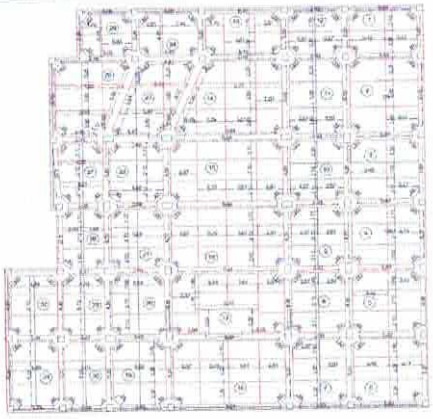

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) (ML) Página 1	1202.02
	TOTAL ACUMULADO SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) (ML)	1202.02

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO / Sogamoso	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	**CIMENTACIÓN EDIFICIO B**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**CAP 2 NP 06**	**SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)**	

CIMENTACIÓN EDIFICIO B — pagina 2

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	ITEM	LONG (m)		CANT	SUBTOTAL
CIMENTACIÓN TORRE B ROMBOS COLUMNAS Y PANTALLAS	1	21.35		1.00	21.35
	2	30.20		1.00	30.20
	3	25.51		1.00	25.51
	4	34.74		1.00	34.74
	5	57.57		1.00	57.57
	6	33.75		1.00	33.75
	7	31.64		1.00	31.64
	8	34.60		1.00	34.60
	9	36.10		1.00	36.10
	10	61.41		1.00	61.41
	11	36.85		1.00	36.85
	12	27.67		1.00	27.67
	13	35.65		1.00	35.65
	14	44.95		1.00	44.95
	15	76.03		1.00	76.03
	16	39.97		1.00	39.97
	17	42.70		1.00	42.70
	18	33.58		1.00	33.58
	19	33.20		1.00	33.20
	20	31.93		1.00	31.93
	21	32.72		1.00	32.72
	22	36.68		1.00	36.68
	23	27.38		1.00	27.38
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					**866.18**

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

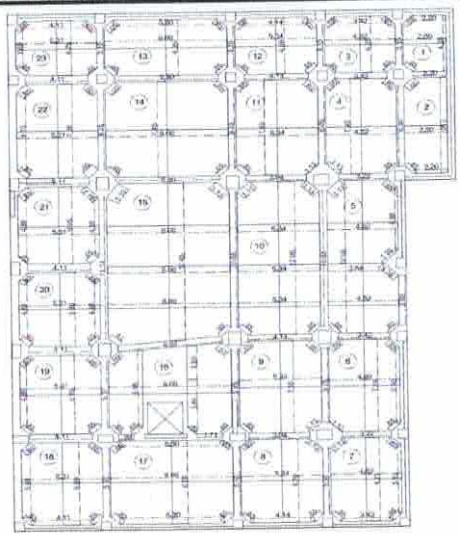

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) (ML) Página 2	**866.18**
	TOTAL ACUMULADO SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) (ML)	**2068.20**

CONTRATISTA — **INTERVENTORIA**

ALCALDÍA DE SOGAMOSO / Sogamoso	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	**CIMENTACIÓN EDIFICIO B**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**CAP 2 NP 07**	**SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)**	

CIMENTACIÓN EDIFICIO A — **pagina** 1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANT	SUBTOTAL
SOLADOS ZARPAS, ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN TORRE B				1.00	459.69
					0.00
					0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					**459.69**

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

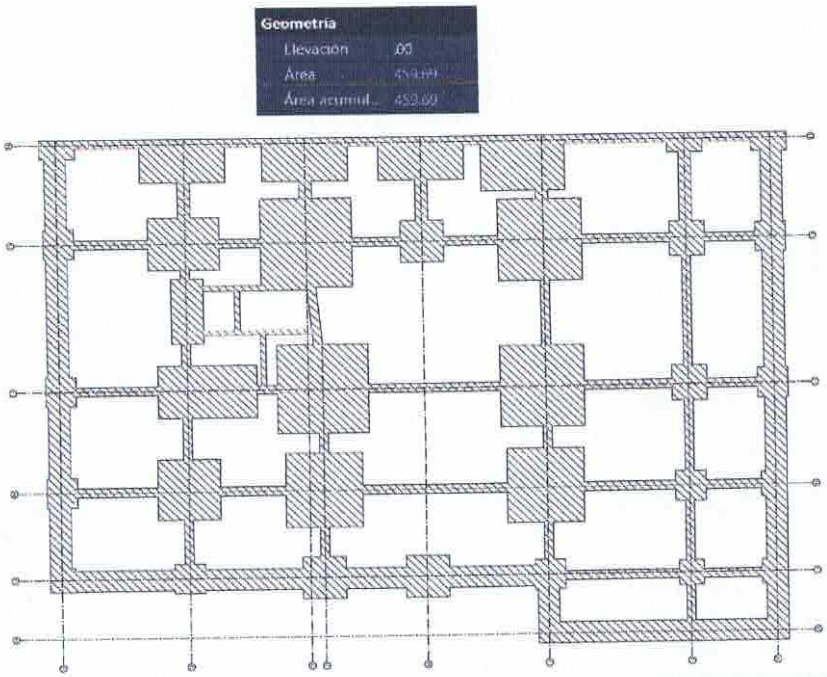

OBSERVACIONES: **REMETIRSE A MEM. DIGITAL DWG**	SUBTOTAL SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) (M2) Página 1	**459.69**
	TOTAL ACUMULADO SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) (M2)	**459.69**

CONTRATISTA — **INTERVENTORIA**

ALCALDÍA DE SOGAMOSO / Sogamoso	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO
		VERSION 1
		FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	CIMENTACIÓN EDIFICIO B	UNIDAD	UN
ITEM	CAP 2 NP 08	PERFORACION Y ANCLAJE QUIMICO PARA VARILLA DE 1/2"-3/8"	

MUROS DE CONTENCIÓN — pagina 1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONG (m)	ANCHO (m)	CANT X PUNTO	COLUMNAS	SUBTOTAL
PUNTOS CONTRA COLUMNAS ANCLAJES TORRE A			34.00	34.00	1156.00
PUNTOS CONTRA COLUMNAS ANCLAJES TORRE B			34.00	28.00	952.00
					0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					2,108.00

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

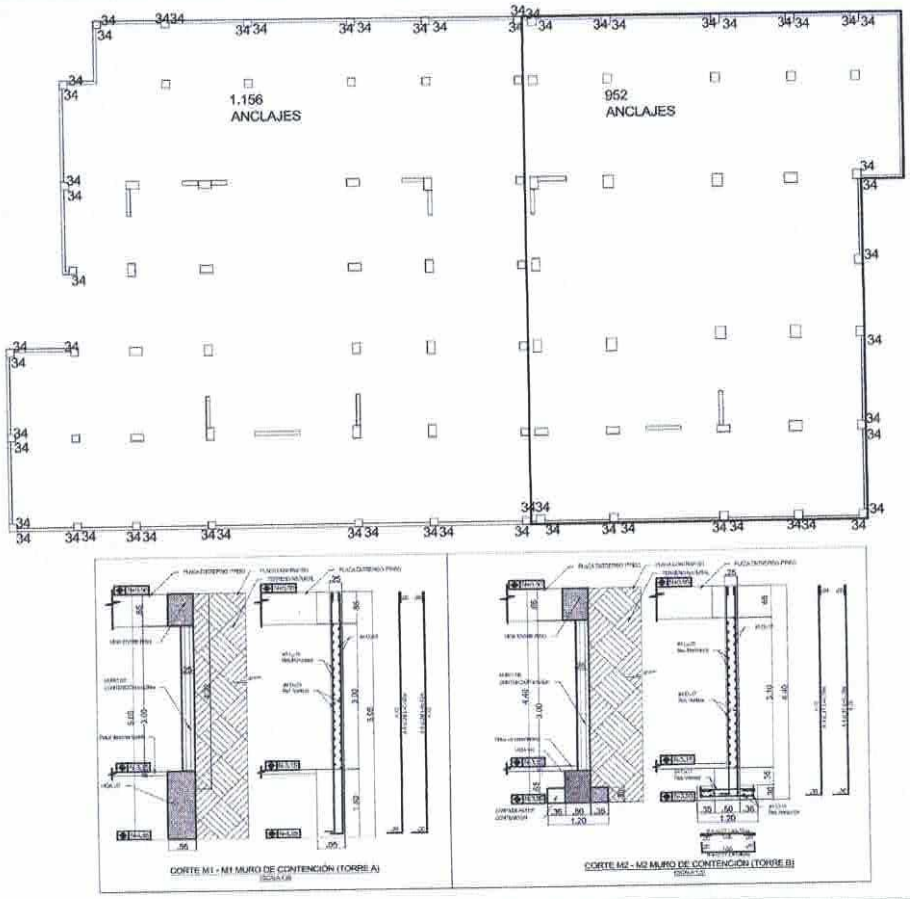

OBSERVACIONES: REMETIRSE A MEM. DIGITAL DWG	SUBTOTAL PERFORACION Y ANCLAJE QUIMICO PARA VARILLA DE 1/2"-3/8" (UN) Página 1	2108.00
	TOTAL ACUMULADO PERFORACION Y ANCLAJE QUIMICO PARA VARILLA DE 1/2"-3/8" (UN)	2108.00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO CONSORCIO CAM SOGAMOSO		VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	DRY WALL	UNIDAD	Metro Cuadrado
ITEM	5.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 1	

REFERENCIAS			DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANT	SUBTOTAL
CIELO RASO ZONA 1				176.16		1	176.16000
CIELO RASO ZONA 2				273.04		1	273.04000
CIELO RASO ZONA 3				50.27		1	50.27000
CIELO RASO ZONA 4				306.55		1	306.55000
							0.00000
							0.00000
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							806.02

Área: Según Software REVIT 2024


DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA



OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 1 (UNIDAD) Página	806.02
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 1 (UNIDAD)	806.02

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

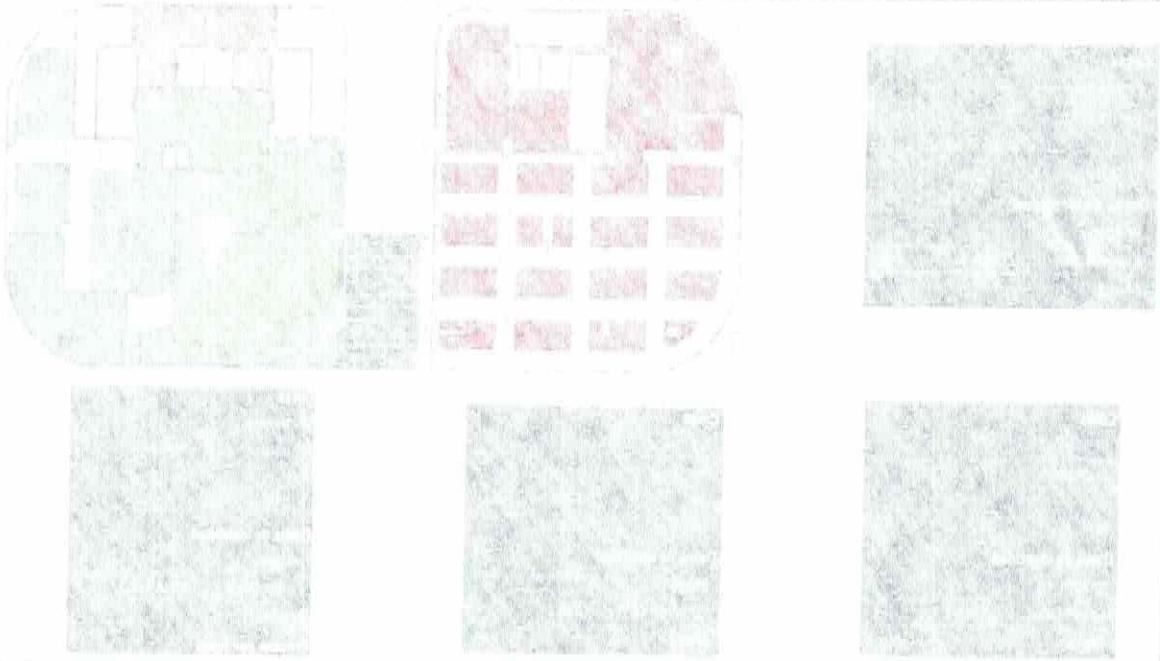

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO CONSORCIO CAM SOGAMOSO		VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1


CAPITULO:	DRY WALL	UNIDAD	Metro Cuadrado
ITEM	5.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 2	

REFERENCIAS			DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANT	SUBTOTAL
CIELO RASO ZONA 1				437.94		1	437.94000
CIELO RASO ZONA 2				79.97		1	79.97000
						1	0.00000
						1	0.00000
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							517.91

Área: Según Software REVIT 2024

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA







OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 2 (UNIDAD) Página	517.91
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 2 (UNIDAD)	517.91

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO CONSORCIO CAM SOGAMOSO		VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	DRY WALL	UNIDAD	Metro Cuadrado
ITEM	5.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 3	

REFERENCIAS			DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANT	SUBTOTAL
CIELO RASO 3 ZONA 1				242.00		1	242.00000
CIELO RASO 3.1 ZONA 2				258.13		1	258.13000
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							500.13

Área: Según Software REVIT 2024

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA



OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 3 (UNIDAD) Página	500.13
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 3 (UNIDAD)	500.13

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	DRY WALL	UNIDAD	Metro Cuadrado
ITEM	5.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 4	

REFERENCIAS		DIMENSIONES					CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANT	SUBTOTAL
CIELO RASO 4 ZONA 1				236.31		1	236.31000
CIELO RASO 4.1 ZONA 2				215.35		1	215.35000
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							451.66

Área: Según Software REVIT 2024

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

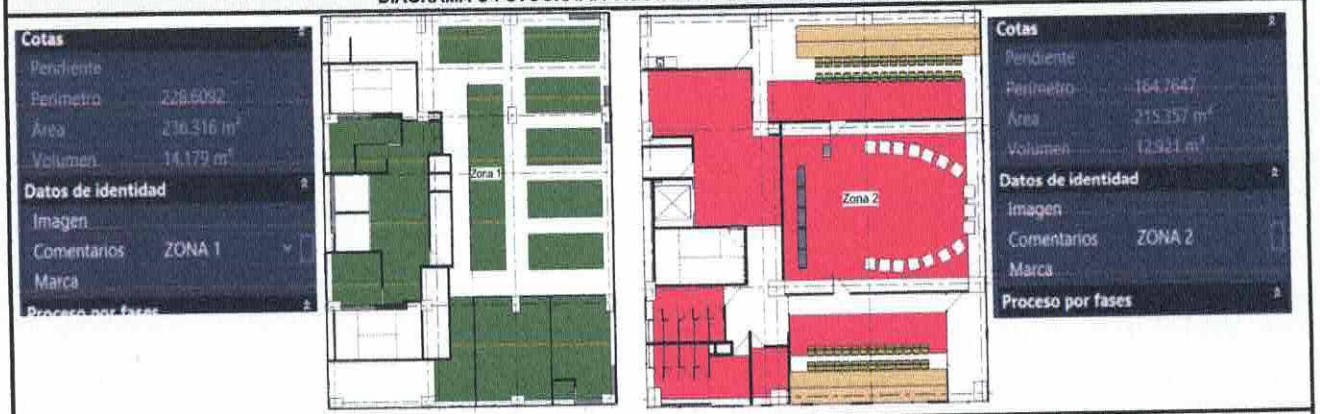

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 4 (UNIDAD) Página	451.66
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 4 (UNIDAD)	451.66

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ		8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1


CAPITULO:	DRY WALL	UNIDAD	Metro Cuadrado
ITEM	5.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 5	

REFERENCIAS		DIMENSIONES					CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANT	SUBTOTAL
CIELO RASO				249.30		1	249.30000
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							249.30

Área: Según Software REVIT 2024

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

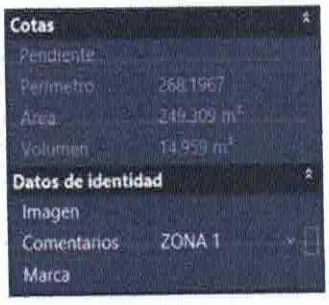

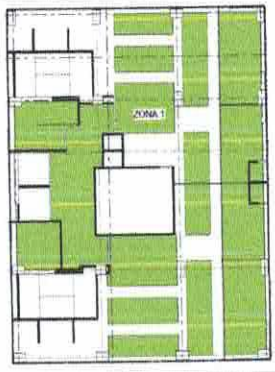

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 5 (UNIDAD) Página	249.30
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 5 (UNIDAD)	249.30

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO
VERSION 1		
FECHA		

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1


CAPITULO:	DRY WALL	UNIDAD	Metro Cuadrado
ITEM	5.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 6	

REFERENCIAS			DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANT	SUBTOTAL
CIELO RASO ZONA 1				273.17		1	273.17
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							273.17

Área: Según Software REVIT 2024

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

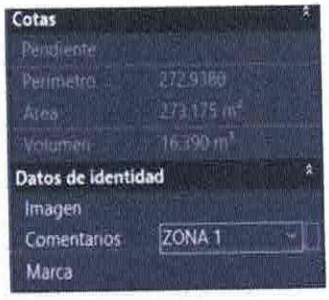

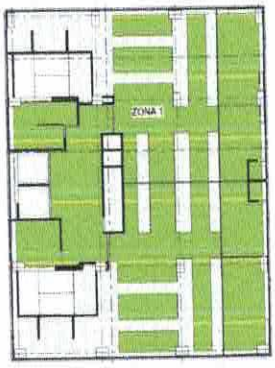

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 6 (UNIDAD) Página	273.17
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 6 (UNIDAD)	273.17

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	VERSION 1 FECHA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	DRY WALL	UNIDAD	Metro Cuadrado
ITEM	5.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 7	

REFERENCIAS			DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANT	SUBTOTAL
CIELO RASO ZONA 1				276.95		1	276.95
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							276.95

Área: Según Software REVIT 2024

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

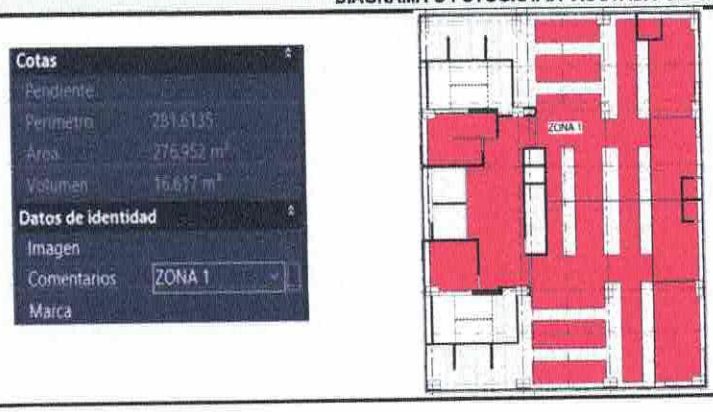

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 7 (UNIDAD) Página	276.95
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 7 (UNIDAD)	276.95

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO
VERSION 1		
FECHA		
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1


CAPITULO:	DRY WALL	UNIDAD	Metro Cuadrado
ITEM	5.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 8	

REFERENCIAS			DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANT	SUBTOTAL
CIELO RASO ZONA 1				258.37		1	258.37
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							258.37

Área: Según Software REVIT 2024

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA



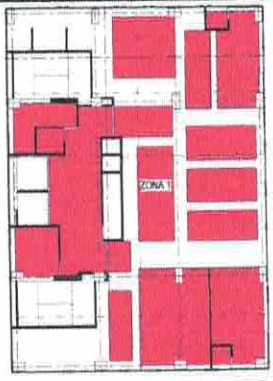

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 8 (UNIDAD) Página	258.37
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 8 (UNIDAD)	258.37

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO
VERSION 1		
FECHA		

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES


MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	DRY WALL	UNIDAD	Metro Cuadrado
ITEM	5.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 9	

REFERENCIAS			DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANT	SUBTOTAL
CIELO RASO ZONA 1				219.08		1	219.08
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							219.08

Área: Según Software REVIT 2024

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

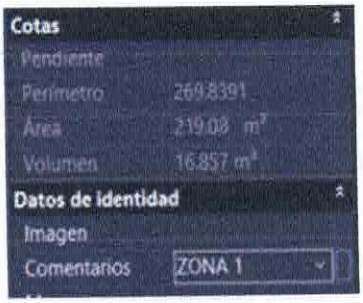



OBSERVACIONES:	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 9 (UNIDAD) Página	219.08
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" - Nivel 9 (UNIDAD)	219.08

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	VERSION 1 PERIODO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	RED ELECTRICA	UNIDAD	UN
ITEM	CAP 6.02.12 NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	
		PAGINA	1

REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	CANT	SUBTOTAL
INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE					2.0	2.0
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						2.00

ESQUEMA

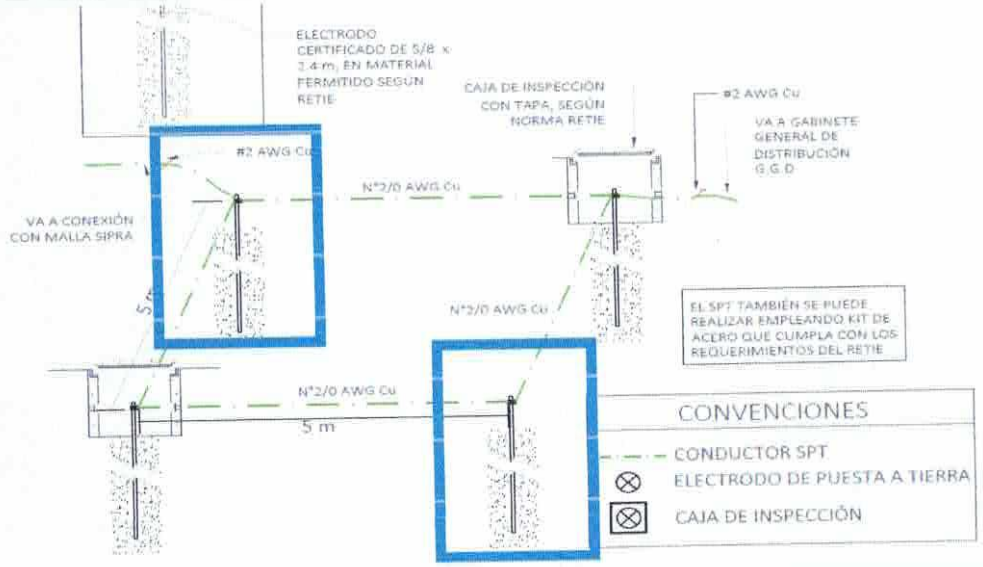

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO (UN) Página 1	2.00
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO (UN)	2.00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	VERSION 1 PERIODO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	RED ELECTRICA	UNIDAD	UN
ITEM	CAP 6.02.12 NP 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN X PARA UNION DE MALLA A TIERRA	
		PAGINA	1

REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	CANT	SUBTOTAL
soldadura en X					12.0	12.0
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						12.00

ESQUEMA



OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN X PARA UNION DE MALLA A TIERRA (UN) Página 1	12.00
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN X PARA UNION DE MALLA A TIERRA (UN)	12.00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

PROYECTO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	VERSION 1 PERIODO 8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	RED ELECTRICA				UNIDAD	UN
ITEM	CAP 6.02.12 NP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN T PARA UNION DE MALLA A TIERRA				
					PAGINA	1

REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	CANT	SUBTOTAL
Soldadura en T					31.0	31.0
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						31.00

ESQUEMA

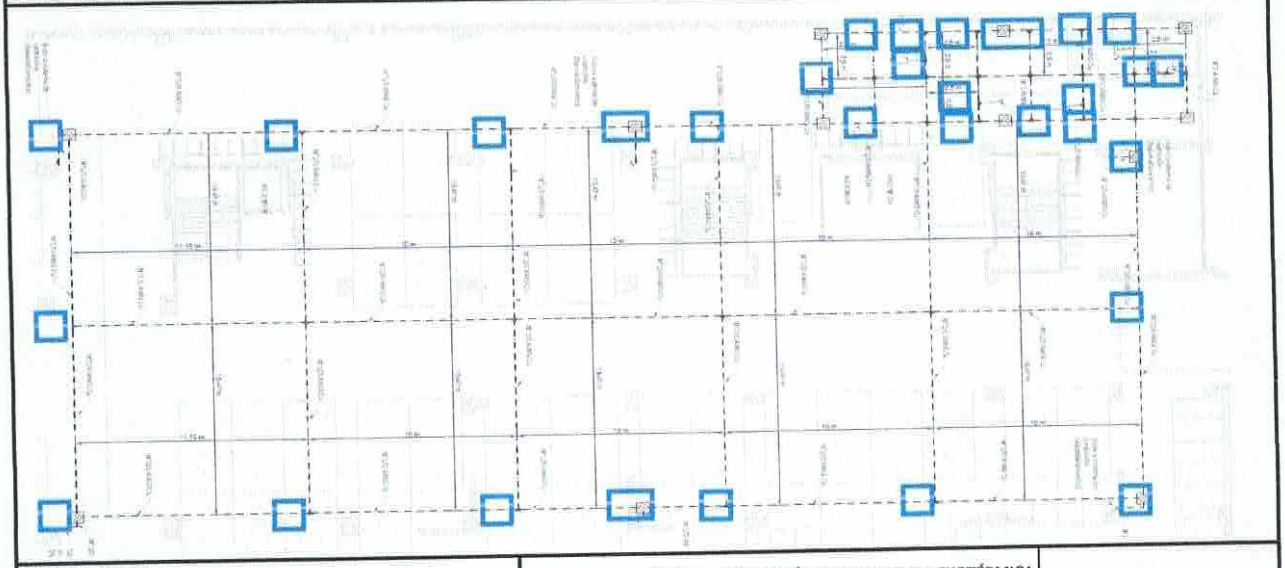

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN T PARA UNION DE MALLA A TIERRA (UN) Página 1	31.00
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN T PARA UNION DE MALLA A TIERRA (UN)	31.00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 PERIODO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ		8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	RED ELECTRICA	UNIDAD	UN
ITEM	CAP 6.02.12 NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 50 CM X 50 CM	
		PAGINA	1

REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	CANT	SUBTOTAL
CAJA DE PASO ENTRADA					1.0	1.0
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						1.00

ESQUEMA

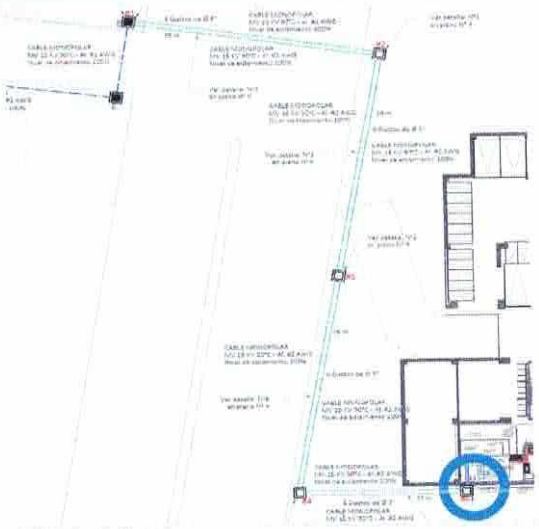

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 50 CM X 50 CM (UN) Página 1	1.00
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 50 CM X 50 CM (UN)	1.00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1 PERIODO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ		8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	RED ELECTRICA	UNIDAD	ml
ITEM	CAP 6.02.12 NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 100 MM X 500 MM	
		PAGINA	1

REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	CANT	SUBTOTAL
BANDEJA DE ENTRADA					2.5	2.5
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						2.50

ESQUEMA

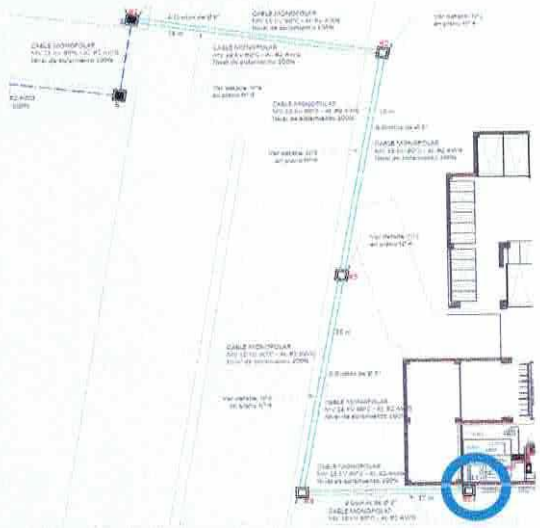

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 100 MM X 500 MM (ml) Página 1	2.50
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 100 MM X 500 MM (ml)	2.50

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 1
	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	PERIODO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	REDES	UNIDAD	ML
ITEM	CAP 6 NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE CON FILTRO SECCION 0.50X0.50	
		PAGINA	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
ITEM	LONG (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	CANT	SUBTOTAL (ML)
TORRE A DRENAJE CON FILTRO 0.50 X 0.50	10.22			1	10.22
	7.75			1	7.75
	7.75			1	7.75
	7.74			1	7.74
	7.45			1	7.45
	37.21			1	37.21
	10.2			1	10.20
	38.15			1	38.15
	31.85			1	31.85
	27.47			1	27.47
	11.96			1	11.96
TORRE B DRENAJE CON FILTRO 0.50 X 0.50	54.7			1	54.70
	21.23			1	21.23
	21.23			1	21.23
	8			1	8.00
	20.48			1	20.48
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					323.39

ESQUEMA

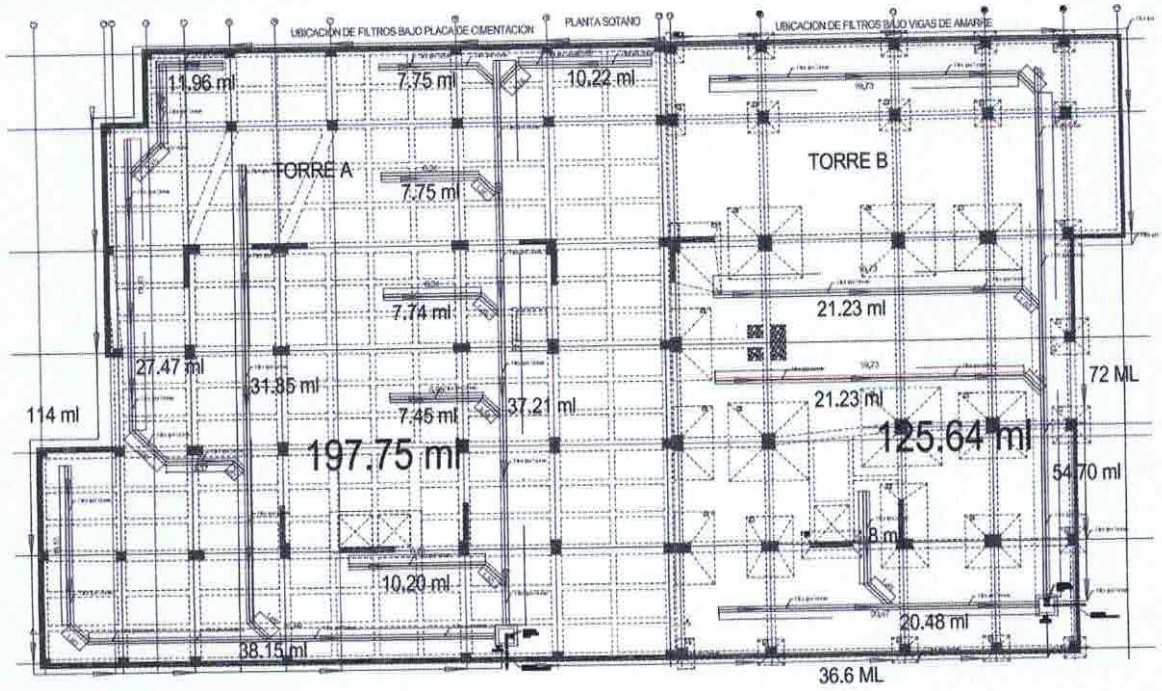

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE CON FILTRO SECCION 0.50X0.50 (ML) Página 1	323.39
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE CON FILTRO SECCION 0.50X0.50 (ML)	323.39

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SOGAMOSO	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO VERSION 1 PERIODO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	REDES	UNIDAD	ML
ITEM	CAP 6 NP 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 6" PARA DRENAJE CON FILTRO SECCION 0.50X1.20	
		PAGINA	1

REFERENCIAS	DIMENSIONES				CANTIDADES
ITEM	LONG (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	CANT	SUBTOTAL (ML)
FILTRO PERIMETRAL EXTERNO TORRE A Y B	29.19			1	29.19
	14.19			1	14.19
	3.19			1	3.19
	23.35			1	23.35
	2.1			1	2.10
	36.6			1	36.60
	1.06			1	1.06
	29.95			1	29.95
	15.57			1	15.57
	4.37			1	4.37
	21.15			1	21.15
	2.67			1	2.67
	4.62			1	4.62
	33.99			1	33.99
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					222.00

ESQUEMA

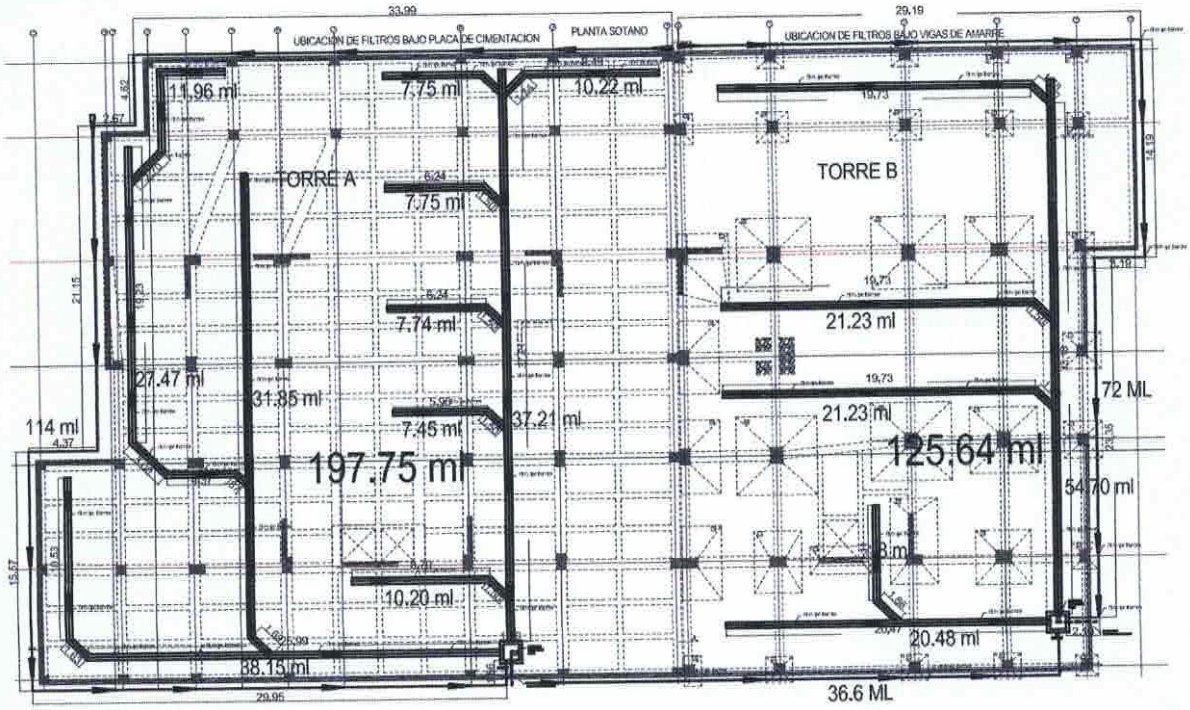

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 6" PARA DRENAJE CON FILTRO SECCION 0.50X1.20 (ML) Página 1	222.00
	TOTAL ACUMULADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 6" PARA DRENAJE CON FILTRO SECCION 0.50X1.20 (ML)	222.00

DEPARTAMENTO DE BOYACA	CONSORCIO CAM SOGAMOSO	VERSION 1
MUNICIPIO DE SOGAMOSO		PERIODO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ		8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	REDES	UNIDAD	m3
ITEM	CAP 6 NP 03	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 Mpa. (3000 PSI)	
		PAGINA	1

REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
ITEM	ELEMENTO	LARGO (M)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	CANT ELEMENTO	SUBTOTAL (M3)
CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO BLQ A	MURO 1	3.28	1.50	0.25	2.00	2.46
	MURO 2	3.28	1.00	0.25	2.00	1.64
	PLACA PISO	1.50	1.50	0.20	1.00	0.45
CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO BLQ B	MURO 1	3.28	1.50	0.25	2.00	2.46
	MURO 2	3.28	1.00	0.25	2.00	1.64
	PLACA PISO	1.50	1.50	0.20	1.00	0.45
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						9.1

ESQUEMA

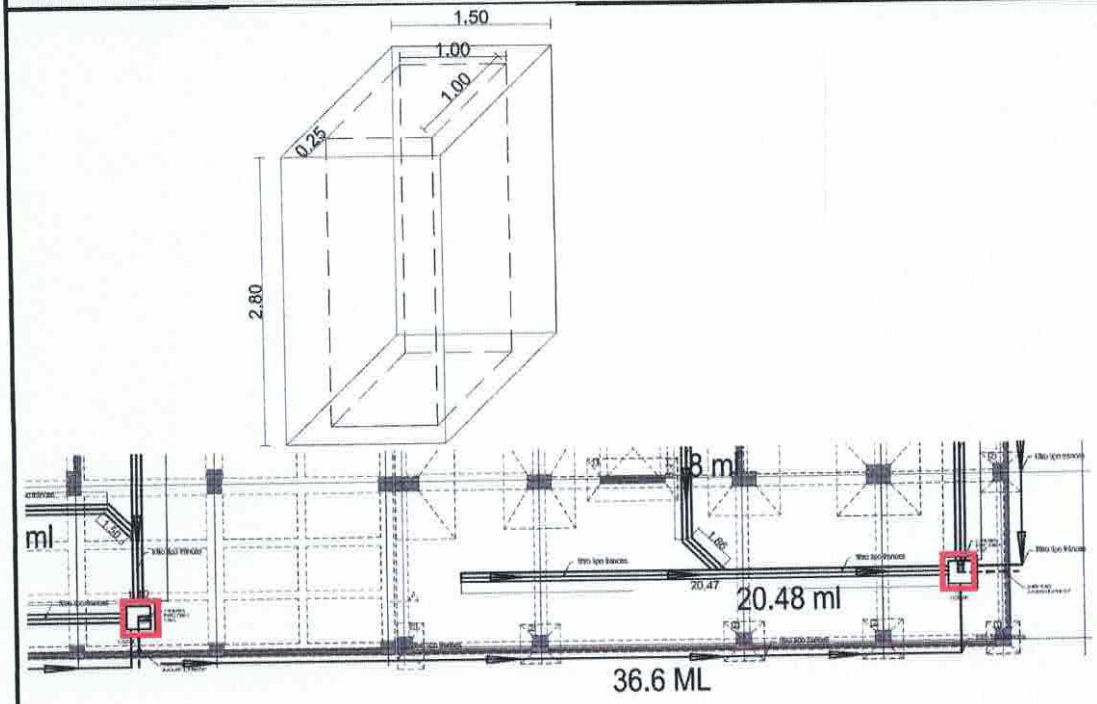

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 Mpa. (3000 PSI) (m3) Página 1	9.10
	TOTAL ACUMULADO CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 Mpa. (3000 PSI) (m3)	9.10

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SOGAMOSO	CONSORCIO CAM SOGAMOSO
VERSION 1		
PERIODO		
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO / BOYACÁ	8/04/2026


MEMORIAS DE CANTIDADES

MODIFICATORIA N°1

CAPITULO:	REDES	UNIDAD	und
ITEM	CAP 6 NP 04	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (INCLUYE MARCO Y TAPA).	
		PAGINA	1

REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
ITEM	LONG (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	CANT	M3	SUBTOTAL (ML)
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO				6.00		6.00
				TOTAL CANTIDADES DE OBRA		6.00

ESQUEMA

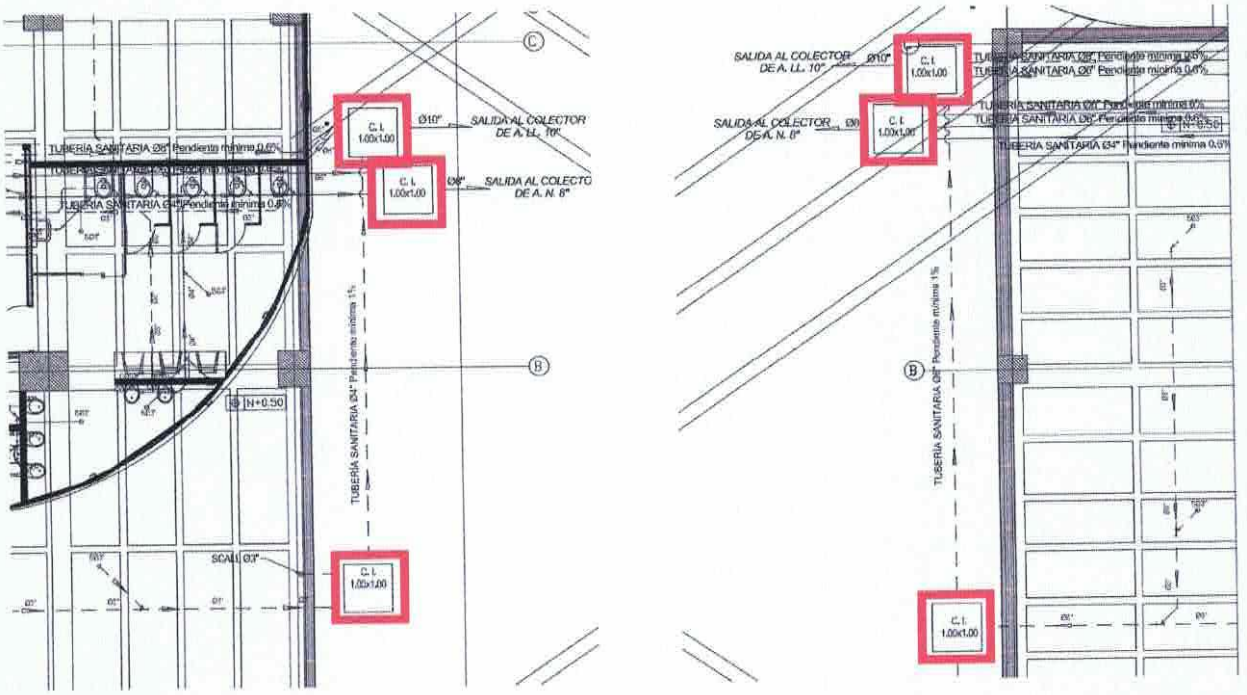

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (INCLUYE MARCO Y TAPA). (und) Página 1	6.00
	TOTAL ACUMULADO CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (INCLUYE MARCO Y TAPA). (und)	6.00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA
