SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:32:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84380936

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 18/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALMA DISENO Y CONSTRUCCION SAS		
Documento	NI900496721	**Dirección**	CL 30C #44 A - 32 BARRIO LA GABRIELA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3216048183
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VILLA ROLDAN JUAN PABLO	**Identificación**	CC 71336740
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1042768949	LINA MARCELA BLANQUICETT BARRIENTOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 98682386	LUIS HERNANDO HENAO GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 560.400	$ 140.200	$ 243.800	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.084.600	$ 9.900	$ 1.094.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:40:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83519334

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 18/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO		
Documento	CC1121912279	**Dirección**	AV 37 #55 - 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2398457
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121912279	JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO	57	00										X							0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 0	$ 400.000	$ 312.500	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.500	$ 16.600	$ 903.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:27:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83243553

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 27/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN PABLO VILLA ROLDAN		
Documento	CC71336740	**Dirección**	AV 26 #52 - 200 TORRE 1 APARTAMENTO 1731
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4873102
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71336740	JUAN PABLO VILLA ROLDAN	03	00																	0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:27:06 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82383831

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8901854948

PAGADO 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN PABLO VILLA ROLDAN		
Documento	CC71336740	**Dirección**	AV 26 #52 - 200 TORRE 1 APARTAMENTO 1731
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4873102
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71336740	JUAN PABLO VILLA ROLDAN	03	00																	0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.680.000	$ 210.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.680.000	$ 1.680.000	$ 0	$ 0	$ 268.800	$ 210.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.800	$ 0	$ 478.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:29:11 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82092108

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 09/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALMA DISENO Y CONSTRUCCION SAS		
Documento	NI900496721	**Dirección**	CL 30C #44 A - 32 BARRIO LA GABRIELA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3216048183
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VILLA ROLDAN JUAN PABLO	**Identificación**	CC 71336740
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007418183	ALEXIS ZAPATA MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1041146672	ELKIN DARIO MALDONADO VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1041148476	YEISON ALBERTO JARAMILLO GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1042768949	LINA MARCELA BLANQUICETT BARRIENTOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 8466260	JORGE MARIO HOYOS CASTAÑEDA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF04) COMFAMA	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 98682386	LUIS HERNANDO HENAO GUZMAN	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.026.150	$ 8.026.150	$ 8.026.150	$ 8.026.150	$ 1.284.400	$ 321.300	$ 558.800	$ 321.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.485.800	$ 8.300	$ 2.494.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:39:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82913519

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 14/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO		
Documento	CC1121912279	**Dirección**	AV 37 #55 - 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2398457
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121912279	JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:26:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81838674

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 21/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN PABLO VILLA ROLDAN		
Documento	CC71336740	**Dirección**	AV 26 #52 - 200 TORRE 1 APARTAMENTO 1731
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4873102
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71336740	JUAN PABLO VILLA ROLDAN	03	00																	0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.680.000	$ 210.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.680.000	$ 1.680.000	$ 0	$ 0	$ 268.800	$ 210.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.800	$ 0	$ 478.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:28:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83901751

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 24/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN PABLO VILLA ROLDAN		
Documento	CC71336740	**Dirección**	AV 26 #52 - 200 TORRE 1 APARTAMENTO 1731
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4873102
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71336740	JUAN PABLO VILLA ROLDAN	03	00																	0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:25:43 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 82120375

Nro Planilla Corregida: 81838674 **Periodo Cotización:** noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 04/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN PABLO VILLA ROLDAN		
Documento	CC71336740	**Dirección**	AV 26 #52 - 200 TORRE 1 APARTAMENTO 1731
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4873102
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71336740	JUAN PABLO VILLA ROLDAN	03	00									A								0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.680.000	$ 210.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.800
CC 71336740	JUAN PABLO VILLA ROLDAN	03	00									C	X							0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 250.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 320.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 51.200	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 0	$ 91.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 06:39:10 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82222537

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 10/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO		
Documento	CC1121912279	**Dirección**	AV 37 #55 - 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2398457
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121912279	JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO	57	00										X							0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 0	$ 400.000	$ 312.500	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.500	$ 0	$ 886.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PROCESO:		Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-046
FORMATO:	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/07/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 33 **DEL** lunes, 13 de julio de 2026 **AL** domingo, 19 de julio de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 250,00 **MUNICIPIO:** SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 67 **DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA** **BARRIO/VEREDA: ZONA URBANA**

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE MINDEPORTE: ADRIANA HERNANDEZ

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA: EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	
Contrato No.	SA –SF 007 DE 2025	
Tiempo inicial (meses)		3,5
Valor Inicial:		$ 251.232.445,98
Valor anticipo :(si aplica)	N-A	
Valor adición(es) MinDeporte:	N-A	
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N-A	
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N-A	
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N-A	
Valor Actualizado:	$	251.232.445,98
Valor pagado:	$	125.616.222,99
Saldo por pagar:	$	125.616.222,99
Plazo Inicial (dias):		105 dias
Fecha de Inicio:		martes, 11 de noviembre de 2025
Prorroga 1		7 meses
Plazo despues de prorroga		315 dias
Fecha de Terminación Actualizada		jueves, 24 de septiembre de 2026
Dias Transcurridos		250,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONCORCIO GRUPACK CIVIL	
Contrato No.	LP–SF 002 DE 2025	
Tiempo (meses)	3	
Valor Inicial:	$	4.148.926.956,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A.	
Valor adición(es) MinDeporte:	N/A.	
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N/A.	
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N/A.	
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N/A.	
Valor Actualizado:	$	4.148.926.956,00
Valor pagado:	$	886.407.845,00
Saldo por pagar:	$	3.262.519.111,00
Plazo Inicial (dias):	90 dias	
Fecha de Inicio:	martes, 02 de diciembre de 2025	
Prorroga 1	6 meses	
Plazo despues de prorroga	270 dias	
Fecha de Terminación Actualizada	1 de septiembre de 2026	
Dias Transcurridos	229	

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO	% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO	% DE ATRASO/ADELANTO	ACUMULADO
	62,07%		39,81%		-22,26%
	$ 3.289.034.268,29		$ 1.651.723.363,49		-$ 1.179.529.298,51


% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
Obras preliminares				100,00%	62,07%	39,81%	-22,26%
Localización y replanteo	2/12/2025	6/12/2025	4,00	0,13%	0,13%	0,12%	0,00%
Cerramiento provisional en tela verde	2/12/2025	27/12/2025	25,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%
Desmonte, retiro de teja existente, Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	17/05/2026	11/07/2026	55,00	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%
Demolición manual o mecanica de losas de placa en concreto espesor hasta E: 0.15M. Incluye cargue, transporte y botada de	7/12/2025	31/01/2026	55,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%
Demolicion manual de carcamo en concreto existente; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la	28/12/2025	31/01/2026	34,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%
Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe,	4/01/2026	17/01/2026	13,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%
Demolicion manual de muros existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	11/01/2026	31/01/2026	20,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
Retiro de estructura metalica existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	24/05/2026	20/06/2026	27,00	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
Cimentación							
Excavación manual de material comun de H: 0 - 2m, incluye transporte de material proveniente de la excavacion hasta sitio	11/01/2026	28/02/2026	48,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,00%
Suministro e instalación de Mortero de limpieza, E= 0.05 cm	16/02/2026	14/03/2026	26,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de ciclopeo (60% piedra y 40% concreto)	23/02/2026	13/03/2026	18,00	1,07%	1,07%	1,11%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa (3.000 psi) para vigas de cimientos, pilotes, Zapatas y otros elementos de cimientos	23/02/2026	10/04/2026	46,00	8,25%	8,25%	8,42%	0,00%
Suministro e instalación de concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) para muro de contención	2/03/2026	20/03/2026	18,00	1,36%	1,36%	1,36%	0,00%
suministro e instalacion de subbase granular debidamente compactado; al 90% del proctor modificado	2/03/2026	17/04/2026	46,00	2,42%	2,42%	2,42%	0,00%
transporte e instalacion de material (de prestamo) seleccionado	10/03/2026	5/04/2026	26,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
Estructuras en concreto, acero, mamposteria, acabados y carpinteria metálica							
Suministro e instalación de acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para Columnas, vigas, muros de contencion, gradas y otros	2/02/2026	30/03/2026	56,00	7,61%	7,61%	7,00%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para escalas de graderias, vigas cintas y otros elementos de la	23/02/2026	18/03/2026	23,00	1,68%	1,68%	1,36%	0,00%
Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI, para placas de piso e=10 cm, curado, suministro y transporte de los materiales, mano	17/02/2026	21/03/2026	32,00	3,57%	3,57%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso e=10 cms.	2/03/2026	21/03/2026	19,00	1,44%	1,44%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tuberia de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18	23/03/2026	24/04/2026	32,00	0,74%	0,74%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tuberia HG de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18 y h: 0.95m, Incluye anticorrosivo y pintura, perforacion en elemento de concreto	29/03/2026	24/04/2026	26,00	0,84%	0,84%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tuberia estructural metalica, rectangular 76,2*38*1,5mm (Hxbxesp), 4,2m x	5/03/2026	21/03/2026	16,00	2,58%	2,58%	0,00%	0,00%
Muro dovelado para cerramiento permanente en bloque de	27/03/2026	23/05/2026	57,00	2,28%	2,28%	0,00%	0,00%
Muro dovelado divisorio en bloque de concreto de 12x20x40,	22/03/2026	2/05/2026	41,00	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento metalico TIPO LAMINA SCREEN PANEL. (*según plano*), Incluye corte,	26/04/2026	16/05/2026	20,00	2,39%	2,39%	0,00%	0,00%
Placa maciza en concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) con espesor E: 0.15m; incluye formaleta, vidrio y todo lo necesario para su	19/04/2026	15/05/2026	26,00	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de mortero 1:5 para revoque de muros; Incluye filetes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,63%	0,63%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de paredes de baños; Incluye filetes, pega , emboquillado y todo lo	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,23%	0,23%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de piso de baños (donde aplique); Incluye filetes, pega	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta en madera entomborada 0.8 x 2.05 m para baños; Incluye ala, marco, bisagras, chapa y todo lo	6/06/2026	13/06/2026	7,00	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta batiente metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1 x 2.05 m para bodega; Incluye ala,	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta corrediza metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1.03 x 2.05 m para curto util y acceso a	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación ventana en alumino 50-20 blanco de 60x40 y vidrio transparente 4mm; Incluye sistema de seguridad y	11/04/2026	25/04/2026	14,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de pasamanos abatible en tuberia de	19/04/2026	23/05/2026	34,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable de 45cm x 80 cm en calibre 20 satinado TIPO SOCODA para division	17/05/2026	23/05/2026	6,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Incluye Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica según diseño estructural	17/05/2026	6/06/2026	20,00	4,17%	3,74%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de fachada en persiana o celosia traslucida 3mm de policarbonato tipo aerolux o similar con	21/06/2026	11/07/2026	20,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Redes Hidrosanitarias y aparatos sanitarios							
Suministro, transporte e instalación de baterías de baño Suministro, transporte e instalación de baterías de baño Sumin Su	22/03/2026	16/05/2026	55,00	0,54%	0,54%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de codos 45° en tuberia PVC	22/03/2026	25/04/2026	34,00	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%


Suministro e instalacion de tuberia PVC DN 200 (8")	12/04/2026	16/05/2026	34,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tragante 8x6" de cúpula plastica o metalica	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Yee de 6"	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 4". Incluye union, codos, accesorios, cemento de pegar E: 0.05 M de	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 2". Incluye union, codos, accesorios, cemento de pegar E: 0.05 M de	23/03/2026	11/04/2026	19,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 4". Incluye sifon, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 2". Incluye sifon, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de sanitario redondo linea push	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de lavamanos con pedestal TIPO AMERICANO DE CORONA. Incluye grifería y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de orinal en porcelana con grifería ajustable cromada de bronce modo TIPO AMERICANO DE CORONA. Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Incrustaciones cromadas . Incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	31/05/2026	20/06/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso central metalica cromada antiolor cuadrada 10x10. Incluye accesorios de	14/06/2026	4/07/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D= 4". Incluye union, codos, accesorios, cemento de pegar E: 0.05 M de	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D= 1/2". Incluye union, codos, accesorios, cemento de pegar E: 0.05 M	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto hidraulico de 1/2". Incluye, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	6/07/2026	24/07/2026	18,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion valvula bola PVC 1/2" lisa soldable.	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro e instalacion de tapa registro 15x15	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 60x60cm	19/04/2026	3/05/2026	14,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 80x80cm	20/04/2026	9/05/2026	19,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Cubiertas e impermeabilizaciones							
Suministro e instalación de Teja UPVC (policloruto de vinilo no plastificado de alta resistencia a 7 años de exposición	5/07/2026	1/08/2026	27,00	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de canoa metálica. Se incluye aplicación de anticorrosivo y pintura y todo lo necesario para su	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalaciones Redes Electricas							
suministro transporte e instalcion de luminaria de 10477 lumenes 100W 240V para iluminacion de cancha	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida para iluminacion, incluye caja y todo lo necesario para su correcto instalacion	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tablero de iluminación de fabricacion especial de 10 CTOS, de distribución para circuitos ramales de	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tablero de medida en energía normal según diagrama unifilar, en lamina colled rolled calibre 16, pintura electrostatica, en 3Ø 3H 3F, incluye flipeones, aplicion, puesta a	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #8 bifásico con tierra para alimentación de tablero TN-CUS AWG-AWG-AWG, Incl	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 bifásico con tierra para alimentación de circuitos ramales 2N12+1N12 AWG, lo	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC canalizada de 2" incluye excavacion	15/03/2026	11/04/2026	27,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 3/4" la cual incluye todo lo necesario para su correcto funcionamineto	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1/2" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #6 bifásico con tierra	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 monofásico con	11/07/2026	18/07/2026	7,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida de potencia normal,	12/07/2026	25/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de luminaria led tipo proyector para	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de luminaria de ojo buey de 18	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de punta captadora 16mmx 100 cm	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Tub IMC Ø1"x3m (Bajantes)	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Caja ratwell métalica4x4 la cual incluye	12/07/2026	1/08/2026	13,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de CONECTOR BIMETALICO	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de alamborn de aluminio 2/0. Para anillo soportes tipo obo para autosoportar el anillo superiror lo cual incluye todo lo necesario para su correcta instalación	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	5/07/2026	1/08/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm	5/07/2026	18/07/2026	27,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA. AEREA 2F	12/07/2026	8/08/2026	13,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE VARILLA 5/8"	12/07/2026	1/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE	5/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO RAMAL 2X12(F)	26/07/2026	15/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE	5/07/2026	1/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE	5/07/2026	25/07/2026	27,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 VOLTIOS EN EMT Ø 3/4" CON	5/07/2026	18/07/2026	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA EMT 1/2"	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMÉTICA	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Pintura y Demarcacion de Elementos			13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de *pintura acrilica antideslizante para*	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Estuco plastico (dos manos) sobre	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 dos manos (color a	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacion			1 día				
suministro e instalacion de asiento sin espaldar para graderias			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de porterias integradas de futbol y	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de bancas para equipos REFERENCIA	5/07/2026	15/08/2026	41,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA PAISAJISMO	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de PISO ENCAUCHETADO en lamina de	5/07/2026	8/08/2026	34,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de marcador electronico led deportivo digital	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria Cerramiento							
Construcción de mampostería en ladrillo tipo bocadillo a la vista			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso en madera							
Suministro e instalacion de piso plastico negro calibre 6 tableros OSB pretegidos con capara asfaltica (proteccion antihumedad)	5/07/2026	8/08/2026	34,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%
OE							
Demolición de concreto reforzado h>15 cm, incluye el traslado interno en obra a la zona de cargue, y cargue final y disposición de material	22/02/2026	28/03/2026	34,00	0,65%	0,65%	0,58%	0,07%
Excavación manual de material común de H: 2 - 4 m, incluye el traslado	22/02/2026	4/04/2026	41,00	1,75%	1,75%	0,99%	0,76%
Excavación mecanica y manual de material de lleno con rocas,	22/02/2026	4/04/2026	41,00	2,76%	2,76%	2,76%	0,00%
Mamposteria estructural de 0- 2 m de altura	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 2 - 4 m de altura	26/04/2026	9/05/2026	13,00	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 4 - 6 m de altura	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Caisson de 1 metro efectivo de ancho, incluye refuerzo de acero, excavacion D=1,2 en material comun	1/03/2026	18/04/2026	48,00	5,48%	5,15%	7,40%	-2,25%
Suministro e instalación de tuberia de 4" para manejo provisional de agua	1/03/2026	7/03/2026	6,00	0,06%	0,00%	0,05%	-0,05%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 200 mm (8")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,23%	0,10%	0,00%	0,10%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 250 mm (10")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,14%	0,10%	0,00%	0,10%
Suministro e instalación de techo provisional en plastico y guadua	22/02/2026	14/03/2026	20,00	0,22%	0,12%	0,18%	-0,06%
Lleno con afirmado compactado manual debidamente compactado; al 90% del proctor modificado de maximas de 15cm	8/02/2026	4/04/2026	55,00	3,81%	3,00%	3,43%	-0,43%
Demolición de concreto reforzado y roca dentro de caisson, incluye trasiego en sitio de obra y cargue final y disposición de material	1/03/2026	4/04/2026	34,00	0,50%	0,10%	0,42%	-0,32%
Suministro transporte e instalación de Acero estructural HSS para elementos de cubierta según diseño ASTM A500, A572, A992, A53, A106, de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica, andamio certificado	17/05/2026	20/06/2026	34,00	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de caja de inspección de 80x80x 2 m de altura	12/04/2026	25/04/2026	13,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETIE	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETILAP	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
PAGA	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,81%	0,50%	0,08%	0,42%
PMT	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,52%	0,20%	0,05%	0,15%
TOTAL					**62,07%**	**39,81%**	**-22,26%**


3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: | **VISTA DE LA OBRA**

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
Juan Pablo Villa Roldan	Directora de Interventoria	250
Johan Lopez	Residente de Interventoria	250
Luis H Henao	Inspectora de Interventoria	208
Lina Blanquicet	Profesional SST	250
Nota:	Lo correspondiente a los profesionales especialistas debido a la dedicación del proyecto presentaran ordenes de servicio y se adjuntará la planilla de seguridad social perteneciente a cada periodo.	
ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	
0	N/A Para el presente Periodo	

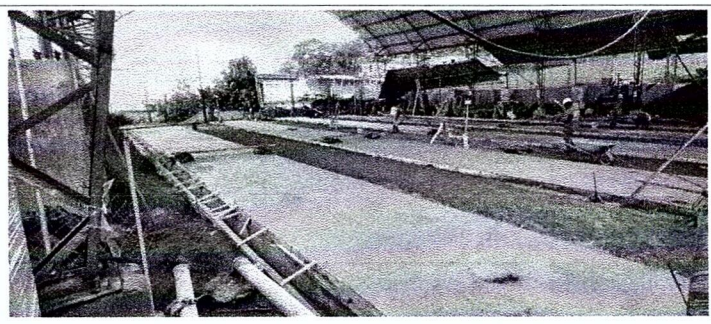


4. CURVA DE AVANCE









En la semana DEL PRESENTE INFORME comprendida del 13 AL 19 DE JULIO, el porcentaje programado acumulado en dicho periodo corresponde al 62,07% SEGÚN ultima REPROGRAMACION y el porcentaje ejecutado acumulado del mes es del 39,81%. Ya se presenta atraso conforme a la reporgramacion en tregad el mes de mayo, se ha solicitado un balance de obra final y conforme este, presentar una nueva programación del proyecto.

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SEMANA 33 - DEL	13 de julio de 2026	AL	19 de julio de 2026

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal

SITUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS EN LA SEMANA

en el transcurso de la semana Se solicita nuevamente al contratista entregar urgentemente ajuste al plan de contingencia debido a que van 6 meses dias de obra y el porcentaje es muy poco de ejecucion, en la actualizacion de la ultima reprogramacion se ve ya un atraso de obra pero analizando los frentes de obra en campo y avance no se culminaria la obra el dia 1 de septiembre de 2026, por lo tanto es urgente la aplicacion de este plan.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ATRASO/ADELANTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA:

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

se solicita al mpio presentar otro si a la interventoria para actualizacion de las polizas solicitadas por el ministerio, se reitero existio un error en al formulacion del contratoy la poliza de calidad de servicio es de 5 años como lo indican los pliegos. sigue pendiente este tema

Se realizo comite de obra el dia jueves 21 de mayo quedaron varias tareas de parte de la administracion, como lo son definir el microperforado, pisos, y microperforado de terminacion sobre cerco cdi.

REPORTE DE ACTIVIDADES SISOMA

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

para poder cumplir el plan de contingencia es necesario ingresar mas personal en obra, muy poco personal esta seman ahya 4 trabajadores menos. No se hizo nunguna fundicion de concreto esta actividad es necesario para renddimientos del plan de contingencia, se envia oficio 26 en el cual hay temas importantes por resolver, hubo comision topografica en obra y los resultados no fueon los esperados referentes alos ejes de los pedestales, se necesita correcion urgente de parte del calculista.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en (Lugar), a los

Diecinueve	(19)	días del mes de	JULIO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes)		(Año)

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:

Firma:

Nombre: **JUAN PABLO VILLA ROLDAN**

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALMA Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN SAS

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Elaboró: Grupo de Trabajo de la Interventoría

Original: Mindeporte
1era copia : Interventor
2da copia : Supervisor Ente Territorial

PROCESO:		Versión: 1
FORMATO:	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-046
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 12/06/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 32 **DEL** lunes, 06 de julio de 2026 **AL** domingo, 12 de julio de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 243,00

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 74

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE MINDEPORTE: ADRIANA HERNANDEZ

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

BARRIO/VEREDA: ZONA URBANA

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA: EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
Contrato No.	SA –SF 007 DE 2025
Tiempo Inicial (meses)	3,5
Valor Inicial:	$ 251.232.445,98
Valor anticipo :(si aplica)	N-A
Valor adición(es) MinDeporte:	N-A
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N-A
Valor Actualizado:	$ 251.232.445,98
Valor pagado:	$ 125.616.222,99
Saldo por pagar:	$ 125.616.222,99
Plazo Inicial (dias):	105 dias
Fecha de Inicio:	martes, 11 de noviembre de 2025
Prorroga 1	7 meses
Plazo despues de prorroga	315 dias
Fecha de Terminación Actualizada	jueves, 24 de septiembre de 2026
Días Transcurridos	243,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONCORCIO GRUPACK CIVIL
Contrato No.	LP–SF 002 DE 2025
Tiempo (meses)	3
Valor Inicial:	$ 4.148.926.956,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A.
Valor adición(es) MinDeporte:	N/A.
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N/A.
Valor Actualizado:	$ 4.148.926.956,00
Valor pagado:	$ 886.407.845,00
Saldo por pagar:	$ 3.262.519.111,00
Plazo Inicial (dias):	90 dias
Fecha de Inicio:	martes, 02 de diciembre de 2025
Prorroga 1	6 meses
Plazo despues de prorroga	270 dias
Fecha de Terminación Actualizada	1 de septiembre de 2026
Días Transcurridos	222

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO
	59,38%
	$ 3.146.496.055,24

% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO
	38,45%
	$ 1.595.297.956,89

% DE ATRASO/ADELANTO	ACUMULADO
	-20,93%
	-$ 1.109.055.014,74

% DE AVANCE OBRA


CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
Obras preliminares				100,00%	59,38%	38,45%	-20,93%
Localización y replanteo	2/12/2025	6/12/2025	4,00	0,13%	0,13%	0,12%	0,00%
Cerramiento provisional en tela verde	2/12/2025	27/12/2025	25,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%
Desmonte, retiro de teja existente, Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	17/05/2026	11/07/2026	55,00	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%
Demolición manual o mecanica de losas de placa en concreto espesor hasta E: 0.15M. Incluye cargue, transporte y botada de	7/12/2025	31/01/2026	55,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%
Demolicion manual de carcamo en concreto existente; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la	28/12/2025	31/01/2026	34,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%
Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe,	4/01/2026	17/01/2026	13,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%
Demolicion manual de muros existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	11/01/2026	31/01/2026	20,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
Retiro de estructura metalica existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	24/05/2026	20/06/2026	27,00	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
Cimentación							
Excavación manual de material comun de H: 0 - 2m, incluye transporte de material proveniente de la excavacion hasta sitio	11/01/2026	28/02/2026	48,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,00%
Suministro e instalación de Mortero de limpieza, E= 0.05 cm	16/02/2026	14/03/2026	26,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de ciclopeo (60% piedra y 40% concreto)	23/02/2026	13/03/2026	18,00	1,07%	1,07%	1,11%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa (3.000 psi) para vigas de cimientos, pilotes, Zapatas y otros elementos de cimientos	23/02/2026	10/04/2026	46,00	8,25%	8,25%	8,42%	0,00%
Suministro e instalación de concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) para muro de contención	2/03/2026	20/03/2026	18,00	1,36%	1,36%	1,36%	0,00%
suministro e instalacion de subbase granular debidamente compactado; al 90% del proctor modificado	2/03/2026	17/04/2026	46,00	2,42%	2,42%	2,42%	0,00%
transporte e instalacion de material (de prestamo) seleccionado	10/03/2026	5/04/2026	26,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
Estructuras en concreto, acero, mampostería, acabados y carpintería metálica							
Suministro e instalación de acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para Columnas, vigas, muros de contencion, gradas y otros	2/02/2026	30/03/2026	56,00	7,61%	7,61%	7,00%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para escalas de graderías, vigas cintas y otros elementos de la	23/02/2026	18/03/2026	23,00	1,68%	1,68%	0,00%	0,00%
Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI, para placas de piso e=10 cm, curado, suministro y transporte de los materiales, mano	17/02/2026	21/03/2026	32,00	3,57%	3,57%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso e=10 cms.	2/03/2026	21/03/2026	19,00	1,44%	1,44%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tubería de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18	23/03/2026	24/04/2026	32,00	0,74%	0,74%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubería HG de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18 y h: 0.95m, Incluye anticorrosivo y pintura, perforacion en elemento de concreto	29/03/2026	24/04/2026	26,00	0,84%	0,84%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tubería	5/03/2026	21/03/2026	16,00	2,58%	2,58%	0,00%	0,00%
Muro dovelado para cerramiento permanente en bloque de	27/03/2026	23/05/2026	57,00	2,28%	2,28%	0,00%	0,00%
Muro dovelado divisorio en bloque de concreto de 12x20x40,	22/03/2026	2/05/2026	41,00	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento metalico TIPO LAMINA SCREEN PANEL, (*según plano*), Incluye corte,	26/04/2026	16/05/2026	20,00	2,39%	2,39%	0,00%	0,00%
Placa maciza en concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) con espesor E: 0.15m, incluye formaleta, vidrado y todo lo necesario para su	19/04/2026	15/05/2026	26,00	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de mortero 1:5 para revoque de muros; Incluye filetes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,63%	0,63%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de paredes de baños; Incluye filetes, pega, emboquillado y todo lo	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,23%	0,23%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de piso de baños (*Antideslizante*); Incluye filetes, pega,	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta en madera entomborada 0.8 x 2.05 m para baños; Incluye ala, marco, bisagras, chapa y todo lo	6/06/2026	13/06/2026	7,00	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta batiente metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1 x 2.05 m para bodega; Incluye ala,	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta corrediza metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1.03 x 2.05 m para curto util y acces a	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación ventana en alumino 50-20 blanco de 60x40 en vidrio transparente 4mm; Incluye sistema de seguridad, y	11/04/2026	25/04/2026	14,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de pasamanos abatible en tuberia de	19/04/2026	23/05/2026	34,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable de 45cm x 80 cm en calibre 20 satinado TIPO SOCODA para division	17/05/2026	23/05/2026	6,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Incluye	17/05/2026	6/06/2026	20,00	4,17%	1,05%	0,00%	0,00%
Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica según diseño estructural	21/06/2026	11/07/2026	20,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de fachada en persiana o celosia traslucida 3mm de policarbonato tipo aerolux o similar con							
Redes Hidrosanitarias y aparatos sanitarios							
Suministro, transporte e	Suministro, transporte e	Sumin Su		0,54%	0,54%	0,00%	0,00%


Suministro, transporte e instalación de codos 45° en tubería PVC D=6"	22/03/2026	25/04/2026	34,00	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tuberia PVC DN 200 (8")	12/04/2026	16/05/2026	34,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tragante 6x6" de cúpula plastico o metalico	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Yee de 6"	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 4" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0.05 M de	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 2" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0.05 M de	23/03/2026	11/04/2026	19,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 4". Incluye sifon, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 2". Incluye sifon, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de sanitario redondo linea push	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de lavamanos con pedestal TIPO MILANO DE CORONA , incluye grifería y todo lo	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de orinal en porcelana con grifería sanitaria accionado de bajo precio TIPO ARRECIFE DE	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Incrustaciones cromadas , incluye accesorios de fijacion y todo lo necesario para su	31/05/2026	20/06/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso central metalica antiarco antichispa cuadrada 15x15 , incluye accesorios de	14/06/2026	4/07/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D= 4" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0.05 M de	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D= 1/2" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0.05 M	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto hidraulico de 1/2". Incluye, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	6/07/2026	24/07/2026	18,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion valvula bola PVC 1/2" lisa soldable.	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro e instalacion de tapa registro 15x15	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 60x60cm	19/04/2026	3/05/2026	14,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 80x80cm	20/04/2026	9/05/2026	19,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Cubiertas e impermeabilizaciones							
Suministro e instalación de Teja UPVC (policlorulo de vinilo no plastificado) de alta resistencia Termoacustica 2 mm de espesor,	5/07/2026	1/08/2026	27,00	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de canoa metálica. Se incluye	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalaciones Redes Electricas							
suministro transporte e instalcion de luminaria de 10477 lumenes 100W 240V para iluminacion de cubierta	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida para iluminacion, incluye caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tablero de iluminación de fabricacion especial de 10 CTOS , de distribución para circuitos ramales de	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tablero de medida en energía normal según diagrama unifilar, en lamina colled rolled calibre 16, pintura electrostática ral 7032/35 , incluye fijaciones, anclajes, puesta a	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #8 bifásico con tierra para alimentación de circuitos ramales 2N12+1N12 AWG, lo	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 bifásico con tierra para alimentación de circuitos ramales 2N12+1N12 AWG, lo cual incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC canalizada de 2" incluye excavación	15/03/2026	11/04/2026	27,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 3/4" la cual incluye todo lo necesario para su correcto funcionamineto	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1/2" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #6 bifásico con tierra	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 monofásico con	11/07/2026	18/07/2026	7,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida de potencia normal,	12/07/2026	25/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de luminaria led tipo proyector para	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de luminaria de ojo buey de 18	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de punta captadora 16mmx 100 cm	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Tub IMC Ø1"x3m (Bajantes)	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Caja ratwell métalica4x4 la cual incluye	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de CONECTOR BIMETALICO	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de alamborn de aluminio 2/0. Para anillo	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
soportes tipo obo para autosoportar el anillo superior lo cual incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA. AEREA 2F	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE VARILLA 5/8"	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO RAMAL 2X12(F)	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 VOLTIOS EN EMT Ø 3/4" CON	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA EMT 1/2"	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMÉTICA	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Pintura y Demarcacion de Elementos							
Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de *pintura acrílica antideslizante para*	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Estuco plastico (dos manos) sobre	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 dos manos (color a	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacion			1 día				
suministro e instalacion de asiento sin espaldar para graderias			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de porterias integradas de futbol y	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de bancas para equipos REFERENCIA	5/07/2026	15/08/2026	41,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA PAISAJISMO	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de PISO ENCAUCHETADO en lamina de	5/07/2026	8/08/2026	34,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de marcador electronico led deportivo digital	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria Cerramiento							
Construcción de mampostería en ladrillo tipo bocadillo a la vista			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso en madera							
Suministro e instalacion de piso plastico negro calibre 6 tableros OSB pretegidos con capara asfaltica (proteccion antihumedad)	5/07/2026	8/08/2026	34,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%
OE							
Demolición de concreto reforzado h>15 cm, incluye el traslado interno en obra a la zona de cargue, y cargue final y disposición de material	22/02/2026	28/03/2026	34,00	0,65%	0,65%	0,58%	0,07%
Excavación manual de material común de H: 2 - 4 m, incluye el traslado	22/02/2026	4/04/2026	41,00	1,75%	1,75%	0,99%	0,76%
Excavación mecanica y manual de material de lleno con rocas,	22/02/2026	4/04/2026	41,00	2,76%	2,76%	2,76%	0,00%
Mamposteria estructural de 0- 2 m de altura	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 2 - 4 m de altura	26/04/2026	9/05/2026	13,00	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 4 - 6 m de altura	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Caisson de 1 metro efectivo de ancho, incluye refuerzo de acero, excavacion D=1,2 en material comun	1/03/2026	18/04/2026	48,00	5,48%	5,15%	7,40%	-2,25%
Suministro e instalación de tuberia de 4" para manejo provisional de agua	1/03/2026	7/03/2026	6,00	0,06%	0,00%	0,05%	-0,05%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 200 mm (8")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,23%	0,10%	0,00%	0,10%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 250 mm (10")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,14%	0,10%	0,00%	0,10%
Suministro e instalación de techo provisional en plastico y guadua	22/02/2026	14/03/2026	20,00	0,22%	0,12%	0,18%	-0,06%
Lleno con afirmado compactado manual debidamente compactado; al 90% del proctor modificado capas de maximas de 15cm	8/02/2026	4/04/2026	55,00	3,81%	3,00%	3,43%	-0,43%
Demolición de concreto reforzado y roca dentro de caisson, incluye traslego en sitio de obra y cargue final y disposición de material	1/03/2026	4/04/2026	34,00	0,50%	0,10%	0,42%	-0,32%
Suministro transporte e instalación de Acero estructural HSS para elementos de cubierta según diseño ASTM A500, A572, A992, A53, A106, de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica, andamio certificado	17/05/2026	20/06/2026	34,00	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de caja de inspección de 80x80x 2 m de altura	12/04/2026	25/04/2026	13,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETIE	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETILAP	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
PAGA	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,81%	0,50%	0,08%	0,42%
PMT	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,52%	0,20%	0,05%	0,15%
TOTAL					**59,38%**	**38,45%**	**-20,93%**

3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:


PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
Juan Pablo Villa Roldan	Directora de Interventoría	243
Johan Lopez	Residente de Interventoría	243
Luis H Henao	Inspectora de Interventoría	201
Lina Blanquicet	Profesional SST	243
Nota:	Lo correspondiente a los profesionales especialistas debido a la dedicación del proyecto presentaran ordenes de servicio y se adjuntará la planilla de seguridad social perteneciente a cada periodo.	
ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	
0	N/A Para el presente Periodo	


VISTA DE LA OBRA

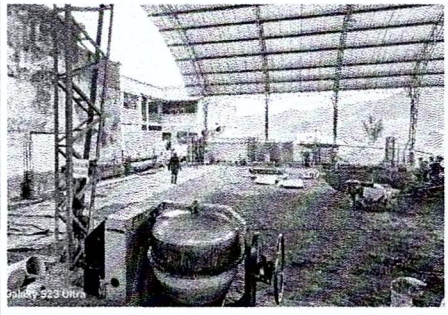


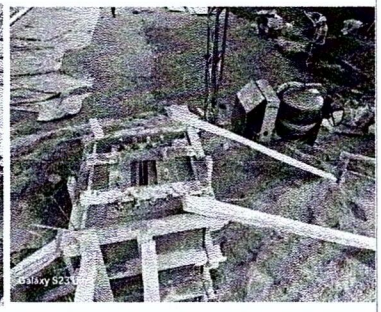


4. CURVA DE AVANCE









En la semana DEL PRESENTE INFORME comprendida del 06 AL 12 DE JULIO, el porcentaje programado acumulado en dicho periodo corresponde al 59,36% SEGÚN ultima REPROGRAMACION y el porcentaje ejecutado acumulado del mes es del 38,45%. Ya se presenta atraso conforme a la reporgramacion en tregad el mes de mayo, se ha solicitado un balance de obra final y conforme este, presentar una nueva programación del proyecto.

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SEMANA 32 - DEL	**6 de julio de 2026**	**AL**	**12 de julio de 2026**

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal

SITUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS EN LA SEMANA

en el transcurso de la semana Se solicita nuevamente al contratista entregar urgentemente ajuste al plan de contingencia debido a que van 6 meses dias de obra y el porcentaje es muy poco de ejecucion, en la actualizacion de la ultima reprogramacion se ve ya un atraso de obra pero analizando los frentes de obra en campo y avance no se culminaria la obra el dia 1 de septiembre de 2026, por lo tanto es urgente la aplicacion de este plan.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ATRASO/ADELANTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA:

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

se solicita al mpio presentar otro si a la interventoria para actualizacion de las polizas solicitadas por el ministerio, se reitero existio un error en al formulacion del contratoy la poliza de calidad de servicio es de 5 años como lo indican los pliegos. sigue pendiente este tema

Se realizo comite de obra el dia jueves 21 de mayo quedaron varias tareas de parte de la administracion, como lo son definir el microperforado, pisos, y microperforado de terminacion sobre cerco cdi.

REPORTE DE ACTIVIDADES SISOMA

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

para poder cumplir el plan de contingencia es necesario ingresar mas personal en obra, muy poco personal esta seman ahya 4 trabajadores menos. No se hizo nunguna fundicion de concreto esta actividad es necesario para renddimientos del plan de contingencia, se envia oficio 26 en el cual hay temas importantes por resolver, hubo comision topografica en obra y los resultados no fueon los esperados referentes alos ejes de los pedestales, se necesita correcion urgente de parte del calculista.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en (Lugar), a los

Doce	(12)	días del mes de	JULIO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes)		(Año)

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:

Original: Mindeporte
1era copia : Interventor
2da copia : Supervisor Ente Territorial

Firma:
Nombre: **JUAN PABLO VILLA ROLDAN**
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALMA Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN SAS
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Elaboró: Grupo de Trabajo de la Interventoría

PROCESO:		Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-046
FORMATO:	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 5/07/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 31 **DEL** lunes, 29 de junio de 2026 **AL** domingo, 05 de julio de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 236,00 **MUNICIPIO:** SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 81 **DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA** **BARRIO/VEREDA: ZONA URBANA**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHAN BECHARA
INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:	EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	
Contrato No.	SA –SF 007 DE 2025	
Tiempo inicial (meses)		3,5
Valor Inicial:		$ 251.232.445,98
Valor anticipo :(si aplica)	N-A	
Valor adición(es) MinDeporte:	N-A	
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N-A	
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N-A	
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N-A	
Valor Actualizado:	$	251.232.445,98
Valor pagado:	$	188.424.334,49
Saldo por pagar:	$	62.808.111,50
Plazo Inicial (dias):		105 dias
Fecha de Inicio:		martes, 11 de noviembre de 2025
Prorroga 1		7 meses
Plazo despues de prorroga		315 dias
Fecha de Terminación Actualizada		jueves, 24 de septiembre de 2026
Dias Transcurridos		236,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONCORCIO GRUPACK CIVIL	
Contrato No.	LP–SF 002 DE 2025	
Tiempo (meses)	3	
Valor Inicial:	$	4.148.926.956,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A.	
Valor adición(es) MinDeporte:	N/A.	
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N/A.	
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N/A.	
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N/A.	
Valor Actualizado:	$	4.148.926.956,00
Valor pagado:	$	1.418.441.381,00
Saldo por pagar:	$	2.730.485.575,00
Plazo Inicial (dias):	90 dias	
Fecha de Inicio:	martes, 02 de diciembre de 2025	
Prorroga 1	6 meses	
Plazo despues de prorroga	270 dias	
Fecha de Terminación Actualizada	1 de septiembre de 2026	
Dias Transcurridos	215	

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO
	56,67%
	$ 2.351.196.905,97

% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO
	37,80%
	$ 1.568.294.389,37

% DE ATRASO/ADELANTO	ACUMULADO
	-18,87%
	-$ 999.887.018,68

% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
Obras preliminares				100,00%	56,67%	37,80%	-18,87%
Localización y replanteo	2/12/2025	6/12/2025	4,00	0,13%	0,13%	0,12%	0,00%
Cerramiento provisional en tela verde	2/12/2025	27/12/2025	25,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%
Desmonte, retiro de teja existente, Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	17/05/2026	11/07/2026	55,00	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%
Demolición manual o mecanica de losas de placa en concreto espesor hasta E: 0.15M. Incluye cargue, transporte y botada de	7/12/2025	31/01/2026	55,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%
Demolicion manual de carcamo en concreto existente; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la	28/12/2025	31/01/2026	34,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%
Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe.	4/01/2026	17/01/2026	13,00	0,13%	0,13%	0,09%	0,00%
Demolicion manual de muros existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	11/01/2026	31/01/2026	20,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
Retiro de estructura metalica existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	24/05/2026	20/06/2026	27,00	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
Cimentación							
Excavación manual de material comun de H: 0 - 2m, incluye transporte de material proveniente de la excavacion hasta sitio	11/01/2026	28/02/2026	48,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,00%
Suministro e instalación de Mortero de limpieza, E= 0.05 cm	16/02/2026	14/03/2026	26,00	0,15%	0,32%	0,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de ciclopeo (60% piedra y 40% concreto)	23/02/2026	13/03/2026	18,00	1,07%	1,07%	1,11%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa (3.000 psi) para vigas de cimientos, pilotes, Zapatas y otros elementos de cimientos	23/02/2026	10/04/2026	46,00	8,25%	8,25%	7,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) para muro de contención	2/03/2026	20/03/2026	18,00	1,36%	1,36%	1,36%	0,00%
suministro e instalacion de subbase granular debidamente compactado; al 90% del proctor modificado	2/03/2026	17/04/2026	46,00	2,42%	2,42%	1,19%	0,00%
transporte e instalacion de material (de prestamo) seleccionado proveniente de la excavacion; debidamente compactado.	10/03/2026	5/04/2026	26,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
Estructuras en concreto, acero, mamposteria, acabados y carpinteria metálica							
Suministro e instalación de acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para Columnas, vigas, muros de contencion, gradas y otros	2/02/2026	30/03/2026	56,00	7,61%	6,50%	4,45%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para escalas de graderias, vigas cintas y otros elementos de la	23/02/2026	18/03/2026	23,00	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI, para placas de piso e=10 cm, curado, suministro y transporte de los materiales, mano	17/02/2026	21/03/2026	32,00	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso e=10 cms.	2/03/2026	21/03/2026	19,00	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tuberia de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18	23/03/2026	24/04/2026	32,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tuberia HG de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18 y h: 0.95m, Incluye anticorrosivo y pintura, perforacion en elemento de concreto	29/03/2026	24/04/2026	26,00	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tuberia	5/03/2026	21/03/2026	16,00	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado para cerramiento permanente en bloque de	27/03/2026	23/05/2026	57,00	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado divisorio en bloque de concreto de 12x20x40,	22/03/2026	2/05/2026	41,00	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento metalico TIPO LAMINA SCREEN PANEL, (*según plano*), Incluye corte,	26/04/2026	16/05/2026	20,00	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Placa maciza en concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) con espesor E: 0.15m; incluye formaleta, vidrado y todo lo necesario para su	19/04/2026	15/05/2026	26,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de mortero 1:5 para revoque de muros; Incluye filetes y todo lo necesario para su correcta instalacion	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de paredes de baños; Incluye filetes, pega, emboquillado y todo lo	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de piso de baños (Antideslizante); Incluye filetes, pega,	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta en madera entomborada 0.8 x 2.05 m para baños; Incluye ala, marco, bisagras, chapa y todo lo	6/06/2026	13/06/2026	7,00	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta batiente metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1 x 2.05 m para bodega; Incluye ala,	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta corrediza metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1.03 x 2.05 m para curto util y acces a	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación ventana en alumino 50-20 blanco de	11/04/2026	25/04/2026	14,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de pasamanos abatible en tuberia de	19/04/2026	23/05/2026	34,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable de 45cm x 80 cm en calibre 20 satinado TIPO SOCODA para division orinal; Incluye accesorios de fijacion, y todo lo necesario para su	17/05/2026	23/05/2026	6,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Incluye Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y	17/05/2026	6/06/2026	20,00	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%


Suministro, transporte y montaje de fachada en persiana o celosia traslucida 3mm de policarbonato tipo aerolux o similar con protección UV altura del panel 0.3m, con perfil de soporte lateral en	21/06/2026	11/07/2026	20,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Redes Hidrosanitarias y aparatos sanitarios							
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= Sumin Su	22/03/2026	16/05/2026	55,00	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de codos 45° en tuberia PVC D= 6"	22/03/2026	25/04/2026	34,00	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tuberia PVC DN 200 (8")	12/04/2026	16/05/2026	34,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tragante 8x6" de cúpula plastica o metalica	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Yee de 6"	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 4" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E: 0.05 M de	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 2" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E: 0.05 M de	23/03/2026	11/04/2026	19,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 4". Incluye sifon, union, codos, accesorios y	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 2". Incluye sifon, union, codos, accesorios y	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de sanitario redondo linea push	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de lavamanos con pedestal	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de orinal en porcelana con	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de incrustaciones cromadas .	31/05/2026	20/06/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso central	14/06/2026	4/07/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D= 4" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E: 0.05 M de	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D= 1/2" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E: 0.05 M	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto hidraulico de 1/2". Incluye, union, codos, accesorios y todo	6/07/2026	24/07/2026	18,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion valvula bola PVC 1/2" lisa soldable.	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro e instalacion de tapa registro 15x15	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 60x60cm	19/04/2026	3/05/2026	14,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 80x80cm	20/04/2026	9/05/2026	19,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Cubiertas e impermeabilizaciones							
Suministro e instalación de Teja UPVC (policlorulo de vinilo no	5/07/2026	1/08/2026	27,00	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de canoa metálica. Se incluye	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalaciones Redes Electricas							
suministro transporte e instalacion de luminaria de 10477 lumenes	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalacion de salida para iluminacion,	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tablero de iluminación de fabricacion	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tablero de medida en energía normal según diagrama unifilar, en lamina colled rolled calibre 18, pintura	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #8 bifásico con tierra	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 bifásico con tierra para alimentación de circuitos ramales 2N12+1N12 AWG, lo	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC canalizada de 2" incluye excavacion	15/03/2026	11/04/2026	27,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 3/4" la cual incluye todo lo necesario para su correcto funcionamineto	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1/2" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #6 bifásico con tierra	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 monofásico con	11/07/2026	18/07/2026	7,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida de potencia normal,	12/07/2026	25/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de luminaria led tipo proyector para	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de luminaria de ojo buey de 18	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de punta captadora 16mmx 100 cm	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Tub IMC Ø1"x3m (Bajantes)	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Caja ratwell métalica4x4 la cual incluye	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de CONECTOR BIMETALICO	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de alamborn de aluminio 2/0. Para anillo	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
soportes tipo obo para autosoportar el anillo superiror lo cual incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA. AEREA 2F	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE VARILLA 5/8"	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO RAMAL 2X12(F)	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 VOLTIOS EN EMT Ø 3/4" CON	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA EMT 1/2"	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMÉTICA	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Pintura y Demarcacion de Elementos							
Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de *pintura acrilica antideslizante para*	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Estuco plastico (dos manos) sobre	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 dos manos (color a	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacion			1 día				
suministro e instalacion de asiento sin espaldar para graderias			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de porterias integradas de futbol y	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de bancas para equipos REFERENCIA	5/07/2026	15/08/2026	41,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA PAISAJISMO	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de PISO ENCAUCHETADO en lamina de	5/07/2026	8/08/2026	34,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de marcador electronico led deportivo digital	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria Cerramiento							
Construcción de mamposteria en ladrillo tipo bocadillo a la vista			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso en madera							
Suministro e instalacion de piso plastico negro calibre 6 tableros OSB pretegidos con capara asfaltica (proteccion antihumedad)	5/07/2026	8/08/2026	34,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%
OE							
Demolición de concreto reforzado h>15 cm, incluye el traslado interno en obra a la zona de cargue, y cargue final y disposición de material	22/02/2026	28/03/2026	34,00	0,65%	0,13%	0,58%	-0,45%
Excavación manual de material común de H: 2 - 4 m, incluye el traslado	22/02/2026	4/04/2026	41,00	1,75%	0,29%	0,99%	-0,70%
Excavación mecanica y manual de material de lleno con rocas,	22/02/2026	4/04/2026	41,00	2,76%	0,46%	2,76%	-2,30%
Mamposteria estructural de 0- 2 m de altura	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 2 - 4 m de altura	26/04/2026	9/05/2026	13,00	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 4 - 6 m de altura	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Caisson de 1 metro efectivo de ancho, incluye refuerzo de acero, excavacion D=1,2 en material comun	1/03/2026	18/04/2026	48,00	5,48%	0,00%	7,40%	-7,40%
Suministro e instalación de tubería de 4" para manejo provisional de agua	1/03/2026	7/03/2026	6,00	0,06%	0,00%	0,05%	-0,05%
Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 200 mm (8")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 250 mm (10")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de techo provisional en plastico y guadua	22/02/2026	14/03/2026	20,00	0,22%	0,07%	0,18%	-0,10%
Lleno con afirmado compactado manual debidamente compactado; al 90% del proctor modificado capas de maximas de 15cm	8/02/2026	4/04/2026	55,00	3,81%	1,43%	3,43%	-2,00%
Demolición de concreto reforzado y roca dentro de caisson, incluye trasiego en sitio de obra y cargue final y disposición de material	1/03/2026	4/04/2026	34,00	0,50%	0,00%	0,42%	-0,42%
Suministro transporte e instalación de Acero estructural HSS para elementos de cubierta según diseño ASTM A500, A572, A992, A53, A106, de acero al carbon de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica, andamio certificado	17/05/2026	20/06/2026	34,00	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de caja de inspección de 80x80x 2 m de altura	12/04/2026	25/04/2026	13,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%


CERTIFICACIÓN RETILAP	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
PAGA	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,81%	0,28%	0,08%	0,20%
PMT	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,52%	0,18%	0,05%	0,13%
TOTAL					**56,67%**	**37,80%**	**-18,87%**

3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:


PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
Juan Pablo Villa Roldan	Directora de Interventoria	236
Johan Lopez	Residente de Interventoria	236
Luis H Henao	Inspectora de Interventoria	194
Lina Blanquicet	Profesional SST	236
Nota:	Lo correspondiente a los profesionales especialistas debido a la dedicación del proyecto presentaran ordenes de servicio y se adjuntará la planilla de seguridad social perteneciente a cada periodo.	
ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	
0	N/A Para el presente Periodo	


VISTA DE LA OBRA

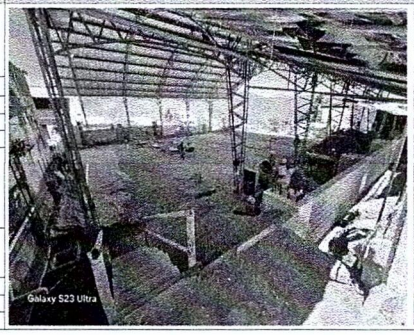


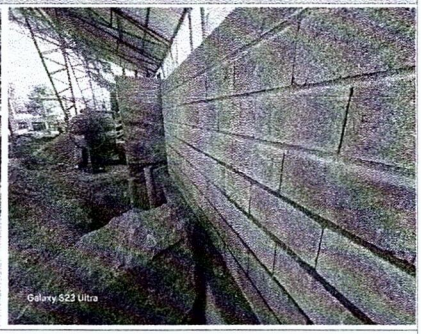


4. CURVA DE AVANCE









En la semana DEL PRESENTE INFORME comprendida del 29 junio AL 5 DE JULIO, el porcentaje programado acumulado en dicho periodo corresponde al 56.67% SEGÚN ultima REPROGRAMACION y el porcentaje ejecutado acumulado del mes es del 37.8%. ESTA SEMANA se presenta UN GRAN atraso 18.87% considerable a la reporgramacion entregada el mes de mayo. se esta avanzando en las obras del plan de contingencia MUY LENTAS Y POCOC AVANCE SE ESTA PRESENTANDO MUCHO ATRAZO EN ESTA ACTIVIDADpero las actividades en paparalelo a la reporgramacion estan generenado el retraso SE DEBE MEJORAR los rendimientos.

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SEMANA 31 - DEL	29 de junio de 2026	AL	5 de julio de 2026

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concreto PEDESTAL B3 - B4 - B5 - B6 y A2 - A3
- instalacion de tuberia de 10" novaford-MUY LENTO ESTA ACTIVIDAD NO SE COMPLETA RODAS LAS SEMANA DE A POCO

SITUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS EN LA SEMANA

MUCHO CAMBIO DE PERSONAL EL FIN DE SEMANA SALIEERON 3 OFICIALES NO HAY CONTINUIDAD SE HA GENERADO MUCHO RETROCESO EN OBRA, TODAS LAS SEMANAS HAY ESPERAR EL PERSONAL SE ACOMODE. SE SOLICITO POR ESCRITO EXPLICACION SOBRE EL TEMA Y RESOLVER LO MAS RAPIDO EN OBRA, SIGUE MUCHO DESORDEN EN CAMPO LA OBRA NO TIENE UN NORTE ESTABLECIDO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ATRASO/ADELANTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA:

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concreto PEDESTAL B3 - B4 - B5 - B6 y A2 - A3
- instalacion de tuberia de 10" novaford-MUY LENTO ESTA ACTIVIDAD NO SE COMPLETA RODAS LAS SEMANA DE A POCO

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

se ENTREGA OTRO SI PARA REVISION DE JURIDICO DE INTERVENTORIA, SE FIRMA Y SE ENTREGAN POLIZAS RESPCTIVAS, SE MONTA INFORMACION EN EL SECOP para actualizacion de las polizas solicitadas por el ministerio, se reitero existio un error en al formulacion del contrato y la poliza de calidad de servicio es de 5 años como lo indican los pliegos. sigue pendiente este tema

Se realizo comite de obra el dia MARTES 30 de junio quedaron varias tareas de parte de la administracion, Se presentaron algunos apus extras del nuebo bloque para ir cerrrando el tema financiero, no han sido aprobados debido alas grandes atrasoa en obra.

REPORTE DE ACTIVIDADES SISOMA

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

Se sigue solicitando mas personal para han cambiado en 1 semanas 3 oficiales nuevos y 2 ayudantes, no se ha podido avanzar el plan de contingencia, muy poco personal esta semana hay 5 trabajadores menos e ingresaron nuevos no tiene el animo necesario para las labores. solo se fundieron algunas y vigas y pedestales, es necesario incrementar el rendimiento de fundida de concretos, ya llegaron las platinas para parte superior de pedestal y es necesario la fundicion urgente de pedestales, se entrega diseños estructurales de la ampliacion pero son demaciado exagerados y se solicit auna modificacion urgente o cambio de diseñador. se sigue proceso de demolicion de seccion de bloque de CDI.
SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA NO ESTA INCUMPLIENDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA NI PROGRAMACION SE LE RECUERDAN SON DOS ACTIVIDADES DEBE IR PARALELAS el tazo segun programacion es demaciado.sigue muy igual a la semana pasada el avance muy poco significativo no hay fotos que mostra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en (Lugar), a los

cinco	(5)	días del mes de	julio	de	2026
(Dia en letras)	(Dia en números)		(Mes)		(Año)

Original: Mindeporte
1era copia : Interventor
2da copia : Supervisor Ente Territorial

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:

Firma:
Nombre: **JUAN PABLO VILLA ROLDAN**
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALMA Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN SAS
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Elaboró: Grupo de Trabajo de la Interventoría

PROCESO:	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
FORMATO:	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código: ATC-FR-046
		Fecha: 28/06/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 30 **DEL** lunes, 22 de junio de 2026 **AL** domingo, 28 de junio de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 229,00 **MUNICIPIO:** SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 88 **DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA** **BARRIO/VEREDA: ZONA URBANA**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHAN BECHARA
INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:	EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
Contrato No.	SA –SF 007 DE 2025
Tiempo inicial (meses)	3,5
Valor Inicial:	$ 251.232.445,98
Valor anticipo :(si aplica)	N-A
Valor adición(es) MinDeporte:	N-A
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N-A
Valor Actualizado:	$ 251.232.445,98
Valor pagado:	$ 188.424.334,49
Saldo por pagar:	$ 62.808.111,50
Plazo Inicial (dias):	105 dias
Fecha de Inicio:	martes, 11 de noviembre de 2025
Prorroga 1	7 meses
Plazo despues de prorroga	315 dias
Fecha de Terminación Actualizada	jueves, 24 de septiembre de 2026
Dias Transcurridos	229,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONCORCIO GRUPACK CIVIL
Contrato No.	LP–SF 002 DE 2025
Tiempo (meses)	3
Valor Inicial:	$ 4.148.926.956,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A.
Valor adición(es) MinDeporte:	N/A.
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N/A.
Valor Actualizado:	$ 4.148.926.956,00
Valor pagado:	$ 1.418.441.381,00
Saldo por pagar:	$ 2.730.485.575,00
Plazo Inicial (dias):	90 dias
Fecha de Inicio:	martes, 02 de diciembre de 2025
Prorroga 1	6 meses
Plazo despues de prorroga	270 dias
Fecha de Terminación Actualizada	1 de septiembre de 2026
Dias Transcurridos	208

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO
	53,52%
	$ 2.220.505.706,85

% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO
	36,25%
	$ 1.503.986.021,55

% DE ATRASO/ADELANTO	ACUMULADO
	-17,27%
	-$ 915.105.925,42

% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
Obras preliminares				100,00%	53,52%	36,25%	-17,27%
Localización y replanteo	2/12/2025	6/12/2025	4,00	0,13%	0,13%	0,12%	0,00%
Cerramiento provisional en tela verde	2/12/2025	27/12/2025	25,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%
Desmonte, retiro de teja existente, Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	17/05/2026	11/07/2026	55,00	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%
Demolición manual o mecanica de losas de placa en concreto espesor hasta E: 0.15M. Incluye cargue, transporte y botada de material hasta sitio autorizado por la interventoria	7/12/2025	31/01/2026	55,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%
Demolicion manual de carcamo en concreto existente; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria	28/12/2025	31/01/2026	34,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%
Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe,	4/01/2026	17/01/2026	13,00	0,13%	0,13%	0,09%	0,00%
Demolicion manual de muros existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	11/01/2026	31/01/2026	20,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
Retiro de estructura metalica existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	24/05/2026	20/06/2026	27,00	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
Cimentación							
Excavación manual de material comun de H: 0 - 2m, incluye transporte de material proveniente de la excavacion hasta sitio	11/01/2026	28/02/2026	48,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,00%
Suministro e instalación de Mortero de limpieza, E= 0.05 cm	16/02/2026	14/03/2026	26,00	0,15%	0,32%	0,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de ciclopeo (60% piedra y 40% concreto)	23/02/2026	13/03/2026	18,00	1,07%	1,07%	1,11%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa (3.000 psi) para vigas de cimientos, pilotes, Zapatas y otros elementos de cimientos	23/02/2026	10/04/2026	46,00	8,25%	8,25%	7,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) para muro de contención	2/03/2026	20/03/2026	18,00	1,36%	1,36%	1,36%	0,00%
suministro e instalacion de subbase granular debidamente compactado; al 90% del proctor modificado	2/03/2026	17/04/2026	46,00	2,42%	2,42%	1,19%	0,00%
transporte e instalacion de material (de prestamo) seleccionado proveniente de la excavacion; debidamente compactado.	10/03/2026	5/04/2026	26,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
Estructuras en concreto, acero, mamposteria, acabados y carpinteria metálica							
Suministro e instalación de acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para Columnas, vigas, muros de contencion, gradas y otros	2/02/2026	30/03/2026	56,00	7,61%	6,50%	4,45%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para escalas de graderias, vigas cintas y otros elementos de la	23/02/2026	18/03/2026	23,00	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI, para placas de piso e=10 cm, curado, suministro y transporte de los materiales, mano	17/02/2026	21/03/2026	32,00	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso e=10 cms	2/03/2026	21/03/2026	19,00	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tuberia de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18	23/03/2026	24/04/2026	32,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tuberia HG de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18 y h: 0.95m, Incluye anticorrosivo y pintura, perforacion en elemento de concreto	29/03/2026	24/04/2026	26,00	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tuberia estructural metalica, rectangular 76x38x1.5mm (largo= 1.2m y	5/03/2026	21/03/2026	16,00	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado para cerramiento permanente en bloque de	27/03/2026	23/05/2026	57,00	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado divisorio en bloque de concreto de 12x20x40,	22/03/2026	2/05/2026	41,00	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento metalico TIPO LAMINA SCREEN PANEL, (*según plano*), Incluye corte,	26/04/2026	16/05/2026	20,00	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Placa maciza en concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) con espesor E: 0.15m, incluye formaleta, vidrado y todo lo necesario para su	19/04/2026	15/05/2026	26,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de mortero 1:5 para revoque de muros; incluye filetes y todo lo necesario para su correcta instalacion	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de paredes de baños; Incluye filetes, pega , emboquillado y todo lo	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de piso de baños (Antideslizante) ; Incluye filetes, pega ,	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta en madera entomborada 0.8 x 2.05 m para baños; Incluye ala, marco, bisagras, chapa y todo lo	6/06/2026	13/06/2026	7,00	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta batiente metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1 x 2.05 m para bodega; Incluye ala,	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta corrediza metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1.03 x 2.05 m para curto util y acceso a	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación ventana en alumino 50-20 blanco de 60x40 y vidrio transparente 4mm; Incluye sistema de seguridad, y	11/04/2026	25/04/2026	14,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de pasamanos abatible en tuberia de	19/04/2026	23/05/2026	34,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable de 45cm x 80 cm en calibre 20 satinado TIPO SOCODA para division orinal, ; Incluye accesorios de fijacion y todo lo necesario para su	17/05/2026	23/05/2026	6,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%


Redes Hidrosanitarias y aparatos sanitarios							
Suministro, transporte e instalación de baterías sanitarias Suministro, transporte e instalación de baterías sanitarias Sumin Su	22/03/2026	16/05/2026	55,00	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de codos 45° en tubería PVC D= 6"	22/03/2026	25/04/2026	34,00	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tuberia PVC DN 200 (8")	12/04/2026	16/05/2026	34,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tragante 8x6" de cúpula plastica o metalica	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Yee de 6"	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 4" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0,05 M de	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 2" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0,05 M de	23/03/2026	11/04/2026	19,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 4". Incluye sifon, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 2". Incluye sifon, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de sanitario redondo linea push ahorrador TIPO SMART SINGLE DE CORONA . Incluye grifería y	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de lavamanos con pedestal TIPO MILANO DE CORONA . Incluye grifería y todo lo	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de orinal en porcelana con grifería ajustable empuste de 1/2pg media TIPO ARRECIFE DE	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Incrustaciones cromadas . Incluye de 6 pulgadas y todo lo necesario para su correcto	31/05/2026	20/06/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso central metálica galvanizada antiolor cuadrada 10x10 . Incluye accesorios de	14/06/2026	4/07/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D= 1" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0,05 M de	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D= 1/2" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0,05 M	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto hidraulico de 1/2". Incluye, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	6/07/2026	24/07/2026	18,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion valvula bola PVC 1/2" lisa soldable.	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro e instalacion de tapa registro 15x15	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 60x60cm	19/04/2026	3/05/2026	14,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 80x80cm	20/04/2026	9/05/2026	19,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Cubiertas e impermeabilizaciones							
Suministro e instalación de Teja UPVC (policlorulo de vinilo no plastificado) de alta resistencia Tejas onduline Tejas de 2,95 M de	5/07/2026	1/08/2026	27,00	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de canoa metálica. Se incluye aplicación de anticorrosivo y pintura y todo lo necesario para su	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalaciones Redes Electricas							
suministro transporte e instalacion de luminaria de 10477 lumenes 100W 240V para iluminacion de cancha	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalacion de salida para iluminacion, incluye suministro de tuberia conduit, cableado	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tablero de iluminación de fabricacion especial de 10 CTOS, de distribución para circuitos ramales de	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tablero de medida en energía normal según diagrama unifilar, en lamina colled rolled calibre 16, pintura electrostática ral 7032-25 , incluye Breakers , cableado, canaleta	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #8 bifásico con tierra para alimentación de tablero TN1-2N8+1N10 AWG, lo cual	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 bifásico con tierra para alimentación de circuitos ramales 2N12+1N12 AWG, lo	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC canalizada de 2" incluye excavacion	15/03/2026	11/04/2026	27,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 3/4" la cual incluye todo lo necesario para su correcto funcionamineto	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1/2" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalacion de tuberia emt 1" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #6 bifásico con tierra	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 monofásico con	11/07/2026	18/07/2026	7,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida de potencia normal.	12/07/2026	25/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de luminaria led tipo proyector para	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de luminaria de ojo buey de 18	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de punta captadora 16mmx 100 cm	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Tub IMC Ø1"x3m (Bajantes)	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Caja ratwell métalica4x4 la cual incluye	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de CONECTOR BIMETALICO	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de alamborn de aluminio 2/0. Para anillo	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
soportes tipo obo para autosoportar el anillo superiror lo cual incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Varila Copperweld de 5/8" por 2.40m	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA 2F	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE VARILLA 5/8"	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO RAMAL 2X12(F)	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 VOLTIOS EN EMT Ø 3/4" CON	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA EMT 1/2"	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMÉTICA	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Pintura y Demarcacion de Elementos							
Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de *pintura acrilica antideslizante para*	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Estuco plastico (dos manos) sobre	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 dos manos (color a	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacion			1 día				
suministro e instalacion de asiento sin espaldar para graderias			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de porterias integradas de futbol y	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de bancas para equipos REFERENCIA	5/07/2026	15/08/2026	41,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA PAISAJISMO	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de PISO ENCAUCHETADO en lamina de	5/07/2026	8/08/2026	34,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de marcador electronico led deportivo digital	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria Cerramiento							
Construcción de mamposteria en ladrillo tipo bocadillo a la vista			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso en madera							
Suministro e instalacion de piso plastico negro calibre 6 tableros OSB pretegidos con capara asfaltica (proteccion antihumedad)	5/07/2026	8/08/2026	34,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%
OE							
Demolición de concreto reforzado h>15 cm, incluye el traslado interno en obra a la zona de cargue, y cargue final y disposición de material	22/02/2026	28/03/2026	34,00	0,65%	0,13%	0,58%	-0,45%
Excavación manual de material común de H: 2 - 4 m, incluye el traslado	22/02/2026	4/04/2026	41,00	1,75%	0,29%	0,99%	-0,70%
Excavación mecanica y manual de material de lleno con rocas,	22/02/2026	4/04/2026	41,00	2,76%	0,46%	2,76%	-2,30%
Mamposteria estructural de 0- 2 m de altura	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 2 - 4 m de altura	26/04/2026	9/05/2026	13,00	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 4 - 6 m de altura	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Caisson de 1 metro efectivo de ancho, incluye refuerzo de acero, excavacion D=1,2 en material comun	1/03/2026	18/04/2026	48,00	5,48%	0,00%	7,40%	-7,40%
Suministro e instalación de tuberia de 4" para manejo provisional de agua	1/03/2026	7/03/2026	6,00	0,06%	0,00%	0,05%	-0,05%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 200 mm (8")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 250 mm (10")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de techo provisional en plastico y guadua	22/02/2026	14/03/2026	20,00	0,22%	0,07%	0,18%	-0,10%
Lleno con afirmado compactado manual debidamente compactado; al 90% del proctor modificado capas de maximas de 15cm	8/02/2026	4/04/2026	55,00	3,81%	1,43%	3,43%	-2,00%
Demolición de concreto reforzado y roca dentro de caisson, incluye trasiego en sitio de obra y cargue final y disposición de material	1/03/2026	4/04/2026	34,00	0,50%	0,00%	0,42%	-0,42%
Suministro transporte e instalación de Acero estructural HSS para elementos de cubierta segun diseño ASTM A500, A572, A992, A53, A106, de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica, andamio certificado	17/05/2026	20/06/2026	34,00	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de caja de inspección de 80x80x 2 m de altura	12/04/2026	25/04/2026	13,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETIE	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%


3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
Juan Pablo Villa Roldan	Directora de Interventoría	229
Johan Lopez	Residente de Interventoría	229
Luis H Henao	Inspectora de Interventoría	187
Lina Blanquicet	Profesional SST	229
Nota:	Lo correspondiente a los profesionales especialistas debido a la dedicación del proyecto presentaran ordenes de servicio y se adjuntará la planilla de seguridad social perteneciente a cada periodo.	


ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO
0	N/A Para el presente Periodo


VISTA DE LA OBRA

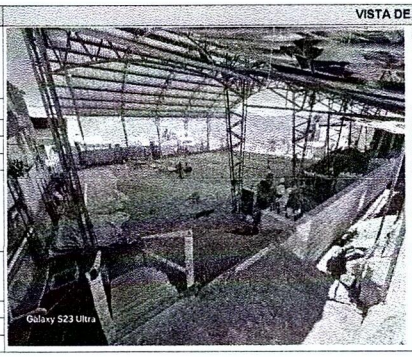


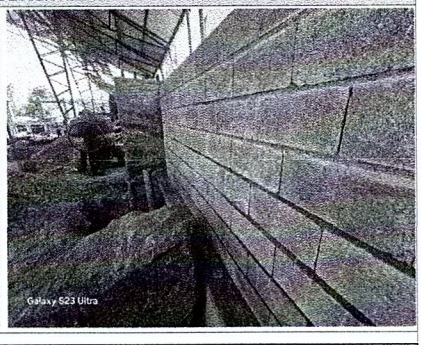


4. CURVA DE AVANCE









En la semana DEL PRESENTE INFORME comprendida del 8 AL 14 DE JUNIO, el porcentaje programado acumulado en dicho periodo corresponde al 53.52% SEGÚN ultima REPROGRAMACION y el porcentaje ejecutado acumulado del mes es del 36.25%. ESTA SEMANA se presenta UN GRAN atraso considerable a la reporgramacion entregada el mes de mayo. se esta avanzando en las obras del plan de contingencia MUY LENTAS Y POCOC AVANCE SE ESTA PRESENTANDO MUCHO ATRAZO EN ESTA ACTIVIDADpero las actividades en paparalelo a la reporgramacion estan generenado el retraso SE DEBE MEJORAR los rendimientos.

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SEMANA 30 - DEL	22 de junio de 2026	AL	28 de junio de 2026

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concreto PEDESTAL B2 y A1
- instalacion de tuberia de 8" y 10" novaford-MUY LENTO ESTA ACTIVIDAD NO SE COMPLETA RODAS LAS SEMANA DE A POCO

SITUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS EN LA SEMANA

MUCHO CAMBIO DE PERSONAL EL FIN DE SEMANA SALIEERON 3 OFICIALES NO HAY CONTINUIDAD SE HA GENERADO MUCHO RETROCESO EN OBRA, TODAS LAS SEMANAS HAY ESPERAR EL PERSONAL SE ACOMODE. SE SOLICITO POR ESCRITO EXPLICACION SOBRE EL TEMA Y RESOLVER LO MAS RAPIDO EN OBRA, SIGUE MUCHO DESORDEN EN CAMPO LA OBRA NO TIENE UN NORTE ESTABLECIDO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ATRASO/ADELANTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA:

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concreto PEDESTAL B2 y A1
- instalacion de tuberia de 8" y 10" novaford-MUY LENTO ESTA ACTIVIDAD NO SE COMPLETA RODAS LAS SEMANA DE A POCO

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

se ENTREGA OTRO SI PARA REVISION DE JURIDICO DE INTERVENTORIA, SE FIRMA Y SE ENTREGAN POLIZAS RESPCTIVAS, SE MONTA INFORMACION EN EL SECOP para actualizacion de las polizas solicitadas por el ministerio, se reitero existio un error en al formulacion del contrato y la poliza de calidad de servicio es de 5 años como lo indican los pliegos. sigue pendiente este tema

Se realizo comite de obra el dia MARTES 23 de junio quedaron varias tareas de parte de la administracion, Se presentaron algunos apus extras del nuebo bloque para ir cerrrando el tema financiero

REPORTE DE ACTIVIDADES SISOMA

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

Se sigue solicitando mas personal para han cambiado en 1 semanas 3 oficiales nuevos y 2 ayudantes, no se ha podido avanzar el plan de contingencia, muy poco personal esta semana hay 5 trabajadores menos e ingresaron nuevos no tiene el animo necesario para las labores. solo se fundieron algunas y vigas y pedestales, es necesario incrementar el rendimiento de fundida de concretos, ya llegaron las platinas para parte superior de pedestal y es necesario la fundicion urgente de pedestales, se entrega diseños estructurales de la ampliacion pero son demaciado exagerados y se solicit auna modificacion urgente o cambio de diseñador. se sigue proceso de demolicion de seccion de bloque de CDI.
SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA NO ESTA INCUMPLIENDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA NI PROGRAMACION SE LE RECUERDAN SON DOS ACTIVIDADES DEBE IR PARALELAS el tazo segun programacion es demaciado.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en (Lugar), a los

VEINTIOCHO	(28)	días del mes de	JUNIO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes)		(Año)

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:

Firma:
Nombre: **JUAN PABLO VILLA ROLDAN**
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALMA Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN SAS
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Elaboró: Grupo de Trabajo de la Interventoría

Original Mindeporte
1era copia : Interventor
2da copia : Supervisor Ente Territorial

PROCESO:		Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-046
FORMATO:	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 21/06/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 29 **DEL** lunes, 15 de junio de 2026 **AL** domingo, 21 de junio de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 222,00 **MUNICIPIO:** SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 95 **DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA** **BARRIO/VEREDA: ZONA URBANA**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHAN BECHARA
INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:	EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
Contrato No.	SA –SF 007 DE 2025
Tiempo inicial (meses)	3,5
Valor Inicial:	$ 251.232.445,98
Valor anticipo :(si aplica)	N-A
Valor adición(es) MinDeporte:	N-A
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N-A
Valor Actualizado:	$ 251.232.445,98
Valor pagado:	$ 188.424.334,49
Saldo por pagar:	$ 62.808.111,50
Plazo Inicial (dias):	105 dias
Fecha de Inicio:	martes, 11 de noviembre de 2025
Prorroga 1	7 meses
Plazo despues de prorroga	315 dias
Fecha de Terminación Actualizada	jueves, 24 de septiembre de 2026
Días Transcurridos	222,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONCORCIO GRUPACK CIVIL
Contrato No.	LP–SF 002 DE 2025
Tiempo (meses)	3
Valor Inicial:	$ 4.148.926.956,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A.
Valor adición(es) MinDeporte:	N/A.
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N/A.
Valor Actualizado:	$ 4.148.926.956,00
Valor pagado:	$ 1.418.441.381,00
Saldo por pagar:	$ 2.730.485.575,00
Plazo Inicial (dias):	90 dias
Fecha de Inicio:	martes, 02 de diciembre de 2025
Prorroga 1	6 meses
Plazo despues de prorroga	270 dias
Fecha de Terminación Actualizada	1 de septiembre de 2026
Días Transcurridos	201

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO
	50,35%
	$ 2.088.984.722,35

% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO
	36,10%
	$ 1.497.762.631,12

% DE ATRASO/ADELANTO	ACUMULADO
	-14,25%
	-$ 755.081.611,88

% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
Obras preliminares				100,00%	50,35%	36,10%	-14,25%
Localización y replanteo	2/12/2025	6/12/2025	4,00	0,13%	0,13%	0,12%	0,00%
Cerramiento provisional en tela verde	2/12/2025	27/12/2025	25,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%
Desmonte, retiro de teja existente, Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	17/05/2026	11/07/2026	55,00	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%
Demolición manual o mecanica de losas de placa en concreto espesor hasta E: 0.15M. Incluye cargue, transporte y botada de material hasta sitio autorizado por la interventoria.	7/12/2025	31/01/2026	55,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%
Demolicion manual de carcamo en concreto existente; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	28/12/2025	31/01/2026	34,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%
Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe,	4/01/2026	17/01/2026	13,00	0,13%	0,13%	0,09%	0,00%
Demolicion manual de muros existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	11/01/2026	31/01/2026	20,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
Retiro de estructura metalica existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	24/05/2026	20/06/2026	27,00	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
Cimentación							
Excavación manual de material comun de H: 0 - 2m, Incluye transporte de material proveniente de la excavacion hasta sitio	11/01/2026	28/02/2026	48,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,00%
Suministro e instalación de Mortero de limpieza, E= 0.05 cm	16/02/2026	14/03/2026	26,00	0,15%	0,32%	0,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de ciclopeo (60% piedra y 40% concreto)	23/02/2026	13/03/2026	18,00	1,07%	1,07%	1,11%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa (3.000 psi) para vigas de cimientos, pilotes, Zapatas y otros elementos de cimientos	23/02/2026	10/04/2026	46,00	8,25%	8,25%	7,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) para muro de contención	2/03/2026	20/03/2026	18,00	1,36%	1,36%	1,36%	0,00%
suministro e instalacion de subbase granular debidamente compactado; al 90% del proctor modificado	2/03/2026	17/04/2026	46,00	2,42%	2,42%	1,19%	0,00%
transporte e instalacion de material (de prestamo) seleccionado proveniente de la excavacion; debidamente compactado.	10/03/2026	5/04/2026	26,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
Estructuras en concreto, acero, mamposteria, acabados y carpinteria metálica							
Suministro e instalación de acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para Columnas, vigas, muros de contencion, gradas y otros	2/02/2026	30/03/2026	56,00	7,61%	6,50%	4,45%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para escalas de graderias, vigas cintas y otros elementos de la	23/02/2026	18/03/2026	23,00	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI, para placas de piso e=10 cm, curado, suministro y transporte de los materiales, mano	17/02/2026	21/03/2026	32,00	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso e=10 cms.	2/03/2026	21/03/2026	19,00	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tuberia de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18	23/03/2026	24/04/2026	32,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tuberia HG de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18 y h: 0.95m, Incluye anticorrosivo y pintura, perforacion en elemento de concreto	29/03/2026	24/04/2026	26,00	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tuberia estructural metalica, costanera 76.2*38*1.5mm (Hierro) 1.2mm	5/03/2026	21/03/2026	16,00	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado para cerramiento permanente en bloque de concreto de 20x20x40 con alzum de H:1.5m. (*según plano*)	27/03/2026	23/05/2026	57,00	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado divisorio en bloque de concreto de 12x20x40, (*según plano*) Incluye mortero, cerchas, pegas de refuerzo y todo	22/03/2026	2/05/2026	41,00	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento metalico TIPO LAMINA SCREEN PANEL, (*según plano*), Incluye corte,	26/04/2026	16/05/2026	20,00	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Placa maciza en concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) con espesor E: 0.15m; incluye formaleta, vidrado y todo lo necesario para su	19/04/2026	15/05/2026	26,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de mortero 1:5 para revoque de muros; Incluye filetes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de paredes de baños; Incluye filetes, pega , emboquillado y todo lo	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de piso de baños (*Antideslizante*); incluye filetes, pega	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta en madera entornborada 0.8 x 2.05 m para baños; Incluye ala, marco, bisagras, chapa y todo lo	6/06/2026	13/06/2026	7,00	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta batiente metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1 x 2.05 m para bodega; Incluye ala,	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta corrediza metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1.03 x 2.05 m para curto util y acces a	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación ventana en aluminio 50-20 blanco de 60x40 y vidrio transparente 4mm; Incluye sistema de seguridad, y	11/04/2026	25/04/2026	14,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de pasamanos abatible en tuberia de	19/04/2026	23/05/2026	34,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable de 45cm x 80 cm en calibre 20 satinado TIPO SOCODA para division orinal ; Incluye accesorios de fijacion, y todo lo necesario para su	17/05/2026	23/05/2026	6,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Incluye Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica según diseño estructural	17/05/2026	6/06/2026	20,00	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de fachada en persiana o celosia translucida 2mm de policarbonato tipo acrylux o similar con	21/06/2026	11/07/2026	20,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%


Redes Hidrosanitarias y aparatos sanitarios							
Suministro, transporte e instalación de bajantes de Suministro, transporte e instalación de bajantes de Sumin Su	22/03/2026	16/05/2026	55,00	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de codos 45° en tuberia PVC	22/03/2026	25/04/2026	34,00	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tuberia PVC DN 200 (8")	12/04/2026	16/05/2026	34,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tragante 8x6" de cúpula	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Yee de 6"	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D=	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D=	23/03/2026	11/04/2026	19,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 4". Incluye sifon, union, codos, accesorios y	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 2". Incluye sifon, union, codos, accesorios y	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de sanitario redondo linea push	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de lavamanos con pedestal	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de orinal en porcelana con	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de incrustaciones cromadas .	31/05/2026	20/06/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso central	14/06/2026	4/07/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D=	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D=	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto hidraulico de 1/2". Incluye, union, codos, accesorios y todo	6/07/2026	24/07/2026	18,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion valvula bola PVC 1/2" lisa soldable.	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro e instalacion de tapa registro 15x15	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 60x60cm	19/04/2026	3/05/2026	14,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 80x80cm	20/04/2026	9/05/2026	19,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Cubiertas e impermeabilizaciones							
Suministro e instalación de Teja UPVC (policloruto de vinilo no	5/07/2026	1/08/2026	27,00	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de canoa metálica. Se incluye	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalaciones Redes Electricas							
suministro transporte e instalcion de luminaria de 10477 lumenes	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida para iluminacion,	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tablero de iluminación de fabricacion	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tablero de medida en energía normal	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #8 bifásico con tierra	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 bifásico con	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC canalizada de	15/03/2026	11/04/2026	27,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 3/4" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1/2" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #6 bifásico con tierra	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 monofásico con	11/07/2026	18/07/2026	7,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida de potencia normal,	12/07/2026	25/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de luminaria led tipo proyector para	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de luminaria de ojo buey de 18	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de punta captadora 16mmx 100 cm	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Tub IMC Ø1"x3m (Bajantes)	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Caja ratwell métalica4x4 la cual incluye	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de CONECTOR BIMETALICO	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de alamborn de aluminio 2/0. Para anillo	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
soportes tipo obo para autosoportar el anillo superiror lo cual	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA. AEREA 2F	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATERRIZAJE VARILLA 5/8"	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO RAMAL 2X12(F)	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 VOLTIOS EN EMT Ø 3/4" CON	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA EMT 1/2"	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMÉTICA	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Pintura y Demarcacion de Elementos							
Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de *pintura acrilica antideslizante para*	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Estuco plastico (dos manos) sobre	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 dos manos (color a	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacion		1 día					
suministro e instalacion de asiento sin espaldar para graderias			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de porterias integradas de futbol y	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de bancas para equipos REFERENCIA	5/07/2026	15/08/2026	41,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA PAISAJISMO	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de PISO ENCAUCHETADO en lamina de	5/07/2026	8/08/2026	34,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de marcador electronico led deportivo *digital*	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria Cerramiento							
Construcción de mamposteria en ladrillo tipo bocadillo a la vista			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso en madera							
Suministro e instalacion de piso plastico negro calibre 6 tableros OSB pretegidos con capara asfaltica (proteccion antihumedad)	5/07/2026	8/08/2026	34,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%
OE							
Demolición de concreto reforzado h>15 cm, incluye el traslado interno en obra a la zona de cargue, y cargue final y disposición de material	22/02/2026	28/03/2026	34,00	0,65%	0,13%	0,58%	-0,45%
Excavación manual de material común de H: 2 - 4 m, incluye el traslado	22/02/2026	4/04/2026	41,00	1,75%	0,29%	0,99%	-0,70%
Excavación mecanica y manual de material de lleno con rocas,	22/02/2026	4/04/2026	41,00	2,76%	0,46%	2,76%	-2,30%
Mamposteria estructural de 0- 2 m de altura	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 2 - 4 m de altura	26/04/2026	9/05/2026	13,00	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 4 - 6 m de altura	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Caisson de 1 metro efectivo de ancho, incluye refuerzo de acero, excavacion D=1,2 en material comun	1/03/2026	18/04/2026	48,00	5,48%	0,00%	7,40%	-7,40%
Suministro e instalación de tubería de 4" para manejo provisional de agua	1/03/2026	7/03/2026	6,00	0,06%	0,00%	0,05%	-0,05%
Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 200 mm (8")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 250 mm (10")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de techo provisional en plastico y guadua	22/02/2026	14/03/2026	20,00	0,22%	0,07%	0,18%	-0,10%
Lleno con afirmado compactado manual debidamente compactado, al 90% del proctor modificado capas de maximas de 15cm	8/02/2026	4/04/2026	55,00	3,81%	1,43%	3,43%	-2,00%
Demolición de concreto reforzado y roca dentro de caisson, incluye trasiego en sitio de obra y cargue final y disposición de material	1/03/2026	4/04/2026	34,00	0,50%	0,00%	0,42%	-0,42%
Suministro transporte e instalación de Acero estructural HSS para elementos de cubierta según diseño ASTM A500, A572, A992, A53, A106, de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epoxica, andamio certificado	17/05/2026	20/06/2026	34,00	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de caja de inspección de 80x80x 2 m de altura	12/04/2026	25/04/2026	13,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETIE	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETILAP	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
PAGA	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,81%	0,28%	0,08%	0,20%
PMT	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,52%	0,18%	0,05%	0,13%

3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:


PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
Juan Pablo Villa Roldan	Directora de Interventoria	222
Johan Lopez	Residente de Interventoria	222
Luis H Henao	Inspectora de Interventoria	180
Lina Blanquicet	Profesional SST	222
Nota:	Lo correspondiente a los profesionales especialistas debido a la dedicación del proyecto presentaran ordenes de servicio y se adjuntará la planilla de seguridad social perteneciente a cada periodo.	


ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO
0	N/A Para el presente Periodo


VISTA DE LA OBRA

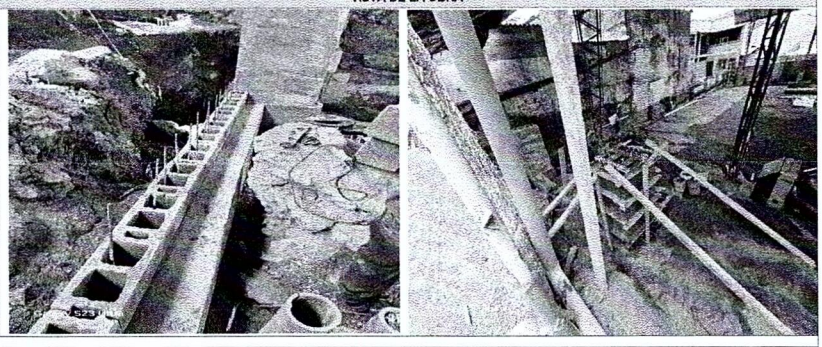


4. CURVA DE AVANCE









En la semana DEL PRESENTE INFORME comprendida del 8 AL 14 DE JUNIO, el porcentaje programado acumulado en dicho periodo corresponde al 50.35% SEGÚN ultima REPROGRAMACION y el porcentaje ejecutado acumulado del mes es del 36.10%. ESTA SEMANA se presenta UN GRAN atraso considerable a la reporgramacion entregada el mes de mayo. se esta avanzando en las obras del plan de contingencia MUY LENTAS Y POCOC AVANCE SE ESTA PRESENTANDO MUCHO ATRAZO EN ESTA ACTIVIDADpero las actividades en paparalelo a la reporgramacion estan generenado el retraso SE DEBE MEJORAR los rendimeintos.

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SEMANA 29 - DEL	15 de junio de 2026	AL	21 de junio de 2026

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concretoPEDESTAL B1

instalacion de tuberia de 8" y 10" novaford-MUY LENTO ESTA ACTIVIDAD NO SE COMPLETA RODAS LAS SEMANA DE A POCO

SITUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS EN LA SEMANA

ese realizan reuniones en l a acaldi apara analizar los temas de microperforados y laminas lisas en fachadas internas de coliseo, adicionalmente se observa la necesisidd de presentar un Apus de perciales y estructura metalica ya que las contractuales no cumplen con la altura requerida, es necesario mejorarlas, adicionamente se le informa el contrtasita el retrazo de la obra y es necesario ejecuatr las obras paralelas al plan de contingencia.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ATRASO/ADELANTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA:

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concretoPEDESTAL B1

instalacion de tuberia de 8" y 10" novaford-MUY LENTO ESTA ACTIVIDAD NO SE COMPLETA RODAS LAS SEMANAN DE A POCO

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

se ENTREGA OTRO SI PARA REVISION DE JURIDICO DE INTERVENTORIA, para actualizacion de las polizas solicitadas por el ministerio, se reitero existio un error en al formulacion del contratoy la poliza de calidad de servicio es de 5 años como lo indican los pliegos. sigue pendiente este tema

Se realizo comite de obra el dia JUEVES 18 de junio quedaron varias tareas de parte de la administracion, YA SE DEFINIO el microperforado altura final microperforado, pisos de concreto quedo en 13cmde espesor, y lamina lisa, se presentaron varias propuestas es necesrio definir el acabado y modulacion final y se aprobaron algunos apus extras

REPORTE DE ACTIVIDADES SISOMA

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

Se sigue solicitando mas personal para han cambiado en 2 semanas 5 oficiales y 4 ayudantes, no se ha podido avanzer el plan de contingencia, muy poco personal esta semana hay 2 trabajadores menos e ingresaron nuevos no tiene el animo necesario para las labores. solo se fundieron algunas y vigas y pedestales, es necesario incrementar el rendimiento de fundida de concretos, ya llegaron las platinas para parte superior de pedestal y es necesario la fundicion urgente de pedestales, se entrega diseños estructurales de la ampliacion pero son demaciado exagerados y se solicit auna modificacion urgente o cambio de diseñador. se sigue proceso de demolicion de seccion de bloque de CDI.
SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA NO ESTA CUMPPLIENDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA NI PROGRAMACION SE LE RECUERDAN SON DOS ACTIVIDADES DEBE IR PARALELAS el tazo segun programacion es demaciado.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en (Lugar), a los

veintiuno	(21)	días del mes de	JUNIO	de	2026
(Dia en letras)	(Dia en números)		(Mes)		(Año)

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:

Firma:
Nombre: **JUAN PABLO VILLA ROLDAN**
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALMA Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN SAS
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Elaboró: Grupo de Trabajo de la Interventoría

Original: Mindeporte
1era copia : Interventor
2da copia : Supervisor Ente Territorial

PROCESO:		Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-046
FORMATO:	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 8/06/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 28 **DEL** lunes, 08 de junio de 2026 **AL** domingo, 14 de junio de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 215,00 **MUNICIPIO:** SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 102 **DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA** **BARRIO/VEREDA: ZONA URBANA**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHAN BECHARA
INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:	EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
Contrato No.	SA –SF 007 DE 2025
Tiempo Inicial (meses)	3,5
Valor Inicial:	$ 251.232.445,98
Valor anticipo :(si aplica)	N-A
Valor adición(es) MinDeporte:	N-A
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N-A
Valor Actualizado:	$ 251.232.445,98
Valor pagado:	$ 188.424.334,49
Saldo por pagar:	$ 62.808.111,50
Plazo Inicial (dias):	105 dias
Fecha de Inicio:	martes, 11 de noviembre de 2025
Prorroga 1	7 meses
Plazo despues de prorroga	315 dias
Fecha de Terminación Actualizada	jueves, 24 de septiembre de 2026
Días Transcurridos	215,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONCORCIO GRUPACK CIVIL
Contrato No.	LP–SF 002 DE 2025
Tiempo (meses)	3
Valor Inicial:	$ 4.148.926.956,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A.
Valor adición(es) MinDeporte:	N/A.
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N/A.
Valor Actualizado:	$ 4.148.926.956,00
Valor pagado:	$ 1.418.441.381,00
Saldo por pagar:	$ 2.730.485.575,00
Plazo Inicial (dias):	90 dias
Fecha de Inicio:	martes, 02 de diciembre de 2025
Prorroga 1	6 meses
Plazo despues de prorroga	270 dias
Fecha de Terminación Actualizada	1 de septiembre de 2026
Días Transcurridos	194

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO
	47,66%
	$ 1.977.378.587,23

% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO
	35,85%
	$ 1.487.390.313,73

% DE ATRASO/ADELANTO	ACUMULADO
	-11,81%
	-$ 625.790.444,65

% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
Obras preliminares				100,00%	47,66%	35,85%	-11,81%
Localización y replanteo	2/12/2025	6/12/2025	4,00	0,13%	0,13%	0,12%	0,00%
Cerramiento provisional en tela verde	2/12/2025	27/12/2025	25,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%
Desmonte, retiro de teja existente, Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	17/05/2026	11/07/2026	55,00	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%
Demolición manual o mecanica de losas de placa en concreto espesor hasta E: 0.15M. Incluye cargue, transporte y botada de material hasta sitio autorizado por la interventoria.	7/12/2025	31/01/2026	55,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%
Demolicion manual de carcamo en concreto existente; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	28/12/2025	31/01/2026	34,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%
Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe,	4/01/2026	17/01/2026	13,00	0,13%	0,13%	0,09%	0,00%
Demolicion manual de muros existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	11/01/2026	31/01/2026	20,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
Retiro de estructura metalica existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	24/05/2026	20/06/2026	27,00	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
Cimentación							
Excavación manual de material comun de H: 0 - 2m, incluye transporte de material proveniente de la excavacion hasta sitio	11/01/2026	28/02/2026	48,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,00%
Suministro e instalación de Mortero de limpieza, E= 0.05 cm	16/02/2026	14/03/2026	26,00	0,15%	0,32%	0,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de ciclopeo (60% piedra y 40% concreto)	23/02/2026	13/03/2026	18,00	1,07%	1,07%	1,11%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa (3.000 psi) para vigas de cimientos, pilotes, Zapatas y otros elementos de cimientos	23/02/2026	10/04/2026	46,00	8,25%	8,25%	7,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) para muro de contención	2/03/2026	20/03/2026	18,00	1,36%	1,36%	1,36%	0,00%
suministro e instalacion de subbase granular debidamente compactado; al 90% del proctor modificado	2/03/2026	17/04/2026	46,00	2,42%	2,42%	1,19%	0,00%
transporte e instalacion de material (de prestamo) seleccionado proveniente de la excavacion; debidamente compactado.	10/03/2026	5/04/2026	26,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
Estructuras en concreto, acero, mamposteria, acabados y carpinteria metálica							
Suministro e instalación de acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para Columnas, vigas, muros de contencion, gradas y otros	2/02/2026	30/03/2026	56,00	7,61%	6,50%	4,45%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para escalas de graderias, vigas cintas y otros elementos de la	23/02/2026	18/03/2026	23,00	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI, para placas de piso e=10 cm, curado, suministro y transporte de los materiales, mano	17/02/2026	21/03/2026	32,00	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso e=10 cms.	2/03/2026	21/03/2026	19,00	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tubería de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18	23/03/2026	24/04/2026	32,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubería HG de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18 y h: 0.95m, Incluye anticorrosivo y pintura, perforacion en elemento de concreto	29/03/2026	24/04/2026	26,00	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tubería estructural metalica, rectangular 76x38x1.5mm (Hierro) 4.2m y	5/03/2026	21/03/2026	16,00	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado para cerramiento permanente en bloque de concreto de 20x20x40 cm, altura de 2m, (según plano)	27/03/2026	23/05/2026	57,00	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado divisorio en bloque de concreto de 12x20x40, (según plano). Incluye mortero, pin, viga, acero de refuerzo y todo	22/03/2026	2/05/2026	41,00	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento metalico TIPO LAMINA SCREEN PANEL, (*según plano*), Incluye corte,	26/04/2026	16/05/2026	20,00	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Placa maciza en concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) con espesor E: 0.15m; incluye formaleta, vidrado y todo lo necesario para su	19/04/2026	15/05/2026	26,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de mortero 1:5 para revoque de muros; incluye filetes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de paredes de baños; incluye filetes, pega, emboquillado y todo lo	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de piso de baños (*Antideslizante*); incluye filetes, pega	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta en madera entomborada 0.8 x 2.05 m para baños; incluye ala, marco, bisagras, chapa y todo lo	6/06/2026	13/06/2026	7,00	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta batiente metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1 x 2.05 m para bodega; Incluye ala,	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta corrediza metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1.03 x 2.05 m para curto util y acces a	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación ventana en alumino 50-20 blanco de 60x40 y vidrio transparente 4mm; Incluye sistema de seguridad, y	11/04/2026	25/04/2026	14,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de pasamanos abatible en tubería de	19/04/2026	23/05/2026	34,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable de 45cm x 80 cm en calibre 20 satinado TIPO SOCODA para division orinal ; Incluye accesorios de fijacion, y todo lo necesario para su	17/05/2026	23/05/2026	6,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Incluye Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica según diseño estructural	17/05/2026	6/06/2026	20,00	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de fachada en persiana o celosia							

Redes Hidrosanitarias y aparatos sanitarios							
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC D= 4" incluye unión, codos, accesorios, cepa de cepa E= 0.95 M de	22/03/2026	16/05/2026	55,00	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de codos 45° en tubería PVC D= 6"	22/03/2026	25/04/2026	34,00	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tuberia PVC DN 200 (8")	12/04/2026	16/05/2026	34,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tragante 8x6" de cúpula plastica o metalica	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Yee de 6"	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria PVC D= 4" incluye unión, codos, accesorios, cepa de cepa E= 0.95 M de	22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria PVC D= 2" incluye unión, codos, accesorios, cepa de cepa E= 0.95 M de	23/03/2026	11/04/2026	19,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 4". Incluye sifon, union, codos, accesorios y todo lo necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 2". Incluye sifon, union, codos, accesorios y todo lo necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de sanitario redondo linea push obenrader TIPO SMART SINGLE DE CORONA incluye grifería y todo lo	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de lavamanos con pedestal TIPO NILO DE CORONA incluye grifería y todo lo	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de orinal en porcelana con grifería ajustable cuyuesto de trafico media TIPO ARRECIFE DE	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Incrustaciones cromadas . Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su	31/05/2026	20/06/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso central metalica galvanizada cuadrada 10x10 . Incluye accesorios de	14/06/2026	4/07/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería hidraulica PVC D= 1/2" incluye unión, codos, accesorios, cepa de cepa E= 0.95 M	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería hidraulica PVC D= 1/2" incluye unión, codos, accesorios, cepa de cepa E= 0.95 M	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto hidraulico de 1/2". Incluye, union, codos, accesorios y todo lo necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	6/07/2026	24/07/2026	18,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion valvula bola PVC 1/2" lisa soldable	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro e instalacion de tapa registro 15x15	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 60x60cm	19/04/2026	3/05/2026	14,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 80x80cm	20/04/2026	9/05/2026	19,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Cubiertas e impermeabilizaciones							
Suministro e instalación de Teja UPVC (policlorulo de vinilo no plastificado) de alta resistencia, Tornillos para fijación incluyendo	5/07/2026	1/08/2026	27,00	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de canoa metálica. Se incluye aplicación de anticorrosivo y pintura vinilo lo necesario para su	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalaciones Redes Electricas							
suministro transporte e instalcion de luminaria de 10477 lumenes 100W 240V para iluminacion de cancha	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida para iluminacion, incluyendo todo lo necesario para su correcto funcionamiento	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tablero de iluminación de fabricacion especial de 10 CTOS, de distribución para circuitos ramales de	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tablero de medida en energía normal según diagrama unifilar, en lamina colled rolled calibre 16, pintura electrostática ral 7035/35, incluye Elementos, gabinete, canaleta	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #8 bifásico con tierra para alimentación de tablero TAL 2N8+4N8+4N8 AWG (o sus	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 bifásico con tierra para alimentación de circuitos ramales 2N12+1N12 AWG, lo	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC canalizada de 2" incluye excavacion	15/03/2026	11/04/2026	27,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 3/4" la cual incluye todo lo necesario para su correcto funcionamineto	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1/2" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #6 bifásico con tierra	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 monofásico con	11/07/2026	18/07/2026	7,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida de potencia normal,	12/07/2026	25/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de luminaria led tipo proyector para	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de luminaria de ojo buey de 18	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de punta captadora 16mmx 100 cm	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Tub IMC Ø1"x3m (Bajantes)	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Caja ratwell métalica4x4 la cual incluye	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de CONECTOR BIMETALICO	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de alamborn de aluminio 2/0. Para anillo	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
soportes tipo obo para autosoportar el anillo superiror lo cual incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA. AEREA 2F	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE VARILLA 5/8"	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO RAMAL 2X12(F)	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 VOLTIOS EN EMT Ø 3/4" CON	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA EMT 1/2"	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMÉTICA	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Pintura y Demarcacion de Elementos							
Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de *pintura acrilica antideslizante para*	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Estuco plastico (dos manos) sobre	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 dos manos (color a	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacion			1 día				
suministro e instalacion de asiento sin espaldar para graderias			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de porterias integradas de futbol y	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de bancas para equipos REFERENCIA	5/07/2026	15/08/2026	41,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA PAISAJISMO	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de PISO ENCAUCHETADO en lamina de	5/07/2026	8/08/2026	34,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de marcador electronico led deportivo digital	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria Cerramiento							
Construcción de mamposteria en ladrillio tipo bocadillo a la vista			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso en madera							
Suministro e instalacion de piso plastico negro calibre 6 tableros OSB pretegidos con capara asfaltica (proteccion antihumedad)	5/07/2026	8/08/2026	34,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%
OE							
Demolición de concreto reforzado h>15 cm, incluye el traslado interno en obra a la zona de cargue, y cargue final y disposición de material	22/02/2026	28/03/2026	34,00	0,65%	0,13%	0,58%	-0,45%
Excavación manual de material común de H: 2 - 4 m, incluye el traslado	22/02/2026	4/04/2026	41,00	1,75%	0,29%	0,99%	-0,70%
Excavación mecanica y manual de material de lleno con rocas,	22/02/2026	4/04/2026	41,00	2,76%	0,46%	2,76%	-2,30%
Mamposteria estructural de 0- 2 m de altura	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 2 - 4 m de altura	26/04/2026	9/05/2026	13,00	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 4 - 6 m de altura	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Caisson de 1 metro efectivo de ancho, incluye refuerzo de acero, excavacion D=1.2 en material comun	1/03/2026	18/04/2026	48,00	5,48%	0,00%	7,40%	-7,40%
Suministro e instalación de tuberia de 4" para manejo provisional de agua	1/03/2026	7/03/2026	6,00	0,06%	0,00%	0,05%	-0,05%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 200 mm (8")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 250 mm (10")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de techo provisional en plastico y guadua	22/02/2026	14/03/2026	20,00	0,22%	0,07%	0,18%	-0,10%
Lleno con afirmado compactado manual debidamente compactado; al 90% del proctor modificado capas de maximas de 15cm	8/02/2026	4/04/2026	55,00	3,81%	1,43%	3,43%	-2,00%
Demolición de concreto reforzado y roca dentro de caisson, incluye trasiego en sitio de obra y cargue final y disposición de material	1/03/2026	4/04/2026	34,00	0,50%	0,00%	0,42%	-0,42%
Suministro transporte e instalación de Acero estructural HEB para elementos de cubierta según diseño ASTM A500, A572, A992, A53, A106, de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica, andamio certificado	17/05/2026	20/06/2026	34,00	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de caja de inspección de 80x80x 2 m de altura	12/04/2026	25/04/2026	13,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETIE	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETILAP	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
PAGA	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,81%	0,28%	0,08%	0,20%
PMT	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,52%	0,18%	0,05%	0,13%
	TOTAL				47,66%	25,85%	11,81%


3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:


PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
Juan Pablo Villa Roldan	Directora de Interventoría	215
Johan Lopez	Residente de Interventoría	215
Luis H Henao	Inspectora de Interventoría	173
Lina Blanquicet	Profesional SST	215
Nota:	Lo correspondiente a los profesionales especialistas debido a la dedicación del proyecto presentaran ordenes de servicio y se adjuntará la planilla de seguridad social perteneciente a cada periodo.	


ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO
0	N/A Para el presente Periodo


VISTA DE LA OBRA

4. CURVA DE AVANCE









En la semana DEL PRESENTE INFORME comprendida del 8 AL 14 DE JUNIO, el porcentaje programado acumulado en dicho periodo corresponde al 47.66% SEGÚN ultima REPROGRAMACION y el porcentaje ejecutado acumulado del mes es del 35.85%. ESTA SEMANA se presenta atraso considerable a la reporgramacion entregada el mes de mayo. se esta avanzando en las obras del plan de contingencia pero las actividades en paparalelo a la reporgramacion estan generenado el retraso SE DEBE MEJORAR los rendimeintos.

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SEMANA 28 - DEL	8 de junio de 2026	AL	14 de junio de 2026

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concreto vigas de fundacion eje pilas a1-a8
instalacion de tuberia de 8" y 10" novaford

SITUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS EN LA SEMANA

ese realizan reuniones en l a acaldi apara analizar los temas de microperforados y laminas lisas en fachadas internas de coliseo, adicionalmente se observa la necesisidd de presentar un Apus de perciales y estructura metalica ya que las contractuales no cumplen con la altura requerida, es necesario mejorarlas, adicionamente se le informa el contrtasita el retrazo de la obra y es necesario ejecuatr las obras paralelas al plan de contingencia.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ATRASO/ADELANTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA:

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concreto vigas de fundacion eje pilas A1-A4
instalacion de tuberia de 8" y 10" novaford interna coliseo
Comision topografica

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

se solicita al mpio presentar otro si a la interventoria para actualizacion de las polizas solicitadas por el ministerio, se reitero existio un error en al formulacion del contratoy la poliza de calidad de servicio es de 5 años como lo indican los pliegos. sigue pendiente este tema

Se realizo comite de obra el dia miercoles 3 de junio quedaron varias tareas de parte de la administracion, como lo son definir el microperforado altura final microperforado, pisos de concretp quedo en 13cmde espesor, y lamina lisa, se presentaron varias propuestas es necesrio definir el acabado y modulacion final

REPORTE DE ACTIVIDADES SISOMA

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

Se sigue solicitando mas personal para poder cumplir el plan de contingencia, muy poco personal esta semana hay 2 trabajadores menos e ingresaron nuevos no tiene el animo necesario para las labores. solo se fundieron algunas y vigas y pedestales, es necesario incrementar el rendimiento de fundida de concretos, ya llegaron las platinas para parte superior de pedestal y es necesario la fundicion urgente de pedestales, seguimos a la espera de los diseños estructurales de la ampliacion. se inicia proceso de demolicion de seccion de bloque de CDI.
SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA NO ESTA CUMPPLIENDO CON EL PLAN DE CONTINGENCIA NI PROGRAMACION SE LE RECUERDAN SON DOS ACTIVIDADES DEBE IR PARALELAS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en (Lugar), a los

siete (Dia en letras) (14) (Dia en números) días del mes de JUNIO (Mes) de 2026 (Año)

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:

Firma:
Nombre: **JUAN PABLO VILLA ROLDAN**
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALMA Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN SAS
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Elaboró: Grupo de Trabajo de la Interventoría

Original: Mindeporte
1era copia : Interventor
2da copia : Supervisor Ente Territorial

PROCESO:	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
FORMATO:	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código: ATC-FR-046
		Fecha: 19/11/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 27 **DEL** lunes, 01 de junio de 2026 **AL** domingo, 07 de junio de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 208,00 **MUNICIPIO:** SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 109 **DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA** **BARRIO/VEREDA: ZONA URBANA**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHAN BECHARA
INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:	EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	
Contrato No.	SA –SF 007 DE 2025	
Tiempo inicial (meses)		3,5
Valor Inicial:		$ 251.232.445,98
Valor anticipo :(si aplica)	N-A	
Valor adición(es) MinDeporte:	N-A	
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N-A	
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N-A	
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N-A	
Valor Actualizado:	$	251.232.445,98
Valor pagado:	$	125.616.222,99
Saldo por pagar:	$	125.616.222,99
Plazo Inicial (dias):		105 dias
Fecha de Inicio:		martes, 11 de noviembre de 2025
Prorroga 1		7 meses
Plazo despues de prorroga		315 dias
Fecha de Terminación Actualizada		jueves, 24 de septiembre de 2026
Días Transcurridos		208,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONCORCIO GRUPACK CIVIL	
Contrato No.	LP–SF 002 DE 2025	
Tiempo (meses)	3	
Valor Inicial:	$	4.148.926.956,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A.	
Valor adición(es) MinDeporte:	N/A.	
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N/A.	
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N/A.	
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N/A.	
Valor Actualizado:	$	4.148.926.956,00
Valor pagado:	$	886.407.845,00
Saldo por pagar:	$	3.262.519.111,00
Plazo Inicial (dias):	90 días	
Fecha de Inicio:	martes, 02 de diciembre de 2025	
Prorroga 1	6 meses	
Plazo despues de prorroga	270 dias	
Fecha de Terminación Actualizada	1 de septiembre de 2026	
Días Transcurridos	187	

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO
	44,00%
	$ 1.825.527.860,64

% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO
	35,60%
	$ 1.477.017.996,34

% DE ATRASO/ADELANTO	ACUMULADO
	-8,40%
	-$ 445.100.739,64

% DE AVANCE OBRA


CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
Obras preliminares				100,00%	44,00%	35,60%	-8,40%
Localización y replanteo	2/12/2025	6/12/2025	4,00	0,13%	0,13%	0,12%	0,00%
Cerramiento provisional en tela verde	2/12/2025	27/12/2025	25,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%
Desmonte, retiro de teja existente, Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	17/05/2026	11/07/2026	55,00	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%
Demolición manual o mecanica de losas de placa en concreto espesor hasta E: 0.15M. Incluye cargue, transporte y botada de	7/12/2025	31/01/2026	55,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%
Demolicion manual de carcamo en concreto existente; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la	28/12/2025	31/01/2026	34,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%
Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe,	4/01/2026	17/01/2026	13,00	0,13%	0,13%	0,09%	0,00%
Demolicion manual de muros existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	11/01/2026	31/01/2026	20,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
Retiro de estructura metalica existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	24/05/2026	20/06/2026	27,00	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
Cimentación							
Excavación manual de material comun de H: 0 - 2m, incluye transporte de material proveniente de la excavacion hasta sitio	11/01/2026	28/02/2026	48,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,00%
Suministro e instalación de Mortero de limpieza, E= 0.05 cm	16/02/2026	14/03/2026	26,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de ciclopeo (60% piedra y 40% concreto)	23/02/2026	13/03/2026	18,00	1,07%	1,07%	1,11%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa (3.000 psi) para vigas de cimientos, pilotes, Zapatas y otros elementos de cimientos	23/02/2026	10/04/2026	46,00	8,25%	8,25%	7,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) para muro de contención	2/03/2026	20/03/2026	18,00	1,36%	1,36%	1,36%	0,00%
suministro e instalacion de subbase granular debidamente compactado; al 90% del proctor modificado	2/03/2026	17/04/2026	46,00	2,42%	2,42%	1,19%	0,00%
transporte e instalacion de material (de prestamo) seleccionado	10/03/2026	5/04/2026	26,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
Estructuras en concreto, acero, mampostería, acabados y carpintería metálica							
Suministro e instalación de acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para Columnas, vigas, muros de contencion, gradas y otros	2/02/2026	30/03/2026	56,00	7,61%	6,50%	4,45%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para escalas de graderias, vigas,cintas y otros elementos de la	23/02/2026	18/03/2026	23,00	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI, para placas de piso e=10 cm, curado, suministro y transporte de los materiales, mano	17/02/2026	21/03/2026	32,00	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso e=10 cms.	2/03/2026	21/03/2026	19,00	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tubería de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18	23/03/2026	24/04/2026	32,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubería HG de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18 y h: 0.95m, Incluye anticorrosivo y pintura, perforacion en elemento de concreto	29/03/2026	24/04/2026	26,00	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tubería estructural metálica, cerramiento 70x30x2.5mm (Vigas 4.2m y	5/03/2026	21/03/2026	16,00	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado para cerramiento permanente en bloque de concreto de 20x20x40 con altura de H: 1.8m, (según plano)	27/03/2026	23/05/2026	57,00	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado divisorio en bloque de concreto de 12x20x40,	22/03/2026	2/05/2026	41,00	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento metalico TIPO LAMINA SCREEN PANEL, (*según plano*), Incluye corte,	26/04/2026	16/05/2026	20,00	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Placa maciza en concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) con espesor E: 0.15m; incluye formaleta, vidrado y todo lo necesario para su	19/04/2026	15/05/2026	26,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de mortero 1:5 para revoque de muros; Incluye filetes y todo lo necesario para su correcta instalacion	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de paredes de baños; Incluye filetes, pega , emboquillado y todo lo	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de piso de baños (*Antideslizante*); Incluye filetes, pega	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta en madera entomborada 0.8 x 2.05 m para baños; Incluye ala, marco, bisagras, chapa y todo lo	6/06/2026	13/06/2026	7,00	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta batiente metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1 x 2.05 m para bodega; Incluye ala	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta corrediza metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1.03 x 2.05 m para curto util y acces a	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación ventana en alumino 50-20 blanco de 60x40 y vidrio transparante 4mm; incluye sistema de seguridad y	11/04/2026	25/04/2026	14,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de pasamanos abatible en tubería de	19/04/2026	23/05/2026	34,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable de 45cm x 80 cm en calibre 20 satinado TIPO SOCODA para division orinal - Incluye accesorios de fijacion y todo lo necesario para su	17/05/2026	23/05/2026	6,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Incluye Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica según diseño estructural	17/05/2026	6/06/2026	20,00	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de fachada en persiana o celosia traslucida 3mm de policarbonato tipo aerolux o similar con proteccion UV altura del panel 0.2m, con perfil de soporte lateral en	21/06/2026	11/07/2026	20,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Redes Hidrosanitarias y aparatos sanitarios							
Suministro, transporte e instalación de baldosa de	Suministro, transporte e instalación de baldosa de	Sumin	Su	22/03/2026	16/05/2026	55,00	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de codos 45° en tubería PVC				22/03/2026	25/04/2026	34,00	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tuberia PVC DN 200 (8")				12/04/2026	16/05/2026	34,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tragante 8x6" de cúpula plastica o metalica				22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de Yee de 6"				22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 4" Incluye union, codos, accesorios, rejilla de grama E: 0.05 M de				22/03/2026	18/04/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%


Suministro, transporte e instalación de lavamanos con pedestal TIPO MILANO DE CORONA , incluye grifería y todo lo	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de orinal en porcelana con grifería ahorrativa, suministro de tapón cenicilla TIPO ARRECIFE DE	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de incrustaciones cromadas . Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su	31/05/2026	20/06/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso central metálica cromada calada cuadrada de 10x10 , incluye accesorios de	14/06/2026	4/07/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería hidraulica PVC D= 1/2" incluye unión, codos, accesorios, copa de copa F.9 PFM de	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería hidraulica PVC D= 1/2" incluye unión, codos, accesorios, copa de copa F.9 PFM de	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto hidraulico de 1/2". Incluye, union, codos, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	6/07/2026	24/07/2026	18,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion valvula bola PVC 1/2" lisa soldable.	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro e instalacion de tapa registro 15x15	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 60x60cm	19/04/2026	3/05/2026	14,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 80x90cm	20/04/2026	9/05/2026	19,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Cubiertas e impermeabilizaciones							
Suministro e instalación de Teja UPVC (policlorulo de vinilo no plastificado) de alta resistencia Termoacustica 2 mm de espesor	5/07/2026	1/08/2026	27,00	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de canoa metálica. Se incluye anclajes de refuerzos y todos los accesorios para su	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalaciones Redes Electricas							
suministro transporte e instalcion de luminaria de 10477 lumenes 4000K/240V para iluminacion de cancha	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida para iluminacion, incluye caja y todo lo necesario para su correcta instalcion	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tablero de iluminación de fabricacion nacional de 12 CTOS de distribución para circuitos ramales de	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tablero de medida en energía normal según diagrama unifilar, en lamina colled rolled calibre 16, pintura electrostática, rel 7032/25, incluye fijaciones, anclajes, puesta a	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #8 bifásico con tierra para alimentación de circuitos ramales 2N12+1N12 AWG, lo	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 bifásico con tierra para alimentación de circuitos ramales 2N12+1N12 AWG, lo	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC canalizada de 2" incluye excavacion	15/03/2026	11/04/2026	27,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 3/4" la cual incluye todo lo necesario para su correcto funcionamineto	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1/2" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #6 bifásico con tierra	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 monofásico con	11/07/2026	18/07/2026	7,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida de potencia normal,	12/07/2026	25/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de luminaria led tipo proyector para	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de luminaria de ojo buey de 18	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de punta captadora 16mmx 100 cm	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Tub IMC Ø1"x3m (Bajantes)	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Caja ratwell métalica4x4 la cual incluye	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de CONECTOR BIMETALICO	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de alamborn de aluminio 2/0. Para anillo	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
soportes tipo obo para autosoportar el anillo superiror lo cual incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA 2F	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE VARILLA 5/8"	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO RAMAL 2X12(F)	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 VOLTIOS EN EMT Ø 3/4" CON	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA EMT 1/2"	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMÉTICA	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Pintura y Demarcacion de Elementos							
Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de *pintura acrilica antideslizante para*	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Estuco plastico (dos manos) sobre	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 dos manos (color a	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacion			1 día				
suministro e instalacion de asiento sin espaldar para graderias			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de porterias integradas de futbol y	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de bancas para equipos REFERENCIA	5/07/2026	15/08/2026	41,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA PAISAJISMO	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de PISO ENCAUCHETADO en lamina de	5/07/2026	8/08/2026	34,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de marcador electronico led deportivo digital	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria Cerramiento							
Construcción de mamposteria en ladrillo tipo bocadillo a la vista			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso en madera							
Suministro e instalacion de piso plastico negro calibre 6 tableros OSB pretegidos con capara asfaltica (proteccion antihumedad)	5/07/2026	8/08/2026	34,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%
OE							
Demolición de concreto reforzado h>15 cm, incluye el traslado interno en obra a la zona de cargue, y cargue final y disposición de material	22/02/2026	28/03/2026	34,00	0,65%	0,13%	0,58%	-0,45%
Excavación manual de material común de H: 2 - 4 m, incluye el traslado	22/02/2026	4/04/2026	41,00	1,75%	0,29%	0,99%	-0,70%
Excavación mecanica y manual de material de lleno con rocas,	22/02/2026	4/04/2026	41,00	2,76%	0,46%	2,76%	-2,30%
Mamposteria estructural de 0- 2 m de altura	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 2 - 4 m de altura	26/04/2026	9/05/2026	13,00	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 4 - 6 m de altura	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Caisson de 1 metro efectivo de ancho, incluye refuerzo de acero, excavacion D=1,2 en material comun	1/03/2026	18/04/2026	48,00	5,48%	0,00%	7,40%	-7,40%
Suministro e instalación de tubería de 4" para manejo provisional de agua	1/03/2026	7/03/2026	6,00	0,06%	0,00%	0,05%	-0,05%
Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 200 mm (8")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 250 mm (10")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de techo provisional en plastico y guadua	22/02/2026	14/03/2026	20,00	0,22%	0,07%	0,18%	-0,10%
Lleno con afirmado compactado manual debidamente compactado; al 90% del proctor modificado capas de maximas de 15cm	8/02/2026	4/04/2026	55,00	3,81%	1,43%	3,43%	-2,00%
Demolición de concreto reforzado y roca dentro de caisson, incluye traslego en sitio de obra y cargue final y disposición de material	1/03/2026	4/04/2026	34,00	0,50%	0,00%	0,42%	-0,42%
Suministro transporte e instalación de Acero estructural HSS para elementos de cubierta según diseño ASTM A500, A572, A992, A53, A106, de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica, andamio certificado	17/05/2026	20/06/2026	34,00	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de caja de inspección de 80x80x 2 m de altura	12/04/2026	25/04/2026	13,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETIE	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETILAP	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
PAGA	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,81%	0,28%	0,08%	0,20%
PMT	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,52%	0,18%	0,05%	0,13%
TOTAL					**44,00%**	**35,60%**	**-8,40%**


3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:


PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
Juan Pablo Villa Roldan	Directora de Interventoría	208
Johan Lopez	Residente de Interventoría	208
Luis H Henao	Inspectora de Interventoría	166
Lina Blanquicet	Profesional SST	208
Nota:	Lo correspondiente a los profesionales especialistas debido a la dedicación del proyecto presentaran ordenes de servicio y se adjuntará la planilla de seguridad social perteneciente a cada periodo.	
ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	
0	N/A Para el presente Periodo	

VISTA DE LA OBRA


Curva de avance ($ COP)
2,5E+09
2,25E+09
2E+09
1,75E+09
1,5E+09
1,25E+09
ALOR


Curva de avance (%)
0,6
0,5
0,4
UE (%)





En la semana DEL PRESENTE INFORME comprendida del 01 al 7 JUNIO, el porcentaje programado acumulado en dicho periodo corresponde al 44.00% SEGÚN ultima REPROGRAMACION y el porcentaje ejecutado acumulado del mes es del 35.60%. ESTA SEMANA se presenta atraso considerable a la reporgramacion entregada el mes de mayo. se esta avanzando en las obras del plan de contingencia pero las actividades en paparalelo a la reporgramacion estan generenado el retraso SE DEBE MEJORAR los rendimientos.

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SEMANA 27 - DEL	1 de junio de 2026	AL	7 de junio de 2026

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concreto vigas de fundacion eje pilas g1-g7

instalacion de tuberia de 8" y 10" novaford

SITUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS EN LA SEMANA

se realizan reuniones en la alcaldia para analizar los temas de microperforados y laminas lisas en fachadas internas de coliseo, adicionalmente se observa la necesisidd de presentar un Apus de perciales y estructura metalica ya que las contractuales no cumplen con la altura requerida, es necesario mejorarlas, adicionamente se le informa el contrtasita el retrazo de la obra y es necesario ejecuatr las obras paralelas al plan de contingencia. se presentaron estos apus estan en analisis de aprobacion.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ATRASO/ADELANTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA:

- Excavación manual
- Armado de acero de refuerzo para vigas
- Armando de acero de refuerzo para pedestal
- concreto vigas de fundacion eje pilas A1-A4

instalacion de tuberia de 8" y 10" novaford interna coliseo
Comosion topografica

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

se solicita al mpio presentar otro si a la interventoria para actualizacion de las polizas solicitadas por el ministerio, se reitero existio un error en al formulacion del contratoy la poliza de calidad de servicio es de 5 años como lo indican los pliegos. sigue pendiente este tema

Se realizo comite de obra el dia miercoles 3 de junio quedaron varias tareas de parte de la administracion, como lo son definir el microperforado altura final microperforado, pisos de concretp quedo en 13cmde espesor, y lamina lisa, se presentaron varias propuestas es necesrio definir el acabado y modulacion final este espesor de piso se presento apu nuevo y que contractualmenet solo hay espsor de 10 y 15 cm respectivamente

REPORTE DE ACTIVIDADES SISOMA

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

Se sigue solicitando mas personal para poder cumplir el plan de contingencia, muy poco personal esta semana hay 2 trabajadores menos e ingresaron nuevos no tiene el animo necesario para las labores. solo se fundieron algunas y vigas y pedestales, es necesario incrementar el rendimiento de fundida de concretos, ya llegaron las platinas para parte superior de pedestal y es necesario la fundicion urgente de pedestales, seguimos a la espera de los diseños estructurales de la ampliacion. se inicia proceso de demolicion de seccion de bloque de CDI.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en (Lugar), a los

siete	(7)	días del mes de	JUNIO	de	2026
(Dia en letras)	(Dia en números)		(Mes)		(Año)

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:

Firma:
Nombre: **JUAN PABLO VILLA ROLDAN**
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALMA Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN SAS
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Elaboró: Grupo de Trabajo de la Interventoría

Original: Mindeporte
1era copia : Interventor
2da copia : Supervisor Ente Territorial

PROCESO:		Versión: 1
FORMATO:	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-046
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 26 **DEL** lunes, 25 de mayo de 2026 **AL** domingo, 31 de mayo de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 201,00 **MUNICIPIO:** SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 116 **DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA** **BARRIO/VEREDA: ZONA URBANA**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHAN BECHARA
INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:	EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
Contrato No.	SA –SF 007 DE 2025
Tiempo inicial (meses)	3,5
Valor Inicial:	$ 251.232.445,98
Valor anticipo :(si aplica)	N-A
Valor adición(es) MinDeporte:	N-A
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N-A
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N-A
Valor Actualizado:	$ 251.232.445,98
Valor pagado:	$ 125.616.222,99
Saldo por pagar:	$ 125.616.222,99
Plazo Inicial (dias):	105 dias
Fecha de Inicio:	martes, 11 de noviembre de 2025
Prorroga 1	7 meses
Plazo despues de prorroga	315 dias
Fecha de Terminación Actualizada	jueves, 24 de septiembre de 2026
Dias Transcurridos	201,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONCORCIO GRUPACK CIVIL
Contrato No.	LP–SF 002 DE 2025
Tiempo (meses)	3
Valor Inicial:	$ 4.148.926.956,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A.
Valor adición(es) MinDeporte:	N/A.
Valor adición(es) No. 1 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 2 Ente territorial	N/A.
Valor adición(es) No. 3 Ente territorial	N/A.
Valor Actualizado:	$ 4.148.926.956,00
Valor pagado:	$ 886.407.845,00
Saldo por pagar:	$ 3.262.519.111,00
Plazo Inicial (dias):	90 dias
Fecha de Inicio:	martes, 02 de diciembre de 2025
Prorroga 1	6 meses
Plazo despues de prorroga	270 dias
Fecha de Terminación Actualizada	1 de septiembre de 2026
Dias Transcurridos	180

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO
	39,14%
	$ 1.623.890.010,58

% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO
	34,23%
	$ 1.420.177.697,04

% DE ATRASO/ADELANTO	ACUMULADO
	-4,91%
	-$ 260.171.979,95

% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
Obras preliminares				100,00%	39,14%	34,23%	-4,91%
Localización y replanteo	2/12/2025	6/12/2025	4,00	0,13%	0,13%	0,12%	0,00%
Cerramiento provisional en tela verde	2/12/2025	27/12/2025	25,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%
Desmonte, retiro de teja existente, Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	17/05/2026	11/07/2026	55,00	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%
Demolición manual o mecanica de losas de placa en concreto espesor hasta E: 0.15M. Incluye cargue, transporte y botada de	7/12/2025	31/01/2026	55,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%
Demolicion manual de carcamo en concreto existente; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la	28/12/2025	31/01/2026	34,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%
Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe,	4/01/2026	17/01/2026	13,00	0,13%	0,13%	0,09%	0,00%
Demolicion manual de muros existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	11/01/2026	31/01/2026	20,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
Retiro de estructura metalica existentes; Incluye disposicion final de las mismas hasta sitio autorizado por la interventoria.	24/05/2026	20/06/2026	27,00	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
Cimentación							
Excavación manual de material comun de H: 0 - 2m, incluye transporte de material proveniente de la excavacion hasta sitio	11/01/2026	28/02/2026	48,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,00%
Suministro e instalación de Mortero de limpieza, E= 0.05 cm	16/02/2026	14/03/2026	26,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de ciclopeo (60% piedra y 40% concreto)	23/02/2026	13/03/2026	18,00	1,07%	1,07%	1,11%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa (3.000 psi) para vigas de cimientos, pilotes, Zapatas y otros elementos de cimientos	23/02/2026	10/04/2026	46,00	8,25%	8,25%	7,20%	0,00%
Suministro e instalación de concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) para muro de contención	2/03/2026	20/03/2026	18,00	1,36%	1,36%	1,36%	0,00%
suministro e instalacion de subbase granular debidamente compactado; al 90% del proctor modificado	2/03/2026	17/04/2026	46,00	2,42%	2,42%	1,19%	0,00%
transporte e instalacion de material (de prestamo) seleccionado	10/03/2026	5/04/2026	26,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
Estructuras en concreto, acero, mamposteria, acabados y carpinteria metálica							
Suministro e instalación de acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para Columnas, vigas, muros de contencion, gradas y otros	2/02/2026	30/03/2026	56,00	7,61%	6,50%	4,45%	0,00%
Suministro e instalación de concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para escalas de graderias, vigas cintas y otros elementos de la	23/02/2026	18/03/2026	23,00	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y vaciado de concreto de 3000 PSI, para placas de piso e=10 cm, curado, suministro y transporte de los materiales, mano	17/02/2026	21/03/2026	32,00	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso e=10 cms	2/03/2026	21/03/2026	19,00	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tuberia de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18	23/03/2026	24/04/2026	32,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tuberia HG de 1 1/2" redonda (*según diseño*) calibre 18 y h: 0.95m, Incluye anticorrosivo y pintura, perforacion en elemento de concreto	29/03/2026	24/04/2026	26,00	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tuberia estructural metalica, rectangular 76x38x1.5mm (Hxmm: 4.3m y	5/03/2026	21/03/2026	16,00	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado para cerramiento permanente en bloque de	27/03/2026	23/05/2026	57,00	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Muro dovelado divisorio en bloque de concreto de 12x20x40,	22/03/2026	2/05/2026	41,00	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de cerramiento metalico TIPO LAMINA SCREEN PANEL, (*según plano*), Incluye corte,	26/04/2026	16/05/2026	20,00	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Placa maciza en concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) con espesor E: 0.15m; incluye formaleta, vidrado y todo lo necesario para su	19/04/2026	15/05/2026	26,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de mortero 1:5 para revoque de muros; incluye filetes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de paredes de baños; Incluye filetes, pega, emboquillado y todo lo	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de piso de baños (*Antideslizante*); Incluye filetes, pega,	11/05/2026	6/06/2026	26,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta en madera entomborada 0.8 x 2.05 m para baños; Incluye ala, marco, bisagras, chapa y todo lo	6/06/2026	13/06/2026	7,00	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta batiente metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1 x 2.05 m para bodega; Incluye ala	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de puerta corrediza metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1.03 x 2.05 m para curto util y acces a	31/05/2026	13/06/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación ventana en alumino 50-20 blanco de 60x40 y vidrio transparente 4mm; Incluye sistema de seguridad, y	11/04/2026	25/04/2026	14,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de pasamanos abatible en tuberia de	19/04/2026	23/05/2026	34,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable de 45cm x 80 cm en calibre 20 satinado TIPO SOCODA para division orinal.; Incluye accesorios de fijacion, y todo lo necesario para su	17/05/2026	23/05/2026	6,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Incluye Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica según diseño estructural	17/05/2026	6/06/2026	20,00	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de fachada en persiana o celosia traslucida 3mm de policarbonato tipo aerolux o similar con	21/06/2026	11/07/2026	20,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Redes Hidrosanitarias y aparatos sanitarios							
Suministro, transporte e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de paredes de baños; Incluye filetes, pega, emboquillado y todo lo	Suministro, transporte e instalación de baldosa egeo de 30x60 para enchape de piso de baños (*Antideslizante*); Incluye filetes, pega,	Suministro e instalación de puerta en madera entomborada 0.8 x 2.05 m para baños; Incluye ala, marco, bisagras, chapa y todo lo	Suministro e instalación de puerta batiente metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1 x 2.05 m para bodega; Incluye ala	Suministro e instalación de puerta corrediza metalica en lamina galvanizada calibre 22 de 1.03 x 2.05 m para curto util y acces a	Suministro e instalación ventana en alumino 50-20 blanco de 60x40 y vidrio transparente 4mm; Incluye sistema de seguridad, y	Suministro e instalación de pasamanos abatible en tuberia de	Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable de 45cm x 80 cm en calibre 20 satinado TIPO SOCODA para division orinal.; Incluye accesorios de fijacion, y todo lo necesario para su	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Incluye Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica según diseño estructural	Suministro, transporte y montaje de fachada en persiana o celosia traslucida 3mm de policarbonato tipo aerolux o similar con
Suministro, transporte e instalación de codos 45° en tuberia PVC	22/03/2026	25/04/2026	34,00	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tuberia PVC DN 200 (8")	12/04/2026	16/05/2026	34,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%

Suministro, transporte e instalación de tuberia sanitaria PVC D= 2" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0.05 M de	23/03/2026	11/04/2026	19,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 4". Incluye sifon, union, codos, accesorios y	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto sanitario de 2". Incluye sifon, union, codos, accesorios y	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de sanitario redondo linea push	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de lavamanos con pedestal	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de orinal en porcelana con	10/05/2026	6/06/2026	27,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de incrustaciones cromadas .	31/05/2026	20/06/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso central	14/06/2026	4/07/2026	20,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D= 4" incluye union, codos, accesorios, cama de arena E= 0.05 M de	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte e instalación de tuberia hidraulica PVC D=	28/06/2026	11/07/2026	13,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Punto hidraulico de 1/2". Incluye, union, codos, accesorios y todo	6/07/2026	24/07/2026	18,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion valvula bola PVC 1/2" lisa soldable.	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro e instalacion de tapa registro 15x15	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 60x60cm	19/04/2026	3/05/2026	14,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Caja de inspeccion de 80x80cm	20/04/2026	9/05/2026	19,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Cubiertas e impermeabilizaciones							
Suministro e instalación de Teja UPVC (policlorulo de vinilo no	5/07/2026	1/08/2026	27,00	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro, transporte y montaje de canoa metálica. Se incluye	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalaciones Redes Electricas							
suministro transporte e instalcion de luminaria de 10477 lumenes	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida para iluminacion,	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de tablero de iluminación de fabricacion	5/07/2026	2/08/2026	28,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tablero de medida en energia normal según diagrama unifilar, en lamina colled rolled calibre 16, pintura	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #8 bifásico con tierra	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 bifásico con tierra para alimentación de circuitos ramales 2N12+1N12 AWG, lo	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC canalizada de 2" incluye excavacion	15/03/2026	11/04/2026	27,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 3/4" la cual incluye todo lo necesario para su correcto funcionamineto	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1/2" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de tuberia emt 1" la cual incluye	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #6 bifásico con tierra	5/04/2026	25/04/2026	20,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro transporte e instalación de circuito #12 monofásico con	11/07/2026	18/07/2026	7,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de salida de potencia normal,	12/07/2026	25/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de luminaria led tipo proyector para	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
suministro transporte e instalcion de luminaria de ojo buey de 18	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de punta captadora 16mmx 100 cm	19/07/2026	8/08/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Tub IMC Ø1"x3m (Bajantes)	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de Caja ratwell métalica4x4 la cual incluye	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de CONECTOR BIMETALICO	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de alamborn de aluminio 2/0. Para anillo	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
soportes tipo obo para autosoportar el anillo superiror lo cual	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0	26/07/2026	8/08/2026	13,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m	2/08/2026	15/08/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA. AÉREA 2F	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE VARILLA 5/8"	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO RAMAL 2X12(F)	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE	5/07/2026	1/08/2026	27,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METÁLICA	5/07/2026	25/07/2026	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 VOLTIOS EN EMT Ø 3/4" CON	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA EMT 1/2"	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMÉTICA	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Pintura y Demarcacion de Elementos							
Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con	12/07/2026	8/08/2026	27,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de *pintura acrilica antideslizante para*	2/08/2026	22/08/2026	20,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura tipo koraza o exteriores (*tres*	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Estuco plastico (dos manos) sobre	12/07/2026	1/08/2026	20,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro y Aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 dos manos (color a	26/07/2026	15/08/2026	20,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacion			1 día				
suministro e instalacion de asiento sin espaldar para graderias			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de porterias integradas de futbol y	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de bancas para equipos REFERENCIA	5/07/2026	15/08/2026	41,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA PAISAJISMO	19/07/2026	1/08/2026	13,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de PISO ENCAUCHETADO en lamina de	5/07/2026	8/08/2026	34,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalacion de marcador electronico led deportivo digital	5/07/2026	18/07/2026	13,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria Cerramiento							
Construcción de mamposteria en ladrillo tipo bocadillo a la vista			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso en madera							
Suministro e instalacion de piso plastico negro calibre 6 tableros OSB pretegidos con capara asfaltica (proteccion antihumedad)	5/07/2026	8/08/2026	34,00	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%
OE							
Demolición de concreto reforzado h>15 cm, incluye el traslado interno en obra a la zona de cargue, y cargue final y disposición de material	22/02/2026	28/03/2026	34,00	0,65%	0,13%	0,58%	-0,45%
Excavación manual de material común de H: 2 - 4 m, incluye el traslado	22/02/2026	4/04/2026	41,00	1,75%	0,29%	0,99%	-0,70%
Excavación mecanica y manual de material de lleno con rocas,	22/02/2026	4/04/2026	41,00	2,76%	0,46%	2,76%	-2,30%
Mamposteria estructural de 0- 2 m de altura	12/04/2026	2/05/2026	20,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 2 - 4 m de altura	26/04/2026	9/05/2026	13,00	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria estructural de 4 - 6 m de altura	26/04/2026	16/05/2026	20,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Caisson de 1 metro efectivo de ancho, incluye refuerzo de acero, excavacion D=1,2 en material comun	1/03/2026	18/04/2026	48,00	5,48%	0,00%	7,40%	-7,40%
Suministro e instalación de tuberia de 4" para manejo provisional de agua	1/03/2026	7/03/2026	6,00	0,06%	0,00%	0,05%	-0,05%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 200 mm (8")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada de 250 mm (10")	22/03/2026	11/04/2026	20,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de techo provisional en plastico y guadua	22/02/2026	14/03/2026	20,00	0,22%	0,07%	0,18%	-0,10%
Lleno con afirmado compactado manual debidamente compactado; al 90% del proctor modificado capas de maximas de 15cm	8/02/2026	4/04/2026	55,00	3,81%	1,43%	3,43%	-2,00%
Demolición de concreto reforzado y roca dentro de caisson, incluye trasiego en sitio de obra y cargue final y disposición de material	1/03/2026	4/04/2026	34,00	0,50%	0,00%	0,42%	-0,42%
Suministro transporte e instalación de Acero estructural HSS para elementos de cubierta según diseño ASTM A500, A572, A992, A53, A106, de acero al carbón de alta resistencia, según diseño, incluye suministro de materiales, anclajes, soldaduras, soportes, instalación, pintura anticorrosivo y acabado final en pintura epóxica, andamio certificado	17/05/2026	20/06/2026	34,00	10,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Suministro e instalación de caja de inspección de 80x80x 2 m de altura	12/04/2026	25/04/2026	13,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETIE	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICACIÓN RETILAP	17/08/2026	1/09/2026	15,00	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
PAGA	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,81%	0,28%	0,08%	0,20%
PMT	2/12/2025	1/09/2026	273,00	0,52%	0,18%	0,05%	0,13%
TOTAL					**39,14%**	**34,23%**	**-4,91%**

3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
Juan Pablo Villa Roldan	Directora de Interventoría	201
Johan Lopez	Residente de Interventoría	201
Luis H Henao	Inspectora de Interventoría	159
[illegible]	Profesional SST	201

VISTA DE LA OBRA

