Asunto:	**ACTA DE SUPERVISION ASPECTOS ADMINISTRATIVOS N°02**
Fecha:	5 de agosto del 2026
N° de contrato:	CAR-2026-004
Fecha de celebración:	19 de marzo de 2026
Fecha Acta de Inicio:	20 de marzo de 2026
CDP	116 del 02 de febrero de 2026
CDP Adición	252 del 26 de mayo de 2026
RP	309 del 19 de marzo de 2026
RP Adición	493 del 03 de junio de 2026
Objeto:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ**
Plazo:	El plazo para la ejecución del contrato es de tres (03) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2026.
Valor:	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($47.696.000,00) M/CTE
Valor según otrosí N°01	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($23.848.000,00) /CTE., incluido IVA
Valor total:	SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($71.544.000,00) M/CTE, incluido IVA
Forma de pago:	La Entidad efectuará al Contratista pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de combustible suministrado y revisado, aceptado y recibido a satisfacción por la Supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Supervisión de conformidad con los precios unitarios y el valor de los productos suministrados. Para la realización de los pagos parciales al contratista, se deberá allegar los siguientes documentos: • Factura electrónica o su equivalente del servicio prestado. • Acta de Supervisión. • Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda o en su defecto planilla de pago de seguridad social.

	• Planillas de seguridad profesionales y personal que tenga a cargo para el desarrollo de las actividades a desarrollar. • Bitácora de horas alquiladas con operador, indicando la fecha de inicio y fin, así como el lugar en el que se prestó el servicio. • Documentación de la maquinaria para su tránsito, conforme la norma lo establece. **Parágrafo 1.** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. **Parágrafo 2.** El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **Parágrafo 3**. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Parágrafo 4.** Cada Pago estará sujeto al programa anual Mensualizado de Caja PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. **Parágrafo 5.** El Municipio realizara un último pago correspondientes al 10% del valor del contrato una vez se liquide el contrato.
Contratista:	ISMAEL CARVAJAL ALVAREZ
CC:	96.352.403
Supervisor o interventor:	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Cédula de Ciudadanía N°	1.094.947.712

ASPECTOS TÉCNICOS

CONDICIONES INICIALES Y LAS EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD SEGUÍN OTROSI N°01	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler de retroexcavadora de oruga con operador	Hora	88	44	132	$542.000	**$71.544.000**
TOTAL							**$71.544.000**

CANTIDAD DE HORAS SUPERVISADAS DE UTILIZACIÓN DEL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA

FECHA	ACTIVIDAD	INICIO HOROMETRO	FINALIZACIÓN DE HOROMETRO	TOTAL, HORAS TRABAJADAS
21/03/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe en la vereda Birmania	1617	1625,4	8,4
22/03/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe en la vereda Birmania	1625,4	1632,9	7,5
23/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1632,9	1640,5	7,6
24/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1640,5	1648,5	8
25/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1648,5	1652,8	4,3
26/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1652,8	1660	7,2
28/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1667,8	1674	6,2
11/04/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe y ampliación de vía en algunos tramos en la vía que conduce de El Doncello a	1697,5	1705,3	7,8

	la inspección de Berlín			
13/04/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe y ampliación de vía en algunos tramos en la vía que conduce de El Doncello a la inspección de Berlín	1705,3	1712,7	7,4
14/04/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe y ampliación de vía en algunos tramos en la vía que conduce de El Doncello a la inspección de Berlín	1712,7	1720,3	7,6
01/05/2026	Se retoma labores de remoción de derrumbes en la vía que conduce a la inspección de Berlín, ya que debido a las fuertes lluvias registradas no se había podido trabajar. Sin embargo, durante labores realizadas el día de hoy, se vuelve a presentar lluvia en la zona, lo que obliga a parar actividades.	1720,3	1722,5	2,2
02/05/2026	Se continua con el retiro de los derrumbes presentes en esta vía, principalmente uno que está obstaculizando el paso en su totalidad, esperando que el clima permita trabajar y remover totalmente los derrumbes pendientes. El clima vuelve a impedirnos continuar con el trabajo, obligando a parar las labores.	1722,5	1725,1	2,6
19/05/2026	Se retoma labores de remoción de derrumbes en la zona de la vía que conduce a la inspección de Berlín, con el ánimo de finalizar estas remociones pendientes. Las condiciones climáticas nuevamente, vuelve a pararnos el trabajo.	1725,1	1727,5	2,4
20/05/2026	Se continua con los trabajos de remoción de derrumbes y ampliación en la vía en algunos puntos de está vía que conduce a la inspección de Berlín.	1727,5	1732,1	4,6

21/05/2026	Se continúa trabajando en la remoción del último derrumbe pendiente por remover, para dejar la vía despejada y con facilidad de movilidad de los vehículos sobre este corredor vial que conduce a la inspección de Berlín.	1732,1	1733,8	1,7
03/06/2026	Se inicia labores de retiro de derrumbes en la vía de la vereda Las Brisas, los cuales impiden el paso de vehículos. Sin embargo, el trabajo se tuvo que parar porque se continúan presentando fuertes lluvias en el municipio, la ola invernal en estos últimos 3 meses ha sido muy fuerte. Se suspende actividad hasta que el clima mejore un poco, ya que la zona intervenida es inestable y angosta, representando peligro para laborar en esas condiciones.	1738,1	1740,6	2,5
09/06/2026	Aprovechando que las condiciones climáticas en la zona han mejorado, se retoma las actividades de remoción de derrumbes buscando habilitar ´paso en la vía de la vereda Las Brisas.	1740,6	1746,8	6,2
10/06/2026	Se continua las labores de remoción de derrumbes en la zona, esperando que el clima permita continuar con los trabajos para finalizar y habilitar la vía para vehículos. Se presento una brisa leve, sin embargo, se espera el clima mañana sea favorable para continuar con el avance en los trabajos.	1746,8	1752,6	5,8
11/06/2026	Después de presentar una llovizna durante el transcurso de la mañana, se continua en la tarde removiendo derrumbes que se encuentran a lo largo de un tramo de la vía de la vereda Las Brisas.	1752,6	1756,9	4,3
12/06/2026	A pesar que el día este nublado, se continúa realizando los trabajos de remoción de los derrumbes, faltan ya solo 3 tramos por ser intervenidos para habilitar el paso vehicular.	1756,9	1762,6	5,6

13/06/2026	Se continua con la remoción de los derrumbes y se pudo finalizar los trabajos en la zona, dejando destapada la vía de la vereda Las Brisas.	1762,6	1768,9	6,3
17/069/2026	Se inicia actividades de movimiento y limpieza de la vía con la maquinaria, para remover los derrumbes presentes en varios puntos en la vía de la vereda Morrocoy. Además, se hizo intervención en zanjas que fueron destruidas con el desbordamiento de la quebrada, lo cual también afectaba el paso por la vía.	1772,3	1782	9,7
18/06/2026	Se continua desde temprano las labores de remoción de los derrumbes existentes, se trabajo hasta dejar la vía sin presencia de derrumbes, garantizando una vía habilitada para el paso de vehículos.	1782	1788,2	6,2
TOTAL EJECUTADO				**132.2**

NOTA: El contratista en su informe relaciona que asume el tiempo de más que haya laborado la maquinaria, sin generar un costo adicional en el valor contratado, esto en caso de presentarse la situación.

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Que el día 19 de marzo de 2026 se firmó el presente contrato de alquiler entre el **MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ e ISMAEL CARVAJAL ALVAREZ**
2. Que el día 19 de marzo de 2026 se realizó el pago de la estampilla pro universidad por el valor de $238.000.
3. Que el día veinte (20) de marzo de 2026 el contratista remitió al supervisor la póliza N°CHU-100076188, amparando el municipio con los siguientes amparos, y fueron aprobadas el mismo día:

Póliza	Aseguradora	Clase de Amparo	% Asegurado	Valor Asegurado	Vigencia	Aprobación	
						Si	No
CHU-100076188	Seguros Mundial	**Cumplimiento del Contrato**	10% del valor total del contrato	$ 4.769.600,00	19/03/2026 A 19/12/2026	X	
CHU-100076188	Seguros Mundial	**Prestaciones Sociales**	5% del valor total del contrato	$ 2.384.800,00	19/03/2026 A 19/06/2029	X	
CHU-100076188	Seguros Mundial	**Calidad del Servicio**	10% del valor total del contrato	$ 4.769.600,00	19/03/2026 A 19/12/2026	X	

251

CHU-100014203	Seguros Mundial	Responsabilidad civil	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	19/03/2026 A 19/06/2026	X	

4. Que el 20 de marzo de 2026 se suscribió el acta de inicio del contrato de alquiler CAR-2026-004.
5. Que el 26 de marzo de 2026 se adelantó visita de seguimiento y supervisión al trabajo adelantado por la maquinaria contratada.
6. Que el Que el once (11) de mayo de 2026 el contratista presentó la siguiente información:
   - Informe con la relación de cantidades entregadas y registro fotográfico
   - Planillas de pago de seguridad social
   - Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda o en su defecto planilla de pago de seguridad social
   - Factura electrónica No FEVT-97
   - Certificación bancaria
   - Bitácora de horas trabajadas
   - Documentación de la maquinaria para su tránsito
7. Que el día veintiuno (21) de mayo de 2026, se realizó visita de seguimiento y supervisión al trabajo adelantado por la maquinaria contratada.
8. Que el día veintiuno (21) de mayo de 2026, se suscribió acta de supervisión para pago parcial N°01.
9. Que el veintiséis (26) de mayo de 2026, se expide comprobante de egreso G-001-00000383 como soporte de pago del pago parcial N°01
10. Que el día dos (02) de junio de 2026, se suscribió adición N°01 al contrato por valor de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($23.848.000,00) /CTE., incluido IVA.
11. Que el día nueve (09) de junio de 2026, el contratista actualizó las polizas N°CHU-100076188 anexo 1, amparando el municipio con los siguientes amparos, y fueron aprobadas el mismo día:

Póliza	Aseguradora	Clase de Amparo	% Asegurado	Valor Asegurado	Vigencia	Aprobación	
						Si	No
CHU-100076188	Seguros Mundial	Cumplimiento del Contrato	10% del valor total del contrato	$ 7.154.400,00	02/06/2026 A 19/12/2026	X	
CHU-100076188	Seguros Mundial	Prestaciones Sociales	5% del valor total del contrato	$ 3.577.200,00	02/06/2026 A 19/06/2029	X	

CHU-100076188	Seguros Mundial	**Calidad del Servicio**	10% del valor total del contrato	$ 7.154.400,00	02/06/2026 A 19/12/2026	X	
CHU-100014203	Seguros Mundial	**Responsabilidad civil**	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	19/03/2026 A 19/06/2026	X	

12. Que el día doce (12) de junio de 2026, se realizó visita de seguimiento y supervisión al trabajo adelantado por la maquinaria.
13. Que el día diecinueve (19) de junio se suscribió acta de supervisión N°01
14. Que el día diecinueve (19) de junio se suscribió acta de terminación del contrato
15. Que el día 24 de julio de 2026 se realizó el pago de la estampilla pro universidad de la adición por el valor de $119.000.
16. Que el cinco (05) de agosto de 2026 el contratista presentó la siguiente información para la liquidación:
    - Informe con la relación de cantidades entregadas y registro fotográfico
    - Planillas de pago de seguridad social
    - Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda o en su defecto planilla de pago de seguridad social
    - Factura electrónica No FEVA-51
    - Oficio de expensas del contrato
    - Bitácora de horas trabajadas
    - Documentación de la maquinaria para su tránsito
17. Que el día cinco (05) de agosto, se suscribió acta de supervisión N°02

Seguridad Social del contratista:

- **Contratista**

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Marzo	Ismael Carvajal	Contratista	9501573509	2026/04/08	I	$800.000	$228.000
Abril	Ismael Carvajal	Contratista	9503250008	2026/05/04	I	$2.400.000	$684.000
Mayo	Ismael Carvajal	Contratista	9504813037	2026/06/03	I	$2.400.000	$684.000
Mayo	Ismael Carvajal	Contratista	9508970483	2026/08/04	N	$3.199.459	$912.000
Junio	Ismael Carvajal	Contratista	9506407853	2026/07/06	I	$1.600.000	$456.000

- **Operador maquinaria**

252

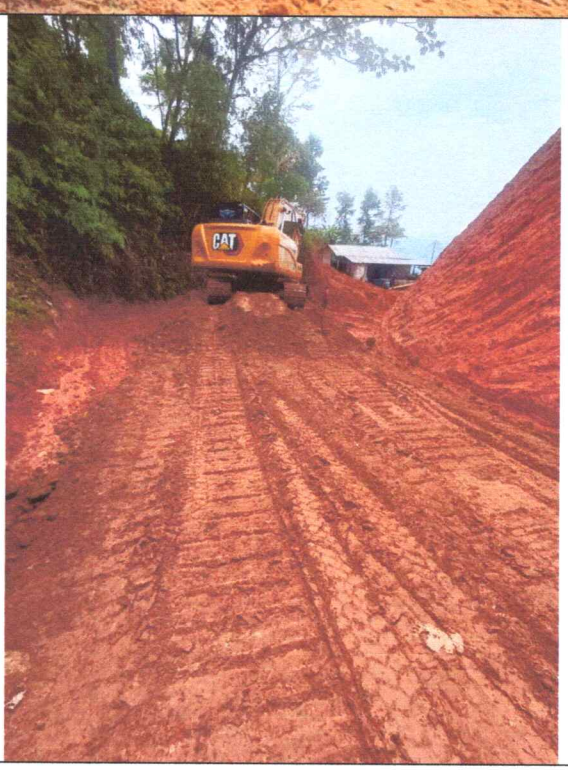
MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Marzo	Orlando Cardoso	Operador maquinaria	9502787112	2026/04/08	E	$1.750.905	$542.300
Abril	Orlando Cardoso	Operador maquinaria	9504270332	2026/05/05	E	$1.750.905	$542.300
Mayo	Victor Montenegro	Operador maquinaria	9505935516	2026/06/02	E	$1.750.905	$438.700
Mayo	Victor Montenegro	Operador maquinaria	9507537828	2026/07/06	N	$1.750.905	$103.600
Junio	Yeison Hoyos	Operador maquinaria	9507446203	2026/07/06	E	$1750.905	$542.300

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS:



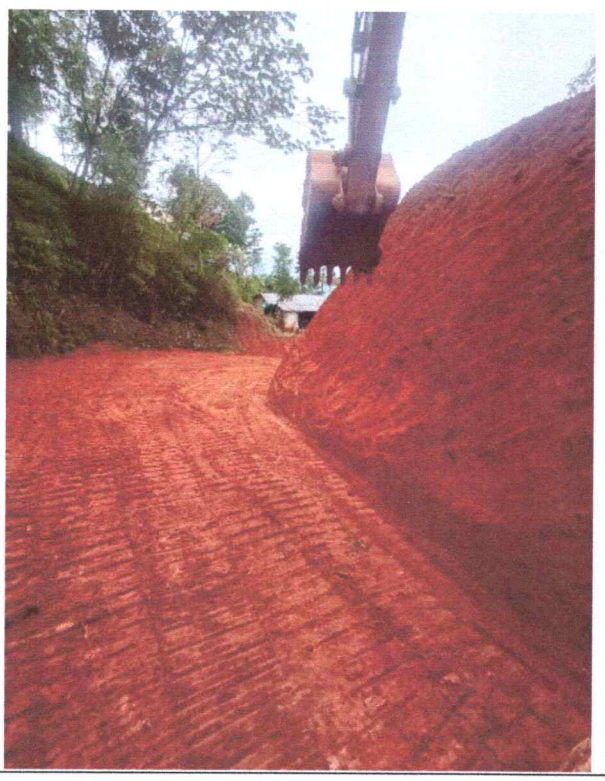

14 PRO+ 5G




CAT









Dirección:	Cra. 4ª Cll. 3ª Esq.	Proyectó: Kassandra Andrea Orozco
Sitio Web:	www.eldoncello-caqueta.gov.co	Elaboró: Kassandra Andrea Orozco
Teléfono:	Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101	Revisó: Kassandra Andrea Orozco
Correo electrónico:	contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co	Aprobó: Kassandra Andrea Orozco

ANEXOS:

- Acta de visita N°01 a los veintiséis (26) días del mes de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026).
- Acta de visita N°02 a los veintiún (21) días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026).
- Acta de visita N°03 a los doce (12) días del mes de junio de Dos Mil Veintiséis (2026).

El Doncello Caquetá, a los cinco (05) días del mes de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026).

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s
Supervisora
