2723

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			Puerto Gaitán Paraíso Natural
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	**Versión:** 05	**Vigencia:** 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 05 de Agosto de 2026 **1090-1496**

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: Karen P
Fecha 05 AGO 2026
Hora: 5:30pm

Doctora:
ALEJANDRA CASTILLO BLANDÓN
Secretaria de Contratación
Alcaldía de Municipal
Puerto Gaitán - Meta

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1700 DE 2025 CON NUMERO DE PROCESO LP-SI-009-2025 CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"** IDENTIFICADO CON BPIN No. 2024505680013.

ASUNTO: Remisión de Informe Mensual No. 03 del Contrato de la Referencia.

Cordial saludo

En cumplimiento de lo establecido en el proceso contractual y con el propósito de garantizar la adecuada gestión administrativa del Contrato de Obra No. 1700 de 2025, me permito remitir el **Informe Mensual de Obra No. 03**, correspondiente al periodo comprendido entre el **01 y el 30 de Abril de 2026**, documento entregado por el contratista de Obra **"UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25"** ante la Interventoría y la Supervisión.

Es pertinente señalar que el informe fue objeto de revisión técnica y administrativa por parte del Contratista de Interventoría "**CONSORCIO INTERFISCA GAITÁN 25**", el cual emitió concepto favorable de aprobación del reporte al considerar que la información refleja de manera adecuada el avance y cumplimiento de las actividades ejecutadas. De igual manera, se cuenta con el aval de la supervisión, lo que otorga plena validez a lo consignado en el documento y respalda la gestión realizada en el marco de la ejecución contractual.

La presente remisión tiene como finalidad dejar constancia formal de la aprobación y aval obtenidos a la presente documentación, y poner a disposición de la Secretaría de Contratación el informe para su incorporación al expediente contractual.

LUZ ADRIANA HERNÁNDEZ CANTOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (E)
DECRETO ADMINISTRATIVO No. 0157 DEL 03 DE AGOSTO DE 2026

Elaboró: Maria Luisa Beltran Acevedo
Profesional de Apoyo CPS No. 1399 de 2025

Revisó: Luz Adriana Hernández Cantor
Directora Técnica de Seguimiento de Proyectos de Infraestructura

Anexos: Una (01) Carpeta en Físico.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2724

CONSORCIO
INTERFISCA GAITAN25

Mayo 11 de 2026, Puerto Gaitán, Meta.

Ingeniero:
CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura
Supervisor del contrato
Municipio de Puerto Gaitán – Meta

*Referencia: Contrato de Obra No. 1700. De 2025 "**CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".***

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1739 DE 2025.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META.

Asunto: Remisión de informe Nro. 03 Contrato de Obra.

Cordial saludo,

En mi calidad de Interventoría del contrato, me permito remitir a la supervisión el Informe de Obra Nro.03, para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026, el cual contiene el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de las actividades ejecutadas durante dicho periodo.

Una vez realizada la revisión integral del documento y sus respectivos soportes, el equipo técnico de interventoría avala el contenido del informe, al evidenciar que las actividades reportadas corresponden con lo ejecutado en campo, cumplen con las especificaciones técnicas del contrato y se ajustan a las condiciones reales de ejecución del proyecto.

En ese sentido, se deja constancia de la validación del informe presentado, considerando que refleja de manera adecuada el avance de obra, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista durante el periodo evaluado.

Agradezco la atención prestada y quedo atento(a) a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente.

Fernando villegas

ING. FERNANDO JOSE VILLEGAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
NIT 902017391-1

CORRESPONDENCIA
RADICADO Nº 51-0081
HORA: 4:52PM
12 MAY 2026
RECIBIDO

2725

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

Recibido Interventoría Diaz 05-05-2026 9:50 am

Puerto Gaitán Meta 05 de mayo de 2026

Señores:
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ
Representante legal.

*Referencia: Contrato de Obra No. 1700. De 2025 "**CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".***

Asunto: Entrega de informe Nro.03

Cordial saludo,

Atendiendo las obligaciones especificas contractuales, la Unión Temporal Confisca 25, hace entrega del informe N°3, el cual relaciona las actividades constructivas, administrativas y demás sujetas al objeto contractual, realizadas durante el periodo transcurrido entre el 01 al 30 de abril del presente año.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación y/o sugerencia a la información entregada.

Cordialmente,

R.L LEGAL ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
C.C 1.023.879.760

276

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

Recibo Interventoría 05-05-2026 9:50 am

Puerto Gaitán Meta 05 de mayo de 2026

Señores:
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ
Representante legal.

*Referencia: Contrato de Obra No. 1700. De 2025 "**CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".***

Asunto: Entrega de informe Nro.03

Cordial saludo,

Atendiendo las obligaciones especificas contractuales, la Unión Temporal Confisca 25, hace entrega del informe N°3, el cual relaciona las actividades constructivas, administrativas y demás sujetas al objeto contractual, realizadas durante el periodo transcurrido entre el 01 al 30 de abril del presente año.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación y/o sugerencia a la información entregada.

Cordialmente,

R./ LEGAL ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
C.C 1.023.879.760

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA			
	Infraestructura			
	Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITÁN, FEBRERO DE 2026

Contrato de obra No.: 1700 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

Radicado No: Fecha:

Periodo del informe: Desde: 01 / 04 / 2026 Hasta: 30 / 04 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	***INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO***					
1,01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			
2	***INFORMACION DEL CONTRATO***					
2,01	**Cuadro de trazabilidad:** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			
3	***INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO***					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			
4	***INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO***					
4,01	Plan de inversión de anticipo				X	
4,02	Información de avance financiero de la obra	X	X			
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de obra.				X	
4,04	Acta de desembolso del anticipo de obra (si aplica).				X	
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra .	X	X			
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			
4,07	Ordenes de pago efectuadas (Desembolso de anticipo y pagos parciales)	X	X			
5	***INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO***					
5,01	Grafico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas. (financiera, por porcentajes)	X	X			
5,02	Cuadro de avance con acumulado mes a mes	X	X			
5,03	Control del estado del tiempo resumen (día a día mes reportado en el informe)	X	X			
6	***INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO***					
6,01	Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo) propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) y organigrama de personal	X	X			
6,02	Certificado del representante legal y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matricula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			
6,03	Paz y salvo de los trabajadores (retirados al corte)	X	X			
7	***CUADRO DE LABORATORIOS TOMADOS EN EL PERIODO***	X	X			
8	***CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)***	X	X			
9	***INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO***					
9,01	Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del proyecto (prediales, ambientales, de construcción en otros).	X	X			
9,02	Seguimiento a la disposición de materiales	X	X			
9,03	Registro fotográfico de actividades ambientales	X	X			
10	***ANEXOS***					
10,01	Actas de socialización (informes inicial)	X	X			
10,02	Actas de vecindad (de apertura y cierre - si aplica)	X	X			

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA			
	Infraestructura			
	Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITÁN, FEBRERO DE 2026

Contrato de obra No.: 1700 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

Radicado No: Fecha:

Periodo del informe: Desde: 01 / 04 / 2026 Hasta: 30 / 04 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
10,03	Relación de comités de obra. (según orden cronológico y debidamente numeradas)	X	X			
10,04	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			
10,05	Cartera topográfica de obra (si en el periodo se ejecutaron labores que requiere esta labor)	X	X			
10,06	Calidad de los materiales, ensayos de laboratorio y certificados de calidad, (anexar de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales , anexando certificados de los materiales y de calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos)	X	X			
10,07	*Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)*				X	
10,08	Informe de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en el cual se registre el seguimiento de las capacitaciones, entregas de EPP, protocolos de prevención y mitigación del COVID-19 y su seguimiento mediante registros (planillas, formatos, etc.) debidamente firmados por el profesional correspondiente	X	X			
10,09	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			
10,1	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratados por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			
10,11	Ordenes de operación de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de obra (si aplica)				X	
10,12	Aprobación del contrato fiduciario (si aplica)				X	
10,13	*Informe del contrato fiduciario del anticipo del contrato de obra (si aplica)*				X	
10,14	Anexos (cada ficha de PMA o PAGA genera una evidencia la cual debe venir relacionada en el informe de interventoria, asi como del cumplimiento de los deberes derivados de los actos administrativos, registro fotográfico), firmado por el profesional (si aplica).	X	X			
11	***CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)***	X	X			

NOTA: Se aclara asi alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaria de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoria, deben allegarse por la interventoria conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.

Revisó y aprobó:

Fernando Villegas

ING. FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ
R/L CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORÍA

Nota: se debe paginar los informes

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CONTRATO DE OBRA No. 1700 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025

"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"

UNION TEMPORAL CONFISCA25

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 03
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
DEPARTAMENTO DEL META
ABRIL DE 2026

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 4
1.2 LOCALIZACIÓN 4
1.3 DESCRIPCIÓN Y ALANCE DEL PROYECTO 5
1.4 POBLACIÓN BENEFICIADA 5
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 7
3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO 8
3.1 PÓLIZAS SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 8
3.2 PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO 9
4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 10
4.1 AVANCE FINANCIERO 10
4.2 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 10
4.3 RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES 12
4.4 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS (DESEMBOLSO DE ANTICIPO Y PAGOS PARCIALES) 13
5. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 14
5.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO 14
5.2 CUADRO DE AVANCE CON ACUMULADO MES A MES 16
5.2.1 Control de avance físico vs programado 17
5.3 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO 35
5.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 36
5.4.1 Actividades administrativas 36
5.4.2 Descripción de las actividades de obra ejecutadas 38
6. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 47
6.1 RELACIÓN DE PERSONAL 47
6.1.1 Personal profesional y operativo 47
6.1.2 Personal modificado 48
6.1.3 Organigrama de personal 48
6.2 CERTIFICADO DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO Y/O REVISOR FISCAL DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES MENSUALES 48

6.3 PAZ Y SALVO DE LOS TRABAJADORES RETIRADOS 48
7. ENSAYOS DE LABORATORIO 49
8. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 49
9. INFORMACIÓN AMBIENTAL 49
10. CONCLUSIONES 50
11. LISTADO DE ANEXOS 52

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro No. 1 Porcentajes de distribución por Rango de Edad Puerto Gaitán 6
Cuadro No. 2 Trazabilidad del contrato 7
Cuadro No. 3 Póliza de cumplimiento, según suscripción del contrato 8
Cuadro No. 4 Póliza responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento – RCE, suscripción del contrato 8
Cuadro No. 5 Póliza de cumplimiento, según acta de inicio 9
Cuadro No. 6 Póliza responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento – RCE, según acta de inicio 9
Cuadro No. 7 Resumen financiero del contrato 10

LISTA DE GRÁFICOS

Pág.

Gráfico No. 1 Población desagregada por área 6
Gráfico No. 2 Avance mensual programado vs ejecutado en pesos 14
Gráfico No. 3 Avance mensual programado vs ejecutado en porcentaje 14
Gráfico No. 4 Avance acumulado programado vs ejecutado en pesos 15
Gráfico No. 5 Avance acumulado programado vs ejecutado en porcentaje 15
Gráfico No. 6 Organigrama del personal 48
Gráfico No. 7 Relación de maquinaria y equipos 49

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

La administración municipal de Puerto Gaitán - Meta mediante el proceso de licitación pública No. LP-SI-009-2025 con objeto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", adjudicó el contrato de obra No. 1700 del día 11 de diciembre de 2025 a la UNION TEMPORAL CONFISCA25. Igualmente, procedió a contratar la correspondiente interventoría, mediante el proceso de selección por Concurso de Méritos No. CM-SI-009-2025 bajo el objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", el cual fue adjudicado y celebrado con el contrato No. 1739 del día 16 de diciembre de 2025 al CONSORCIO INTERFISCA GAITAN 25; bajo la supervisión del ing. CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES – secretario de infraestructura.

1.2 LOCALIZACIÓN

La obra se localiza en el municipio de Puerto Gaitán Meta, en el predio con coordenadas: 4°18'44.56'' N y 72°4'51.96'' O y dirección: 1) Calle 10 # 6-60 y 2) Carrea 7 # 10-22 en el barrio Centro.

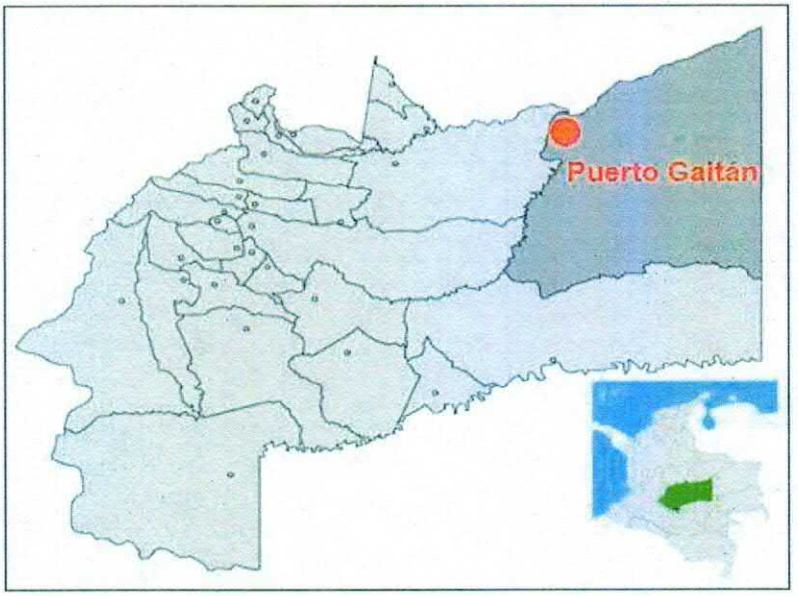




Imagen No. 1 Localización geográfica de la obra

1.3 DESCRIPCIÓN Y ALANCE DEL PROYECTO

El proyecto está orientado a la construcción de la sede de la fiscalía general de la nación en el municipio de Puerto Gaitán - Meta, cubriendo la necesidad de una infraestructura idónea para su funcionamiento, el cual consta de:

- Demoliciones
- Movimiento de tierras
- Cimientos, estructuras y elementos menores de concreto
- Muros, pañetes y pinturas
- Pisos, enchapes y urbanismo
- Cielorasos y cubiertas
- Carpintería metálica
- Redes hidrosanitarias y pluviales
- Sistema de aire acondicionado
- Red eléctrica, voz y datos
- Zonas verdes

1.4 POBLACIÓN BENEFICIADA

Conforme a lo indicado en el estudio previo el número de personal beneficiario se presenta a continuación:

RANGO DE EDAD	TOTAL, POBLACIÓN
0-14	15.409
15-19	4.270
20-59	23.774
59- MAS	2.674
VALIDACIÓN	**46.127**

Cuadro No. 1 Porcentajes de distribución por Rango de Edad Puerto Gaitán
Fuente: Tomado del estudio previo - Censo DANE 2018 - Proyección 2024 para el municipio de Puerto Gaitán - Meta.

Por otra parte, el estudio previo menciona que de acuerdo con el Censo DANE 2018 - Proyección 2024 para el municipio de Puerto Gaitán - Meta, la distribución poblacional por áreas geográficas del municipio de Puerto Gaitán que se presenta en el siguiente gráfico, refleja que el 49.22% de la población reside en la zona urbana del municipio, mientras que en la zona rural se ubica el 50.78% de la población".

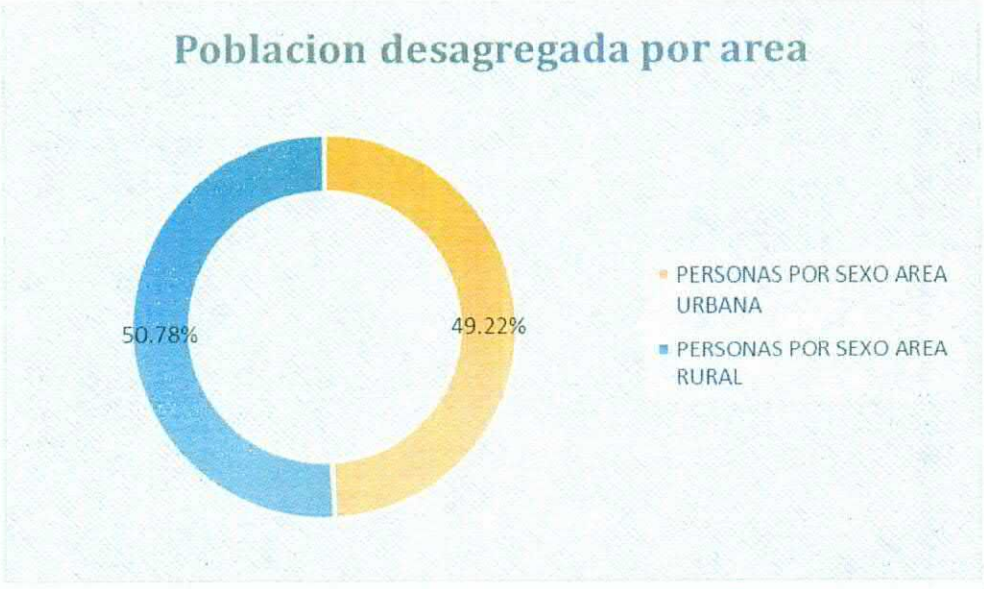


Gráfico No. 1 Población desagregada por área
Fuente: Tomado del estudio previo - Censo DANE 2018 - Proyección 2024 para el municipio de Puerto Gaitán – Meta

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la trazabilidad del contrato.

No. PROCESO:	LP-SI-009-2025
No. Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	1700 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25 NIT. 902.013.442-0 R. /L ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO C.C 1.023.879.760 DE BOGOTÁ D.C CORREO: consfisca25@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO:	**VALOR VIGENCIA 2025:** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE **($597.596.423,40)** **VALOR VIGENCIA 2026:** TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE **($3.404.853.335,06)** **VALOR TOTAL:** CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($4.002.449.758,46)**
PLAZO EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25 FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1739 DE 2025. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"
SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO:	DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2027

Cuadro No. 2 Trazabilidad del contrato

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el control de pólizas aprobadas según vigencias, valor y coberturas exigidas en minuta, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos durante la ejecución del contrato.

3.1 PÓLIZAS SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						
No. DE LA PÓLIZA	11-44-101278512 ANEXO 0						
AMPAROS	**VIGENCIA**						**VALOR ASEGURADO**
	DESDE			**HASTA**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Cumplimiento del contrato	11	12	2025	15	04	2027	$ 400.244.975,85
Estabilidad y calidad de la obra	11	12	2026	11	12	2031	$ 400.244.975,85
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11	12	2025	15	12	2029	$ 200.122.487,92
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							**13/02/2026**

Cuadro No. 3 Póliza de cumplimiento, según suscripción del contrato

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
No. DE LA PÓLIZA	11-40-101088990 ANEXO 0						
AMPAROS	**VIGENCIA**						**VALOR ASEGURADO**
	DESDE			**HASTA**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Predios labores y operaciones	11	12	2025	15	12	2026	$ 875.452.500,00
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							**13/02/2026**

Cuadro No. 4 Póliza responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento – RCE, suscripción del contrato

3.2 PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						
No. DE LA PÓLIZA	11-44-101278512 ANEXO 2						
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	16	02	2026	21	06	2027	$ 400.244.975,85
Estabilidad y calidad de la obra	16	02	2027	16	02	2032	$ 400.244.975,85
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16	02	2026	20	02	2030	$ 200.122.487,92
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							02/03/2026

Cuadro No. 5 Póliza de cumplimiento, según acta de inicio

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
No. DE LA PÓLIZA	11-40-101088990 ANEXO 2						
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	16	02	2026	20	02	2027	$ 875.452.500,00
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:							02/03/2026

Cuadro No. 6 Póliza responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento – RCE, según acta de inicio

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 AVANCE FINANCIERO

A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato en el cual se relaciona solo los pagos de las actas parciales, teniendo en cuenta que el contrato no contempla anticipo

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.002.449.758,46	100%
VALOR ACTAS PARCIALES	N. A	N. A
VALOR TOTAL PAGADO	N. A	N. A
VALOR POR COBRAR	**$ 4.002.449.758,46**	**100%**

Cuadro No. 7 Resumen financiero del contrato

4.2 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El contrato contempla los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

- **CDP vigencia 2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP DE INVERSIÓN			
NÚMERO DE CDP	DIS.2026000018		
FECHA DE EXPEDICIÓN	ENE.02.2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	DIC.31.2026
N° DE CERTIFICADO DE PAA	2026000098	**N° DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD**	SCD.20260000022
CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL CDP	**$ 3.404.853.335,06**	SON. TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSIÓN	
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL

PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PRODUCTO MGA	"4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA"
NUMERO DE PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)

Tabla 1 Relación de disponibilidad presupuestal vigencia 2026

- **CDP vigencia 2025**

• *INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP DE INVERSIÓN*			
NÚMERO DE CDP	DIS.2025002862		
FECHA DE EXPEDICIÓN	OCT.02.2025	**FECHA DE VENCIMIENTO**	DIC.31.2025
N° DE CERTIFICADO DE PAA	2025001964	**N° DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD**	SCD.20250001546
CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL CDP	**$ 597.596.423,40**	SON. QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSIÓN	
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PRODUCTO MGA	"4501040 - INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA"
NUMERO DE PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)

Tabla 2 Relación de disponibilidad presupuestal vigencia 2025

4.3 RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

El contrato contempla los siguientes registros presupuestales:

- **Registro presupuestal vigencia 2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN			
NÚMERO DE REGISTRO	**RES.2026000007**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	ENE.02.2026
NÚMERO DE CDP	DIS.2026000018		
DOCUMENTO DE CONTROL	0002 - CONTRATOS DE OBRAS	**No. CONTRATO / RESOLUCIÓN**	1700
BENEFICIARIO	**902.013.442 - UNION TEMPORAL CONFISCA 25**		
CONCEPTO DEL REGISTRO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	**$ 3.404.853.335,06**	SON. TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSIÓN	
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)

Tabla 3 Relación de registro presupuestal vigencia 2026

- **Registro presupuestal vigencia 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN			
NÚMERO DE REGISTRO	**RES.2025004274**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	DIC.22.2025
NÚMERO DE CDP	DIS.2025002862		
DOCUMENTO DE CONTROL	0002 - CONTRATOS DE OBRAS	**No. CONTRATO / RESOLUCIÓN**	1700
BENEFICIARIO	**902.013.442- UNION TEMPORAL CONFISCA 25**		
CONCEPTO DEL REGISTRO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	**$ 597.596.423,40**	SON. QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSIÓN	
SECCIÓN	FDS-FONDO DE SEGURIDAD - FONSET
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SECTOR	FDS-1-45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA	FDS-1-4501-FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)
SUBPROGRAMA	FDS-1-4501-1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PROYECTO	2024505680013 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - 45 - GOBIERNO TERRITORIAL - 4501 - FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)

Tabla 4 Relación de registro presupuestal vigencia 2025

4.4 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS (DESEMBOLSO DE ANTICIPO Y PAGOS PARCIALES)

El contrato no contempla anticipo y a la fecha no se han realizado pagos parciales.

5. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

5.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

A continuación, se presenta el avance programado vs ejecutado de las actividades ejecutadas.

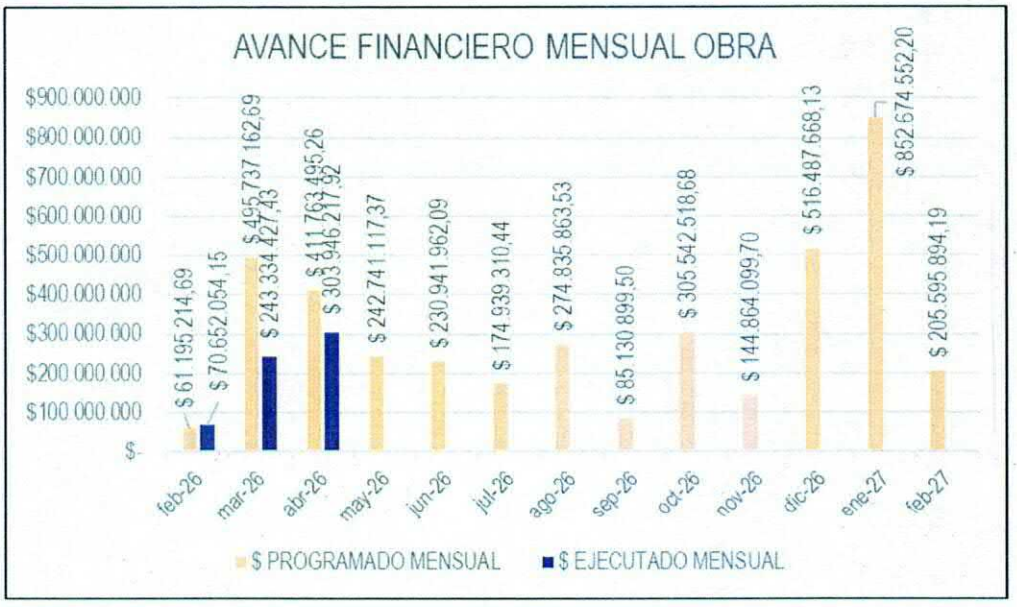


Gráfico No. 2 Avance mensual programado vs ejecutado en pesos

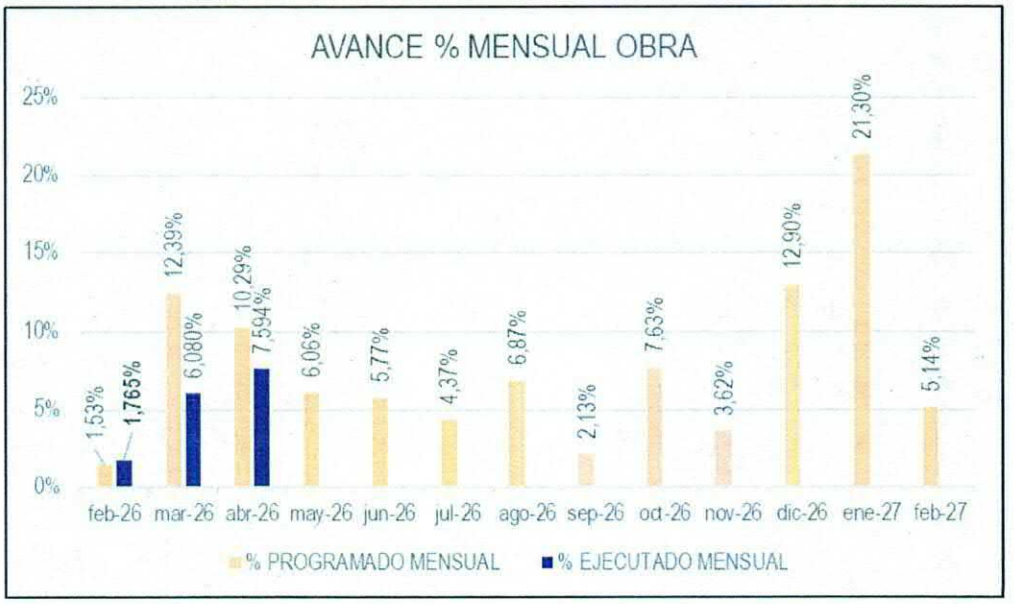


Gráfico No. 3 Avance mensual programado vs ejecutado en porcentaje

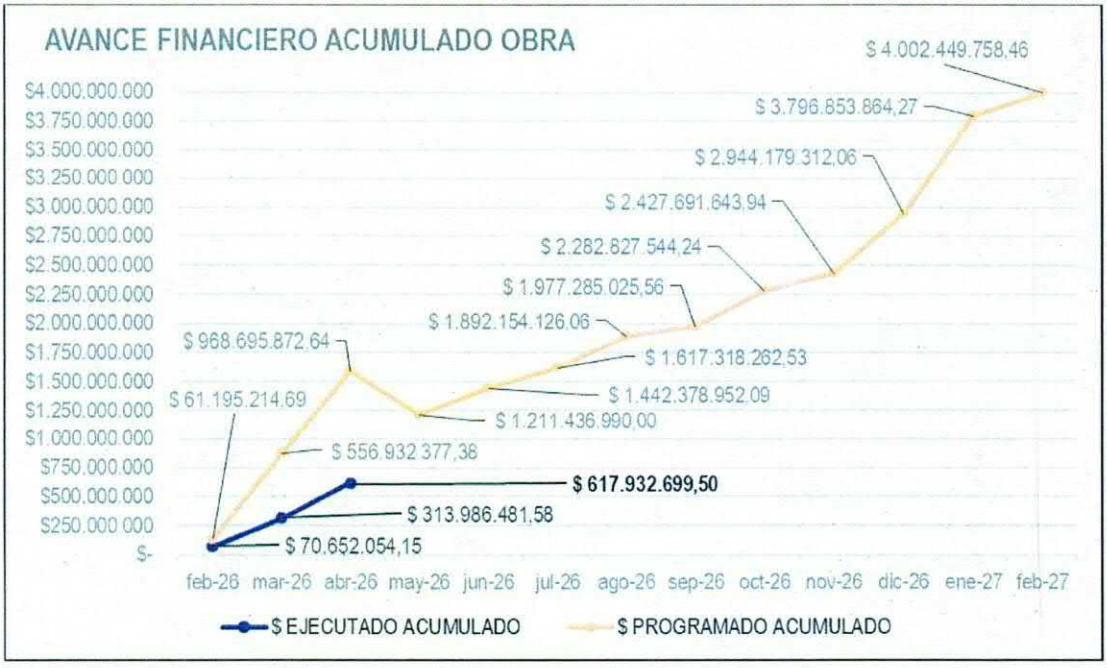


Gráfico No. 4 Avance acumulado programado vs ejecutado en pesos

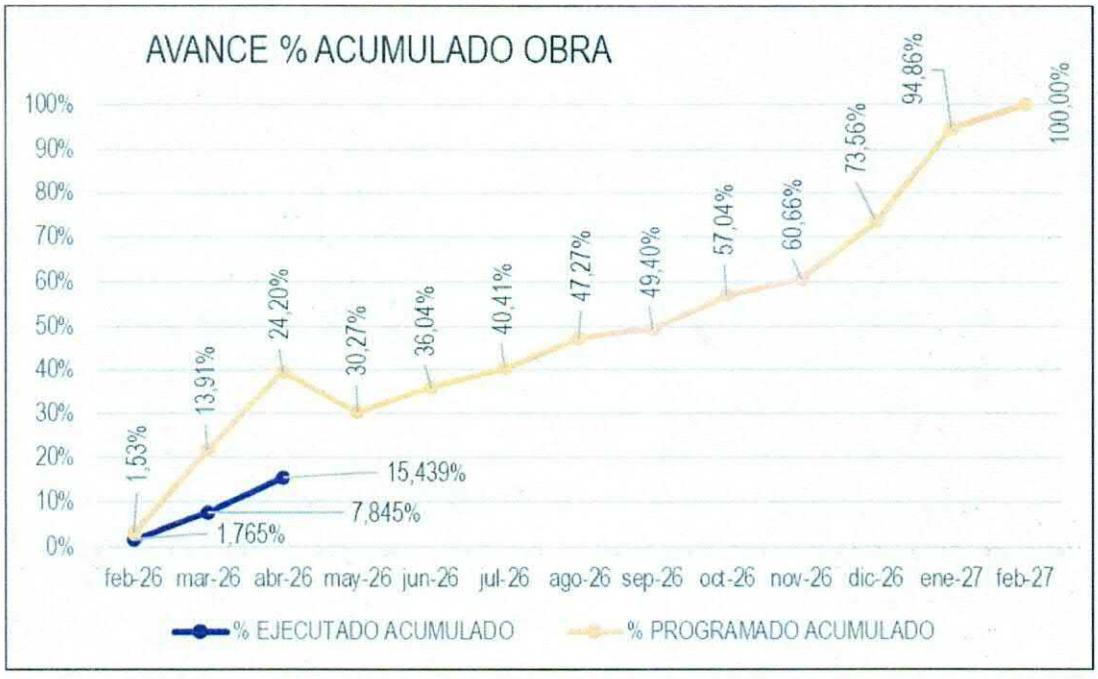


Gráfico No. 5 Avance acumulado programado vs ejecutado en porcentaje

5.2 CUADRO DE AVANCE CON ACUMULADO MES A MES

A continuación, se presentan las cantidades ejecutadas durante el periodo, así como las cantidades acumuladas.

PROGRAMACIÓN					EJECUTADO					DESVIACIÓN MENSUAL		DESVIACIÓN ACUMULADA	
MES	MENSUAL		ACUMULADO		MES	MENSUAL		ACUMULADO					
	VALOR	%	VALOR	%		VALOR	%	VALOR	%				
feb-26	$ 61.195.214,69	1,53%	$ 61.195.214,69	1,53%	feb-26	$ 70.652.054,15	1,765%	$ 70.652.054,15	1,765%	-$ 9.456.839,46	0,24%	-$ 9.456.839,46	0,24%
mar-26	$ 495.737.162,69	12,39%	$ 556.932.377,38	13,91%	mar-26	$ 243.334.427,43	6,080%	$ 313.986.481,58	7,845%	$ 252.402.735,26	-6,31%	$ 242.945.895,80	-6,07%
abr-26	$ 411.763.495,26	10,29%	$ 968.695.872,64	24,20%	abr-26	$ 303.946.217,92	7,594%	$ 617.932.699,50	15,439%	$ 107.817.277,34	-2,69%	$ 350.763.173,14	-8,76%
may-26	$ 242.741.117,37	6,06%	$ 1.211.436.990,00	30,27%	may-26			$ 617.932.699,50	15,439%	$ 242.741.117,37	-6,06%		
jun-26	$ 230.941.962,09	5,77%	$ 1.442.378.952,09	36,04%	jun-26			$ 617.932.699,50	15,439%	$ 230.941.962,09	-5,77%		
jul-26	$ 174.939.310,44	4,37%	$ 1.617.318.262,53	40,41%	jul-26			$ 617.932.699,50	15,439%	$ 174.939.310,44	-4,37%		
ago-26	$ 274.835.863,53	6,87%	$ 1.892.154.126,06	47,27%	ago-26			$ 617.932.699,50	15,439%	$ 274.835.863,53	-6,87%		
sep-26	$ 85.130.899,50	2,13%	$ 1.977.285.025,56	49,40%	sep-26			$ 617.932.699,50	15,439%	$ 85.130.899,50	-2,13%		
oct-26	$ 305.542.518,68	7,63%	$ 2.282.827.544,24	57,04%	oct-26			$ 617.932.699,50	15,439%	$ 305.542.518,68	-7,63%		
nov-26	$ 144.864.099,70	3,62%	$ 2.427.691.643,94	60,66%	nov-26			$ 617.932.699,50	15,439%	$ 144.864.099,70	-3,62%		
dic-26	$ 516.487.668,13	12,90%	$ 2.944.179.312,06	73,56%	dic-26			$ 617.932.699,50	15,439%	$ 516.487.668,13	-12,90%		
ene-27	$ 852.674.552,20	21,30%	$ 3.796.853.864,27	94,86%	ene-27			$ 617.932.699,50	15,439%	$ 852.674.552,20	-21,30%		
feb-27	$ 205.595.894,19	5,14%	$ 4.002.449.758,46	**100,00%**	feb-27			$ 617.932.699,50	**15,439%**	$ 205.595.894,19	-5,14%		
TOTAL	$ 4.002.449.758,46	100,00%			TOTAL	$ 617.932.699,50	15,44%						

Tabla 5 Cantidades ejecutadas y acumuladas

5.2.1 Control de avance físico vs programado

Durante este período, se ejecutó un avance mensual del **7,594%,** equivalente a **TRESCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($303.946.217,92),** frente a un avance mensual programado del **10,29%,** correspondiente a CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTISÉIS CENTAVOS. ($ 411.763.495,26).

De igual manera se cuenta con un avance acumulado correspondiente a 15,439% equivalente a **SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 617.932.699,50)** Lo anterior representa una menor ejecución acumulada frente a lo programado del 8,76%, tal como se detalla en la siguiente tabla:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
1. PRELIMINARES					**$ 53.165.894,56**									
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	1.101,4400	$ 3.573,41	$ 3.935.896,71				1101,44	100,00 %	$ 3.935.896,71	0,0000	0,00%	$ 0,00
1,02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	732,7200	$ 8.164,82	$ 5.982.526,91	573,2400	78%	$ 4.680.401,42	573,24	78,23 %	$ 4.680.401,42	159,4800	21,77%	$ 1.302.125,49
1,03	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	48,9500	$ 434.003,88	$ 21.244.489,93				48,95	100,00 %	$ 21.244.489,93	0,0000	0,00%	$ 0,00
1,04	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	21,0000	$ 87.788,13	$ 1.843.550,73				21,00	100,00 %	$ 1.843.550,73	0,0000	0,00%	$ 0,00
1,05	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE	M2	338,8400	$ 14.784,06	$ 5.009.430,89				338,84	100,00 %	$ 5.009.430,89	0,0000	0,00%	$ 0,00

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
	CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.													
1,06	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	338,8400	$ 19.936,73	$ 6.755.361,59				338,84	100,00 %	$ 6.755.361,59	0,0000	0,00%	$ 0,00
1,07	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	5,0000	$ 40.824,08	$ 204.120,40				5,00	100,00 %	$ 204.120,40	0,0000	0,00%	$ 0,00
1,08	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	5,0000	$ 32.659,27	$ 163.296,35				5,00	100,00 %	$ 163.296,35	0,0000	0,00%	$ 0,00
1,09	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	10,0000	$ 19.179,97	$ 191.799,70				10,00	100,00 %	$ 191.799,70	0,0000	0,00%	$ 0,00
1,10	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	299,0900	$ 8.644,12	$ 2.585.369,85				0,00	0,00%	$ 0,00	299,0900	100,00%	$ 2.585.369,85
1,11	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	401,6500	$ 13.071,21	$ 5.250.051,50				401,65	100,00 %	$ 5.250.051,50	0,0000	0,00%	$ 0,00
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS					**$ 228.565.834,38**									
2,01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE	M3	296,19	$ 123.948,19	$ 36.712.214,40	24,86	8%	$ 3.081.352,00	105,77	35,71 %	$ 13.110.000,06	190,4200	64,29%	$ 23.602.214,34
2,02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	479,16	$ 141.475,66	$ 67.789.477,25	247,00	52%	$ 34.944.488,02	247,00	51,55 %	$ 34.944.488,02	232,1600	48,45%	$ 32.844.989,23

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
2,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20,7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	64,00	$ 791.806,67	$ 50.675.626,88	11,38	18%	$ 9.010.759,90	47,24	73,81 %	$ 37.404.947,09	16,7600	26,19%	$ 13.270.679,79
2,04	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	49,98	$ 164.052,08	$ 8.199.322,96				0,00	0,00%	$ 0,00	49,9800	100,00%	$ 8.199.322,96
2,05	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 KG/CM2 O 3.9 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	49,98	$ 1.304.305,58	$ 65.189.192,89				0,00	0,00%	$ 0,00	49,9800	100,00%	$ 65.189.192,89
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					**$ 397.998.387,23**									
3,01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	4,11	$ 765.478,57	$ 3.146.116,92				0,00	0,00%	$ 0,00	4,1100	100,00%	$ 3.146.116,92
3,02	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	14.016,32	$ 9.269,90	$ 129.929.884,77	3937,45	28%	$ 36.499.767,76	7117,27	50,78 %	$ 65.976.381,17	6.899,0500	49,22%	$ 63.953.503,60
3,03	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	127,78	$ 10.020,32	$ 1.280.396,49				0,00	0,00%	$ 0,00	127,7800	100,00%	$ 1.280.396,49
3,04	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,65	$ 1.108.306,18	$ 35.077.890,60	4,81	15%	$ 5.330.952,73	20,05	63,35 %	$ 22.221.538,91	11,6000	36,65%	$ 12.856.351,69

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
3,05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	26,65	$ 1.187.623,39	$ 31.650.163,34	13,09	49%	$ 15.545.990,18	13,09	49,12 %	$ 15.545.990,18	13,5600	50,88%	$ 16.104.173,17
3,06	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	29,21	$ 978.215,29	$ 28.573.668,62				0,00	0,00%	$ 0,00	29,2100	100,00%	$ 28.573.668,62
3,07	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	27,56	$ 1.538.402,88	$ 42.398.383,37				0,00	0,00%	$ 0,00	27,5600	100,00%	$ 42.398.383,37
3,08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	24,11	$ 1.581.881,51	$ 38.139.163,21				0,00	0,00%	$ 0,00	24,1100	100,00%	$ 38.139.163,21
3,09	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20	ML	241,26	$ 188.951,20	$ 45.586.366,51				0,00	0,00%	$ 0,00	241,2600	100,00%	$ 45.586.366,51
3,10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,61	$ 2.270.034,57	$ 1.384.721,09				0,00	0,00%	$ 0,00	0,6100	100,00%	$ 1.384.721,09
3,11	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,77	$ 2.644.834,51	$ 2.036.522,57	3,22	418 %	$ 8.516.367,12	3,22	418,18 %	$ 8.516.367,12	-2,4500	-318,18%	-$ 6.479.844,55
3,12	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,72	$ 1.127.064,93	$ 811.486,75				0,00	0,00%	$ 0,00	0,7200	100,00%	$ 811.486,75
3,13	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,08	$ 1.333.266,82	$ 9.439.529,09				0,00	0,00%	$ 0,00	7,0800	100,00%	$ 9.439.529,09

Puerto Gaitán – Meta

311 386 8024

Confisca25@gmail.com

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
3,14	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0,20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	161,74	$ 158.795,56	$ 25.683.593,87				0,00	0,00%	$ 0,00	161,7400	100,00%	$ 25.683.593,87
3,15	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1,67	$ 1.712.874,27	$ 2.860.500,03				0,00	0,00%	$ 0,00	1,6700	100,00%	$ 2.860.500,03
4. ACERO ESTRUCTURAL					**$ 210.477.986,47**									
4,01	PERFIL CAJON PHR NEGRO 305X80X2,5MM CAL 12	ML	331,22	$ 255.727,34	$ 84.702.009,55				0,00	0,00%	$ 0,00	331,2200	100,00%	$ 84.702.009,55
4,02	PERFIL CIRC. 4" (E=4 MM) FY = 3500 KG/CM2	ML	9,00	$ 30.066,41	$ 270.597,69				0,00	0,00%	$ 0,00	9,0000	100,00%	$ 270.597,69
4,03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	3.568,18	$ 35.173,50	$ 125.505.379,23				0,00	0,00%	$ 0,00	3.568,1800	100,00%	$ 125.505.379,23
5. MUROS, PAÑETES Y PINTURAS					**$ 356.615.072,38**									
5,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	1.372,13	$ 64.279,85	$ 88.200.310,58				0,00	0,00%	$ 0,00	1.372,1300	100,00%	$ 88.200.310,58
5,02	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	549,39	$ 41.735,29	$ 22.928.950,97				0,00	0,00%	$ 0,00	549,3900	100,00%	$ 22.928.950,97
5,03	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	2.541,88	$ 29.815,65	$ 75.787.804,42				0,00	0,00%	$ 0,00	2.541,8800	100,00%	$ 75.787.804,42
5,04	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	549,39	$ 16.026,36	$ 8.804.721,92				0,00	0,00%	$ 0,00	549,3900	100,00%	$ 8.804.721,92
5,05	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2.156,37	$ 13.296,56	$ 28.672.303,09				0,00	0,00%	$ 0,00	2.156,3700	100,00%	$ 28.672.303,09

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
5,06	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR (DOS MANOS)	M2	33,46	$ 34.470,13	$ 1.153.370,55				0,00	0,00%	$ 0,00	33,4600	100,00%	$ 1.153.370,55
5,07	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,54	$ 2.119.002,09	$ 3.263.263,22				0,00	0,00%	$ 0,00	1,5400	100,00%	$ 3.263.263,22
5,08	ESTUCO PLÁSTICO	M2	2.156,37	$ 19.236,94	$ 41.481.960,31				0,00	0,00%	$ 0,00	2.156,3700	100,00%	$ 41.481.960,31
5,09	GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES)	M2	549,39	$ 157.124,06	$ 86.322.387,32				0,00	0,00%	$ 0,00	549,3900	100,00%	$ 86.322.387,32
	6. PISOS Y ENCHAPES				**$ 158.764.922,87**									
6,01	PISO EN CERÁMICA 33.8X33.8CM ANTIDESLIZANTE	M2	28,62	$ 96.181,02	$ 2.752.700,79				0,00	0,00%	$ 0,00	28,6200	100,00%	$ 2.752.700,79
6,02	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0,30 X0,60 BRILLANTE	M2	18,41	$ 142.067,86	$ 2.615.469,30				0,00	0,00%	$ 0,00	18,4100	100,00%	$ 2.615.469,30
6,03	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	104,30	$ 108.681,15	$ 11.335.443,95				0,00	0,00%	$ 0,00	104,3000	100,00%	$ 11.335.443,95
6,04	LOSETA A-40; 600X200X600 MM	M2	33,19	$ 165.266,08	$ 5.485.181,20				0,00	0,00%	$ 0,00	33,1900	100,00%	$ 5.485.181,20
6,05	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	143,20	$ 162.957,37	$ 23.335.495,38				0,00	0,00%	$ 0,00	143,2000	100,00%	$ 23.335.495,38
6,06	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	29,60	$ 41.916,64	$ 1.240.732,54				0,00	0,00%	$ 0,00	29,6000	100,00%	$ 1.240.732,54
6,07	PORCELANATO BEIGE	M2	344,79	$ 155.336,17	$ 53.558.358,05				0,00	0,00%	$ 0,00	344,7900	100,00%	$ 53.558.358,05
6,08	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60X10	ML	336,99	$ 43.736,79	$ 14.738.860,86				0,00	0,00%	$ 0,00	336,9900	100,00%	$ 14.738.860,86
6,09	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO DE 1/2 CAÑA	ML	96,87	$ 120.604,03	$ 11.682.912,39				0,00	0,00%	$ 0,00	96,8700	100,00%	$ 11.682.912,39
6,10	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD)	ML	29,66	$ 15.350,42	$ 455.293,46				0,00	0,00%	$ 0,00	29,6600	100,00%	$ 455.293,46
6,11	PISO ESMALTADO CON COLOR MINERAL	M2	274,10	$ 96.612,53	$ 26.481.494,47				0,00	0,00%	$ 0,00	274,1000	100,00%	$ 26.481.494,47
6,12	DEMARCACIÓN EN PISO	ML	100,41	$ 9.875,46	$ 991.594,94				0,00	0,00%	$ 0,00	100,4100	100,00%	$ 991.594,94

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
6.13	CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	67,88	$ 60.273,80	$ 4.091.385,54				0,00	0,00%	$ 0,00	67,8800	100,00%	$ 4.091.385,54
7. CIELORASOS Y CUBIERTAS					**$ 212.009.699,17**									
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. INCLUYE PERFILERIA METALICA	M2	420,27	$ 160.535,68	$ 67.468.330,23				0,00	0,00%	$ 0,00	420,2700	100,00%	$ 67.468.330,23
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	417,80	$ 262.062,95	$ 109.489.900,51				0,00	0,00%	$ 0,00	417,8000	100,00%	$ 109.489.900,51
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	176,88	$ 133.206,09	$ 23.561.493,20				0,00	0,00%	$ 0,00	176,8800	100,00%	$ 23.561.493,20
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	74,95	$ 79.435,51	$ 5.953.691,47				0,00	0,00%	$ 0,00	74,9500	100,00%	$ 5.953.691,47
7.05	CABALLETE TERMOACUST a=0.82 m. e=0,27 mm (super)	ML	24,55	$ 225.510,54	$ 5.536.283,76				0,00	0,00%	$ 0,00	24,5500	100,00%	$ 5.536.283,76
8. PUERTAS,VENTANAS,BARANDAS,VIDRIOS					**$ 314.602.317,78**									
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18.	M2	21,61	$ 819.356,13	$ 17.706.285,97				0,00	0,00%	$ 0,00	21,6100	100,00%	$ 17.706.285,97
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 10 MM	M2	46,50	$ 628.251,10	$ 29.213.676,15				0,00	0,00%	$ 0,00	46,5000	100,00%	$ 29.213.676,15
8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	0,94	$ 352.708,45	$ 331.545,94				0,00	0,00%	$ 0,00	0,9400	100,00%	$ 331.545,94

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA. CON VIDRIO 4 MM	M2	19,74	$ 871.927,21	$ 17.211.843,13				0,00	0,00%	$ 0,00	19.7400	100,00%	$ 17.211.843,13
8.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTEMA PERSIANA FIJA 3"	M2	7,53	$ 490.919,19	$ 3.696.621,50				0,00	0,00%	$ 0,00	7,5300	100,00%	$ 3.696.621,50
8.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	4,83	$ 1.398.650,32	$ 6.755.481,05				0,00	0,00%	$ 0,00	4,8300	100,00%	$ 6.755.481,05
8.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SEGURIDAD TAQUILLA MARCO EN ALUMINIO	M2	2,95	$ 286.966,77	$ 846.551,97				0,00	0,00%	$ 0,00	2,9500	100,00%	$ 846.551,97
8.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1,5 MTS.	UN	4,00	$ 365.117,21	$ 1.460.468,84				0,00	0,00%	$ 0,00	4,0000	100,00%	$ 1.460.468,84
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	M2	77,42	$ 2.968.520,32	$ 229.822.843,17				0,00	0,00%	$ 0,00	77,4200	100,00%	$ 229.822.843,17
8.10	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,98	$ 178.662,58	$ 532.414,49				0,00	0,00%	$ 0,00	2,9800	100,00%	$ 532.414,49
8.11	SANDBLASTING BLANCO	M2	59,27	$ 118.518,40	$ 7.024.585,57				0,00	0,00%	$ 0,00	59,2700	100,00%	$ 7.024.585,57
9. RED HIDRÁULICA Y VARIOS					**$ 8.304.375,69**									
9.01	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS, INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.331.396,08	$ 2.662.792,16				0,00	0,00%	$ 0,00	2,0000	100,00%	$ 2.662.792,16

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
9,02	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3"X1" INCLUYE COLLAR DE DERIVACIÓN, REGISTRO DE INCORPORACIÓN, ADAPTADOR MACHO, REGISTRO DE CORTE, MEDIDOR CHORRO MULTIPLE Y DEMÁS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 511.942,72	$ 511.942,72				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 511.942,72
9,03	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36,44	$ 12.703,77	$ 462.925,38				0,00	0,00%	$ 0,00	36,4400	100,00%	$ 462.925,38
9,04	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	62,40	$ 18.838,52	$ 1.175.523,65				0,00	0,00%	$ 0,00	62,4000	100,00%	$ 1.175.523,65
9,05	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 33.283,88	$ 99.851,64				0,00	0,00%	$ 0,00	3,0000	100,00%	$ 99.851,64
9,06	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 56.868,85	$ 796.163,90				0,00	0,00%	$ 0,00	14,0000	100,00%	$ 796.163,90
9,07	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 5.989,39	$ 293.480,11				0,00	0,00%	$ 0,00	49,0000	100,00%	$ 293.480,11
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUPERFICIAL CENTRÍFUGA, SUCCIÓN X DESCARGA DE 1" POTENCIA 1HP	UN	1,00	$ 2.301.696,13	$ 2.301.696,13				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 2.301.696,13
10. RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜES					**$ 33.589.469,71**									
	RED SANITARIA													
10,01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	49,57	$ 32.273,41	$ 1.599.792,93				0,00	0,00%	$ 0,00	49,5700	100,00%	$ 1.599.792,93
10,02	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	21,70	$ 78.033,55	$ 1.693.328,04				0,00	0,00%	$ 0,00	21,7000	100,00%	$ 1.693.328,04
10,03	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	55,00	$ 12.090,01	$ 664.950,55				0,00	0,00%	$ 0,00	55,0000	100,00%	$ 664.950,55
10,04	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 36.496,94	$ 1.021.914,32				0,00	0,00%	$ 0,00	28,0000	100,00%	$ 1.021.914,32

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
10,05	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 94.875,87	$ 379.503,48				0,00	0,00%	$ 0,00	4,0000	100,00%	$ 379.503,48
10,06	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	5,00	$ 72.838,95	$ 364.194,75				0,00	0,00%	$ 0,00	5,0000	100,00%	$ 364.194,75
10,07	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	2,00	$ 83.819,58	$ 167.639,16				0,00	0,00%	$ 0,00	2,0000	100,00%	$ 167.639,16
10,08	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 91.118,36	$ 364.473,44				0,00	0,00%	$ 0,00	4,0000	100,00%	$ 364.473,44
	RED PLUVIAL													
10,09	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	37,48	$ 40.371,09	$ 1.513.108,45				0,00	0,00%	$ 0,00	37,4800	100,00%	$ 1.513.108,45
10,10	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	44,00	$ 30.430,02	$ 1.338.920,88				0,00	0,00%	$ 0,00	44,0000	100,00%	$ 1.338.920,88
10,11	CANAL LAMINA GAL C.16 LD=1.22M,ANTICO Y PINT. INCLUYE MALLA DE PROTECCION	ML	87,57	$ 236.861,23	$ 20.741.937,91				0,00	0,00%	$ 0,00	87,5700	100,00%	$ 20.741.937,91
10,12	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,00	$ 124.656,86	$ 3.739.705,80				0,00	0,00%	$ 0,00	30,0000	100,00%	$ 3.739.705,80
	11. APARATOS SANITARIOS Y VARIOS				**$ 30.948.325,73**									
11,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	3,00	$ 458.712,20	$ 1.376.136,60				0,00	0,00%	$ 0,00	3,0000	100,00%	$ 1.376.136,60
11,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	4,00	$ 615.001,02	$ 2.460.004,08				0,00	0,00%	$ 0,00	4,0000	100,00%	$ 2.460.004,08
11,03	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	$ 1.013.842,29	$ 1.013.842,29				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 1.013.842,29
11,04	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN	UN	5,00	$ 1.117.237,34	$ 5.586.186,70				0,00	0,00%	$ 0,00	5,0000	100,00%	$ 5.586.186,70

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
	ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.													
11,05	SUMINISTRO E INTALACIÓN MUEBLE BAJO 80 CM	ML	1,72	$ 1.640.013,68	$ 2.820.823,53				0,00	0,00%	$ 0,00	1,7200	100,00%	$ 2.820.823,53
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18	M2	25,02	$ 315.805,36	$ 7.901.450,11				0,00	0,00%	$ 0,00	25,0200	100,00%	$ 7.901.450,11
11,07	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	2,00	$ 1.003.199,82	$ 2.006.399,64				0,00	0,00%	$ 0,00	2,0000	100,00%	$ 2.006.399,64
11,08	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UN	2,00	$ 758.278,47	$ 1.516.556,94				0,00	0,00%	$ 0,00	2,0000	100,00%	$ 1.516.556,94
11,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE TECHO, INCLUYE SISTEMAS CONEXIÓN Y EXTRACCIÓN POR TECHO.	UN	7,00	$ 895.275,12	$ 6.266.925,84				0,00	0,00%	$ 0,00	7,0000	100,00%	$ 6.266.925,84
	12. RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS				**$ 349.265.583,28**									
	PRELIMINARES													
12,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0,23	$ 376.196,31	$ 86.525,15				0,00	0,00%	$ 0,00	0,2300	100,00%	$ 86.525,15
	POSTES													
12,02	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	$ 2.337.037,03	$ 2.337.037,03				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 2.337.037,03
12,03	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	0,39	$ 212.893,74	$ 83.028,56				0,00	0,00%	$ 0,00	0,3900	100,00%	$ 83.028,56
	TEMPLETES													
12,04	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 2.361.491,43	$ 2.361.491,43				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 2.361.491,43

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
	TRANSFORMADORES													
12,05	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 22.035.833,60	$ 22.035.833,60				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 22.035.833,60
	ACOMETIDAS ELECTRICAS													
12,06	ACOMETIDA PARCIAL 3No.10+1No.12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	10,00	$ 36.833,83	$ 368.338,30				0,00	0,00%	$ 0,00	10,0000	100,00%	$ 368.338,30
12,07	ACOMETIDA PARCIAL 4No.8+1No.8T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15,00	$ 68.058,18	$ 1.020.872,70				0,00	0,00%	$ 0,00	15,0000	100,00%	$ 1.020.872,70
12,08	ACOMETIDA GENERAL 3X4/0+1X2/0+6T CU	ML	30,00	$ 154.099,27	$ 4.622.978,10				0,00	0,00%	$ 0,00	30,0000	100,00%	$ 4.622.978,10
12,09	ACOMETIDA PARCIAL 4No.1/0+1No.2 DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 261.588,18	$ 5.231.763,60				0,00	0,00%	$ 0,00	20,0000	100,00%	$ 5.231.763,60
12,10	ACOMETIDA PARCIAL 4No.8+1No.8T	ML	60,00	$ 60.396,07	$ 3.623.764,20				0,00	0,00%	$ 0,00	60,0000	100,00%	$ 3.623.764,20
12,11	ACOMETIDA PARCIAL 1No.12+1No.12+12T	ML	728,00	$ 28.469,84	$ 20.726.043,52				0,00	0,00%	$ 0,00	728,0000	100,00%	$ 20.726.043,52
	SALIDAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS				$ 0,00									
12,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 134.469,46	$ 403.408,38				0,00	0,00%	$ 0,00	3,0000	100,00%	$ 403.408,38
12,13	SALIDA TOMA BIFASICO (2No.10+1No.14). L=10 SUMINSTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 227.111,56	$ 227.111,56				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 227.111,56
12,14	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 199.061,47	$ 398.122,94				0,00	0,00%	$ 0,00	2,0000	100,00%	$ 398.122,94
12,15	SALIDA PARA LUMINARIA LED EN EMT SUMINSTRO E INSTALACIÓN	UN	137,00	$ 177.958,52	$ 24.380.317,24				0,00	0,00%	$ 0,00	137,0000	100,00%	$ 24.380.317,24
12,16	SALIDA PARA LUMINARIA LED DE EMERGENCIA R1 2X1,6W INCLUYE LUMINARIA	UN	16,00	$ 283.089,30	$ 4.529.428,80				0,00	0,00%	$ 0,00	16,0000	100,00%	$ 4.529.428,80

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
12,17	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED REGULADA EN CANALETA METALICA SUMINSTRO E INSTALACIÓN	UN	26,00	$ 114.053,00	$ 2.965.378,00				0,00	0,00%	$ 0,00	26,0000	100,00%	$ 2.965.378,00
12,18	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED REGULADA EMT METALICA SUMINSTRO E INSTALACIÓN	UN	13,00	$ 201.234,77	$ 2.616.052,01				0,00	0,00%	$ 0,00	13,0000	100,00%	$ 2.616.052,01
12,19	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED REGULADA PVC METALICA SUMINSTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 140.191,44	$ 1.962.680,16				0,00	0,00%	$ 0,00	14,0000	100,00%	$ 1.962.680,16
12,20	SALIDA PARA DATOS INCLUYE TOMA RJ45 CATEGORIA 6 EN CANALETA METÁLICA	UN	18,00	$ 94.197,81	$ 1.695.560,58				0,00	0,00%	$ 0,00	18,0000	100,00%	$ 1.695.560,58
12,21	SALIDA PARA CCTV	UN	21,00	$ 227.298,54	$ 4.773.269,34				0,00	0,00%	$ 0,00	21,0000	100,00%	$ 4.773.269,34
12,22	SALIDA PARA EXTRACTORES	UN	8,00	$ 199.659,98	$ 1.597.279,84				0,00	0,00%	$ 0,00	8,0000	100,00%	$ 1.597.279,84
12,23	SALIDA PARA DATOS INCLUYE TOMA RJ45 CATEGORIA 6 EN TUBERÍA EMT	UN	13,00	$ 158.268,97	$ 2.057.496,61				0,00	0,00%	$ 0,00	13,0000	100,00%	$ 2.057.496,61
	CAJAS Y CANALIZACIONES													
12,24	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	1,00	$ 1.251.756,90	$ 1.251.756,90				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 1.251.756,90
12,25	CANALIZACIÓN CS208 2 DUCTOS DE 4" PVC	ML	32,00	$ 387.936,99	$ 12.413.983,68				0,00	0,00%	$ 0,00	32,0000	100,00%	$ 12.413.983,68
12,26	CAJA PARA CAMARA DE INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA 30X30 CON TAPA	UN	1,00	$ 129.684,14	$ 129.684,14				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 129.684,14

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
12.27	CANALETA METALICA 12X5M2,4M CON DIVISIÓN BLANCA	UN	46,00	$ 174.755,85	$ 8.038.769,10				0,00	0,00%	$ 0,00	46,0000	100,00%	$ 8.038.769,10
	ESTRUCTURAS													
12.28	ESTRUCTURA LA218 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO TERMINAL CON DERIVACION	UN	1,00	$ 4.942.507,66	$ 4.942.507,66				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 4.942.507,66
12.29	ESTRUCTURA LA202 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL	UN	1,00	$ 469.329,47	$ 469.329,47				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 469.329,47
12.30	ESTRUCTURA CTU520 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN URBANO, MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 2.029.304,58	$ 2.029.304,58				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 2.029.304,58
12.31	ESTRUCTURA AE238 SUBTERRANIZACIÓN DE ACOMETIDA EN B.T.	UN	1,00	$ 2.050.623,93	$ 2.050.623,93				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 2.050.623,93
	CABLES Y TUBERÍAS													
12.32	AFLORAMIENTO DE CABLE XLPE EN TUBERIA IMC DE 4" IMC	UN	1,00	$ 2.145.957,16	$ 2.145.957,16				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 2.145.957,16
12.33	CABLE XLPE No. 1/0 15KV AL	ML	86,00	$ 40.859,87	$ 3.513.948,82				0,00	0,00%	$ 0,00	86,0000	100,00%	$ 3.513.948,82
12.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 4"	ML	12,00	$ 193.715,12	$ 2.324.581,44				0,00	0,00%	$ 0,00	12,0000	100,00%	$ 2.324.581,44
	TABLEROS													
12.35	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA PLANTA ELECTRICA 3X200A	UN	1,00	$ 507.940,52	$ 507.940,52				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 507.940,52
12.36	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN BREAKER INDUSTRIAL UNO GENERAL DE 3X200A, BREAKER 3X150A, 3X40A, 3X20A Y 2X20A	UN	1,00	$ 2.107.405,27	$ 2.107.405,27				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 2.107.405,27

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
12,37	TABLERO BISFASICO BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 330.134,98	$ 330.134,98				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 330.134,98
12,38	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOS 3X150A	UN	1,00	$ 1.575.671,42	$ 1.575.671,42				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 1.575.671,42
12,39	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOS 3X40A	UN	1,00	$ 876.340,32	$ 876.340,32				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 876.340,32
12,40	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOS 3X20A	UN	1,00	$ 744.942,32	$ 744.942,32				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 744.942,32
	VARIOS													
12,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE AE319 INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO EN BAJA TENSIÓN	UN	1,00	$ 5.411.766,63	$ 5.411.766,63				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 5.411.766,63
12,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO DE RESPLADO DE 66KW	UN	1,00	$ 128.412.342,63	$ 128.412.342,63				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 128.412.342,63
12,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES METALICA CABLOFIL 60X200X3000MM CON SOPORTE PELDAÑO DENTADO	UN	22,00	$ 364.531,42	$ 8.019.691,24				0,00	0,00%	$ 0,00	22,0000	100,00%	$ 8.019.691,24
12,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 10 KVA	UN	1,00	$ 29.672.624,32	$ 29.672.624,32				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 29.672.624,32
	ALUMBRADO EXTERNO													
12,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR SOLAR DE 100W	UN	3,00	$ 382.813,04	$ 1.148.439,12				0,00	0,00%	$ 0,00	3,0000	100,00%	$ 1.148.439,12

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
12,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DE 30W CON MÁSTIL	UN	5,00	$ 3.059.557,93	$ 15.297.789,65				0,00	0,00%	$ 0,00	5,0000	100,00%	$ 15.297.789,65
12,47	CONEXIONADO DESDE LA RED EXISTENTE A LA EDIFICACIÓN	UN	1,00	$ 5.746.266,13	$ 5.746.266,13				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 5.746.266,13
13. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO					**$ 270.309.828,40**									
13,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE 14 UND TIPO SPLIT Y 8 UND TIPO CASETTE, UNIDADES CONDENSADORAS, EVAPORADORES DE REFRIGERANTE Y NITRÓGENO, TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y CONTROL INALÁMBRICO.	UN	1,00	$ 256.679.734,40	$ 256.679.734,40				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 256.679.734,40
13,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE CONTROL 2X18	ML	140,00	$ 46.966,76	$ 6.575.346,40				0,00	0,00%	$ 0,00	140,0000	100,00%	$ 6.575.346,40
13,03	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN Y CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS EMT 3/4"	UN	40,00	$ 176.368,69	$ 7.054.747,60				0,00	0,00%	$ 0,00	40,0000	100,00%	$ 7.054.747,60
14. ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES					**$ 5.624.228,41**									
14,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA, APTA PARA JARDÍN	M3	4,36	$ 275.114,10	$ 1.199.497,48				0,00	0,00%	$ 0,00	4,3600	100,00%	$ 1.199.497,48
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLORES ISABELLA H=40CM	UN	80,00	$ 44.219,58	$ 3.537.566,40				0,00	0,00%	$ 0,00	80,0000	100,00%	$ 3.537.566,40
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL FLOR AMARILLO-H=1.0 M	UN	4,00	$ 126.737,79	$ 506.951,16				0,00	0,00%	$ 0,00	4,0000	100,00%	$ 506.951,16
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL FLOR ROSADO H=1.0 M	UN	3,00	$ 126.737,79	$ 380.213,37				0,00	0,00%	$ 0,00	3,0000	100,00%	$ 380.213,37

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
15. TRANSPORTES					**$ 261.437.279,49**									
15.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	65.165,76	$ 1.723,11	$ 112.287.772,71	38909,6	60%	$ 67.045.520,86	48429,60	74,32 %	$ 83.449.528,06	16.736,1600	25,68%	$ 28.838.244,66
15.02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	86.558,32	$ 1.723,11	$ 149.149.506,78	5558,696	6%	$ 9.578.244,66	45372,47	52,42 %	$ 78.181.749,89	41.185,8540	47,58%	$ 70.967.756,89
	COSTOS DIRECTOS				$ 2.891.679.205,55			$194.233.844,64			$408.629.389,72			$2.483.049.815,85
		29,00%		ADMINISTRACIÓN	$ 838.586.969,61			$ 56.327.814,95			$118.502.523,02			$720.084.446,60
		1,00%		IMPREVISTOS	$ 28.916.792,06			$ 1.942.338,45			$ 4.086.293,90			$ 24.830.498,16
		4,00%		UTILIDAD	$ 115.667.168,22			$ 7.769.353,79			$ 16.345.175,59			$ 99.321.992,63
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 983.170.929,89			$ 66.039.507,18			$138.933.992,51			$844.236.937,39
	SUBTOTAL OBRA CIVIL				$ 3.874.850.135,44			$260.273.351,82			$547.563.382,23			$3.327.286.753,24
16.TRAMITES DE LEGALIZACIÓN RED ELÉCTRICA					**$ 19.320.599,02**									
16.01	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE	UN	1,00	$ 6.967.961,14	$ 6.967.961,14				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 6.967.961,14
16.02	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	1,00	$ 7.711.492,01	$ 7.711.492,01				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 7.711.492,01
16.03	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑOS ELECTRICOS (TARIFA TRANSFORMADOR HASTA 112,5 KVA URBANO - VIGENCIA AÑO 2023 EMSA)	UN	1,00	$ 661.145,87	$ 661.145,87				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 661.145,87
16.04	PRUEBAS VLF CABLE RED DE MEDIA TENSIÓN	UN	1,00	$ 3.980.000,00	$ 3.980.000,00				0,00	0,00%	$ 0,00	1,0000	100,00%	$ 3.980.000,00

2454

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ABRIL 2026			EJECUTADO ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CANT. EJECUTADA	%	$	CANT. ACUMULADA	%	$	CANT. POR EJECUTAR	%	$
COSTO OBRA CIVIL					$ 3.874.850.135,44			$260.273.351,82			$547.563.382,23			$3.327.286.753,24
TRAMITES DE LEGALIZACIÓN RED ELECTRICA					$ 19.320.599,02			$ 0,00			$ 0,00			$ 19.320.599,02
VALOR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					$ 82.473.936,00		49,187%	$ 40.566.400,00		69,899%	$ 57.646.280,00		30,101%	$ 24.825.656,00
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO					$ 25.805.088,00		12,038%	$ 3.106.466,10		49,297%	$ 12.721.037,30		50,703%	$ 13.084.050,70
VR TOTAL DE OBRA					$ 4.002.449.758,46									
VR TOTAL DE OBRA EJECUTADO								$303.946.217,92			$617.932.699,53			$3.384.517.058,96
% DE AVANCE								7,594%			15,439%			84,561%
VR TOTAL DE OBRA ACUMULADO								$617.932.699,50						
% DE AVANCE ACUMULADO								15,439%						

Tabla 6 Control de programación de obra

5.3 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante este período no se registraron precipitaciones significativas, en general las condiciones climáticas se caracterizaron por tiempo seco y soleado.

FECHA	ESTADO DEL TIEMPO (en horas)			
	Seco	Nublado	Lluvias	Total, horas
miércoles, 1 de abril de 2026	9		0	9
jueves, 2 de abril de 2026	*No laborado*			
viernes, 3 de abril de 2026	*No laborado*			
sábado, 4 de abril de 2026	*No laborado*			
domingo, 5 de abril de 2026	*No laborado*			
lunes, 6 de abril de 2026	8		1	9
martes, 7 de abril de 2026	9		0	9
miércoles, 8 de abril de 2026	9		0	9
jueves, 9 de abril de 2026	9		0	9
viernes, 10 de abril de 2026	8		0	8
sábado, 11 de abril de 2026	*No laborado*			
domingo, 12 de abril de 2026	*No laborado*			
lunes, 13 de abril de 2026	9		0	9
martes, 14 de abril de 2026	9		0	9
miércoles, 15 de abril de 2026	9		0	9
jueves, 16 de abril de 2026	7		2	9
viernes, 17 de abril de 2026	8		0	8
sábado, 18 de abril de 2026	*No laborado*			
domingo, 19 de abril de 2026	*No laborado*			
lunes, 20 de abril de 2026	9		0	9
martes, 21 de abril de 2026	9		0	9
miércoles, 22 de abril de 2026	8		1	9
jueves, 23 de abril de 2026	9		0	9
viernes, 24 de abril de 2026	8		0	8
sábado, 25 de abril de 2026	*No laborado*			
domingo, 26 de abril de 2026	*No laborado*			
lunes, 27 de abril de 2026	9		0	9
martes, 28 de abril de 2026	4		5	9
miércoles, 29 de abril de 2026	6		3	9
jueves, 30 de abril de 2026	9		0	9





5.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

5.4.1 Actividades administrativas

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se adelantó la elaboración de la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01, las cuales fueron remitidas el día 16 de abril al equipo de interventoría para su revisión, validación y posterior radicación ante la entidad contratante, con el fin de dar inicio al trámite correspondiente.

De igual forma, el día miércoles 29 de abril se llevó a cabo comité de obra con la participación de las partes interesadas (fiscalía general de la Nación, supervisión del contrato, interventoría y Secretaría de Gobierno), con el propósito de revisar el avance del proyecto y definir la ruta para la aprobación de la modificatoria. En dicho espacio, la entidad manifestó que los recursos solicitados deberán ser sometidos a aprobación por parte del comité FONSET, el cual debe ser convocado y presidido por el señor alcalde, lo que implica una gestión y programación que requiere un tiempo prudencial. No obstante, se evidenció

la voluntad institucional de adelantar dicho trámite en el menor tiempo posible, con el fin de evitar retrasos en la ejecución de la obra.

Durante el presente periodo se participó en Comité Técnico con la Interventoría, en el cual se revisó el ítem correspondiente a la excavación manual, las memorias de cálculo y el Análisis de Precios Unitarios asociado. Como resultado, se acordó actualizar la documentación técnica del ítem e incorporarla dentro del trámite de la Acta Modificatoria No. 1, dejando definido el procedimiento para su posterior reconocimiento económico.

Por otra parte, el día 15 de abril se realizó la entrega del informe mensual correspondiente al mes de marzo ante la interventoría, y se avanzó en la elaboración del informe correspondiente al mes de abril.

Adicionalmente, se llevó a cabo la vinculación de personal operativo conforme a los lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y seguridad social, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante el periodo también se atendieron oportunamente los requerimientos y solicitudes de carácter administrativo por parte de la entidad contratante y la interventoría.

Finalmente, se desarrollaron actividades de suministro y acopio de materiales necesarios para la ejecución de la obra, asegurando la disponibilidad oportuna de insumos conforme a la programación establecida.





Seguimiento por las partes interesadas sobre el avance de obra y concertación de acciones para tramite de Adición Nro.01 y Prorroga Nro.01 del contrato.

5.4.2 Descripción de las actividades de obra ejecutadas

A continuación, se presenta la descripción detallada de las actividades ejecutadas durante el período, las cuales se encuentran debidamente soportadas mediante registro fotográfico como evidencia del avance físico de la obra.

1,02. DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE

Durante el presente periodo se llevó a cabo la actividad de descapote manual en áreas próximas a intervenir de la construcción con el respectivo trasiego de material sobrante.










Actividad de descapote manual

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT-902013442-0

2,01. EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE

Durante el presente periodo se realizó la actividad de excavación manual en conglomerado para la construcción y mejoramiento de zapatas.

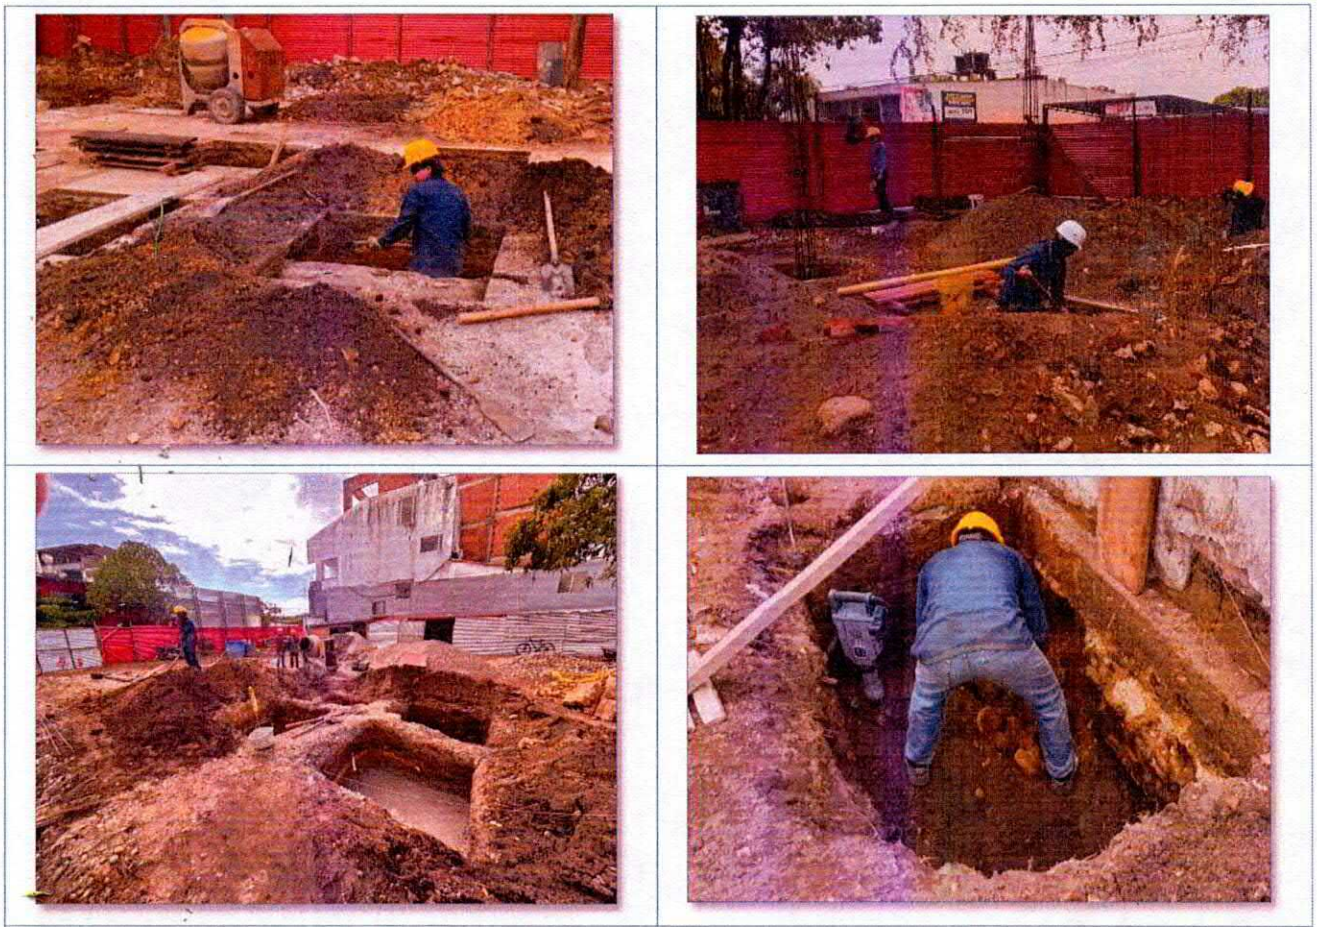

Actividad de excavación en conglomerado

Nota aclaratoria: Durante la revisión del presupuesto contractual y de la documentación que soporta la Acta Modificatoria No. 1, realizada conjuntamente con la Interventoría, se identificó que el ítem de excavación manual registrado en el presupuesto no corresponde a la profundidad de las excavaciones ejecutadas en obra. En consecuencia, el Contratista elaboró y presentó el Análisis de Precios Unitarios (APU) actualizado para el ítem "Excavación manual en conglomerado H=0,00 - 2,00 m incluye cargue", junto con la respectiva actualización de las memorias de cálculo, documentos que hacen parte del trámite de la modificatoria radicada ante la Entidad. Mientras se surte dicho trámite, la actividad continuará reportándose dentro del avance físico de la obra por ser indispensable para el desarrollo de las actividades posteriores; no obstante, las partes interesadas informaron al contratista de obra que su reconocimiento económico se efectuará únicamente una vez la modificación contractual sea aprobada y formalizada.

2,02. RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG. COMPACTACIÓN MANUAL.

Durante el presente periodo se realizó la actividad de relleno para estructuras con material granular para las zapatas de la ediciacion.







Actividad de relleno para estructuras con material granular

2,03. CONCRETO CICLÓPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA

Durante el presente periodo reportado se llevó a cabo el vaciado de concreto ciclópeo para el mejoramiento de la construcción de la cimentación.

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

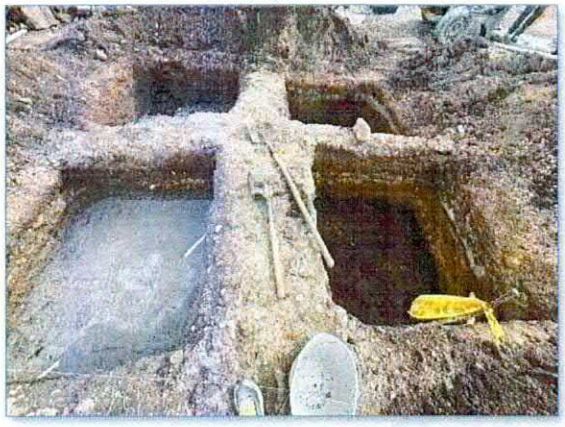

Instalacion de Concreto ciclopeo

3,02. ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE

Durante el presente periodo se realizó la actividad de suministro y acopio de acero figurado para el desarrollo de las actividades constructivas de zapatas y vigas.







Suministro, acopio y figurado de acero

3,04. ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Durante el presente periodo reportado se realizó la actividad de instalación para concreto mezclado en obra para la construcción de las zapatas de la edificación.

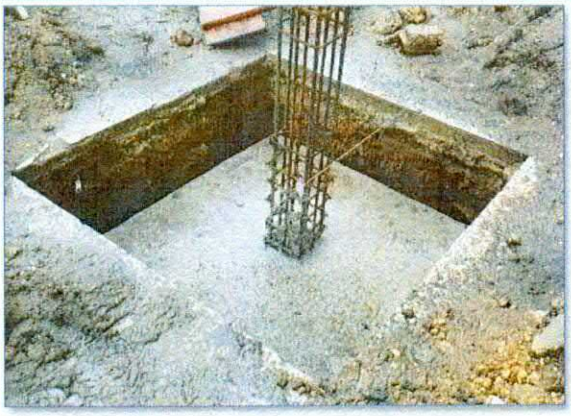







Instalación de concreto para zapatas de cimentación

3,05. VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Durante el presente periodo reportado se llevó a cabo la instalación de concreto para la construcción de las vigas de amarre de la edificación.





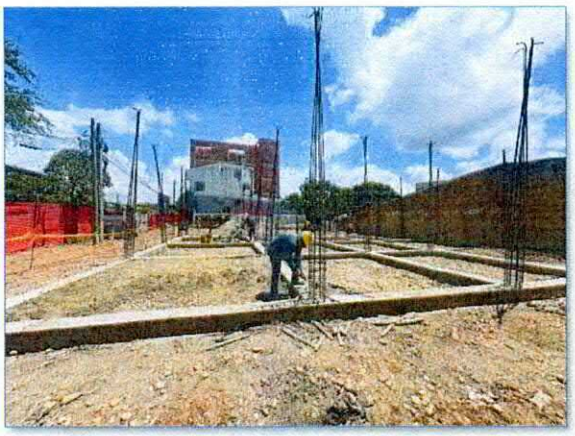




Actividad de instalación de concreto para vigas


3,11. PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Durante el presente periodo reportado se llevó a cabo la instalación de concreto para la construcción de pedestales de la edificación.

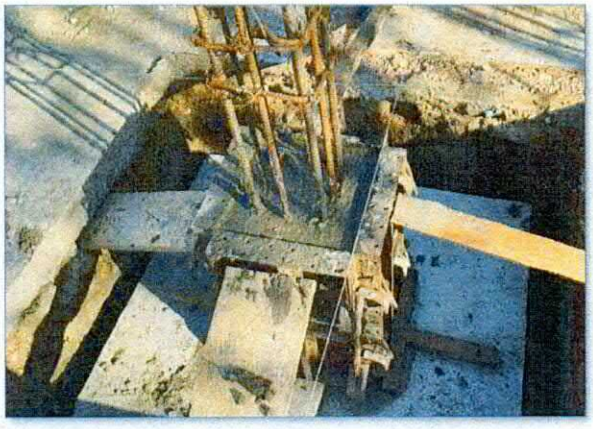






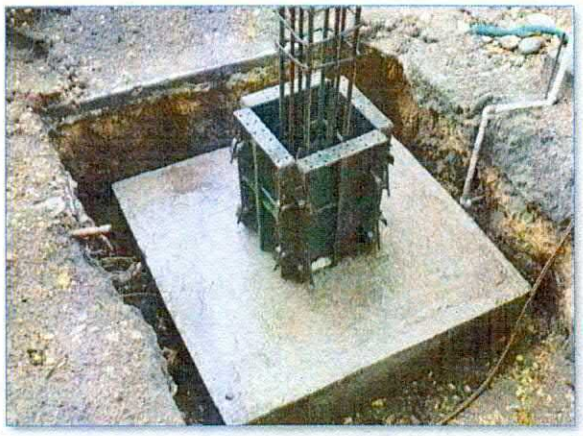

Actividad de instalación de concreto para pedestales

15,01. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

Durante el presente periodo reportado se realizó el suministro, transporte y acopio del material granular requerido para el desarrollo de las actividades constructivas,

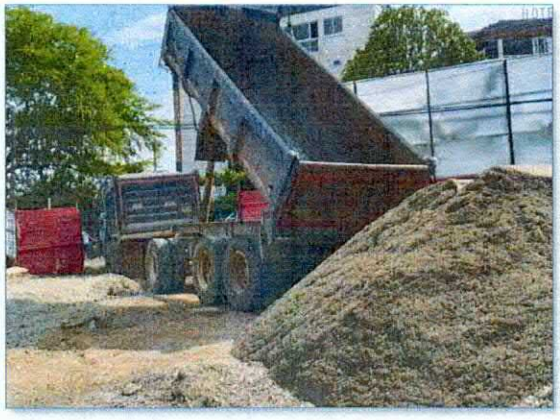







Suministro, transporte y acopio de material granular

15,02. TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.

Durante el presente periodo se realizó la actividad de acopio temporal y transporte de residuos de demolición y excavación para la respectiva disposición final y aprovechamiento de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable.





Desmonte de estructura de cubierta

6. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

6.1 RELACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se relaciona el personal profesional - operativo y modificado durante el periodo del mes de abril.

6.1.1 Personal profesional y operativo

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168896592	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168896592	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PROTEGER	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARÍO HERNÁNDEZ CALDERÓN	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSÉ SÁNCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5168896592	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	FAMISANAR	SURA

Tabla 7 Relación de personal durante el periodo

6.1.2 Personal modificado

Durante este periodo no se presentaron cambios de personal ofertado.

6.1.3 Organigrama de personal



Gráfico No. 6 Organigrama del personal

6.2 CERTIFICADO DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO Y/O REVISOR FISCAL DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES MENSUALES

Se anexa el certificado del contador público avalando el cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales durante el periodo.

6.3 PAZ Y SALVO DE LOS TRABAJADORES RETIRADOS

Durante el periodo reportado, No se realizó el retiro personal

7. ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo correspondiente al mes de abril, se realizaron los ensayos de laboratorio asociados a las actividades de cimentación de la edificación, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto y evaluar el comportamiento de los materiales utilizados en obra, conforme a la normativa aplicable. Los resultados obtenidos se anexan al presente informe y hacen parte integral de los soportes técnicos del proyecto, permitiendo validar la calidad de los materiales empleados y el adecuado desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado.





8. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipo menor empleados durante el periodo.

MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR	CANTIDAD
Retroexcavadora con llantas	1
Rotomartillo	1
Minicargador	1
Volqueta doble troque	1
Demoledor	1

Gráfico No. 7 Relación de maquinaria y equipos

9. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Se anexa el informe ambiental, el cual incluye los requerimientos ambientales aplicables, el seguimiento a la disposición de RCD y el registro fotográfico de las actividades ambientales ejecutadas durante el período.

10. CONCLUSIONES

- Durante el mes de abril de 2026, el proyecto presentó un avance físico mensual del 7,594%, equivalente a TRESCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($303.946.217,92), el cual se encuentra por debajo del avance programado del 10,29%, correspondiente a CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE ($411.763.495,26), evidenciándose una desviación en la ejecución frente a lo planificado para el periodo.

- El proyecto alcanza un avance acumulado del 15,439%, equivalente a SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($617.932.699,50), lo cual representa una menor ejecución acumulada del 8,76% frente a lo programado, situación que se asocia principalmente a la necesidad de tramitar y aprobar la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro.01 y Prorroga Nro.01, la cual contempla ajustes técnicos, actividades no previstas y la prórroga del plazo contractual.

- Durante el periodo se desarrollaron actividades constructivas correspondientes a las etapas iniciales y estructurales del proyecto, destacándose labores de descapote, excavaciones, rellenos, concretos ciclópeos, construcción de zapatas, vigas, pedestales, instalación de acero de refuerzo y transporte de materiales, las cuales son fundamentales para el avance de la estructura y consolidación de la obra conforme a la programación técnica.

- En el componente ambiental, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) presentó una ejecución mensual del 49,187%, equivalente a CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($40.566.400,00), alcanzando un avance acumulado del 69,899%, correspondiente a CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($57.648.280,00), evidenciando un adecuado desarrollo de las actividades ambientales en el marco del proyecto.

- Por su parte, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) registró una ejecución mensual del 12,038%, equivalente a TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($3.106.466,10), con un avance acumulado del 49,297%, correspondiente a DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($12.721.037,30), garantizando las condiciones de seguridad y manejo del tránsito en el área de influencia de la obra.

- El Contratista dio cumplimiento a las observaciones efectuadas durante la revisión técnica, presentando la actualización del APU y de las memorias de cálculo correspondientes al ítem de excavación manual. Así mismo, se continuará ejecutando y reportando esta actividad conforme al avance de la obra, dejando establecido que el valor definitivo será reconocido una vez la Acta Modificatoria No. 1 sea aprobada por la Entidad, de acuerdo con el APU actualizado y las condiciones reales de ejecución.

- En cuanto a la gestión administrativa, durante el periodo se adelantó la formulación y trámite de la Modificatoria Nro. 01 (Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01), incluyendo su presentación a la interventoría para revisión y validación, así como la socialización en comité de obra con las entidades involucradas, en donde se definió la ruta de aprobación ante el comité FONSET, evidenciándose la necesidad de dicha gestión para garantizar la continuidad del proyecto.

- De manera paralela, se dio cumplimiento a la entrega oportuna de informes, vinculación de personal conforme a lineamientos de SST, atención de requerimientos administrativos y actividades de suministro y acopio de materiales, lo cual permite mantener condiciones adecuadas para la ejecución del proyecto.

- Finalmente, se concluye que el comportamiento del avance durante el mes de abril se encuentra condicionado por la gestión de aprobación de la modificatoria, la cual resulta determinante para garantizar la continuidad normal de las actividades y el cumplimiento de la programación establecida para el proyecto.

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de Obra
MP. 25202096145 CND

R. LEGAL ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

11. LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. Relación de comités de obra
ANEXO 2. Registro fotográfico de avance con acumulado mensual
ANEXO 3. Certificados de calidad de materiales
ANEXO 4. Ensayos de ensayos de laboratorio
ANEXO 5. Informe SST
ANEXO 6. Nominas mensuales
ANEXO 7. Planillas de pagos de seguridad social
ANEXO 8. Informe ambiental
ANEXO 9. Certificado de maquinaria y equipo menor
ANEXO 10. Informe PMT

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 1. Relación de comités de obra

DESCRIPCIÓN	FECHA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.7	15/04/2026
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.8	29/04/2026

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

2780

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO DE ACTA DE COMITÉ DE OBRA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-01	Version:04	Vigencia:10-01-2025	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° 07

CONTRATO/CONVENIO N°:	CONTRATO DE OBRA (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)
CONTRATO DERIVADO No.	CONTRATO DE OBRA 1700 DE 2025 (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)
TIPO DE CONTRATO:	OBRA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META. (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 (EN LETRAS)
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25 (Escriba el nombre o razon social del interventor)
SUPERVISOR	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES (Escriba el nombre o razon social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)
VALOR:	$ 4.002.449.758,46 (VALOR EN NUMEROS)
PLAZO:	DOCE (12) MESES (NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2027 (ESCRIBA LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO, LA ULTIMA PRORROGA Y ULTIMO REINICIO DEL CONTRATO)
LUGAR, FECHA Y HORA:	Frente de Obra (LUGAR, DIA - MES-AÑO DE LA FECHA DEL COMITÉ DE OBRA Y HORA)

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia.
2. Revisión del avance físico de obra a la fecha.
3. Seguimiento al cumplimiento de la programación de obra.
4. Observaciones de la interventoría respecto a la presentación de informes mensuales.
5. Observaciones relacionadas con orden y aseo en obra.
6. Observaciones técnicas respecto a actividades de vaciado de concreto.
7. Seguimiento al cumplimiento de lineamientos SST y uso de EPP por parte del personal operativo.
8. Revisión de plazos para entrega del informe mensual correspondiente al mes de abril de 2026.
9. Estado de trámite de la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01.
10. Compromisos y varios.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE REUNIÓN)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo la fecha 20 de abril y hora programada (9:00 a.m), se da inicio al comité de seguimiento entre el contratista de obra y la interventoría, con el fin de revisar el estado actual del proyecto, el avance físico ejecutado y el cumplimiento de la programación de obra establecida para el periodo.

En primera instancia, el contratista socializa el avance de las actividades ejecutadas a la fecha, indicando que actualmente se desarrollan actividades correspondientes a excavaciones, cimentaciones, armado y figurado de acero, vaciado de elementos estructurales, así como labores complementarias de organización y acopio de materiales requeridos para el desarrollo del proyecto.

Posteriormente, la interventoría realiza seguimiento al cumplimiento de la programación de obra, reiterando la importancia de mantener control permanente sobre las actividades programadas y ejecutadas, así como de reportar de manera precisa los avances físicos y financieros del proyecto.

En este sentido, la interventoría realiza observaciones específicas respecto a la elaboración y presentación de los informes mensuales, especialmente sobre el contenido de las tablas de seguimiento donde se relaciona lo programado frente a lo ejecutado. Se solicita al contratista que, para el informe correspondiente al mes de abril de 2026, los porcentajes reportados se presenten con mínimo tres (3) decimales, con el fin de evitar inconsistencias en los cálculos y diferencias en las validaciones realizadas por la interventoría. De igual manera, se solicita especial cuidado en el reporte de valores y porcentajes financieros, garantizando coherencia entre las operaciones matemáticas y la información consignada en el informe.

Así mismo, la interventoría realiza observaciones relacionadas con el orden y aseo del frente de obra, recordando al contratista que es responsabilidad directa del residente de obra, director de obra y personal SST garantizar que el personal operativo mantenga condiciones adecuadas de organización, limpieza y almacenamiento de materiales, equipos y maquinaria dentro del proyecto. Se reitera la necesidad de conservar el frente de obra en condiciones óptimas de seguridad y operación.

De igual forma, la interventoría deja constancia de lo ocurrido el día diecisiete (17) de abril de 2026 durante una actividad de vaciado de concreto, en la cual se evidenció que la mezcla presentaba una consistencia no adecuada para su instalación, observándose un exceso de fluidez. En razón a lo anterior, la interventoría procedió a suspender temporalmente la actividad hasta tanto se corrigieran las condiciones de la mezcla y se garantizara el cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes. En este sentido, la interventoría recomienda al contratista reforzar los controles de calidad sobre los materiales y procesos constructivos, reiterando que cualquier actividad que no cumpla con las especificaciones técnicas podrá ser rechazada o no validada, situación que eventualmente podría generar retrasos en la programación de obra.

Seguidamente, la interventoría realiza observaciones respecto al cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, particularmente en relación con el porte y uso adecuado de Elementos de Protección Personal – EPP por parte del personal operativo. Se recomienda al profesional SST del contratista realizar seguimiento permanente al estado y uso correcto de los elementos de protección durante la jornada laboral, reiterando que cualquier incumplimiento deberá ser reportado mediante las observaciones y llamados de atención correspondientes, conforme al conducto regular interno del contratista, con el propósito de prevenir incidentes y accidentes laborales dentro del proyecto.

	FORMATO DE ACTA DE COMITÉ DE OBRA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-01	Version:04	Vigencia:10-01-2025	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° ___08___

CONTRATO/CONVENIO N°:	CONTRATO DE OBRA (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)
CONTRATO DERIVADO No.	CONTRATO DE OBRA 1700 DE 2025 (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)
TIPO DE CONTRATO:	OBRA (PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META. (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 (EN LETRAS)
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25 (Escriba el nombre o razón social del interventor)
SUPERVISOR	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)
VALOR:	$ 4.002.449.758,46 (VALOR EN NUMEROS)
PLAZO:	DOCE (12) MESES (NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2027 (ESCRIBA LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO, LA ULTIMA PRORROGA Y ULTIMO REINICIO DEL CONTRATO)
LUGAR, FECHA Y HORA:	Frente de Obra- Oficina Secretaria de Infraestructura 29/04/2026 (LUGAR, DIA - MES-AÑO DE LA FECHA DEL COMITE DE OBRA Y HORA)

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ORDEN DEL DÍA

ASISTENTES

Arquitecta delegada de supervisión – Fiscalía General de la Nación
Contratista de obra
Interventoría
Supervisión del contrato

OBJETO DEL COMITÉ: Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al estado de ejecución del proyecto "Construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Puerto Gaitán – Meta", verificando el avance de las actividades desarrolladas en obra, socializando las condiciones actuales del proyecto y revisando el estado del trámite correspondiente a la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01, con el fin de articular acciones entre las partes interesadas para garantizar la continuidad, funcionalidad y adecuada ejecución de la infraestructura conforme a los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad establecidos para el proyecto.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE REUNIÓN)

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo la fecha anteriormente indicada, se llevó a cabo el Comité de Obra No. 08, el cual se desarrolló en dos jornadas: inicialmente en el frente de obra del proyecto y posteriormente en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Municipal. El comité contó con la participación de representantes de la Fiscalía General de la Nación, contratista de obra, interventoría, apoyo a la supervisión y supervisión del contrato.

En la primera jornada desarrollada en el frente de obra, se efectuó recorrido técnico con el fin de verificar el estado actual del proyecto, el avance físico ejecutado y las actividades constructivas que se encuentran en desarrollo. Durante la visita se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a excavaciones, construcción de cimentaciones, zapatas, vigas, armado y figurado de acero, así como labores de acopio y organización de materiales requeridos para el desarrollo de la obra.

Durante el recorrido, el contratista socializó el estado actual de ejecución y manifestó que las actividades que actualmente se vienen desarrollando corresponden a aquellas que pueden ejecutarse dentro de las condiciones contractuales vigentes; sin embargo, indicó que las actividades subsiguientes se encuentran directamente relacionadas con los ajustes técnicos contemplados en la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01, razón por la cual manifestó su preocupación frente a la necesidad de gestionar oportunamente la aprobación de dicha solicitud, toda vez que la no aprobación de la misma podría generar restricciones importantes en el normal desarrollo del proyecto y afectar el avance programado de la obra.

Por su parte, la interventoría manifestó que los ajustes incorporados en la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01 obedecen a condiciones reales evidenciadas durante el proceso constructivo, así como a requerimientos técnicos, funcionales, operativos y de seguridad asociados a la infraestructura. En este sentido, indicó que los ajustes propuestos fueron revisados y avalados técnicamente por la interventoría, considerando aspectos relacionados con diseño arquitectónico, redes hidráulicas y sanitarias, redes eléctricas, incorporación del sistema fotovoltaico, adecuaciones de seguridad, ajustes de urbanismo y demás actividades complementarias requeridas para garantizar la funcionalidad integral de la edificación.

De igual manera, la interventoría manifestó su preocupación frente a los tiempos requeridos para el trámite y aprobación de la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01, teniendo en cuenta que la continuidad de varias actividades proyectadas depende directamente de la viabilidad de dichos ajustes, por lo cual reiteró la necesidad de adelantar las gestiones administrativas correspondientes con la mayor celeridad posible, evitando así restricciones técnicas y afectaciones en la programación general del proyecto.

Posteriormente, el comité continuó en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Municipal, donde se sostuvo mesa de trabajo con el Secretario de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato y con el Secretario de Gobierno, considerando que el proyecto es financiado mediante recursos FONSET. Durante la reunión, representantes de la Fiscalía General de la Nación manifestaron su preocupación frente al trámite administrativo requerido para la aprobación de la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01, indicando la importancia de garantizar la continuidad del proyecto y la ejecución de las actividades necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento, operatividad y seguridad de la futura sede institucional.

En desarrollo de la reunión, el Secretario de Gobierno manifestó que, previo a la presentación formal del proyecto ante el Comité FONSET, deberá adelantarse una mesa técnica de trabajo en la cual el contratista y la interventoría socialicen detalladamente los ajustes técnicos incorporados en la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01, así como sus respectivos soportes y justificaciones técnicas, financieras y contractuales. Lo anterior con el fin de que las dependencias y miembros que conforman el comité cuenten con claridad suficiente respecto al alcance y necesidad de los ajustes propuestos.

Así mismo, reiteró la importancia de que las actividades adicionales y complementarias contempladas en la solicitud se encuentren debidamente soportadas y avaladas por la interventoría, considerando que estas obedecen a requerimientos técnicos identificados durante la etapa constructiva, ajustes derivados de las condiciones reales del proyecto y necesidades funcionales y de seguridad propias de la infraestructura.

	FORMATO DE ACTA DE COMITÉ DE OBRA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-01	Version:04	Vigencia:10-01-2025	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° ___08___

Por parte de la Secretaría de Infraestructura se informó que se han adelantado acercamientos previos con el señor Alcalde Municipal con el propósito de socializar el alcance y necesidad de la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01, indicando además que continuará la articulación institucional con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación y Oficina de Contratación para la revisión integral de la documentación y el avance del trámite administrativo correspondiente.

Durante la reunión también se dejó constancia de que varios de los ajustes incorporados al proyecto corresponden a precisiones técnicas y actividades complementarias derivadas de las condiciones reales encontradas en campo, de la definición final de redes y espacios funcionales, así como de requerimientos asociados a seguridad, operatividad y funcionamiento integral de la infraestructura, aspectos que requieren su implementación para garantizar la adecuada ejecución y puesta en servicio de la edificación conforme a las necesidades actuales del proyecto.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación manifestó que hace parte del Comité FONSET y solicitó de manera especial que la gestión y programación de la mesa técnica y posterior comité se adelante con prioridad, teniendo en cuenta la importancia institucional del proyecto y la necesidad de evitar retrasos significativos que puedan afectar la continuidad de la obra.

Finalmente, la interventoría informó que el día veintidós (22) de abril de 2026 fue radicada formalmente ante la entidad contratante la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01, la cual cuenta con el respectivo aval técnico de la interventoría y contiene los soportes técnicos, financieros y jurídicos requeridos para sustentar la solicitud presentada por el contratista. De igual manera, se informó que fue radicada la solicitud correspondiente a la Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01 del contrato de interventoría, considerando que la ampliación del plazo contractual de obra por dos (2) meses requiere igualmente garantizar la continuidad de las labores de seguimiento, control y supervisión integral durante el periodo adicional solicitado.

La interventoría manifestó finalmente que permanece atenta a cualquier observación, recomendación o requerimiento adicional que pueda surgir durante el proceso de revisión de la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01 por parte de la supervisión del contrato y de las diferentes dependencias involucradas en el trámite correspondiente.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNION

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar la gestion correspondiente para dar tramite a la solicitud de Modificatoria Nro.01.	Secretaria de Infraestructura		

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FIRMA		FIRMA	Fernando Villegas
NOMBRE	ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	NOMBRE	FERNANDO JOSE VILLEGAS DIAZ
CARGO	CONTRATISTA	CARGO	INTERVENTOR
FIRMA		FIRMA	Adriana Hdez
NOMBRE	MARIA LUCIA BELTRAN ACEVEDO	NOMBRE	LUZ ADRIANA HERNANDEZ CANTOR
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO DE LA SUPERVISION - CPS 1389-2025	CARGO	DIRECCION TECNICO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CHRISTIAN JULIAN [illegible] REYES	NOMBRE	
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR	CARGO	REPRESENTANTE FISCALIA GENERAL DE LA NACION

ORIGINAL: CONTAVE
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 2. Registro fotográfico de avance con acumulado mensual

(En el capítulo 5.4.2 Descripción de las actividades ejecutadas, se incluye el registro fotográfico del periodo actual)

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO MES MARZO - 2026



Actividad de excavación en conglomerado




Instalacion de Concreto ciclopeo






Suministro, acopio y figurado de acero

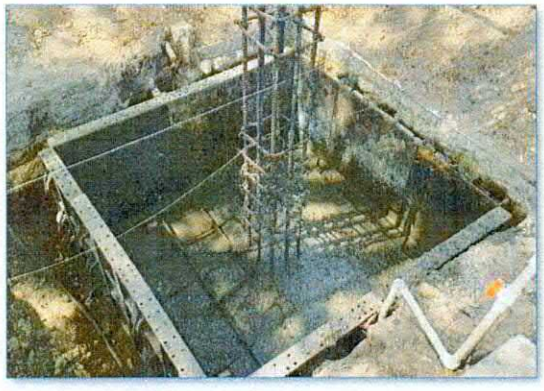

Instalación de concreto para zapatas de cimentación

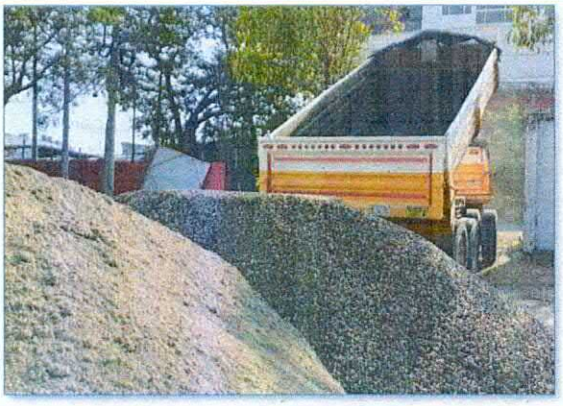

Suministro, transporte y acopio de material granular

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0





Transporte de sobrantes

REGISTRO FOTOGRÁFICO MES FEBRERO - 2026



Localización y replanteo del área a intervenir



Desmonte de sanitarios y lavamanos





Puerto Gaitán – Meta

311 386 8024

Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

Desmonte de carpintería metálica y cubierta	
	
Demolición de la infraestructura existente	

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 3. Certificados de calidad de materiales

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

2788

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

CEMENTO HIDRÁULICO TIPOS UG Y ART

Fabricado por **CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S.** en la **Carrera 11 No. 75 – 19, Bogotá; , Cundinamarca, Colombia** identificada con **número de NIT 830.099.238-2**

Manufactured by **CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S.** in the **Carrera 11 No. 75 – 19, Bogotá, Cundinamarca, Colombia** identified with **NIT number830.099.238-2**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 121 (2023)

Especificación de desempeño para cemento hidráulico
Performance specification for hydraulic cement
SECTOR ICS: 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-0019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-0019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER468310
Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-05-27
Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2025-05-26
Last Expiration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2031-05-26
Next Expiration Date:

Fecha Última Modificación: 2023-08-31
Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2025-06-18
Restoration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
PRODUCT CERTIFICATION BODY

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 - 76. Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI ve TIC. A.S.

MILL TEST CERTIFICATE

Description of Goods
REINFORCING DEFORMED STEEL BARS NTC 2289 GR60W
FOR 6 METERS (+/-50 MM) / 12 METERS (+/-100 MM)

CERTIFICATE NO : 24/083
PAGE : 2/2
DATE : 29.05.2024
REF : KDC/2024-072/RDB

PROCESS ROUTE EAF/CCM/QST

BAR MARK T R / K D / SIZE / W / 6 0 / /

SIZE (INCH / MM)	Length (Meters)	Heat Number	Number of Bundles		Weight	Mechanical Properties					Chemical Composition on Product												
						Yield Strength	Tensile Strength	Rm / ReH	Elng.	Bend	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	B	N	Ceq
					Kg/m	Mpa	Mpa		%	Test	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(#5) Q 5/8"	6 METERS	24-03017	94		1,484	480	634	1,32	15,1	OK	0,27	0,98	0,17	0,021	0,017	0,13	0,13	0,027	0,34	0,006	0,0002	0,008	0,46
(#5) Q 5/8"	6 METERS	24-03016	15		1,484	479	619	1,29	15,7	OK	0,27	0,93	0,16	0,019	0,036	0,14	0,14	0,021	0,38	0,005	0,0003	0,009	0,45
(#5) Q 5/8"	6 METERS	23-04731	34		1,465	474	636	1,34	15,8	OK	0,29	0,96	0,19	0,017	0,016	0,13	0,13	0,023	0,34	0,005	0,0001	0,008	0,48
(#5) Q 5/8"	6 METERS	23-04730	48		1,472	477	638	1,34	16,5	OK	0,27	0,91	0,20	0,018	0,029	0,13	0,15	0,024	0,37	0,005	0,0001	0,009	0,45
(#5) Q 5/8"	6 METERS	23-04729	20		1,467	475	623	1,31	15,8	OK	0,27	0,93	0,20	0,017	0,029	0,14	0,12	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,008	0,46
			211																				
(#5) Q 5/8"	12 METERS	24-03016	6		1,484	479	619	1,29	15,7	OK	0,27	0,93	0,16	0,019	0,036	0,14	0,14	0,021	0,38	0,005	0,0003	0,009	0,45
(#5) Q 5/8"	12 METERS	23-04731	16		1,465	474	636	1,34	15,8	OK	0,29	0,96	0,19	0,017	0,016	0,13	0,13	0,023	0,34	0,005	0,0001	0,008	0,48
(#5) Q 5/8"	12 METERS	23-04730	19		1,472	477	638	1,34	16,5	OK	0,27	0,91	0,20	0,018	0,029	0,13	0,15	0,024	0,37	0,005	0,0001	0,009	0,45
(#5) Q 5/8"	12 METERS	23-04729	11		1,467	475	623	1,31	15,8	OK	0,27	0,93	0,20	0,017	0,029	0,14	0,12	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,008	0,46
			52																				
(#6) Q 3/4"	12 METERS	24-03054	18		2,118	487	640	1,31	15,8	OK	0,28	0,98	0,17	0,020	0,039	0,14	0,12	0,025	0,37	0,005	0,0001	0,009	0,47
(#6) Q 3/4"	12 METERS	24-03055	9		2,106	489	636	1,30	15,5	OK	0,28	0,93	0,19	0,034	0,020	0,14	0,23	0,037	0,35	0,008	0,0001	0,009	0,47
			27																				
			2.410																				

1)Tensile Testing according to ASTM A 370 (Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products)
2)Bend Testing according to ASTM E 290 (Standard Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility)
3) Chemical Analysis according to ASTM E415 (Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry)
4)The results presented correspond exclusively to the sample tested.
5)The laboratory does not assume any responsibility for partial or total reproduction of this document without the written permission of the Division of Mechanical Testing
6)All incoming raw materials checked by radiation detection system(exploranium at900) and natural radioactivity levels detected

KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİC. A.Ş.
www.kaptangrupturkiye.com
MERSİS NO: 0499001945300015
İTO SİCİL NO: 198822

Adress
Head Office : Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No:2 34662 Altunizade / Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Factory Marmara Ereğlisi : Eksi Elma Mevkii Seymen Yolu 4.km Marmaraereğlisi / TEKIRDAG / TURKEY
e-mail export@kaptandemir.com.tr

2784

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI ve TIC. A.S.

MILL TEST CERTIFICATE

Description of Goods
REINFORCING DEFORMED STEEL BARS NTC 2289 GR60W
FOR 6 METERS (+/-50 MM)

CERTIFICATE NO : 24/066
PAGE : 1/2
DATE : 29.05.2024
REF. : KDC/2024-072/RDB

PROCESS ROUTE EAF/CCM/QST

BAR MARK //// T R //// K D //// SIZE //// W //// 6 0 ////

SIZE (INCH / MM)	Length (Meters)	Heat Number	Number of Bundles		Weight	Mechanical Properties					Chemical Composition on Product												
						Yield Strength	Tensile Strength	Rm / ReH	Elng.	Bend	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	B	N	Ceq
					Kg/m	Mpa	Mpa		%	Test	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02671	84		0,429	490	637	1,30	15,1	OK	0,27	0,91	0,19	0,019	0,025	0,13	0,13	0,022	0,36	0,005	0,0001	0,0090	0,45
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02664	112		0,420	462	618	1,34	15,0	OK	0,28	0,93	0,16	0,033	0,017	0,12	0,20	0,021	0,37	0,007	0,0001	0,0091	0,47
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02666	14		0,421	497	659	1,33	15,6	OK	0,28	0,87	0,17	0,021	0,019	0,13	0,10	0,021	0,35	0,005	0,0001	0,0092	0,45
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02663	65		0,422	487	648	1,33	16,2	OK	0,29	0,93	0,16	0,019	0,015	0,13	0,12	0,024	0,34	0,005	0,0001	0,0093	0,47
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02662	70		0,424	484	633	1,31	14,8	OK	0,29	0,91	0,18	0,014	0,030	0,13	0,10	0,025	0,34	0,005	0,0001	0,0098	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02903	102		0,422	483	647	1,34	17,3	OK	0,27	0,97	0,17	0,017	0,018	0,14	0,10	0,023	0,37	0,005	0,0001	0,0095	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02663	57		0,421	492	637	1,29	14,8	OK	0,29	0,93	0,16	0,019	0,015	0,13	0,12	0,024	0,34	0,005	0,0001	0,0093	0,47
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02662	57		0,422	485	637	1,31	15,6	OK	0,29	0,91	0,18	0,014	0,030	0,13	0,10	0,025	0,34	0,005	0,0001	0,0098	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02661	124		0,424	493	668	1,35	15,3	OK	0,29	0,89	0,17	0,032	0,013	0,18	0,23	0,027	0,38	0,005	0,0001	0,0092	0,48
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02660	50		0,420	505	692	1,37	17,8	OK	0,27	0,91	0,15	0,015	0,011	0,14	0,18	0,023	0,36	0,005	0,0001	0,0094	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02641	105		0,423	493	634	1,29	14,9	OK	0,27	0,90	0,16	0,024	0,017	0,12	0,15	0,022	0,35	0,005	0,0006	0,0095	0,45
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02660	54		0,420	486	660	1,36	14,7	OK	0,27	0,91	0,15	0,015	0,011	0,14	0,18	0,023	0,36	0,005	0,0001	0,0094	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02640	80		0,420	466	608	1,30	15,0	OK	0,27	0,94	0,19	0,017	0,025	0,12	0,11	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,0092	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02903	19		0,422	473	615	1,30	15,3	OK	0,27	0,97	0,17	0,017	0,018	0,14	0,10	0,023	0,37	0,005	0,0001	0,0095	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02657	45		0,421	481	662	1,38	15,5	OK	0,26	1,06	0,22	0,012	0,016	0,12	0,09	0,023	0,38	0,005	0,0001	0,0085	0,48
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02642	117		0,422	496	637	1,28	15,4	OK	0,27	0,87	0,16	0,018	0,025	0,12	0,12	0,021	0,34	0,005	0,0002	0,0088	0,44
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02640	28		0,421	490	626	1,28	15,6	OK	0,27	0,94	0,19	0,017	0,025	0,12	0,11	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,0092	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02657	34		0,423	485	617	1,27	14,7	OK	0,28	1,06	0,22	0,012	0,016	0,12	0,09	0,023	0,38	0,005	0,0001	0,0085	0,48
			1.217																				
Q 9 MM	6 METERS	24-02657	35		0,475	488	653	1,34	14,9	OK	0,28	1,06	0,22	0,012	0,016	0,12	0,09	0,023	0,38	0,005	0,0001	0,0085	0,48
Q 9 MM	6 METERS	24-02644	115		0,471	465	628	1,35	15,2	OK	0,28	0,91	0,14	0,017	0,016	0,12	0,09	0,022	0,34	0,004	0,0001	0,0097	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02639	117		0,473	468	618	1,32	14,8	OK	0,28	0,91	0,15	0,012	0,014	0,10	0,08	0,021	0,35	0,005	0,0004	0,0095	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02657	7		0,476	455	603	1,33	15,8	OK	0,28	1,06	0,22	0,012	0,016	0,12	0,09	0,023	0,38	0,005	0,0001	0,0085	0,48
Q 9 MM	6 METERS	24-02640	8		0,473	456	602	1,32	16,3	OK	0,27	0,94	0,19	0,017	0,025	0,12	0,11	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,0092	0,46
Q 9 MM	6 METERS	24-02638	112		0,474	472	612	1,30	14,9	OK	0,28	0,87	0,16	0,013	0,017	0,12	0,07	0,022	0,37	0,004	0,0001	0,0092	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02655	113		0,471	482	625	1,30	15,1	OK	0,28	0,93	0,17	0,015	0,023	0,11	0,09	0,019	0,35	0,006	0,0001	0,0093	0,46
Q 9 MM	6 METERS	24-02656	91		0,472	474	621	1,31	15,8	OK	0,29	0,86	0,17	0,012	0,010	0,12	0,09	0,020	0,35	0,005	0,0001	0,0088	0,46
Q 9 MM	6 METERS	24-02645	110		0,473	470	614	1,31	14,7	OK	0,27	0,93	0,13	0,018	0,024	0,11	0,10	0,024	0,35	0,005	0,0001	0,0090	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02654	119		0,472	469	601	1,28	15,8	OK	0,26	0,90	0,16	0,014	0,026	0,12	0,09	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,0092	0,43
Q 9 MM	6 METERS	24-02968	87		0,473	483	638	1,38	15,7	OK	0,29	0,94	0,17	0,015	0,002	0,19	0,13	0,032	0,36	0,005	0,0001	0,0091	0,48
Q 9 MM	6 METERS	24-03007	115		0,473	481	656	1,36	15,2	OK	0,27	0,92	0,19	0,013	0,022	0,13	0,09	0,023	0,36	0,005	0,0001	0,0098	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02643	78		0,471	472	607	1,29	14,9	OK	0,27	0,95	0,14	0,017	0,032	0,12	0,08	0,022	0,38	0,004	0,0001	0,0089	0,45
			1.107																				

KAPTAN DEMIR ÇELİK
ENDÜSTRİSİ VE TİC. A.Ş.
www.kaptangrupturkiye.com
MERSİS NO: 0499001945300015
İTO SİCİL NO: 198822

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI ve TIC. A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE

Description of Goods
REINFORCING DEFORMED STEEL BARS NTC 2289 GR60W
FOR 6 METERS (+/-50 MM) / 12 METERS (+/-100 MM)

CERTIFICATE NO : 24/056
PAGE : 2/2
DATE : 29.05.2024
REF. : KDC/2024-072/RDB

PROCESS ROUTE EAF/CCM/QST

BAR MARK TR/KD/SIZE/W/60/

SIZE (INCH / MM)	Length (Meters)	Heat Number	Number of Bundles		Weight	Mechanical Properties					Chemical Composition on Product												
						Yield Strength	Tensile Strength	Rm / ReH	Elng.	Bend	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	B	N	Ceq
					Kg/m	Mpa	Mpa		%	Test	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02649	85		0,534	461	611	1,33	16,4	OK	0,27	0,92	0,16	0,021	0,032	0,13	0,10	0,023	0,39	0,005	0,0001	0,0092	0,44
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02672	54		0,534	486	643	1,32	14,9	OK	0,27	0,94	0,14	0,032	0,025	0,12	0,15	0,021	0,35	0,006	0,0001	0,0096	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02670	110		0,531	471	620	1,32	15,9	OK	0,28	0,94	0,14	0,017	0,016	0,12	0,13	0,019	0,37	0,005	0,0001	0,0093	0,46
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02667	112		0,529	482	614	1,27	16,0	OK	0,29	0,91	0,16	0,015	0,025	0,11	0,07	0,019	0,34	0,005	0,0001	0,0091	0,46
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02666	87		0,530	483	626	1,30	15,6	OK	0,28	0,87	0,17	0,021	0,019	0,13	0,10	0,021	0,35	0,005	0,0001	0,0092	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02680	38		0,531	481	614	1,28	14,8	OK	0,27	0,92	0,18	0,021	0,035	0,13	0,10	0,021	0,36	0,005	0,0001	0,0095	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02665	69		0,527	463	609	1,32	16,7	OK	0,28	0,92	0,17	0,016	0,035	0,12	0,09	0,019	0,37	0,005	0,0001	0,0096	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02666	20		0,527	472	611	1,29	15,3	OK	0,28	0,87	0,17	0,021	0,019	0,13	0,10	0,021	0,35	0,005	0,0001	0,0092	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02645	19		0,528	475	602	1,27	14,3	OK	0,27	0,93	0,13	0,018	0,024	0,11	0,10	0,024	0,35	0,005	0,0001	0,0090	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02669	120		0,530	481	626	1,30	15,6	OK	0,27	0,93	0,17	0,015	0,019	0,12	0,10	0,018	0,38	0,005	0,0001	0,0089	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02646	122		0,529	479	612	1,28	14,8	OK	0,26	0,92	0,13	0,019	0,022	0,12	0,12	0,026	0,33	0,006	0,0001	0,0094	0,44
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02668	105		0,531	492	622	1,26	15,1	OK	0,27	0,91	0,17	0,011	0,021	0,12	0,09	0,019	0,39	0,005	0,0001	0,0098	0,44
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02671	25		0,528	480	618	1,29	14,6	OK	0,27	0,91	0,19	0,019	0,025	0,13	0,13	0,022	0,36	0,005	0,0001	0,0090	0,45
			946																				
			3.270																				

1)Tensile Testing according to ASTM A 370 (Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products)
2)Bend Testing according to ASTM E 290 (Standard Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility)
3) Chemical Analysis according to ASTM E415 (Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry)
4)The results presented correspond exclusively to the sample tested.
5)The laboratory does not assume any responsibility for partial or total reproduction of this document without the written permission of the Division of Mechanical Testing
6)All incoming raw materials checked by radiation detection system(exploranium at900) and natural radioactivity levels detected

KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİC. A.Ş.
MERSİS NO: 0499001945300015
TİC SİCİL NO: 198822

Adress
Head Office : Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No:2 34662 Altunizade / Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Factory Marmara Ereğlisi : Eksi Elma Mevkii Seymen Yolu 4.km Marmaraereğlisi / TEKIRDAG / TURKEY
e-mail export@kaptandemir.com.tr

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI ve TIC. A.S.

MILL TEST CERTIFICATE

Description of Goods
REINFORCING DEFORMED STEEL BARS NTC 2289 GR60W
FOR 6 METERS (+/-50 MM) / 12 METERS (+/-100 MM)

CERTIFICATE NO : 24/083
PAGE : 1/2
DATE : 29.05.2024
REF : KDC/2024-072/RDB

PROCESS ROUTE EAF/CCM/QST

BAR MARK //// T R //// K D //// SIZE //// W //// 6 0 ////

SIZE (INCH / MM)	Length (Meters)	Heat Number	Number of Bundles		Weight	Mechanical Properties					Chemical Composition on Product												
						Yield Strength	Tensile Strength	Rm / ReH	Elng.	Bend	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	B	N	Ceq
					Kg/m	Mpa	Mpa		%	Test	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Q 11 MM	6 METERS	24-02885	83		0,715	465	608	1,31	15,3	OK	0,27	0,92	0,20	0,020	0,020	0,07	0,10	0,012	0,36	0,005	0,0000	0,009	0,45
Q 11 MM	6 METERS	24-02887	62		0,709	478	618	1,29	15,7	OK	0,27	0,93	0,18	0,014	0,022	0,08	0,10	0,010	0,33	0,003	0,0000	0,009	0,44
Q 11 MM	6 METERS	24-02888	128		0,710	475	622	1,31	15,2	OK	0,27	0,92	0,19	0,019	0,035	0,08	0,10	0,012	0,34	0,004	0,0000	0,010	0,45
Q 11 MM	6 METERS	24-02891	44		0,714	479	628	1,31	16,3	OK	0,26	0,90	0,17	0,020	0,026	0,08	0,18	0,016	0,33	0,004	0,0000	0,009	0,44
			317																				
Q 12 MM	6 METERS	24-02898	17		0,857	501	639	1,32	15,1	OK	0,28	0,94	0,18	0,019	0,022	0,09	0,11	0,014	0,34	0,004	0,0000	0,009	0,46
Q 12 MM	6 METERS	24-02900	27		0,844	486	638	1,31	15,2	OK	0,27	0,93	0,18	0,017	0,025	0,08	0,09	0,012	0,37	0,004	0,0000	0,009	0,45
Q 12 MM	6 METERS	24-02901	128		0,840	475	639	1,35	15,3	OK	0,28	0,95	0,17	0,017	0,017	0,13	0,11	0,022	0,35	0,005	0,0001	0,008	0,47
Q 12 MM	6 METERS	24-02902	38		0,847	501	633	1,26	15,1	OK	0,29	1,08	0,17	0,033	0,011	0,14	0,18	0,025	0,34	0,007	0,0001	0,009	0,50
Q 12 MM	6 METERS	24-02904	48		0,844	491	631	1,29	16,7	OK	0,27	0,95	0,15	0,019	0,013	0,13	0,10	0,020	0,36	0,005	0,0001	0,009	0,45
Q 12 MM	6 METERS	24-02905	101		0,846	483	636	1,32	14,9	OK	0,27	1,00	0,13	0,023	0,034	0,14	0,09	0,021	0,35	0,005	0,0001	0,009	0,46
Q 12 MM	6 METERS	24-02906	123		0,845	472	630	1,33	15,9	OK	0,26	0,95	0,15	0,019	0,015	0,13	0,08	0,022	0,35	0,005	0,0001	0,010	0,44
Q 12 MM	6 METERS	24-02907	56		0,847	480	624	1,30	15,6	OK	0,28	0,90	0,14	0,021	0,037	0,14	0,11	0,041	0,36	0,005	0,0001	0,010	0,45
			538																				
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02954	90		0,945	471	616	1,31	16,1	OK	0,28	0,97	0,18	0,013	0,024	0,13	0,09	0,023	0,35	0,005	0,0003	0,010	0,47
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02955	126		0,944	467	614	1,31	15,0	OK	0,27	0,97	0,18	0,017	0,019	0,15	0,10	0,028	0,35	0,006	0,0002	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02956	110		0,944	481	628	1,31	15,9	OK	0,28	0,95	0,14	0,018	0,013	0,13	0,11	0,025	0,35	0,005	0,0002	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02957	46		0,946	475	624	1,31	15,5	OK	0,27	0,97	0,16	0,018	0,019	0,14	0,10	0,025	0,38	0,005	0,0001	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02958	116		0,948	472	614	1,30	16,8	OK	0,28	0,97	0,15	0,022	0,016	0,13	0,10	0,024	0,36	0,006	0,0001	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02959	114		0,945	476	624	1,31	15,5	OK	0,27	0,93	0,13	0,022	0,017	0,13	0,18	0,026	0,34	0,005	0,0001	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02960	122		0,945	472	614	1,30	15,3	OK	0,28	0,92	0,15	0,014	0,017	0,13	0,12	0,019	0,38	0,005	0,0001	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02961	87		0,942	471	614	1,30	16,9	OK	0,27	0,92	0,14	0,022	0,020	0,13	0,13	0,022	0,37	0,005	0,0001	0,009	0,45
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02962	110		0,948	469	613	1,31	15,2	OK	0,27	0,95	0,16	0,021	0,017	0,15	0,16	0,025	0,33	0,005	0,0001	0,010	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02963	123		0,940	469	625	1,33	15,4	OK	0,27	0,94	0,17	0,015	0,015	0,16	0,15	0,023	0,39	0,005	0,0001	0,009	0,45
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02964	120		0,942	476	630	1,32	15,8	OK	0,28	0,96	0,17	0,018	0,008	0,13	0,16	0,022	0,36	0,006	0,0001	0,009	0,47
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02965	101		0,946	475	618	1,30	16,3	OK	0,27	0,91	0,15	0,028	0,019	0,13	0,17	0,020	0,37	0,005	0,0001	0,010	0,45
			1.265																				

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC. A.S.
www.kaptangroupturkiye.com
MERSIS NO: 0499001945300015
ITO SICIL NO: 198822

2642

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 4. Ensayos de laboratorio

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

IQL-14457-2026
INGEQUALITY S.A.S
Nit 900972178-7
CO20/962451

Villavicencio, 30 de Abril de 2026

Señores:

UNION TEMPORAL CONFISCA 25

Ciudad.

Referencia. CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

Tema: Informe General de control de calidad ensayos de resistencia a la Compresión en muestras cilíndricas.

Cordial Saludo,

Con la presente estamos haciendo entrega de los resultados finales correspondientes a los ensayos de resistencia a la compresión realizados a las muestras suministradas por ustedes, con el fin de realizar el respectivo control de calidad del concreto, el cual está siendo usado en la construcción de los diferentes elementos estructurales del proyecto en referencia.

Los ensayos se realizan con los equipos LAB-001, LAB-052 y la información de los resultados obtenidos se encuentra registrada en el formato IQL-FR-003 (ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION INV-E-410) perteneciente a INGEQUALITY SAS, donde se referencian: estructuras o elementos elaborados, fechas de toma, resistencia de diseño y resistencia obtenida de cada muestra, según la información suministrada por Uds., por lo tanto, los resultados obtenidos en los ensayos corresponden exclusivamente a las muestras entregadas al laboratorio.

El presente informe contiene información de todas las muestras de la respectiva orden a la fecha. Se actualizan los resultados de las muestras relacionada a continuación:

N° de Muestra	Edad de Curado	Cantidad	N° de Muestra	Edad de Curado	Cantidad
1	14 DIAS	1	2	14 DIAS	1
3	14 DIAS	1	4	14 DIAS	1
5	14 DIAS	1	6	14 DIAS	1
7	14 DIAS	1	8	14 DIAS	1
9	14 DIAS	1	10	14 DIAS	1
11	14 DIAS	1	12	14 DIAS	1
13	14 DIAS	1	14	7 DIAS	1
15	7 DIAS	1	-	-	-

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com
N.S. 17824

La reproducción, copia, distribución, comunicación pública o transformación no autorizada del contenido de este informe constituye una infracción a los derechos patrimoniales y morales de autor protegidos por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993, así como por el Código Penal Colombiano en su artículo 270. INGEQUALITY S.A.S. se reserva el derecho de iniciar acciones legales civiles y penales contra quienes incurran en actos de plagio o uso indebido de este documento, incluyendo la solicitud de indemnización por perjuicios, medidas cautelares y sanciones contempladas en la legislación vigente.

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda,

Atentamente,

JUAN DIEGO TRUJILLO LADINO
Ingeniero Civil
M.P. 25202-336555 CND

En caso de presentarse alguna PQR ó producto no conforme, dirigirla al correo ingequalitysascalidad@gmail.com para ser atendida.

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

IQI-14457-2026
INGEQUALITY S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD
Nit 900972178-7
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962451

Código:	IQI-FR-003
Versión:	02
Fecha:	30/09/2019
Página:	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

CLIENTE: UNION TEMPORAL CONFISCA 25

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – DEPARTAMENTO DEL META

FECHA RECIBO: ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE ABRIL

OBSERVACIONES: NINGUNA

MARCA DE CEMENTO: PORTLAND

NUMERO DE SERVICIO: 17824

NUMERO DE INFORME: IQI-1457-26

FECHA INFORME: 30 de abril de 2026

TIPO DE MEZCLA: OBRA / PLANTA / SIN REFERENCIA: X

C= 17,83 K= 1,38

NOMBRE DEL ELEMENTO	Nº MUESTRA	f'c Diseño (PSI)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensayo	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (Gr)	CARGA (Kgf)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CORREC. ESBELTEZ	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% RESIS.	RESISTENCIA PROYECTADA (PSI)	TIPO DE FALLO	
ZAPATAS (CICLOPEO)	1	3000	06/04/26	7 DIAS	13-04-26	10,2	20,1	3752	12536	81,71	2,284	0,99	2173,19	152,12	72,4%	3253,7		X
	1			14 DIAS	20-04-26	10,1	20,2	3810	14120	80,12	2,354	1	2517,69	176,24	83,9%	3729,1		X
	1			28 DIAS	04-05-26													
ZAPATAS	2	3000	06/04/26	7 DIAS	13-04-26	10,0	20,1	3812	11739	78,54	2,415	1	2138,86	149,72	71,3%	3206,3		X
	2			14 DIAS	20-04-26	10,1	20,1	3806	13738	80,12	2,363	0,99	2428,62	170,00	81,0%	3606,2		X
	2			28 DIAS	04-05-26													
ZAPATAS (CICLOPEO)	3	3000	08/04/26	7 DIAS	15-04-26	10,0	20,2	3819	12148	78,54	2,407	1	2209,61	154,67	73,7%	3304,0		X
	3			14 DIAS	22-04-26	10,2	20,1	3822	15063	81,71	2,327	0,99	2607,10	182,50	86,9%	3852,5		X
	3			28 DIAS	06-05-26													
ZAPATAS	4	3000	08/04/26	7 DIAS	15-04-26	10,1	20,2	3784	12320	80,12	2,338	1	2196,74	153,77	73,2%	3286,2		X
	4			14 DIAS	22-04-26	10,2	20,2	3811	14362	81,71	2,309	0,99	2485,77	174,00	82,9%	3685,1		X
	4			28 DIAS	06-05-26													

OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA				
7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	90 DIAS
65-67	82-83	100	117-118	128-132

L/D	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
FACTOR CORR.	0,53	0,85	0,92	0,97	0,98	1,00









La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA:	REVISO	FIRMA:
	NOMBRE: JAMES HERRERA		NOMBRE: JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO: AUX. DE LABORATORIO		CARGO: ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 17824

IQI-1457-2026
INGEQUALITY S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD
Nit 900972178-7
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962451

Código:	IQI-FE-003
Versión:	02
Fecha:	20/05/2025
Página:	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

CLIENTE: UNION TEMPORAL CONFISCA 25

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – DEPARTAMENTO DEL META

FECHA RECIBO: ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE ABRIL

OBSERVACIONES: NINGUNA

MARCA DE CEMENTO: PORTLAND

C= 17,83 K= 1,38

NUMERO DE SERVICIO: 17824

NUMERO DE INFORME: IQI-1457-26

FECHA INFORME: 30 de abril de 2026


TIPO DE MEZCLA: OBRA ☐ PLANTA ☐ NSR REFERENCIA X

NOMBRE DEL ELEMENTO	Nº MUESTRA	f'c Diseño (PSI)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensayo	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	CARGA (Kgf)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CORREC. ESBELTEZ	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% RESIS.	RESISTENCIA PROYECTADA (PSI)	TIPO DE FALLO	
ZAPATAS (CICLOPEO)	5	3000	10/04/26	7 DIAS	17-04-26	10,1	20,1	3756	12527	80,12	2,332	0,99	2211,31	154,79	78,7%	3806,3		
	5			14 DIAS	24-04-26	10,1	20,2	3821	14129	80,12	2,361	1	2519,30	176,35	84,0%	3731,3	X	
	5			28 DIAS	08-05-26												X	
ZAPATAS	6	3000	10/04/26	7 DIAS	17-04-26	10,0	20,2	3762	11369	78,54	2,371	1	2104,30	147,30	70,1%	3158,6		
	6			14 DIAS	24-04-26	10,1	20,2	3785	13926	80,12	2,339	1	2483,10	173,82	82,8%	3681,4	X	
	6			28 DIAS	08-05-26													X
PEDESTALES DE CIMENTACION	7	3000	10/04/26	7 DIAS	17-04-26	10,1	20,1	3816	12584	80,12	2,370	0,99	2221,88	155,50	74,0%	3320,2		
	7			14 DIAS	24-04-26	10,2	20,2	3832	14239	81,71	2,322	0,99	2464,48	172,51	82,1%	3655,7	X	
	7			28 DIAS	08-05-26													X
ZAPATAS	8	3000	13/04/26	7 DIAS	20-04-26	10,1	20,2	3808	11966	80,12	2,333	1	2133,62	149,35	71,1%	3199,1	X	
	8			14 DIAS	27-04-26	10,1	20,2	3769	14692	80,12	2,329	1	2619,69	183,38	87,3%	3869,9	X	
	8			28 DIAS	11-05-26													

OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA				
7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	90 DIAS
65-67	82-85	100	117-118	128-130

L/D	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
FACTOR CORR.	0,87	0,93	0,92	0,97	0,99	1,00



La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO		REVISO	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	JAMES HERRERA	NOMBRE:	JUAN DIEGO TRUJILLO
CARGO:	AUX. DE LABORATORIO	CARGO:	ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 17824

IQI-1457-2026
INGEQUALITY S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD
Nit 900972178-7
ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS CO20/962451

Codigo	IQI-FE-003
Version	02
Fecha	30/09/2019
Pagina	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

CLIENTE: UNION TEMPORAL CONFISCA 25
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – DEPARTAMENTO DEL META
FECHA RECIBO: ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE ABRIL
OBSERVACIONES: NINGUNA
MARCA DE CEMENTO: PORTLAND C- 17,85 K- 1,58

NUMERO DE SERVICIO: 17824
NUMERO DE INFORME: IQI-1457-26
FECHA INFORME: 30 de abril de 2026

TIPO DE MEZCLA	OBRA	PLANTA	MIX REFERENCIA
			X

NOMBRE DEL ELEMENTO	Nº MUESTRA	f'c Diseño (MPa)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensayo	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	CARGA (Kgf)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CORREC. DENSIDAD	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% RESIS.	RESISTENCIA PROYECTADA (PSI)	TIPO DE FALLO 1	2	3	4	5	6
PEDESTALES DE CIMENTACION	9	3000	14/04/26	7 DIAS	21-04-26	10,1	20,1	3810	11874	80,12	2,366	0,99	2086,04	146,72	69,9%	3147,3						X
	9			14 DIAS	28-04-26	10,1	20,1	3866	14138	80,12	2,401	0,99	2499,23	174,95	83,3%	3705,6			X			
	9			28 DIAS	12-05-26																	
ZAPATAS	10	3000	14/04/26	7 DIAS	21-04-26	10,2	20,2	3754	12699	81,71	2,274	0,99	2197,94	153,86	73,3%	3287,9						X
	10			14 DIAS	28-04-26	10,1	20,1	3820	14867	80,12	2,372	0,99	2624,38	183,71	87,5%	3876,4						X
	10			28 DIAS	12-05-26																	
PEDESTALES DE CIMENTACION	11	3000	15/04/26	7 DIAS	22-04-26	10,1	20,0	3832	11974	80,12	2,391	0,99	2118,70	147,96	70,5%	3171,6			X			
	11			14 DIAS	29-04-26	10,2	20,0	3837	14638	81,71	2,348	0,99	2553,54	177,55	84,5%	3751,0			X			
	11			28 DIAS	13-05-26																	
ZAPATAS	12	3000	15/04/26	7 DIAS	22-04-26	10,1	20,1	3816	12348	80,12	2,370	0,99	2179,72	152,58	72,7%	3262,7			X			
	12			14 DIAS	29-04-26	10,0	20,1	3823	13629	78,54	2,422	1	2478,99	173,53	82,6%	3675,7						X
	12			28 DIAS	13-05-26																	

OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA				
7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	90 DIAS
65-67	83-85	100	117-118	128-130

L/D	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
FACTOR CORR.	0,53	0,83	0,92	0,97	0,99	1,00









La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO		REVISO	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	JAMES HERRERA	NOMBRE:	JUAN DIEGO TRUJILLO
CARGO:	AUX. DE LABORATORIO	CARGO:	ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 17824

IQI-1457-2026
INGEQUALITY S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD
Nit 900972178-7
ISO 9001 SGS CO20/962451

Código:	IQL-FR-003
Versión:	02
Fecha:	30/09/2019
Página:	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

CLIENTE: UNION TEMPORAL CONFISCA 25

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – DEPARTAMENTO DEL META

FECHA RECIBO: ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE ABRIL

OBSERVACIONES: NINGUNA

MARCA DE CEMENTO: PORTLAND

C= 17,83 K= 1,38

NUMERO DE SERVICIO: 17824

NUMERO DE INFORME: IQL-1457-26

FECHA INFORME: 30 de abril de 2026

TIPO DE MEZCLA: OBRA / PLANTA / SIN REFERENCIA X

NOMBRE DEL ELEMENTO	Nº MUESTRA	f'c Diseño (PSI)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensayo	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	CARGA (Kgf)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CORREC. ALTURA/DIAM	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% RESIS.	RESISTENCIA PROYECTADA (PSI)	TIPO DE FALLA	
FEDESTALES DE CIMENTACION	13	3000	16/04/26	7 DIAS	23-04-26	10,1	20,2	3856	12877	80,12	2,383	1	2296,06	160,72	76,5%	3425,3		X
	13			14 DIAS	30-04-26	10,0	20,2	3794	14366	78,54	2,391	1	2613,05	182,91	87,1%	3860,7		X
	13			28 DIAS	14-05-26													
VIGAS DE CIMENTACION	14	3000	20/04/26	7 DIAS	27-04-26	10,2	20,1	3819	12571	81,71	2,323	0,99	2175,78	152,30	72,5%	3257,3		X
	14			14 DIAS	04-05-26													
	14			28 DIAS	18-05-26													
VIGAS DE CIMENTACION	15	3000	22/04/26	7 DIAS	29-04-26	10,1	20,2	3817	12688	80,12	2,359	1	2262,36	158,37	75,4%	3376,8		X
	15			14 DIAS	06-05-26													
	15			28 DIAS	20-05-26													
VIGAS DE CIMENTACION	16	3000	24/04/26	7 DIAS	01-05-26													
	16			14 DIAS	08-05-26													
	16			28 DIAS	22-05-26													

OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA				
7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	90 DIAS
65-67	85-85	100	117-118	125-130

L/D	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
FACTOR CORR.	0,87	0,93	0,96	0,97	0,98	1,00









La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA:	REVISO	FIRMA:
	NOMBRE: JAMES HERRERA		NOMBRE: JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO: AUX. DE LABORATORIO		CARGO: ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com
N.S. 17824

Codigo	IQI-FR-005
Version	02
Fecha	30/09/2019
Pagina	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410

INGEQUALITY S.A.S


PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META		
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO:	17824
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - DEPARTAMENTO DEL META	NUMERO DE INFORME:	IQI-1457-26
FECHA RECIBO:	ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE ABRIL	FECHA INFORME:	30 de abril de 2026
OBSERVACIONES:	NINGUNA		
MARCA DE CEMENTO:	PORTLAND C- 17,83 K- 1,38	TIPO DE MEZCLA	OBRA: ; PLANTA: ; MIX REFERENCIA: X


NOMBRE DEL ELEMENTO	Nº MUESTRA	f'c Diseño (PSI)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensayo	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	CARGA (Kgf)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CONDIC. ESPECIM.	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% RESIS.	RESISTENCIA PROYECTADA (PSI)	TIPO DE FALLO
VIGAS DE CIMENTACION	17	3000	27/04/26	7 DIAS	04-05-26												
	17			14 DIAS	11-05-26												
	17			28 DIAS	25-05-26												
VIGAS DE CIMENTACION	18	3000	29/04/26	7 DIAS	06-05-26												
	18			14 DIAS	13-05-26												
	18			28 DIAS	27-05-26												
VIGAS DE CIMENTACION	19	3000	30/04/26	7 DIAS	07-05-26												
	19			14 DIAS	14-05-26												
	19			28 DIAS	28-05-26												


OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA				
7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	90 DIAS
65-67	82-83	100	117-118	128-130

L/D	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
FACTOR CORR.	0,87	0,95	0,97	0,97	0,99	1,00









La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA .	REVISO	FIRMA .
	NOMBRE . JAMES HERRERA		NOMBRE . JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO . AUX. DE LABORATORIO		CARGO . ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 17824

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 5. Informe SST

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

CONTRATO DE OBRA NO. 1700 DE 2025

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

INFORME MENSUAL NRO.1 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
R/L ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
DEPARTAMENTO DEL META
ABRIL DE 2026

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
2.1. OBJETIVO GENERAL 3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
3. ALCANCE DEL PROYECTO 4
4. LISTADO DE PERSONAL VINCULADO 4
4.1. Personal mes de abril 2026 4
5. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 5
6. INDUCCIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). 6
7. ENTREGA DE DOTACIÓN Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 7
8. ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO PARA DESARROLLO DE TAREAS (VERIFICACIÓN PERFIL Y/O COMPETENCIA) 8
8.1 INSPECCIÓN A RECURSOS FÍSICOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 8
8.2. INSPECCIÓN DE EQUIPOS 9
8.3. VERIFICACIÓN DEL PERFIL 9
8.4. DESARROLLO DE COMPETENCIAS 9
9. PROGRAMA DE CAPACITACIONES 9
9.2. CHARLAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11
10. REPORTES DE ACCIDENTES 12
11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12
12. RETIRO DE PERSONAL UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 13
13. CONCLUSIONES 13

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las obligaciones contractuales derivadas del CONTRATO DE OBRA NO. 1700 DE 2025, la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 presenta el Informe de Gestión SST correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, fecha en la cual se dio inicio formal a las actividades del contrato.

El presente informe tiene como finalidad evidenciar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en la fase inicial del proyecto, detallando las acciones preventivas, controles aplicados, procesos administrativos de vinculación del personal y medidas adoptadas para mitigar los riesgos propios de las actividades preliminares de obra.

Durante este período se desarrollaron actividades de instalación, adecuación inicial, desmontes y demoliciones menores, las cuales fueron ejecutadas bajo criterios de prevención, control y supervisión permanente, priorizando la integridad física y la salud del personal vinculado.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a la legislación colombiana prevista para proteger la integridad de los trabajadores independiente de su modalidad de contratación o vinculación en el proyecto.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo por medio de la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Diseñar y ejecutar una adecuada planeación de las tareas con el fin de optimizar los recursos y minimizar la mayor cantidad de incidentes o accidentes de trabajo, enfermedades y perdidas en las operaciones.
- Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios acordes con el esquema de jerarquización, prevaleciendo la intervención en la fuente y en el medio.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contrato de Obra No. 1700 de 2025 tiene por objeto la construcción de la sede de la fiscalía general de la Nación en el municipio de Puerto Gaitán, comprendiendo la ejecución integral de las actividades necesarias para la materialización, puesta en funcionamiento y entrega de la infraestructura conforme a los diseños, especificaciones técnicas, normativa vigente y obligaciones contractuales establecidas.

El alcance del proyecto incluye el desarrollo de las siguientes fases constructivas:

- Actividades preliminares, cerramiento y adecuación de campamento.
- Demoliciones, desmontes y manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).
- Movimiento de tierras y adecuación del terreno.
- Ejecución de cimentaciones y estructuras en concreto.
- Instalación de acero estructural y elementos metálicos.
- Construcción de muros, pañetes y acabados arquitectónicos.
- Instalación de pisos, enchapes, cielorrasos y cubiertas.
- Montaje de puertas, ventanas, barandas y vidrios.
- Ejecución de redes hidráulicas, sanitarias internas y sistemas de evacuación.
- Instalación de aparatos sanitarios.
- Implementación de redes eléctricas, voz y datos.
- Instalación del sistema de aire acondicionado.
- Adecuación de zonas exteriores y zonas verdes.
- Actividades de transporte y logística asociadas a la obra.

Desde el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo, el alcance del proyecto implica la ejecución de actividades con exposición a riesgos locativos, mecánicos, eléctricos, biomecánicos, de trabajo en alturas, manipulación de cargas, operación de maquinaria pesada y coordinación de múltiples frentes de trabajo, lo cual requiere la implementación integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando la identificación, evaluación y control permanente de peligros durante todas las etapas constructivas.

El proyecto contempla la vinculación de personal profesional, técnico y operativo, así como la participación de subcontratistas especializados, quienes deberán cumplir con los lineamientos del SG-SST del contratista y la normativa nacional vigente en materia de riesgos laborales.

4. LISTADO DE PERSONAL VINCULADO

Durante el periodo reportado, la Unión Temporal Confisca 25 efectuó la vinculación del personal requerido para la ejecución de las actividad de obra, dando cumplimiento a la normativa laboral vigente y a los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, procesos de inducción y entrega de elementos de protección personal.

4.1. Personal mes de abril 2026

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra vinculado a la Unión Temporal Confisca 25 para al mes de abril del presente año:

Tabla 1. Personal vinculado mes de abril de 2026

IDENTIFICACIÓN		TIPO DE COTIZANTE	APELLIDOS Y NOMBRES	COL.	EXT.	LIQ SOLO FSP.	REFORMA TRIBUTARIA	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING		RET	
TIPO	NÚMERO									APLICA	DIA	APLICA	DIA
CC	1006691448	DEPENDIENTE	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1006776906	DEPENDIENTE	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1006783220	DEPENDIENTE	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1052413449	DEPENDIENTE	JAIMES CAAMANO DANY FABIAN				SI	$1.750.905	FIJO	X	7		
CC	1121829244	DEPENDIENTE	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1121946586	DEPENDIENTE	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1124818810	DEPENDIENTE	AYALA ROJAS DANIEL ANDRES				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1124818911	DEPENDIENTE	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1124991535	DEPENDIENTE	PEREZ CARIBAN WALFRAN				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1134450031	DEPENDIENTE	DARAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN				SI	$1.750.905	FIJO	X	7		
CC	3215459	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	40186168	DEPENDIENTE	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	52481418	DEPENDIENTE	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO				SI	$2.000.000	FIJO				
CC	7248128	DEPENDIENTE	SANCHEZ USECHE JOSE				SI	$2.500.000	FIJO				
CC	74325151	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86047574	DEPENDIENTE	TRIGOS MORENO WILLIAM				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86062096	DEPENDIENTE	BAQUERO MUNOZ CARLOS EDUARDO				SI	$2.000.000	FIJO				

PROCESOS DE AFILIACIÓN:

- Realización de exámenes medico ocupacionales de ingreso (EMO) de acuerdo al cargo a desempeñar.
- Procesos de inducción el cual consta de teoría y evaluación.
- Entrega de Dotación y entrega de EPP, al ingresar el personal a ejercer sus actividades.
- Acompañamiento en campo para desarrollo de tareas (verificación perfil y/o competencia).

Como evidencia del cumplimiento del proceso de Afiliación al SGSS se anexan al presente informe las Planillas de pago de Seguridad Social y exámenes médicos ocupacionales de ingreso del personal vinculado.

5. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

La Unión Temporal Confisca 25 realiza la práctica de exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado al proyecto, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a la normativa vigente en materia de salud ocupacional.

Estos exámenes se realizan al momento del ingreso del personal y según las necesidades propias de la operación, con el fin de verificar las condiciones de salud de los trabajadores y garantizar su aptitud para el desarrollo seguro de las actividades propias del proyecto.

A continuación se reporta el estado de aseguramiento del personal operativo mediante el cruce de planillas y certificados:

Tabla 2. Relación de personal y cargo abril de 2026

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA ESP. AMBIENTAL	5168896592	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168896592	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENIERÍA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PROTEGER	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARÍO HERNÁNDEZ CALDERÓN	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSÉ SÁNCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5168896592	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	FAMISANAR	SURA
ADOLFO VASQUES MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL				

6. INDUCCIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).


La UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 dentro de su Programa de Formación garantiza el proceso de inducción esto sujeto al Decreto 1072 de 2015-Artículo 2.2.4.6.11, dicho programa cumple con los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, se incluyen temas como la identificación, el control de peligros y riesgos en puesto de trabajo y la prevención de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales propios y contratistas, entre otros temas sugeridos en el marco legal, ejemplo:

- Políticas del SG-SST de LA UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
- Funciones y responsabilidades de SG-SST,
- Funciones del COPASST, Funciones del comité de convivencia laboral, Funciones de la brigada Integral de control y atención de emergencias.
- Reporte de incidentes y accidentes de trabajo,
- Uso adecuado de EPP,
- Clasificación y disposición de los residuos sólidos,
- Pausas activas.

Registro fotográfico



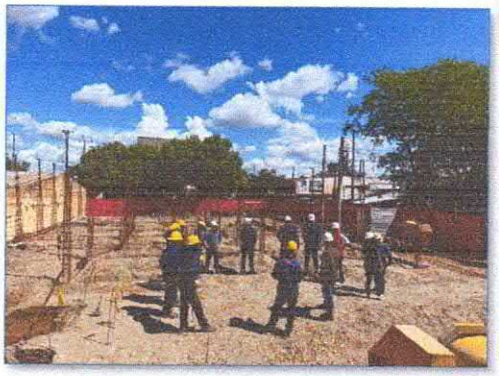


7. ENTREGA DE DOTACIÓN Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 acata lo emanado en el Código Sustantivo del Trabajo – CST (Art. 230) en el cual se indica la obligación de hacer entrega de la dotación, (calzado, vestido, casco, guantes, gafas, tapa oídos y tapa bocas para ejercer la labor contratada); de acuerdo al marco legal se realizó seguimiento al adecuado uso de los EPP a través de inspecciones y se dio en reposición aquellos EPP que ya no proporcionaban la protección debido al desgate normal por su uso.

Registro fotografico



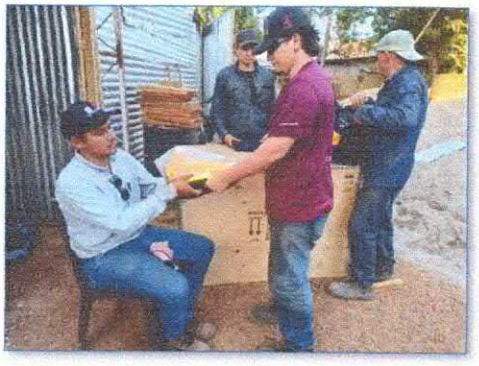

Inspección uso adecuado y estado de los EPP

8. ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO PARA DESARROLLO DE TAREAS (VERIFICACIÓN PERFIL Y/O COMPETENCIA)

Las actividades de acompañamiento y supervisión en campo por parte del área HSE se realizan recurriendo a inspecciones de seguridad. La UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 reconoce la importancia de realizar permanentemente inspecciones de seguridad, las cuales permite reducir y prevenir lesiones en el área de trabajo, mejorar el ambiente y condiciones laborales; que la operación permanezca segura pues advierte respecto a desviaciones de proceso o comportamiento, lo que podría llegar a desencadenar accidentes de trabajo (AT) o enfermedades laborales (EL).

8.1 INSPECCIÓN A RECURSOS FÍSICOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Para le ejecución del Contrato de Obra No. 1700 de 2025, se lleva a cabo de manera continua y programada la inspección de los recursos físicos destinados para la atención de emergencias, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

Estas inspecciones fueron realizadas mensualmente por el personal responsable del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25, bajo la supervisión y acompañamiento de la interventoría, con el objetivo de garantizar la operatividad, disponibilidad y correcto estado de los elementos requeridos para la atención de emergencias durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Dentro de las acciones efectuadas se incluyeron la inspección y verificación de botiquines de primeros auxilios, extintores portátiles, camillas de emergencia, así como la revisión preoperacional de los equipos y herramientas utilizadas en la obra, asegurando su funcionamiento adecuado y cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas.

Estas actividades se documentaron mediante los respectivos formatos de inspección y registro fotográfico, los cuales reposan en el archivo técnico del proyecto como evidencia de la gestión preventiva desarrollada por el contratista.

Registro fotográfico



Inspeccion de kit contra incencido y Kit de primeros auxilios

8.2. INSPECCIÓN DE EQUIPOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se realizaron actividades de inspección de equipos y herramientas menores, en atención a las labores ejecutadas en obra, las cuales han requerido principalmente el uso de herramienta manual y una mezcladora.

En este sentido, se efectuaron verificaciones periódicas del estado general de la mezcladora, revisando condiciones de funcionamiento, estructura, sistema eléctrico y elementos de seguridad, con el fin de garantizar su operación segura y eficiente durante las actividades constructivas.

Así mismo, se realizó la inspección de herramientas menores, verificando su estado físico, condiciones de uso y aptitud para las actividades desarrolladas, evitando la utilización de herramientas defectuosas o en mal estado que pudieran representar riesgos para el personal.

Estas actividades se desarrollaron conforme a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), contribuyendo a la prevención de incidentes y al mantenimiento de condiciones seguras en el desarrollo de la obra.

Registro fotográfico





8.3. VERIFICACIÓN DEL PERFIL

Este proceso se da antes del proceso de contratación, el director de obra con apoyo del líder de punto de trabajo realizó entrevistas y verificación de hojas de vida que permiten la verificación del perfil del candidato al cargo.

8.4. DESARROLLO DE COMPETENCIAS

La estrategia para el desarrollo de competencias se lleva a cabo a partir de Capacitaciones, charlas 5 minutos, publicación de información preventiva en y el apoyo constante de los comités SST, además cada ayudante de obra está constantemente asistido por el maestro de la obra quien le cuida e indica las labores a ejecutar en el día a día.

9. PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Durante la ejecución del Contrato de Obra No.1700 de 2025, la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 implementara un programa de capacitaciones y charlas de sensibilización en el marco del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientado a fortalecer la cultura preventiva del personal vinculado al proyecto y garantizar el desarrollo de las actividades en condiciones seguras.

Las capacitaciones estarán dirigidas a todo el personal técnico, operativo y administrativo, y serán programadas periódicamente durante el desarrollo del contrato, abordando los temas asociados a la identificación, prevención y control de los riesgos laborales propios de las labores ejecutadas en la obra.


Entre los principales riesgos presentes durante la ejecución del proyecto se identificaron los siguientes:

- Riesgos eléctricos, derivados de la instalación y conexión del sistema de red eléctrica, tableros, cableado y equipos de refrigeración.
- Riesgos locativos, asociados a irregularidades del terreno, manipulación de materiales, tránsito dentro del área de obra y almacenamiento de insumos.
- Riesgos por manipulación de herramientas y equipos, como cortes, golpes, atrapamientos o proyección de partículas.
- Riesgos ergonómicos, por posturas forzadas, levantamiento manual de cargas y movimientos repetitivos.
- Riesgos físicos, relacionados con exposición a ruido, vibraciones y cambios de temperatura durante las actividades de instalación.
- Riesgos químicos, por exposición a productos de limpieza, pinturas y disolventes.
- Riesgos biomecánicos y de caída a mismo o distinto nivel, durante actividades de instalación, mantenimiento o manipulación de estructuras.
- Riesgos de incendio o conato, por almacenamiento y manipulación de materiales combustibles o equipos eléctricos energizados.

El desarrollo del programa de capacitaciones permitirá fortalecer las competencias del personal en el reconocimiento y control de los factores de riesgo, en la correcta utilización de los elementos de protección personal (EPP) y en la aplicación de procedimientos seguros para la prevención de accidentes, incidentes o enfermedades laborales.

Todas las actividades de capacitación serán registradas mediante actas de asistencia, registros fotográficos.

Tabla 3. Temáticas formación SST - capacitaciones

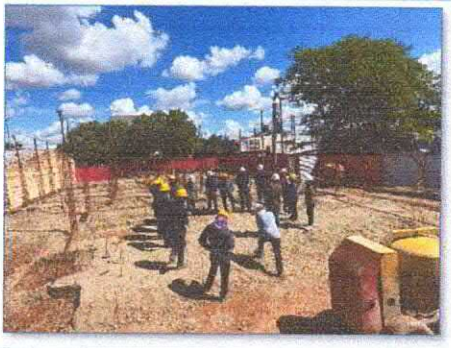Nro.	COMPONENTE	TEMA	Registro fotográfico
1	Seguridad y Salud en el Trabajado	Capacitación en Calistenia Laboral: Prevención del riesgo biomecánico	

Fuente: Propia

9.2. CHARLAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 1700 de 2025, la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25, a través del personal responsable del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), implementara de manera permanente la estrategia de charlas diarias de seguridad de 5 minutos, desarrolladas directamente en los frentes de trabajo y en distintos momentos de la jornada laboral, como parte de las acciones de formación, prevención y control establecidas dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Estas charlas cortas constituyen una herramienta práctica y efectiva para la comunicación directa con los trabajadores, permitiendo recordar y reforzar los comportamientos seguros, las normas de protección y las medidas de prevención frente a los peligros y situaciones adversas que podrían presentarse durante la ejecución de las actividades propias del proyecto.

Los temas abordados en estas jornadas incluyeron, entre otros, el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP), la identificación de condiciones y actos inseguros, el manejo seguro de herramientas y equipos, la prevención de riesgos eléctricos, físicos, ergonómicos y locativos, las medidas de orden y aseo en obra, la gestión de residuos, la atención de emergencias menores y la promoción de prácticas de autocuidado y corresponsabilidad en seguridad.

El objetivo fundamental de estas actividades fue informar, sensibilizar y comprometer a los trabajadores con la prevención de accidentes e incidentes laborales, fortaleciendo la cultura del autocuidado, el cumplimiento de los procedimientos establecidos y el trabajo seguro dentro de cada frente de obra.

Las charlas fueron dirigidas y registradas por el personal del área de SST de la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), y bajo la supervisión y acompañamiento del equipo de interventoría. Los registros de estas actividades se encuentran soportados mediante actas de asistencia y evidencias fotográficas los cuales se anexan al presente informe como evidencia documental del cumplimiento del componente de formación y comunicación en seguridad.

Registro fotográfico





10. REPORTES DE ACCIDENTES

Durante la ejecución del contrato no se reportaron presuntos accidentes laborales AT ni enfermedades laborales EL en las actividades del proyecto, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 4. Indicadores siniestralidad la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA

MES	F.A FRECUENCIA ACCIDENTALIDAD	S.A. SEVERIDAD AT	P.A.M. PROPORCIÓN ACCIDENTES MORTALES	INCIDENCIA EL	PREVALENCIA EL	AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA
ABRIL 2026	0	0	0	0	0	0

11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se presentan las principales estrategias de prevención de seguridad por parte del área HSE para minimizar potencial de ATEL.

Tabla 5. Actividades ejecutadas

FICHA RESUMEN LABORES HSE PRIORIZADAS EN CAMPO	
LABORES HSE ANTES DE LA OPERACIÓN	✓ Verificación del pago de seguridad social. ✓ Inspecciones pre operacionales de equipos, máquinas y herramientas. ✓ Inspección EPP ✓ Entrega EPP de acuerdo a la labor a realizar ✓ Charla 5 min ✓ Identificación de peligros
LABORES HSE DURANTE LAS OPERACIONES	✓ Verificación de uso adecuado de EPP. ✓ Verificación uso adecuado de herramientas manuales, neumáticas y eléctricas. ✓ Verificación riesgos de posibles imprevistos. ✓ Verificación señalización de las áreas de trabajo ✓ Verificación de comportamiento seguro por parte de los trabajadores. ✓ Apoyo para realización de pausas activas. ✓ Verificación espacios ordenados y limpios. ✓ Verificación área laboral segura ✓ Verificación adecuada higiene postural ✓ Hidratación

LABORES HSE DESPUÉS DE LAS OPERACIONES.	✓ Verificación disposición adecuada de residuos. ✓ Verificación condiciones de salud y/o reportes. ✓ Verificación condiciones de maquinaria, equipos y herramientas. ✓ Verificación almacenamiento seguro de herramientas. ✓ Actividades para acondicionamiento corporal. ✓ Verificación orden y aseo ✓ Verificar estado de los EPP (si necesitan reposición.

12. RETIRO DE PERSONAL UNIÓN TEMPORAL CONFISCA

Para el presente periodo no se reportaron retiros.

13. CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se evidenció la implementación de las actividades necesarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución del proyecto.

- Se continúo realizando de manera adecuada la vinculación del personal, garantizando el cumplimiento de los requisitos en materia de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. Así mismo, se efectuó la entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP) conforme a las actividades desarrolladas en obra, promoviendo condiciones seguras para el personal operativo.

- De igual forma, se continuo implementaron medidas preventivas y de control de riesgos, acompañadas de la realización de charlas de inducción, reinducción y capacitaciones periódicas, orientadas a fortalecer la cultura de seguridad en el proyecto y prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo.

- Se verificó la disponibilidad y adecuado estado de los elementos de atención de emergencias, tales como botiquín de primeros auxilios, así como la adopción de protocolos básicos de respuesta ante eventualidades.

- Durante el periodo reportado se realizaron inducciones y socializaciones permanentes al personal operativo y administrativo, orientadas al fortalecimiento de la cultura de prevención, autocuidado y cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente en lo relacionado con identificación de riesgos, uso adecuado de herramientas y comportamiento seguro dentro del área de intervención.

DENISE ROCIÓ MARTÍNEZ MOLINA
C.C. 52481418
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
Resolución 6972 del 14 de octubre de 2020

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 1 INFORME SST- INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

2816

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25	
GESTION HUMANA	UNION TEMPORAL CONFISCA 25 NIT 900913442-0
ENTREGA DE DOTACION Y EPI	

CODIGO: GH-FR-03 VERSION: 01 REVISADO: 05/02/2018 APROBADO: 05/02/2018

COMPROMISO DEL TRABAJADOR Y MARCO LEGAL

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Arte. 56 y art. 58 número 7; LEY 9 DE 1979; Arte. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado adecuado de los EPP, el incumplimiento me genera faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Recusros Humano - Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento al cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de la empresa.

INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Leider Esteban Darapo Gaitan		
CEDULA	1134450031	DE	Villavicencio
CARGO	Ayudante de obra		

TIPO DE ENTREGA (Seleccione con una X el tipo de entrega)

Inicial (X) tiempo ( ) Reposicion ( ) Vencimiento ( )

FECHA DE LA ENTREGA:

LISTADO DE DOTACION Y EPI

DESCRIPCION		CANT	DESCRIPCION		CANT
Pantalón	X	1	Bota de caucho con punta de acero	☐	
Camisa manga larga	X	1	Bota larga con punta de acero	☐	
Buso	☐		Casco	X	1
Gafas de seguridad claras	☑		Capuchon o Escafandra	☐	
Gafa de seguridad oscura	X	1	Impermeable	☐	
Tyvek	☐		Chaleco reflectivo	☐	
Protector auditivo de insercion	☐		Paleta pare y siga	☐	
Protector auditivo tipo copa	☐		Arnes	☐	
Mascarilla desechable	☐		Eslinga	☐	
Mascarilla de cartuchos	☐		Overol	☐	
Guantes cortos de Vaqueta	X	1	Cachucha	☐	
Guantes de nitrilo	☐		Riata	☐	
Bota corta con punta de Acero	X	1	Camisilla	☐	
Carnet	☐		Porta carnet	☐	
Otro:	☐		Otro:	☐	
Otro:	☐		Otro:	☐	
Otro:	☐		Otro:	☐	

OBSERVACIONES

CUALES?

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN LA ENTREGA

QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE	Denise Rodio Martinez	NOMBRE	Leider Esteban Darapo
CARGO:	52481418 Profesional SST	CARGO	Ayudante de obra.

2877

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25	
GESTION HUMANA	UNION TEMPORAL CONFISCA 25 NIT 902015442-0
ENTREGA DE DOTACION Y EPI	

CODIGO: GH-FR-03 VERSION: 01 REVISADO: 05/02/2018 APROBADO: 05/02/2018

COMPROMISO DEL TRABAJADOR Y MARCO LEGAL

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Arte. 56 y art. 58 número 7; LEY 9 DE 1979; Arte. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado adecuado de los EPP, el incumplimiento me genera faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Recusros Humano - Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento al cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de la empresa.

INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Dany fabian Jaimes Caamaño		
CEDULA	1052 413 449	DE	Duitama.
CARGO	Ayudante de obra.		

TIPO DE ENTREGA (Seleccione con una X el tipo de entrega)

Inicial (X) tiempo ( ) Reposicion ( ) Vencimiento ( )

FECHA DE LA ENTREGA:

LISTADO DE DOTACION Y EPI

DESCRIPCION		CANT	DESCRIPCION		CANT
Pantalón	X	1	Bota de caucho con punta de acero	☐	
Camisa manga larga	X	2	Bota larga con punta de acero	☐	
Buso	☐		Casco	X	1
Gafas de seguridad claras	☑		Capuchon o Escafandra	☐	
Gafa de seguridad oscura	X	1	Impermeable	☐	
Tyvek	☐		Chaleco reflectivo	☐	
Protector auditivo de insercion	☐		Paleta pare y siga	☐	
Protector auditivo tipo copa	☐		Arnes	☐	
Mascarilla desechable	☐		Eslinga	☐	
Mascarilla de cartuchos	☐		Overol	☐	
Guantes cortos de Vaqueta	X	1	Cachucha	☐	
Guantes de nitrilo	☐		Riata	☐	
Bota corta con punta de Acero	X	1	Camisilla	☐	
Carnet	☐		Porta carnet	☐	
Otro:	☐		Otro:	☐	
Otro:	☐		Otro:	☐	
Otro:	☐		Otro:	☐	

OBSERVACIONES	CUALES?	

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN LA ENTREGA

QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE	Denise Ruiz Martinez.	NOMBRE	Dany fabian Jaimes.
CARGO:	Profesional SISO.	CARGO	Ayudante de obra.

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 2 INFORME SST- REGISTROS DE INDUCCIÓN Y EXÁMENES MÉDICOS

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS S.A.S

Nit. 900547903 - 9
Dirección: Carrera 12 No.08 - 07 Barrio Centro, Puerto Gaitan-Meta
Tel: 3154140634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

PRE-INGRESO

Tipo certificación: Pre-Ingreso ⊗ Periódico ○ Egreso ○ Post incapacidad ○ Seguimiento ○
Control ○ Reubicación ○ Retorno ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **08/04/2026 06:46:00** Ciudad **PUERTO GAITAN** Departamento **META**

Doc. Identidad **CC 1052413449** Nombre **DANY FABIAN JAIME CAAMAÑO** Sexo **F** Edad **27 Años**

Teléfono **3143047792** Dirección **CORPOMECAVE**

Cargo **AYUDANTE**

Empresa **902013442 - UNION TEMPORAL CONFISCA 252**

Actividad económica **CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.**

Eps **FAMISANAR**

Arl **N/A** Fondo de pensión **PORVENIR**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PREINGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR, CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA, AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS YOSEOS CON ENMASCARAMIENTO(AUDIOMETRIA TONAL)

CONCEPTO

Favorable para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

DIETA BAJA EN GRASA ORIGEN ANIMAL,DIETA SALUDABLE,EJERCICIO REGULAR,ESTILO DE VIDA SALUDABLE,UTILIZACION DE EPP SEGUN CARGO.

Gustavo A. Franco G. 9870330
Medico U.T.P. – RM 9870330
ESP. S.S.T. – UNAB – RES 95-286

GUSTAVO ADOLFO FRANCO GUTIERREZ
MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RM: 9870330
ESP.S.S.T UNAB RES 95-286 DE 2023

Trabajador: DANY FABIAN JAIME CAAMAÑO
CC: 1052413449
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS S.A.S
Nit. 900547903 - 9
Dirección: Carrera 12 No.08 - 07 Barrio Centro, Puerto Gaitan-Meta
Tel: 3154140634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

PRE-INGRESO

Tipo certificación: Pre-Ingreso (X) Periódico ( ) Egreso ( ) Post incapacidad ( ) Seguimiento ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Retorno ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **08/04/2026 06:46:00** Ciudad **PUERTO GAITAN** Departamento **META**

Doc. Identidad **CC 1052413449** Nombre **DANY FABIAN JAIME CAAMAÑO** Sexo **F** Edad **27 Años**

Teléfono **3143047792** Dirección **CORPOMECAVE**

Cargo **AYUDANTE**

Empresa **902013442 - UNION TEMPORAL CONFISCA 252**

Actividad económica **CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.**

Eps **FAMISANAR**

Arl **N/A** Fondo de pensión **PORVENIR**

RESTRICCIONES LABORALES

PUNTUACIÓN FRAMINGHAM MODIFICADO

Puntaje: 8 RIESGO INTERMEDIO

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EAPB-EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Gustavo A. Franco G.
Medico U.T.P. – RM 9870330
ESP. S.S.T. – UNAB – RES 95-286

GUSTAVO ADOLFO FRANCO GUTIERREZ
MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RM: 9870330
ESP.S.S.T UNAB RES 95-286 DE 2023

Trabajador: DANY FABIAN JAIME CAAMAÑO
CC: 1052413449
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS S.A.S

Nit. 900547903 - 9
Dirección: Carrera 12 No.08 - 07 Barrio Centro, Puerto Gaitan-Meta
Tel: 3154140634

RECOMENDACIONES
PRE-INGRESO

Tipo certificación: Pre-Ingreso (X) Periódico ( ) Egreso ( ) Post incapacidad ( ) Seguimiento ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Retorno ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **08/04/2026 06:46:00** Ciudad **PUERTO GAITAN** Departamento **META**

Doc. Identidad **CC 1052413449** Nombre **DANY FABIAN JAIME CAAMAÑO** Sexo **F** Edad **27 Años**

Teléfono **3143047792** Dirección **CORPOMECAVE**

Cargo **AYUDANTE**

Empresa **902013442 - UNION TEMPORAL CONFISCA 252**

Actividad económica **CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.**

Eps **FAMISANAR**

Arl **N/A** Fondo de pensión **PORVENIR**

RECOMENDACIONES

DIETA BAJA EN GRASA ORIGEN ANIMAL,DIETA SALUDABLE,EJERCICIO REGULAR,ESTILO DE VIDA SALUDABLE,UTILIZACION DE EPP SEGUN CARGO.

Gustavo A. Franco G.
Medico U.T.P. - RM 9870330
ESP. S.S.T. - UNAB - RES 95-286

GUSTAVO ADOLFO FRANCO GUTIERREZ
MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RM: 9870330
ESP.S.S.T UNAB RES 95-286 DE 2023

Trabajador: DANY FABIAN JAIME CAAMAÑO
CC: 1052413449
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

2822

UNION TEMPORAL CONFISCA 25

GESTION HUMANA	UNION TEMPORAL CONFISCA 25 NIT 901013442-0
CONSTANCIA DE INDUCCION- REINDUCCION	

CODIGO: GH-FR-14	VERSION: 01	REVISADO: 01/01/2026	APROBADO: 03/01/2026

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

				TIPO	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Dany Johan Jaimes Camero	CARGO:	Ayudante de obra	INDUCCIÓN	X
ÁREA / PROYECTO:	Construcción de la sede Fiscalia.	FECHA INGRESO:	01-04-2026	REINDUCCIÓN	

INDUCCIÓN DE PERSONAL

INFORMACIÓN EMPRESARIAL	FECHA	NOMBRE CARGO Y FIRMA CAPACITADOR	FIRMA TRABAJADOR
Objetivos integrales del SG-SST	07-04-26	Danny Perez Yanez / Denise Martinez	Danny F.Y.C
Reglamento Interno de trabajo			
Organigrama			
Alcance del SGI			
Contexto de la organización			

POLÍTICAS EMPRESARIALES	FECHA	NOMBRE CARGO Y FIRMA CAPACITADOR	FIRMA TRABAJADOR
Política integral del SG-SST	07-04-26	Danny Perez Yanez / Denise Martinez	Danny F.Y.C.
Política de seguridad vial			
Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas			
Política de protección de datos			

HSE	FECHA	NOMBRE CARGO Y FIRMA CAPACITADOR	FIRMA TRABAJADOR
Matrices(IPVR, epp, requisitos legales, sustancias quimicas)	07-04-26	Danny Perez Yanez	Danny F.Y.C
Reglamento de higiene y seguridad industrial			
Plan de emergencias- medevac-Conocimiento e identificación brigadas de emergencia, para saber como actuar, protocolos de seguridad.			
Le dieron a conocer los Programas y programas de vigilancia Epidemiologica del SGI			
Comité de convivencia laboral (miembros y funciones)			
Copasst o viga (miembros y funciones)			
Reporte de accidentes e incidentes e investigación			
Uso, cuidado y mantenimiento de los elementos EPI.			
Le explicarón que es HSEQR			
Plan de manejo ambiental y gestion de residuos			
Le quedo claro que es un accidente laboral, enfermedad laboral y cual es la ley que lo regula? Que debe hacer en caso de un accidente.			
Le informaron que debe hacer una evaluacion de riesgos antes de iniciar cada recorrido y si es necesario reportarlo enel formato REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS.			
Fase I Fomento del trabajo limpio y saludable			
Conoce las Normas Básica que debe tener en Seguridad			
Sabe cómo mitigar los riesgos a los cuales esta expuesto en cada puesto de trabajo.			

CARGO	FECHA	NOMBRE CARGO Y FIRMA CAPACITADOR	FIRMA TRABAJADOR
Le quedaron claras las Funciones y Responsabilidades que esta asumiendo en su cargo. Y cuáles son sus Responsabilidades en Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad.	07-04-26	Danny Perez Yanez / Denise Martinez	Danny F.Y.C
Horarios de trabajo (turnos) y lugar de trabajo			
Conducto Regular			
Divulgacion de los procedimientos que se encuentran a su cargo según al proceso del sgi en que pertenece.			
Procedimientos de interacción en la labor a desempeñar			

INFORMACION ADICIONAL

APROBO		VALIDA	VISTO BUENO	
SI	X			
NO		COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	JEFE INMEDIATO	COORDINADOR HSE

PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS S.A.S

Nit. 900547903 - 9
Dirección: Carrera 12 No.08 - 07 Barrio Centro, Puerto Gaitan-Meta
Tel: 3154140634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

PRE-INGRESO

Tipo certificación: Pre-Ingreso ⊗ | Periódico ○ | Egreso ○ | Post incapacidad ○ | Seguimiento ○
Control ○ | Reubicación ○ | Retorno ○ | Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **09/04/2026 08:25:00** Ciudad **PUERTO GAITAN** Departamento **META**

Doc. Identidad **CC 1134450031** Nombre **LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN** Sexo **M** Edad **28 Años**

Teléfono **3138169957** Dirección **UNUMA**

Cargo **AYUDANTE**

Empresa **902013442 - UNION TEMPORAL CONFISCA 252**

Actividad económica **CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.**

Eps **NUEVA EPS**

Arl **SURA** Fondo de pensión **N/A**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PREINGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR, AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS YOSEOS CON ENMASCARAMIENTO(AUDIOMETRIA TONAL), CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA

CONCEPTO

Favorable para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

DIETA BAJA EN GRASA ORIGEN ANIMAL,DIETA SALUDABLE,EJERCICIO REGULAR,ESTILO DE VIDA SALUDABLE,UTILIZACION DE EPP SEGUN CARGO.

Gustavo A. Franco G. 9870330
Medico U.T.P. – RM 9870330
ESP. S.S.T. – UNAB – RES 95-286

GUSTAVO ADOLFO FRANCO GUTIERREZ
MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RM: 9870330
ESP.S.S.T UNAB RES 95-286 DE 2023

Leider Darapo

Trabajador: LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN
CC: 1134450031
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS S.A.S
Nit. 900547903 - 9
Dirección: Carrera 12 No.08 - 07 Barrio Centro, Puerto Gaitan-Meta
Tel: 3154140634

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

PRE-INGRESO

Tipo certificación: Pre-Ingreso (X) Periódico ( ) Egreso ( ) Post incapacidad ( ) Seguimiento ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Retorno ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **09/04/2026 08:25:00** Ciudad **PUERTO GAITAN** Departamento **META**

Doc. Identidad **CC 1134450031** Nombre **LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN** Sexo **M** Edad **28 Años**

Teléfono **3138169957** Dirección **UNUMA**

Cargo **AYUDANTE**

Empresa **902013442 - UNION TEMPORAL CONFISCA 252**

Actividad económica **CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.**

Eps **NUEVA EPS**

Arl **SURA** Fondo de pensión **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES

PUNTUACIÓN FRAMINGHAM MODIFICADO

Puntaje: 9 RIESGO INTERMEDIO

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EAPB-EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

Gustavo A. Franco G.
Medico U.T.P. – RM 9870330
ESP. S.S.T. – UNAB – RES 95-286

GUSTAVO ADOLFO FRANCO GUTIERREZ
MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RM: 9870330
ESP.S.S.T UNAB RES 95-286 DE 2023

Leider Darapo

Trabajador: LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN
CC: 1134450031
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS S.A.S
Nit. 900547903 - 9
Dirección: Carrera 12 No.08 - 07 Barrio Centro, Puerto Gaitan-Meta
Tel: 3154140634

RECOMENDACIONES
PRE-INGRESO

Tipo certificación:	Pre-Ingreso ⊗	Periódico ○	Egreso ○	Post incapacidad ○	Seguimiento ○
	Control ○	Reubicación ○	Retorno ○	Trabajo en alturas ○	

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **09/04/2026 08:25:00** Ciudad **PUERTO GAITAN** Departamento **META**

Doc. Identidad **CC 1134450031** Nombre **LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN** Sexo **M** Edad **28 Años**

Teléfono **3138169957** Dirección **UNUMA**

Cargo **AYUDANTE**

Empresa **902013442 - UNION TEMPORAL CONFISCA 252**

Actividad económica **CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.**

Eps **NUEVA EPS**

Arl **SURA** Fondo de pensión **N/A**

RECOMENDACIONES

DIETA BAJA EN GRASA ORIGEN ANIMAL,DIETA SALUDABLE,EJERCICIO REGULAR,ESTILO DE VIDA SALUDABLE,UTILIZACION DE EPP SEGUN CARGO.

Gustavo A. Franco G.
Medico U.T.P. – RM 9870330
ESP. S.S.T. – UNAB – RES 95-286

GUSTAVO ADOLFO FRANCO GUTIERREZ
MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RM: 9870330
ESP.S.S.T UNAB RES 95-286 DE 2023

Leider Darapo

Trabajador: LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN
CC: 1134450031
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

2826

UNION TEMPORAL CONFISCA 25

GESTION HUMANA	UNION TEMPORAL CONFISCA 25 NIT 901013442-6
CONSTANCIA DE INDUCCION- REINDUCCION	

CODIGO: GH-FR-14 | VERSION: 01 | REVISADO: 01/01/2026 | APROBADO: 03/01/2026

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

				TIPO	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leider Esteban Dorado Gaitan	CARGO:	Ayudante	INDUCCIÓN	X
ÁREA / PROYECTO:	Construccion Sede la Flexilla.	FECHA INGRESO:	07-04-2026	REINDUCCION	

INDUCCIÓN DE PERSONAL

INFORMACIÓN EMPRESARIAL	FECHA	NOMBRE CARGO Y FIRMA CAPACITADOR	FIRMA TRABAJADOR
Objetivos integrales del SG-SST	07-04-26	Denise Martinez	Leider Esteban
Reglamento Interno de trabajo			
Organigrama			
Alcance del SGI			
Contexto de la organización			

POLÍTICAS EMPRESARIALES	FECHA	NOMBRE CARGO Y FIRMA CAPACITADOR	FIRMA TRABAJADOR
Política integral del SG-SST	07-04-26	Denise Martinez	Leider Esteban
Política de seguridad vial			
Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas			
Política de protección de datos			

HSE	FECHA	NOMBRE CARGO Y FIRMA CAPACITADOR	FIRMA TRABAJADOR
Matrices(IPVR, epp, requisitos legales, sustancias quimicas)	07-04-26	Denise Martinez	Leider Esteban
Reglamento de higiene y seguridad industrial			
Plan de emergencias- medevac-Conocimiento e identificación brigadas de emergencia, para saber como actuar, protocolos de seguridad.			
Le dieron a conocer los Programas y programas de vigilancia Epidemiologica del SGI			
Comité de convivencia laboral (miembros y funciones)			
Copasst o viga (miembros y funciones)			
Reporte de accidentes e incidentes e investigación			
Uso, cuidado y mantenimiento de los elementos EPI.			
Le explicarón que es HSEQR			
Plan de manejo ambiental y gestion de residuos			
Le quedo claro que es un accidente laboral, enfermedad laboral y cual es la ley que lo regula? Que debe hacer en caso de un accidente.			
Le informaron que debe hacer una evaluacion de riesgos antes de iniciar cada recorrido y si es necesario reportarlo enel formato REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS.			
Fase I Fomento del trabajo limpio y saludable			
Conoce las Normas Básica que debe tener en Seguridad			
Sabe cómo mitigar los riesgos a los cuales esta expuesto en cada puesto de trabajo.			

CARGO	FECHA	NOMBRE CARGO Y FIRMA CAPACITADOR	FIRMA TRABAJADOR
Le quedaron claras las Funciones y Responsabilidades que está asumiendo en su cargo. Y cuáles son sus Responsabilidades en Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad.	07-04-26	Denise Martinez	Leider Esteban
Horarios de trabajo (turnos) y lugar de trabajo			
Conducto Regular			
Divulgacion de los procedimientos que se encuentran a su cargo según al proceso del sgi en que pertenece.			
Procedimientos de interacción en la labor a desempeñar			

INFORMACION ADICIONAL

APROBO		VALIDA	VISTO BUENO	
SI	X			
NO		COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	JEFE INMEDIATO	COORDINADOR HSE

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 3 INFORME SST - CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD ARL

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

2878

ARL | sura

Medellín, 12 de mayo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa UNION TEMPORAL CONFISCA 25, NIT N902013442, ha reportado 1 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026, con un total de 0 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 5.88%.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 191.104.32.12, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 6. Nominas mensuales

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL ABRIL

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/04/2026	AL	30/04/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	30/04/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 40.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.040.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.899.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ -	30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 50.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.050.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.909.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.362	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.362	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.290	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 120.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.120.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.979.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.500.000	$ 960.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 960.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.709.095	$ 100.000	$ -	$ 3.609.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 90.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.090.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.949.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.362	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.362	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.290	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 10.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.010.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.869.928	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 90.000	24	$ 1.400.724	$ 24	$ 72.000	$ -	$ -	$ -	$ 199.276	$ 1.672.000	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.559.942	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 80.000	24	$ 1.400.724	$ 24	$ 64.000	$ -	$ -	$ -	$ 199.276	$ 1.664.000	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.551.942	
TOTALES					$ 31.012.670	$ 4.780.940		$ 30.312.308		$ 4.746.940	$ -	$ -	$ -	$ 4.134.977	$ 39.194.225	$ 1.212.492	$ 1.112.492	$ 36.869.240	

Redondeado al peso	Neto pagado: $36.869.240	Treinta y Seis Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Pesos

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL ABRIL

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/04/2026	AL	30/04/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	30/04/2026		

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	24	$ 1.600.000	$	133.333	$	1.067	$	133.333	$	58.364
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	24	$ 1.600.000	$	133.333	$	1.067	$	133.333	$	58.364
TOTAL NOMINA			**$ 34.447.285**	**$**	**2.870.607**	**$**	**28.173**	**$**	**2.870.607**	**$**	**1.263.013**

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	7.032.400
TOTAL NOMINA	$	36.869.240
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	**$**	**43.901.640**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1123086252 TP 271654-T

2831

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 7. Planillas de pagos de seguridad social

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	902013442
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5168896592		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2026
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0705351661

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.402.200	$ 0	$ 3.402.200
230201	230201- PROTECCION	2	$ 448.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.400	$ 0	$ 448.400
SUBTOTALES:										**$ 4.450.800**	**$ 0**	**$ 4.450.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 126.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 126.200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 320.200
SUBTOTALES:													**$ 1.213.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.213.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0			$ 1.884.800	$ 1.884.800	$ 0	$ 0	$ 1.884.800
SUBTOTALES:									**$ 1.884.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.884.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.213.400	$ 0	$ 1.213.400
SUBTOTALES:			**$ 1.213.400**	**$ 0**	**$ 1.213.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD								ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006691448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000776906	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006783220	MORA DARZON CRISTIAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1052413449	CAAMAÑO JAMES DANY FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	230201-PROTECCION	24	$ 1.400.724	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.200	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.400.724		$ 97.500	24		SCCF34-COFREM META	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121852944	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30		SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1121948586	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30		SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124818810	AYALA ROJAS DANIEL ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1124991535	PEREZ CARBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	SCCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1134450051	DARAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	07																	230201-PROTECCION	24	$ 1.400.724	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.200	NUEVA EPS CM	24	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.400.724		$ 97.500	24		SCCF34-COFREM META	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2833

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	NZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5168896592	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO		2026
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:			0705351661

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901360195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&B S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 29 36 A 31	TELÉFONO:	6635253
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1751023511			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			570768

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200	
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1023879760	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

Planilla Pagada

2836

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

Puerto Gaitán – Meta, 30 de abril de 2026

Señores:
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN
La ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No. 1700 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 – CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META.

ASUNTO: CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.023.879.760 de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal y **MIGUEL ÁNGEL GUERRERO RUEDA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.123.086.252 de GUAMAL y Tarjeta Profesional No 271654-T, en mi condición de contador de la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 con NIT 902013442-0, certificamos bajo la gravedad de juramento el pago de forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, por lo tanto, se encuentran al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes pagados por la compañía, durante el mes de abril de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

A continuación, se relaciona el personal afiliado durante el periodo.

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168896592	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168896592	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	MALLAMAS	SURA

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PROTEGER	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARÍO HERNÁNDEZ CALDERÓN	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSÉ SÁNCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5168896592	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	FAMISANAR	SURA

En constancia, se firma en Puerto Gaitán Meta, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.

MIGUEL ÁNGEL GUERRERO RUEDA
C.C. No. 1.123.086.252
T.P. No. 271654-T
CONTADOR

ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
C.C 1.023.879.760
REP. LEGAL UNIÓN TEMPORAL
CONFISCA 25




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271654-T

MIGUEL ANGEL
GUERRERO RUEDA
C.C. 1123086252
RES. INSCRIPCION 873 DEL 19/06/2020
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292297 305245

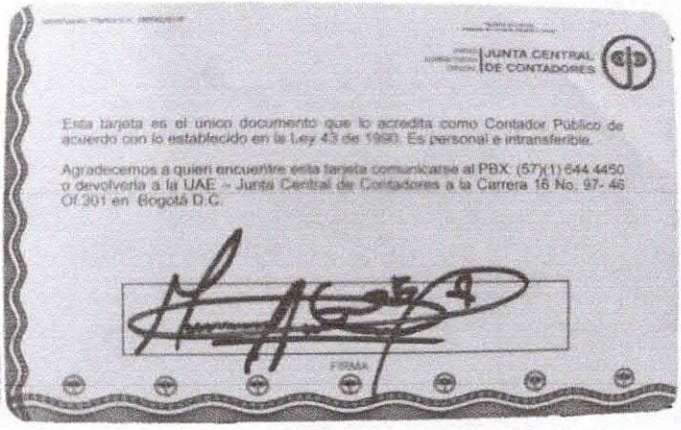

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.086.252
GUERRERO RUEDA

APELLIDOS
MIGUEL ANGEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1993
CAPARRAPI
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-MAR-2011 GUAMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

0026713096A 1 35330273

2839

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 0 3 9 6 B 0 8 F 0 0 1 4 7 8 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL ANGEL GUERRERO RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1123086252 de GUAMAL (META) Y Tarjeta Profesional No 271654-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 8. Informe ambiental

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL PERIODO 3
01 AL 30 DE ABRIL

CONTRATO DE OBRA NO. 1700 DE 2025

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
R/L ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
DEPARTAMENTO DEL META
ABRIL DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 3
2.1. DESCRIPCIÓN Y ALANCE DEL PROYECTO 3
2.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 4
2.3. Localización 5
3. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 6
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 7
4.1. PROGRAMA: PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES Y REQUERIMIENTOS LEGALES – AMBIENTALES 7
4.2. PROGRAMA: EXCAVACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS 8
4.3. PROGRAMA: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 9
4.4. PROGRAMA: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 9
4.5. PROGRAMA: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 10
4.6. PROGRAMA: MANEJO DE AGREGADOS PÉTREOS 10
4.7. PROGRAMA: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS 11
4.8. PROGRAMA: MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12
4.9. PROGRAMA: CIRCULACIÓN PEATONAL, DESVIACIÓN DE TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES TEMPORALES 13
4.10. PROGRAMA: MANEJO DE FAUNA Y FLORA 15
4.11. PROGRAMA: INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESMONTE DE CAMPAMENTOS 16
4.12. PROGRAMA: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL. 17
4.13. PROGRAMA: ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES 17
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas en el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA) durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, en desarrollo del contrato de obra. Su finalidad es evidenciar el cumplimiento de las medidas ambientales implementadas durante la ejecución del proyecto, así como las acciones adelantadas para la prevención, mitigación, control y manejo de los impactos generados por las actividades constructivas.

Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades orientadas al manejo adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD), control de material particulado, señalización ambiental y de seguridad, manejo y acopio de materiales, seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y control operativo del campamento de obra, en concordancia con los lineamientos establecidos en el PMA aprobado. Así mismo, se efectuó seguimiento permanente a las condiciones ambientales del proyecto, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y de las obligaciones contractuales asociadas al componente ambiental.

El presente documento consolida el avance de las actividades ambientales ejecutadas durante el periodo reportado, incluyendo el seguimiento técnico, administrativo y operativo requerido para asegurar una adecuada gestión ambiental durante el desarrollo de la obra.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

La administración municipal de Puerto Gaitán - Meta mediante el proceso de licitación pública No. LP-SI-009-2025 con objeto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", adjudicó el contrato de obra No. 1700 del día 11 de diciembre de 2025 a la UNION TEMPORAL CONFISCA25. Igualmente, procedió a contratar la correspondiente interventoría, mediante el proceso de selección por Concurso de Méritos No. CM-SI-009-2025 bajo el objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", el cual fue adjudicado y celebrado con el contrato No. 1739 del día 16 de diciembre de 2025 al CONSORCIO INTERFISCA GAITAN 25; bajo la supervisión del ing. CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES – secretario de infraestructura.

2.1. DESCRIPCIÓN Y ALANCE DEL PROYECTO

El proyecto está orientado a la construcción de la sede de la fiscalía general de la nación en el municipio de Puerto Gaitán - Meta, cubriendo la necesidad de una infraestructura idónea para su funcionamiento, el cual consta de:

- Demoliciones
- Movimiento de tierras
- Cimientos, estructuras y elementos menores de concreto

- Muros, pañetes y pinturas
- Pisos, enchapes y urbanismo
- Cielorasos y cubiertas
- Carpintería metálica
- Redes hidrosanitarias y pluviales
- Sistema de aire acondicionado
- Red eléctrica, voz y datos
- Zonas verdes

2.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Cuadro de Trazabilidad


No. PROCESO:	LP-SI-009-2025
No. Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	1700 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25 NIT. 902.013.442-0 R. /L ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO C.C 1.023.879.760 DE BOGOTÁ D.C CORREO: consfisca25@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO:	**VALOR VIGENCIA 2025:** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE **($597.596.423,40)** **VALOR VIGENCIA 2026:** TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE **($3.404.853.335,06)** **VALOR TOTAL:** CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($4.002.449.758,46)**
PLAZO EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25 FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1739 DE 2025.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"
SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO:	DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2027

2.3. Localización

La obra se localiza en el municipio de Puerto Gaitán Meta, en el predio con coordenadas: 4°18'44.56" N y 72°4'51.96" O y dirección: 1) Calle 10 # 6-60 y 2) Carrea 7 # 10-22 en el barrio Centro.

Ilustración 1. Localización general del Proyecto

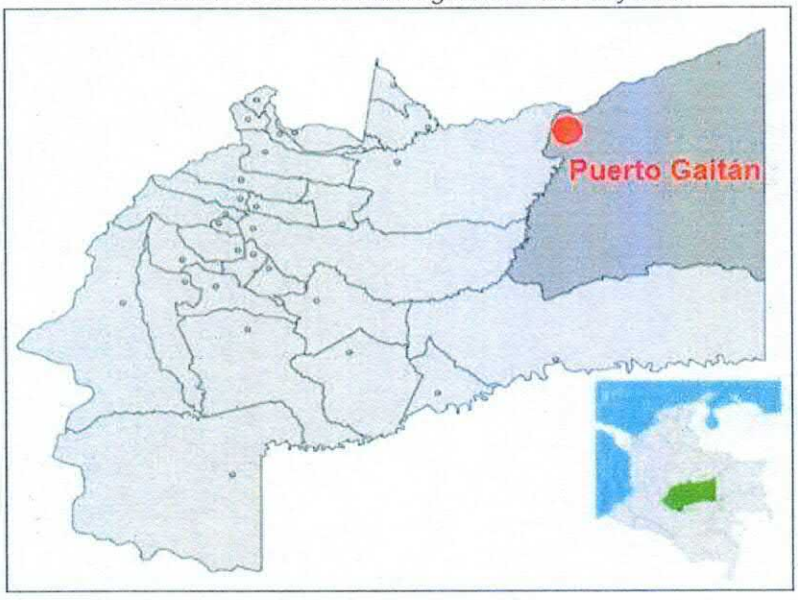

Fuente: Pagina Web, Wikipedia
Ilustración 2. Localización especifica



Fuente: Propia a base de Google Earth

3. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental – PMA, contendrá las medidas previstas para prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales negativos generados sobre el entorno, los recursos naturales y las comunidades del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Dichas medidas serán plasmadas en programas que a su vez se derivan en proyectos específicos de acuerdos a las acciones que implican las etapas constructivas.

A continuación, la presente tabla relaciona los programas que deberá contener el PMA, con sus respectivos proyectos aplicables al objeto del contrato.

Tabla 1. Cuadro resumen de las actividades de Gestion Ambiental .

Programas	Proyectos
Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	Planificación de intervenciones y demás requerimientos legales ambientales.
Actividades Constructivas	Manejo integral de residuos de construcción y demolición RCD
	Manejo de residuos sólidos convencionales
	Manejo de residuos peligrosos.
	Manejo de materiales de construcción no pétreos
	Manejo de agregados pétreos
	Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales

Manejo de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos	Protección de Fauna
Gestión Hídrica	Manejo de aguas residuales y lluvias -PUEAA
Gestión de contaminación Atmosférica	Control de la contaminación atmosférica, ruido
Manejo de Instalaciones Temporales de Maquinaria y Equipos	Manejo de Maquinaria, equipos y vehículos
	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos
Gestión Social	Información y divulgación

AVANCE RECURSOS DURANTE EL PERIODO – PMA

Cuadro 2.Avance recursos durante el periodo del PMA

AVANCE DE RECURSOS EJECUTADOS PMA		
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META		
Valor PMA	**$ 82.473.936,00**	100%
Ejecución reporte Nro.3	$ 40.566.400,00	49,19%
Ejecución Acumulado	**$ 57.648.280,0**	69,90%

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo reportado en el presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- Contratación de personal.
- Actividades de obra
- Excavación manual
- Cimentación
- Acopio y transporte de materiales pétreo y no pétreos
- transporte de RCD.

4.1. PROGRAMA: PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES Y REQUERIMIENTOS LEGALES – AMBIENTALES

Conformación del grupo de gestión ambiental

Durante el presente perdió se realiza la conformación del grupo de gestión ambiental conformado por:

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	20%
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	ESPECIALISTA	30%

Ajuste y Restructuración del PMA si se requiere acorde a las dinámicas de la obra.

Para la elección del contrato se cuenta con el documento Plan de Manejo Ambiental reestructurado, en cuanto a programas, proyectos y redistribución del presupuesto teniendo en cuenta las dinámicas y condiciones reales de la obra.

El documento PMA ajustado y definitivo, fue entregado al equipo de interventoría para la respectiva aprobación y posterior entrega a la supervisión del contrato.

Capacitación al personal de obra

En articulación con el componente SST, se realizó una capacitación al personal que participara en el desarrollo de la obra, donde se socializan y profundizan dos temáticas correspondientes a manejo y gestión de residuos vegetales; y manejo de equipos. Se anexa listado de asistencia.

Registro fotográfico





4.2. PROGRAMA: EXCAVACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS

Señalización y cubrimiento de residuos de excavaciones en obra.

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de excavación, demolición y retiro de especies vegetales asociadas al desarrollo de la obra, las cuales generaron material sobrante producto de dichas intervenciones. En atención a lo anterior, se implementaron medidas de manejo orientadas a la adecuado acopio y disposición y/o aprovechamiento de estos residuos dentro del área del proyecto.

Registro fotográfico





4.3. PROGRAMA: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Disposición Final de RCDs

Para el presente periodo se ejecutaron de excavación y demolición, de las cuales los residuos generados por las actividades de demolición (RCD), se encuentran actualmente acopiados de manera temporal dentro del frente de obra, en un área destinada para tal fin. Este manejo busca facilitar su posterior cargue, transporte y disposición final a través de un gestor o sitio autorizado que cumpla con la normativa ambiental aplicable para la gestión de este tipo de residuos.

Registro fotográfico





4.4. PROGRAMA: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Almacenamiento y Disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios

Para el presente periodo reportado los residuos sólidos convencionales generados en el desarrollo de las actividades del proyecto son almacenados temporalmente en los puntos

ecológicos instalados dentro del frente de obra. Estos puntos se encuentran debidamente identificados y socializados con el personal operativo, con el fin de garantizar la correcta disposición de los residuos en los recipientes correspondientes.

Posteriormente, dichos residuos son entregados al servicio público de aseo del municipio, a través de la empresa prestadora encargada de la recolección de residuos sólidos, garantizando así su adecuada gestión y disposición final en cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.

Registro fotográfico





4.5. PROGRAMA: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Punto de almacenamiento de sustancias químicas

Para el periodo reportado no se generaron ni se almacenaron residuos peligrosos asociados al uso de sustancias químicas dentro del frente de obra. No obstante, en el marco de la implementación del Plan de Manejo Ambiental se tiene prevista la adecuación de un punto específico para el almacenamiento temporal de sustancias químicas o residuos peligrosos que eventualmente puedan generarse durante la ejecución de las actividades constructivas.


4.6. PROGRAMA: MANEJO DE AGREGADOS PÉTREOS Y MATERIALES NO PÉTREOS

Protección de los materiales no pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de trabajo.

Durante el periodo reportado, se realizó la adecuada gestión, manejo y acopio de materiales pétreos y no pétreos requeridos para la ejecución de las actividades constructivas, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a los lineamientos establecidos en

el Plan de Manejo Ambiental - PMA. Lo anterior garantiza el uso eficiente de los insumos, el orden en obra y el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas.

Registro fotográfico

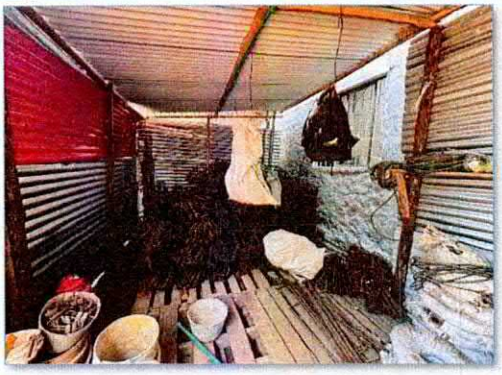

4.7. PROGRAMA: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS

Proteger los sumideros presentes en la obra

En el marco de las estrategias de uso eficiente y protección del recurso hídrico, se contempla la implementación de medidas orientadas a prevenir la afectación de la infraestructura de drenaje existente en el entorno del proyecto.

Entre estas medidas se encuentra la instalación de elementos de protección en los sumideros ubicados en el área circundante al frente de obra, mediante la colocación de rejillas o barreras que permitan evitar el ingreso de materiales de excavación, residuos o escombros que puedan ser arrastrados por escorrentía superficial. Esta medida busca prevenir taponamientos o afectaciones en el sistema de drenaje pluvial existente.

Estrategias de uso eficiente y ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias

Como parte de las estrategias de manejo del recurso hídrico, durante el presente periodo reportado se dispuso un tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 1.000

litros, el cual será utilizado para la recolección y almacenamiento de agua destinada a diferentes actividades propias de la obra.

Dado que el predio donde se desarrollará el proyecto cuenta con servicio de acueducto, el suministro de agua para actividades iniciales ha sido tomado de las instalaciones existentes. No obstante, como medida de aprovechamiento del recurso hídrico, se contempla la recolección de aguas lluvias para su uso en actividades de limpieza, control de material particulado u otras labores que no requieran agua potable.

Registro fotográfico





4.8. PROGRAMA: MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Actividades de control y seguimiento

Durante el periodo reportado se realizó seguimiento y verificación al estado general de la maquinaria empleada en las actividades iniciales del proyecto, la cual corresponde principalmente a una retroexcavadora utilizada en labores de demolición y excavación.

En el marco de estas verificaciones se constató que el equipo cuenta con los elementos mínimos requeridos para la atención de emergencias ambientales y de seguridad, tales como extintor y kit para atención de posibles derrames. Estas acciones de control hacen parte de las medidas preventivas orientadas a minimizar riesgos asociados a la operación de maquinaria dentro del frente de obra.

Registro fotográfico





4.9. PROGRAMA: CIRCULACIÓN PEATONAL, DESVIACIÓN DE TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES TEMPORALES

Instalación de señalización sitios temporales

Durante el periodo reportado, el contratista mantuvo el campamento de obra debidamente señalizado, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y las normas de seguridad aplicables al proyecto. La señalización implementada incluye identificación de áreas de acopio de materiales, zonas restringidas, rutas de evacuación, puntos de encuentro, áreas de almacenamiento y demás elementos informativos y preventivos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, orden y control dentro del área de trabajo. De igual manera, este programa se articula directamente con la señalización establecida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del proyecto.

Registro fotográfico





Plan de Manejo de Transito - PMT

Se realizo la instalación de señalización preventiva y reglamentaria en el entorno del frente de obra, conforme a lo establecido en el PMT presentado a la interventoría, la supervisión del contrato y la Secretaría de Tránsito del municipio para su respectiva revisión y aprobación.

AVANCE RECURSOS DURANTE EL PERIODO – Plan de Manejo de Transito -PMT

Cuadro 3.Avance recursos durante el periodo del PMT

AVANCE DE RECURSOS EJECUTADOS PMT		
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META		
Valor PMT	**$ 25.805.088,00**	100%
Ejecución reporte Nro.3	$ 3.106.466,10	12,038%
Ejecución Acumulado	**$ 12.721.037,30**	49,297%

Registro fotográfico









4.10. PROGRAMA: MANEJO DE FAUNA Y FLORA

Rescate de Fauna de presentarse.

Durante el periodo reportado, el contratista ejecutó las actividades de tala controlada de cuatro (4) especies forestales ubicadas dentro del área de intervención del proyecto, previa gestión y autorización ante la Secretaría Ecológica Municipal y con conocimiento de las partes interesadas. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.0477 expedida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena - CORMACARENA, mediante la cual se amplía el alcance de la Resolución No. 2.6.04-554-2004, delegando a las alcaldías municipales la facultad de expedir permisos y autorizaciones para aprovechamientos forestales de árboles aislados en zonas urbanas de su jurisdicción, hasta por una cantidad máxima de diez (10) ejemplares.

Las actividades fueron desarrolladas conforme a los lineamientos técnicos, ambientales y normativos aplicables, garantizando el adecuado manejo, cargue, transporte y disposición final de los residuos vegetales generados durante la intervención. Durante la ejecución de las labores no se evidenció presencia de fauna silvestre asociada a los individuos intervenidos.

Así mismo, en cumplimiento de las medidas de compensación ambiental establecidas por la Secretaría Ecológica Municipal, el contratista realizó la entrega de cinco (5) especies arbóreas nativas por cada árbol retirado, dando cumplimiento a las acciones de compensación forestal requeridas para el desarrollo de la actividad autorizada.

Registro fotográfico









4.11. PROGRAMA: INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESMONTE DE CAMPAMENTOS

Instalación del campamento

Como parte de las actividades preliminares del proyecto se realizó el cerramiento perimetral del área de intervención, con el objetivo de delimitar el frente de obra y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y control de acceso.

De igual manera, se iniciaron las actividades de adecuación del campamento de obra, incluyendo la organización de áreas destinadas al almacenamiento de materiales, zonas de trabajo y espacios requeridos para el funcionamiento del personal vinculado al proyecto. Estas adecuaciones buscan garantizar condiciones operativas adecuadas para el desarrollo de las actividades constructivas.

Registro fotográfico





4.12. PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL

Información y Divulgación

En el marco del componente social del proyecto se realizó una jornada de socialización dirigida a la comunidad y a las entidades interesadas, en la cual se presentaron las características generales del proyecto, su alcance, las actividades constructivas a desarrollar y el tiempo estimado de ejecución.

Durante esta jornada también se brindó información relacionada con el proceso de contratación de mano de obra, indicando los requisitos para la recepción de hojas de vida, así como las condiciones laborales bajo las cuales se realizará la vinculación del personal. Se reiteró que estos procesos se desarrollarán en cumplimiento de la normativa laboral vigente y de las políticas públicas de empleo aplicables.

Adicionalmente, como parte de las acciones de divulgación, se encuentra en proceso de instalación de la valla informativa del proyecto en el frente de obra.

Registro fotográfico





4.13. PROGRAMA: ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES

Instalación y adecuación de punto para el servicio de atención al usuario

Durante el periodo reportado, en el frente de obra permanece personal del contratista y de la interventoría, quienes brindan información básica a la comunidad o a cualquier persona interesada en conocer aspectos generales relacionados con el desarrollo del proyecto.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo evaluado, se evidenció la implementación continua de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), orientadas a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales generados por las actividades constructivas, en concordancia con las obligaciones contractuales y la normatividad ambiental vigente.

- Se realizan actividades relacionadas con el manejo de materiales, control de residuos, orden y aseo en obra, así como la protección de áreas intervenidas, se desarrollaron conforme a los lineamientos definidos en el PMA, garantizando condiciones adecuadas desde el punto de vista ambiental y operativo.

- 3En términos de ejecución, el PMA presentó un avance mensual del 49,187%, equivalente a CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($40.566.400,00), alcanzando un avance acumulado del 69,899%, correspondiente a CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($57.648.280,00), lo cual refleja un adecuado desarrollo de las actividades ambientales programadas.

- Se evidenció la correcta gestión, manejo y acopio de materiales pétreos y no pétreos, así como la implementación de medidas para el control de material particulado y prevención de afectaciones al entorno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos ambientales del proyecto.

- Se concluye que, en general, el componente ambiental del proyecto presenta un comportamiento favorable, manteniendo la trazabilidad de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PMA, sin evidenciarse incumplimientos relevantes durante el periodo reportado.

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Especialista Ambiental
MP. 25202096145 CND

ANEXO 1 PMA: LISTADOS DE ASISTENCIA

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES/CHARLAS

TEMA: Manejo de Residuos Vegetales.
LUGAR: Frente de obra.
HORA: 2:00 pm. FECHA: 15-04-2026
COMPONENTE: SST - PMA.

N°	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GENERO	EDAD	FIRMA
	Camilo Andres Rodriguez Vega	1006691448	M	23	Camilo Vega
	Leider Esteban Daraga	1134400051	M	28	Leider
	Cesar Hernandez	3215459	M	48	
	Sabier Hernandez	74325151	M	52	
	William Tegos	86 047 574	M.	60	
	Walfran Perez Caribari	1124991535	M	38	Walfran Perez C.
	Cristian Mauricio Gomez	1006783200	M	201	
	Andres Ayala Rojas	1124818810	M	21	

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

0982

REALIZA/RESPONSABLE

FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Astrid Parrado Rojas.	NOMBRE: Danse Martinez M.
CARGO: Directora obra/ especialista Ambiental.	CARGO: Profesional SST.

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES/CHARLAS

TEMA: Manejo de equipos.

LUGAR: Frente de obra.

HORA: 7:00 am. FECHA: 22-04-2026

COMPONENTE: SST PTA

N°	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GENERO	EDAD	FIRMA
	Cesar Hernandez	3215459	M	48	
	Andres Ayala Rojas	1124818810	M	21	
	Camilo Andres Rodriguez vega	1006891448	M	23	Camilo vega
	Leider Esteban Daraño	1134450031	M	28	leider
	Jabier Hernandez	74325131	M	52	
	William Tejos	80047.514	M.	50	
	Walfran Perez Cariban	1124991535	M	38	Walfran Perez C.
	Cristian A. Mco Goez	1006185220	M	29	

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

2982

REALIZA/RESPONSABLE

FIRMA:
NOMBRE: Astrid Parrado Rojas.
CARGO: Director de obra / Esp. Ambiental.

FIRMA:
NOMBRE: Denise Martinez
CARGO: Profesional SST.

2983

ANEXO 2 PMA: AVANCE DE EJECUCIÓN PMA

1. PERSONAL PROFESIONAL							MES 1 FEBRERO		MES 2 MARZO		MES 3 ABRIL		ACUMULADO	
ITEM	PERFIL	TIEMPO EN MESES	CANT.	SALARIO	DEDICACIÓN	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.1	CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL													
	Profesional o Especialista Ambiental	12	1	$ 2.400.000,00	30%	$ 8.640.000,00	1,00	$ 720.000,00	1,00	$ 720.000,00	1,00	$ 720.000,00	2,00	$ 3.499.200,00
					FACTOR PRESTACIONAL	$ 1,62								
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 13.996.800,00**		**$ 1.166.400,00**		**$ 1.166.400,00**		**$ 1.166.400,00**		**$ 3.499.200,00**
2. COSTOS DIRECTOS														
ITEM	PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDA	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.1	**PROGRAMA 1- PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES Y REQUERIMIENTOS LEGALES - AMBIENTALES**					**$ 940.000,00**		**$ 170.000,00**		**$ 70.000,00**		**$ 0,00**		**$ 240.000,00**
	Ajuste y Restructuración del PMA si se requiere acorde a las dinámicas de la obra.	Logistica en campo	un	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 100.000,00
	Capacitaciones Personal de Obra	Logistica para el desarrollo de capacitaciones	un	12	$ 70.000,00	$ 840.000,00	1,00	$ 70.000,00	1,00	$ 70.000,00	1,00	$ 100.000,00	2,00	$ 140.000,00
2.2	**PROGRAMA 2- EXCAVACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS**					**$ 129.480,00**		**$ 0,00**		**$ 129.480,00**		**$ 0,00**		**$ 129.480,00**
	Señalización y cubrimiento de residuos de excavaciones en obra.	Plastico polietileno calibre 6 - AIM 20209009	m2	100	$ 1.294,80	$ 129.480,00		$ 0,00	100,00	$ 129.480,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 129.480,00
2.3	**PROGRAMA 3- RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS**					**$ 52.997.656,00**		**$ 2.721.600,00**		**$ 6.308.000,00**		**$ 39.000.000,00**		**$ 48.029.599,99**
	Disposición Final de RCDs, Operador autorizado	Prestador del servicio	ton	1.007,56	$ 52.600,00	$ 52.997.656,00	51,74	$ 2.721.600,00	119,92	$ 6.308.000,00	390,00	$ 39.000.000,00	171,67	$ 48.029.599,99
2.4	**PROGRAMA 4- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES**					**$ 1.450.000,00**		**$ 0,00**		**$ 350.000,00**		**$ 100.000,00**		**$ 350.000,00**

1. PERSONAL PROFESIONAL							MES 1 FEBRERO		MES 2 MARZO		MES 3 ABRIL		ACUMULADO	
ITEM	PERFIL	TIEMPO EN MESES	CANT.	SALARIO	DEDICACIÓN	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	Disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, según los indicadores BID.	Recolección por parte de la Empresa de Servicios Públicos Perla del Manacacias, con código de registro 1039196	mes	12	$ 100.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00
	Almacenamiento temporal de Residuos Solidos Convencionales	Adecuación de Puntos ecológicos	un	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00		$ 0,00	1,00	$ 250.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 250.000,00
	PROGRAMA 5- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS					**$ 300.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2.5	Punto de almacenamiento de sustancias químicas	Adecuación de Punto de almacenamiento temporal y disposición final de Residuos Peligrosos en obra.	un	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	PROGRAMA 6- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO PÉTREOS					**$ 2.000.000,00**		**$ 2.000.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.000.000,00**
2.6	Almacenamiento temporal de materiales de construcción.	Adecuación sitio de Acopio para Materiales de construcción.	un	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.000.000,00
	PROGRAMA 7-MANEJO DE AGREGADOS PÉTREOS					**$ 500.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2.7	Protección de los materiales pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de trabajo.	Instalación adecuada para el correcto almacenamiento de materiales pétreos.	un	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.8	**PROGRAMA 8- MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS**					**$ 1.360.000,00**		**$ 0,00**		**$ 600.000,00**		**$ 200.000,00**		**$ 600.000,00**

2832

1. PERSONAL PROFESIONAL							MES 1 FEBRERO		MES 2 MARZO		MES 3 ABRIL		ACUMULADO	
ITEM	PERFIL	TIEMPO EN MESES	CANT.	SALARIO	DEDICACIÓN	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	Proteger los sumideros presentes en la obra	Mallas Sintéticas para sumideros.	Rollo	2	$ 380.000,00	$ 760.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	Estrategias de uso eficiente y ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias	Tanque de 1000 Lt para recolección de aguas lluvias	un	2	$ 300.000,00	$ 600.000,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 600.000,00	2,00	$ 200.000,00	2,00	$ 600.000,00
2.9	**PROGRAMA 9 - DEMOLICIONES**					**$ 4.000.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Acopio temporal de residuos de demoliciones	Adecuación del sitio autorizado para el acopio temporal	un	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.10	**PROGRAMA 10-CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, RUIDO**					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		$ 0,00
	Actividades de control y seguimiento	Actividades desarrolladas por el personal socio-ambiental				$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.11	**PROGRAMA 11-MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Actividades de control y seguimiento	Actividades desarrolladas por el personal socio-ambiental				$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.12	**PROGRAMA 12 -CIRCULACIÓN PEATONAL, DESVIACIÓN DE TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES TEMPORALES**					**$ 400.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Instalación de señalización sitios temporales	Señales Informativas y preventivas dentro de la obra.	un	20	$ 20.000,00	$ 400.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.13	**PROGRAMA 13 - MANEJO DE FAUNA Y FLORA**					**$ 500.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Rescate de Fauna de presentarse.	Rescale y traslado de especies faunisticas a la autoridad competente	un	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

7982

1. PERSONAL PROFESIONAL							MES 1 FEBRERO		MES 2 MARZO		MES 3 ABRIL		ACUMULADO	
ITEM	PERFIL	TIEMPO EN MESES	CANT.	SALARIO	DEDICACIÓN	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.14	PROGRAMA 14- INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESMONTE DE CAMPAMENTOS					$ 2.000.000,00		$ 0,00		$ 2.000.000,00		$ 0,00		$ 2.000.000,00
	Instalación del campamento	Actividades de adecuación	un	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 0,00	1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.000.000,00
2.15	PROGRAMA 15- CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL					$ 100.000,00		$ 100.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 100.000,00
	Información y Divulgación	Divulgación de convocatorias	un	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 100.000,00
2.16	PROGRAMA 16- ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES					$ 1.800.000,00		$ 150.000,00		$ 150.000,00		$ 100.000,00		$ 300.000,00
	Instalación y adecuación de punto para el servicio de atención al usuario	Punto de atención	mes	12	$ 150.000,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00	1,00	$ 100.000,00	2,00	$ 300.000,00
COSTO TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						$ 82.473.936,00	7,65%	$ 6.308.000,00	0,13	$ 10.773.880,00	49,19%	$ 40.566.400,00		$ 57.248.279,99

8982

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 9. Certificado de maquinaria y equipo menor

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

2820

CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25

30 de abril de 2026, Puerto Gaitán, Meta.

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

En el marco del Contrato No. 1739 de 2026, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para la construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, se certifica que, como parte de las actividades de seguimiento, control y verificación técnica del proyecto, se realizó inspección en campo de la maquinaria y equipos reportados por el Contratista de Obra, con el fin de constatar su disponibilidad, estado general e idoneidad para la ejecución de las actividades constructivas programadas.

A continuación, se relaciona la maquinaria y/o equipo empelado durante el periodo.

MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR	CANTIDAD
Retroexcavadora con llantas	1
Rotomartillo	1
Minicargador	1
Volqueta doble troque	1
Demoledor	1
Mezcladora	1

Atentamente,

Fernando Villegas

ING. FERNANDO JOSE VILLEGAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
NIT 902017391-1

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 10. Informe PMT

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

INFORME DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PERIODO 3
01 AL 30 DE ABRIL

CONTRATO DE OBRA NO. 1700 DE 2025

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
R/L ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
DEPARTAMENTO DEL META
ABRIL DE 2026

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 4
1.1 ALCANCE 4
1.2 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 4
1.1.1. Normas generales 4
1.1.2. Normas reglamentarias 5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
3. CATEGORÍA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 7
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE PERIODO 8
4.1 Implementación de señalización vial 9
4.2 Manejo peatonal 11
4.3 Control de tráfico y acceso de maquinaria 15
4.4 Cargue y descargue de materiales y/o RCD´s 18
4.5 Desvíos de tránsito 20
4.6 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN del PMT 21
4.7 Gestión institucional del PMT 21
4.8 AVANCE RECURSOS DURANTE EL PERIODO – Plan de Manejo de Transito - PMT 22
5. CONCLUSIONES 23

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Pág.

Ilustración 1. Localización general del Proyecto..... 6
Ilustración 2. Zonas a intervenir con la obra..... 7
Ilustración 3. Metodología Elaboración del PMT..... 8

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de ejecución del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentado en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META", correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026.

En este informe se describen las actividades desarrolladas para la implementación de las medidas de manejo de tránsito establecidas en el PMT aprobado, orientadas a mitigar los impactos generados por la ejecución de la obra sobre la movilidad vehicular y peatonal en el área de influencia del proyecto.

Así mismo, se presentan las acciones adelantadas para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, la adecuada señalización de las zonas intervenidas y la accesibilidad a los predios colindantes, en cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas vigentes.

El presente informe tiene como finalidad evidenciar la correcta ejecución de las medidas establecidas en el PMT, así como documentar las condiciones de tránsito durante el periodo evaluado, conforme a los lineamientos del Manual de Señalización Vial y demás normativa aplicable.

1.1 ALCANCE

El presente Plan de Manejo de Tránsito (PMT) se desarrolla para el área de influencia directa de las obras del proyecto, contemplando la implementación de medidas y dispositivos para la canalización y regulación del tránsito vehicular y peatonal. Dichas medidas estarán orientadas a garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, del personal de obra y de los equipos durante la ejecución de las actividades constructivas.

Asimismo, el plan establece las estrategias operativas, señalización temporal, desvíos y controles necesarios para mantener la movilidad en condiciones adecuadas, procurando minimizar las interferencias y afectaciones sobre el flujo normal de tránsito en las vías aledañas al proyecto, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos técnicos aplicables.

1.2 MARCO DE REFERENCIA LEGAL

1.1.1. Normas generales

Resolución 1885 de 2015 "Por la cual se adopta el manual de señalización vial-Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y

ciclorrutas de Colombia" en el capítulo 4 del referido manual, respecto a la señalización y medidas de seguridad para obras en la vía, establece:

"Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía"

"(...) Las distintas características de cada obra, y la variedad de condiciones que se pueden presentar, impiden establecer una secuencia rígida y única de dispositivos y normas. En todo caso la realización de obras que afecten la normal circulación del tránsito, deberá ser concordante y cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas contenidas en este capítulo y ofrecer la protección a conductores de los diferentes modos de transporte, pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehículos. Así mismo, la instalación de la señalización de calles y carreteras afectadas por obras civiles deberá diseñarse e instalarse de acuerdo con los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debidamente aprobados por la autoridad competente.

1.1.2. Normas reglamentarias

CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE LEY 769 DE 2002.

Dado que el proyecto contempla intervención de vías urbanas, se debe tener en cuenta lo establecido en el CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE LEY 769 DE 2002, TITULO III, CAPITULO VIII **Trabajos eventuales en vía pública:**

Artículo 101. Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Los proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se constituyan en un polo importante generados de viajes tales como parques de diversiones, centros comerciales, estadios, centros culturales y otros, deberán tener la aprobación del organismo de tránsito de la jurisdicción.

Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. En los eventos previstos en los incisos anteriores el interesado deberá

presentar junto con su solicitud un plan de señalización y desvíos, que debe ser aprobado por la autoridad competente.

Parágrafo. El Ministerio de Transporte determinará, los elementos y los dispositivos de señalización necesarios en las obras de construcción. Conc.: 102, 109 y ss.

Artículo 102. Manejo de escombros. Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Parágrafo. Será sancionado por la Secretaría de Tránsito que corresponda con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el particular u organismo estatal que no cumpla con el debido manejo de escombros y desechos de construcción, así como estará obligado a efectuar las reparaciones por daños infringidos a los bienes de uso público. Conc.: 101.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La obra se localiza en el Municipio de Puerto Gaitán Meta, con dirección: Calle 10 # 6-60 y Carrera 7 # 10-22 en el barrio Centro.

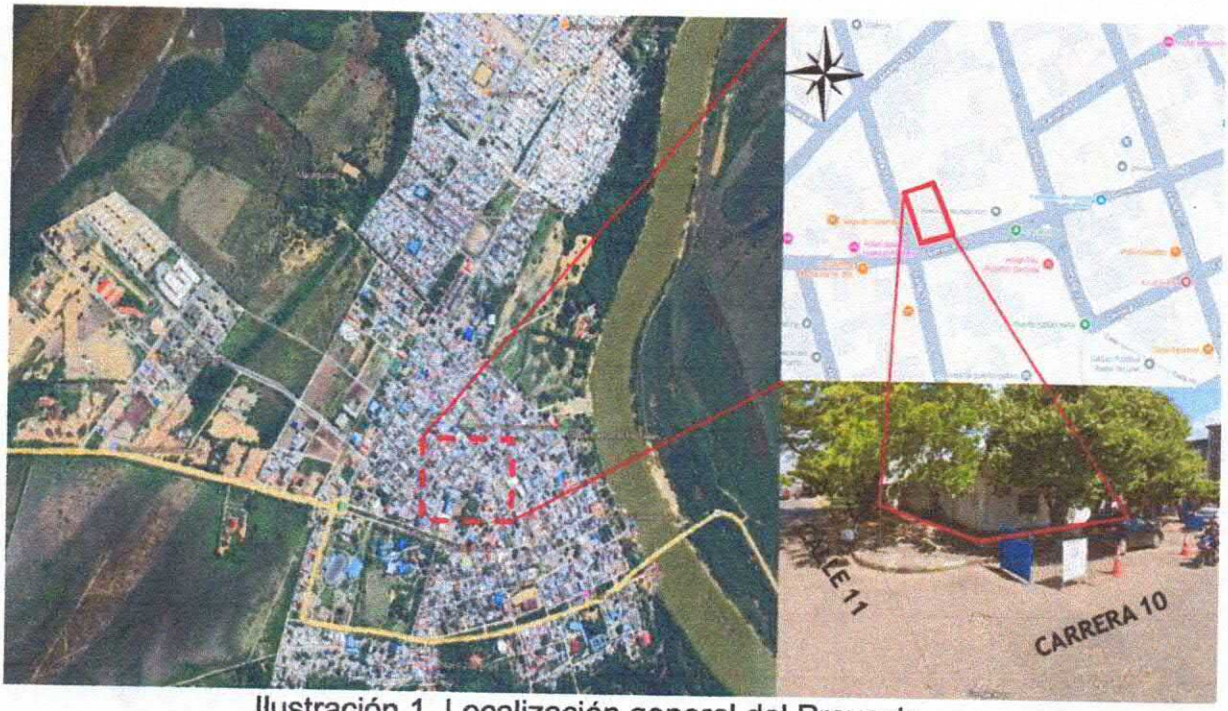


Ilustración 1. Localización general del Proyecto.

Las vías a intervenir con circulación de maquinaria, dentro del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META" son la Calle 11 y la Carrera 10.



Ilustración 2. Zonas a intervenir con la obra
Fuente: Propia con Google Earth

3. CATEGORÍA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

El proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", se enmarca dentro de una intervención **CATEGORÍA I** de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de señalización del INVÍAS.

Este tipo de obras corresponde a aquellas en que los espacios de circulación son muy poco afectados por las intervenciones y no hay afectación sobre zonas aledañas. Hay poca o nula intervención en los espacios de circulación peatonal. El impacto de la obra sobre el tránsito de vehículos puede ser mitigado por la misma infraestructura a intervenir sin esperar que los flujos sean desviados.

A continuación, se presentan los lineamientos para la elaboración del PMT, según el Manual de señalización vial Capitulo 4. Para el caso en particular se ha definido que el tipo de PMT a implementar es el tipo I

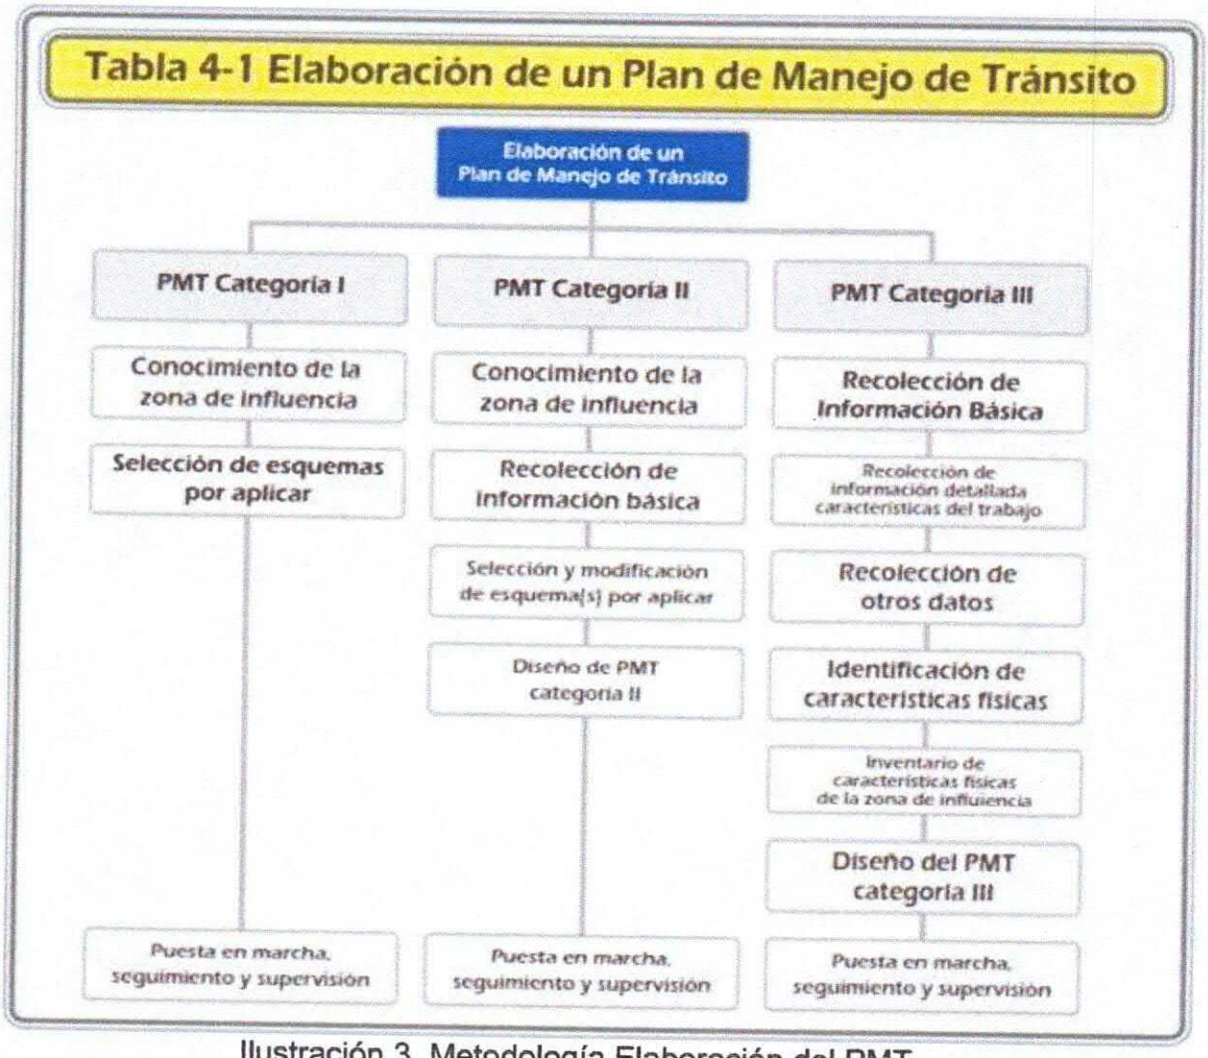


Ilustración 3. Metodología Elaboración del PMT
Fuente: Manual de señalización vial 2015

Para esta categoría normalmente la zona de influencia de los trabajos será igual al espacio de los trabajos. Con base en los esquemas se puede definir el costo de las señales, auxiliares de tránsito, movilización y similares. Esta categoría de trabajos se resume con valor global fijo y requiere de una inspección cada día para confirmar la presencia de todos los elementos contemplados en el PMT.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE PERIODO

Considerando que los trabajos son desarrollados en un solo sitio, el cual se encuentra delimitado como zona de trabajo, solo se presenta intervención con el tráfico vehicular en el momento que se requiera el ingreso y salida de materiales y escombros a la obra, mediante vehículos de carga. Asimismo, se acondiciona un

sendero peatonal en la zona de andén inmediatamente junto a la obra, de tal manera que no se generen riesgos en la circulación por el sitio.

Se cuenta con un director de obra, el ingeniero Residente y demás personal que realiza la debida implementación del PMT.

NOMBRES	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	20%
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	30%
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	100%
DENISE ROCIÓ MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL/CONTROLADOR VIAL	100%
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	100%

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL


Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se dio continuidad a la implementación de la señalización vial establecida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), garantizando su permanencia, visibilidad y adecuado estado en el área de influencia del proyecto.

La señalización preventiva e informativa se mantiene ubicada sobre la vía y andenes perimetrales del frente de obra, específicamente en la carrera 10 y la calle 11, conforme a lo definido en el PMT aprobado. Así mismo, se realizaron actividades de verificación y ajuste cuando fue necesario, con el fin de asegurar su funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente.

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0


Registro fotográfico

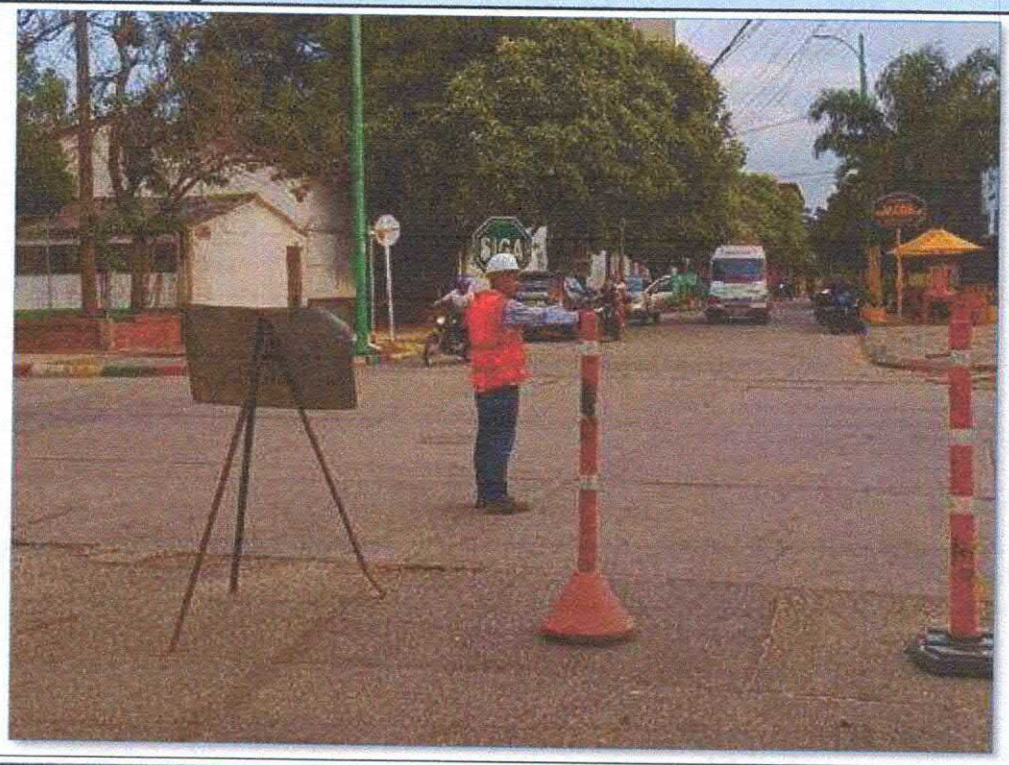



Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com



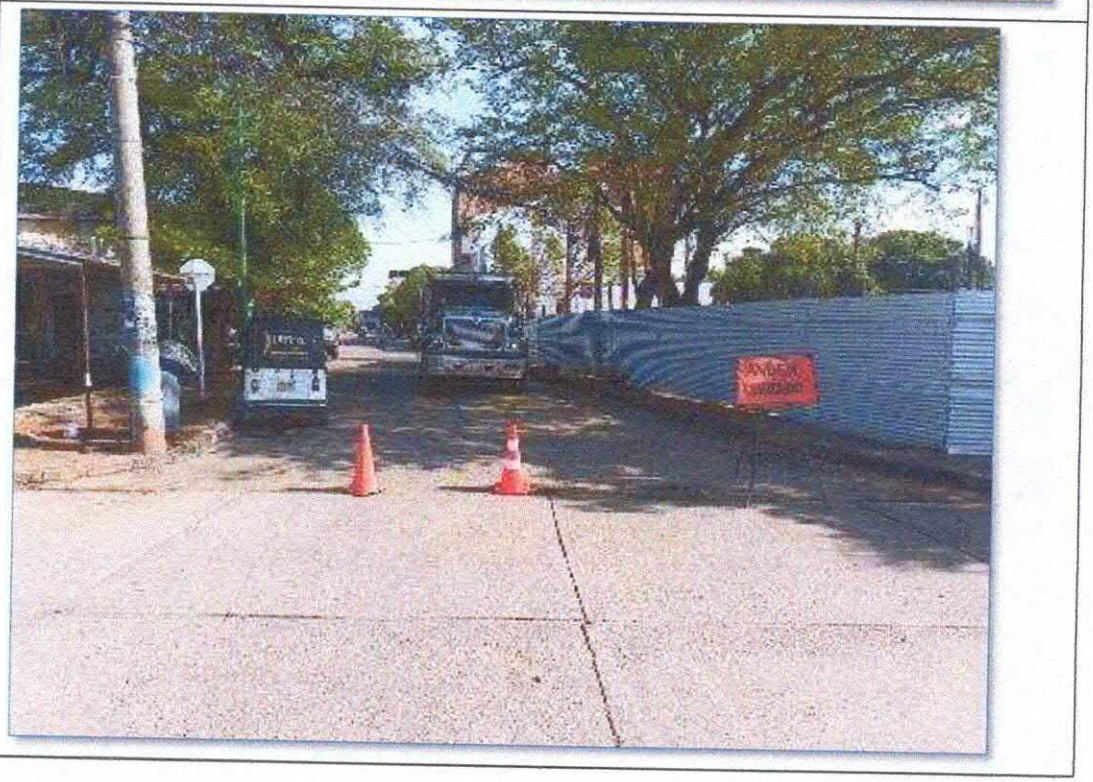

4.2 MANEJO PEATONAL

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

Se dio continuidad a la operación del sendero peatonal dispuesto sobre el costado de la carrera 10, el cual se encuentra delimitado mediante colombinas, permitiendo la circulación segura y ordenada de los peatones en el área intervenida.

Durante el periodo evaluado, el sendero se mantuvo en condiciones adecuadas de uso, garantizando la segregación entre las zonas de tránsito peatonal y las áreas de ejecución de obra, minimizando riesgos para los usuarios.

Registro fotográfico



Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0





Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0





Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

4.3 CONTROL DE TRÁFICO Y ACCESO DE MAQUINARIA

Se continuó con la implementación de control de tráfico mediante personal autorizado, encargado de regular la circulación vehicular y peatonal durante las maniobras puntuales de ingreso y salida de vehículos de carga y maquinaria al frente de obra.

Estas actividades se realizan de manera ocasional, por periodos cortos de tiempo y sin una frecuencia diaria, permitiendo un control eficiente del tránsito sin generar afectaciones significativas en la movilidad del sector.


Registro fotográfico



UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0



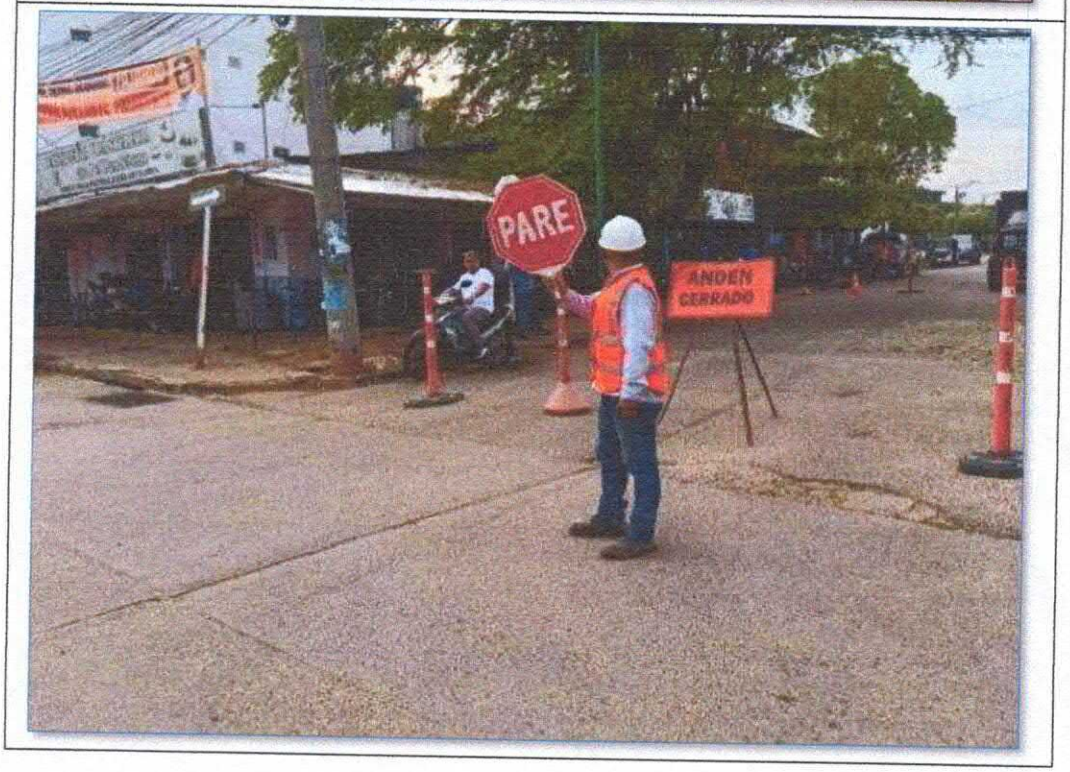

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0





Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com



4.4 CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y/O RCD´S

Durante el periodo de marzo, se mantuvo la ejecución de las actividades de cargue y descargue de materiales al interior del frente de obra, el cual se encuentra debidamente delimitado mediante cerramiento en teja.

Esta práctica ha permitido evitar la ocupación de la vía pública, garantizando condiciones seguras para la circulación vehicular y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el PMT.

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

Registro fotográfico





Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

4.5 DESVÍOS DE TRÁNSITO

Se dio continuidad a la implementación de cierres temporales parciales sobre la calle 11, asociados exclusivamente a las maniobras de ingreso y salida de volquetas al frente de obra.

Estos cierres se realizan de manera puntual y controlada, bajo la coordinación de personal controlador de tráfico, garantizando la regulación del tránsito durante las maniobras y el restablecimiento inmediato de la circulación una vez finalizadas, sin generar afectaciones relevantes en la movilidad del sector.

Registro fotográfico





4.6 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PMT

Durante el presente periodo el contratista presentó ante la interventoría y la supervisión del contrato el informe Nro.2 de ejecución del PMT correspondiente al mes de febrero, en el cual se detallan las actividades desarrolladas, las medidas implementadas y las condiciones de manejo de tránsito durante dicho periodo.

Esta gestión permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas al PMT, así como mantener informadas a las instancias de control sobre el desarrollo y comportamiento de las medidas adoptadas en obra.

4.7 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PMT

En el marco del desarrollo del proyecto, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) fue objeto de revisión y trámite ante la autoridad competente, obteniendo aprobación mediante Resolución Administrativa No. 0145 del 26 de febrero de 2026, expedida por la Alcaldía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, "*por medio de la cual se autoriza la implementación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el proyecto construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación*".

La citada resolución establece la autorización para la implementación del PMT, en concordancia con las condiciones operativas del proyecto.

Dicho acto administrativo fue debidamente notificado al contratista el 02 de marzo, quien ha dado cumplimiento a las disposiciones técnicas, operativas y de señalización allí contenidas durante el periodo evaluado.

Así mismo, se ha mantenido la articulación con la supervisión del contrato y la interventoría, garantizando el seguimiento a la correcta implementación de las medidas definidas en el PMT, en concordancia con lo aprobado por la autoridad competente.

4.8 AVANCE RECURSOS DURANTE EL PERIODO – PLAN DE MANEJO DE TRANSITO -PMT

Cuadro 1.Avance recursos durante el periodo del PMT

AVANCE DE RECURSOS EJECUTADOS PMT		
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META		
Valor PMT	**$ 25.805.088,00**	100%
Ejecución reporte Nro.3	$ 3.106.466,10	12,038%
Ejecución Acumulado	**$ 12.721.037,30**	49,297%

5. CONCLUSIONES

- Durante el periodo reportado se dio continuidad a la implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado para el proyecto, verificándose la permanencia y adecuado estado de la señalización preventiva, reglamentaria e informativa instalada en el área de influencia de la obra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución Administrativa No. 0145 del 26 de febrero de 2026 y de los lineamientos definidos por la autoridad de tránsito competente.

- La ejecución de las medidas de manejo peatonal y control vehicular permitió mantener condiciones adecuadas de movilidad y seguridad en el sector intervenido, especialmente durante las actividades de excavación, cimentación, construcción de zapatas y vigas, así como durante el ingreso y salida de maquinaria, equipos y vehículos asociados al transporte de materiales pétreos, granulares y residuos de construcción y demolición (RCD).

- Durante el periodo reportado, las actividades de cargue, descargue y transporte de materiales se desarrollaron bajo acompañamiento y control del personal autorizado del PMT, evitando afectaciones significativas sobre la movilidad del sector y garantizando condiciones seguras tanto para peatones como para vehículos que transitan en el área de influencia del proyecto.

- El sendero peatonal provisional y las medidas de segregación implementadas en el frente de obra permanecieron en funcionamiento y en adecuadas condiciones de operación, permitiendo la circulación segura de peatones y minimizando riesgos asociados a la ejecución de actividades constructivas.

- El componente del Plan de Manejo de Tránsito presenta para el periodo correspondiente al presente informe una ejecución mensual por valor de TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($3.106.466,10), equivalente al 12,038% del valor total del componente. De igual manera, se registra una ejecución acumulada de DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($12.721.037,30), correspondiente al 49,297% del valor total aprobado para el PMT.

- Las actividades ejecutadas durante el periodo permitieron mantener condiciones adecuadas de seguridad vial y control operacional en el entorno

del proyecto, garantizando la continuidad de la obra bajo parámetros técnicos y de seguridad acordes con los requerimientos establecidos para la ejecución contractual.

R./ LEGAL ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
INGENIERO CIVIL, ESPECIALISTA
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
C.C 1.023.879.760

2896

CONSORCIO
INTERFISCA GAITAN25

Mayo 11 de 2026. Puerto Gaitán, Meta.

Ingeniero:
CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura
Municipio de Puerto Gaitán – Meta

Referencia: Contrato de Obra No. 1700. De 2025 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".

Asunto: Revisión y Aval cumplimiento PMT- Mes de abril de 2026.

Cordial saludo;

La Interventoría del contrato No. 1739 de 2025, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META", se permite manifestar que:

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, se realizó seguimiento técnico permanente en campo a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por parte del contratista de obra, verificando el cumplimiento de las medidas definidas en el plan aprobado y en la normatividad aplicable.

En el desarrollo de las actividades, la interventoría constató la continuidad en la implementación y mantenimiento de la señalización vial instalada en el área de influencia del proyecto, así como la adecuada operación del sendero peatonal delimitado sobre la carrera 10, garantizando condiciones seguras para la movilidad de los usuarios.

De igual manera, se verificó la correcta ejecución de las actividades de control de tráfico durante las maniobras de ingreso y salida de vehículos de carga y maquinaria, incluyendo la aplicación de cierres temporales parciales sobre la calle 11, los cuales fueron realizados de manera controlada, sin generar afectaciones significativas a la movilidad del sector.

Así mismo, la interventoría evidenció que las actividades de cargue y descargue de materiales se realizaron al interior del frente de obra, evitando la ocupación del espacio público y cumpliendo con las disposiciones establecidas en el PMT.

Se verificó además el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución Administrativa No. 0145 del 26 de febrero de 2026, mediante la cual la autoridad competente autorizó la implementación del PMT para el proyecto, evidenciando coherencia entre lo aprobado, lo ejecutado y las condiciones reales de la obra.

Como resultado del seguimiento efectuado, la interventoría concluye que las medidas implementadas por el contratista han sido adecuadas y suficientes para el manejo del tránsito durante el periodo evaluado.


CONSORCIO
INTERFISCA GAITAN25


Evidencia Fotográfica








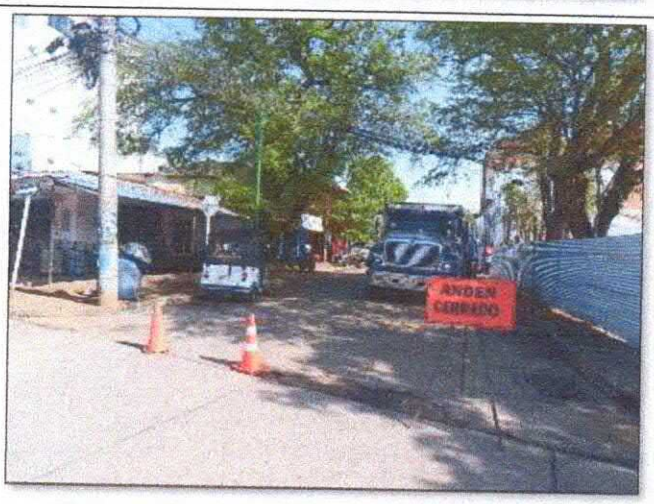

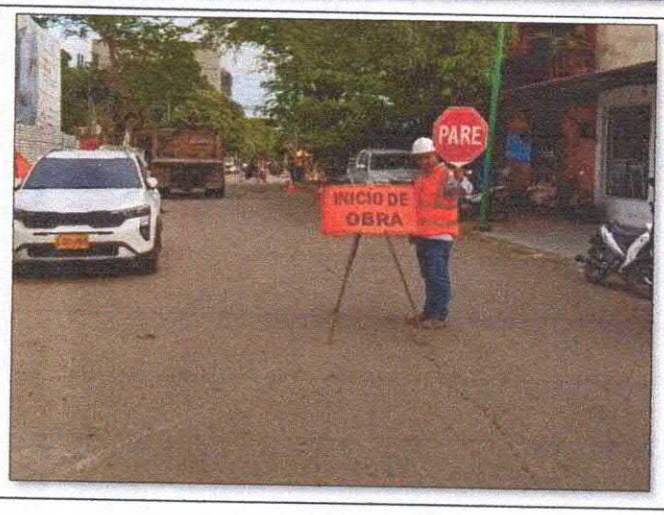

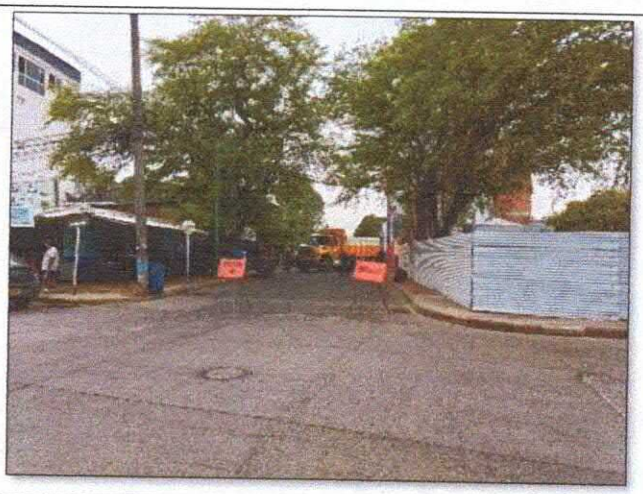

Correo: consorciointerfiscagaitan25@gmail.com
BL N TORRE 29 AP 203 URBANIZACIÓN LAS MARGARITAS - FLOR AMARILLO
Tel.: 315-361-9997

CONSORCIO
INTERFISCA GAITAN25

En este sentido, la interventoría avala el informe del PMT correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2026, presentado por el contratista, al considerar que refleja de manera técnica, veraz y coherente las actividades desarrolladas y las condiciones de manejo de tránsito durante el periodo evaluado.

Fernando villegas

ING. FERNANDO JOSE VILLEGAS DIAZ
INGENIERO CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
NIT 902017391-1

2899

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

AVAL DE INTERVENTORÍA

Puerto Gaitán – Meta

311 386 8024

2900

CONSORCIO
INTERFISCA GAITAN25

Mayo 11 de 2026. Puerto Gaitán, Meta.

Ingeniero:
CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura
Municipio de Puerto Gaitán – Meta

Referencia: Contrato de Obra No. 1700. De 2025 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".

Asunto: revisión y aval informe de obra - Mes de abril de 2026.

Cordial saludo;

En calidad de Interventoría del Contrato de Obra No. 1700 de 2025, y en ejercicio de las funciones de seguimiento, control y verificación técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, nos permitimos manifestar que, una vez revisado el informe de avance de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026, se emite el presente aval en los siguientes términos:

- Se verificó que las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo en mención fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, los diseños aprobados, los pliegos de condiciones y las obligaciones contractuales, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

- Así mismo, se constató que el contratista dispuso del personal profesional, técnico y operativo ofertado, cumpliendo con los perfiles y dedicaciones mínimas requeridas, así como con la maquinaria y equipos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades programadas.

- En desarrollo de las actividades de seguimiento en campo, esta Interventoría verificó la correcta ejecución de las obras, el cumplimiento de las condiciones de seguridad, calidad y organización del frente de trabajo, así como la coherencia entre lo ejecutado y lo reportado en el informe presentado.

- Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó el seguimiento al avance físico y financiero del proyecto, evidenciando que se alcanzó una ejecución del 7,594%, equivalente a TRESCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($303.946.217,92), frente a un avance mensual programado del 10,29%, correspondiente a CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTISÉIS CENTAVOS. ($ 411.763.495,26).

- Se constató un avance acumulado del 15,439%, equivalente a **SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($617.932.699,50),** lo que representa un rezago del 8,76% frente a lo programado, situación que la Interventoría considera

CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25

directamente relacionada con las restricciones derivadas del trámite de la Modificatoria Nro. 01, Adición Nro. 01 y Prórroga Nro. 01.

PROGRAMACIÓN					EJECUTADO					DESVIACIÓN ACUMULADA	
MES	MENSUAL		ACUMULADO		MES	MENSUAL		ACUMULADO			
	VALOR	%	VALOR	%		VALOR	%	VALOR	%		
feb-26	$ 61.195.214,69	1,53%	$61.195.214,69	1,53%	feb-26	$70.652.054,15	1,765%	$ 70.652.054,15	1,765%	-$ 9.456.839,46	0,24%
mar-26	$ 495.737.162,69	12,39%	$556.932.377,38	13,91%	mar-26	$ 243.334.427,43	6,080%	$ 313.986.481,58	7,845%	$ 242.945.895,80	-6,07%
abr-26	$ 411.763.495,26	10,29%	$968.695.872,64	24,20%	abr-26	$ 303.946.217,92	7,594%	$ 617.932.699,50	15,439%	$ 350.763.173,14	-8,76%
may-26	$ 242.741.117,37	6,06%	$1.211.436.990,00	30,27%	may-26			$ 617.932.699,50	15,439%		
jun-26	$ 230.941.962,09	5,77%	$1.442.378.952,09	36,04%	jun-26			$ 617.932.699,50	15,439%		
jul-26	$ 174.939.310,44	4,37%	$1.617.318.262,53	40,41%	jul-26			$ 617.932.699,50	15,439%		
ago-26	$ 274.835.863,53	6,87%	$ 1.892.154.126,06	47,27%	ago-26			$ 617.932.699,50	15,439%		
sep-26	$ 85.130.899,50	2,13%	$ 1.977.285.025,56	49,40%	sep-26			$ 617.932.699,50	15,439%		
oct-26	$ 305.542.518,68	7,63%	$ 2.282.827.544,24	57,04%	oct-26			$ 617.932.699,50	15,439%		
nov-26	$ 144.864.099,70	3,62%	$ 2.427.691.643,94	60,66%	nov-26			$ 617.932.699,50	15,439%		
dic-26	$ 516.487.668,13	12,90%	$ 2.944.179.312,06	73,56%	dic-26			$ 617.932.699,50	15,439%		
ene-27	$ 852.674.552,20	21,30%	$ 3.796.853.864,27	94,86%	ene-27			$ 617.932.699,50	15,439%		
feb-27	$ 205.595.894,19	5,14%	$ 4.002.449.758,46	**100,00%**	feb-27			$ 617.932.699,50	**15,439%**		
TOTAL	**$ 4.002.449.758,46**	**100,00%**			TOTAL	**$ 617.932.699,50**	**15,44%**				

Con base en lo anterior, esta Interventoría avala el avance de obra reportado y las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2026, al evidenciarse su conformidad con las condiciones contractuales y técnicas del proyecto.

El presente aval se emite para los fines pertinentes dentro del desarrollo del contrato.

Fernando Villegas

ING. FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
