
Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de Seguimiento Semanal Etapa de estudios y diseños Contrato de obra 3375 -2025 e interventoria 3891-2025 Grupo 1	DD	MM	AA
ACTA No. 10		21	4	2026

LUGAR: . https://teams.microsoft.com/meet/25812218217594?p=1scH3xZ04US1mnVx6Y **HORA DE INICIO:** 8:10 a. m. **HORA FIN:** 9:35 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

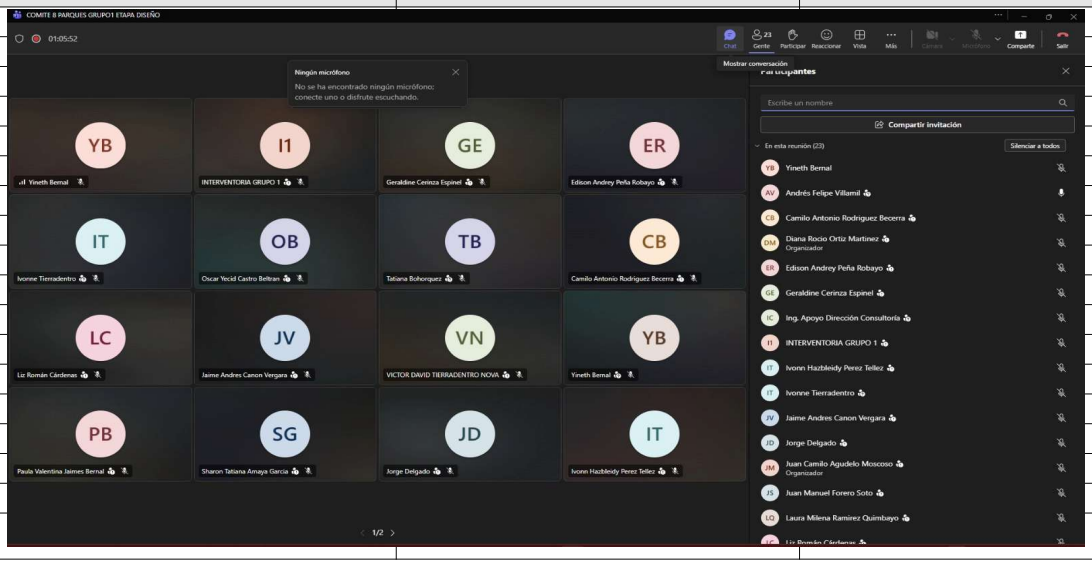

ORDEN DEL DIA

1. Verificación general del contarto.	4.
2. Verificacion de compromisos acta anterior.	5.
3.Verificacion de los componentes tecnico, estructural, electrico, geotecnia y Ambiental, SST y Social	6.

TEMAS TRATADOS

Se realiza comité de seguimiento "Etapa de Estudios y Diseños" contrato de obra 3375 -2025 e interventoria 3891-2025 Grupo 1 efectuando seguimieto a los compromisos establecidos en comité del 14 de Abril del 2026

Se evidencia un 54,73% programado del 52,03 % Vs con un atraso del 2,70%, el porcentaje de avance corresponde a la programacion deobra vigente, mas sin embago se evidencia por la interventoria que existe una reprogrmacion que esta en verificacion y que sera producto del reporte para la semana siguiente.

COMPONENTE TECNICO

-Mesa de Selección IDRD : Realizada el 14 de abril del 2026 en la cual se dio aval por parte del IDRD a las alternativas aprobadas por la interventoría, se remitirá de manera formal las observaciones efectuadas por el IDRD para ser atendidas en la etapa de Anteproyecto.

-Realizara mesa de trabajo del componente de paisajismo e urbanismo el 21 de Abril del 2026 con el fin de establecer opciones de materialidad de acuerdo a las observaciones efectuadas por el IDRD, por otra parte el contratista está evaluando diferentes proveedores por tratarse de algunos materiales no estándar; asi mismo el IDRD solicitó que se evalúe la viabilidad de la materialidad a futuro, garantizando la estabilidad por un periodo minimo de 5 años.

-El contratista expuso que existe una diferencia entre las áreas establecidas en el RUPI y las áreas reales arrojadas por la topografía, lo cual dejaría un saldo a favor en el contrato, razon por la cual se plantea la consulta sobre la viabilidad de areas aledañas (como andenes deteriorados) en aras de copar el saldo del contrato, para lo cual el IDRD efectuara la consulta con el area de contratacion y estructuracion del proyecto.

COMPONENTE HIDRAULICO

- de acuerdo a la radicacion de los esquemas basicos por parte del contratosta el 06 de Abril del 2026 no se ha dado respuesta por parte de la EAAB a la informacion remitida.

COMPONENTE ELECTRICO

-El contratista remitió los documentos para los trámites ante Enel.
-Se informó sobre la programación de una visita nocturna con la UAESP a los parques (iniciando en El Tejar) para evaluar la posibilidad de iluminación mediante el plan de expansión.
- Se solicita a contratista remitir los formularios de solicitud de servicio con las firmas correspondientes por parte del IDRD.

COMPONENTE ARQUEOLOGICO Y PATRIMONIAL
-Se remitió el diagnóstico arqueológico ante el ICANH y se compartió el número de radicado con el IDRD.
-El IDRD notificó que, debido a la cercanía del parque Rincón de Los Ángeles con el monumento a Manuel Cepeda Vargas, se debe radicar un protocolo de protección preventivo ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

COMPONENTE SST
-El Informe SST 1 presentó retrasos debido a observaciones pendientes de índole administrativa, puntualmente la falta de un certificado de parafiscales y un contrato.
-El contratista realizó un nuevo envío tras una mesa de trabajo para su validación.

COMPONENTE SOCIAL
-Se realizaron reuniones de avance comunitario en Rincón de Los Ángeles y Senderos de Castilla (13 asistentes cada una). En Rincón de Los Ángeles, la comunidad manifestó inquietudes sobre el sistema de drenaje (SUDS) y propuso intervenir un muro con un grafiti, lo cual cuenta con la anuencia del administrador del conjunto colindante.
-En el parque El Tejar, se dialogó con un residente que utiliza un acceso colindante al parque para el ingreso de vehículos de publicidad. Se le aclaró que no se dejará acceso vehicular sobre el parque y se evaluarán sugerencias técnicas para que adecúe su entrada por otro costado.
-Se remitió el diseño de las vallas informativas al apoyo social del IDRD para continuar con el trámite correspondiente.

COMPONENTE AMBIENTAL
-El contratista entregó el Informe Ambiental 2 y la Interventoría devolvió observaciones.
-Se presentó una versión preliminar (versión cero) del Programa de Manejo Ambiental de RCD, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría y se ajustará cuando se cuente con los diseños definitivos.
-El trámite del permiso de publicidad exterior se encuentra pausado a la espera de la aprobación del diseño de la valla por parte del área de comunicaciones del IDRD.

COMPONENTE FORESTAL
-Se completó el levantamiento del 100% del inventario forestal.
-Se discutió la necesidad de validar prontamente si se requerirán trámites y permisos ante la autoridad ambiental, lo cual depende de cruzar la información del inventario con los diseños definitivos para identificar interferencias

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Mesa de trabajo Materialidades	Contratista / Interventoria / IDRD	22/04/2026
Factibilidad Economica de los parques	Contratista / Interventoria	24/04/2026
Presentacion Informes N° 02	Contratista	28/04/2026
Protocolo de Proteccion ante el IDPC	Contratista	14/04/2026
Subsanacion de Informe SST - Ambiental	Contratista	24/04/2026
Informes de interventoria No 01 Totalidad de Componentes	Interventoria	28/04/2026
Taller de prevencion de Genero	Contratista / Interventoria	21/04/2026
Verificacion Componentes	Contratista / Interventoria	14/04/2026

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

Siendo las 8:50 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Adriana Gutierrez	NOMBRE		
CARGO	Dir. Interventoria	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Adriana Gutierrez *
