
| Si no maneja consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNIÓN:Comité de Seguimiento Semanal Etapa de estudios y diseños Contrato de obra 3375 -2025 e interventoria 3891-2025 Grupo 1 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| **ACTA No. 9** | | 14 | 4 | 2026 |

**LUGAR:** . https://teams.microsoft.com/meet/25812218217594?p=1scH3xZ04US1mnVx6Y **HORA DE INICIO:** 8:10 a. m. **HORA FIN:** 8:40 a. m.

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|

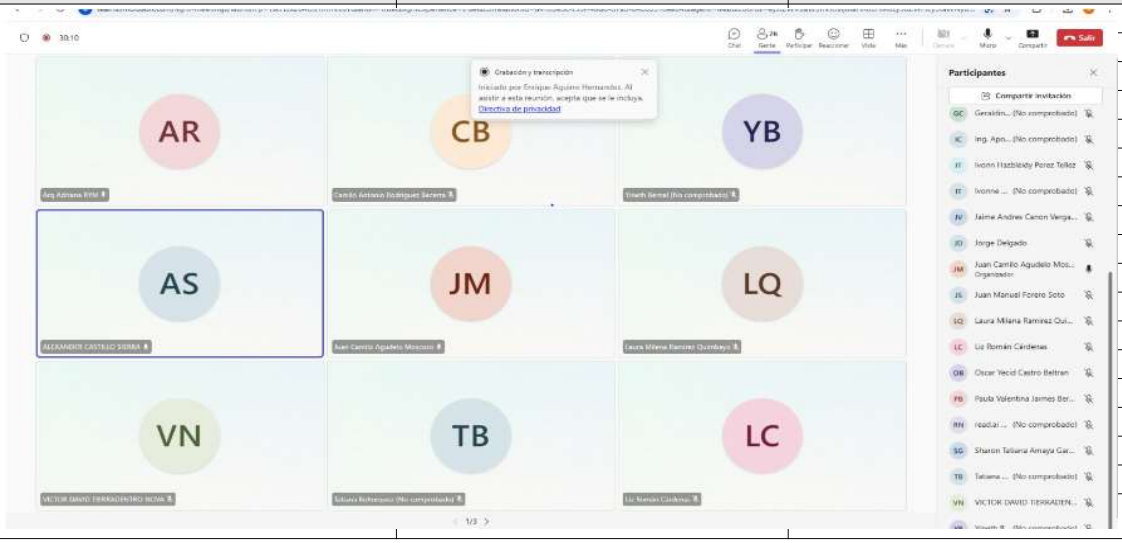


**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Verificación general del contarto. | 4. |
| 2. Verificacion de compromisos acta anterior. | 5. |
| 3.Verificacion de los componentes tecnico, estructural, electrico, geotecnia y Ambiental, SST y Social | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

Se realiza comité de seguimiento "Etapa de Estudios y Diseños" contrato de obra 3375 -2025 e interventoria 3891-2025 Grupo 1 efectuando seguimieto a los compromisos establecidos en comité del 07 de Abril del 2026

Se evidencia un % programado del 51,06% Vs ejecutado del 48,70% con un atraso del 2,36%, el atraso minimizo dado que por parte del contratista se continua con el plan de contingencia el cual efectuo radicacion de formulario MU ante la UAESP tramite que disminuyo el % negativo cargado al contrato.

**COMPONENTE TECNICO**

- Se realizara mesa de seleccion entre Interventoria e IDRD el 14 de Abril del 2026 en aras de efectuar la aprobacion de la alternativa aprobada por la interventoria y asi dar continuidad con la etapa de Anteproyecto.
- Mesa de Trabajo de Componente Hidráulico. Se efectuo radicación de los esquemas básicos ante la EAAB en aras de evidenciar la factibilidad inicial de los diseños hidraulicos con conexiones de SUDS a nivel de calsada; esquemas que deberan tener aval previo por parte del Acueducto.
- Mesa de Trabajo ETC la cual fue realizada el 07 de Abril del 2026 en la cual se estableció los parámetros para el levantamiento de redes y las actividades una vez se de inicio al contrato en la etapa de Obra, se programara visita en campo en aras de establecer las redes existentes en campo.
- Componente Eléctrico : Se remitieron por parte del contratista poderes diligenciados para ser tramitados por el IDRD.
- Componente Arqueología: Se remitió por parte del contratista diagnostico del arqueología para continuar con el tramite ante el ICANH, documento que fue verificado y avalado por la interventoria.
- Se solicita por la entidad dar celeridad en el tema de informes mensuales ya que los periodos de presentacion estan por fuera de los establecidos inicialmente por la entidad.

**COMPONENTE SST**
-Se realizará seguimiento el día viernes 17 de Abril del 2025.
- Se encuentra en verificacion del informe mensual No 01 del contratista por parte de la interventoria.
- A la fecha no se presentan accidentes ni incidentes laborales.

**COMPONENTE SOCIAL**
-Se revisan y aprueban las piezas de divulgación para las reuniones de avance.
- Se efectuaron entrega de pieza de divulgación a comunidad de los parques rincon de los angeles y castilla las cuales se realizaran el 18 de Abril del 2026
-En la ultima semana no se recibió ninguna PQR´S

**COMPONENTE AMBIENTAL**
-Se realizará seguimiento el día viernes 17 de Abril del 2025.
-Se realizara verificacion del informe mensual No 01 del contratista de acuerdo a los parametros establecidos por el IDRD.
-Se encuentra en elaboracion el informe No 01 del contrato de interventoria

**COMPONENTE FORESTAL**
Se ha realizado el inventario al 100% de los individuos vegetales dentro de los parques.
Se han tenido avances preliminares para validar la no interferencia de arbolado con las actividades a ejecutar.
Se ha avanzado con la revisión de manera permanente de los codigos SIGAU.

**COMPROMISOS**

| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Copilacion de Informe Tecnico de Obra No 01 | Contratista / Interventoria | 8/04/2026 |
| Radicacion de Esquemas Basicos a EAAB | Contratista | 10/04/2026 |
| Aprobacion Informe No 01 Ambiental Obra | Interventoria | 10/04/2026 |
| Verificacion Esquema Basico /Comité de Selección | IDRD | 14/04/2026 |
| Verificacion Componentes | Contratista / Interventoria | 14/04/2026 |
| Reuniones de socializacion del esquema basico | Contratista/ Interventoria / IDRD | 11/04/2026 |

**EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN**

| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | |
|---|---|---|---|---|

**Observaciones**

Siendo las 8:50 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA |  | FIRMA | | |
| NOMBRE | Adriana Gutierrez | NOMBRE | | |
| CARGO | Dir. Interventoria | CARGO | | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Adriana Gutierrez |
|---|---|

*
