CONSORCIO PARQUES DISTRITALES

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No. 3 DE INTERVENTORÍA

ETAPA: ESTUDIOS Y DISEÑOS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO N° 3891 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA AL CONTRATO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1″

Bogotá D.C, MAYO DE 2026

TABLA DE REVISIONES

INFORME MENSUAL AMBIENTAL #3 DE INTERVENTORÍA			
APROBACIÓN DE DOCUMENTO			
APROBACIÓN	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	NOMBRE	ING. YINETH BERNAL
		FIRMA	
		FECHA	Mayo de 2026
	RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	NOMBRE	ARQ. ADRIANA GUTIÉRREZ
		FIRMA	
		FECHA	Mayo de 2026
	VISTO BUENO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	NOMBRE	ARQ. ADRIANA GUTIÉRREZ
		FIRMA	
		FECHA	Mayo de 2026

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**CAPITULO MODIFICADO**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
0	Versión original	27/05/2026	N/A

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 5
2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATO 5
2.2 PERSONAL MÍNIMO APROBADO 6
2.3 INFORME MENSUAL CONTRATISTA 7
2.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 7
3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 8
3.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO 8
3.2 SEGUIMIENTO A LAS DETERMINANTES AMBIENTALES 9
3.3 ESTADO DE PERMISOS, AUTORIZACIONES O REGISTROS 10
3.4 SEGUIMIENTO A PAGOS 11
3.5 BALANCE DE AREAS 11
3.6 DISEÑOS DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE 12
3.7 ACTA DE PAISAJISMO 14
3.8 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 15
3.9 METODOLOGÍAS DE ENSAYOS IN SITU. 15
3.10 BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 15
4. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD 16
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 16
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO, IMÁGENES O PLANOS 18
7. CONCLUSIONES 19
8. ANEXOS INTERVENTORÍA 19

INDICÉ DE TABLAS

Tabla 1 Contrato de obra
Tabla 2. Contrato de Interventoría
Tabla 3. Personal ambiental
Tabla 4. Trazabilidad informes ambientales
Tabla 5. Localización
Tabla 6. Reuniones de seguimiento
Tabla 7. Avance Requerimiento ambientales
Tabla 8. Resumen consultas ambientales
Tabla 9. Permisos ambientales
Tabla 10. Pago permisos
Tabla 11. Cuadro de áreas según POT
Tabla 12. Avance acta paisajismo
Tabla 13. Avance plan de gestión de riesgos
Tabla 14. Avance PMARCD
Tabla 15. Avance PMA
Tabla 16. Registro fotográfico

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las labores realizadas por el CONSORCIO PARQUES DISTRITALES, comprendida del 01 al 30 de abril de 2026 para, **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA AL CONTRATO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1"** al contrato de obra No. 3775 de 2025 Celebrado entre el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD y CONSORCIO CAPITAL IJ, de acuerdo con la propuesta presentada y con los términos de referencia que sirvieron de base al contrato , siendo una de las obligaciones de la Interventoría hacer el registro y control de las labores a cargo del el Contratista, por lo anterior, el presente informe corresponde a las labores realizadas en el componente ambiental.

2. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATO

Tabla 1 Contrato de obra

CONCEPTO	DATO
Objeto:	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1
Contrato No.:	3775 DE 2025
Contratista:	CONSORCIO CAPITAL IJ
NIT:	901.992.277-5
Plazo inicial :	7 MESES Y 15 DÍAS
Fecha de inicio:	17 de febrero de 2026
Fecha final estudios y diseños	16 de junio de 2026
Fecha final de obra:	02 de octubre de 2026
Valor inicial :	$ 5.939.090.747

Tabla 2. Contrato de Interventoría

CONCEPTO	DATO
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA AL CONTRATO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1
Contrato No.:	3891 de 2025
Contratista	CONSORCIO PARQUES DISTRITALES
NIT:	902.012.643-1
Plazo inicial:	8 meses y 15 días
Fecha de inicio:	17 de febrero de 2026
Fecha final estudios y diseños	16 de junio de 2026
Fecha final de obra:	02 de noviembre de 2026
Valor inicial :	$ 986.497.881

2.2 PERSONAL MÍNIMO APROBADO

Para la ejecución del contrato en la etapa de estudios y diseños, se cuenta con el siguiente personal aprobado.

Tabla 3. Personal ambiental

CARGO	CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
	NOMBRE	No. APROBACIÓN	NOMBRE	No. APROBACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	LYDA IVONNE TIERRADENTRO	R&M-SG-3891-001-2025	YINETH MARCELA BERNAL	20264200045531
PROFESIONAL GESTIÓN DEL RIESGO	FLABIO FEDERICO SOLER	R&M-SG-3891-001-2025	FERNANDO OSPINA	20264200045531

2.3 INFORME MENSUAL CONTRATISTA

Consorcio Capital IJ presento el informe ambiental #3, el cual fue revisado por interventoria y aprobado con la siguiente trazabilidad. Se adjunta comunicado de aprobación del informe y lista de chequeo. **Ver Anexo 1**

Tabla 4. Trazabilidad de informes ambientales

CONTRATISTA	RECIBIDO	APROBACIÓN RYM	REMISIÓN AL IDRD
INFORME AMBIENTAL No.1	Comunicado JPS-3775-378-2026 del 27/03/2026	Comunicado CDP-SG-3891-043-2025 del 11/04/2026	20262100205602 del 15/04/2026
INFORME AMBIENTAL No.2	Comunicado JPS-3775-503-2026 del 22/04/2026	Comunicado CDP-SG-3891-065-2025 del 04/05/2026	20262100240632 del 05/05/2026
INFORME AMBIENTAL No.3	Al cierre del periodo de este informe, el contratista no ha radicado el informe mensual No.3, se espera su entrega para la primera semana del mes de mayo de 2026, de acuerdo los plazos contractuales		

2.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

El proyecto, contempla la intervención de 4 parques ubicados en la ciudad de Bogotá, a continuación imagen de referencia y tabla de localizaciones.



Ilustración. Localización Area Puntual de Parques

Tabla 5. Localización

PARQUE	LOCALIZACIÓN	ID-PARQUE
Senderos de Castilla	Calle 7a con Carrera 83 costado noroccidental	08-627
Rincón de los Ángeles II Etapa	Calle 6a 73b 21	08-651
El Tejar	Interior de la manzana 21/30 comprendida entre la calle 24 sur y la av. primero de mayo Calle 26 sur y entre la Carreras 52a y 52b	16-210
Industrial Puente Aranda	Cruce Avenida Carrera 49 50 con diagonal 9 Costado sur	16-313

Durante el periodo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el objeto del contrato.

- Se adelantan actividades de elaboración de diseños
- Se llevaron acabó comités de seguimiento semanal integrales y propios del área
- Se realizaron las primeras entregas de los productos Plan de Manejo Ambiental y Programa de manejo de RCD.
- Elaboración de informes mensuales

Para el corte del presente informe, en la etapa de estudios y diseños se tiene un **avance del 57.49%** según lo reportado por el área técnica.

3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

3.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO

En cuanto a la gestión ambiental durante este periodo, interventoría y contratista participaron en las siguientes actividades documentadas: **Ver Anexo 2**

Tabla 6. Reuniones de seguimiento

TIPO DE REUNIÓN	FECHA
Comité integral de seguimiento No.8	07/04/2026
Comité ambiental, forestal, fauna y paisajismo No.6	10/04/2026

Comité integral de seguimiento No.9	14/04/2026
Comité ambiental, forestal, fauna y paisajismo No.7	17/04/2026
Comité integral de seguimiento No.10	21/04/2026
Comité ambiental, forestal, fauna y paisajismo No.8	24/04/2026
Comité integral de seguimiento No.11	28/04/2026

3.2 SEGUIMIENTO A LAS DETERMINANTES AMBIENTALES

Para la presente etapa de estudios y diseños, se tienen en cuenta las determinantes ambientales establecidas en:

- Decreto 555 de 2021. Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá
- Resolución 3654 de 2014. Por la cual se establece el programa de reconocimiento -Bogotá Construcción Sostenible", y se deroga la resolución 5926 de 2011.
- Resolución 194 de 2025. Por medio de la cual se definen los parámetros y lineamientos de construcción sostenible, se adopta la guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones, se sustituye la Resolución 0549 del 2015 y se dictan otras disposiciones.
- Acuerdo 418 de 2009. Por el cual se promueve la implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes, entre otras en el D. C. y se dictan otras disposiciones

Se diligencio el formato de Requerimientos ambientales de la subdirección técnica de construcciones del IDRD, con el fin verificar la aplicabilidad de los ítems dentro de lo diseñado hasta el momento. **Ver Anexo No.3**

Tabla 7. Avance requerimiento ambientales

CRONOGRAMA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS														
	MES 1				MES 2				MES 3					
ACTIVIDAD /ENTREGABLE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	% AVANCE	OBSERVACIONES
Lista de verificación "Requerimientos Ambientales"						X					X		70%	Se presente versión del formato a corte del periodo 3

El Consorcio Capital IJ, realizo consultas a JBB, SDP, SDA, IDIGER, DADEP, UAESP y CAR, con el fin de establecer determinantes a tener en cuenta para el diseño de cada uno de los parques, las cuales ya cuentan con respuestas en donde se define que ninguno de los parques presenta interferencias. Se adjunta matriz de trazabilidad y comunicaciones de salida y entrada de cada una de las entidades. **Ver Anexo No.4**

Tabla 8. Resumen consultas ambientales

ENTIDAD	RADICADO ENVIADO	RADICADO RESPUESTA
Jardín Botánico de Bogotá (JBB)	Radicado 2025JBB4100131851 Oficio 2025JBB4100131851	2025JBB4100116122
Jardín Botánico de Bogotá (JBB)	Radicado 2025JBB4100130321 Oficio JPS-3775-2143-2025	2025JBB4100111972
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	Radicado 20251128004 Oficio JPS-3775-2158-2025	01252012141*
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP)	Radicado 20254000332222 Oficio: JPS-3775-2160-2025	20252010212351
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)	Traslado por competencia CAR radicado 20251128004 Oficio JPS-3775-2158-2025	2025EE288819
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)	Radicado 20257000747422. Oficio JPS-3775-2173-2025	20254000289821
IDIGER	Radicado IDIGER 2025ER26837 Oficio: JPS-3775-2164-2025	Nro.:2025EE24202 (RO-160006)
Secretaria Distrital de Planeación (SDP)	Radicado 1-2025-60338 Oficio: JPS-3775-2171-2025	2-2025-68694 Incluye adjunto
Secretaria Distrital de Planeación (SDP)	Radicado 3-2025-38092 (1-2025-60338). Oficio: JPS-3775-2171-2025	3-2025-39205

A la fecha no se tienen respuestas pendientes por parte de las entidades consultadas.

3.3 ESTADO DE PERMISOS, AUTORIZACIONES O REGISTROS

Para este mes de la etapa de estudios y diseños, no se requieren permisos, sin embargo se mencionan los que se deben tramitar previo al inicio de la etapa de obra:

Tabla 9. Permisos ambientales

Requerimiento	Aplica	Observaciones	% AVANCE
Registro de publicidad exterior visual	SI	Se espera la definición del área de la valla por parte de comunicaciones del IDRD para establecer si aplica el registro ante la SDA, sin embargo el contratista ha avanzado en el diligenciamiento de los formatos de registro para cada parque. **Ver Anexo No.5**	20%
PIN de obra como generador de RCD	SI	El contratista presento el primer avance del programa de manejo ambiental de RCD con el fin de dar tramite a la apertura del PIN Ambiental previo al inicio de la etapa	40%
Permiso de aprovechamiento forestal	NO	Por ahora no se contempla tramite de permiso de aprovechamiento forestal, de llegarse a identificar la necesidad, se deberá dar el tramite correspondiente.	N/A a la fecha

3.4 SEGUIMIENTO A PAGOS

Para este periodo o no se realizaron pagos, sin embargo, se mencionan los que el contratista debe tramitar previo al inicio de la etapa de obra:

Tabla 10. Pago permisos

Requerimiento	Aplica	Observaciones	% AVANCE
Registro de publicidad exterior visual	SI	Pago de acuerdo a liquidación por permiso de valla de cada parque	0%

3.5 BALANCE DE AREAS

Siguiendo los lineamientos de lo establecido en el Decreto POT 555 de 2021, manual de espacio público y la cartilla ciudad encuentro para los parques del IDRD se establece de acuerdo con la vocación de cada parque, en la propuesta de los diseños se debe cumplir con las siguientes áreas.

Tabla 11. Cuadro de áreas según POT


CODIGO	PARQUE	RUPI	POT 555-2021	VOCACION
16-210	PARQUE EL TEJAR	2426-72	SUPERFICIE DURA S2 35% MIN S2 MAX S2 AREA SUPERFICIE DURA 80% 100% COMPONENTE JUEGOS 20% 35% DEMÁS COMPONENTES 60% 65%	LUDICO
08-627	SENDEROS DE CASTILLA	3082-4	SUPERFICIE DURA S2 35% MIN S2 MAX S2 AREA SUPERFICIE DURA 80% 100% COMPONENTE JUEGOS 20% 35% DEMÁS COMPONENTES 60% 65%	LUDICO
08-651	RINCON DE LOS ANGELES ETAPA II	1123-20	SUPERFICIE DURA S2 35% MIN S2 MAX S2 AREA SUPERFICIE DURA 80% 100%	CONTEMPLATIVO
16-313	INDUSTRIAL PUENTE ARANDA	1858-10	SUPERFICIE DURA S2 35% MIN S2 MAX S2 AREA SUPERFICIE DURA 80% 100% COMPONENTE JUEGOS 15% 30% DEMÁS COMPONENTES 65% 70%	LUDICO

Para el presente informe, se adjunta tabla comparativa entre lo establecido en el POT y en los esquemas básicos a la fecha en cuanto a zonas duras y verdes. **Ver Anexo No.6**

3.6 DISEÑOS DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE

La tipología de SUDS propuesta en la etapa de esquema básico corresponde a jardines de biorretención, incorporando uno para el parque Senderos de Castilla, uno en Rincón de los Ángeles II etapa, uno en El Tejar y dos en el Parque Industrial Puente Aranda.

Esta tipología se fundamenta en el uso de depresiones vegetales que permiten la captación, tratamiento y manejo de la escorrentía mediante procesos de filtración e infiltración, contribuyendo a la mejora en la calidad del agua, así como al fortalecimiento del valor paisajístico y la generación de hábitat.

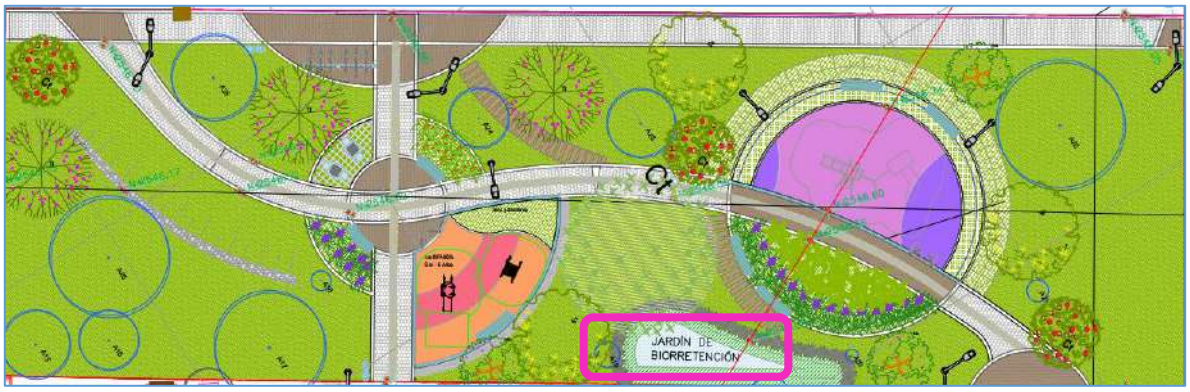


Parque senderos de castilla



Parque Industrial Puente Aranda



Parque el tejar

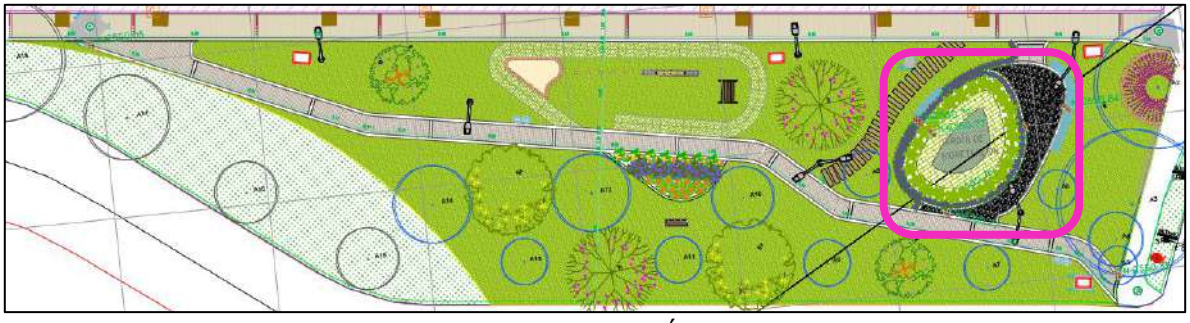

Parque Rincón de los Ángeles

3.7 ACTA DE PAISAJISMO

Se evalúa dentro del objeto del contrato el diseño paisajístico detallado (áreas de plantación, especies propuestas, ubicación y detalles técnicos) para generar la solicitud ante las autoridades ambientales, y obtener la aprobación mediante acta por el JBB.

Tabla 12. Avance acta de paisajismo

CRONOGRAMA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS														
	MES 1				MES 2				MES 3					OBSERVACIONES
ACTIVIDAD /ENTREGABLE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	% AVANCE	
Suscripción acta de diseño de arbolado y jardinería											X		0%	A la fecha de corte del presente informe no se cuenta con entregables

3.8 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

El plazo establecido para la entrega del plan de gestión para el riesgo de desastres esta dado contractualmente para la tercera semana del mes tres. A la fecha de corte del presente informe, el contratista no ha presentado avances sobre el mismo.

Tabla 13. Avance plan de gestión de riesgos

CRONOGRAMA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS														
	MES 1				MES 2				MES 3					OBSERVACIONES
ACTIVIDAD /ENTREGABLE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	% AVANCE	
Plan de gestión de riesgo de desastres											X		0%	A la fecha de corte del presente informe no se cuenta con entregables

3.9 METODOLOGÍAS DE ENSAYOS IN SITU.

En este periodo no se ejecutaron ensayos in situ que requieran medidas ambientales.

3.10 BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Respecto a la evaluación de si el proyecto aplica o no para participar en el programa de reconocimiento Bogotá Construcción Sostenible, se evaluara una vez se tenga la aprobación de diseños definitivos arquitectónicos y urbanísticos para levantar la lista de chequeo correspondiente.

4. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El día 20 de abril de 2025, se tuvo la entrega de la versión 0 del programa de manejo ambiental de RCD el cual fue revisado por Interventoria y devuelto con observaciones. A la fecha de corte del presente informe se encuentra en ajustes por parte del contratista.

Tabla 14. Avance PMARCD

CRONOGRAMA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS														
	MES 1				MES 2				MES 3					
ACTIVIDAD /ENTREGABLE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	% AVANCE	OBSERVACIONES
Programa de manejo Ambiental de RCD								X					50%	PMARCD en ajustes por parte del contratista

4.1 Presupuesto de costos de tratamientos y disposición de RCD de la obra

A la fecha no se tiene un entregable de este ítem, ya que dentro de la versión 0 del PMARCD no se adjuntó la estimación de costos. Avance de ejecución 0%.

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El día 30 de abril de 2026 se tuvo la entrega de la versión 0 del Plan de Manejo Ambiental, la cual, a fecha de corte del presente informe se encuentra en revisión de la interventoría. El plazo establecido para la entrega del Plan de Manejo Ambiental esta dado contractualmente una semana antes de dar inicio a las actividades de obra.

Tabla 15. Avance PMA

CRONOGRAMA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS														
	MES 1				MES 2				MES 3					
ACTIVIDAD /ENTREGABLE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	% AVANCE	OBSERVACIONES
Plan de Manejo Ambiental											X		40%	versión 0, en revisión de la Interventoría

5.1 Introducción, objetivos, antecedentes, metodología, marco normativo especifico y aplicable.

La Versión 0 del PMA se presenta de manera parcial, lo establecido en este item.

5.2 Caracterización ambiental del área de influencia

La visita de caracterización del área de influencia directa e indirecta de cada uno de los parques de intervención se realizó el mes 1 y se incluye dentro de la versión 0 del PMA.

5.3 Descripción de las actividades del proyecto

El proyecto contempla a nivel general las actividades de estudios y diseños de cuatro (4) parques de proximidad, y la construcción de estos implicará fases de excavación, cimentación de infraestructura deportiva, contemplativa, lúdica y cultural de acuerdo con la vocación de cada uno de ellos. De acuerdo con lo anterior, se recibió la versión 0 del PMA para revisión de interventoría.

5.4 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables.

La Versión 0 del Plan de Manejo Ambiental, esta en revisión de la interventoria

5.5 Identificación de aspectos e impactos ambientales.

La Versión 0 del Plan de Manejo Ambiental, esta en revisión de la interventoria

5.6 Evaluación de impactos ambientales.

La Versión 0 del Plan de Manejo Ambiental, esta en revisión de la interventoria

5.7 Formulación de programas de manejo

La Versión 0 del Plan de Manejo Ambiental, esta en revisión de la interventoria
.

5.8 Formulación de fichas de seguimiento y manejo

La Versión 0 del Plan de Manejo Ambiental, esta en revisión de la interventoría

5.9 Costos asociados a la implementación

La Versión 0 del Plan de Manejo Ambiental, esta en revisión de la interventoría

5.10 Cronograma Ambiental

El contratista deberá incluir dentro del Plan de Manejo Ambiental un cronograma de actividades ambientales para la etapa de obra, sobre el cual se realizaría seguimiento semanal. Para el presente periodo no aplica, la Versión 0 del Plan de Manejo Ambiental, esta en revisión de la interventoria

.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO, IMÁGENES O PLANOS

Se evidencia registro fotográfico de inspección de sumideros existentes

Tabla 16. Registro fotográfico

Senderos de Castilla	Rincon de los Ángeles II etapa
	

7. CONCLUSIONES

- Para este periodo se cuenta con un esquema básico de los parques a intervenir, sobre los cuales se pudo realizar un análisis preliminar de zonas verdes, zonas duras y propuesta de implementación de SUDS.

- El contratista ha hecho entrega de los productos ambientales, de acuerdo al cronograma establecido en el apéndice Ambiental del contrato.

- Se recibió la primera versión del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y demolición -RCD y Plan de Manejo Ambiental

- A corte del presente informe, el contratista no ha entregado avances frente al plan de gestión de riesgo de desastres.

- La Interventoría continuará realizando seguimiento a la entrega de los productos por parte del contratista, para dar inicio a la etapa constructiva con el lleno de requisitos.

- Se han ejecutado comités de seguimiento semanal específicos para el área y también se participa en el comité integral.

8. ANEXOS INTERVENTORÍA

Anexo 1. Aprobación informe contratista
Anexo 2. Actas de comité
Anexo 3. Formato requerimientos ambientales
Anexo 4. Consultas entidades
Anexo 5. Avance formatos PEV
Anexo 6. Relación zonas duras y verdes
