CONSORCIO INTERHIDRAULICO 2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 5

CONTRATO D E INTERVENTORIA No 003 – 2026

OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR



Periodo: Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026

La Jagua de Ibirico – Cesar, Mayo 31 de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME ADMINISTRATIVO 9
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 9
Datos generales del CONTRATO DE OBRA N.º 003 DEL 2025 10
ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 11
REVISIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA 11
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 003-2026 13
ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
REVISIÓN DE PÓLIZA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
LISTADO DE MATERIALES DE LA OBRA 15
LISTADO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 16
CONTROL DE LOS RECURSOS DE APOYO DEL CONTRATISTA DE OBRA 17
RECURSO HUMANO 17
Equipamiento 17
Planta física 18
REGISTRO DE LAS ACTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA 18
contrato de obra 18
1.1.10.2. ACTAS RECIBO PARCIALES DE OBRA 18
1.1.10.3. ACTAS MODIFICATORIAS DEL CONTRATO DE OBRA 18
1.1.10.4. ACTA DE COMITÉ DE OBRA, ETC. 18
CONTRATO DE INTERVENTORIA 19
1.1.10.5. ACTAS DE INICIO, ACTAS DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19
1.1.10.6. ACTAS RECIBO PARCIALES DE INTERVENTORÍA 19
1.1.10.7. ACTAS MODIFICATORIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 19
CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 19
CORRESPONDENCIA ENVIADA 19
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 20
REGISTRO DE LA BITÁCORA DE OBRA 20
2. INFORME ASPECTO TÉCNICO 20

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 20
ALCANCE DE LOS TRABAJOS PARA ESTE PERIODO 20
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 23
CALIDAD DE LOS MATERIALES. 23
PRUEBAS Y ENSAYOS 23
TOPOGRAFÍA 23
Levantamiento topográfico ligado a coordenadas certificadas 23
AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 23
3. INFORME ASPECTO FINANCIERO Y/O CONTABLE 24
Estado de cuentas del contrato de obra 24
Control de pagos realizados al contrato de obra Nº 003-2025 24
3.1.1. SEGUIMIENTO AL MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA. 25
3.1.2. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA. 25
3.1.3. CURVA DE AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA. 26
estado de cuentas del contrato de interventoria 26
3.1.1. CONTROL DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 26
3.1.2. MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26
AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 27
4. INFORME DE ASPECTOS AMBIENTALES 27
Análisis de las actividades y posibles impactos ambientales durante la ejecución de las obras. 28
Fichas de manejo ambiental 28
INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA 28
INFORMACION Y comunicación A LA COMUNIDAD 28
ahorro del resurso hidrico 29
separacion de residuos en la fuente 29
SENSIBILIZACION AMBIENTAL 29
señalizacion en obra 30
Control de clima 30
UNidades sanitarias 32

5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 32
Control de personal del contratista de obra 32
personal y afiliación al sistema de seguridad social (Conforme al contrato) 32
Charlas y capacitaciones 32
Entrega y reposición de EPp 33
Accidentes de trabajo 33
Planes de emergencia 33
Seguridad industrial en obra 33
Control del personal de interventoría 33
5.2.1. AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (CONFORME AL CONTRATO) 34
5.2.2. INSPECCIONES 34
5.2.3. ACCIDENTES DE TRABAJO 34
6. INFORME ASPECTO SOCIAL 34
Socialización del proyecto 34
7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 37
De carácter administrativo: 37
De carácter técnico: 37
De carácter financiero: 37
De carácter ambiental: 37
De carácter de seguridad y salud en el trabajo: 37
De carácter social: 37

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales del contrato de obra. 10
Tabla 2. Pólizas – Contrato de Obra. 11
Tabla 3. Generalidades Contrato de interventoría. 13
Tabla 4. Pólizas – Contrato de Interventoría 15
Tabla 5. Control de materiales en la obra. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 6. Control de herramientas, maquinaria y equipos. 17

Tabla 7. Localización de bodegas de material del contratista.....18
Tabla 8. Reuniones de comité de obra. 18
Tabla 11. Avance del Contrato de obra.....23
Tabla 12. Control de pagos realizados al Contratista de obra. 24
Tabla 13. Plan de inversión de anticipo – Contrato de Obra.....25
Tabla 14. Cuadro Control Financiero– Contrato de Obra.....25
Tabla 15. Control de pagos a la interventoría.....26
Tabla 16. Plan de inversión de anticipo – Contrato de Interventoría.....27
Tabla 17. Cuadro Control Financiero Contrato de Interventoría. 27
Tabla 21. Relación de personal del Contratista de obra. 32
Tabla 22. Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 23. Indicadores de accidentalidad de la contratista.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 24. Resumen de maquinaria. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 25. Relación del personal de Interventoría. 34
Tabla 26. Indicador de Gestión. 35
Tabla 27. Quejas recibidas de la comunidad en el periodo.....35
Tabla 28. Resumen de información de gestión social en el periodo.....36

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Curva S – avance de obra.....26
Grafico 2. Avance financiero de obra.....28
Grafico 3. Control diario del clima.....35

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO No 1 – REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO No. 2 – COPIA DE LA BITACORA.

ANEXO No. 3 – SOPORTES PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

ANEXO No. 4 – CONTROL DEL CLIMA

ANEXO No 5 – ACTAS DE VECINDAD

INTRODUCCIÓN

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, a través de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP mediante proceso de selección, bajo la modalidad de invitación publica No 003, el contrato de obra N.º 003 DEL 26 DE DICIEMRBE DE 2025 con **MARBAL CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con el NIT: 900.558.098-1 y representado legalmente por LEIDYS ROCIO BARON MENDOZA, para desarrollar el siguiente objeto: "OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Por otra parte la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP adjudicó y suscribió el contrato de interventoría N.º 003 DEL 21 DE ENERO DE 2026 con **CONSORCIO INTERHIDRAULICO**, identificado con el NIT: 902.025.540-6, representado legalmente por el señor LUIS MIGUEL MARTINEZ PACHON**,** para el desarrollo del proyecto u objeto: **"**INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

El plazo inicial para desarrollar el presente contrato es de cinco (05) meses, a partir de la fecha de la firma del acta de inicio la cual se firmó por las partes el día 23 de enero de 2026.

El presente informe corresponde a las actividades de la INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, en el periodo comprendido del 01/05/2026 al 31/05/2026.

INFORME DE INTERVENTORÍA

El siguiente informe de Interventoría es elaborado por la Interventoría Externa contratada, ejercida por CONSORCIO INTERHIDRAULICO, y entregado al SUPERVISOR del mismo, ejercido por el Ingeniero designado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP, en un periodo mensual durante la ejecución de la obra. El presente contiene los aspectos: Técnicos, Administrativos, Financieros y/o Contables, Ambientales y Sociales que puedan afectar el normal desarrollo del contrato. Es así, como el siguiente informe tiene como mínimo el siguiente contenido:
Informe Administrativo, Informe Técnico, Informe Contable y/o Financiero, Informe Ambiental, Informe Social y de manera general las fechas, observaciones, conclusiones y recomendaciones.

A. Aspecto Administrativo

1. Revisión de las siguientes actas:
   - ✓ Actas de iniciación de obras.
   - ✓ Actas de vecindad
2. Revisión de cantidades de obra
3. Cantidad de obras no previstas en el contrato inicial y/o adiciones.
4. Revisión de los análisis unitarios del constructor.
5. Revisión de las garantías.
6. Revisión del proyecto.
7. Manejo de materiales, manejo de equipo, control del almacén,
8. Control de la programación,
9. Sanciones.
10. Copia de la bitácora de obra.

B. Aspecto Técnico

1. Supervisión de los diseños del proyecto
2. Revisión de Planos y especificaciones técnicas de construcción.
3. Revisión de Materiales que sean los especificados en los pliegos y su buen manejo en construcción y bodega
4. Comprobar que los equipos que se encuentren en obra sean los ofertados en la propuesta para que puedan cumplir la programación ofertada.
5. Controlar la calidad y cantidad de la Mano de obra sea la correcta para cumplir la programación.
6. Procedimientos constructivos que sean los adecuados.

7. Controlar el programa de trabajo e inversiones.
8. Informe técnico final.

C. Aspecto Contable y/o Financiero

1. Informe del manejo de las cuentas
2. Aprobación de los extractos
3. Supervisión de compras, contratos y subcontratos de obras
4. Manejo de fondos, control de flujo de fondos.
5. Control contable.
6. Revisión del presupuesto
7. Revisión del flujo de inversión de conformidad con el programa de obra.

D. Aspecto Ambiental

1. Revisión de licencia y/o plan de manejo ambiental.
2. Los controles a los residuos, ruidos, emisiones de gases y material particulado, vertimientos, y visuales.

E. Aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Personal del Contratista.
2. Personal de Interventoría.

F. Aspecto Social


1. Sociabilización del proyecto en la población asentada en el área de influencia.
2. Impacto socio-económico generado por la ejecución de la obra a la población (en las diferentes zonas, residencial, múltiple, institucional, recreacional, entre otros).
3. Manejo del tráfico peatonal y vehicular en el área de influencia de la obra.
4. Previo aviso de la suspensión de los servicios públicos domiciliarios a la población en el área de influencia.
5. Los efectos generados a la salud en la población en el desarrollo de la obra
6. Impacto en el estilo de vida de la comunidad,
7. Obstaculización de la movilidad vehicular y peatonal, afectación de la salud de la comunidad.

G. Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones

1. INFORME ADMINISTRATIVO

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Municipio El proyecto se realizará en el casco urbano del Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar, específicamente en los barrios Pedro Castro, San José, 11 de noviembre y Boqueron.

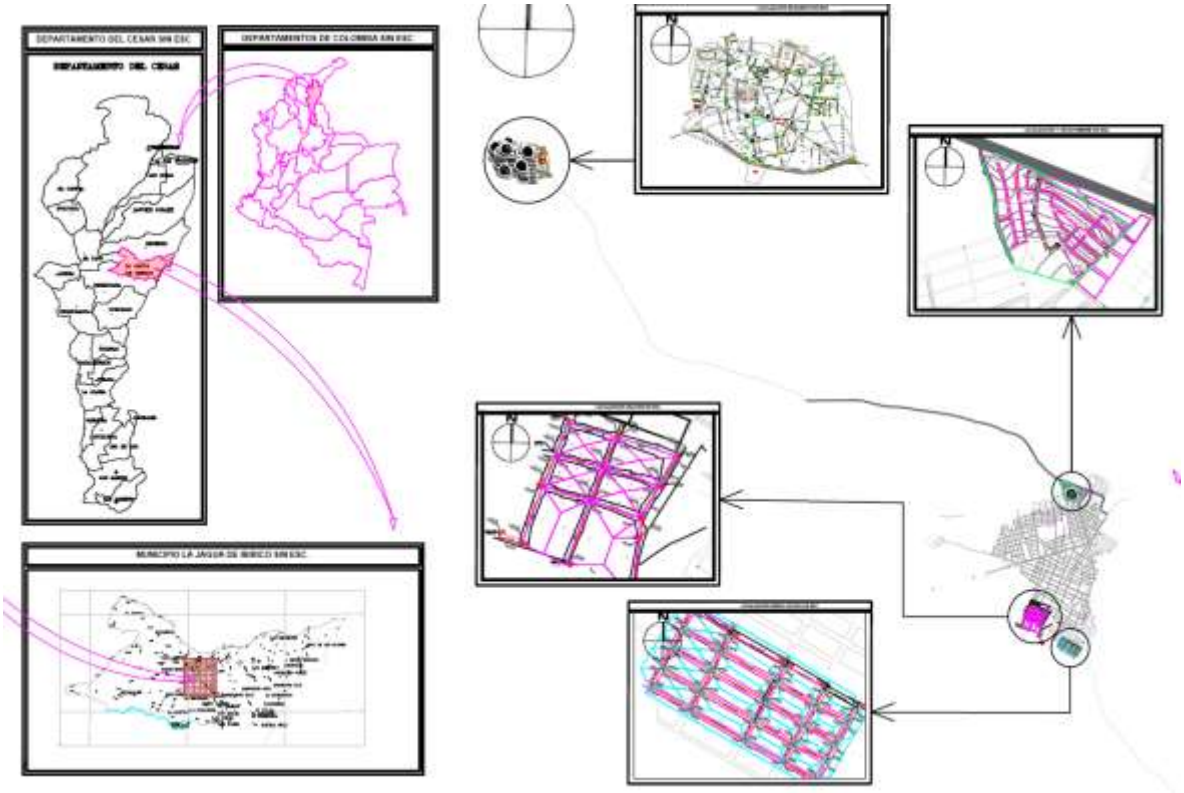

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA N.º 003 DEL 2025

Tabla 1. Datos generales del contrato de obra.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO DE OBRA	
Entidad Contratante:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP
Interventor:	CONSORCIO INTERHIDRAULICO
Supervisor:	JEISON ANDRES RINCÓN MORA
Objeto del Contrato:	OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contrato No:	003 – 2025
Contratista de la obra:	MARBAL CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 900558098-1
Representante Legal:	LEIDYS ROCIO BARON MENDOZA
Valor del Contrato:	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($7.463.342.076) MCTE
Valor del Anticipo:	$3.731.671.038,00
Fecha de terminación inicial:	VEINTITRÉS (23) DE JUNIO DEL 2026
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	NO APLICA
Valor del Contrato + Adicional:	NO APLICA
Adición valor del anticipo:	NO APLICA
Plazo de ejecución inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de inicio:	VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE 2026
Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	
Total días transcurridos de suspensión (1,2,3 para cada caso):	
Fecha de Prórroga:	
Adición plazo:	
Plazo de ejecución modificado:	
Fecha de terminación actualizada:	
Fecha de Corte del Informe:	31 DE MAYO DE 2026
Días Transcurridos:	128 días

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	
Acta parcial 2	
Acta parcial 3	
Acumulado	
Anticipo (50%)	$3.731.671.038,00
Anticipo	
Anticipo desembolsado:	$3.731.671.038,00
Fecha de desembolso	
Amortización Acta parcial 1	
Amortización Acta parcial 2	
Amortización Acta parcial 3	
Pendiente por amortizar	

Fuente: Elaboración propia a partir de información contractual del proyecto,

ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP en cumplimiento del objeto contractual del Contrato No. 003 del 2025, adelantó el proceso de selección, de acuerdo con el Manual de Contratación, con el fin de contratar al ejecutor de las actividades para el proyecto denominado "OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

REVISIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2. Pólizas – Contrato de Obra.

POLIZA CONTRATO DE OBRA					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033621	26/12/2025	26/08/2026	$ 1.492.668.415,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033621	26/12/2025	26/08/2026	$ 3.731.671.038,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033621	26/12/2025	26/05/2029	$ 746.334.207,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033621	26/05/2026	26/05/2031	$ 2.239.002.622,80
PREDIOS LABORES Y OPERACIONE	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-40-101010690	26/12/2025	26/08/2026	$ 2.239.002.622,80
POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033621	23/01/2026	23/09/2026	$ 1.492.668.415,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033621	23/01/2026	23/09/2026	$ 3.731.671.038,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033621	23/01/2026	23/06/2029	$ 746.334.207,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033621	23/06/2026	23/06/2031	$ 2.239.002.622,80
PREDIOS LABORES Y OPERACIONE	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-40-101010690	23/01/2026	23/09/2026	$ 2.239.002.622,80
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS					
NOTA:		El amparo por ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.			

Fuente: Elaboración propia a partir de información contractual del proyecto,

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 003-2026

Tabla 3. Generalidades Contrato de interventoría.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP
Supervisión:	JEISON ANDRES RINCÓN MORA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contrato No:	003 – 2025
Contratista de la obra:	CONSORCIO INTERHIDRAULICO
Representante Legal:	LUIS MIGUEL MARTINEZ PACHON
Valor del Contrato:	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($522.451.804) M/CTE.
Valor del Anticipo:	$104.490360,80
Fecha de terminación inicial:	VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE 2026
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	
Valor del Contrato + Adicional:	
Adición valor del anticipo:	
Plazo de ejecución inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de inicio:	VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE 2026
Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	
Total días transcurridos de suspensión (1,2,3 para cada caso):	
Fecha de Prorroga:	
Adición plazo:	
Plazo de ejecución modificado:	
Fecha de terminación actualizada:	
Fecha de Corte del Informe:	31 DE MAYO DE 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Días Transcurridos:	128 días
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	$
Acta parcial 2	$
Acta parcial 3	$
Acta parcial 4	$
Acta parcial 5	
Acumulado	$
Anticipo	
Anticipo desembolsado:	$104.490360,80
Fecha de desembolso	
Amortización Acta parcial 1	$
Amortización Acta parcial 2	$
Amortización Acta parcial 3	$
Amortización Acta parcial 4	$
Pendiente por amortizar	$

Fuente: Elaboración propia a partir de información contractual del proyecto.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP, en cumplimiento del objeto contractual del Contrato No. 003 del 2026 adelantó el proceso de selección, de acuerdo con el Manual de Contratación, con el fin de contratar al ejecutor de interventoría, para el proyecto denominado INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Como resultado del proceso y previa presentación al Comité de Contratación, se recomendó la aceptación a CONSORCIO INTERHIDRAULICO que, mediante documento de aceptación de la invitación a cotizar, se seleccionó al proponente CONSORCIO INTERHIDRAULICO para el desarrollo del proyecto INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

REVISIÓN DE PÓLIZA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 4. Pólizas – Contrato de Interventoría.

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033841	21/01/2026	21/10/2026	$ 104.490.360,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033841	21/01/2026	21/10/2026	$ 104.490.360,80
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033841	21/06/2026	21/06/2031	$ 156.735.541,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033841	21/01/2026	21/06/2029	$ 52.245.180,40
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS					
POLIZA ACTA DE INICO					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033841	23/01/2026	23/10/2026	$ 104.490.360,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033841	23/01/2026	23/10/2026	$ 104.490.360,80
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033841	23/06/2026	23/06/2031	$ 156.735.541,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO SA	47-44-101033841	23/01/2026	23/06/2029	$ 52.245.180,40
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS					

Fuente: Elaboración propia a partir de información contractual del proyecto,

LISTADO DE MATERIALES DE LA OBRA

Para este periodo las obras realizadas corresponden a: excavación mecánica, cargue mecánico, retiro de sobrantes; conformación, construcción manholes, construcción caja de registro, instalación de tubería, para las cuales el contratista cuenta con disponibilidad de materiales en su almacén -campamento para la ejecución de las actividades constructivas del proyecto como se relacionan a continuación y se evidencian en registro fotográfico anexo.

Tabla 5. Control de materiales en la obra.

CONTROL DE MATERIALES DE LA OBRA				
ALMACEN E INVENTARIO	FECHA DE CORTE:	31 DE MAYO DE 2026		
	HOJA	1	DE	1
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES		
MATERIAL DE CANTERA - TRITURADO	CENTRO DE ACOPIO			
MATERIAL DE CANTERA - ARENA	CENTRO DE ACOPIO			
CEMENTO (BULTOS POR 50 KG)	CENTRO DE ACOPIO			
ACERO DE ½"	CENTRO DE ACOPIO			
TUBERIA CORRUGADA SANITARIA 6"	CENTRO DE ACOPIO			
TUBERIA CORRUGADA SANITARIA 8"	CENTRO DE ACOPIO			
SILLA YEE 8"X6"	CENTRO DE ACOPIO			
TUBERIA PVC 3"	CENTRO DE ACOPIO			
HIDRANTES	CENTRO DE ACOPIO			
ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC	CENTRO DE ACOPIO			

Fuente: Elaboración propia a partir de información del proyecto

LISTADO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para este periodo en la obra se utilizaron herramientas menores como palas, picos, barras, porras y machetes; así como maquinaria y equipos tales como retroexcavadora, minicargador, mezcladora, y equipo de topografía (nivel de precisión), entre otros.

Tabla 6. Control de herramientas, maquinaria y equipos.

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			FECHA DE CORTE:	31 DE MAYO DE 2026
DESCRIPCIÓN	**CANT.**	**PLACA**	**MARCA/MODELO**	**TIEMPO EN OBRA (DIAS)**
MAQUINARIA/EQUIPO				
Mezcladora	4			
Retroexcavadora	3			
Minicargador	1			
Canguro	1			
Rana	1			
Motobomba	2			
Rotomartillo	3			
Nivel topografico	2			
Planta electrica	2			
Motocarro	3			

CONTROL DE LOS RECURSOS DE APOYO DEL CONTRATISTA DE OBRA.
RECURSO HUMANO

El contratista de obra cuenta dentro de su personal técnico con Ingenieros, Auxiliares, Topógrafo; Laboratoristas con buena experiencia y alto conocimiento en el trabajo que nos compete; durante el periodo se vinculó personal obrero al proyecto, el cual cuenta con afiliación al sistema de seguridad.

EQUIPAMIENTO

La empresa encargada de la obra cuenta con el equipamiento básico necesario para el desarrollo de las actividades, disponiendo de los equipos, instrumentos y herramientas mínimas requeridas para apoyar al recurso humano en la ejecución de sus labores. Entre estos se destacan maquinaria amarilla como retrocargador, minicargador, volquetas para el transporte de materiales y equipos de topografía, entre ellos el nivel de precisión. Asimismo, la empresa dispone de personal externo especializado encargado de realizar los diferentes laboratorios, pruebas y ensayos, con el fin de garantizar la calidad de las actividades ejecutadas en la obra.

PLANTA FÍSICA

El contratista cuenta con una oficina principal oficina y punto de atención a la comunidad y recepción de PQRs ubicada en carrera 2 # 9-39 barrio Camilo Torres, el cual a su vez funciona como campamento o centro de acopio, lugar donde almacenan todo el material requerido para la obra. En registro fotográfico anexo se puede apreciar dicho campamento – oficina.

Tabla 7. Localización de bodegas de material del contratista.

LUGAR	DIRECCIÓN
Oficina principal	Carrera 2 # 9-39 barrio Camilo Torres

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria de obra,

REGISTRO DE LAS ACTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA

1.1.10.1. Acta de inicio, actas de suspensiones y reinicios del contrato de obra.

Hasta el momento solo se ha suscrito el acta de inicio del contrato de obra,

1.1.10.2. Actas recibo parciales de obra

A fecha de corte de este informe no se presenta acta de recibo parcial de obra.

1.1.10.3. Actas modificatorias del contrato de obra

Durante la ejecución del contrato de obra no se han realizado cambios y/o modificativas.

1.1.10.4. Acta de comité de obra, etc.

Se realizó comité de obra según se relaciona en la siguiente tabla y se anexa en el presente informe acta de reunión de dicho comité.

Tabla 8. Reuniones de comité de obra.

REUNIONES DE COMITÉ DE OBRA		
ACTA DE COMITÉ No.	FECHA	OBJETO DE LA REUNION
1	23/01/2026	Acta de inicio

2	17/02/2026	Socializar y evaluar los rediseños y replanteos técnicos requeridos, en atención a las condiciones identificadas en campo

CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1.10.5. Actas de inicio, actas de suspensiones y reinicios del contrato de interventoría

Hasta el momento solo se ha suscrito el acta de inicio del contrato de interventoría,

1.1.10.6. Actas recibo parciales de interventoría

Hasta el momento de corte del presente informe la interventoría no ha presentado actas parciales de cobro.

1.1.10.7. Actas modificatorias del contrato de interventoría.

Durante la ejecución del contrato de interventoría no se han realizado cambios y/o modificativas.

CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN

El contratista de obra presento la programación ajustada al ACTA DE INICO del contrato de obra.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Dentro de los archivos anexos del presente informe se presentan los oficios remitidos por la interventoría.

Tabla 9. Correspondencia enviada.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
No. DE OFICIO	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
OF CIH 202605 - 04	15/05/2026	Requerimiento por retraso en el cronograma de ejecucion – instalación de tubería alcantarillado sanitario Barrio 11 de noviembre y obras complementarias.	INTERVENTORIA
	25/05/2026	Respuesta a solicitud de programación de entrega de obra – Corregimiento de Boquerón.	INTERVENTORIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Dentro de los archivos anexos del presente informe se presentan impresión de las comunicaciones recibidas vía correo electrónico que fueron remitidas por el contratista en respuesta a las solicitudes por oficio hechas por la interventoría.

Tabla 10. Correspondencia recibida.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
No. DE OFICIO	**FECHA**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
	20/05/2026	Respuesta a requerimiento por retraso en cronograma de ejecución – Barrio 11 de noviembre.	CONTRATISTA DE OBRA
	21/05/2025	Solicitud de programación de entrega de obra – Corregimiento de Boquerón	CONTRATISTA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITÁCORA DE OBRA

Las copias de la bitácora se pueden observar en los anexos del presente informe.

2. INFORME ASPECTO TÉCNICO

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Durante el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026, la firma contratista MARBAL CONSTRUCCIONES SAS, en el desarrollo de la ejecución del contrato de las actividades hasta la fecha intervenida, le ha dado cumplimiento a los procesos y procedimientos constructivos de las especificaciones técnicas correspondientes.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS PARA ESTE PERIODO

Para el presente periodo se han desarrollado por parte del contratista las actividades relacionadas a continuación, las cuales a su vez están evidenciadas en el registro fotográfico anexo al presente informe

Se finaliza el proceso de elaboración y recepción de las actas de vecindad correspondientes, mediante inspección detallada de las edificaciones y predios colindantes al área de influencia del proyecto, dejando registro del estado actual de fachadas, estructuras, andenes y demás elementos susceptibles de afectación.

Se efectuó la revisión detallada de los diseños y carteras topográficas, verificando coherencia entre planos, coordenadas, cotas y referencias geodésicas, así como la correspondencia con las condiciones reales del terreno, con el fin de asegurar la correcta implementación de la información técnica durante la etapa constructiva.

BARRIO PEDRO CASTRO

- PRELIMINARES
    - Excavación a máquina en zanja material común y/o conglomerado.
    - Retiro de material sobrante de la excavación y escombros - incluye cargue, transporte

- RELLENOS
    - Relleno seleccionado. incluye suministro y compactación.
    - Relleno con material producto de la excavación.
    - Bombeo aguas servidas producto del cambio de tubería existente con motobomba ø=3".

- ESTRUCTURA SOPORTE TUBERIA
    - Cimentación de la tubería. incluye: suministro y compactación del material para la nivelación del fondo de la zanja, además de equipos, herramientas menores y mano de obra.

- INSTALACION DE TUBERIA
    - Instalación de tubería corrugada sanitaria 8" - 200mm
    - Construcción de pozo de inspección de 1,80 m de diámetro externo, muros de 0,15 m de altura promedio 3,00 mt-concreto clase II.
    - Empalme de tubería de alcantarillado a pozos existentes, incluye abertura de paredes y pozo, retiro de material

- ACOMETIDAS Y CAJAS DE INSPECCION
    - Suministro e instalación de kit silla yee de 8"x6" (200x160mm)
    - Caja de inspección de 60x60x60cm, en concreto, incluye excavación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

BARRIO SAN JOSE

- SUMINISTRO DE TUBERIAS

- Suministro de tubería corrugada sanitaria 8" - 200mm

CORREGIMIENTO BOQUERON

- PRELIMINARES
  - Excavación manual para instalación de tubería pvc acueducto.
  - Relleno seleccionado. incluye suministro e instalación.
  - Cama de arena para apoyo de tubería.

- INSTALACION DE TUBERIA
  - Instalación de tubería de presión de pvc diámetro 3".
  - Suministro e instalación de conexión domiciliaria de 3"x1/2". incluye excavación manual y relleno de zanja con compactación.
  - Suministro e instalación de tee hd 3"
  - Suministro e instalación de válvula 3"
  - Suministro e instalación de hidrante diámetro 3". incluye kit de nivelación y válvula de cierre de 3".
  - Construcción de caja para válvula
  - Retiro y limpieza de sobrantes

BARRIO 11 DE NOVIEMBRE

- PRELIMINARES
  - Excavación a máquina en zanja material común y/o conglomerado.
  - Retiro de material sobrante de la excavación y escombros - incluye cargue, transporte
  - Entibado continuo en madera

- INSTALACION DE TUBERIA
  - Instalación de tubería corrugada sanitaria 8" - 200mm
  - Construcción de pozo de inspección de 1,80 m de diámetro externo, muros de 0,15 m de altura promedio 3,00 mt-concreto clase II.
  - Empalme de tubería de alcantarillado a pozos existentes, incluye abertura de paredes y pozo, retiro de material

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

- PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo, la Interventoría realizó seguimiento al contrato principal en los aspectos administrativo, técnico, financiero, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, con todo su equipo interdisciplinario de profesionales, técnicos, auxiliares de apoyo y personal administrativo, cumpliendo las cláusulas del contrato.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.

En este periodo de ejecución de la obra, se evidencio por parte del contratista la calidad de los materiales utilizados, se entregaron como soportes los diferentes certificados de materiales correspondientes.

PRUEBAS Y ENSAYOS

A la fecha de corte de este informe el contratista realizó los ensayos y laboratorios en las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución de la obra.

TOPOGRAFÍA
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LIGADO A COORDENADAS CERTIFICADAS

El contratista, con acompañamiento de la interventoría, realizó el replanteo topográfico de las áreas correspondientes a la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado. En obra se cuenta con equipos de precisión para el control permanente de niveles y alineamientos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante las actividades de excavación, trazado e instalación de redes.


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 11. Avance del Contrato de obra.

AVANCE PROGRAMADO EN EL PERIODO: (Hasta el 31 de mayo de 2026)	**45,14%**
AVANCE EJECUTADO EN EL PERESENTE PERIODO:	**21,44%**
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO:	**70,65%**
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	**41,80%**
% DE ADELANTO O ATRASO PRESENTADO ACUMULADO (Periodo 5):	**- 28,85%**

Fuente: Elaboración propia a partir de información contractual del proyecto,

Gráfico 1. Curva Programación Vs Avance de obra.

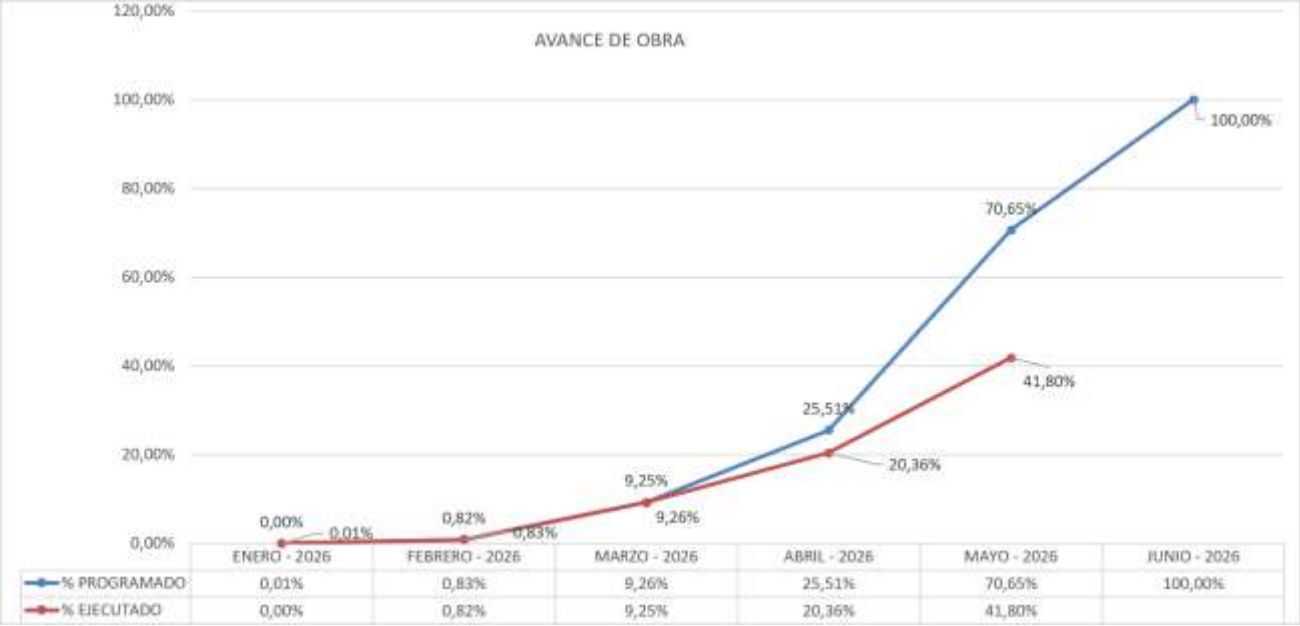

Para el presente periodo cuando han transcurrido 128 días de ejecución de la obra que corresponde al 85,33% del plazo del contrato, se han ejecutado actividades por valor de $ 3.119.998.483,37 lo que corresponde al 41,80 % de avance acumulado respecto a un 70,65% de avance programado de acuerdo con la reprogramación ajustada presentada por el contratista, reflejándose de esta manera una diferencia de 28,85% de atraso en la ejecución de las obras respecto a lo programado.

3. INFORME ASPECTO FINANCIERO Y/O CONTABLE

ESTADO DE CUENTAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTROL DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA N° 003-2025

Tabla 12. Control de pagos realizados al Contratista de obra.

CONTRATO DE OBRA No 003-2025	
VALOR CONTRATO DE OBRA	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($7.463.342.076) MCTE
VALOR ANTICIPO 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	**$ 3.731.671.038,00**
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA Nº 001	(A la fecha no se han presentado actas parciales de cobro)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA 001- (50%)	

VALOR ACUMULADO PAGADO Y EJECUTADO	
VALOR POR EJECUTAR Y CANCELAR	$

Fuente: Elaboración propia a partir de información contractual del proyecto,

3.1.1. SEGUIMIENTO AL MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA.

En cumplimiento de lo establecido en el contrato el EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP desembolso al contratista de obra MARBAL CONSTRUCCIONES SAS por concepto de anticipo un monto de $ 3.731.671.038,00 que corresponde al 50 % del valor total del contrato de obra.

A continuación, se presenta el plan de inversión de anticipo entregado por el contratista y aprobado por la interventoría y supervisión del contrato

Tabla 13. Plan de inversión de anticipo – Contrato de Obra.

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN / DETALLE**	**CANTIDAD A EJECUTAR CON ANTICIPO**	**VALOR A EJECUTAR CON ANTICIPO**
1	PAGO MANO DE OBRA	35,00%	$1.306.084.863,30
2	PAGO DE MATERIALES	45,00%	$1.679.251.967,10
3	PAGO MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,00%	$746.334.207,60
	COSTO TOTAL	**100%**	**$ 3.731.671.038,00**

3.1.2. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

Tabla 14. Cuadro Control Financiero– Contrato de Obra.

FINANCIERO OBRA 003 DE 2025						
VR. DEL CONTRATO		**$7.463.342.076**	**VR. ANTICIPO**		**$7.463.342.076**	
ACTA PARCIAL Nº	**% EJECUCION**	**EGRESO Nº**	**FECHA**	**VALOR ACTA PAGO MENSUAL**	**AMORTIZACIÓN**	**VALOR NETO**
1						
2						
TOTALES						

A fecha de corte del presente informe no se ha presentado facturación por parte del contratista

3.1.3. CURVA DE AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

Gráfico 2. Avance financiero de obra



ESTADO DE CUENTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1.1. CONTROL DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 15. Control de pagos a la interventoría.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 003-2026	
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($522.451.804) M/CTE.
VALOR ANTICIPO DE INTERVENTORÍA (20%)	$104.490360,80
ACTA 01 DE INTERVENTORÍA	(A la fecha no se han presentado actas parciales de cobro)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA 01 – (20%)	N.A
VALOR ACUMULADO PAGADO Y EJECUTADO	N.A.
VALOR POR EJECUTAR Y CANCELAR	N.A.

Fuente: Elaboración propia a partir de información contractual del proyecto,

3.1.2. MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En cumplimiento de lo establecido en el contrato el EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP desembolso al contratista interventor CONSORCIO INTERHIDRAULICO por

concepto de anticipo un monto de $ 104.490.360,80 que corresponde al 20 % del valor total del contrato, como lo estipula la CLAUSULA: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, del contrato, que expresa "EL CONTRATANTE"

A continuación, se presenta el plan de inversión de anticipo entregado del contratista de interventoría y aprobado por la supervisión del contrato

Tabla 16. Plan de inversión de anticipo – Contrato de Interventoría.

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN / DETALLE**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR POR MES**	**VALOR TOTAL**	**%**
1	PAGO DE HONORARIOS Y SALARIOS A PROFESIONALES	5	$ 15.673.554,12	$ 78.367.770,60	15 %
2	ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS PÚBLICOS	5	$ 2.089.807,22	$ 10.449.036,08	2 %
3	TRANSPORTE Y EQUIPOS	5	$ 2.089.807,22	$ 10.449.036,08	2 %
4	PAPELERÍA		$ 1.044.903,61	$ 5.224.518,04	1 %
	COSTO TOTAL			**$ 104.490.360,80**	**20%**

AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 17. Cuadro Control Financiero Contrato de Interventoría.

FINANCIERO INTERVENTORIA 003 – 2026						
VALOR DEL CONTRATO:		**$ 522.451.804,00**		**VR. DEL ANTICIPO 20%:**	**$104.490.360.80**	
ACTA Nº	**% EJECUCION**	**EGRESO Nº**	**FECHA**	**VALOR ACTA PAGO MENSUAL**	**AMORTIZACIÓN**	**VALOR NETO**
1						
TOTALES						

A fecha de corte del presente informe no se ha presentado facturación por parte del contratista

4. INFORME DE ASPECTOS AMBIENTALES

El contratista presenta un Plan De Manejo Ambiental - PMA para minimizar los posibles impactos que pueda generar las obras en la zona de influencia del proyecto.

El Plan De Manejo Ambiental - PMA presentados por el contratista, consignan las medidas de control, prevención, mitigación, y compensación para los posibles efectos ambientales que pueda generar la obra de **"OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**.

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES Y POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

A continuación, se presenta la matriz de impactos, donde se describen las actividades del proyecto y su calificación en base a los factores afectados.

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

De acuerdo a las medidas de manejo estipuladas en la ficha ambiental del Plan De Manejo Ambiental - PMA de las obras objeto de interventoría, se presenta a continuación el cumplimiento de cada medida.

INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA

Con el propósito de informar a la comunidad sobre los alcances, objetivos, entidades responsables, fuentes de financiación y cronograma de ejecución, se llevó a cabo la instalación de la valla informativa del proyecto al inicio de la obra, actividad ejecutada por el contratista.

La valla fue ubicada en un lugar visible y estratégico, utilizando estructuras debidamente ancladas en concreto para garantizar su estabilidad y seguridad.

Esta acción da cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental en materia de socialización del proyecto, promoviendo la transparencia con la comunidad y previniendo el desconocimiento de la intervención, así como la posible generación de impactos visuales negativos.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD

En el marco del programa de información y comunicación a la comunidad, se implementaron acciones encaminadas a establecer canales permanentes de diálogo con las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto.

Se llevó a cabo la socialización general de la obra, contando con la participación del alcalde municipal, representantes de entidades gubernamentales, presidentes de juntas de acción comunal y miembros de la comunidad, con el fin de presentar los objetivos, alcances y beneficios del proyecto.

De manera complementaria, se instaló una valla informativa en un lugar visible y estratégico, asegurando la adecuada divulgación de la información y fomentando la participación ciudadana durante el desarrollo de las actividades constructivas.

AHORRO DEL RESURSO HIDRICO

Con el propósito de promover el uso responsable del recurso hídrico durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se implementaron acciones orientadas al ahorro y uso eficiente del agua por parte del personal vinculado a la obra. Estas medidas buscaron reducir el consumo innecesario y fomentar prácticas adecuadas en el manejo de este recurso natural.

Durante la ejecución de las labores, se brindaron recomendaciones al personal sobre el uso racional del agua en actividades cotidianas, evitando el desperdicio y promoviendo el cierre adecuado de llaves y puntos de abastecimiento cuando no se encontraban en uso. Asimismo, se verificó el buen estado de las conexiones y elementos utilizados para el suministro de agua, con el fin de prevenir fugas o pérdidas.

SEPARACION DE RESIDUOS EN LA FUENTE

Con el propósito de promover una adecuada gestión de los residuos generados durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se implementó la separación de residuos en la fuente, con el fin de facilitar su correcta clasificación, almacenamiento y disposición final. Esta medida busca minimizar los impactos ambientales asociados a la inadecuada disposición de residuos sólidos.

Se dispusieron recipientes debidamente identificados para la clasificación de los diferentes tipos de residuos, tales como residuos ordinarios, reciclables y otros residuos generados en las actividades propias del proyecto.

SENSIBILIZACION AMBIENTAL

Con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental entre el personal vinculado al proyecto, se llevaron a cabo actividades de sensibilización ambiental orientadas a promover buenas prácticas en el manejo de los recursos naturales y en el desarrollo responsable de las actividades de obra.

Durante estas jornadas se brindó información al personal sobre la importancia de la protección del medio ambiente, abordando temas relacionados con el uso eficiente de los recursos, la adecuada gestión de residuos y la prevención de posibles impactos ambientales derivados de las actividades del proyecto. Estas acciones se realizaron mediante charlas informativas y recomendaciones dirigidas al personal presente en el área de trabajo.

CAPACITACIONES AMBIENTALES	
FECHA	**TEMA**
07/05/2026	Manejo de aguas residuales en obra
12/05/2026	Control del polvo durante excavaciones
22/05/2026	Uso eficiente del agua en limpieza y obra
27/05/2026	Protección de zonas verdes cercanas
29/05/2026	Control de sedimentos y lodos

SEÑALIZACION EN OBRA

Con el propósito de garantizar la seguridad del personal y de la comunidad durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se realizó la instalación de la señalización de obra en las áreas intervenidas. Esta medida busca advertir sobre la presencia de trabajos en ejecución y orientar adecuadamente el tránsito de personas y vehículos en el sector.

La señalización fue ubicada en puntos estratégicos del área de trabajo, empleando elementos visibles y adecuados para informar sobre las condiciones de la obra, las restricciones de acceso y las precauciones que deben tenerse en cuenta durante el desarrollo de las actividades constructivas. De esta manera, se facilita la identificación del área intervenida y se promueve el cumplimiento de las normas de seguridad.


CONTROL DE CLIMA

Durante el periodo evaluado, las condiciones climáticas se caracterizaron por una marcada predominancia de tiempo seco y estable, evidenciada durante la mayor parte de los días y horas registradas. De manera puntual se presentaron episodios de nubosidad, llovizna y lluvia de diferente intensidad, concentrados principalmente durante los últimos días del mes. Estos eventos fueron de corta duración y se registraron especialmente en horas de la madrugada, la mañana y algunas franjas nocturnas.

Las precipitaciones observadas incluyeron periodos de llovizna y lluvias fuertes, seguidas por condiciones de nubosidad temporal y posterior retorno a tiempo seco. En términos generales, las condiciones meteorológicas fueron favorables para el desarrollo de las actividades programadas, sin evidenciarse afectaciones significativas ni suspensiones prolongadas de los trabajos. No obstante, durante los episodios de precipitación se implementaron las medidas preventivas y de seguridad correspondientes para garantizar la continuidad operativa del proyecto.

A continuación, se presenta el control diario de lluvias.

Gráfico 3. Control diario del clima

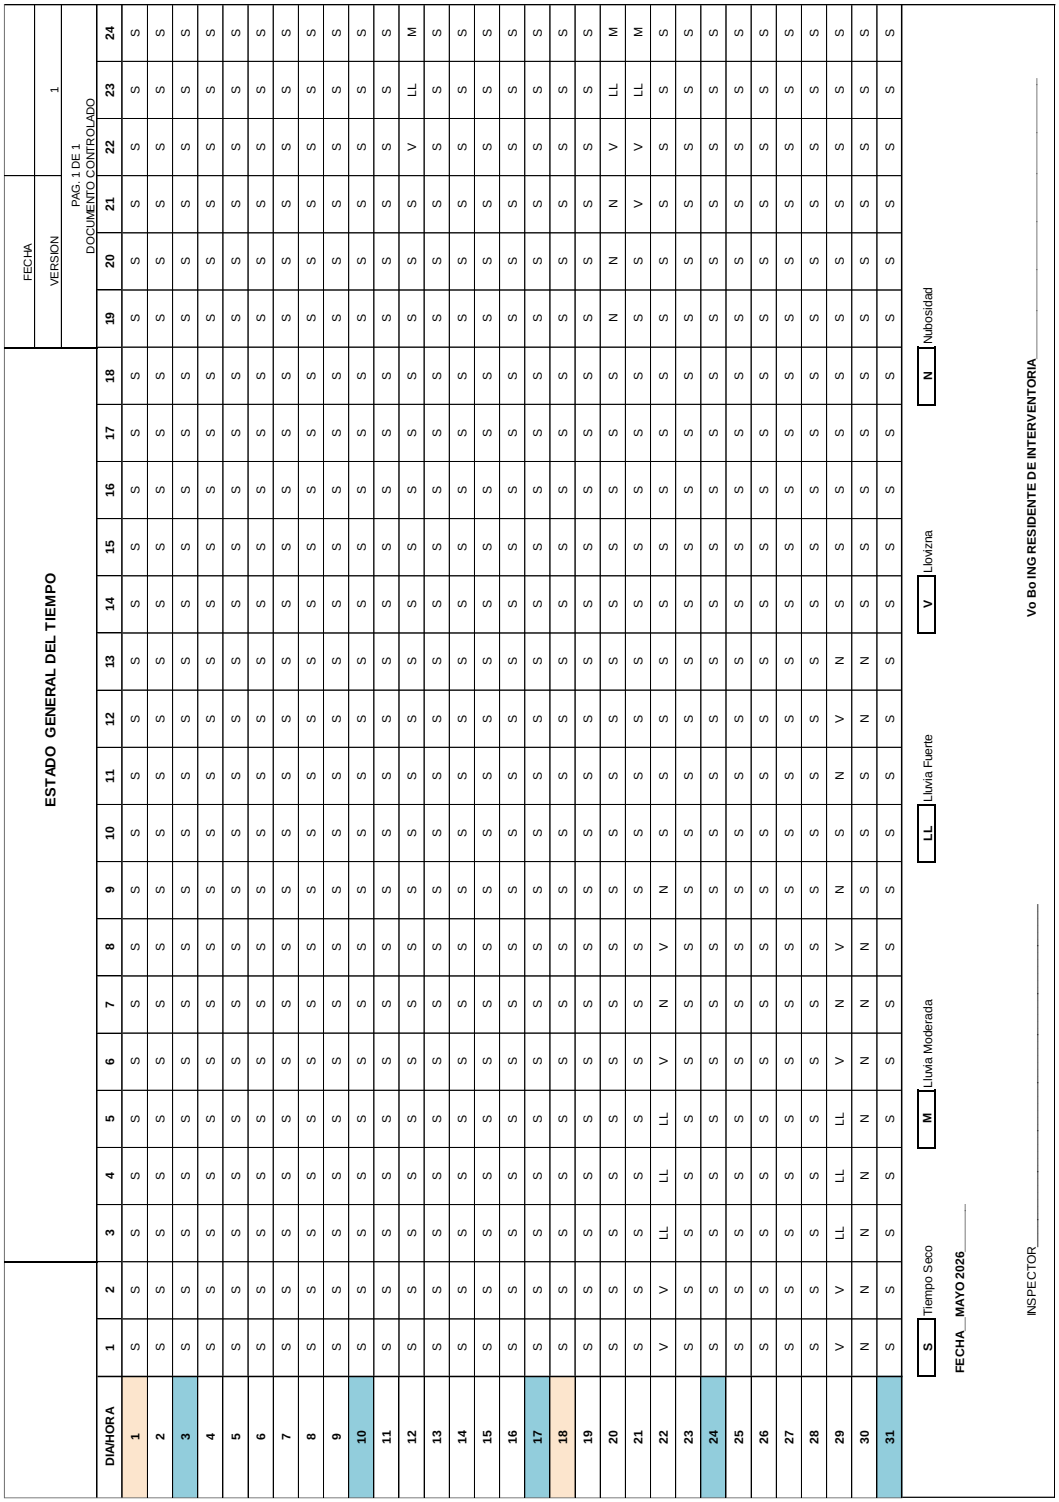

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria de obra,

UNIDADES SANITARIAS

El uso del baño en el presente informe se manejó a través de alquiler de baños de las viviendas del sector o calles en intervención pertenecientes a la misma comunidad (casa residencial), para suplir las necesidades del personal operativo,

5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Para este tercer periodo de ejecución de obra, el contratista cuenta con comisión topográfica, ingeniero residente, ingeniero ambiental, auxiliar en seguridad, residente social. A continuación, se relaciona el resumen del personal vinculado por la Contratista para el desarrollo de la obra.

Tabla 18. Relación de personal del Contratista de obra.

PERSONAL TÉCNICO MINIMO PROPUESTO EN LA OFERTA TECNICA			
NOMBRE	CARGO	CORRESPONDE AL DE LA PROPUESTA	FUE CAMBIADO
ANDRES ALFONSO FERNANDEZ SOTO	DIRECTOR DE OBRA	SI	NO
LUIS MIGUEL ARIZA MOLINA	RESIDENTE DE OBRA	SI	NO
JENIFFER ROMERO	INGENIERO AMBIENTAL	SI	NO
ELIANA MARCELA SOCARRAS MACHADO	RESIDENTE SOCIAL	SI	NO
CESAR ANDRES ROMERO ARENAS	TOPOGRAFO	SI	NO
JULIETH PAOLA CORDERO FLOREZ	PROFESIONAL SISO	SI	NO

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria de obra,

PERSONAL Y AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (CONFORME AL CONTRATO)

El contratista presenta los soportes de afiliación y aportes al sistema de seguridad social de todo el personal que labora en la obra.

CHARLAS Y CAPACITACIONES

El contratista desarrolló charlas técnicas en obra de 5 minutos abarcando la siguiente temática:

Tabla 19. Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

FECHA	TEMA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES
04/05/2026	Seguridad en instalación de tubería
09/05/2026	Riesgo por derrumbe de zanjas
15/05/2026	Ingreso seguro a pozos de inspección
19/05/2026	Riesgos por aguas residuales
20/05/2026	Manejo seguro de motobombas y equipos de achique
23/05/2026	Atropellamiento por maquinaria en zanja
25/05/2026	Uso Seguro de compactadores
30/05/2026	Exposición al sol y altas temperaturas

Fuente: Elaboración propia a partir de información del informe mensual de la contratista,

ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPP

La entrega y de elementos de protección individual la realizó el personal en seguridad y salud en el trabajo del contratista, a cada empleado en el frente de la obra de trabajo.

ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el período del presente informe no se presentó accidente laboral en el frente de obra trabajado.

PLANES DE EMERGENCIA

El contratista ha presentado y socializado el plan de emergencia requerido, con el fin de preparar al personal para actuar correctamente ante accidentes.

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRA

El contratista informa que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017 la cual establece los estándares mínimos del SG-SST, se encuentra desarrollado.

CONTROL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

A continuación, se hace una relación del personal de la interventoría

Tabla 20. Relación del personal de Interventoría.

PERSONAL TÉCNICO MINIMO EXIGIDO EN LA PROPUESTA			
NOMBRE	**CARGO**	**CORRESPONDE AL DE LA PROPUESTA**	**FUE REEMPLAZADO**
MARIA CONCEPCION FERNANDEZ LIMA	DIRECTOR DE OBRA	**SI**	**NO**
WILLIAM JAVIER VANEGAS BARROS	INGENIERO RESIDENTE	**SI**	**NO**
IVAN DAVID CORZO CARRILLO	INSPECTOR DE OBRA	**SI**	**NO**
YERZON ENEL TRESPALACIOS FAJARDO	RESIDENTE AMBIENTAL	**SI**	**NO**
ANA MARIA PABON AYALA	TRABAJADOR SOCIAL	**SI**	**NO**

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria de obra,

5.1.1. Afiliación y aportes al sistema de seguridad social (conforme al contrato)

Anexo al presente informe se presentan los soportes de pago al sistema de seguridad social del personal de interventoría.

5.1.2. Inspecciones

Durante el periodo del presente informe, la interventoría realizó inspección al frente de obra activo. Se revisó el estado de los extintores, botiquín, estado del almacén, señalización de obra.

5.1.3. Accidentes de trabajo

No se presentaron accidentes laborales durante el período del presente informe,

6. INFORME ASPECTO SOCIAL

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

El día 23 de enero de 2026 se llevó a cabo la socialización del proyecto, con la participación de representantes del contratista de obra, la interventoría, entidad contratante, líderes comunitarios y miembros de la comunidad en general. Con esta actividad se dio cumplimiento a la primera etapa del proyecto.

Se finaliza el proceso de levantamiento de actas de vecindad, con el propósito de registrar de manera detallada el estado inicial de las edificaciones, predios y espacios ubicados en el área de influencia del proyecto. Esta actividad se desarrolla con el fin de prevenir posibles conflictos, garantizar la transparencia del proceso y establecer responsabilidades ante eventuales afectaciones.

Con el propósito de fortalecer la comunicación con la comunidad y garantizar el adecuado acompañamiento al personal vinculado al proyecto, el profesional del área social y el especialista en salud ocupacional realizaron recorridos periódicos en el área de intervención. Estas actividades permitieron mantener un contacto directo tanto con los trabajadores como con los habitantes del sector, facilitando espacios de diálogo, orientación e interacción.
Durante estos recorridos se brindó información relacionada con el desarrollo de las actividades del proyecto, así como recomendaciones en temas sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se atendieron inquietudes o sugerencias por parte de la comunidad y del personal de obra, promoviendo una relación basada en el respeto, la participación y la comunicación permanente.

En la Tabla 26 se presenta el indicador de gestión social correspondiente al período del presente informe, el cual registra un valor de cero (0), dado que a la fecha no se han presentado quejas por parte de la comunidad hacia el contratista de la obra que permitan la aplicación de los indicadores de gestión social.

De igual manera, en la Tabla 27 se muestra la ubicación de quejas por parte de la comunidad, reportando un valor de cero (0), en razón a que hasta la fecha no se han recibido inconformidades relacionadas con la ejecución del proyecto.

Tabla 21. Indicador de Gestión.

INDICADORES PMA				
No.	**PROGRAMA**	**INDICADOR DE GESTIÓN**	**Cantidad**	**CUMPLIMIENTO**
1	Ficha de Manejo Ambiental Gestión Social	I=(# reuniones programadas)/(# de reuniones realizadas)*100	-	-

Fuente: Elaboración propia a partir de información del informe mensual del contratista,

Tabla 22. Quejas recibidas de la comunidad en el periodo.

UBICACIÓN		NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS	FECHA	OBSERVACIONES
MUNICIPIO	LUGAR			
LA JAGUA DE IBIRICO	ÁREA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	0		
		0		

Fuente: Elaboración propia a partir de información del informe mensual del contratista,

Tabla 23. Resumen de información de gestión social en el periodo.

UBICACIÓN	NÚMERO DE ACTAS DE VECINDAD	OBSERVACIONES
LA JAGUA DE IBIRICO	102	Se han identificado afectaciones menores en algunas viviendas ubicadas dentro de los tramos a intervenir, las cuales han sido debidamente registradas en las actas correspondientes.

Fuente: Elaboración propia a partir de información informe mensual del contratista,

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

Se exige al contratista que todo el personal que labora en la obra, debe estar obligatoriamente afiliados a la seguridad social y pago de los parafiscales y por ende de igual manera llevar una correcta implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

DE CARÁCTER TÉCNICO:

La obra presenta un avance físico acumulado para el presente periodo (del 01 de mayo de 2026 a 31 de mayo de 2026) del **41,80%,** frente a un avance físico programado acumulado del **70,65%;** por lo que se puede evidenciar un atraso en el avance físico del **28,85%.**

DE CARÁCTER FINANCIERO:

A fecha de corte del presente informe el contratista de obra y la interventoría no han presentado actas de cobro por lo tanto el avance financiero registra un 0%. Solo fue girado por parte de la entidad contratante a título de anticipo un 50% del valor total del contrato de obra y un 20% del valor total del contrato de interventoría.

DE CARÁCTER AMBIENTAL:

El contratista debe garantizar el mantenimiento constante del orden y aseo en los frentes de trabajo, así como cumplir de manera estricta con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en el SG-SST, reforzando la implementación de planes de emergencia y brigadas de atención.

DE CARÁCTER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El contratista hizo entrega del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017 la cual establece los estándares mínimos del SG-SST.

DE CARÁCTER SOCIAL:

Durante el periodo del presente informe no se presentaron peticiones quejas o reclamos por parte de la comunidad. La interventoría estará atenta mediante la post-ejecución de la obra, a cualquier solicitud verbal

o escrita de parte de la comunidad residente dentro del área de influencia del proyecto, para ser contestada de manera inmediata y resolver la inquietud presentada.

CONCLUCIONES GENERALES

En términos generales, se concluye que la obra física correspondiente a la OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR presenta un atraso considerable frente al cronograma de ejecución establecido contractualmente. Si bien durante el periodo evaluado se evidenció la implementación de acciones por parte del contratista orientadas a mejorar el rendimiento de la obra y avanzar en la ejecución de las actividades programadas, estas no han sido suficientes para reducir de manera significativa el atraso existente respecto al avance previsto.
En consecuencia, persiste un atraso importante en el desarrollo del proyecto, situación que podría comprometer el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos. Por lo anterior, se requiere que el contratista intensifique de manera inmediata las medidas correctivas, técnicas, operativas y administrativas necesarias para acelerar el ritmo de ejecución, recuperar el atraso acumulado y garantizar la culminación oportuna de las obras.

Durante el periodo evaluado, se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la correcta aplicación de los procedimientos constructivos y el uso adecuado de materiales y equipos.

Firma: 
Nombre: LUIS MIGUEL MARTINEZ PACHON
Rep. Legal: CONSORCIO INTERHIDRAULICO

ANEXOS

ANEXO No 1
REGISTRO FOTOGRAFICO.

	
FOTO 1	FOTO 2
Descripción:	Descripción:
	
FOTO 3	FOTO 4
Descripción:	Descripción:

	
FOTO 5	FOTO 6
Descripción:	Descripción:
	
FOTO 7	FOTO 8
Descripción:	Descripción:

	
FOTO 9	FOTO 10
Descripción:	Descripción:
	
FOTO 11	FOTO 12
Descripción:	Descripción:

	
FOTO 13	FOTO 14
Descripción:	Descripción:
	
FOTO 15	FOTO 16
Descripción:	Descripción:

	
FOTO 17	FOTO 18
Descripción:	Descripción:
	
FOTO 19	FOTO 20
Descripción:	Descripción:

	
FOTO 21	FOTO 22
Descripción:	Descripción:
	
FOTO 23	FOTO 24
Descripción:	Descripción:

CONTRATO DE OBRA N°003 DE 2025

OBJETO:

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

7 707294 376240

TAYDEM
Soluciones prácticas para oficina

⇒ 30-ABRIL-2026 JUEVES

- CLIMA: Mañana Soleada, Tarde Nublado
- PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res Contratista, 1 Topog. Aux. topg. 1 social, 1 Ing. amb, 3 operadores, 2 maestros, 1 oiso, Aux. viales, Of. varios
- MAQUINARIA: Eq. Topog. 3 Retroexcavadora, 1 canguro, mezcladora, 2 motobomba, H. menor
- ACTIVIDADES: Se realizó por parte del contratista las sgtes actividades:
- "Plan de emergencias y primeros auxilios" fue la charla SISO de hoy.
- Barrio Pedro Castro: continua con la nivelación cotas terreno, excavación mecanica mat. común y/o conglomerado (Nota: con sobreanchos realizados para evitar posibles derrumbos. Se realiza cama cimentación para la tubería (triturado), se inst. tub ϕ8" corrugado, posterior relleno con mat. sitio por capas y compactado. Se realizaron las acto. relacionados a las acom. san. instalación de silla Yee 8"x6", inst tub ϕ6" corrugado y posterior fundido de cajas de inspección sanitaria. Reparación de acom. acueducto.
- Barrio 11 de Noviembre: continuan con las excavaciones mec/manual para manholes fundida de columna y cortapas, según especificaciones de diseño.
- Boqueron: Se continuo con las actividades preliminares para acueducto y suministro e instalación tub. puc ϕ3" y accesorios. Relleno Mat. sitio.

-

- Ing. Res Contratista — Ing. Res. Interventoria

⇒ 1-MAYO-2026 VIERNES

- CLIMA: Soleado
- PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topog. Aux Topog, 1 Social, 1 Ing. Amb, 3 Operadores, 2 Maestros, 1 Oiso, Aux. Viales, Of. Varios
- MAQUINARIA: Eq. Topog, 3 Retroexcavadora, 1 Canguro, 1 Mezcladora, 2 Motobomba, H. Menor
- ACTIVIDADES:
- Barrio Pedro Castro: Se continuo con la nivelación, exc. mecanica material común/conglomerado; cimentación para tub. ϕ8" (triturado), instalación de tubería corrugado ϕ8", relleno con mat. producto de la misma excavación y mat. seleccionado. Compactación por capas. Adicionalmento instalación acom. san. domiciliarias ϕ6", tub ϕ6" corrugados, Kit silla yee 8"x6".
- Barrio 11 de Noviembre: continuan con la exc. mecanica y manual de manholes, posterior fundido de cilindros, fondo y cortapa.
- Boqueron: Se continuo con las actividades preliminares para acueducto, suministro e instalación tub puc ϕ3" y accesorios. Relleno con mat. sitio.

Ing. Res. Contratista — Ing. Res. Interventoria

⇒ 3- MAYO - 2026 SABADO

• CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Contratista, 1 Topografo, Aux. Topo, 1 Social, 1 Ing. amb, 3 operadores, 2 maestros, 1 Siso, Aux. viales, of. varios

• MAQUINARIA: Eq. Topog, 3 Retroexcavadora, 1 Canguro, mezcladora, 2 motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

-Barrio Pedro Castro: Continua con la nivelación y chequeo de excavacion mecanica para la inst. tub. 8" Corrugado, se coso cimentacion para la tuberia (bitur Posterior insta. tubo 8" Corrugado relleno con mat. de sitio y mat. Selecionado Compactacion por capas. asi mismo se realizan actividades relacionadas con la cont. acom. 6" Corrugado. Inst. Silla yee 8x6 tubo 6" y Const. Cajas de inspeccion.

-11 Noviembre: Continua Con la exc. mecanica/manual para manholes. Fundida de cilindros y arotapas Segun especificaciones del diseño.

-Boqueron: Se continua con las actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tubo pvc 3" y accesorios. Relleno mat. sitio misma excavacion

Ing. Res Contratista

Ing. Res. Interventoria

⇒ 4- MAYO- 2026 LUNES

• CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res Contratista, 1 Topog, Aux. topog, 1 Social, 1 Ing. amb, 3 operadores, 2 maestros, 1 Siso, Aux. viales, of. varios

• MAQUINARIA: Eq Topog, 3 Retroexcavadora, 1 canguro, mezcladora, 2 motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

-Barrio Pedro Castro: Continua con la nivelacion y chequeo de exc. mecanica para inst. tubo 8" Corrugado, relleno con mat. de sitio y mat. seleccionado Compactacion por capas. asi mismo se realizan actividades relacionadas con las acom. 6" Corrugado. Inst. Silla yee 8x6 tubo" y Const. Cajas de inspeción.

-11 Noviembre: Continua con la exc. mecanica/manual para manholes. Fundida de cilindros y arotapas Según especificaciones del diseño.

-Boqueron: se continua con las actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tubo pvc 3" y acesorios. Relleno mat. sitio misma exc.

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

⇒ 5 MAYO - 2026 MARTES

• CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux. topo, Social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 SISO, Aux. viales, Of. varios

• MAQUINARIA: Eq. topog, 3 Retroexcavadora, 1 canguro, mezcladora, 2 motobomba

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Continua con la nivelacion y chequeo de exc. mecanica para la inst. tubo 8" Corrugado, se uso cimentacion para tub. (triturado) posterior inst. tubo 8. Corrugado relleno con mat. de sitio y mat. seleccionado Compactacion por capas. asi mismo realizan actividades relacionadas con la Const. Acom. 6" Corrugado. Inst. silla yee 8x6 tubo 6" y Const. Cajas Inspe.
- 11 Noviembre: Continua con la exc. mecanica/manual para manholes. Fund. Cilindros y aro tapas segun especificaciones del diseño
- Boqueron: Se continua con las actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tubo pvc 3" y acesorios. Relleno mat. sitio misma exc.

Ing. Res. Contratista

Ing. Res Interventoria.

⇒ 6 - MAYO - 2026 MIERCOLES

• CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topog., Aux. Topog. Social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 SISO, Aux. viales, Of. varios

• MAQUINARIA: Eq. topog. 3 Retroexcavadora, 1 canguro, mezcladora, 2 motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Continua con la nivelacion y chequeo de exc. mecanica para inst. tubo 8" Corrugado, se uso cimentacion para tub. (triturado) posterior inst. tub. 8" Corrugado relleno con mat. sitio y mat. seleccionado Compactacion por capas. asi mismo se realizan act. Relacionadas con la inst. acom 6" Corrugado. Inst. Silla yee 8x6 tubo 6" y Const. Cajas de Insp.
- 11 Noviembre: Continua con la exc. mecanica/manual para manholes. Fundida cilindros y aro tapas segun especificaciones del diseño.
- Boqueron: Se continua con las actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tubo pvc 3" y accesorios Relleno mat sitio misma exc.

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria.

7- MAYO - 2026 JUEVES

•CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux. topog, 1 Social, 1 Ing. amb, 3 operadores, 2 maestros, 1 siso, Aux. viales, OF. varios

• MAQUINARIA: Eq. topog. 3 Retroexcavadora, 1 Canguro, mezcladora, 2 motobomba. H. menor

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Continua con la nivelacion y chequeo de excavacion mecanica para inst. tubo 8" corrugado, se uso cimentacion para tub (triturado) posterior inst. tubo 8" Corrugado. Relleno con mat sitio y mat. seleccionado Compactacion por capas. asi mismo se realizan actividades relacionadas con la const. acom. 6" Corrugada. Inst. Silla yee 8x6 tubo 6" Cont. Cajas Insp.

- 11 Noviembre: Continua con la exc. mecanica/manual para manholes. Fundida de cilindros y arotapas Según especificaciones del diseño

- Boqueron: Se continua con las actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tubo pvc 3" y accesorios Relleno mat. sitio misma exc.

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

⇒ 8-MAYO - 2026 VIERNES

•CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux Topog. 1 Social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 siso, Aux. viales, of. varios

• MAQUINARIA: Eq. topog. 3 Retroexcavadora, 1 canguro, mezcladora, 2 motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES

- Barrio Pedro Castro: Continua con la nivelacion y chequeo de exc. mecanica para inst. tubo 8 Corrugado, se uso cimentacion para tub (triturado) posterior inst. tub. 8" Corrugado. Relleno con mat sitio y mat seleccionado compactacion por capas. as mismo se realizan actividades relacionadas con la Const. acom 6" Corrugada. Inst. Silla yee 8x6 tub. 6" Const. Caja Insp.

- 11 Noviembre: Continua con la exc. mecanica/manual para manholes. Fundida cilindros y arotapas Según especificaciones del diseño

- Boqueron: Se continua con las actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tubo pvc 3" y accesorios. Relleno mat. sitio misma exc.

- Barrio San Jose: Exc. mecanica para ubicar manhol colector Sur. chequeo niveles.

Ing. Res. Contratista.

Ing Res. Interventoria.

=) 9 MAYO 2026 SABADO

• CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res Contratista, 1 Topog, Aux topog, 1 Social, 1 Ing. amb, 3 operadores, 2 maestros, 1 siso, Aux. viales, of. varios

• MAQUINARIA: Eq Topog, 3 Retroexcavadora, 1 Canguro, Motobomba, 2 Motobomba, H. Menor

• ACTIVIDADES:

- Barro Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con la Const. Acom. San. Tubo 6" Corrugada. Inst silla yee 8x6 tubo 6" Construcion cajas de inspeccion

- 11 Noviembre: Continua con la exc. mecanica/manual para manholes Fundida cilindros y arotapas segun especificaciones del diseño.

- Boqueron: Se continua con las actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tubo pvc 3" y accesorios. Relleno mat. sitio misma exc.

- Barrio San Jose: Continua exc mecanica para ubicar manholes Colector sur. chequeo de niveles.

Ing. Res Contratista. Ing. Res. Interventoria

⇒ 11 - MAYO - 2026 LUNES

• CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topog. Aux. Topog, 1 Social, 1 Ing. amb, 3 operadores 2 maestros, 1 siso, Aux. viales, of. varios

• MAQUINARIA: Eq. Topog 3 Retro exc. 1 canguro, mezcladora, 2 motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con la const. Acometida San. Tubo 6" Corrugada. Inst. Silla yee 8x6 tubo 6" Construccion de Cajas de inspeccion.

- 11 Noviembre: Continua con la exc. mecanica/manual para manholes Fundida de cilindros y arotapas segun especificaciones del diseño.

- Boqueron: Se continua con las actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tubo 3" y accesorios. Relleno con mat. sitio misma exc.

- Barrio San Jose: Continua con nivelacion y chequeo de exc. mecanica para inst. tubo 8" Corrugado, se uso cimentacion para tub (tinturado parcial) posterior inst. tuberia 8" Corrugado. Relleno con mat. sito y Seleciopado, compactacion por capas. asimismo se realizan actividad relacionadas con la const. Acom 6" Corrugada. Inst silla yee 8x6 tubo 6"

Ing. Res. Contratista Ing. Res. Interventoria

⇒ 12 - MAYO - 2026 MARTES

• CLIMA: Soleado Nocho: lluvioso

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing Res. Contratista, 1 Topogrraro, Aux. Topog, 1 Social, 1 Ing. amb
3 operadores, 2 maestros, 1 siso, Aux. viales, of. varios

• MAQUINARIA: Eq. Topog, 3 Retroexc, 1 Canguro, mezcladora, 2 motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom tubo 6"C. Instalacion silla yee 8"x6" tubo 6". Construcuon de cajas de inspecion.

- 11 Noviembre: Continua con la exc. mec/man. para manholes fundida de cilind. y arotapas según especificaciones del diseño.

- Barrio San Jose: Nivelacion y chequeo de exc. mecanica para inst. tubo Corrugado, se uso cimentacion para tub. (triturado parcial) posterior inst. tubena 8" Corrugado. Relleno mat sitio y selecionado, Comp. por capas. Actividades relacionadas con Const. Acom. 6", Inst. Silla yee 8x6 tubo 6"

Res. Contratista

Res. Interventoria

⇒ 13 - MAYO - 2026 MIERCOLES

• CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topogrraro, Aux. Topog, 1 Social, 1 Ing amb
3 operadores, 2 maestros, 1 siso, Aux. viales, Of. varios

• MAQUINARIA: Eq. Topog, 3 Retroexc, 1 Canguro, mezcladora, 2 motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. tub 6"C. Inst. Silla yee 8x6 tubo 6". Const. Cajas de inspecion

- 11 Noviembre: Continua con la exc. mec/man. para manholes. Fondida de cilindros y arotapas según especificaciones del diseño.

- Boqueron: Continua con actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tubo 3" y acesonos. Relleno con mat. Sitio misma excavacion

- Barrio San Jose: Nivelación y chequeo de exc. mecanica para inst tubena 8" Corrugado, se uso cimentacion para tub. (triturado parcial) posterior inst. tuberia 8" Corrugado. Relleno mat sitio y selecionado compactacion por capas. Actividades relacionados con Const. Acom. 6" Inst. silla yee 8x6 tubo 6"

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

→ 14 - MAYO - 2026 JUEVES

- CLIMA: Soleado
- PERSONAL EN OBRA: Ing. Res. Contratista, 1 topografo, Aux. topog, 1 social, 1 Ing. amb, 3 operadores, 2 maestros, 1 fiso, Aux. viales, of. varios
- MAQUINARIA: Eq. topog. 3 Retroexc, 1 Canguro, mezcladora, 2 motobomba, H. menor
- ACTIVIDADES

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. tubena 6" Corrugado. Inst. Silla yee 8x6" tub. 6" Constrcion caja insp.
- 11 Noviembre: Continua con la exc. mec/man. para manholes fund. cilindro y carotapas segun especificaciones del diseño
- Boqueron: Continua con actividades preliminares para acueducto y suministro e inst. tub. 3" y accesorios. relleno con mat sitio misma excavacion
- Barrio San Jose: Nivelacion y Cheques de exc. mec para inst. tub. 8" C, Se uso cimentacion para tub (triturado parcial) posterior inst tub. 8" C. relleno con mat sitio y silecionado, compactacion por capas.

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

→ 15 MAYO 2026 VIERNES

- CLIMA: Soleado
- PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 topografo, Aux Topog, 1 social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 fiso, Aux. viales, OF. varios
- MAQUINARIA: Eq. Topog, 3 Retroexc, 1 Canguro, mezcladora, motobomba, H. menor
- ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas, con Acom. tubena 6" Corrugado. Inst. silla yee 8x6" tub 6" Construcion Cajas Inspe.
- 11 Noviembre: Continua con la exc. mec/man para manholes Fundida cilindros y carotapas según especificaciones del diseño.
- Boqueron: Continua actividades preliminares para acueducto y Suministro e inst. tub. 3" y accesorios. Pelleno con mat. sitio misma excavacion.
- Barrio San Jose: Nivelacion y chequeo de exc. mec. para inst. tub 8" C. Se uso cimentacion para tub (triturado parcial) posterior inst. tub 8" C. relleno con mat. sitio y seleccionado. Compactacion por capas.

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoría

→ 16 MAYO 2026 SABADO

•CLIMA: Soleado

•PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux. topog. 1 Social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 Siso, Aux. viales, of. varios

•MAQUINARIA: Eq. Topog. Retroexc. mezcladora, Cangrejo, motobomba, H. menor

•ACTIVIDADES:

-Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. tub 6" P. Inst. Silla yee 8x6" tub. 6". Construccion Cajas de inspeccion.

-11 - Noviembre: Continua con exc. mec/man. para manholes Fundida de cilindros y arotapas según especificacion del diseño.

-Boqueron: Continua actividades preliminares para acueducto y suministro e inst tub 3" y accesorios. Relleno con mat sitio y selecionado

-Barrio San Jose: Nivelacion y chequeo de exc. mec. para inst. tub 8" C. Se uso cimentacion (entubado parcial) posterior inst. tub. 8" C. Relleno mat sitio y selecionado. comp. por capas. Const Acom 6" y silla yee 8x6 tub

Ing. Res. Contratista

Ing. Res Interventoria

→ 19 MAYO 2026 MARTES

•CLIMA: Soleado

•PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux. Topog. 1 Social, Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 SISO, Aux. viales, of. varios

•MAQUINARIA: Eq. Topog, Retroexc, mezcladora, cangrejo, motobomba, H. menor

•ACTIVIDADES:

-Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. tub. 6" C inst. Silla yee 8x6" tubo 6" Const. Cajas de inspecciones

-11 Noviembre: Continua con niveles y chequeo de excavacion mec para inst. tub. Se uso cimentacion para la tuberia (entubado) posterior inst. tub. 8". Relleno Con mat. Sitio y Selecionado. compactacion por capas. Construccion Acom. San 6" inst. Silla yee 8x6 tub 6" y Construccion Cajas de inspecion

-San Jose: Continua Con esc. mec/man. para manholes. Fundida cilindro y arotapas Segun especificaciones del diseño

Ing Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

⇒ 20 MAYO 2026 MIERCOLES

•CLIMA: Soleado Noche: Lluvioso

•PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux. Topog. 1 social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 oiso. Aux. viales, of. varios

•MAQUINARIA: Eq. Topog. Retroexc, mezcladora, Canguro, motobomba, H. menor

•ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom tub 6" C. Inst. Silla yee 8x6 tub 6". Construcion Cajas de inspeccion.
- 11 Noviembre: Continua con niveles y chequeo de excavaciones mec. para inst. tub 8C. Seuso Cimentacion (triturado parcial). posterior inst. tub 8" Relleno mat. sitio y selecionado compatado por capas. Construcion Acom. San 6". instalacion silla yee 8x6 y cajas de inspeccion.
- San Jose: Continua con exc. mec/man. para manholes. Fundida cilindro y arotapas segun especificaciones del diseño.

Ing. Res. Contratista. Ing. Res. Interventoria.

⇒ 21 MAYO 2026 JUEVES

•CLIMA: Jobado Nocho: Lluviosa

•PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux Topog. 1 Social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 oiso; Aux viales, of. varios

•MAQUINARIA: Eq. Topog. Retroexc, mezcladora, Canguro, motobomba, H. menor

•ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro:: Se realizan actividades relacionadas con Acom. tub. 6"C. Inst. Silla yee 8x6 tub. 6" Construcion Cajas de inspeccion.
- 11 Noviembre: Continua niveles y chequeo de excavaciones mec. para inst. tub. 8"C. Se uso cimentacion (triturado) posterior inst. tub 8" Relleno mat. sitio y selecionado. compactado por capas. Construcion Acom. San. 6" instalacion. silla yee "8x6" y cajas de inspecion.
- San Jose: Continua con exc. mec/man para manholes Fundida cilindro y arotapas segun diseño.

Ing. Res. Contratista Ing. Res. Interventoria

⇒22 - MAYO 2026 VIERNES

•CLIMA: Madrugada: Lluvioso - Sabado - Nocha: Lluvioso

•PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux. Topog. 1 social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestro, 1 SISO, Aux. viales, OF. vanos

•MAQUINARIA: Eq. Topog, Retroexc, mezcladora, cangoro, motobomba, H. menor

•ACTIVIDADES:

-Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. san. tub 6" instalacion Silla yee 8X6 tub 6". Construcion Caja de inspecion.

- 11 Noviembre: Continua niveles y chequeos de exc. mecanica para inst. tub. 8". Se uso cimentacion (triturado) posterior inst. tub. 8" relleno mat Sitio y . Selecionado. compactado por capas Construcion Acom. San. 6". Inst. Silla yee 8x6 tub. 6" y caja de inspecion.

- San Jose: Continua con excavacion manual/mecanica para manholes fundida de cilindro y arotapas segun diseño

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

⇒23 MAYO 2026 SABADO

•CLIMA: Sabado

•PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux Topog 1 Social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 SISO, Aux. viales, OF. vanos

•MAQUINARIA: Eq. Topog, Retroexc. mezcladora, cangoro, motobomba, H. menor

•ACTIVIDADES:

-Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. San. tub 6" instalacion Silla yee 8x6 tub 6" Construcion caja de inspeccion.

- 11 Noviembre: Continua niveles y chequeo de exc. mec. para inst. tubena 8". Se uso cimentacion (triturado) posterior inst. tub. 8" relleno mat. sitio. y selecionado compactados por capas. Construcion Acom. San. 6" insta. Silla yee 8x6 tub. 6" y caja de inspecion.

- San Jose: Continua con excavacion manual/mecanica para manholes. Fundida cilindro y arotapas según diseño.

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria.

⇒ 25 MAYO 2026 LUNES

- CLIMA: Soleado
- PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux. Topog, 1 Social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 Sisa, Aux. viales, of. varios
- MAQUINARIA: Eq. Topog, Retroexc, mezcladora, Canguro, motobomba, H. menor
- ACTIVIDADES:

- Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. san. tub 6" instalacion silla yee 8x6 tub. 6" Contrucion caja de inspeccion
- 11 Noviembre: Continua niveles y chequeo de exc. mecanica para instalacion tub. 8" Se uso cimentacion (triturado) posterior inst. tub. 8" relleno mat. sitio y selecionado. compactado por capas. Construcion Acom. San. 6" Instalacion silla yee 8x6 y Cajas de inspecion.
- San Jose: Continua exc. man/mec. para manholes, Fundida cilindros y aretapas segun diseña

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

⇒ 26 MAYO 2026 MARTES

- CLIMA: Soleado
- PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, Aux. Topog, 1 Social, 1 Ing amb 3 operadores, 2 maestros, 1 Siso, Aux. viales, of. varios
- MAQUINARIA: Eq. Topog, Retroexc, mezcladora, Canguro, motobomba, H. menor
- ACTIVIDADES:

- Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. san. tub. 6" instalacion silla yee 8x6 tub 6". Construcion Caja de inspecion. Continua niveles y chequeo de exc. mecanica para instalacion tub 8" Se uso cimentacion (triturado) posterior inst. tubo 8" relleno mat sitio y selecionado. compactado por capas. Construcion acom san. 6" instalacion silla yee 8x6 y Construcion Cajas de inspecion.
- San Jose: Continuo exc. man/mec para manholes, Fundida cilindros y aretapas segun diseño

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

⇒ 27 MAYO 2026 MIERCOLES

• CLIMA: Soleado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, 1 Social, 1 Ing. amb, 3 operadores, 2 maestros, 1 SISO, Aux. viales, OF. varios

• MAQUINARIA: Eq. Topog, Retroexc, mezcladora, Canguro, motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. San 6", Inst. Silla yee 8x6, tub 6", Construcion Cajas de inspecion.

- 11 Noviembre: Continuan niveles y chequeo de exc. mecanica para inst. tub. 8". Relleno mat. seleccionado y compactado por capas. Construcion Acom. San. 6" Inst. Silla yee 8x6 tub 6" Contruccion Cajas de inspecion.

- San Jose: Continua con exc. man/mec. para manholes Fundida cilindros y arotapas segun diseño.

Ing. Res. Contratista

Ing. Res Interventoria

⇒ 28 MAYO 2026 JUEVES

• CLIMA: Soleado

• PERSONA EN OBRA: 1 Ing. Res Contratista, 1 Topografo, 1 Social, 1 Ing. amb. 3 operadores, 2 maestros, 1 SISO. Aux. viales. OF. varios

• MAQUINARIA: Eq. Topog. Retroexc. mezladora, Canguro, motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. San. 6" Intalacion Silla yee 8x6 tub. 6" Cond. Caja inspeccion

- 11 Noviembre: Continua niveles y chequeo de exc mecanica para inst. tub. 8". Relleno mat. seleccionado y compactado por capas Construcion Acom. San 6" Inst. Silla yee 8x6 tub 6" Construccion de cajas de inspeccion.

- San Jose: Continua con exc. man/mec para manholes Fundida cilindros y arotapas segun diseño

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

⇒ 29 MAYO 2026 VIERNES

• CLIMA: 1am - 3pm / 4am - 6pm Nublado

• PERSONAL: EN OBRA: 1 Ing. Res Contratista, 1 topografo, 1 Social, 1 Ing. amb, 3 operadores, 2 maestros, 1 sso, Aux. viales, Of. varios

• MAQUINARIA: Eq. Topog, Retroexc, mezcladora, Canguro, motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom San 6". Inst. Silla yee 8x6 tub 6" Construcion caja de inspecion
- 11 Noviembre: Continuan niveles y chequeo de exc. mecanica para inst. tub. 8". Relleno mat. Seleccionado y compactado por capas Construcion Cajas de inspecion.
- San Jose: Continua con exc man/mec para manholes fundida cilindros y arotapas segun diseño

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

⇒ 30 MAYO 2026 SABADO

• CLIMA: Nublado

• PERSONAL EN OBRA: 1 Ing. Res. Contratista, 1 Topografo, 1 Social, 1 Ing. amb 3 operadores, 2 maestros, 1 sso, Aux viales, Of. varios

• MAQUINARIA: Eq. Topog. Retroexc, mezcladora, Canguro, motobomba, H. menor

• ACTIVIDADES:

- Barrio Pedro Castro: Se realizan actividades relacionadas con Acom. San. tub. 6" Inst. Silla yee 8x6 tub. 6" Construcion caja inspeccion.
- 11 Noviembre Continuan niveles y chequeo de exc. mecanica para inst. tub. 8" Se uso cimentacion (triturado) posterior inst. tub. 8" Relleno mat. Seleccionado y compactado por capas Construcion Cajas de inspecion.
- San Jose. Continua Con exc. mec/man. para manholes fundida cilindros y arotapas segun especificaciones diseño

Ing. Res. Contratista

Ing. Res. Interventoria

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902025540	6	CONSORCIO INTERHIDRAULICO 2026	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERHIDRAULICO 2026	CL 14 NO 13 - 23 LC 1 OBRERO	VALLEDUPAR-CESAR	3023770784	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	05436929	9505436929	E	2026/06/10	2026/05/29	BANCO AV VILLAS	0	$6,548,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1065599369	CORZO CARRILLO IVAN DAVID	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
2	CC	1063492025	FERNANDEZ LIMA MARIA CONCEPCION	230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF15	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
3	CC	1065646772	PABON AYALA ANA MARIA	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
4	CC	1003240324	SUESCUN MESTRE FRANCISCO EDUARDO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC1	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
5	CC	77193610	TRESPALACIOS FAJARDO YERZON ENEL	231001	30	$2,650,000	$424,000	EPS005	30	$2,650,000	$106,000	CCF15	30	$2,650,000	$106,000	14-11	30	$2,650,000	$184,500	30	$0	$0
6	CC	1121333761	VANEGAS BARROS WILLIAM JAVIER	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF15	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					**$21,150,000**	**$3,384,000**			**$21,150,000**	**$846,000**			**$21,150,000**	**$846,000**			**$21,150,000**	**$1,472,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$3,384,000	$0	$0	$3,384,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$424,000	$0	$0	$424,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,480,000	$0	$0	$2,480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,472,100	$0	$0	$1,472,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$1,472,100	$0	$0	$1,472,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$846,000	$0	$0	$846,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$846,000	$0	$0	$846,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$846,000	$0	$0	$846,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$240,000	$0	$0	$240,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$280,000	$0	$0	$280,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$226,000	$0	$0	$226,000
TOTAL				**6**	**$6,548,100**	**$0**	**$0**	**$6,548,100**

			ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																FECHA					
																			VERSION			1		
																			PAG. 1 DE 1 DOCUMENTO CONTROLADO					
DIA/HORA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
4	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
5	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
6	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
7	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
8	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
9	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
11	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
12	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	V	LL	M
13	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
16	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
17	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
18	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
19	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	V	LL	M
21	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	V	V	LL	M
22	V	V	LL	LL	LL	V	N	V	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
23	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
24	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
25	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
26	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
27	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
28	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
29	V	V	LL	LL	LL	V	N	V	N	S	N	V	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
30	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
31	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S Tiempo Seco **M** Lluvia Moderada **LL** Lluvia Fuerte **V** Llovizna **N** Nubosidad

FECHA__MAYO 2026_____
