ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATO No. ICCU 201 DE 2025
CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

INFORME MENSUAL SST No.14
PERIODO 20 AL 31 DE MAYO DE 2026

ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 217 DE 2025
CONSORCIO INTERVIAS PEB-BB

MAYO DE 2026

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

INFORME MENSUAL SST No.14
PERIODO 20 AL 31 DE MAYO DE 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios

CONTRATISTA	
Realizado por	**Aprobado por**
	
Nohelia Pinto Ahumada Profesional SSTA	Ing. Luis Ballesteros Director de obra

Contenido

Contenido

INFORMACIÓN BÁSICA 5
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5
VALOR DEL CONTRATO 6
PERSONAL SST CONTRATISTA 6
EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA 6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO 7
INGRESOS 8
Directo 8
Personal Mínimo Requerido 9
RETIROS 10
SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 11
ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
NILO: 14
PUENTE VEHICULAR TAMBORES: 14
VENECIA: 15
FUSA – SIBATÉ: 15
FUSA – TIERRA NEGRA: 15
VILLAPINZÓN: 16
MANTA: 16
PERSONAL ROTATIVO 17
COPAS Y CCL 17
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) : 17
OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST 18
CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD 19

CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS 21
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 23
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 24
DOTACIÓN Y EPP 25
SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS 26
PROGRAMA DE INSPECCIONES 27
PERMISOS DE TRABAJO Y ATS 28
PERMISOS DE TRABAJO Y ATS. 28
PLAN DE EMERGENCIAS 29
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 30
SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA 31
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST 31
COMPONENTE AMBIENTAL 35
Actividades realizadas: 35
MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 36
MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES: 38
REGISTRO FOTOGRÁFICO 39
GESTIÓN SOCIAL 39
LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD 39
LISTADO DE ANEXOS 42

INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca contribuir al desarrollo vial del departamento, optimizando la infraestructura existente y previniendo contingencias que afecten la movilidad, conectividad y seguridad de las comunidades. Las obras viales, si bien representan una mejora significativa en la calidad de vida de los habitantes, también implican impactos en el entorno natural y social, así como riesgos inherentes para los trabajadores involucrados en su ejecución.

En ese sentido, durante esta fase del proyecto, se ha dado prioridad a la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos laborales, con el objetivo de proteger la integridad física y mental de los trabajadores, así como la conservación de los recursos técnicos y ambientales. La gestión SST se desarrolla conforme a los lineamientos del SG-SST, cumpliendo con la normatividad vigente y con los requerimientos contractuales establecidos por el ICCU.

Este informe corresponde al período comprendido entre el 20 al 31 de mayo de 2026, e incluye las actividades adelantadas en materia de SST y Ambiental, tanto a nivel documental como en campo. Se detallan los avances en la revisión del componente técnico del proyecto desde la perspectiva de seguridad, así como las observaciones realizadas en el área de influencia directa y las posibles afectaciones identificadas sobre trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.
Así mismo, el presente documento integra las evidencias de cumplimiento del SG-SST, los planes de acción implementados, y los resultados de las estrategias orientadas a fomentar un ambiente laboral seguro y saludable, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, y garantizando la continuidad y calidad de las obras.

INFORMACIÓN BÁSICA

Contratista	Consorcio Obras ICCU CJIK
Contrato N°	ICCU 201 DE 2025
Fecha de suscripción del contrato:	5 de marzo de 2025
Fecha de suscripción de acta de inicio:	9 de abril de 2025
Plazo inicial:	8 meses y 22 días
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2025
Prórroga No 1	2 meses - Fecha de terminación 28 febrero de 2026
Prórroga No 2	1 mes y ocho días - Fecha de terminación 08 abril de 2026
Prórroga No 3	22 días – Fecha de terminación 30 abril 2026
Prorroga No 4	4 meses y 15 días fecha de finalización 05 de octubre de 2026
Suspensiones:	N/A
Plazo actual:	12 meses y 22 días
Fecha de terminación actualizada:	30 abril de 2026
Valor Inicial del contrato:	$ 6.800.000.000
Adición No 1	$ 2.900.000.000
Valor Total del contrato	$ 9.700.000.000
Interventoría:	Consorcio Intervias PEB-BB

Tabla 1. Información Básica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Contractualmente se tenía establecido un plazo de ocho (8) meses y veintidós (22) días, contados a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO desde el 09 de abril hasta el 31 de diciembre de 2025; aprobadas las pólizas de la prórroga No. 1, se otorgó un plazo adicional de dos (2) meses; aprobadas las pólizas de la prórroga No. 2, un plazo adicional de un (1) mes y ocho (8) días; y aprobadas las pólizas de la prórroga No. 3, se concedió un plazo adicional hasta el treinta (30) de abril de 2026, aprobadas las pólizas de la prórroga No. 4 un plazo adicional de 4 meses y 15 días, quedando como nueva fecha de finalización del contrato el 05 de octubre de 2026, para un total de dieciséis (16) meses y treinta y siete (37) días.

VALOR DEL CONTRATO

El Valor inicial del contrato se estableció en la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.800.000.000,00); Adicionalmente se informa que el 30 de diciembre de 2025 se aprobó la adición No 1 por un valor de ($ 2.900.000.000) DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para un total de ($ 9.700.000.00) NUEVE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

PERSONAL SST CONTRATISTA

Cargo	Nombre	Cédula	Fase
Residente SSTA	Nohelia Pinto Ahumada	52514856	Construcción

Total	**1**

Tabla 2. Responsables de SST

EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA

Para el mes comprendido del 20 al 31 de mayo de 2026 se relacionaron nuevos ingresos tanto personal directo del consorcio como de los subcontratistas.

Cargos	Informe No. 14	Novedades
Ingresos Nuevos	2	Ver Anexo 1. Ingresos
Retiro Antiguo	5	
Personal activo Antiguo	43	
Ingresos retiros	0	
Total Activos	45	

Tabla 3. Empleos generados para el contrato

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, está interesado en la " ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

El lugar de ejecución de las Obras en el departamento de Cundinamarca tiene a su cargo aproximadamente 6.992 Km de red vial distribuidas en sus quince provincias, 5.142,53 Km (76,6%) de las vías departamentales se encuentran en afirmado y solo 4.848,87 Km (26,4%) se encuentran pavimentadas, así mismo en general 26,46% / 1.856,55 Km)

presentan deterioro de la superficie de rodadura, deterioro o ausencia de obras de drenaje transversal (alcantarillas() y longitudinal (cunetas) y estructuras de contención.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- Construcción y/o conservación de muros de contención o confinamiento
- Rehabilitación de vías
- Remoción de derrumbes
- Estabilización de taludes
- Recuperación de banca
- Habilitación de variantes
- Excavaciones varias sin clasificar
- Construcción y/o conservación gaviones
- Rellenos para estructuras
- Transporte de materiales provenientes de derrumbes y de excavaciones
- Reparación, rehabilitación o construcción de puentes vehiculares

La ejecución de estas y otras obras y/o actividades busca hacer frente de manera oportuna a cualquier emergencia que se presente a lo largo de toda la red secundaria y terciaria a cargo del departamento, garantizando la seguridad y transitabilidad en menor tiempo posible en el caso de ser suspendido parcial o temporalmente.
Todos los subcontratistas y trabajadores estarán sujetos a las disposiciones que sobre SG-SST se establecen en este documento.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

INGRESOS

Durante el periodo comprendido entre el 20 al 31 de mayo de 2026, se registró un total de (2) dos colaboradores ingresos de personal al proyecto correspondiente al contrato ICCU,

incluyendo colaboradores vinculados tanto de manera directa como indirecta, para la vinculación del personal directo de la zona se envió comunicado de vinculación laboral a la alcaldía del municipio. A continuación, se detallan dichos ingresos:

Directo

PERSONAL DIRECTO							
No	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FRENTE DE OBRA**
1	1074958680	DANIEL	CIFUENTES CIFUENTES	CJIK	AUX TRAFICO	07/05/2026	PACHO LA PALMA

Tabla 4. Personal directo

PERSONAL INDIRECTO							
No	**CEDULA**	**APELLIDOS**	**NOMBRES**	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FRENTE DE OBRA**
2	1121837179	GIL	RUBEN DARIO	CONSORCIO LA PALMA	OFICIAL	26/05/2026	PACHO LA PALMA

Tabla 5. Personal indirecto

Personal Mínimo Requerido

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO								
No	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**EMPRESA**	**CARGO**	**% DE DEDICACIÓN**	**FECHA DE INGRESO**	**FRENTE DE OBRA**
1	52514856	NOHELIA	PINTO AHUMADA	CONSORCIO ICCU CIJK	PROFESIONAL SST-	100%	25-jun-25	OFICINA
2	1026270626	WILLIAM LEONARDO	OLIVEROS RAMIEZ	JMS	RESIDENTE	100%	07/02/2026	OFICINA
3	1104068887	YOLIMA CONSTANZA	DIAZ DIAZ	CONSORCIO ICCU CIJK	TOPOGRAFO	100%	04/07/2025	FUSA-NILO
4	1109299894	TATIANA	GONZALEZ TRUJILLO	CIMELEC	INGENIERO INSPECTOR	100%	27-may-25	FUSA-NILO
5	1090987542	LUIS HERNANDO	BALLESTEROS LOPEZ	CONSORCIO ICCU CIJK	DIRECTOR DE OBRA	100%	1-may-25	OFICINA

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO								
No	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**EMPRESA**	**CARGO**	**% DE DEDICACIÓN**	**FECHA DE INGRESO**	**FRENTE DE OBRA**
6	79265782	ADONAI	TORO VALERO	INDEPENDIENTE	ESPEC. ESTRUCTURAL	25%	Abril 2025	OFICINA
7	11320288	NOE GERARDO	DIAZ JIMENEZ	ICCU CJIK	ESPECIALISTA GEOTECNIA	25%	01/08/2025	OFICINA
8	1013627428	JEIMY VIVIANA	FRESNEDA	JMS	INGENIERO INSPECTOR	100%	Mayo 2025	OFICINA

Tabla 6. Personal Requerido

Toda la documentación correspondiente a los soportes que validan la seguridad social para el presente mes se puede evidenciar en el siguiente link

RETIROS

Para el cierre del presente periodo, correspondiente al mes de abril de 2026, se registraron seis (5) retiros de los colaboradores directos e indirectos vinculados al contrato.

PERSONAL RETIRADO					
No	**NOMBRE APELLIDOS**	**CEDULA**	**CONTRATISTA**	**FECHA DE RETIRO**	**ANEXO**
1	KAREN DANIELA MONTERO TRIANA	1,069,332,125	**ICCU CJIK**	05/05/2026	CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO, LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO
2	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ CHUQUEN	1,069,762,064	**ICCU CJIK**	25/05/2026	CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO, LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO
3	MIGUEL ANDRES BERMUDEZ BUENO	1003520064	**ICCU CJIK**	22/05/2026	CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO, LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO
4	WILSON GONZALEZ QUIROGA	5772300	**CONSORCIO REGIONAL**	31/05/2026	CARTA DE RENUNCIA, LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO
5	JUAN BAUTISTA OVIEDO CASTILLO	80367897	**EMECON**	31/04/2026	CARTA DE TRASLADO, SEGURIDAD SOCIAL

Tabla 7. Retiro

SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 20 al 31 de mayo de 2026,
Los soportes de los pagos de seguridad social del personal directo e indirecto se verán reflejados en el informe final de diciembre.

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL - MAYO 2026						
No	**NOMBRE APELLIDO**	**CEDULA**	**CONTRATISTA**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**NÚMERO EN LA PLANILLA**	**FRENTE**
1	RUIZ PEREZ KAREN DANIELA	1000728495	CONSORCIO ICCU CJIK	80695612	20-21	OFICINA
2	CHAVEZ CHAVES PABLO EMILIO	1077149553	CONSORCIO ICCU CJIK	80695612	5	VILLAPINZÓN
3	DIAZ DIAZ YOLIMA CONSTANZA	1104068887	CONSORCIO ICCU CJIK	80695612	6	OFICINA
4	HIDALGO CASTAÑEDA HUGO	3099028	CONSORCIO ICCU CJIK	80695612	10	LA PALMA
5	MENDOZA BUELVAS JOSE VIDAL	3965630	CONSORCIO ICCU CJIK	80695612	12	BODEGA
6	PINTO AHUMADA NOHELIA	52514856	CONSORCIO ICCU CJIK	80695612	16	OFICINA
7	BALLESTEROS LOPEZ LUIS HERNANDO	1090987542	CONSORCIO ICCU CJIK	80695612	1	OFICINA
8	DIAZ JIMENEZ NOE GERARDO	11320288	CONSORCIO ICCU CJIK	78616314	1	OFICINA

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL - MAYO 2026						
No	**NOMBRE APELLIDO**	**CEDULA**	**CONTRATISTA**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**NÚMERO EN LA PLANILLA**	**FRENTE**
9	TORO VALERO ADONAI	79265782	CONSORCIO ICCU CJIK	78616314	2	OFICINA
10	BERMUDEZ BUENO MIGUEL ANDRES	1003520064	ICCU CJIK	80695612	2-3	FUSA
11	HERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL MIGUEL	1073604848	ICCU CJIK	80695612	8	LA PALMA
12	HERNANDEZ CHUQUEN ANDRES EDUARDO	1069762064	ICCU CJIK	80695612	9	FUSA
13	RAMIREZ TRIANA LAURA CRISTINA	1003479316	ICCU CJIK	80695612	19	LA PALMA
14	JEIMY VIVIANA FRESNEDA	1013627428	JMS INGENIERIA SAS	9504702889	1	OFICINA
15	WILLIAM LEONARDO OLIVEROS RAMIREZ	1026270626	JMS INGENIERIA SAS	9504706003	1	OFICINA
16	TATIANA GONZALEZ TRUJILLO	1109299894	CIMELEC	**78964011**	1	OFICINA
17	LOPEZ RODRIGUEZ EDILBERTO	80499650	CONST. GUERRERO	84321207	5	ROTATIVO
18	CARRANZA CASTILLO JOSE NEFTALI	1071838871	CONST. GUERRERO	84321207	2	ROTATIVO
19	CORDOBA MARTINEZ PEDRO	7252086	CONST. GUERRERO	84320724	10-11	ROTATIVO
20	LESMES AVILA JOSE ANDELFO	3209655	CONST. GUERRERO	84321207	3	ROTATIVO
21	HERNANDEZ CASTAÑO CAMILO	1030631652	CONST. GUERRERO	84321207	1	ROTATIVO
22	HURTADO HURTADO JOSE VALENCIANO	1061198902	CONST. GUERRERO	84320724	2-3	LA PALMA MURO
23	LEUDO URRUTIA APULIO	11636845	CONST. GUERRERO	84320724	5-6	LA PALMA MURO

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL - MAYO 2026						
No	**NOMBRE APELLIDO**	**CEDULA**	**CONTRATISTA**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**NÚMERO EN LA PLANILLA**	**FRENTE**
24	MORENO MARTINEZ JUSTINIANO	11798579	CONST. GUERRERO	84320724	7-8	LA PALMA MURO
25	LOPEZ GONZALEZ PEDRO ANTONIO	5771920	CONST. GUERRERO	84320724	9	FUSA
26	MIRANDA TRIANA HERMES ALEXANDER	192735927	CONSORCIO REGIONAL	81250267	23	LA PALMA
27	ANZOLA ANZOLA EDGAR	1069053378	CONSORCIO REGIONAL	81250267	1	LA PALMA
28	CAYCEDO ALVARADO LUIS FERNANDO	1069054930	CONSORCIO REGIONAL	81250267	8	LA PALMA
29	HINCAPIE ESPINOZA LEIDY PAOLA	1121860695	CONSORCIO REGIONAL	81250267	18	LA PALMA
30	GONZALEZ QUIROGA WILSON	5772300	CONSORCIO REGIONAL	81250267	14	LA PALMA
31	MONROY OSORIO OSWALDO	3336559	CONSORCIO REGIONAL	81250267	27	LA PALMA
32	HERRERA DIAZ YESIDH	1073808720	CONSORCIO REGIONAL	81250267	17	LA PALMA
33	MOSCOTE PEÑARANDA JOSE GUILLERMO	1118832246	CONSORCIO REGIONAL	81250267	30	LA PALMA

ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 20 al 31 de mayo de 2026 desde el área de seguridad y salud en el trabajo para el contrato ICCU, se relacionan actividades de intervención las cuales previamente fueron establecidas dentro del plan anual de trabajo:

NILO:

PUENTE VEHICULAR TAMBORES:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Durante el mes de mayo de 2026, en el frente de obra correspondiente al puente ubicado en el municipio de Nilo, se finaliza con el desarrollo de las actividades constructivas orientadas a la finalización de la superestructura.
En esta etapa se ejecutó remates de estructura con el personal Rotativo.

PERSONAL INDIRECTO							
1	3965630	JOSE VIDAL	MENDOZA	CONSORCIO ICCU CJIK	AYUDANTE	01/06/2025	ROTATIVO
2	1071838871	JOSE NEFTALI	CARRANZA CASTILLO	CONST GUERRERO	OFICIAL	27/01/2026	ROTATIVO
3	5771920	PEDRO ANTONIO	LOPEZ	CONST GUERRERO	OFICIAL	06/04/2026	ROTATIVO
4	1030631652	CAMILO	HERNANDEZ	CONST GUERRERO	AYUDANTE	23/01/2026	ROTATIVO
5	1077149553	PABLO EMILIO	CHAVEZ	ICCU CJIK	AYUDANTE DE OBRA	05/09/2025	ROTATIVO

FUSA – TIERRA NEGRA:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento para rellenos y compactados de excavación y finalizar con carpeta asfaltica, se realiza jornada de orden y aseo, se recoge campamento y señalización de obra dada como terminada obra pendiente terminado fino.

PERSONAL INDIRECTO							
1	1069762064	ANDRES EDUARDO	HERNANDEZ	CONSORCIO ICCU CJIK	AYUDANTE	7/04/2026	FUSA
2	1003520064	MIGUEL ANDRES	BERMUDEZ BUENO	CONSORCIO ICCU CJIK	AYUDANTE	17/03/2026	FUSA

LA PALMA PACHO PUENTE PR 80+900

Ingresa personal nuevo al frente la Palma (Pacho Cund.), se realiza fundida de caisson y estribos para estructura de puente, encofrado y fundida de muro.

PERSONAL DIRECTO							
1	3099028	HUGO	HIDALGO CASTAÑEDA	ICCU CJIK	INSPECTOR CIVIL	01/09/2025	LA PALMA
2	1074958680	DANIEL	CIFUENTES	ICCU CJIK	AYUDANTE	20/05/2026	LA PALMA

PERSONAL INDIRECTO							
3	192735927	MIRANDA	HERMES	CONSORCIO REGIONAL	AYUDANTE	30/03/2026	LA PALMA
4	1069053378	ANZOLA ANZOLA	EDGAR	CONSORCIO REGIONAL	AYUDANTE	30/03/2026	LA PALMA
5	1069054930	CAICEDO	LUIS FERNANDO	CONSORCIO REGIONAL	AYUDANTE	30/03/2026	LA PALMA
6	1121860695	HINCAPIE	PAOLA	CONSORCIO REGIONAL	INSP. SST	30/03/2026	LA PALMA
7	5772300	GONZALES	WILSON	CONSORCIO REGIONAL	TOPOGRAFO	30/03/2026	LA PALMA
8	93336559	MONROY	OSWALDO	CONSORCIO REGIONAL	AYUDANTE	13/04/2025	LA PALMA
9	1073808720	HERRERA	YESID	CONSORCIO REGIONAL	AYUDANTE	08/04/2026	LA PALMA
10	1118832246	MOSCOTE	JOSE GUILLERMO	CONSORCIO REGIONAL	OFICIAL	07/04/2026	LA PALMA
11	1121837179	GIL VILLALOBOS	RUBEN DARIO	CONSORCIO REGIONAL	OFICIAL	15/05/2026	LA PALMA

LA PALMA PACHO MURO PR 78+400

Ingresa personal nuevo al frente la Palma (Pacho Cund.), se realiza limpieza de material suelto de la falla geológica manualmente, se realiza excavación para construcción y fundida de caisson.

PERSONAL DIRECTO							
1	3099028	HUGO	HIDALGO CASTAÑEDA	ICCU CJIK	INSPECTOR CIVIL	01/09/2025	LA PALMA
2	1003479316	LAURA C.	RAMIREZ	ICCU CJIK	AUX TRAFICO	22/04/2026	LA PALMA
3	1073604848	ANGEL MIGUEL	HERNANDEZ	ICCU CJIK	AYUDANTE	22/04/2026	LA PALMA

PERSONAL INDIRECTO							
4	1061198902	HURTADO	JOSE VALENCIANO	CONST. GUERRERO	AYUDANTE	26/04/2026	LA PALMA
5	11798579	MORENO MARTINEZ	JUSTIANO	CONST. GUERRERO	AYUDANTE	26/04/2026	LA PALMA

6	11636845	URRUTIA PULIDO	LEUDO	CONST. GUERRERO	AYUDANTE	26/04/2026	LA PALMA
7	7252086	CÓRDOBA	PEDRO	CONST. GUERRERO	OFICIAL	26/04/2026	LA PALMA

PANDI

Se terminan actividades constructivas estamos a la espera de cierre de frente de obra

COPAS Y CCL

El día 21 mayo de 2026 se llevó a cabo la Reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad.

Nombre del miembro del comité	Rol
Tatiana González	Secretaria
Karen Ruiz	Representante del empleador
José Vidal	Representante de los colaboradores

Tabla 9. Representantes Comité

EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) :

El día 21 mayo de 2026 se llevó a cabo la Reunión con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad. no se presentan eventualidades anteriores. La próxima reunión se realizará el 19 de junio de 2026. según la resolución 3461 de 2025.

Nombre del miembro del comité	Rol
Tatiana González	Representante del empleador
Karen Ruiz	Suplente del empleador

José Vidal	Representante de los colaboradores

OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST

En cumplimiento con la normatividad legal vigente, relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, se presentan a continuación los indicadores definidos según la Resolución 0312 de 2019, junto con los resultados obtenidos en el seguimiento y evaluación correspondientes al periodo actual. Adicionalmente, se lleva registro de forma mensual en el formato SST-F-42 Accidentalidad para el control y monitoreo continuo de dichos indicadores.

A continuación, se presenta los resultados del seguimiento a indicadores de gestión:

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	META	MAYO
SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(N° de días de incapacidad por AT en el mes + N° de días cargados en el mes/N° de trabajadores en el mes) *100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por AT	0%	0%
FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(N° de AT que se presentaron durante el mes/ N° de trabajadores en el mes) *100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X AT	0%	0%
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	Número de accidentes de trabajo morales en el año	(N° de AT mortales presentados en el año/ N° total del AT Presentados en el año) *100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	0%	Anual
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD	Número de casos de enfermedad	(N° de casos nuevos y antiguos de EL en el	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de	0	Anual


NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	META	MAYO
LABORAL	laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000	enfermedad laboral en el periodo Z		
INDICE DE LA ENFERMEDAD LABORAL	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(N° de casos nuevos s de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	0	Anual
AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICA	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ N° de días de trabajo programado en el mes)*100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	0%	0%

Tabla 10. Seguimiento indicadores Resolución 0312

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, está comprometido con la salud y la integridad de sus colaboradores, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientado a mantener en cero el índice de accidentalidad del proyecto. Asimismo, tanto el consorcio como las empresas subcontratistas vinculadas al proyecto,

presentan los certificados de accidentalidad emitidos por la ARL correspondiente al periodo vigente.

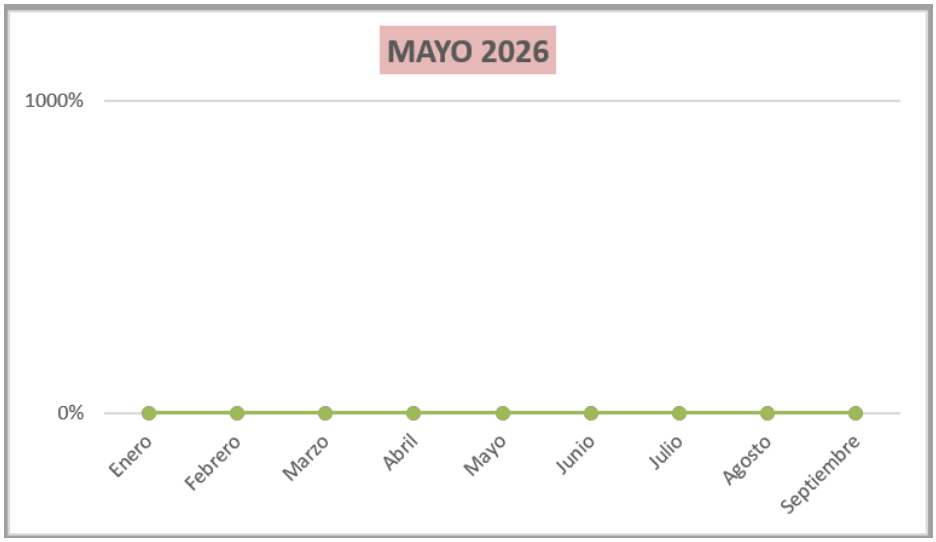

Análisis: El valor parcial del 20 al 31 de mayo de 2026 es de **0%**, lo cual es un **resultado favorable**, pues indica que **no se registraron incidentes** durante ese mes.

Como parte del proceso de ingreso al proyecto, todos los trabajadores, contratistas y personal vinculado deben participar en la inducción SST, donde se socializan las condiciones del entorno laboral, los riesgos identificados en cada actividad y las medidas de prevención y control establecidas, los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto, las buenas prácticas ambientales requeridas, así como las obligaciones y compromisos individuales para la protección del entorno Durante esta jornada, también se realiza la notificación formal de los riesgos a los que estará expuesto el personal, con el fin de garantizar su conocimiento y promover una cultura de autocuidado y prevención. El registro de asistencia a la inducción y la firma de notificación de riesgos se conservan como evidencia del cumplimiento de este procedimiento.

Actividades básicas	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura	Novedad
INDUCCIÓN TOTAL	2	2	100%	100%	100%
LA PALMA	2	2	100%	100%	100%
FUSA - SIBATÉ pe 34	0	0	100%	100%	0%
NILO	0	0	0%	0%	0%
OFICINA	0	0	0%	0%	0%
ROTATIVO	0	0	100%	100%	100%
Notificación de riesgos	2	2	100%	100%	100%

Tabla 11. Inducciones del periodo

CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y promover entornos laborales seguros, el Consorcio OBRAS ICCU CJIK se reprogramaron las actividades de charlas y capacitaciones **para el mes de abril** con el fin garantizar el cumplimiento del plan anual de manera periódica las charlas y capacitaciones van dirigidas a todos los trabajadores y contratistas. Estas actividades permitirán actualizar conocimientos, reforzar comportamientos seguros y brindar herramientas prácticas para la gestión de riesgos en el lugar de trabajo, también irán enfocados en la socialización de los aspectos e impactos ambientales, las obligaciones individuales en el marco del plan de manejo ambiental, y la promoción de buenas prácticas para la prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales. Los temas tratados se seleccionan con base en las necesidades del proyecto y los riesgos identificados, y su ejecución quedará registrada mediante listas de asistencia y evidencias fotográficas.

CHARLAS Y CAPACITACIONES LA PALMA		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
21 MAYO 2026	CHARLA DE SEGURIDAD MANEJO SEGURO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	6
22 MAYO	BOLETÍN MAYO 2026 PUENTE	7

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza la realización de exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado al proyecto. Estos incluyen evaluaciones de ingreso, periódicas y de egreso, con el fin de determinar la aptitud del trabajador para el cargo, hacer seguimiento a su estado de salud y prevenir enfermedades laborales.

Medicina del trabajo	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura	Novedad
Exámenes de ingreso	2	2	100%	100%	N/A
Exámenes periódicos	0	0	100%	100%	N/A
Exámenes de retiro	0	0	100%	N/A	N/A
Cartas de notificación de Examen de Retiro	2	2	100%	100%	100%
Estadística mensual de ausentismo por AT y/o EL	0	0	100%	100%	100%

Tabla 12. Resumen diagnóstico de condiciones de salud

De los anteriores exámenes médicos ocupacionales sus resultados se resumen en el siguiente cuadro:

Medicina del trabajo	Total	Apto - satisfactorio	Apto con recomendaciones	Apto con restricciones	Otras novedades
Exámenes de ingreso	2	2	0	0	N/A
Exámenes periódicos	0	0	0	0	Ninguna

Tabla 13. . Consolidado EMO del periodo

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el periodo del 20 al 31 de mayo de 2026 se realizó el seguimiento al Programa de Seguridad Industrial, evaluando la implementación del plan de trabajo programado frente a las actividades ejecutadas. Se logró cumplimiento satisfactorio en las actividades planificadas, incluyendo capacitaciones, inspecciones, control de permisos de trabajo y seguimiento a condiciones inseguras.

Higiene industrial	Personal o actividad programada	Personal asistente o actividad realizada	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura
Entrega de EPP y dotación	2	2	100%	100%
Seguimiento a matriz IPERV	1	1	100%	100%
Inspecciones - preoperacionales Fusa pr 34	0	0	100%	100%
Inspecciones- preoperacionales Nilo	0	0	100%	100%
Inspecciones- preoperacionales la palma	4	1	100%	100%
Inspecciones- preoperacionales Transporte	4	1	100%	100%

Higiene industrial	Personal o actividad programada	Personal asistente o actividad realizada	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura
Análisis de trabajo la palma	3	7	100%	100%
Análisis de trabajo Nilo	0	0	100%	100%
Análisis de trabajo Fusa-Sibaté	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo Nilo	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo Fusa	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo la palma	2	7	100%	100%

Tabla 14. Programa de seguridad

DOTACIÓN Y EPP

Como parte del cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) a todo el personal involucrado en el proyecto. Esta entrega incluyó elementos adecuados según el tipo de actividad a realizar, tales como cascos, guantes, gafas, botas con punta de acero, chalecos reflectivos y protección auditiva, entre otros. La distribución fue registrada y firmada por cada trabajador, garantizando así la trazabilidad y el compromiso con el uso correcto del EPP durante el desarrollo de las labores.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS

Durante el periodo reportado del 20 al 31 de mayo de 2026 se realizó el seguimiento y verificación de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPVR), no se presentan cambios ni valoración de riesgos.

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el mes de mayo se realizó se realiza cumplimento del plan de trabajo con todos los frentes.

INSPECCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE		
18 AL 22 MAYO	INSPECCION DE EQUIPO DE TRASNPORTE	MAQ- F-07A
25 AL 29 MAYO	INSPECCION DE EQUIPO DE TRASNPORTE	MAQ- F-07A

INSPECCIONES LA PALMA		
MAYO 2026	INSPECCION AMBIENTAL	SSTA-F- 13
MAYO 2026	INSPECCION DE BOTIQUIN	SSTA-F- 15
MAYO 2026	INSPECCION DE EPP	SSTA-F- 08
MAYO 2026	INSPECCION GENERAL	SSTA-F- 09
INSPECCIONES FUSA PR 34+4005		
MAYO 2026	INSPECCION DE BOTIQUIN FUSA	SSTA-F- 15
MAYO 2026	INSPECCION GENERAL	SSTA-F -07

PERMISOS DE TRABAJO Y ATS

Durante el periodo del 20 al 31 de mayo de 2026, se diligencian los formatos de permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada actividad realizada, se realiza cumplimento del plan de trabajo a partir del mes de septiembre con un ATS Y PERMISOS DE TRABAJO de la siguiente manera:

PERMISOS DE TRABAJO Y ATS.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO LA PALMA		
FECHA	**ATS REALIZADO**	**SOPORTE**
19 AL 24 MAYO	ATS AMARRE DE HIERRO	SSTA – F-37
19 AL 24 MAYO	ATS VACIO DE CONCRETO	SSTA – F-37
25 AL 29 MAYO	ATS AMARRE DE HIERRO	SSTA – F-37

PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del 20 al 31 de mayo de 2026, se realizó la socialización del Plan de Emergencia con los trabajadores nuevos que ingresaron en el mes se realizó la socialización como parte del proceso de inducción general en Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta jornada se explicaron los procedimientos de actuación frente a diferentes tipos de emergencias, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y el rol de las brigadas de emergencia, con el fin de que cada colaborador identifique y esté atento para actuar adecuadamente en caso de una eventualidad.

Plan de emergencias y contingencias	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura
Socialización del plan de emergencias (inducción).	2	2	100%	100%
Cap. Brigadas de emergencia primeros auxilios, evacuación y extintores	0	0	N/A	N/A
Elaboración de informe y seguimiento	1	1	100%	100%

Tabla 15. Gestión en emergencias

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el mes correspondiente, en el marco del Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, se cuenta con una Retroexcavadora, lo cual se realizará cumplimento con el plan de inspecciones y/o preoperacionales de maquinaria pesada.


MAQUINARIA AMARILLA	CANTIDAD	FRENTE	FECHA DE RETIRO
MAQUINARIA DIRECTA DEL ICCU	1	LA PALMA	
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO	1	FUSA PR 34+4005	27/05/2026

SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA

MAQUINARIA AMARILLA FUSA PR 34+4005





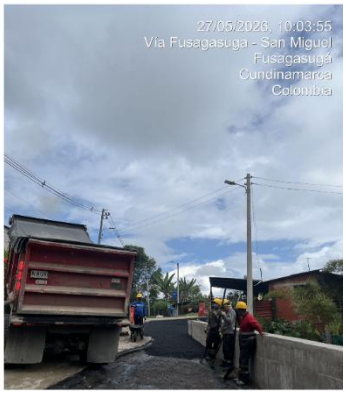

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST

Durante el mes de mayo, se continuó con la ejecución del **Plan de Trabajo Anual**, desarrollando actividades programadas en los componentes de **medicina preventiva, medicina del trabajo, seguridad industrial** y **plan de emergencias**. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Inducción y notificación de riesgos.
- Reunión del **COPASST**. (accidente Francisco Linares)
- Revisión y actualización de la matriz legal aplicable.
- Realización de exámenes médicos ocupacionales.
- Seguimiento al ausentismo laboral.
- Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Inspecciones a elementos de emergencia.

Estas actividades, además de cumplir con las obligaciones legales, contribuyeron al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y al mejoramiento de las condiciones de trabajo en el proyecto.

ACOMPAÑAMIENTOS EN ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTES

ACOMPAÑAMIENTO PUENTE LA PALMA FUNDIDA DE ESTRIBO









ACOMPAÑAMIENTO A EXCAVACION MANUAL Y CONSTRUCCION DE CAISSON MURO LA PALMA CUND





ACOMPAÑAMIENTOS FUSA PR 34 COMPACTACON E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA





ELEMENTOS DE EMERGENCIA

LA PALMA PUENTE	LA PALMA MURO
	

COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades realizadas:

- Se realiza protección de materiales pétreos y delimitados sin afectar el tránsito de vehículos.
- Se realizan llenos y compactación con material granular extraído de las canteras autorizadas. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A,** jurisdicción Municipio de Mosquera, Cundinamarca. Se adjunta Licencia Ambiental resolución # 1326 del 12 de noviembre 2003 y Título Minero de la cantera. licencias adjuntas en el informe #2 de mayo de 2025.
- Jornadas de orden y aseo
- Señalización en las áreas intervenidas
- Desinfección de baterías sanitarias en la mayoría de los frentes se recogen las baterías por terminación de obra.

JORNADA DE ORDEN Y ASEO FUSA PR 34	JORNADA DE ORDEN Y ASEO LA PALMA
 	 

MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

El material granular extraído de la cantera autorizada. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A,** jurisdicción Municipio de Mosquera, Y material de construcción Se acopia en cada frente de obra totalmente protegido para evitar contaminación y propagación de material particulado.

ACOPIOS TEMPORALES	
MURO	**PACHO LA PALMA**
	

MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES:

DESCARGUE DE MATERIALES PARA LOS FRENTES

FUSA PR 34	LA PALMA
	

En verificación con el documento del PMT se cita:

Las actividades de cargue y descargue se realizarán al interior de los cierres propuestos en todo momento contando con los kits de aproximación presentados y sus respectivas transiciones**.**
Se realiza revisión documental y autorización de las volquetas que se encuentran dentro del proyecto documentación presentada en el informe anterior, para realizar ingreso y retiro de material Pétreo y material RCD.

SEÑALIZACION PMT LA PALMA

MURO  MURO	 PUENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el registro fotográfico como evidencia de las actividades Ambientales ejecutadas y descritas en el presente informe correspondiente al 20 al 31 de mayo de 2026. Tales como: jornada de orden y aseo en cada frente de trabajo, charlas y capacitaciones Ambientales Y sst, según el plan de trabajo, señalización de delimitación en áreas de trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS CAPACITACIONES AMBIENTALES Y SST





GESTIÓN SOCIAL

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Se realizaron actas de vecindad al inicio de obra de las viviendas que se encuentran cercanas al frente de Fusa vereda Tierra Negra PR 34.

se recibió acta de solicitud de material de excavación del predio Granja la Violeta quien lo utilizara para recuperación y adecuación de criaderos.

Se cierra el acta de vecindad del frente de Venecia sin ninguna novedad o daño en la propiedad.

No	FRENTE DE OBRA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE	DESARROLLO DEL ACTA
1	NILO PUENTE TAMBORES	09 /05/2025		Se realizan actas de vecindad a las casas mas cercanas a la obra. (4 casas)
2	NILO PUENTE TAMBORES	26/05/2025		FINCA EL SOL disposición de material de excavación
3	NILO PUENTE TAMBORES	16/07/2025		Autorización Suministro de Agua potable del predio del señor propietario Geremias Bernal
4	NILO PUENTE TAMBORES	06- 07/10/2025		Socialización estado placa huella inicio – fin hacia puente tambores
5	NILO PUENTE TAMBORES	06/09/2025		Socialización estado placa huella inicio – fin hacia puente tambores
6	NILO PUENTE TAMBORES	06/10/2025		Estado de la via placa huella inicio – fin hacia puente tambores
7	NILO PUENTE TAMBORES	07/10/2025		Socialización actividad de armado e izaje de puente metálico Tambores
8	TIBACUY MURO DE CONTENCION	12/08/2025	11/12/2025	Solicitud de material de excavación por el señor Hernando Martínez

9	**TIBACUY MURO DE CONTENCION**	**12/08/2025**	**11/12/2025**	**Autorización de material de excavación por el Consorcio ICCU CJIK**
10	**TIBACUY MURO DE CONTENCION**	**12/08/2025**	**11/12/2025**	**Disposición de agua potable por el señor Hernando Martínez**
11	**TIBACUY MURO DE CONTENCION**	**15/08/2025**	**11/12/2025**	**Disposición de agua potable por el señor Hernando Martínez**
12	**TIBACUY MURO DE CONTENCION**	**11/12/2025**	**11/12/2025**	**Acta de cierre de compromisos**
13	**TIBACUY MURO DE CONTENCION**	**03/03/2026**	**03/03/2026**	**Cierre Acta de Vecindad finca sector Martinez**
14	**VENECIA FINCA AZA**	**27/06/2025**		**Acta de vecindad finca los AZA**
15	**VENECIA FINCA AZA**	**01/07/2025**		**Solicitud de permisos campamento para maquinaria y material**
16	**VENECIA FINCA AZA**	**15/07/2025**		**Solicitud de material de excavación**
17	**VENECIA FINCA AZA**	**25/07/2025**		**Solicitud de permiso de botadero material de excavación**
18	**VENECIA FINCA AZA**	**25/07/2025**		**Solicitud de permiso de botadero material de excavación**
19	**VENECIA FINCA AZA**	**24/02/2026**	**24/02/2026**	**Cierre de acta de vecindad finca AZA**
20	**FUSA-SIBATE AVICOLA EL VICTORIAL**	**29/05/2025**	**09/12/2025**	**Solicitud de residuos de excavación por el señor Fernando ortiz**
21	**FUSA-SIBATE AVICOLA EL VICTORIAL**	**02/06/2025**	**09/12/2025**	**Autorización de residuos de excavación por el consorcio**
22	**FUSA-SIBATE VIVERO ROMA VERDE**	**14/08/2025**	**10/12/2025**	**Autorización de disposición de material**
23	**FUSA-SIBATE LOS PINITOS**	**27/11/2025**		**Requerimientos propietarios finca los pinitos**
24	**FUSA-SIBATE AVICOLA EL VICTORIAL**	**09/12/2025**	**09/12/2025**	**Acta de cierre de material de excavación para mejoramiento de terreno Avicola el Victorial**
25	**FUSA-SIBATE VIVERO ROMA VERDE**	**10/12/2025**	**10/12/2025**	**Acta de cierre de dispocion de material y reposición de manquera**
26	**FUSA PR 34 TIERRA NEGRA**	**19/01/2026**		**Acta de vecindad lote VILLA MARIANA**

27	**FUSA PR 34 TIERRA NEGRA**	**19/01/2026**		**Acta de vecindad FINCA LA LOLITA**
28	**FUSA PR 34 TIERRA NEGRA**	**05/02/2026**		**Solicitud de material de excavación Granja la violeta**
29	**FUSA PR 34 TIERRA NEGRA**	**05/02/2026**		**autorización de dispoción material de excavación para la Granja la violeta**
30	**GACHALA SECTOR CAÑO HONDO**	**10/09/2025**		**Socialización de actividades de ingreso de maquinaria a la alcaldía del municipio**
31	**VILLA PINZON VEREDA QUINCHE**	**19/08/2025**		**Socialización de actividades de ingreso de maquinaria a la organización de planeación del municipio**
32	**VILLA PINZON VEREDA QUINCHE**	**30/08/2025**		**Autorización de disposición de agua por la señora Claudia Villagran**
33	**MANTA VARIANTE**	**21/10/2025**		**Socialización de actividades de ingreso de maquinaria a la organización de planeación del municipio**
34	**FUSA EL PLACER**	**12/12/2025**		**Solicitud de material de Fresado por el señor Diego Guerro**
35	**FUSA EL PLACER**	**22/12/2025**		**Acta de entrega de material de Fresado al señor Diego Guerro PARA LA JUNTA DEACCION COMUNAL**
36	**FUSA EL PLACER**	**22/12/2025**		**Acta de entrega de material de Fresado al señor Diego Guerro finca la PONDEROSA**
37	**LA PLAMA TABACAL**	**16/03/2026**		**Acta de vecindad de inicio Sandra Milena Alvarado**
38	**LA PLAMA TABACAL**	**16/03/2026**		**Acta de vecindad de inicio Consuelo Farfan**
39	**LA PLAMA TABACAL**	**16/03/2026**		**Acta de vecindad de inicio Amparo Farfan**

VINCULACION DE PERSONAL

Vincular mínimo el 30% de mano de obra no calificada de la región. El 5% serán mujeres de la región.

PERSONAL FUSA PR 34 PERSONAL TOTAL 2					
CLASIFICACIÓN	**30% - 5% DEL 100%**		**CANTIDAD DE TRABAJADORES**	**CARGOS**	**CUMPLE**
NO CALIFICADOS	**90%**	**100%**	**2**	**AYUDANTES**	**SI CON EL 30%**
MUJERES	**100%**	**100%**	**0**	**AUX TRAFICO**	**SI CON EL 5%**

PERSONAL LA PALMA PUENTE PR 80+900 PERSONAL TOTAL 6					
CLASIFICACIÓN	**30% - 5% DEL 100%**		**CANTIDAD DE TRABAJADORES**	**CARGOS**	**CUMPLE**
NO CALIFICADOS	**90%**	**100%**	**6**	**AYUDANTES**	**SI CON EL 30%**
MUJERES	**0%**	**100%**	**0**	**AUX. TRÁFICO**	**NO CON EL 5%**

PERSONAL LA PALMA MURO PR 78+400 PERSONAL TOTAL 3					
CLASIFICACIÓN	**30% - 5% DEL 100%**		**CANTIDAD DE TRABAJADORES**	**CARGOS**	**CUMPLE**
NO CALIFICADOS	**90%**	**100%**	**2**	**AYUDANTES**	**SI CON EL 30%**
MUJERES	**0%**	**100%**	**1**	**AUX. TRÁFICO**	**NO CON EL 5%**

Numeral 2. 5% sujetos de especial protección constitucional: desplazados, reintegración, víctimas de conflicto armado y lo demás relacionado en el presente numeral.

PERSONAL FUSA - SIBATÉ			
CLASIFICACIÓN	desplazados	reintegración	víctimas de conflicto armado
MUJERES	0%	0%	0%
HOMBRES	0%	0%	0%

PERSONAL LA PALMA			
CLASIFICACIÓN	desplazados	reintegración	víctimas de conflicto armado
MUJERES	0%	0%	0%
HOMBRES	0%	0%	0%

Numeral 27. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) del personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

NACIONALIDAD DEL PERSONAL		
CLASIFICACIÓN	PERSONAL EXTRANJERO	PERSONAL COLOMBIANO
NILO	0%	100%
MANTA	0%	100%
SIBATE-FUSA	0%	100%
LA PALMA	0%	100%

Numeral 52. Suministro e instalación de la valla informativa, teniendo en cuenta que esta debió instalarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la orden de inicio por el ICCU.

SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS.

Teniendo en cuenta el oficio número PS-IEVC-DP-156-25 se solicita se nos informe sobre el avance de esta actividad para cada uno de los frentes de obra que se tienen asignados a la fecha por el ICCU.

Dando alcance al oficio ICCU-CJIK-201-0264, adjunto archivo con los ajustes relacionados a las Vallas. dando cumplimiento a las directrices emitidas por el ICCU - oficina de comunicaciones por medio de correo. (Para elaborar las vallas amablemente solicitamos el plazo de ejecución en meses, así como las fotos en formato JPG y nombradas segùn el frente al que correspondan)

Como respuesta se solicita al Cliente mediante oficio ICCU-CJIK-201-0076, solicitando al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, se hace seguimiento mediante correos electrónicos por las dos partes interesadas:

- 03 febrero el ICCU (oficina de comunicaciones, comunicacionesiccu@gmail.com) solicita que el registro fotográfico enviado sea en formato JPG. se envía correo el mismo día subsanando la solicitud.
- 13 febrero el ICCU (oficina de comunicaciones, comunicacionesiccu@gmail.com) nos solicita optimizar la resolución y el tamaño del registro fotográfico de cada frente de obra.
- 26 de febrero se atiende la solicitud realizada el 13 de febrero para los frentes de obra Pandi, Nilo, Venecia. Se envía a correo corporativo (comunicacionesiccu@gmail.com)
- 03 de marzo se envía correo corporativo (comunicacionesiccu@gmail.com) Dando alcance al registro fotográfico se envía registro fotográfico del frente de TIBACUY.
- 03 de marzo por medio de correo el departamento de comunicaciones del ICCU solicita: Buen día, para elaborar las vallas amablemente solicitamos el registro

fotográfico en formato jpg, sin letras ni marcas de agua, están pendientes las siguientes: VILLA PINZÓN, FUSA, GACHALA, MANTA

- 17 marzo se da alcance y se solicita por vía correo, (comunicacionesiccu@gmail.com): De acuerdo con su solicitud, adjunto el registro fotográfico del frente de Manta. Agradezco amablemente el envío del diseño correspondiente a los frentes de los cuales ya se remitió el registro fotográfico, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.
- 17 marzo se recibe correo por parte: (comunicacionesiccu@gmail.com), solicitado el envío de las fotografías en alta resolución, sin marcas de agua y en formato JPG, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento para la elaboración de las siguientes vallas: Villapinzón, Pandi, Gachalá, Manta.
- 17 marzo Se da respuesta al correo, (comunicacionesiccu@gmail.com): De acuerdo con su solicitud, adjunto el registro fotográfico del frente de Manta y Pandi. Agradezco amablemente el envío del diseño correspondiente a los frentes de los cuales ya se remitió el registro fotográfico, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato. Quedan pendientes el registro fotográfico de Villapinzón y Gachalá
- 17 marzo, se realiza conversación telefónica con el área de comunicaciones ICCU, e informan que los diseños de las vallas ya completas con las fotografías serán enviadas el día miércoles 01 de abril del presente año.

- 23 marzo, se realiza conversación telefónica con el área de comunicaciones ICCU, quienes informan por vía WhatsApp (hubo unos ajustes y tuvimos que enviar a prensa de nuevo esperamos mañana estarte enviando antes de medio día).

- Para el mes de abril se adelantan cotizaciones de las vallas de los frentes ya autorizados. (PANDY, NILO, FUSA, TIBACUY, VENECIA).

LISTADO DE ANEXOS

- **Anexo 1. Ingresos**
- **Anexo 2. Notificación de Riesgos**
- **Anexo 3. Seguridad social**
- **Anexo 4. Copass y Cocola**
- **Anexo 5. Indicadores**
- **Anexo 6. Certificados de accidentalidad**
- **Anexo 7. Inducción SST**
- **Anexo 8. Medicina preventiva**
- **Anexo 9. Dotación y EPP**
- **Anexo 10. Maquinaria y equipos**
- **Anexo 11. Acta de vecindad**
- **Anexo 12. Ambiental**
