# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# SECRETARIA DE HACIENDA
# MUNICIPIO DE CISNEROS
## Nit: 890.910.913



## COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01082

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 27/07/2026

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 01086 | 23/07/2026 |

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 901.509.210 |
| **Nombre:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE |

**CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE**

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO . CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. INT-002-2026 CUYO OBJETO ES MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION D ELOS RECURSOS DEL PROYECTO Y OBRAS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LA ZONA RURAL Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS QUE SE VIERON AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL LINEA 2 SECTOR 2.3. CON EL BPIN 2024051900039

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | **36.042.373,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | 36.042.373,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 36.042.373,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.3.03 | SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 24.038.461,00 |
| | 1.3.3.8.04 | R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 12.003.912,00 |
| CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA | LE2 | INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | 36.042.373,00 |
| CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN | 2402112 | Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional | 36.042.373,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 36.042.373,00 |
| CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN | 240211200 | Vía terciaria con mantenimiento | 12.003.912,00 |
| | 240211807 | Estudios y diseños realizados red vial terciaria | 24.038.461,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD) | 12.003.912,00 |
| | 120108 | LEY/1176/27-12-2007/SGP-Proposito general-Proposito general libre Inversion | 24.038.461,00 |
| CCPET14 - RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT | 1402 | Recursos Superavit Ingresos Sistema General de Participaciones (Existencia En Caja y Bancos ) | 12.003.912,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024051900039 | Mantenimiento de la red vial urbana y rural del municipio de Cisneros | 36.042.373,00 |

**TOTAL PRESENTE ORDEN**

36CF09C811327E1224FA7DD5D14BF28C

**36.042.373,00**

**TOTAL RETENCIONES**

**4.685.509,00**

**TOTAL A PAGAR**

**31.356.864,00**

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 416021913 | Fondos Comunes | 0010844422 | 31.356.864,00 |

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

Impreso por: RUBIELA DEL CARMEN LOPEZ MORALES, el día: lunes, 27 de julio de 2026 siendo las: 17:13:27

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# SECRETARIA DE HACIENDA
# MUNICIPIO DE CISNEROS
## Nit: 890.910.913



**RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|---|---|---|
| Rete-ICA | 1,00 | 360.424,00 |
| Estampilla Pro-Anciano | 4,00 | 1.441.695,00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 1,00 | 360.424,00 |
| Fondo de Seguridad | 5,00 | 1.802.119,00 |
| Estampilla Para La Justicia Familiar | 2,00 | 720.847,00 |

**FIRMAS**

Secretario de Hacienda

Juan Roldan.
Interesado Nit: c.c.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

DAVIVIENDA

eg 1082 1083

Bienvenido: Señor(a) Gladys Margarita Valencia
NIT 8909109133 - MUNICIPIO DE CISNEROS

lunes 27 de julio de 2026

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGO CONTRATO INT-002-2026 | Estado del Pago | Pendiente de Respuesta |
| Producto Origen de los Fondos | 0000000416021913 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 10844422 | Fecha de Creación | 27/07/2026 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 27/07/2026 | Hora de Pago | 11:20 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 31.356.864,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 31.356.864,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 1 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 31.356.864,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 31.356.864,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9015092105 | EMPRESA DE DESARROLLO | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 250256435 | BOGOTA | $ 31.356.864,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |

**© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

# COMPROBANTE ORDEN DE PAGO

**OP Nº 0001086**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00116 | 30/01/2026 |
| 00294 | 30/04/2026 |

**FECHA DE EXPEDICION :** **23/07/2026**

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 901.509.210 |
| **Nombre:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE |

## CONCEPTO DE LA ORDEN:

4E840FC64EC417035F6034B0B96DF1D4

COMPROMISO PAPTAL. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. INT-002-2026 CUYO OBJETO ES MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION D ELOS RECURSOS DEL PROYECTO Y OBRAS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LA ZONA RURAL Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS QUE SE VIERON AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL LINEA 2 SECTOR 2.3. CON EL BPIN 2024051900039

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | **36.042.373,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | 24.038.461,00 |
| | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | 12.003.912,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 24.038.461,00 |
| | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 12.003.912,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.3.03 | SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 24.038.461,00 |
| | 1.3.3.8.04 | R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 12.003.912,00 |
| CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA | LE2 | INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | 24.038.461,00 |
| | LE2 | INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | 12.003.912,00 |
| CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN | 2402112 | Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional | 24.038.461,00 |
| | 2402112 | Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional | 12.003.912,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 24.038.461,00 |
| | C | Con Situación de Fondos | 12.003.912,00 |
| CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN | 240211807 | Estudios y diseños realizados red vial terciaria | 24.038.461,00 |
| | 240211200 | Vía terciaria con mantenimiento | 12.003.912,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120108 | LEY/1176/27-12-2007/SGP-Proposito general-Proposito general libre Inversion | 24.038.461,00 |
| | 120501 | Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD) | 12.003.912,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024051900039 | Mantenimiento de la red vial urbana y rural del municipio de Cisneros | 24.038.461,00 |
| | 2024051900039 | Mantenimiento de la red vial urbana y rural del municipio de Cisneros | 12.003.912,00 |
| CCPET14 - RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT | 1402 | Recursos Superavit Ingresos Sistema General de Participaciones (Existencia En Caja y Bancos ) | 12.003.912,00 |

**VALOR LETRAS:** TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Rete-ICA | 1,00 | 360.424,00 |
| Estampilla Pro-Anciano | 4,00 | 1.441.695,00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 1,00 | 360.424,00 |
| Fondo de Seguridad | 5,00 | 1.802.119,00 |
| Estampilla Para La Justicia Familiar | 2,00 | 720.847,00 |

**TOTAL ORDEN** | **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC** | **TOTAL**

| | | |
|---|---|---|
| 36.042.373,00 | 4.685.509,00 | 31.356.864,00 |

| FIRMAS | |
|---|---|
| Alcalde Municipal | Secretario de Hacienda |

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# SECRETARIA DE HACIENDA
# MUNICIPIO DE CISNEROS
# Nit: 890.910.913



## COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01083

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 27/07/2026

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 01087 | 23/07/2026 |

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 901.509.210 |
| **Nombre:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE |

**CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE**

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL CONTRATO INT-002-2026, SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LA ZONA URBANA Y RURAL, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL. EN EL MARCO DE LA LINEA 2 DEL PDM SECTRO 2.3 PROGRAMA 2.3.1 CON BPIM 2024051900039

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | **1.286.713,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | 1.286.713,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 1.286.713,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.3.03 | SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 858.173,00 |
| | 1.3.3.8.04 | R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 428.540,00 |
| CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA | LE2 | INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | 1.286.713,00 |
| CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN | 2402112 | Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional | 1.286.713,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 1.286.713,00 |
| CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN | 240211200 | Vía terciaria con mantenimiento | 428.540,00 |
| | 240211807 | Estudios y diseños realizados red vial terciaria | 858.173,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD) | 428.540,00 |
| | 120108 | LEY/1176/27-12-2007/SGP-Proposito general-Proposito general libre Inversion | 858.173,00 |
| CCPET14 - RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT | 1402 | Recursos Superavit Ingresos Sistema General de Participaciones (Existencia En Caja y Bancos ) | 428.540,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024051900039 | Mantenimiento de la red vial urbana y rural del municipio de Cisneros | 1.286.713,00 |

**TOTAL PRESENTE ORDEN**

EEC276B445A004994585D581DC113A5F

| TOTAL RETENCIONES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|
| 247.070,00 | 1.039.643,00 |

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 16361484821 | SGP Proposito General Cuenta Mestra | 0000001087 | 1.039.643,00 |

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# SECRETARIA DE HACIENDA
# MUNICIPIO DE CISNEROS
## Nit: 890.910.913



| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Rete-ICA | 1,00 | 10.813,00 |
| Estampilla Pro-Anciano | 4,00 | 43.251,00 |
| Estampilla Pro-Cultura | 2,00 | 21.625,00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 1,00 | 10.813,00 |
| Rete-Iva por Servcios Gravados | 15,00 | 30.816,00 |
| COntratos de administracion Delegada | 10,00 | 108.127,00 |
| Estampilla Para La Justicia Familiar | 2,00 | 21.625,00 |

**FIRMAS**

Secretario de Hacienda

Juan Roldan.
Interesado Nit: c.c.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

# COMPROBANTE ORDEN DE PAGO

## OP Nº 0001087

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00117 | 30/01/2026 |
| 00295 | 30/04/2026 |

**FECHA DE EXPEDICION :** **23/07/2026**

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 901.509.210 |
| **Nombre:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE |

## CONCEPTO DE LA ORDEN:


625785C07D4EC8D6935CEACF2E01BCE1

COMPROMISO PPTAL. CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL CONTRATO INT-002-2026, SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LA ZONA URBANA Y RURAL, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL. EN EL MARCO DE LA LINEA 2 DEL PDM SECTRO 2.3 PROGRAMA 2.3.1 CON BPIM 2024051900039

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | | **1.286.713,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | 858.173,00 |
| | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | 428.540,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 858.173,00 |
| | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 428.540,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.3.03 | SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 858.173,00 |
| | 1.3.3.8.04 | R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 428.540,00 |
| CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA | LE2 | INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | 858.173,00 |
| | LE2 | INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | 428.540,00 |
| CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN | 2402112 | Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional | 858.173,00 |
| | 2402112 | Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional | 428.540,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 858.173,00 |
| | C | Con Situación de Fondos | 428.540,00 |
| CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN | 240211807 | Estudios y diseños realizados red vial terciaria | 858.173,00 |
| | 240211200 | Via terciaria con mantenimiento | 428.540,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120108 | LEY/1176/27-12-2007/SGP-Proposito general-Proposito general libre Inversion | 858.173,00 |
| | 120501 | Ingresos sin destinación especifica (Recursos propios y SGP LD) | 428.540,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024051900039 | Mantenimiento de la red vial urbana y rural del municipio de Cisneros | 858.173,00 |
| | 2024051900039 | Mantenimiento de la red vial urbana y rural del municipio de Cisneros | 428.540,00 |
| CCPET14 - RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT | 1402 | Recursos Superavit Ingresos Sistema General de Participaciones (Existencia En Caja y Bancos ) | 428.540,00 |

**VALOR LETRAS:** UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Rete-ICA | 1,00 | 10.813,00 |
| Estampilla Pro-Anciano | 4,00 | 43.251,00 |
| Estampilla Pro-Cultura | 2,00 | 21.625,00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 1,00 | 10.813,00 |
| Rete-Iva por Servcios Gravados | 15,00 | 30.816,00 |
| COntratos de administracion Delegada | 10,00 | 108.127,00 |
| Estampilla Para La Justicia Familiar | 2,00 | 21.625,00 |



# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# SECRETARIA DE HACIENDA
# MUNICIPIO DE CISNEROS
## Nit: 890.910.913



| TOTAL ORDEN | TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC | TOTAL |
|---|---|---|
| 1.286.713,00 | 247.070,00 | 1.039.643,00 |

| FIRMAS | |
|---|---|
| Alcalde Municipal | Secretario de Hacienda |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: MUNICIPIO DE CISNEROS
NIT Compañía: 0890910913
Fecha Actual: Viernes, 24 de julio de 2026 - 18:49 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000000250256435 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DE BOGOTA | Cuenta local: | R |
| Nombre de beneficiario: | EMPRESA DE DESARRO | Documento: | 000009015092105 |
| Valor: | 31.356.864,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | 310232020 | Referencia: | 2009 |
| Estado: | PAGO RECHAZADO. LA CUENTA DESTINO NO ESTA INSCRITA | | |
| Fecha de aplicación: | 24 de Julio de 2026 | | |

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: MUNICIPIO DE CISNEROS
NIT Compañía: 0890910913
Fecha Actual: Viernes, 24 de julio de 2026 - 18:49 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 00000000250191525 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCO DE BOGOTA | Cuenta local: | P |
| Nombre de beneficiario: | EMPRESA DE DESARRO | Documento: | 000009015092105 |
| Valor: | 1.039.643,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | 310230202 | Referencia: | 005 |
| Estado: | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | | |
| Fecha de aplicación: | 24 de Julio de 2026 | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE CISNEROS
**NIT:** 890910913
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** 890910913
**Secuencia:** V8
**Número de cuenta a debitar:** 16361484821

**Fecha:** 24-07-2026 **Hora:** 18:34:46
**Fecha de Generación:** 24-07-2026

**Fecha de envío del pago:** 24-07-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 24-07-2026

**Impreso por:** MUNICIPIO DE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 4 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $32,396,507.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $31,356,864.00 | **Valor Registros Pendientes:** $1,039,643.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000250256435 | Ahorros | 9015092105 | EMPRESA DE DESARRO | 31,356,864.00 | BANCO DE BOGOTA | PAGO RECHAZADO. LA CUENTA DESTINO NO ESTA INSCRITA | 24-07-2026 |
| 00000000250191525 | Ahorros | 9015092105 | EMPRESA DE DESARRO | 1,039,643.00 | BANCO DE BOGOTA | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | 24-07-2026 |

edu Occidente
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

| CUENTA DE COBRO No. 068 | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | **Día:** 06 | **Mes:** Julio | **Año:** 2026 |
| **MUNICIPIO CISNEROS – ANTIOQUIA** | | | |
| **NIT.** 890.910.913-3. | | **TELÉFONO:** 863 1567 | |
| **DIRECCIÓN:** Carrera 20 # 20-37 Palacio Municipal | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEBE A:** | **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE** | | |
| **NIT.** | 901.509.210-5 | | |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | gerencia@eduoccidente.gov.co | **CELULAR:** | 316 499 9907 |
| **LA SUMA DE:** | **TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 36.042.373)** | | |
| **POR CONCEPTO DE:** | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CONTRATO-INT-002-2026**<br><br>"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL." | | |

NOTAS:

1. Favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No 250256435 a nombre de la Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente– Eduoccidente con NIT. 901509210-5.

**JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO**
Representante Legal

**Banco de Bogotá**
Calle 36 # 7- 47 - Bogotá D.C.
www.bancodebogota.com

**Estamos para usted**
Pyme: 60 1 364 7400
Empresas: 60 1 607 9006

09 de marzo de 2026

¡Buen día!

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE**
**NIT: 901509210-5**

Asunto: Certificación de Cuenta

Nos complace informarle que es titular del producto Cuenta Ahorros No. **250256435,** aperturada el día 09/03/2026, denominada **"CI 002 2026 MUNICIPIO DE CISNEROS CAMINOS VEREDALES"** la Cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Muchas gracias por permitirnos ser su aliado financiero

Banco de Bogotá

Firma autorizada

**Bibiana Valencia Ospina.**
Ejecutiva Banca Oficial Región Antioquia
Teléfono 6042439, Ext. 54527.
Banco de Bogotá.

**Queremos brindarle el mejor servicio,** contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 601 332 0101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Consulte el procedimiento para presentar una queja y las funciones que ejerce el Defensor del Consumidor Financiero ingresando a www.bancodebogota.com/defensordelconsumidor

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Mejor banco en Colombia | Mejor lugar para trabajar | Anuario de Sostenibilidad S&P Global | Empresa Familiarmente Responsable efr

| ALCALDÍA DE CISNEROS<br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | **SOLICITUD DE PAGO DE CUENTAS.** | Código | FO |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de Aprobación | 17/03/2021 |
| | | Versión | |

**EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DD | MM | AA |
| 31 | 05 | 2026 |

**CERTIFICA QUE:**

Que para atender y cancelar los gastos relacionados con el contrato Nro. **CONTRATO-INT-002-2026,** Cuyo objeto es: **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL"** se hace necesario cancelar estos servicios realizados en el tiempo comprendido entre el **30 de enero al 31 de mayo de 2026**, y recibidos a entera satisfacción.

NOTA: La demás documentación reposa en la carpeta del contrato.

Por lo anterior el Municipio de Cisneros - Antioquia, debe a: **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN – EDUOCCIDENTE, NIT. 901.509.210-5, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.788.872 de Medellín**, la suma de: **($37.329.086) TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ML.**
Según registro presupuestal número **000116 del 30 de enero de 2026, registro presupuestal número 000117 del 30 de enero de 2026, registro presupuestal numero 000294 del 30 de abril de 2026, registro presupuestal numero 000295 del 30 de abril de 2026,** cargada a los rubros presupuestales 2.3.2.02.02.005 (Construcción y servicios de la construcción)

**NOTA:**

| | |
|---|---|
| Del CRP N° 000116 | Debitar $ 24.038.461 |
| Del CRP Nº 000117 | Debitar $858.173 |
| Del CRP N° 000294 | Debitar $12.003.912 |
| Del CRP N° 000295 | Debitar $428.540 |

| **RESPONSABLE** | **CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALE**<br>Secretario de Planeación y Obras Publicas |
|---|---|

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

| ALCALDÍA DE CISNEROS<br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | **SOLICITUD DE PAGO DE CUENTAS.** | Código | FO |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de Aprobación | 17/03/2021 |
| | | Versión | |

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Luisa Fernanda Gómez Hernández - Contratista | | 31/05/2026 |
| Revisó | Cristian Leandro Duque Monsalve – Secretario de Planeacion y Obras Publicas | | 31/05/2026 |
| Aprobó | Cristian Leandro Duque Monsalve – Secretario de Planeación y Obras Publicas | | 31/05/2026 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCI**
NIT 901.509.210-5
CR 10 10 20
Tel: (604) 8541560
Sopetrán - Colombia
eduoccidente@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 544**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE CISNEROS | | |
| **NIT** | 890.910.913-3 | **Teléfono** | (604) 8631327 |
| **Dirección** | Carrera 20 N° 20-37 | **Ciudad** | Cisneros - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 06/07/2026, 09:32 |
| **Expedición** | 06/07/2026, 09:32 |
| **Vencimiento** | 06/07/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 1.00 | 1,286,713.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos ochenta y seis mil setecientos trece pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,081,271.43 |
| IVA 19% | 205,441.57 |
| **Total a Pagar** | 1,286,713.00 |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Tarjeta Crédito $ 1,286,713.00

**Observaciones:**
HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No -CONTRATO-INT-002-2026-CISNEROS CAMINOS VEREDALES.
Favor consignar en la Cuenta de AHORROS N0. 250191525 Banco de Bogotá
A nombre de EMPRESA DE DESARROLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE
NOTA: NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DE LO SEÑALADO EN EL RUT, SOMOS UNA ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE RENTA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102392641 aprobado en 20251130 prefijo desde el número 440 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 36b1b96b3a36a43ae48681123f4e5f8391dcb3c0b5fc193d4e838d8a2b6c23c00c9e062ff69281bee1e572eb7e0936c3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco de Bogotá

NIT.860.002.964.4

**Medellín, 09 de marzo de 2026**

**EL BANCO DE BOGOTA A SOLICITUD DEL INTERESADO,**

**Informa que : EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE**
**Identificado con Nit : 901.509.210-5**

**Está vinculado con los siguientes productos financieros:**

☒ Cuenta ahorros **No. 250191525** activa, libre de embargos y genera rendimientos financieros, aperturada desde el 26/08/2021 denominada **"EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE"** no es exenta de GMF.

Se expide esta certificación a nombre del **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE**

Muchas gracias por permitirnos ser su aliado financiero.

Banco de Bogotá

Firma autorizada

**Bibiana Valencia Ospina.**
Ejecutiva Banca Oficial Región Antioquia
Teléfono 6042439, Ext. 54527.
Banco de Bogotá.

**Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco**

| LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PRIMER DESEMBOLSO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN – EDUOCCIDENTE, NIT. 901.509.210-5, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.788.872 de Medellín | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | | | | |
| **NUMERO DEL CONTRATO:** CONTRATO-INT-002-2026 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | |
| **DOCUMENTO** | **REQUIERE** | | **CUMPLE** | |
| | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| Solicitud pago cuenta | X | | x | |
| Constancia de pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales | X | | X | |
| Factura | X | | X | |
| Informe de supervisión | X | | X | |
| Evidencias | X | | X | |
| Adición y Prorroga Nro. 1 | | | | |
| Acta de terminación y recibo a satisfacción | x | | x | |
| Acta de liquidación | x | | x | |
| Constancia publicación contrato GESTION TRANSPARENTE | X | | X | |
| Constancia publicación contrato secop II | X | | X | |
| Acta de inicio | x | | x | |
| Certificados de Registro y compromiso presupuestal | x | | x | |
| Contrato interadministrativo de mandato sin representación CON TRATO-INT-002-2026 | X | | X | |
| Certificado de disponibilidad presupuestal y ECO | X | | X | |

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-05-04, 03:29:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080838560

**Periodo Cotización:** abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

## PAGADO 30/04/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE EDUOCCIDENTE | | |
| **Documento** | NI901509210 | **Dirección** | CR 10 #10 - 20 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8541560 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | SOPETRAN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | ROLDAN ORREGO JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 71788872 |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio |
| CC 1042710074 | MIGUEL ANGEL BEDOYA BAENA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 4.459.256 | $ 713.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 4.459.256 | $ 557.500 | 4,350 | $ 4.459.256 | $ 194.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 4.459.256 | $ 178.400 | $ 89.200 | $ 133.800 | $ 0 | $ 0 |
| CC 71788872 | JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 5.916.750 | $ 946.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 5.916.750 | $ 739.600 | 6,960 | $ 5.916.750 | $ 411.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 5.916.750 | $ 236.700 | $ 118.400 | $ 177.600 | $ 0 | $ 0 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 10.376.006 | $ 10.376.006 | $ 10.376.006 | $ 10.376.006 | $ 1.660.200 | $ 1.297.100 | $ 605.900 | $ 415.100 | $ 207.600 | $ 311.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.497.300 | $ 0 | $ 4.497.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-06-04, 01:32:24 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081649178

**Periodo Cotización:** mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

**PAGADO 29/05/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE EDUOCCIDENTE | | |
| **Documento** | NI901509210 | **Dirección** | CR 10 #10 - 20 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8541560 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | SOPETRAN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | ROLDAN ORREGO JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 71788872 |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio |
| CC 1042710074 | MIGUEL ANGEL BEDOYA BAENA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 4.459.256 | $ 713.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 4.459.256 | $ 557.500 | 4,350 | $ 4.459.256 | $ 194.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 4.459.256 | $ 178.400 | $ 89.200 | $ 133.800 | $ 0 | $ 0 |
| CC 71788872 | JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 5.916.750 | $ 946.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 5.916.750 | $ 739.600 | 6,960 | $ 5.916.750 | $ 411.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 5.916.750 | $ 236.700 | $ 118.400 | $ 177.600 | $ 0 | $ 0 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 10.376.006 | $ 10.376.006 | $ 10.376.006 | $ 10.376.006 | $ 1.660.200 | $ 1.297.100 | $ 605.900 | $ 415.100 | $ 207.600 | $ 311.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.497.300 | $ 0 | $ 4.497.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-07-01, 09:23:38 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082375423

**Periodo Cotización:** junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

**PAGADO 30/06/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE EDUOCCIDENTE | | |
| **Documento** | NI901509210 | **Dirección** | CR 10 #10 - 20 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8541560 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | SOPETRAN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | ROLDAN ORREGO JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 71788872 |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio |
| CC 1042710074 | MIGUEL ANGEL BEDOYA BAENA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 4.459.256 | $ 713.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 4.459.256 | $ 557.500 | 4,350 | $ 4.459.256 | $ 194.000 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 4.459.256 | $ 178.400 | $ 89.200 | $ 133.800 | $ 0 | $ 0 |
| CC 71788872 | JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 5.916.750 | $ 946.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 5.916.750 | $ 739.600 | 6,960 | $ 5.916.750 | $ 411.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 5.916.750 | $ 236.700 | $ 118.400 | $ 177.600 | $ 0 | $ 0 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 10.376.006 | $ 10.376.006 | $ 10.376.006 | $ 10.376.006 | $ 1.660.200 | $ 1.297.100 | $ 605.900 | $ 415.100 | $ 207.600 | $ 311.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.497.300 | $ 0 | $ 4.497.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El de lo

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EFRAIN A MIRA CARVAJAL
Contador Público T.P 163477-T
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA
efrainmira04@hotmail.com
Celular 3505776616

# PERSONA JURÍDICA

Yo, **EFRAIN ANTONIO MIRA CARVAJAL**, identificado con cédula de ciudadanía **No.15.453.285**, en mi condición de Revisor Fiscal de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE** Identificado con **Nit 901.509.210-5** certifico que:

La Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDNETE, se encuentra a paz y salvo de los últimos seis meses (6) por concepto de aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Sopetran (Ant), a los (04) días del mes de MAYO de 2026

Efrain A Mira C

**REVISOR FISCAL**
**Tarjeta Profesional No 163477-T**

EFRAIN A MIRA CARVAJAL
Contador Público T.P 163477-T
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA
efrainmira04@hotmail.com
Celular 3505776616

# PERSONA JURÍDICA

Yo, **EFRAIN ANTONIO MIRA CARVAJAL**, identificado con cédula de ciudadanía **No.15.453.285**, en mi condición de Revisor Fiscal de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE** Identificado con **Nit 901.509.210-5** certifico que:

La Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDNETE, se encuentra a paz y salvo de los últimos seis meses (6) por concepto de aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Sopetran (Ant), a los (04) días del mes de JUNIO de 2026

Efrain A Mira C

**REVISOR FISCAL**
**Tarjeta Profesional No 163477-T**

EFRAIN A MIRA CARVAJAL
Contador Público T.P 163477-T
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA
efrainmira04@hotmail.com
Celular 3505776616

# PERSONA JURÍDICA

Yo, **EFRAIN ANTONIO MIRA CARVAJAL**, identificado con cédula de ciudadanía **No.15.453.285**, en mi condición de Revisor Fiscal de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE** Identificado con **Nit 901.509.210-5** certifico que:

La Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDNETE, se encuentra a paz y salvo de los últimos seis meses (6) por concepto de aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Sopetran (Ant), a los (01) días del mes de JULIO de 2026

Efrain A Mira C

**REVISOR FISCAL**
**Tarjeta Profesional No 163477-T**

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



163477-T

EFRAIN ANTONIO
MIRA CARVAJAL
C.C. 15453285

RESOLUCION INSCRIPCION 365 FECHA 24/11/2011
UNIVERSIDAD U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

174405

Efrain A Mira C

FIRMA DEL TITULAR

92378

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.453.285
MIRA CARVAJAL

APELLIDOS
EFRAIN ANTONIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1973
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.90 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

02-MAY-1992 ALEJANDRIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00031904-M-0015453285-20080726 0001494701A 1 2050014819

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z486A9836E9992C3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EFRAIN ANTONIO MIRA CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15453285 de ALEJANDRIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 163477-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

| | |
|---|---|
| edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | **INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA No. 001**<br>Contrato de Obra No. 035 de 2026<br>Julio 2026 |

## 1. GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS

### 1.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CONTRATO-INT-002-2026

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN |
| **FUNDAMENTO JURIDICO** | Ley 489 de 1998, 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. |
| **ETAPA** | CONTRACTUAL – CELEBRACION |
| **CONVENIENTE MUNICIPIO** | MUNICIPIO DE CISNEROS NIT 890.910.913 |
| **CONVENIENTE - BENEFICIARIO** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN – EDUOCCIDENTE, NIT. 901.509.210-5 |
| **OBJETO** | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. |
| **PLAZO** | TRES (03) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ML (24.896.634), incluido IVA, costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.005(construcción y servicios de la construcción) |
| **NUMEROD EL CDP** | 109 del 02 de enero y 130 del 17 de enero de 2026 |
| **FECHA FIRMA DEL CONTRATO** | 30 DE ENERO DE 2026 |
| **SUPERVISION** | UN FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNCIPIO DE CISNEROS |

### 1.2 CONTRATO DE OBRA No. 035 DE 2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 035 DE 2026 |
| **CONTRATANTE** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| **NIT** | 901.509.210-5 |
| **CONTRATISTA** | V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S |
| **NIT** | 901421866-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
| **C.C** | 43.913.930 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. |
| **VALOR** | VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE – ($24.038.461) |

## 2. SUPERVISION DESARROLLO DE ASPECTOS TECNICOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se llevó a cabo la supervisión técnica de las obligaciones contractuales establecidas en los Contratos de Obra No. **035 – 2026**.

En este proceso, se verificó el avance físico de las actividades ejecutadas, así como la correspondencia entre dichos avances y los valores facturados por los contratistas.

Del mismo modo, se evidenció el desarrollo de las siguientes actividades durante el periodo reportado, las cuales se describen a continuación:

**Contrato de obra No. 035 de 2026**

**VÍA EL SILENCIO**

- ✓ Conformación de Subrasante (motoniveladora)
- ✓ Cargue de materiales fresado con volqueta 7 mt3
- ✓ compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador)

**VÍA LAS CURES**

- ✓ Conformación de Subrasante (motoniveladora)
- ✓ La compactación de vía conformada (vibrocompactador)

**CAMINO SANTA ELENEA - LA EVALIA**

- ✓ Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.
- ✓ Remoción manual de derrumbes Menores.
- ✓ Construcción de desagues para caminos.
- ✓ Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.

**CAMINO SABANALARGO - EL ALGARROBO**

- ✓ Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.
- ✓ Remoción manual de derrumbes Menores.
- ✓ Construcción de desagues para caminos.

- ✓ Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.

**VÍA CAMPO ALEGRE**

- ✓ Conformación de Subrasante (motoniveladora)
- ✓ La compactación de vía conformada (vibrocompactador)

Las actividades previamente detalladas se encuentran debidamente documentadas en los anexos de los Informes de Obra correspondientes al periodo de la presente acta. Dichos anexos, que constituyen parte integral del informe, se entregan junto con el paquete documental respectivo. De igual forma, las memorias de cálculo relacionadas con esta acta se incorporan como soporte técnico y forman parte fundamental del presente informe.

## 3. CONTROL DE PRESUPUESTO

La inyección de recursos al proyecto ha sido con base en las actividades programadas a desarrollar en el mismo. a continuación, se relaciona el balance financiero de la obra donde se mostrará los pagos que se han realizado a los contratistas de obra e interventoría. Asimismo, se relaciona es estado financiero en que se encuentra la el municipio con la Eduoccidente.

| BALANCE FIANCIERO CONTRATO DE OBRA 035 DE 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANCE GENERAL DEL CONTRATO** | | | **PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA** | | |
| Concepto | Valor | | Concepto [Anticipos, Actas, Pagos] | Fecha | Valor |
| Valor Inicial del Contrato | $ 24.038.461 | | Acta N°1 (Presente Acta) | 6/07/2026 | $ 36.042.373 |
| Adición N°1 | $ 12.003.912 | | | | |
| Acta N°1 (Presente Acta) | $ 36.042.373 | | | | |

**TABLA 1 – Balance financiero Contrato de Obra 035 de 2026**

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la relación de las actas presentadas por los **CONTRATISTAS DE OBRA**:

| RELACION DE ACTAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA | VALOR |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Acta N°1 (Presente Acta) | $ 36.042.373 |
| **Total** | **$ 36.042.373** |
| **% Avance** | **100%** |

**TABLA 2 – Relacion de Actas presentadas por el contratista de Obra No. 035 de 2026**

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la relación y estado financiero entre el municipio de **CISNEROS** y la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE.**

| **BALANCE FIANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CONTRATO-INT-002-2026** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANCE GENERAL DEL CONTRATO** | | | **PAGOS REALIZADOS A INTERVENTORIA** | | |
| Concepto | Valor | | Concepto [Anticipos, Actas, Pagos] | Fecha | Valor |
| Valor Inicial del Contrato | $ 24.896.634 | | Desembolso N°1 (Presente Acta) | 6/07/2026 | $ 37.329.086 |
| Adición N°1 | $ 12.432.452 | | | | |
| Valor Desembolso N°1 (Presente Acta) | $ 37.329.086 | | | | |

**Tabla 3 - Balance Fianciero Contrato Interadministrativo**

Asimismo; se representa tabla con los honorarios por administración cobrados por la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE.**

| **HONORARIOS POR ADMINISTRACION** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR SIN HONORARIOS** | **VALOR HONORARIOS** | **VALOR CON HORARIOS** |
| Desembolso N°1 (Presente Acta) | $ 36.042.373 | $ 1.286.713 | $ 37.329.086 |
| **TOTAL** | **$ 544.184.706,27** | **$ 24.974.272,00** | **$ 569.158.978,27** |
| **% de avance** | **100%** | **100%** | **100%** |

**TABLA 4 – Balance financiero Honorarios contrato interadministrativo**

## 4. REGISTROS FOTOGRAFICOS

Con el fin de evidenciar las actividades ejecutadas durante el periodo de seguimiento correspondiente a la presente acta, se remite a los registros fotográficos incluidos en el Informe de Obra además de las Memorias de Cálculo, los cuales forman parte integral del presente informe. Dichos documentos se encuentran debidamente anexados y pueden ser consultados en los complementos incluidos en el paquete documental adjunto.

## 5. SUPERVISION DE PRESENTE ACTA CON % DE AVANCE

Se ha realizado el seguimiento, revisión y supervisión técnica de las actas de obra presentadas hasta la fecha de corte del presente informe, las cuales se encuentran debidamente documentadas en los anexos y en los informes de ejecución correspondientes al periodo reportado.

Durante el desarrollo de la obra no se han presentado novedades o contingencias relevantes, y las actividades se han ejecutado con normalidad, conforme a los plazos estipulados en el contrato y en cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. En consecuencia, se certifica que la ejecución de la obra ha alcanzado un avance del **100 %.**

## 6. CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo reportado, se realizó el seguimiento integral a los aspectos técnicos, financieros, legales y administrativos del proyecto. A la fecha, la ejecución de la obra presenta un avance del 100 %, cumpliendo con lo establecido en el cronograma contractual.

- ✓ La ejecución de las actividades se desarrolló de manera satisfactoria, sin presentar retrasos ni inconvenientes que afectaran el desarrollo normal del proyecto.

- ✓ Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los contratistas, evidenciando el pago correspondiente a sus trabajadores y demás compromisos sociales.
- ✓ El proyecto ha sido ejecutado conforme a las especificaciones establecidas en el contrato y de acuerdo con la normativa técnica vigente aplicable en Colombia.

- ✓ El contratista ha atendido de forma oportuna y diligente las observaciones y recomendaciones emitidas por la supervisión técnica durante el desarrollo de la obra.

- ✓ Se presenta **ACTA DE OBRA No.001 Y FINAL** un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 36.042.373)**

- ✓ **SE AUTORIZA PAGO DE ACTA DE OBRA No. 001 DEL CONTRATO DE OBRA No. 035 DE 2025** que tiene como objeto "**OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.**" por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 36.042.373)**

Cordialmente;

Miguel Bedoya

**MIGUEL ANGEL BEDOYA BAENA**
Director Técnico de Proyectos
Supervisor, Eduoccidente

| ACTA Nro. 01 Y FINAL | CONTRATO No. | 035 DE 2026 | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE CISNEROS<br>Departamento de Antioquia<br>V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES | OBJETO | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CISNEROS |
| | ENTIDAD CONTRATA | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE | |
| | CONTRATATISTA | V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S. | SUPERVISIÓN |
| | VALOR INICIAL | $ 24.038.461,00 VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE | edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO |
| | INTERVENTORIA | MUNICIPIO DE CISNEROS | |
| | PLAZO INICIAL | DOS (2) MESES, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. | |
| | ANTICIPO | N/A | |
| | ACTA DE INICIO | 10/03/2026 | |
| | FECHA DE TERMINACION | 31/05/2026 | |
| | PROORROGA 1 | TRES (3) MESES | |
| | FECHA DE TERMINACION | 30/04/2026 | |
| | ADICION No. 1 ( MOD. 1) | $ 12.003.912,00 DOCE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE | |
| | PROORROGA 2 | 30 DIAS (1 MES) | |
| | FECHA DE TERMINACION | 31/05/2026 | |
| | VALOR FINAL | $ 36.042.373,00 TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE | |
| | PLAZO FINAL | DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS | |
| | % DE AVANCE | 100% | |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | ADICION 1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | EJECUTADO | | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ACTA 1 Y FINAL | | ACUMULADO AL ACTA 1 | | SALDO AL ACTA 1 Y FINAL | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 1 | **VÍA EL SILENCIO** | | | | **$ 5.408.000,00** | | **$ 0,00** | | **$ 5.408.000,00** | | **$ 5.408.000,00** | | **$ 5.408.000,00** | | **$ 0,00** |
| 1,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12,00 | $ 214.500,00 | $ 2.574.000,00 | | | 12,00 | $ 2.574.000,00 | 12,00 | $ 2.574.000,00 | 12,00 | $ 2.574.000,00 | 0,00 | $ - |
| 1,2 | Cargue de materiales fresado con volqueta 7 m3 | Hr | 4,00 | $ 95.000,00 | $ 380.000,00 | | | 4,00 | $ 380.000,00 | 4,00 | $ 380.000,00 | 4,00 | $ 380.000,00 | 0,00 | $ - |
| 1,3 | compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12,00 | $ 204.500,00 | $ 2.454.000,00 | | | 12,00 | $ 2.454.000,00 | 12,00 | $ 2.454.000,00 | 12,00 | $ 2.454.000,00 | 0,00 | $ - |
| 2 | **VÍA LAS CURES** | | | | **$ 5.028.000,00** | | **$ 9.526.914,00** | | **$ 14.554.914,00** | | **$ 14.554.914,00** | | **$ 14.554.914,00** | | **$ 0,00** |
| 2,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12,00 | $ 214.500,00 | $ 2.574.000,00 | 22,74 | $ 4.877.730,00 | 34,74 | $ 7.451.730,00 | 34,74 | $ 7.451.730,00 | 34,74 | $ 7.451.730,00 | 0,00 | $ - |
| 2,2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12,00 | $ 204.500,00 | $ 2.454.000,00 | 22,73 | $ 4.649.184,00 | 34,73 | $ 7.103.184,00 | 34,73 | $ 7.103.184,00 | 34,73 | $ 7.103.184,00 | 0,00 | $ - |
| 3 | **CAMINO SANTA ELENEA - LA EVALIA** | | | | **$ 1.548.000,00** | | **$ 0,00** | | **$ 1.548.000,00** | | **$ 1.548.000,00** | | **$ 1.548.000,00** | | **$ 0,00** |
| 3,1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0,35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 1,20 | $ 140.000,00 | $ 168.000,00 | | | 1,20 | $ 168.000,00 | 1,20 | $ 168.000,00 | 1,20 | $ 168.000,00 | 0,00 | $ - |
| 3,2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 5,00 | $ 15.000,00 | $ 75.000,00 | | | 5,00 | $ 75.000,00 | 5,00 | $ 75.000,00 | 5,00 | $ 75.000,00 | 0,00 | $ - |
| 3,3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 10,00 | $ 24.000,00 | $ 240.000,00 | | | 10,00 | $ 240.000,00 | 10,00 | $ 240.000,00 | 10,00 | $ 240.000,00 | 0,00 | $ - |
| 3,4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1,50 | $ 710.000,00 | $ 1.065.000,00 | | | 1,50 | $ 1.065.000,00 | 1,50 | $ 1.065.000,00 | 1,50 | $ 1.065.000,00 | 0,00 | $ - |
| 4 | **CAMINO SABANALARGO - EL ALGARROBO** | | | | **$ 2.066.144,00** | | **$ 0,00** | | **$ 2.066.144,38** | | **$ 2.066.144,38** | | **$ 2.066.144,38** | | **$ 0,00** |
| 4,1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0,35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 4,00 | $ 140.000,00 | $ 560.000,00 | | | 4,00 | $ 560.000,00 | 4,00 | $ 560.000,00 | 4,00 | $ 560.000,00 | 0,00 | $ - |
| 4,2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 3,00 | $ 14.140,00 | $ 42.420,00 | | | 3,00 | $ 42.420,00 | 3,00 | $ 42.420,00 | 3,00 | $ 42.420,00 | 0,00 | $ - |
| 4,3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 4,00 | $ 24.005,00 | $ 96.020,00 | | | 4,00 | $ 96.020,00 | 4,00 | $ 96.020,00 | 4,00 | $ 96.020,00 | 0,00 | $ - |
| 4,4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1,93 | $ 710.000,00 | $ 1.367.704,00 | | | 1,93 | $ 1.367.704,38 | 1,93 | $ 1.367.704,38 | 1,93 | $ 1.367.704,38 | 0,00 | $ - |
| 5 | **VÍA CAMPO ALEGRE** | | | | **$ 5.028.000,00** | | **$ 0,00** | | **$ 5.028.000,00** | | **$ 5.028.000,00** | | **$ 5.028.000,00** | | **$ 0,00** |
| 5,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12,00 | $ 214.500,00 | $ 2.574.000,00 | | | 12,00 | $ 2.574.000,00 | 12,00 | $ 2.574.000,00 | 12,00 | $ 2.574.000,00 | 0,00 | $ - |
| 5,2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12,00 | $ 204.500,00 | $ 2.454.000,00 | | | 12,00 | $ 2.454.000,00 | 12,00 | $ 2.454.000,00 | 12,00 | $ 2.454.000,00 | 0,00 | $ - |
| | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 19.078.144,00** | | **$ 9.526.914,00** | | **$ 28.605.058,38** | | **$ 28.605.058,38** | | **$ 28.605.058,38** | | **$ 0,00** |
| | **% ADMINISTRACION** | | **23,00%** | | **$ 4.387.973,12** | | **$ 2.191.190,22** | **$ -** | **$ 6.579.163,43** | **$ -** | **$ 6.579.163,43** | **$ -** | **$ 6.579.163,43** | **$ -** | **$ -** |
| | **% UTILIDAD** | | **3,00%** | | **$ 572.344,19** | | **$ 285.807,39** | | **$ 858.151,56** | | **$ 858.151,56** | | **$ 858.151,56** | | **$ -** |
| | **VALOR TOTAL DE OBRA** | | | | **$ 24.038.461,31** | | **$ 12.003.911,61** | | **$ 36.042.373,36** | | **$ 36.042.373,36** | | **$ 36.042.373,36** | | **$ -** |
| | **AJUSTE AL PESO** | | | | **-$ 0,31** | | **$ 0,40** | | **-$ 0,36** | | **-$ 0,36** | | **-$ 0,36** | | |
| | **VALOR TOTAL PROYECTO, A CEROS CENTAVOS** | | | | **$ 24.038.461,00** | | **$ 12.003.912,00** | **$ -** | **$ 36.042.373,00** | | **$ 36.042.373,00** | | **$ 36.042.373,00** | | **$ -** |
| | **PORCENTAJE AVANCE** | | | | | | **49,94%** | | **100,00%** | | **100,00%** | | **100,00%** | | **0,00%** |

**CONTRATISTA**

**NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**SUPERVISIÒN:**

Miguel Bedoya

**MIGUEL ANGEL BEDOYA**
**DIRECTOR TÈCNICO DE PROYECTOS**

**MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA**


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 1,1; 2,1; 5,1 | DESCRIPCIÓN | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | UNIDAD | Hr |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**1. Vía El Silencio**

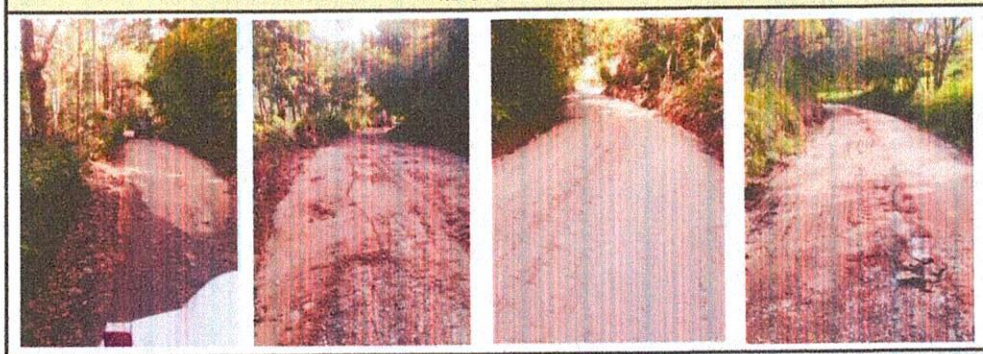

**2. Vía Las Cures**



| Descripcion | Dimensiones | | | Hr | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| **ACTA 1 - Item 1,1** | | | | | |
| Via El Silencio | | | | 12,00 | 12,00 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Via El Silencio** | | | | | **12,00** |
| **ACTA 1 - Item 2,1** | | | | | |
| Vía Las Cures | | | | 34,74 | 34,74 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Vía Las Cures** | | | | | **34,74** |

## 5. Via Campo Alegre






**OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-**

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1; 2,1; 5,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 58,74 | $ 214.500,00 | $ 12.599.730,00 |

**Contratista:**

Firma: Nancy

**Supervisión:**

Firma: Miguel Bedoya

**ACTA 1 - Item 5,1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Campo Alegre | | | | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL ACTA 1. ViaCampo Alegre** | | | | | **12,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | 58,74 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 58,74 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **58,74** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 12.599.730,00** |
| Valor Acumulado | | $ 12.599.730,00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

**MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA**

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu Occidente


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 035 DE 2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| **INTERVENTOR** | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 1,2 | DESCRIPCIÓN | Cargue de materiales fresado con volqueta 7 mt3 | UNIDAD | Hr |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**1.Via El Silencio**



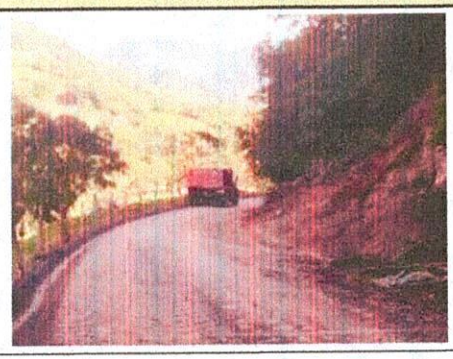



**OBSERVACIONES:**

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Hr | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1 - Item 1,2** | | | | | |
| | | | | 4,00 | 4,00 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Via El Silencio** | | | | | **4,00** |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | 4,00 |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargue de materiales fresado con volqueta 7 mt3 | Hr | 4,00 | $ 95.000,00 | $ 380.000,00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 4,00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **4,00** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 380.000,00** |
| Valor Acumulado | | $ 380.000,00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**Contratista:**

Firma: Nancy

**Supervisión:**

Firma: Miguel Bedoya

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

## MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 1,3; 2,2; 5,2 | DESCRIPCIÓN | compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador) | UNIDAD | Hr |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**1. Via El Silencio**






**OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-**

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Hr | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1. Item 1,3** | | | | | |
| Via El Silencio | | | | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Via El Silencio** | | | | | **12,00** |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | 12,00 |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3; 2,2; 5,2 | compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12,00 | $ 204.500,00 | $ 2.454.000,00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 12,00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **12,00** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 2.454.000,00** |
| Valor Acumulado | | $ 2.454.000,00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**Contratista:**

Firma: _____

**Supervisión:**

Firma: Miguel Bedoya

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

**MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA**

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 035 DE 2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| **INTERVENTOR** | MUNICIPIO DE CISNEROS |


| ÍTEM | 2,2; 5,2 | DESCRIPCIÓN | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | UNIDAD | Hr |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**2. Vía Las Cures**

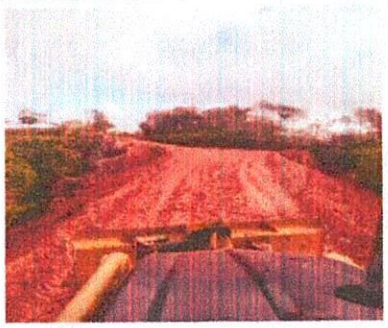

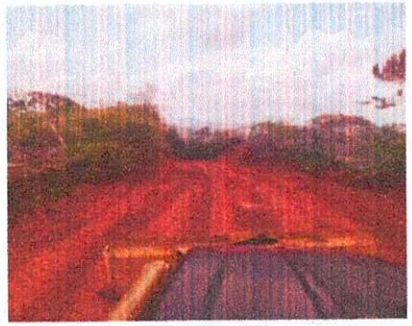

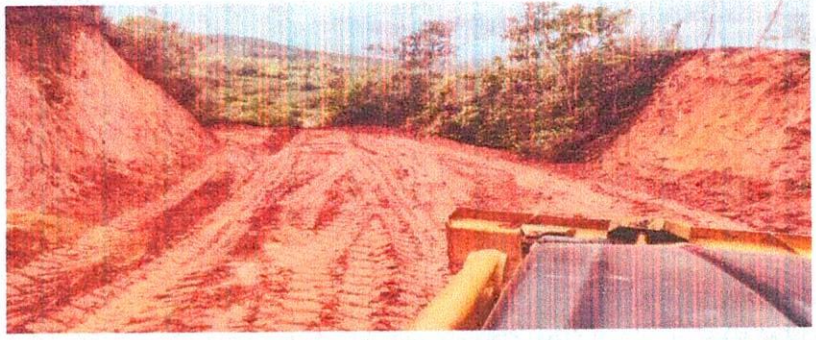

**5. Vía Campo Alegre**

| Descripcion | Dimensiones | | | Hr | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| **ACTA 1 - Item 2,2** | | | | | |
| Vía Las Cures | | | | 34,73 | 34,73 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Vía Las Cures** | | | | | 34,73 |

**ACTA 1 - Item 5,2**





**OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vía Campo Alegre | | | | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL ACTA 1. ViaCampo Alegre** | **12,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | 46,73 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2; 5,2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 46,73 | $ 204.500,00 | $ 9.557.184,00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 46,73 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **46,73** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 9.557.184,00** |
| Valor Acumulado | | $ 9.557.184,00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**Contratista:**

Firma: _____

**Supervisión:**

Firma: _____

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu Occidente


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |


| ÍTEM | 3,1; 4,1 | DESCRIPCIÓN | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**3. Camino Santa Elena - La Evalia**

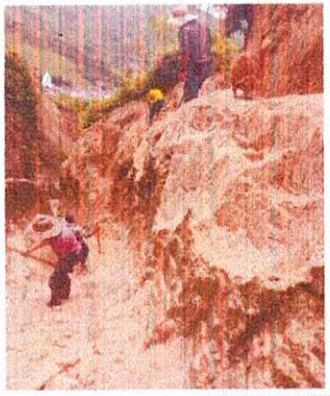

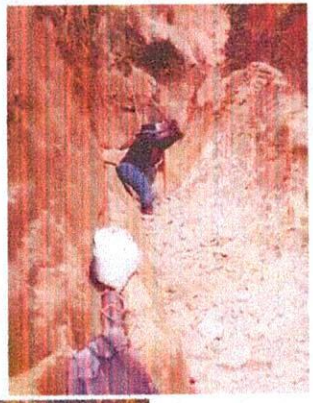


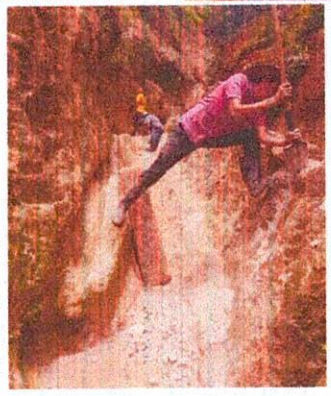

| Descripcion | Dimensiones | | | m3 | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| **ACTA 1 - Item 3,1** | | | | | |
| Camino Santa Elena - La Evalia | 1 | 2,5 | 0,40 | 1,00 | 1,00 |
| | 1 | 2 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Vía Las Cures** | | | | | **1,20** |

## 4. Camino Sabanalarga - El Algarrobo



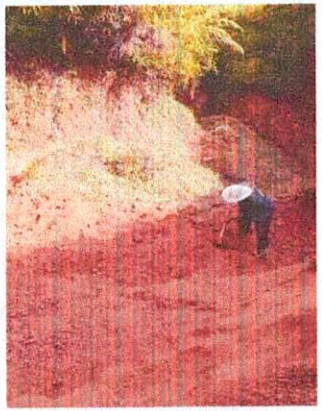

**OBSERVACIONES:** Es el mismo item en descripcion y se ajusta el valor, numerado diferente en cada via-

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1; 4,1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 5,20 | $ 140.000,00 | $ 728.000,00 |

**Contratista:**

Firma: _____

**Supervisión:**

Firma: _____

**ACTA 1 - Item 4,1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camino Sabanalarga - El Algarrobo | 3 | 2,5 | 0,35 | 2,63 | 2,63 |
| | 2 | 2,1 | 0,20 | 0,84 | 0,84 |
| | 1,34 | 2 | 0,20 | 0,54 | 0,54 |
| | | | SUBTOTAL ACTA 1. ViaCampo Alegre | | 4,00 |
| TOTAL ACTA 1 | | | | | 5,20 |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 5,20 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **5,20** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 728.000,00** |
| Valor Acumulado | | $ 728.000,00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA**


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 3,2; 4,2 | DESCRIPCIÓN | Remoción manual de derrumbes Menores. | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**3. Camino Santa Elena - La Evalia**

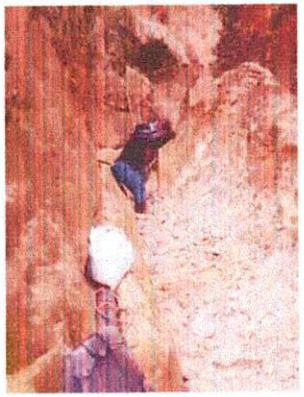

**OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-**

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | factor | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1 - Item 3,2** | | | | | |
| Camino Santa Elena - La Evalia | 1,6 | 1 | 0,50 | 1,35 | 1,08 |
| | 1,8 | 0,9 | 0,40 | 1,35 | 0,87 |
| | 1,7 | 1,1 | 0,60 | 1,35 | 1,51 |
| | 1,5 | 0,95 | 0,45 | 1,35 | 0,87 |
| | 1,3 | 0,75 | 0,50 | 1,35 | 0,66 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Camino Santa Elena - La Evalia** | | | | | **5,00** |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | **5,00** |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2; 4,2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 5,00 | $ 15.000,00 | $ 75.000,00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 5,00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **5,00** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 75.000,00** |
| Valor Acumulado | | $ 75.000,00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**Contratista:**

Firma: Nancy

**Supervisión:**

Firma: Miguel Bedoya

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

**MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA**

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 035 DE 2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| **INTERVENTOR** | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 3,3 | DESCRIPCIÓN | Construcción de desagues para caminos. | UNIDAD | und |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**3. Camino Santa Elena - La Evalia**

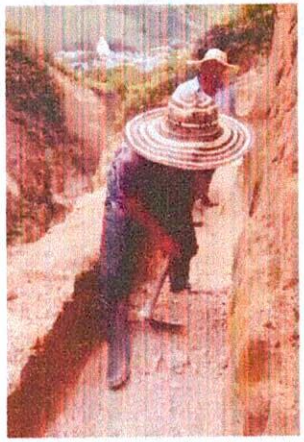

**OBSERVACIONES:**

| Descripcion | Dimensiones | | | unidad | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| **ACTA 1 - Item 3,2** | | | | | |
| Camino Santa Elena - La Evalia | | | | | |
| | | | | 2,00 | 2,00 |
| | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | 3,00 | 3,00 |
| | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | 2,00 | 2,00 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Camino Santa Elena - La Evalia** | | | | | **10,00** |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | **10,00** |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 10,00 | $ 24.000,00 | $ 240.000,00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 10,00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **10,00** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 240.000,00** |
| Valor Acumulado | | $ 240.000,00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**Contratista:**

Firma: Nancy

**Supervisión:**

Firma: Miguel Bedoya

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente

| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 3,4; 4,4 | DESCRIPCIÓN | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | UNIDAD | has |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**3. Camino Santa Elena - La Evalia**






| Descripcion | Dimensiones | | | unidad | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| **ACTA 1 - Item 3,4** | | | | | |
| Camino Santa Elena - La Evalia | | | | 0,50 | 0,50 |
| | | | | 0,59 | 0,59 |
| | | | | 0,41 | 0,41 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Vía Las Cures** | | | | | **1,50** |

**4. Camino Sabanalarga - El Algarrobo**

**ACTA 1 - Item 4,4**



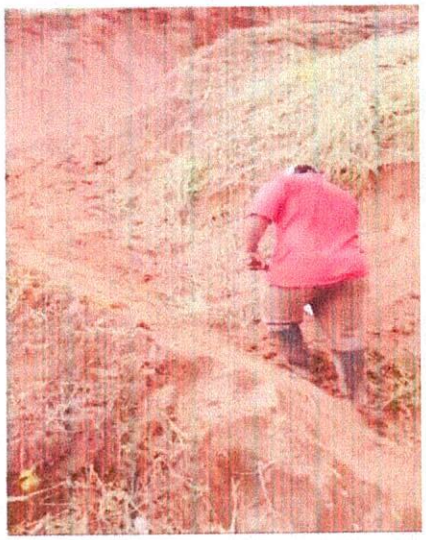

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camino Sabanalarga - El Algarrobo | | | | | |
| | | | | 0,50 | 0,50 |
| | | | | 0,59 | 0,59 |
| | | | | 0,33 | 0,33 |
| | | | | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Camino Sabanalarga - El Algarrobo** | | | | | **1,93** |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | **3,43** |

**OBSERVACIONES:**

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,4; 4,4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 3,43 | $ 710.000,00 | $ 2.432.704,38 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 3,43 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **3,43** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 2.432.704,38** |
| Valor Acumulado | | $ 2.432.704,38 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**Contratista:**

Firma: Nancy

**Supervisión:**

Firma: Miguel Bedoya

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente

| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 4,2 | DESCRIPCIÓN | Remoción manual de derrumbes Menores. | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**4. Camino Sabanalarga - El Algarrobo**



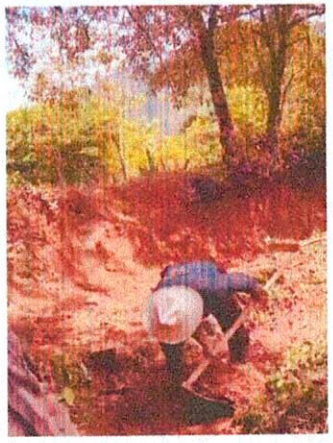

**OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-**

| Descripcion | Dimensiones | | | factor | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| **ACTA 1 - Item 4,2** | | | | | |
| Camino Sabanalarga - El Algarrobo | 1,5 | 1 | 0,35 | 1,35 | 0,71 |
| | 0,9 | 0,7 | 0,60 | 1,35 | 0,51 |
| | 0,9 | 0,9 | 0,45 | 1,35 | 0,49 |
| | 1,1 | 0,65 | 0,50 | 1,35 | 0,48 |
| | 1 | 1 | 0,60 | 1,35 | 0,81 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Camino Sabanalarga - El Algarrobo** | | | | | **3,00** |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | **3,00** |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 3,00 | $ 14.140,00 | $ 42.420,00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 3,00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **3,00** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 42.420,00** |
| Valor Acumulado | | $ 42.420,00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**Contratista:**

Firma: Nancy

**Supervisión:**

Firma: Miguel Bedoya

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 4,3 | DESCRIPCIÓN | Construcción de desagues para caminos. | UNIDAD | und |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**4. Camino Sabanalarga - El Algarrobo**

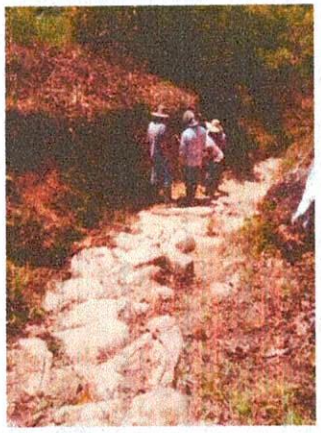

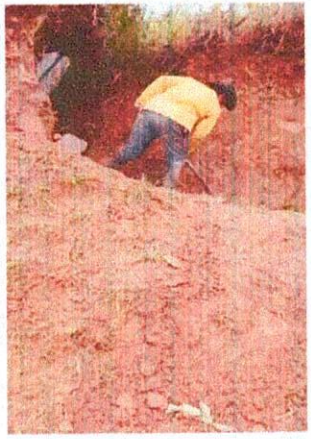



OBSERVACIONES:

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | unidad | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1 - Item 4,3** | | | | | |
| Camino Sabanalarga - El Algarrobo | | | | | |
| | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | 1,00 | 1,00 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Camino Sabanalarga - El Algarrobo** | | | | | **4,00** |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | **4,00** |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 4,00 | $ 24.005,00 | $ 96.020,00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 4,00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **4,00** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 96.020,00** |
| Valor Acumulado | | $ 96.020,00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**Contratista:**

Firma: Nancy

**Supervisión:**

Firma: Miguel Bedoya

# ACTA DE OBRA 1 Y FINAL DE OBRA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE
**Entidad contratante**

**ALCALDÍA DE CISNEROS**
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CISNEROS
**Interventoría**

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S
**Contratista de obra**

OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
**OBJETO**

CONTRATO DE OBRA NRO - 035 DE 2026
**CONTRATO Nro.**

CISNEROS, JUNIO DE 2026

# 01 ACTA Y MEMORIAS

| ACTA Nro. 01 Y FINAL | CONTRATO No. | 035 DE 2026 | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE CISNEROS<br>Departamento de Antioquia | OBJETO | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CISNEROS |
| V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES | ENTIDAD CONTRATA | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE | SUPERVISIÓN |
| | CONTRATISTA | V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S. | edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO |
| | VALOR INICIAL | $ 24,038,461.00 VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE | |
| | INTERVENTORIA | MUNICIPIO DE CISNEROS | |
| | PLAZO INICIAL | DOS (2) MESES, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. | |
| | ANTICIPO | N/A | |
| | ACTA DE INICIO | 10/03/2026 | |
| | FECHA DE TERMINACION | 31/05/2026 | |
| | PROORROGA 1 | TRES (3) MESES | |
| | FECHA DE TERMINACION | 30/04/2026 | |
| | ADICION No. 1 ( MOD. 1) | $ 12,003,912.00 DOCE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE | |
| | PROORROGA 2 | 30 DIAS (1 MES) | |
| | FECHA DE TERMINACION | 31/05/2026 | |
| | VALOR FINAL | $ 36,042,373.00 TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE | |
| | PLAZO FINAL | DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS | |
| | % DE AVANCE | 100% | |

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | ADICION 1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | EJECUTADO | | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ACTA 1 Y FINAL | | ACUMULADO AL ACTA 1 | | SALDO AL ACTA 1 Y FINAL | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 1 | VÍA EL SILENCIO | | | | $ 5,408,000.00 | | $ 0.00 | | $ 5,408,000.00 | | $ 5,408,000.00 | | $ 5,408,000.00 | | $ 0.00 |
| 1.1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12.00 | $ 214,500.00 | $ 2,574,000.00 | | | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 0.00 | $ - |
| 1.2 | Cargue de materiales fresado con volqueta 7 m3 | Hr | 4.00 | $ 95,000.00 | $ 380,000.00 | | | 4.00 | $ 380,000.00 | 4.00 | $ 380,000.00 | 4.00 | $ 380,000.00 | 0.00 | $ - |
| 1.3 | compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12.00 | $ 204,500.00 | $ 2,454,000.00 | | | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 0.00 | $ - |
| 2 | VÍA LAS CURES | | | | $ 5,028,000.00 | | $ 9,526,914.00 | | $ 14,554,914.00 | | $ 14,554,914.00 | | $ 14,554,914.00 | | $ 0.00 |
| 2.1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12.00 | $ 214,500.00 | $ 2,574,000.00 | 22.74 | $ 4,877,730.00 | 34.74 | $ 7,451,730.00 | 34.74 | $ 7,451,730.00 | 34.74 | $ 7,451,730.00 | 0.00 | $ - |
| 2.2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12.00 | $ 204,500.00 | $ 2,454,000.00 | 22.73 | $ 4,649,184.00 | 34.73 | $ 7,103,184.00 | 34.73 | $ 7,103,184.00 | 34.73 | $ 7,103,184.00 | 0.00 | $ - |
| 3 | CAMINO SANTA ELENEA - LA EVALIA | | | | $ 1,548,000.00 | | $ 0.00 | | $ 1,548,000.00 | | $ 1,548,000.00 | | $ 1,548,000.00 | | $ 0.00 |
| 3.1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0,35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 1.20 | $ 140,000.00 | $ 168,000.00 | | | 1.20 | $ 168,000.00 | 1.20 | $ 168,000.00 | 1.20 | $ 168,000.00 | 0.00 | $ - |
| 3.2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 5.00 | $ 15,000.00 | $ 75,000.00 | | | 5.00 | $ 75,000.00 | 5.00 | $ 75,000.00 | 5.00 | $ 75,000.00 | 0.00 | $ - |
| 3.3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 10.00 | $ 24,000.00 | $ 240,000.00 | | | 10.00 | $ 240,000.00 | 10.00 | $ 240,000.00 | 10.00 | $ 240,000.00 | 0.00 | $ - |
| 3.4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1.50 | $ 710,000.00 | $ 1,065,000.00 | | | 1.50 | $ 1,065,000.00 | 1.50 | $ 1,065,000.00 | 1.50 | $ 1,065,000.00 | 0.00 | $ - |
| 4 | CAMINO SABANALARGO - EL ALGARROBO | | | | $ 2,068,144.00 | | $ 0.00 | | $ 2,068,144.38 | | $ 2,068,144.38 | | $ 2,068,144.38 | | $ 0.00 |
| 4.1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0,35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 4.00 | $ 140,000.00 | $ 560,000.00 | | | 4.00 | $ 560,000.00 | 4.00 | $ 560,000.00 | 4.00 | $ 560,000.00 | 0.00 | $ - |
| 4.2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 3.00 | $ 14,140.00 | $ 42,420.00 | | | 3.00 | $ 42,420.00 | 3.00 | $ 42,420.00 | 3.00 | $ 42,420.00 | 0.00 | $ - |
| 4.3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 4.00 | $ 24,005.00 | $ 96,020.00 | | | 4.00 | $ 96,020.00 | 4.00 | $ 96,020.00 | 4.00 | $ 96,020.00 | 0.00 | $ - |
| 4.4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1.93 | $ 710,000.00 | $ 1,367,704.00 | | | 1.93 | $ 1,367,704.38 | 1.93 | $ 1,367,704.38 | 1.93 | $ 1,367,704.38 | 0.00 | $ - |
| 5 | VÍA CAMPO ALEGRE | | | | $ 5,028,000.00 | | $ 0.00 | | $ 5,028,000.00 | | $ 5,028,000.00 | | $ 5,028,000.00 | | $ 0.00 |
| 5.1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12.00 | $ 214,500.00 | $ 2,574,000.00 | | | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 0.00 | $ - |
| 5.2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12.00 | $ 204,500.00 | $ 2,454,000.00 | | | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 0.00 | $ - |
| | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | $ 19,078,144.00 | | $ 9,526,914.00 | | $ 28,605,058.38 | | $ 28,605,058.38 | | $ 28,605,058.38 | | $ 0.00 |
| | % ADMINISTRACION | | 23.00% | | $ 4,387,973.12 | | $ 2,191,190.22 | $ - | $ 6,579,163.43 | $ - | $ 6,579,163.43 | $ - | $ 6,579,163.43 | $ - | $ - |
| | % UTILIDAD | | 3.00% | | $ 572,344.19 | | $ 285,807.30 | | $ 858,151.56 | | $ 858,151.56 | | $ 858,151.56 | | $ - |
| | VALOR TOTAL DE OBRA | | | | $ 24,038,461.31 | | $ 12,003,911.51 | | $ 36,042,373.38 | | $ 36,042,373.38 | | $ 36,042,373.38 | $ - | $ - |
| | AJUSTE AL PESO | | | | -$ 0.31 | | $ 0.49 | | $ 0.36 | | -$ 0.36 | | -$ 0.36 | | |
| | VALOR TOTAL PROYECTO, A CEROS CENTAVOS | | | | $ 24,038,461.00 | | $ 12,003,912.00 | $ - | $ 36,042,373.00 | | $ 36,042,373.00 | | $ 36,042,373.00 | $ - | $ - |
| | PORCENTAJE AVANCE | | | | | | 49.94% | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | 0.00% |

CONTRATISTA

NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISIÓN:

CRISTIAN LEANDO DUQUE MONSALVE
SUPERVISOR EDUOCCIDENTE

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO




| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 1,1; 2,1; 5,1 | DESCRIPCIÓN | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | UNIDAD | Hr |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**1.(Vía El Silencio**

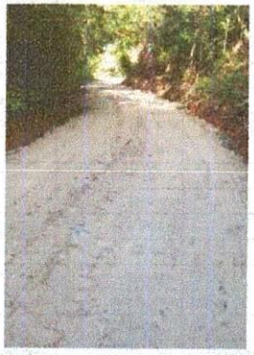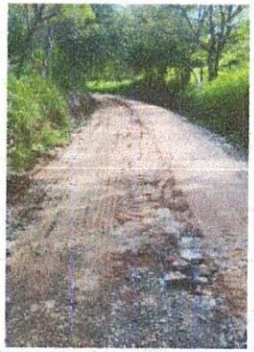**2. Vía Las Cures**




| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Hr | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1 - Item 1,1** | | | | | |
| Vía El Silencio | | | | 12.00 | 12.00 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Vía El Silencio** | | | | | **12.00** |
| **ACTA 1 - Item 2,1** | | | | | |
| Vía Las Cures | | | | 34.74 | 34.74 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Vía Las Cures** | | | | | **34.74** |

## 5. Via Campo Alegre






OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1; 2,1; 5,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 58.74 | $ 214,500.00 | $ 12,599,730.00 |

Contratista:

Firma: Nancy

Supervisión:

Firma:

**ACTA 1 - Item 5,1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Campo Alegre | | | | 12.00 | 12.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL ACTA 1. ViaCampo Alegre | | 12.00 |
| TOTAL ACTA 1 | | | | | 58.74 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 58.74 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA | 58.74 | |
| TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | $ 12,599,730.00 |
| Valor Acumulado | | $ 12,599,730.00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 1.2 | DESCRIPCIÓN | Cargue de materiales fresado con volqueta 7 mt3 | UNIDAD | Hr |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**1. Via El Silencio**



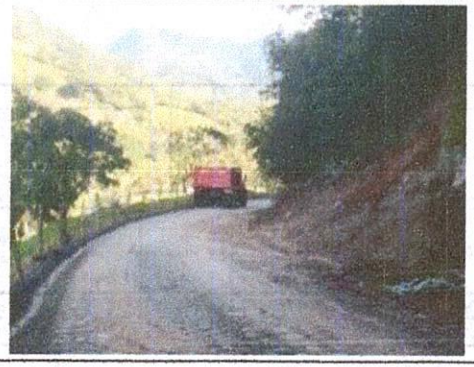



OBSERVACIONES:

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Hr | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1 - Item 1,2** | | | | | |
| | | | | 4.00 | 4.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Via El Silencio** | | | | | 4.00 |
| TOTAL ACTA 1 | | | | | 4.00 |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargue de materiales fresado con volqueta 7 mt3 | Hr | 4.00 | $ 95,000.00 | $ 380,000.00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 4.00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA | 4.00 | |
| TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | $ 380,000.00 |
| Valor Acumulado | | $ 380,000.00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

Contratista:

Firma: Nancy

Supervisión:

Firma:

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 1,3; 2,2; 5,2 | DESCRIPCIÓN | compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador) | UNIDAD | Hr |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**1. Via El Silencio**

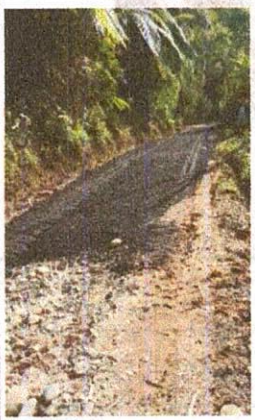




OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Hr | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1. Item 1,3** | | | | | |
| Via El Silencio | | | | 12.00 | 12.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Via El Silencio** | | | | | 12.00 |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | 12.00 |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3; 2,2; 5,2 | compactación de materiales granulares en una via conformada (vibrocompactador) | Hr | 12.00 | $ 204,500.00 | $ 2,454,000.00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 12.00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | 12.00 | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | $ 2,454,000.00 |
| Valor Acumulado | | $ 2,454,000.00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

Contratista:

Firma: Nancy

Supervisión:

Firma: _____

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

**MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA**



ALCALDÍA DE CISNEROS

edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 2,2; 5,2 | DESCRIPCIÓN | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | UNIDAD | Hr |
|---|---|---|---|---|---|
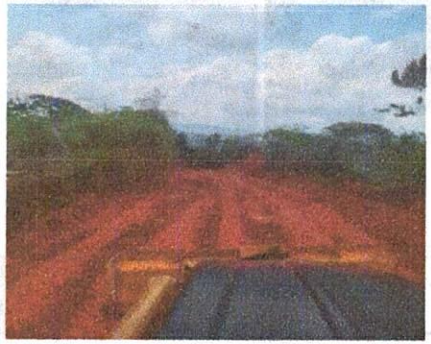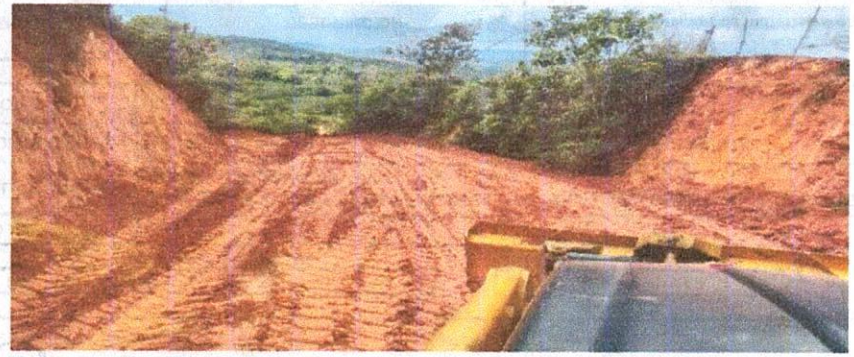
| ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN | Descripcion | Dimensiones | | | Hr | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largo | Ancho | Alto | | |
| 2. Vía Las Cures | ACTA 1 - Item 2,2 | | | | | |
|    | Via Las Cures | | | | 34.73 | 34.73 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SUBTOTAL ACTA 1. Via Las Cures | | | | | 34.73 |
| 5. Via Campo Alegre | ACTA 1 - Item 5,2 | | | | | |





OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Campo Alegre | | | | 12.00 | 12.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL ACTA 1. ViaCampo Alegre | | 12.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTA 1 | | | | | 46.73 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CONDICIONES ACTUALIZADAS

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2; 5,2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 46,73 | $ 204,500.00 | $ 9,557,184.00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 46.73 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA | 46.73 | |
| TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | $ 9,557,184.00 |
| Valor Acumulado | | $ 9,557,184.00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

Contratista:

Firma: _____

Supervisión:

Firma: _____

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |


| ÍTEM | 3,1; 4,1 | DESCRIPCIÓN | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**3. Camino Santa Elena - La Evalia**

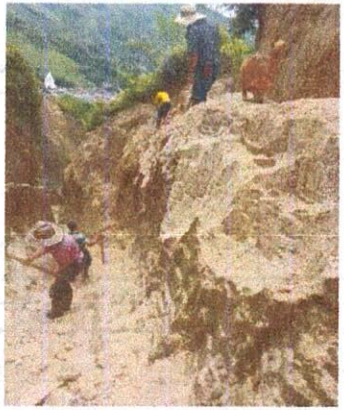

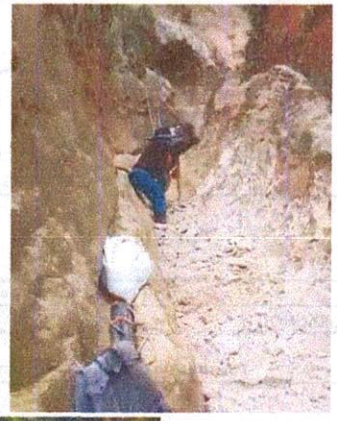


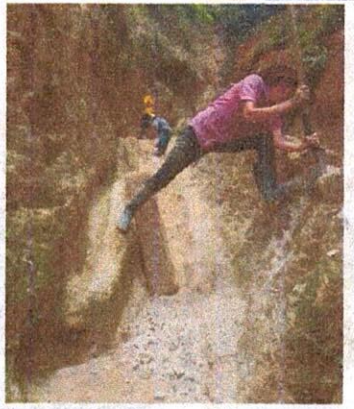

| Descripcion | Dimensiones | | | m3 | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| **ACTA 1 - Item 3,1** | | | | | |
| Camino Santa Elena - La Evalia | 1 | 2.5 | 0.40 | 1.00 | 1.00 |
| | 1 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Via Las Cures** | | | | | **1.20** |

## 4. Camino Sabanalarga - El Algarrobo



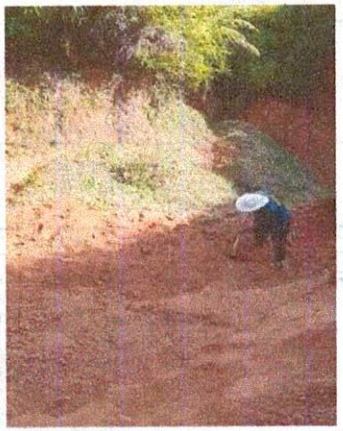

**OBSERVACIONES:** Es el mismo item en descripcion y se ajusta el valor, numerado diferente en cada via-

**ACTA 1 - Item 4,1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camino Sabanalarga - El Algarrobo | 3 | 2,5 | 0.35 | 2.63 | 2.63 |
| | 2 | 2.1 | 0.20 | 0.84 | 0.84 |
| | 1.34 | 2 | 0.20 | 0.54 | 0.54 |
| | | | | SUBTOTAL ACTA 1. ViaCampo Alegre | 4.00 |
| TOTAL ACTA 1 | | | | | 5.20 |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1: 4,1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 5.20 | $ 140,000.00 | $ 728,000.00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 5.20 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **5.20** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | **$ 728,000.00** |
| Valor Acumulado | | $ 728,000.00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

**Contratista:**

Firma: _____

**Supervisión:**

Firma: _____

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 3,2; 4,2 | DESCRIPCIÓN | Remoción manual de derrumbes Menores. | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**3. Camino Santa Elena - La Evalia**

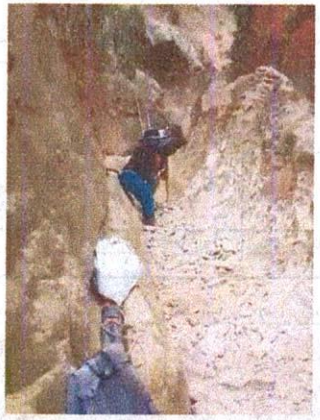

OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | factor | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1 - Item 3,2** | | | | | |
| Camino Santa Elena - La Evalia | 1.6 | 1 | 0.50 | 1.35 | 1.08 |
| | 1.8 | 0.9 | 0.40 | 1.35 | 0.87 |
| | 1.7 | 1.1 | 0.60 | 1.35 | 1.51 |
| | 1.5 | 0.95 | 0.45 | 1.35 | 0.87 |
| | 1.3 | 0.75 | 0.50 | 1.35 | 0.66 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Camino Santa Elena - La Evalia** | | | | | **5.00** |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | **5.00** |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2; 4,2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 5.00 | $ 15,000.00 | $ 75,000.00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 5.00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA | 5.00 | |
| TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | $ 75,000.00 |
| Valor Acumulado | | $ 75,000.00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

Contratista:

Firma: Nancy

Supervisión:

Firma:

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 3.3 | DESCRIPCIÓN | Construcción de desagues para caminos. | UNIDAD | und |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**3. Camino Santa Elena - La Evalia**



OBSERVACIONES:

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | unidad | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1 - Item 3,2** | | | | | |
| Camino Santa Elena - La Evalia | | | | | |
| | | | | 2.00 | 2.00 |
| | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | | | 3.00 | 3.00 |
| | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | | | 2.00 | 2.00 |
| SUBTOTAL ACTA 1. Camino Santa Elena - La Evalia | | | | | 10.00 |
| TOTAL ACTA 1 | | | | | 10.00 |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 10.00 | $ 24,000.00 | $ 240,000.00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 10.00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA | 10.00 | |
| TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | $ 240,000.00 |
| Valor Acumulado | | $ 240,000.00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

Contratista:

Firma: Nancy

Supervisión:

Firma:

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ITEM | 3,4; 4,4 | DESCRIPCIÓN | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | UNIDAD | has |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**


**3. Camino Santa Elena - La Evalia**



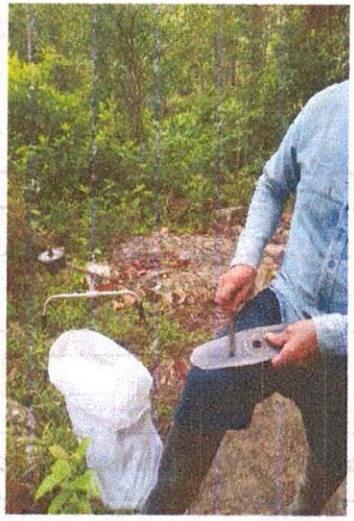

| Descripcion | Dimensiones | | | unidad | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| **ACTA 1 - Item 3,4** | | | | | |
| Camino Santa Elena - La Evalia | | | | 0.50 | 0.50 |
| | | | | 0.59 | 0.59 |
| | | | | 0.41 | 0.41 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Via Las Cures** | | | | | 1.50 |

## 4. Camino Sabanalarga - El Algarrobo

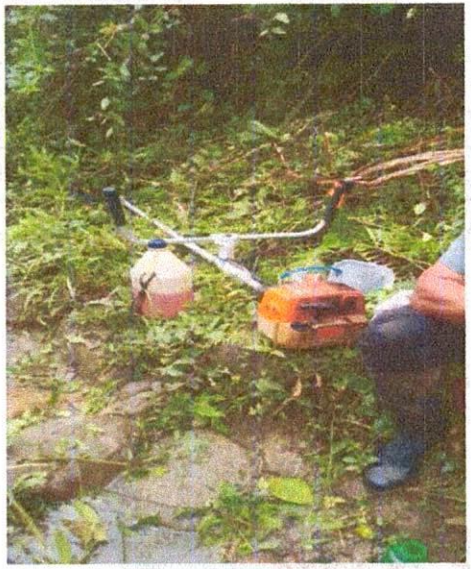



**OBSERVACIONES:**

## ACTA 1 - Item 4,4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camino Sabanalarga - El Algarrobo | | | | | |
| | | | | 0.50 | 0.50 |
| | | | | 0.59 | 0.59 |
| | | | | 0.33 | 0.33 |
| | | | | 0.51 | 0.51 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL ACTA 1. Camino Sabanalarga - El Algarrobo | 1.93 |
| TOTAL ACTA 1 | | | | | 3.43 |

## CONDICIONES ACTUALIZADAS

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,4; 4,4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 3.43 | $ 710,000.00 | $ 2,432,704.38 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 3.43 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA | 3.43 | |
| TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | $ 2,432,704.38 |
| Valor Acumulado | | $ 2,432,704.38 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

Contratista:

Firma: Nancy P.

Supervisión:

Firma: _____

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO


| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 4.2 | DESCRIPCIÓN | Remoción manual de derrumbes Menores. | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**4. Camino Sabanalarga - El Algarrobo**

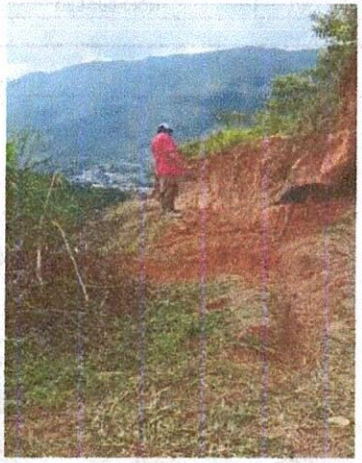

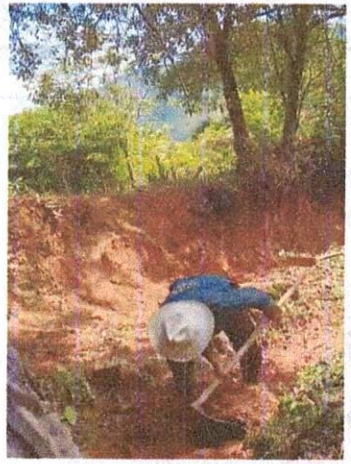

OBSERVACIONES: Es el mismo item en descripcion y valor, numerado diferente en cada via-

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | factor | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 - Item 4,2 | | | | | |
| Camino Sabanalarga - El Algarrobo | 1.5 | 1 | 0.35 | 1.35 | 0.71 |
| | 0.9 | 0.7 | 0.60 | 1.35 | 0.51 |
| | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 1.35 | 0.49 |
| | 1.1 | 0.65 | 0.50 | 1.35 | 0.48 |
| | 1 | 1 | 0.60 | 1.35 | 0.81 |
| SUBTOTAL ACTA 1. Camino Sabanalarga - El Algarrobo | | | | | 3.00 |
| TOTAL ACTA 1 | | | | | 3.00 |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 3.00 | $ 14,140.00 | $ 42,420.00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 3.00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA | 3.00 | |
| TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | $ 42,420.00 |
| Valor Acumulado | | $ 42,420.00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

Contratista:

Firma: Nancy

Supervisión:

Firma:

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES

# MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA DE CISNEROS

edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

| FECHA: | DD | 1 | MM | 6 | AAAA | 2026 | ACTA No. | 1 Y FINAL | ELABORO | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 035 DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |
| ENTIDAD CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| INTERVENTOR | MUNICIPIO DE CISNEROS |

| ÍTEM | 4.3 | DESCRIPCIÓN | Construcción de desagues para caminos. | UNIDAD | und |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN**

**4. Camino Sabanalarga - El Algarrobo**



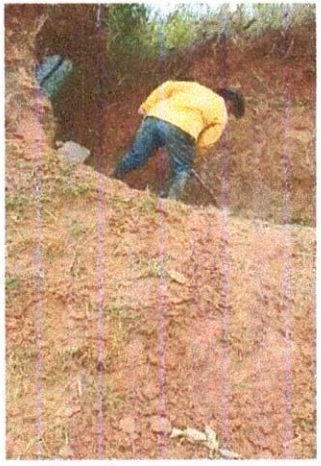



OBSERVACIONES:

| Descripcion | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | unidad | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA 1 - Item 4,3** | | | | | |
| Camino Sabanalarga - El Algarrobo | | | | | |
| | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | | | 1.00 | 1.00 |
| **SUBTOTAL ACTA 1. Camino Sabanalarga - El Algarrobo** | | | | | **4.00** |
| **TOTAL ACTA 1** | | | | | **4.00** |

**CONDICIONES ACTUALIZADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 4.00 | $ 24,005.00 | $ 96,020.00 |

| DESCRIPCION | PARCIALES | |
|---|---|---|
| Cantidad Acumulada Ejecutada | 4.00 | |
| Cantidad Pagada Actas Anteriores | 0 | |
| **TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA** | **4.00** | |
| **TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | $ 96,020.00 |
| Valor Acumulado | | $ 96,020.00 |
| Valor Por Ejecutar | | $ - |

Contratista:

Firma: Nancy

Supervisión:

Firma:

# 02 INFORME TECNICO

# INFORME EJECUTIVO DE OBRA
# ACTA DE OBRA Nro. 001 (V1)

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE
**Entidad contratante**

ALCALDÍA DE CISNEROS
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CISNEROS
**Interventoría**

V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S
**Contratista de obra**

OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
**OBJETO**

CONTRATO DE OBRA NRO - 035 DE 2026
**CONTRATO Nro.**

CISNEROS, JUNIO DE 2026

Dirección: Avenida 26 No. 52 -200 Bello Antioquia
Teléfono: 597 15 48 - Celular: 3147998391
E-mail: vesa.sys.sas@gmail.com

CONTENIDO

**1. LOCALIZACIÓN ..... 6**
**2. ESTADO DEL CONTRATO ..... 9**
2.1. Resumen del contrato: ..... 9
2.2. Pólizas del Contrato: ..... 9
2.2.1. Pólizas iniciales ..... 10
2.2.2. Pólizas Ampliación 1 ..... 11
**3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA ..... 11**
**4. CANTIDADES CONTRACTUALES ..... 11**
**5. ESTADO DE PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA ..... 12**
**6. ADICIONES ..... 12**
**7. RESUMEN DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ..... 15**
7.1. Cantidades ejecutadas ..... 15
7.2. Cantidades ejecutadas ..... 16
7.3. Resumen financiero de actas ..... 18
7.4. Avance de obra ..... 18
7.4.1. Frente de obra Vía El Silencio ..... 18
7.4.2. El Frente de obra Vía Las Cures ..... 19
7.4.3. El Frente de obra Camino Santa Elena - La Evalia ..... 20
7.4.4. El Frente de obra Camino Sabanalarga - El Algarrobo ..... 21
7.4.5. El Frente de obra Vía Campo Alegre ..... 21
7.5. Equipos utilizados ..... 23
**8. AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL ..... 23**
8.1. PQRS ..... 24
8.2. Manejo de Cuerpos de Agua ..... 24
8.3. Manejo de fauna y flora ..... 24
8.4. Área SST ..... 25
8.4.1. Diagnóstico de Condiciones de Trabajo ..... 25
8.4.2. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (SSI) ..... 25
8.4.3. Paz y salvos ..... 26
8.4.4. Higiene y Seguridad en el Trabajo ..... 26
**9. ANEXOS ..... 27**

## LISTADO DE TABLAS

**Tabla 1.** Localización proyecto ..... 6
**Tabla 2.** Datos generales del contrato ..... 9
**Tabla 3.** Pólizas contractuales ..... 10
**Tabla 3.** Pólizas adición y ampliación ..... 11
**Tabla 3.** Datos de cantidades contractuales ..... 11
**Tabla 4.** Datos pagos realizados ..... 12
**Tabla 5.** Cantidades adición 1 ..... 13
**Tabla 7.** Actividades Contractuales ejecutadas ..... 16
**Tabla 8.** Resumen financiero por actas parciales ..... 18
**Tabla 9.** Relación de Equipos, Maquinaria y vehículos ..... 23
**Tabla 10.** Diagnóstico de condiciones de trabajo ..... 25
**Tabla 11.** Personal según seguridad social ..... 25
**Tabla 12.** Causales de Ausentismo ..... 26

## LISTADO DE FOTOS

**Foto 1.** Registro actividades El Silencio ..... 7
**Foto 2.** Registro actividades Vía Las Cures ..... 7
**Foto 3.** Registro Camino Santa Elena - La Evalia ..... 7
**Foto 4.** Registro Camino Sabanalarga - El Algarrobo ..... 8
**Foto 5.** Registro Vía Campo Alegre ..... 8
**Foto 6.** Conformación de Subrasante (motoniveladora) ..... 18
**Foto 7.** Conformación de Subrasante (motoniveladora) ..... 18
**Foto 8.** Cargue de materiales fresado con volqueta 7 $mt^3$ ..... 19
**Foto 9.** Compactación de materiales granulares en una vía conformada ..... 19
**Foto 10.** Compactación de materiales granulares en una vía conformada ..... 19
**Foto 11.** Compactación de materiales granulares en una vía conformada ..... 19
**Foto 12.** Conformación de Subrasante ..... 19
**Foto 13.** Conformación de Subrasante (motoniveladora) ..... 19
**Foto 14.** Conformación de Subrasante ..... 20
**Foto 15.** Conformación de Subrasante ..... 20
**Foto 16.** Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad ..... 20
**Foto 17.** Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad ..... 20
**Foto 18.** Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad ..... 21
**Foto 19.** Remoción manual de derrumbes Menores y Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante ..... 21
**Foto 20.** Remoción manual de derrumbes Menores y Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante ..... 21
**Foto 21.** Conformación de Subrasante (motoniveladora) ..... 22
**Foto 22.** Conformación de Subrasante (motoniveladora) ..... 22
**Foto 23.** Conformación de Subrasante (motoniveladora) ..... 22
**Foto 24.** Conformación de Subrasante (motoniveladora) ..... 22
**Foto 25.** La compactación de vía conformada (vibrocompactador) ..... 22
**Foto 26.** La compactación de vía conformada (vibrocompactador) ..... 22
**Foto 27.** Vibrocompactador de llantas ..... 23
**Foto 28.** Motoniveladora ..... 23
**Foto 29.** Uso de volquetas ..... 23
**Foto 30.** Retro excavadora de llantas ..... 23

# INTRODUCCIÓN

El contrato tiene como finalidad la ejecución de OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, ANTIOQUIA, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – 035 DE 2026. Las intervenciones se realizan en varias veredas del municipio y buscan optimizar la transitabilidad, garantizar la durabilidad de las obras de drenaje y mejorar la movilidad peatonal y vehicular en la región Nordeste del departamento, contribuyendo así al desarrollo social y a la conectividad de las comunidades locales.

El presente informe mensual tiene como propósito detallar el avance y la ejecución de las actividades correspondientes al Contrato de Obra No. 035 de 2026, suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE y la firma V&S Suministros y Soluciones S.A.S., cuyo objeto específico es el mantenimiento manual de vías y caminos veredales en el municipio de Cisneros.

Este contrato fue inicialmente pactado por un periodo de un (1) mes, con un valor de $24.038.461. Posteriormente, mediante la Modificación No. 1 y la Adición con Prórroga No. 1, se adicionó un valor de $12.003.912 y se amplió el plazo hasta el 31 de mayo de 2026, para un total de dos (2) meses de ejecución (60 días).

El informe presenta el seguimiento detallado de las actividades desarrolladas, evidenciando los avances y la correcta ejecución del contrato, así como las acciones adoptadas para el cumplimiento de los objetivos contractuales.

Asimismo, se incluyen registros fotográficos, métricas de avance y las novedades relevantes que hayan incidido en el desarrollo del proyecto, en cumplimiento de las cláusulas contractuales y bajo la supervisión de la entidad contratante.

# 1. LOCALIZACIÓN

Cisneros es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Yolombó, por el este con los municipios de Yolombó y Santo Domingo, y por el sur con Santo Domingo.

En cuanto a la localización del proyecto, se encuentra localizado en las siguientes veredas.

- VÍA EL SILENCIO
- VÍA LAS CURES
- CAMINO SANTA ELENEA - LA EVALIA
- CAMINO SABANALARGA - EL ALGARROBO
- VÍA CAMPO ALEGRE

**Tabla 1.** Localización proyecto

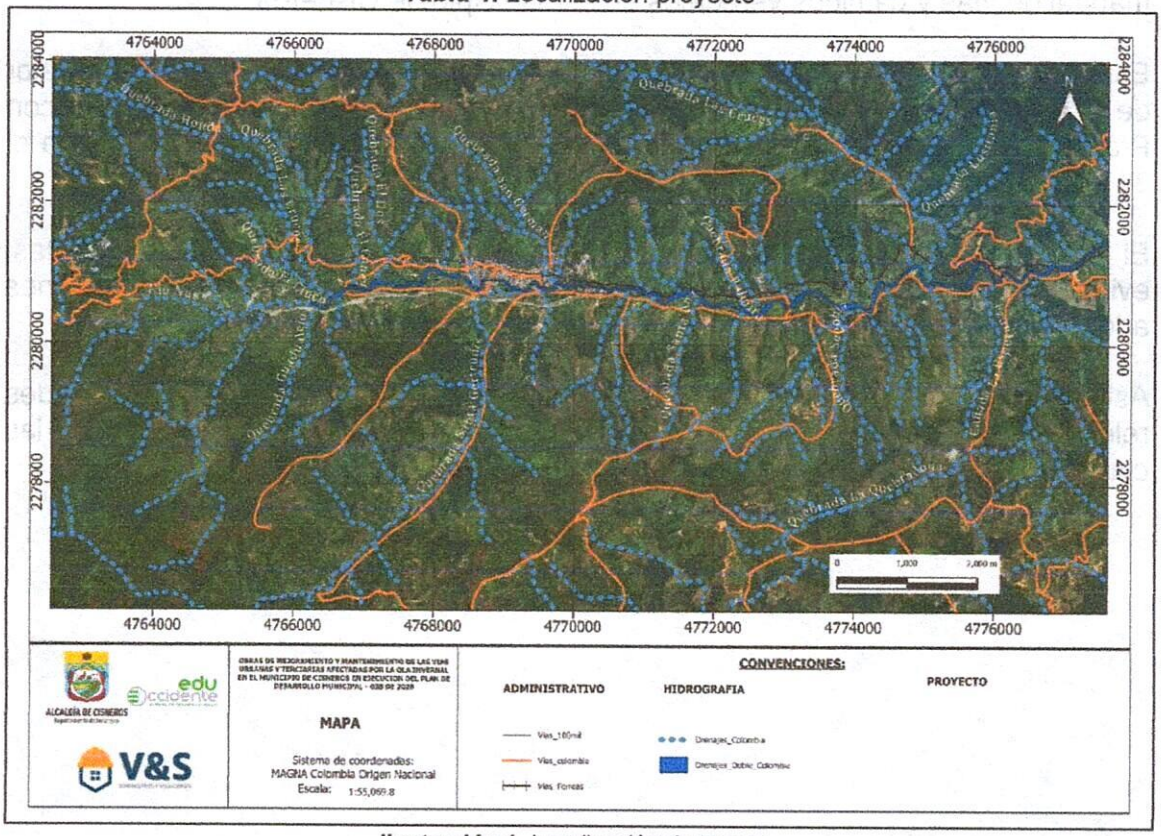



**Ilustración 1.** Localización de tramos
Fuente: Ficha de priorización manteamiento manual 2024

A continuación, se muestran algunas fotos del durante de las actividades contractuales.

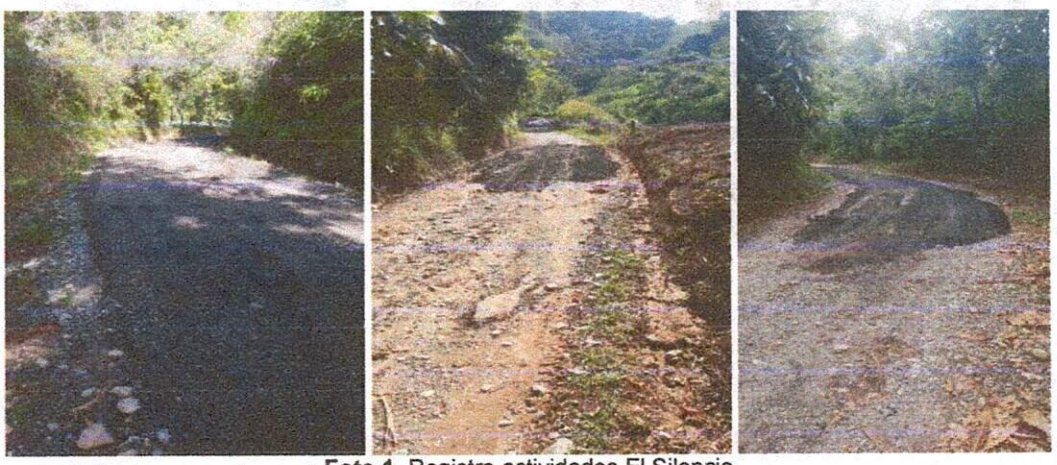


**Foto 1.** Registro actividades El Silencio



**Foto 2.** Registro actividades Vía Las Cures



**Foto 3.** Registro Camino Santa Elena - La Evalia

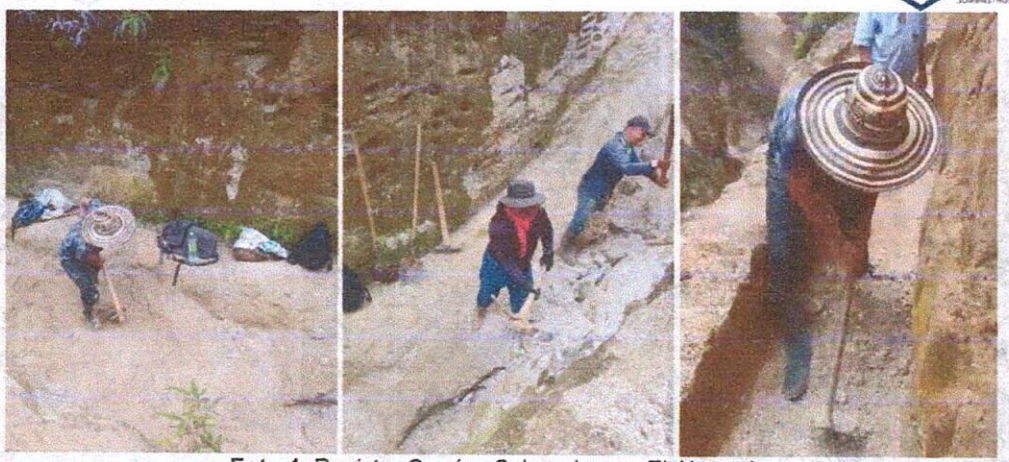


**Foto 4.** Registro Camino Sabanalarga - El Algarrobo

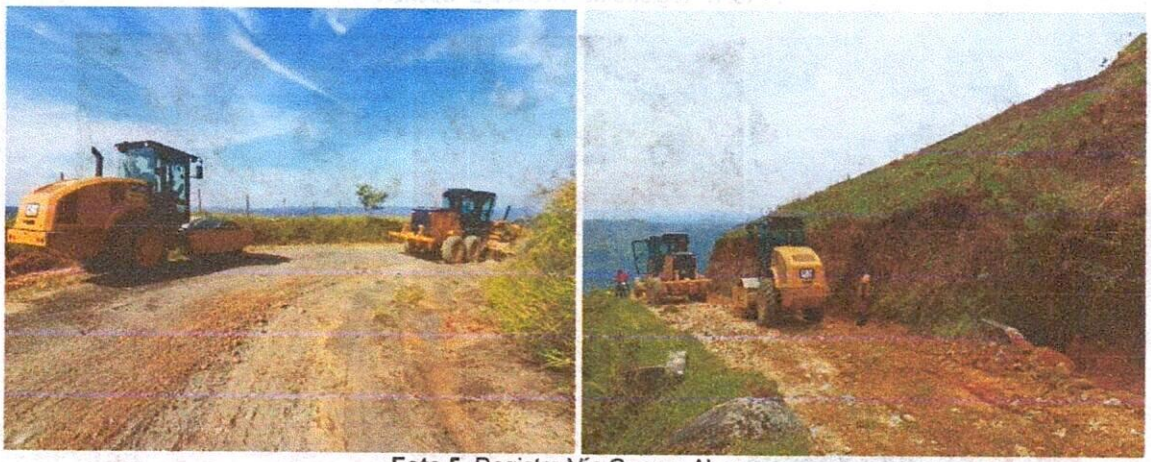


**Foto 5.** Registro Vía Campo Alegre

## 2. ESTADO DEL CONTRATO

Se tiene el ACTA DE INICIO del 13 de noviembre de 2024, del contrato de obra y ACTA DE RECIBO DE OBRA del 12 de enero de 2025.

### 2.1. Resumen del contrato:

Se presenta la información general del Contrato de Obra y las garantías contractuales, en la siguiente tabla:

**Tabla 2.** Datos generales del contrato

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 035 DE 2026 |
| **CONTRATANTE** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| **NIT** | 901.509.210-5 |
| **CONTRATISTA** | V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S |
| **NIT** | 901421866-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
| **C.C** | 43.913.930 |
| **OBJETO** | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. |
| **VALOR** | VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE – ($24.038.461) |
| **PLAZO** | HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026. |
| **FECHA** | NUEVE (09) DE MARZO 2026. |
| **ADICIÓN PRESUPUESTAL:** | ADICIONAR al Contrato de Obra 035 de 2026 la suma de DOCE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE – ($12.003.912) |
| **PRORROGA A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | PRORROGAR el Contrato de Obra 035 de 206 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2026. |

*(Ver Anexo 1. Documentos legales)*

### 2.2. Pólizas del Contrato:

Se aprueban las garantías constituidas por el contratista, en donde mediante acta de aprobación, se indica por parte de EDUOCCIDENTE que las pólizas cumplen con las condiciones establecidas en el contrato, acta que fue expedida en Sopetrán, Antioquia, el 10 de marzo de 2026, firmada por el Gerente General de, Juan Carlos Roldán Orrego.

- **Entidad contratante:** Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE.
- **Contratista:** V&S Suministros y Soluciones S.A.S
- **Objeto del contrato:** Obras de mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y terciarias afectadas por la ola invernal en Cisneros, Antioquia.

**Garantías exigidas en el contrato**

1. **Cumplimiento:** 10% del valor, vigente durante la ejecución y 6 meses adicionales.
2. **Pago de salarios y prestaciones sociales:** 5% del valor, vigente durante la ejecución y 3 años adicionales.
3. **Calidad del servicio:** 10% del valor, vigente durante la ejecución y 5 años adicionales.
4. **Responsabilidad civil extracontractual:** 200 SMMLV, vigente durante el contrato.

- **Pólizas presentadas y aprobadas**
- **Póliza de Cumplimiento No. 510 47 994000028867**
  - Cumplimiento: $2.403.846,10 (vigencia: 09/03/2026 – 06/09/2026)
  - Salarios y prestaciones: $1.201.923,05 (vigencia: 09/03/2026 – 30/04/2029)
  - Calidad del servicio: $2.403.846,10 (vigencia: 30/04/2026 – 30/04/2031)
- **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 74 994000007068**
  - Valor: 200 SMMLV
  - Vigencia: igual al plazo de ejecución del contrato.

A continuación, se hace referencia a las pólizas de seguro del contrato de obra y sus respectivas ampliaciones y adiciones.

### 2.2.1. Pólizas iniciales

**Tabla 3.** Pólizas contractuales

| Tipo de garantía / póliza | Valor asegurado | Vigencia desde | Vigencia hasta |
|---|---|---|---|
| **Cumplimiento (Póliza No. 510 47 994000028867)** | $2.403.846,10 | 09/03/2026 | 06/09/2026 |
| **Pago de salarios y prestaciones sociales** | $1.201.923,05 | 09/03/2026 | 30/04/2029 |
| **Calidad del servicio** | $2.403.846,10 | 30/04/2026 | 30/04/2031 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsabilidad civil extracontractual (Póliza No. 74 994000007068)** | 200 SMMLV | Durante ejecución del contrato | Igual al plazo del contrato |

### 2.2.2. Pólizas Ampliación 1

**Tabla 4.** Pólizas adición y ampliación

| Tipo de garantía / póliza | Valor asegurado | Vigencia desde | Vigencia hasta |
|---|---|---|---|
| **Cumplimiento (Póliza No. 510 47 994000028867)** | $2.403.846,10 | 09/03/2026 | 30/11/2026 |
| **Pago de salarios y prestaciones sociales** | $1.201.923,05 | 09/03/2026 | 31/05/2029 |
| **Calidad del servicio** | $2.403.846,10 | 30/04/2026 | 30/04/2031 |
| **Responsabilidad civil extracontractual (Póliza No. 74 994000007068)** | 200 SMMLV | Durante ejecución del contrato | Igual al plazo del contrato |

*(Ver Anexo 2. Pólizas contrato iniciales y ampliación)*

## 3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Según la minuta contractual, la forma de pago está estipulada por porcentaje de avance de la obra. Este pago se realiza una vez emitida la factura correspondiente al porcentaje de avance alcanzado, previa presentación de actas parciales de obra.

A la fecha no se ha generado Acta de Obra No. 1.

## 4. CANTIDADES CONTRACTUALES

Acorde con la cláusula PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar y desarrollar el siguiente objeto MANTENIMIENTO MANUAL DE VIAS Y CAMINOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS. SEGUNDA: ALCANCE:

El contratista se compromete a ejecutar las labores contratadas de la siguiente forma:

**Tabla 5.** Datos de cantidades contractuales

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **VÍA EL SILENCIO** | | | | $ 5.408.000,00 |
| 1,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12,00 | $214.500,00 | $ 2.574.000,00 |
| 1,2 | cargue de materiales fresado con volqueta 7 mt3 | Hr | 4,00 | $ 95.000,00 | $ 380.000,00 |
| 1,1 | compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12,00 | $204.500,00 | $ 2.454.000,00 |
| 2 | **VÍA LAS CURES** | | | | $ 5.028.000,00 |
| 2,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12,00 | $214.500,00 | $ 2.574.000,00 |

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12,00 | $204.500,00 | $ 2.454.000,00 |
| 3 | CAMINO SANTA ELENEA - LA EVALIA | | | Total | $ 1.548.000,00 |
| 3,1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 12,00 | $ 14.000,00 | $ 168.000,00 |
| 3,2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 5,00 | $ 15.000,00 | $ 75.000,00 |
| 3,3 | Construcción de desagües para caminos. | und | 10,00 | $ 24.000,00 | $ 240.000,00 |
| 3,4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1,50 | $710.000,00 | $ 1.065.000,00 |
| 4 | CAMINO SABANALARGA - EL ALGARROBO | | | | $ 2.066.144,00 |
| 4,1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 4,00 | $140.000,00 | $ 560.000,00 |
| 4,2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 3,00 | $ 14.140,00 | $ 42.420,00 |
| 4,3 | Construcción de desagües para caminos. | und | 4,00 | $ 24.005,00 | $ 96.020,00 |
| 4,4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1,93 | $710.000,00 | $ 1.367.704,00 |
| 5 | VÍA CAMPO ALEGRE | | | | $ 5.028.000,00 |
| 5,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12,00 | $214.500,00 | $ 2.574.000,00 |
| 5,2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12,00 | $204.500,00 | $ 2.454.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | $19.078.144,00 |
| % ADMINISTRACION 23,00% | | | | | $ 4.387.973,12 |
| % UTILIDADES 3,00% | | | | | $ 572.344,19 |
| VALOR TOTAL DE OBRA | | | | | $24.038.461,00 |

Fuente: Elaboración propia

## 5. ESTADO DE PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA

**Tabla 6.** Datos pagos realizados

| Acta Facturada | Factura Nro. | Mes De Presentación Del Acta | Valor Acta | Valor Pagado En Acta |
|---|---|---|---|---|
| No aplica | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| TOT. COBRADO | | | | $0,00 |
| TOT. PAGADO | | | | $0,00 |
| POR FACTURAR | | | | $0,00 |

Fuente: Elaboración propia

## 6. ADICIONES

El 16 de abril de 2026, la empresa V&S Suministros y Soluciones S.A.S., representada por Nancy Adriana Marín Monsalve, solicitó a EDUOCCIDENTE la Adición No. 001 al Contrato de Obra No. 035 de 2026. La solicitud se fundamenta en las afectaciones ocasionadas por la ola invernal, que deterioraron significativamente las vías en tierra, especialmente en el sector Las Cures, generando zonas intransitables y pérdida de material. Para recuperar la

transitabilidad, se requieren actividades adicionales como la conformación de subrasante con motoniveladora y la compactación con vibrocompactador.

El valor de la adición asciende a $12.003.912,09, equivalente al 49,93% del valor inicial del contrato, porcentaje que se encuentra dentro del límite legal del 50% establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

A continuación, se detallan las razones principales que sustentan esta solicitud:

**Tabla 7.** Cantidades adición 1

| ITEM | ACTIVIDAD | NIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **VÍA LAS CURES** | | | | |
| 2.1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 22.74000000 | $ 214,500.00 | $ 4,877,730.00 |
| 2.2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 22.73439833 | $ 204,500.00 | $ 4,649,184.46 |
| **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 9,526,914.46** |
| **% ADMINISTRACION 23,00%** | | | | | **$ 2,191,190.33** |
| **% UTILIDADES 3,00%** | | | | | **$ 285,807.30** |
| **VALOR TOTAL DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA** | | | | | **$ 12,003,912.09** |

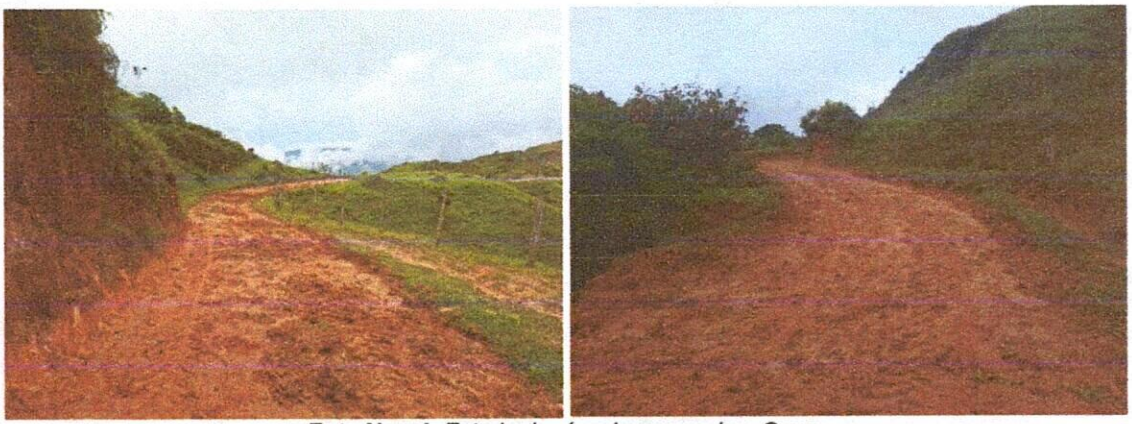


**Foto Nro. 1.** Estado de vías de acceso Las Cures

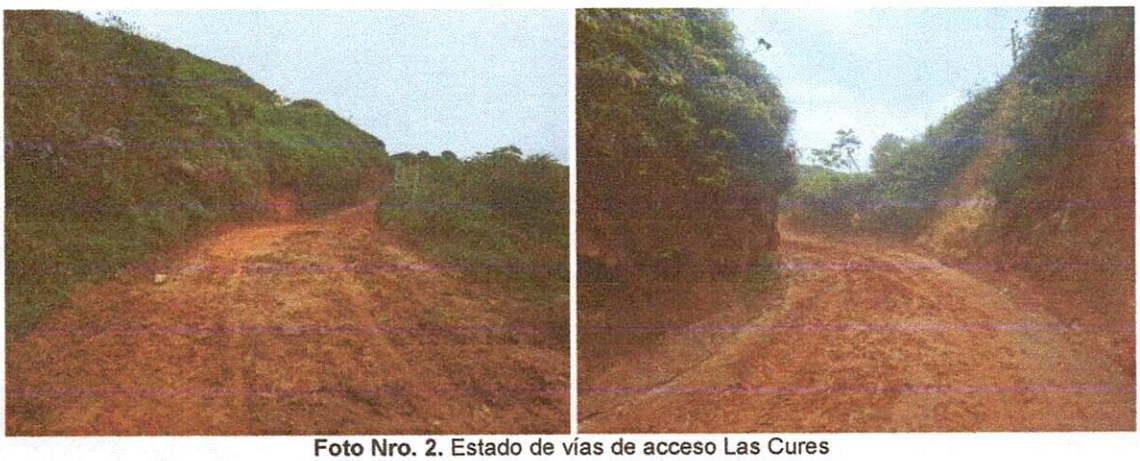


**Foto Nro. 2.** Estado de vías de acceso Las Cures


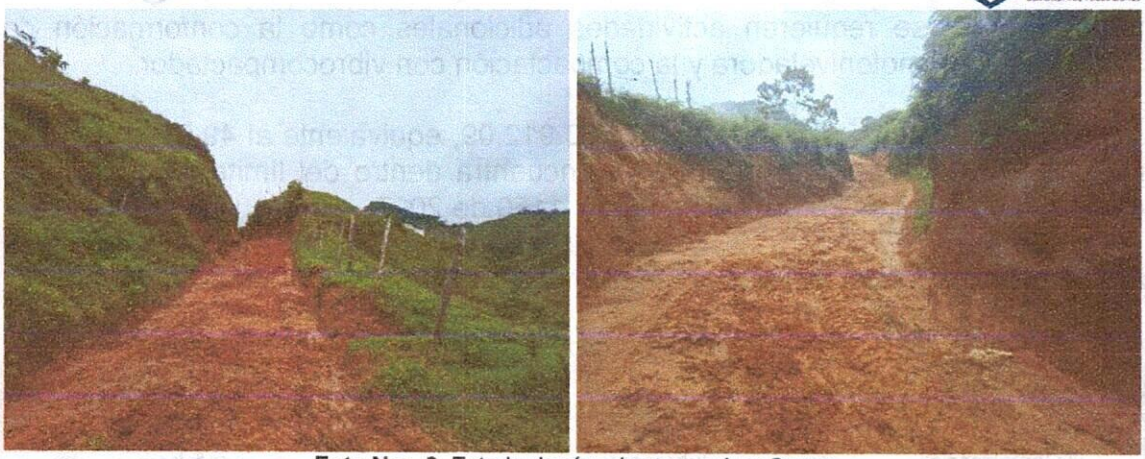


**Foto Nro. 3.** Estado de vías de acceso Las Cures

Por lo anterior, dicha adición fue finalmente aprobada por parte de la Etidad contratante, mediante documento MOD 1 - Adición y prorroga Contrato de Obra 035 2026 – Cisneros, del cual hace parte integral de este informe en su anexo 01 Documentos legales.

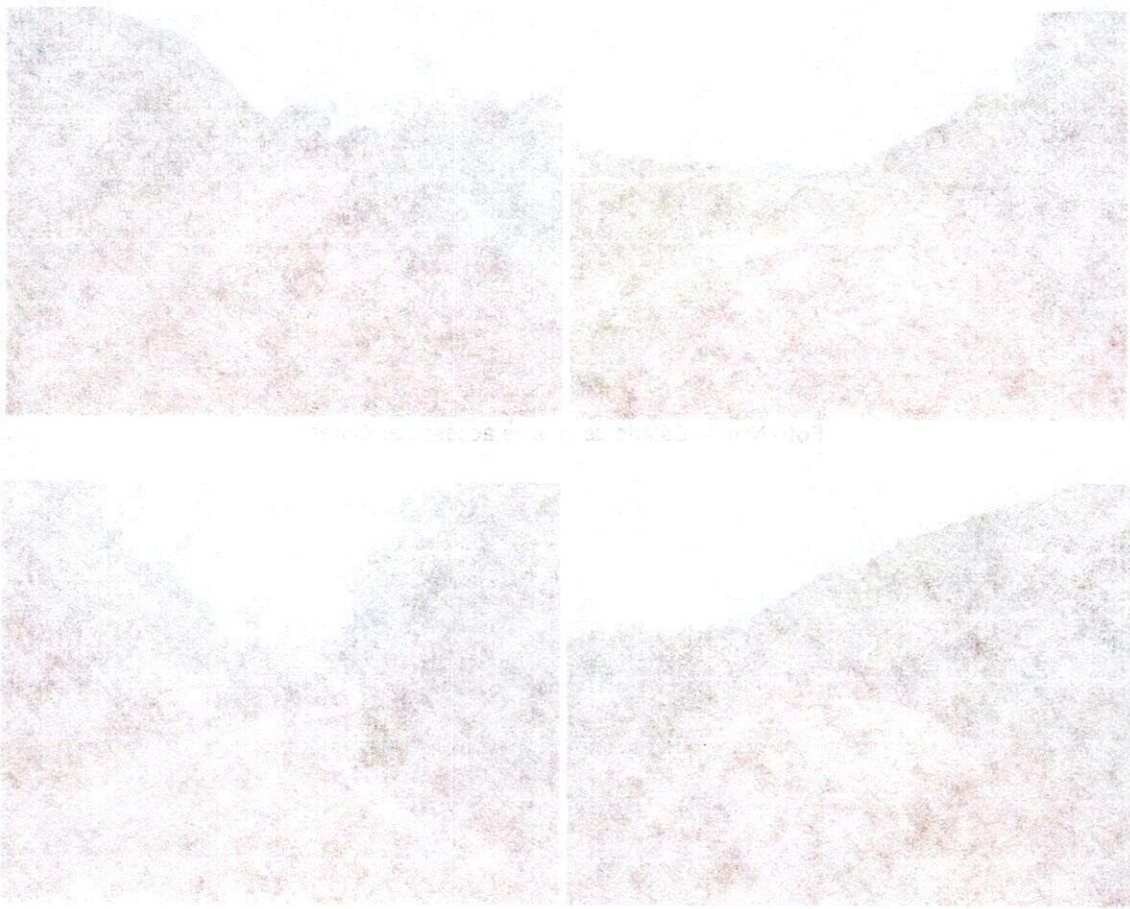

# 7. RESUMEN DE SEGUIMIENTO TÉCNICO

Acorde con el contrato, se tienen las siguientes actividades:

**Vía El Silencio**
- Conformación de subrasante con motoniveladora
- Cargue de materiales fresados con volqueta
- Compactación de materiales granulares con vibrocompactador

**Vía Las Cures**
- Conformación de subrasante con motoniveladora
- Compactación de vía conformada con vibrocompactador

**Camino Santa Elena – La Evalia**
- Excavación manual de material heterogéneo
- Remoción manual de derrumbes menores
- Construcción de desagües para caminos
- Rocería en ambas márgenes del camino

**Camino Sabanalarga – El Algarrobo**
- Excavación manual de material heterogéneo
- Remoción manual de derrumbes menores
- Construcción de desagües para caminos
- Rocería en ambas márgenes del camino

**Vía Campo Alegre**
- Conformación de subrasante con motoniveladora
- Compactación de vía conformada con vibrocompactador

## 7.1. Cantidades ejecutadas

Según la **Tabla 6.** Actividades Contractuales ejecutadas, se tiene la siguiente ejecución de las obras.

## 7.2. Cantidades ejecutadas

**Tabla 8.** Actividades Contractuales ejecutadas

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | ADICION 1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | EJECUTADO | | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ACTA 1 Y FINAL | | ACUMULADO AL ACTA 1 | | SALDO AL ACTA 1 Y FINAL | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 1 | VÍA EL SILENCIO | | | | $ 5,408,000.00 | | $ 0.00 | | $ 5,408,000.00 | | $ 5,408,000.00 | | $ 5,408,000.00 | | $ 0.00 |
| 1.1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12.00 | $ 214,500.00 | $ 2,574,000.00 | | | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 0.00 | $ - |
| 1.2 | Cargue de materiales fresado con volqueta 7 mt3 | Hr | 4.00 | $ 95,000.00 | $ 380,000.00 | | | 4.00 | $ 380,000.00 | 4.00 | $ 380,000.00 | 4.00 | $ 380,000.00 | 0.00 | $ - |
| 1.3 | compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12.00 | $ 204,500.00 | $ 2,454,000.00 | | | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 0.00 | $ - |
| 2 | VÍA LAS CURES | | | | $ 5,028,000.00 | | $ 9,526,914.00 | | $ 14,554,914.00 | | $ 14,554,914.00 | | $ 14,554,914.00 | | $ 0.00 |
| 2.1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12.00 | $ 214,500.00 | $ 2,574,000.00 | 22.74 | $ 4,877,730.00 | 34.74 | $ 7,451,730.00 | 34.74 | $ 7,451,730.00 | 34.74 | $ 7,451,730.00 | 0.00 | $ - |
| 2.2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12.00 | $ 204,500.00 | $ 2,454,000.00 | 22.73 | $ 4,649,184.00 | 34.73 | $ 7,103,184.00 | 34.73 | $ 7,103,184.00 | 34.73 | $ 7,103,184.00 | 0.00 | $ - |
| 3 | CAMINO SANTA ELENEA - LA EVALIA | | | | $ 1,548,000.00 | | $ 0.00 | | $ 1,548,000.00 | | $ 1,548,000.00 | | $ 1,548,000.00 | | $ 0.00 |
| 3.1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 1.20 | $ 140,000.00 | $ 168,000.00 | | | 1.20 | $ 168,000.00 | 1.20 | $ 168,000.00 | 1.20 | $ 168,000.00 | 0.00 | $ - |
| 3.2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 5.00 | $ 15,000.00 | $ 75,000.00 | | | 5.00 | $ 75,000.00 | 5.00 | $ 75,000.00 | 5.00 | $ 75,000.00 | 0.00 | $ - |
| 3.3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 10.00 | $ 24,000.00 | $ 240,000.00 | | | 10.00 | $ 240,000.00 | 10.00 | $ 240,000.00 | 10.00 | $ 240,000.00 | 0.00 | $ - |
| 3.4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1.50 | $ 710,000.00 | $ 1,065,000.00 | | | 1.50 | $ 1,065,000.00 | 1.50 | $ 1,065,000.00 | 1.50 | $ 1,065,000.00 | 0.00 | $ - |
| 4 | CAMINO SABANALARGO - EL ALGARROBO | | | | $ 2,066,144.00 | | $ 0.00 | | $ 2,066,144.38 | | $ 2,066,144.38 | | $ 2,066,144.38 | | $ 0.00 |
| 4.1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 4.00 | $ 140,000.00 | $ 560,000.00 | | | 4.00 | $ 560,000.00 | 4.00 | $ 560,000.00 | 4.00 | $ 560,000.00 | 0.00 | $ - |
| 4.2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 3.00 | $ 14,140.00 | $ 42,420.00 | | | 3.00 | $ 42,420.00 | 3.00 | $ 42,420.00 | 3.00 | $ 42,420.00 | 0.00 | $ - |
| 4.3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 4.00 | $ 24,005.00 | $ 96,020.00 | | | 4.00 | $ 96,020.00 | 4.00 | $ 96,020.00 | 4.00 | $ 96,020.00 | 0.00 | $ - |
| 4.4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1.93 | $ 710,000.00 | $ 1,367,704.00 | | | 1.93 | $ 1,367,704.38 | 1.93 | $ 1,367,704.38 | 1.93 | $ 1,367,704.38 | 0.00 | $ - |
| 5 | VÍA CAMPO ALEGRE | | | | $ 5,028,000.00 | | $ 0.00 | | $ 5,028,000.00 | | $ 5,028,000.00 | | $ 5,028,000.00 | | $ 0.00 |

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | ADICION 1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | EJECUTADO | | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ACTA 1 Y FINAL | | ACUMULADO AL ACTA 1 | | SALDO AL ACTA 1 Y FINAL | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 5.1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12.00 | $ 214,500.00 | $ 2,574,000.00 | | | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 12.00 | $ 2,574,000.00 | 0.00 | $ - |
| 5.2 | La compactación de via conformada (vibrocompactador) | Hr | 12.00 | $ 204,500.00 | $ 2,454,000.00 | | | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 12.00 | $ 2,454,000.00 | 0.00 | $ - |
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | $ 19,078,144.00 | | $ 9,526,914.00 | | $ 28,605,058.38 | | $ 28,605,058.38 | | $ 28,605,058.38 | | $ 0.00 |
| % ADMINISTRACION | | | | 23.00% | $ 4,387,973.12 | | $ 2,191,190.22 | $ - | $ 6,579,163.43 | $ - | $ 6,579,163.43 | $ - | $ 6,579,163.43 | $ - | $ - |
| % UTILIDAD | | | | 3.00% | $ 572,344.19 | | $ 285,807.30 | | $ 858,151.56 | | $ 858,151.56 | | $ 858,151.56 | | $ - |
| VALOR TOTAL DE OBRA | | | | | $ 24,038,461.31 | | $ 12,003,911.51 | | $ 36,042,373.36 | | $ 36,042,373.36 | | $ 36,042,373.36 | | $ - |
| AJUSTE AL PESO | | | | | -$ 0.31 | | $ 0.49 | | -$ 0.36 | | -$ 0.36 | | -$ 0.36 | | |
| VALOR TOTAL PROYECTO, A CEROS CENTAVOS | | | | | $ 24,038,461.00 | | $ 12,003,912.00 | $ - | $ 36,042,373.00 | | $ 36,042,373.00 | | $ 36,042,373.00 | | $ - |
| PORCENTAJE AVANCE | | | | | | | 49.94% | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | | 0.00% |

## 7.3. Resumen financiero de actas

**Tabla 9.** Resumen financiero por actas parciales

| | | |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato Inicial** | | |
| **Valor Final del Contrato** | | |
| **Valor Adición 1** | | |
| **Acta Nº 1 Y FINAL** | Valor Bruto | $ 36,042,373.00 |
| | Amortización Anticipo | 0,00 |
| | Valor Acta | $ 36,042,373.00 |
| **VALOR EJECUTADO (ACTAS BRUTAS)** | | **$ 36,042,373.00** |
| **SALDO CONTRATO** | | **$0,oo** |

| ACTA No. | ACTA 1 | ACUMULADO | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| EJECUTADO | $ 36,042,373.00 | $ 36,042,373.00 | 100% |

## 7.4. Avance de obra

Se tiene a la fecha, la ejecución del 100%, en el siguiente registro se muestra la ejecución de las obras civiles para el contrato.

### 7.4.1. Frente de obra Vía El Silencio

- 1,1 Conformación de Subrasante (motoniveladora)
- 1,2 Cargue de materiales fresado con volqueta 7 $mt^3$
- 1,1 Compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador)



**Foto 6.** Conformación de Subrasante (motoniveladora)



**Foto 7.** Conformación de Subrasante (motoniveladora)

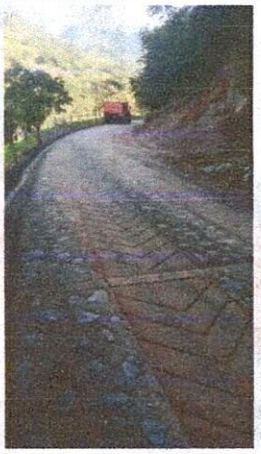


**Foto 8.** Cargue de materiales fresado con volqueta 7 mt³



**Foto 9.** Compactación de materiales granulares en una vía conformada



**Foto 10.** Compactación de materiales granulares en una vía conformada



**Foto 11.** Compactación de materiales granulares en una vía conformada

## 7.4.2. El Frente de obra Vía Las Cures

- 2,1 Conformación de Subrasante (motoniveladora)
- 2,2 La compactación de vía conformada (vibrocompactador)

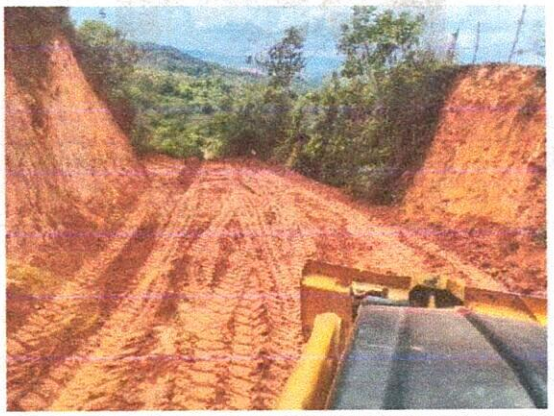


**Foto 12.** Conformación de Subrasante



**Foto 13.** Conformación de Subrasante (motoniveladora)



**Foto 14.** Conformación de Subrasante

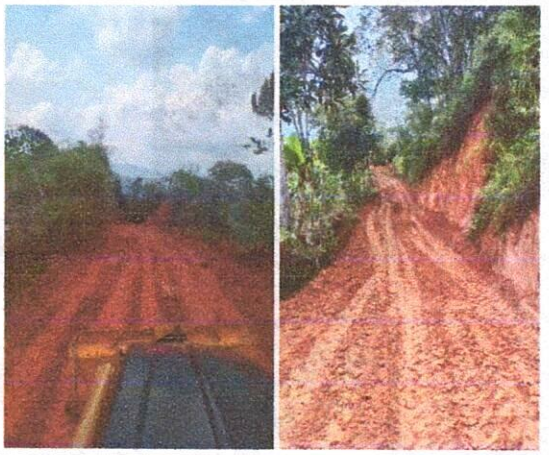


**Foto 15.** Conformación de Subrasante

### 7.4.3. El Frente de obra Camino Santa Elena - La Evalia

- 3,1 Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.
- 3,2 Remoción manual de derrumbes Menores.
- 3,3 Construcción de desagües para caminos.
- 3,4 Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.

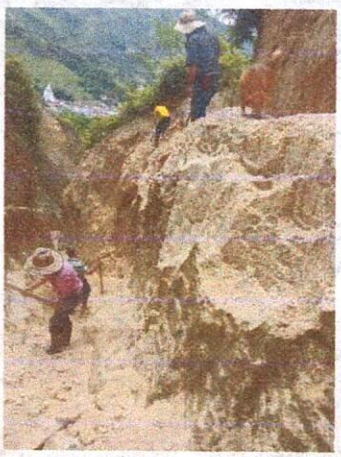


**Foto 16.** Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad

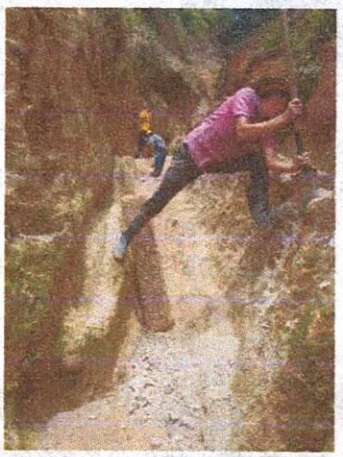
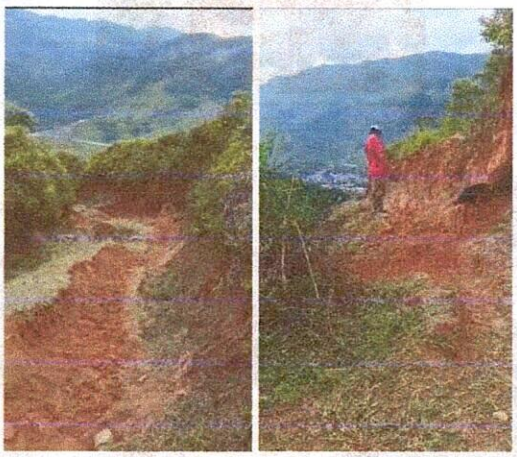


**Foto 17.** Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto 18.** Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad | **Foto 19.** Remoción manual de derrumbes Menores. |

### 7.4.4. El Frente de obra Camino Sabanalarga - El Algarrobo

- 4,1 Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.
- 4,2 Remoción manual de derrumbes Menores.
- 4,3 Construcción de desagües para caminos.
- 4,4 Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto 20.** Remoción manual de derrumbes Menores y Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante | **Foto 21.** Remoción manual de derrumbes Menores |

### 7.4.5. El Frente de obra Vía Campo Alegre

- 5,1 Conformación de Subrasante (motoniveladora)

- 5,2 La compactación de vía conformada (vibrocompactador)

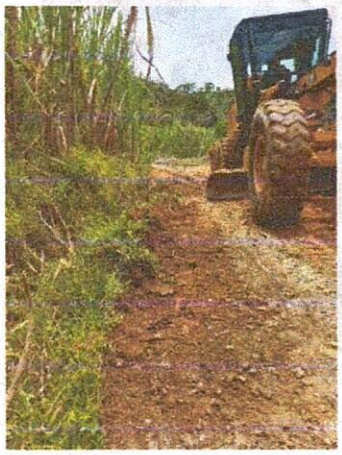


**Foto 22.** Conformación de Subrasante (motoniveladora)



**Foto 23.** Conformación de Subrasante (motoniveladora)




**Foto 24.** Conformación de Subrasante (motoniveladora)

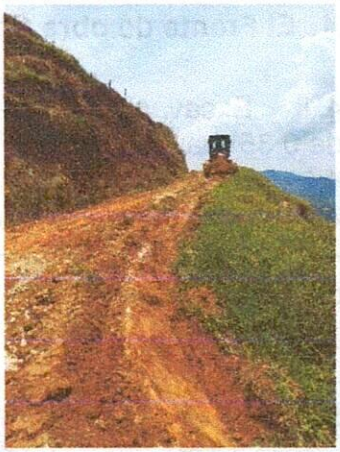


**Foto 25.** Conformación de Subrasante (motoniveladora)



**Foto 26.** La compactación de vía conformada (vibrocompactador)



**Foto 27.** La compactación de vía conformada (vibrocompactador)

## 7.5. Equipos utilizados

Durante el periodo se utilizó los siguientes equipos.

**Tabla 10.** Relación de Equipos, Maquinaria y vehículos

| Nro. | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Motoniveladora | 1 |
| 2 | Vibrocompactador | 1 |
| 3 | Retroexcavadora de llantas | 1 |
| 4 | Volquetas | 1 |
| 5 | Azadón | 4 |
| 6 | Palas | 4 |
| 7 | Rastrillos | 4 |



**Foto 28.** Vibrocompactador de llantas




**Foto 29.** Motoniveladora

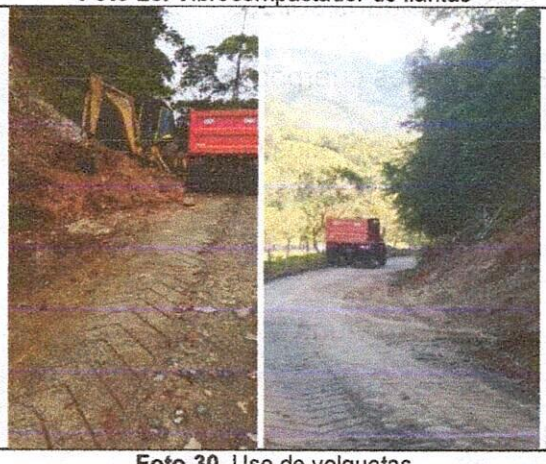


**Foto 30.** Uso de volquetas



**Foto 31.** Retro excavadora de llantas

# 8. AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

Con el propósito de reconocer que el área social tiene como principal interés mitigar los impactos y minimizar los traumatismos que puedan afectar a la población residente en los ejes viales a intervenir, se han implementado estrategias orientadas a la creación de escenarios de comunicación participativa.

Estos escenarios permiten que la comunidad:

- Identifique y reconozca a las entidades responsables de la ejecución del proyecto.
- Tener acceso a canales formales para la presentación de solicitudes, quejas y reclamos.
- Recibir respuestas oportunas y soluciones efectivas a las inquietudes planteadas.

De esta manera, se promueve un diálogo abierto y transparente entre las partes, fortaleciendo la confianza y asegurando que las inquietudes de la comunidad sean atendidas de manera adecuada durante el desarrollo del proyecto.

### 8.1. PQRS

A la fecha no se ha tenido PQRS por parte de la Comunidad aleña a la obra.

### 8.2. Manejo de Cuerpos de Agua

Se tuvo los siguientes manejos, para no impactar los recursos hídricos de la zona.

- ✓ Los cuerpos de agua no se les arroja residuos sólidos.
- ✓ No se dispuso de materiales de obra en los cuerpos de agua.
- ✓ No se dispuso residuos de excavaciones sobre los cuerpos de agua.

### 8.3. Manejo de fauna y flora

Se tienen los siguientes manejos, para no impactar la fauna y flora del Área de Influencia:

- ✓ No se realizaron tala de individuos arbóreos. Los cuales fueron identificados en el acta de entorno.
- ✓ No se dio caza a fauna nativa.
- ✓ Los árboles y vegetación aledaña no fueron usadas como elementos de demarcación.
- ✓ Se dispuso correctamente el material vegetal de la poda y los RCD.

## 8.4. Área SST

El objetivo fundamental del Componente, es garantizar que en el desarrollo de los proyectos de obras civiles se implementen las medidas preventivas y de control necesarias frente a los riesgos de origen laboral existentes, que aseguren el bienestar de todas las partes involucradas, evitando daños a la propiedad, al ambiente y a la salud de los trabajadores. Se tiene para el contrato las siguientes actividades:

### 8.4.1. Diagnóstico de Condiciones de Trabajo

En cuanto a las actividades realizadas durante el periodo, se tiene lo siguiente:

**Tabla 11.** Diagnóstico de condiciones de trabajo

| Nro. | Actividad | Cumplimiento | | | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Si | No | No Aplica | |
| 1 | Verificación de cerramientos de obra | | | X | No Aplica |
| 2 | Verificación de uso de EPP | X | | | Se entrega EPP, como caretas, guantes de carnaza |
| 3 | Ventilación de punto de emergencia (camilla, extintor, botiquín dotado) | X | | | Se procede con la compra y fueron instaladas en campo. |
| 4 | Verificación de SSI del personal de mano de obra no calificada | X | | | Se cuenta con pagos de SSI |
| 5 | Verificación de SSI del personal de mano de obra calificada | X | | | Se cuenta con pagos de SSI |
| 6 | Verificación de inducción del personal | X | | | Ver anexo 6 |

### 8.4.2. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (SSI)

Se procede cuenta con el siguiente personal en cada frente y debidamente afiliado a la SSI:

**Tabla 12.** Personal según seguridad social

| NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | EPS | ARL | PENSIÓN | CAJA DE COMPENSACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO FERNANDO | 1.041.228.924 | NUEVA EPS (EPS037) | ARL SURA | PORVENIR | COMFAMA |
| BUSTAMANTE EDUARDO | 71.173.573 | SAVIA SALUD (EPS040) | ARL SURA | COLFONDOS | COMFAMA |
| QUICENO YESID | 1.035.388.752 | NUEVA EPS (EPS037) | ARL SURA | PROTECCIÓN | COMFAMA |
| MARÍN GUSTAVO | 71.174.726 | EPS SURA (EPS010) | ARL SURA | PROTECCIÓN | COMFAMA |
| DELGADILLO PEDRO | 11.410.931 | NUEVA EPS (EPS037) | ARL SURA | COLPENSIONES | COMFAMA |
| DUQUE DUBÁN | 1.035.389.383 | NUEVA EPS (EPS037) | ARL SURA | PROTECCIÓN | COMFAMA |

| NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | EPS | ARL | PENSIÓN | CAJA DE COMPENSACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| JARAMILLO DAHYAN | 1.001.389.525 | SAVIA SALUD (EPS040) | ARL SURA | PORVENIR | COMFAMA |
| OSORIO JUAN | 98.506.385 | — | ARL SURA | PROTECCIÓN | COMFAMA |
| VANEGAS FREDY | 71.172.407 | SAVIA SALUD (EPS040) | ARL SURA | COLPENSIONES | COMFAMA |

Por lo anterior se entregan los soportes del pago de la SSI del personal de obra. *(Ver Anexo 4. Planillas SSI)*

### 8.4.3. Paz y salvos

Se entregan los paz y salvos del personal, acorde con la tabla 10. Personal según seguridad social.

### 8.4.4. Higiene y Seguridad en el Trabajo

- **Uso de EPP:** El personal cuenta con los EPP, guantes de carnaza y baqueta, monogafas protección UV.
- **Accidentes laborales:** Para verificar los indicadores de accidentabilidad según exigidos en la normatividad colombiana Resolución 0312 de 2019, por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, durante el presente periodo NO SE PRESENTÓ ningún accidente de trabajo, a continuación, se muestra el cálculo de indicadores mensual.
- **Ausentismo y Enfermedad Laboral:** Se verifican los indicadores de ausentismo y enfermedad según el cumplimiento de la normativa legal vigente en Colombia la Resolución 0312 de 2019, por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, por lo cual para el presente periodo se reporta que:

**Tabla 13.** Causales de Ausentismo

| CONCEPTO | DIAS |
|---|---|
| Ausencias Injustificadas | 0 |
| Enfermedad General | 0 |
| Calamidad | 0 |
| Permisos No Remunerados | 0 |
| Suspensiones | 0 |
| TOTAL | 0 |

# 9. ANEXOS

Anexo 1. Documentos Legales
Anexo 2. Pólizas Contrato
Anexo 3. Comunicado Adición
Anexo 4. Planilla SSI
Anexo 5. Paz y Salvos

ANEXOS

# ANEXOS

# Anexo 1 Documentos Legales

| | |
|---|---|
| edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | **CONTRATO DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 035 DE 2026 |
| **CONTRATANTE** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE |
| **NIT** | 901.509.210-5 |
| **CONTRATISTA** | V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S |
| **NIT** | 901421866-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE |
| **C.C** | 43.913.930 |
| **OBJETO** | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. |
| **VALOR** | VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE – ($24.038.461) |
| **PLAZO** | HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026. |
| **FECHA** | NUEVE (09) DE MARZO 2026. |

Entre los suscritos a saber, de una parte, **JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.788.872, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE**" identificada con NIT. 901.509.210-5, debidamente autorizada para contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 modificada parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal No. 04 de 2025, de una parte y quien en adelante se denominará **EDUOCCIDENTE**, y de otra parte la empresa V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S, identificada con NIT 901421866-6, representada legalmente por NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía 43.913.930, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra bajo las siguientes consideraciones **1.** El contrato a ejecutar será financiadas con los recursos provenientes del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INT-002-2026** celebrado entre la Alcaldía Municipal de Cisneros y la EDUOCCIDENTE, cuyo objeto es **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 2.** Que la Empresa de Desarrollo urbano del Occidente - Eduoccidente para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con el municipio, adelantó proceso de selección de contratista conforme a lo estipulado en su Manual de Contratación (Acuerdo No. 004 de 2025). **3**. Que dicho proceso de selección se llevó a cabo mediante la modalidad de Invitación Directa No. 035 de 2026 cuyo objeto es OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. **4.** Que, conforme a lo anterior el contrato que se formaliza a través del presente documento, se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA** se obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar y desarrollar el siguiente objeto **OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y TERCIARIAS**

| edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | CONTRATO DE OBRA |
|---|---|

**AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. ALCANCE:**
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **VÍA EL SILENCIO** | | | | $ 5.408.000,00 |
| 1,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12,00 | $214.500,00 | $ 2.574.000,00 |
| 1,2 | cargue de materiales fresado con volqueta 7 mt3 | Hr | 4,00 | $ 95.000,00 | $ 380.000,00 |
| 1,1 | compactación de materiales granulares en una vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12,00 | $204.500,00 | $ 2.454.000,00 |
| 2 | **VÍA LAS CURES** | | | | $ 5.028.000,00 |
| 2,1 | Conformación de Subrasante (motoniveladora) | Hr | 12,00 | $214.500,00 | $ 2.574.000,00 |
| 2,2 | La compactación de vía conformada (vibrocompactador) | Hr | 12,00 | $204.500,00 | $ 2.454.000,00 |
| 3 | **CAMINO SANTA ELENEA - LA EVALIA** | | | Total | $ 1.548.000,00 |
| 3,1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 12,00 | $ 14.000,00 | $ 168.000,00 |
| 3,2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 5,00 | $ 15.000,00 | $ 75.000,00 |
| 3,3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 10,00 | $ 24.000,00 | $ 240.000,00 |
| 3,4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1,50 | $710.000,00 | $ 1.065.000,00 |
| 4 | **CAMINO SABANALARGA - EL ALGARROBO** | | | | $ 2.066.144,00 |
| 4,1 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 4,00 | $140.000,00 | $ 560.000,00 |
| 4,2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | m3 | 3,00 | $ 14.140,00 | $ 42.420,00 |
| 4,3 | Construcción de desagues para caminos. | und | 4,00 | $ 24.005,00 | $ 96.020,00 |
| 4,4 | Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | has | 1,93 | $710.000,00 | $ 1.367.704,00 |
| 5 | **VÍA CAMPO ALEGRE** | | | | $ 5.028.000,00 |
