.

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	FEBRERO 19 DE 2026				
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	19/01/2026	Y EL	18/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS				
ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	CUATRO (4) MESES		
TIPO DE CONTRATO	OBRA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 3.844.989.807,72		
PROCESO No.:	LP2-009-2025	FECHA DE INICIO:	19/01/2026		
CONTRATO No.:	01513 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/05/2026		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA	LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER		
NIT CONTRATISTA:	902.020.635-4	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	SIMCOC SAS		
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9131344	APOYO SUPERVISIÓN	JOHAN FERNANDO SUAREZ		

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	19/01/2026	19/01/2026	19/06/2029	4 MESES	0	18/05/2026	SI	SE ACTUALIZAN POLIZAS CON FECHAS DEL ACTA DE INICIO

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


		ADICIONES		
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00	CONCEPTO	FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 3.844.989.807,72			
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 3.844.989.807,72			
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 3.844.989.807,72			
VALOR PAGADO:	$ 0,00			
VALOR POR PAGAR:	$ 3.844.989.807,72			
% POR PAGAR	100,00%			
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES		$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoria, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	EL CONTRATISTA NO PRESENTA ACTA PARCIAL A LA FECHA	
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"

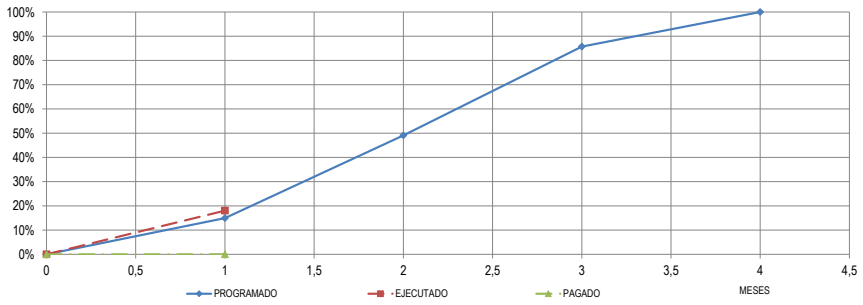

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	15%	18%	0%
2	49%		
3	86%		
4	100%		

PROGRAMADO	15%	
EJECUTADO	18%	
ATRASOS	3%	
DESEMPEÑO		1,21
% PAGADO	0%	
Pendiente por cancelar	$	692.867.163
Pendiente por can	$	3.152.122.644
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTACTO A PROVEEDORES, VISITA A LOS PREDIOS DEL PROYECTO, INICIO ACTIVIDAD DE AISLAMIENTO EN PREDIOS RANCHERIA, ROCERIA PARA DESPEJAR LINDEROS, ACTIVIDADES PREVIAS A LA REFORESTACION

REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA

NO APLICA

RECOMENDACIONES

CONTINUAR CON EL RITMO DE TRABAJO, Y REFORZAR LOS PROTOCOLOS LOGISTICA Y DE MANTENIMIENTO INICIAL DE PLANTACIONES, SIEMBRA Y AISLAMIENTO CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATICAS MEJOREN Y SEAN LAS ADECUACUADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

RIESGOS Y ALERTAS

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

://drive.google.com/file/d/1csVbTOmn8XHy71sywXcVYflw6JnJh3et/view?usp=sh	ogle.com/drive/folders/1hjPaNZ9aZjRARLz_fqCbintodVZkGnqI	ive.google.com/file/d/1c0Zs2lf-Kbzhob28M6oUSVqAUVS6s0mi/view?usp	
Informe N°1 con Anexos	Fotos	Acta de Inicio	
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

Juan José Bonett.

INTERVENTOR

Nombre: **JUAN JOSE BONETT PARADA**
REPRESENTANTE LEGAL
SIMCOC SAS
NIT. 900.043.668-9

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	SANDRA PATRICIA VEGA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
REVISO:	JOHAN FERNANDO SUAREZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	
V.B:	JUAN JOSE BONETT PARADA	REPRESENTANTE	Juan José Bonett.
