INFORME DE INTERVENTORÍA No. 04

CONTRATO No. 01514 DE 2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS.



PERIODO:
19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2026.

EMPRESA:

SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES SIMCOC S.A.S.

Km 2 Anillo vial Conjunto Natura Ecoparque Empresarial T1 Oficina 417
6076852120 - 3102007899
interventoriasimcoc@gmail.com

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 2
1. INTRODUCCION 4
2. ANTECEDENTES 5
3. OBJETIVO DE LA INTERVENTORIA 9
3.1 Objetivo general 9
3.2 Objetivos específicos 9
4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 10
4.1 Generalidades del contrato de obra 10
4.2 Seguimiento a las garantías 11
4.3 Personal Equipo técnico Mínimo: 12
4.4 Información y seguimiento financiero e informe de inversión: 13
4.5 Actividades ejecutadas 15
4.6 Actas Efectuadas. 16
4.7 Programacion de trabajo 16
5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 17
5.1 Generalidades del Contrato de Interventoría 17
5.2 Seguimiento a las garantías: 17
5.3 Descripción de las actividades ejecutadas por parte de la Interventoría 19
5.4 Seguimiento Ambiental 21
5.5 Personal técnico y de trabajo 22
5.6 Información financiera del contrato de Interventoría: 22
5.7 Avance en tiempo 23
5.8 Actas efectuadas 24
5.9 Relación de la correspondencia. 24
5.10 Seguimiento Bitácora 24
5.11 Registro fotográfico 25
5.12 Estado Del Tiempo. 27
6. Conclusiones 29
7. Recomendaciones 30

Lista de Tablas

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 01513 de 2025 10

Tabla 2. Seguimiento a las garantías del contrato de obra No. 01513 de 2025 11

Tabla 3. Personal administrativo contratado. 12

Tabla 4. Forma de Pago estipulada en el contrato de obra No. 01513 de 2025. 12

Tabla 5. Estado financiero del contratista..... 13

Tabla 6. Generalidades del Contrato de Interventoría No. 01514 DE 2025..... 16

Tabla 7. Seguimiento a las garantías del contrato de interventoría No. 01514 DE 2025 17

Tabla 8. Personal equipo de trabajo mínimo.....20

Tabla 9. Forma de Pago estipulada en el contrato de interventoría No. 01514 DE 2025 20

Tabla 10 Estados financieros Interventoría 21

Tabla 11. Control de avance en el tiempo para la ejecución del contrato 21

1. INTRODUCCION

El presente informe comprende el periodo del día 19 de abril al 18 de Mayo de 2026, describe las actividades ejecutadas y de seguimiento de los **Contrato de obra No 01513 de 2025**, **"RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS"** y de la **INTERVENTORIA** quien es el encargado de vigilar y controlar el contrato en mención con base la especificaciones y obligaciones que tienen los contratistas.

2. ANTECEDENTES

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS como máxima autoridad ambiental del departamento de Santander en su jurisdicción, debe velar por la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos presentes en ella. Estos ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país y mantienen equilibrios y procesos ecológicos básicos como la regulación del clima, el agua, suelos y la biodiversidad. Sin embargo, la transformación de ecosistemas por las actividades agrícolas y ganaderas, la sobreexplotación de especies silvestres, la introducción de especies y el cambio climático son los principales factores que amenazan la conservación de este importante grupo biológico (Valderrama et. jal., 2014; Bello et al., 2014, citados por el Instituto Humbolt 2019.

En el Departamento de Santander, se pueden encontrar una variedad de ecosistemas estratégicos que cumplen funciones importantes para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental.

Algunos de los ecosistemas más destacados en Santander son:

ECOSISTEMA	ÁREA	
	Ha.	%
Humedales del Magdalena	846.686	28.0%
Bosques Secos	196.393	6%
Bosques Altoandinos	178.228	5.8%
Páramo	212.445	7.0%

Estos dos últimos ecosistemas son considerados y distinguidos por ser extremadamente sensibles y es por ello que se debe propender por su conservación, recuperación y preservación.

Es así que, la CAS en desarrollo de su misión de administrar los recursos naturales renovables en su jurisdicción, ha venido gestionando recursos para la conservación de áreas de importancia estratégica y ecológica para la conservación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos municipales y veredales.

En este proyecto se realizará la intervención en el municipio de Onzaga, donde se intervendrán los predios denominados VEGAS DEL RAMAL Y RANCHERÍA, con un área total de 1.928,1 hectáreas, localizados en el Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI de los Paramos de Guantada y la Rusia en sus zonas de CONSERVACIÓN y PRESERVACIÓN. Razón por la cual el departamento de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS-, en el marco de sus compromisos institucionales de coordinar actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado,

En este sentido, la Corporación y el Departamento de Santander generaron un proyecto que

cumplen con lo establecido en el Plan de Desarrollo “Es tiempo de Santander”, 2024 – 2027, metas e indicadores de resultado que impacta el desarrollo del Programa: “Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 3202” y en el Plan de Acción de la CAS 2024-2027 “Es tiempo de la Sostenibilidad”. Proyecto que fue evaluado y cuenta con inscripción y viabilizarían en el Banco de Programas y proyectos de inversión del Departamento de Santander y de la corporación para lo cual se suscribió el Convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516, cuyo Objeto es: ***“AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LAS CORPORACION AUTONOMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”*** donde consiste en conservar, proteger y recuperar áreas estratégicas mediante restauración activa, pasiva y manejo silvoagrícola, silvopastoril y agroforestal, para preservar la diversidad ecosistémica con enfoque en Soluciones basadas en la Naturaleza.

Por tal motivo se realizarán procesos de restauración con plantación protectora, primer mantenimiento de 63 hectáreas en los predios Vegas del Ramal y Ranchería, del municipio de Onzaga y un aislamiento de 7.120 metros lineales de cerca perimetral en los mencionados predios, lo anterior con el fin de generar acciones de recuperación de 63 hectáreas de zonas de importancia hídrica, generando acciones de conservación mediante restauración activa y pasiva evitando la deforestación y la expansión de la frontera agrícola.

La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS- realiza procesos de establecimiento de plantaciones protectoras, Protectoras – productoras, procesos de restauración, rehabilitación, recuperación ecología y revegetalización, con el fin de propender por la protección, conservación, recuperación de áreas de importancia hídrica, de suelos, de servicios ecosistémicos, de áreas protegidas, de ecosistemas estratégicos; plantaciones que deben ser objeto de actividades de manejo silvicultural y a las cuales se les deben realizar mantenimiento, para garantizar un desarrollo óptimo de las plantaciones y lograr una supervivencia mayor de las plantas, evitar y/o controlar ataque de plagas y enfermedades, mejorar los niveles nutricionales del suelo en sitio definitivo, eliminar competencia por arvenses que realmente afecten su desarrollo a través de limpieza y plateos, y en general garantizar las mínimas condiciones para un buen desarrollo de las plantaciones establecidas en vigencias anteriores.

Todas estas labores son de importancia y de carácter obligatorio realizarlas ya que sin ellas la plantación se perdería y no se podría cumplir con los fines y objetivos que se proponen cumplir con el establecimiento de árboles. Una de las causas de la pérdida acentuada del régimen de caudales, es la destrucción de la cobertura boscosa debido a la deforestación para ampliar la frontera agropecuaria, a la tala ilegal, etc., lo que conlleva a deterioro del suero por erosión, además de la desaparición de la fauna y flora endémica de la zona. La restauración, rehabilitación y/o reforestación se convierte en la principal herramienta a utilizar al momento de mitigar efectos ambientalmente nocivos generados por la actividad antrópica o por fenómenos naturales

Los procesos de recuperación, conservación y protección de las microcuencas que abastecen a la población rural son alternativas sostenibles para aportar a la rehabilitación de estas áreas

y propenden por el aumento de la oferta de bienes y servicios ambientales, fundamentales para la supervivencia del hombre y desarrollo de los procesos productivos sostenibles, así como generación de empleo en las zonas En este sentido y con el fin de dar continuidad al proceso de conservación de los recursos hídricos en los predios intervenidos por la CAS con procesos de establecimiento de coberturas vegetales, es necesario realizar actividades de mantenimiento de plantaciones establecidas en vigencias anteriores con el fin de consolidar procesos de recuperación y rehabilitación para que dichos predios se restauren y recuperen y continúen siendo áreas estratégicas para el suministro de bienes y servicios ambientales.

- **Restauración**

El proceso de restauración, comprende actividades de reforestación por medio de siembra de árboles de especies nativas, esta actividad implica una serie de pasos organizados y coordinados para garantizar una ejecución eficiente y respetuosa con el ambiente como se describe a continuación

Planificación y preparación	1. Reconocimiento de los predios
	2. Trasado en las áreas identificadas para la reforestación
	3. Transporte de equipos a insumos hasta el área de intervención
Ejecución de la restauración.	4. Despeje de zonas de intervención
	5. Ahoyado
	6. Distribución de abono orgánico, materia correctivo y material vegetal
	7. Aplicación de material correctivo y abono orgánico
	8. Siembra de especies arbóreas
	9. Revisión general estado de especies arbóreas.

En cada hectárea de establecerán 1.100 especies arbóreas nativas de altura mínima de 60 cm, para el caso de los predios de la CAS localización en el municipio de onzaga se han recomendado las siguientes especies: Guamo (Inga spa.), Manchador (Bosnia guaimenses), Cenizo (Piptocoma discolor), Cordoncillo (Piper sp.), Lechero (Euphorbia sp), Canelo o Encenillo (Blakea sphaerica), Roble (Quercus humboldtii), Cúcharo (Rapanea guianensis), Falso pimiento (Schinus molle), Mano de Oso (Oreopanax floribundum), Jazmin, Laurel huesito (Pittosporum undulatum), Aliso (Alnus jorullensis), cedro (Cedrela montana), Cucharo (Rapanea guianeresis)*.

En cuanto a los predios de la CAS la densidad de siembre será la misma 1.100 árboles por hectáreas con alturas mínimas de 60 cm y las especies serán establecidas por la CAS al momento de la identificación de los predios a intervenir. El listado de especies acá presentado es un listado opcional de especies priorizadas según la actividad, sin embargo si en el proceso de ejecución; en las actividades de verificación y ejecución en campo, de acuerdo a la sobrevivencia, adaptabilidad a los suelos, de acuerdo a las condiciones climáticas, disponibilidad de material, especies de referencia, entre otros se requiere cambiar e incluir alguna especie que no se encuentre en este listado, este proceso debe ser solicitado formalmente con la debida justificación técnica para evaluación

❖ **Aislamiento**

Se construirá cerca en postes de plástico compactos con pie de amigo en concreto y alambre de púas para aislar los predios con el fin de garantizar la protección de la cobertura vegetal existente y contribuir a la restauración y recuperación natural del área como se describe a continuación.

Planificación y preparación.	1.	Marcación y estacado de las áreas de aislamiento.
	2.	Transporte del material a los predios a aislar.
Ejecución del aislamiento.	3.	Despeje de los linderos.
	4.	Trasiego de equipos y materiales.
	5.	Ahoyado
	6.	Hincado de postes
	7.	Templado y grapado
	8.	Revisión del estado general de los tramos de cerca instalados

❖ **Mantenimiento.**

El proceso de mantenimiento, comprende actividades de resiembra y reemplazo de especies dañadas o que no se desarrollan de manera adecuada por medio de siembra de árboles de especies nativas, se ha estimado un porcentaje de resiembra de 10% es decir 110 árboles por hectárea establecida, así mismo contempla el despeje de la totalidad de las especies arbóreas y abonado de las mismas, esta actividad implica una serie de pasos organizados y coordinados para garantizar una ejecución eficiente y respetuosa con el ambiente como se describe a continuación.

Planificación y preparación	1.	Identificación de especies arbóreas a reemplazar.
	2.	Transporte de insumos hasta al área de intervención
Ejecución de la mantenimiento.	3.	Despeje de especies arbóreas
	4.	Ahoyado de los árboles a resembrar.
	5.	Distribución de abono orgánico, material vegetal
	6.	Aplicación de material abono orgánico
	7.	Siembra de especies arbóreas a resembrar
	8.	Revisión general estado de especies arbóreas.

Por lo tanto, el contrato busca atender las necesidades presentadas de acuerdo a los antecedentes anteriormente mencionados bajo el proyecto formulado del proyecto de obra **RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS** que fue adjudicado a LA UNION TEMPORAL RESATURACION ECOLOGICA“ , con el fin de mitigar los problemas identificados.

Además, se realizó la contratación de una interventoría bajo modalidad de concurso de méritos, con el fin de realizar un control más riguroso y permanente sobre los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos, socio ambientales y de SST.

3. OBJETIVO DE LA INTERVENTORIA

3.1 Objetivo general

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, Contable y Jurídica para el contrato cuyo objeto es ***"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS".***

3.2 Objetivos específicos

- ✓ Realizar un seguimiento técnico de la ejecución del contrato de obra, verificando el cumplimiento del objeto contractual, especificaciones técnicas, propuesta económica y técnica, cronograma de obra, documentos del proceso contractual, obligaciones del contratista, informes, autorizaciones de parte de propietarios o poseedores de los predios, disposición y manejo de personal, entre otros aspectos técnicos.
- ✓ Llevar a cabo un seguimiento administrativo, verificando que el contratista vincule y mantenga durante la ejecución del contrato el personal ofrecido en la propuesta, así comotambién vigilando el cumplimiento de los plazos establecidos, de las disposiciones legales,de las garantías contractuales establecidas, entre otros aspectos administrativos.
- ✓ Realizar un seguimiento financiero de la ejecución del contrato de obra, llevando a cabo un control de las inversiones, de los pagos del personal vinculado al contrato de obra y los pagos de seguridad social y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente, así como también llevando actualizado el control presupuestal y de ejecución de la obra.
- ✓ Ejecutar un seguimiento ambiental, verificando y exigiendo el cumplimento de la normatividad ambiental, salud en el trabajo, seguridad industrial establecida por parte de la CAS durante la ejecución de los trabajos a realizar, así como también exigiendo al contratista el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de obra y la normatividad vigente.
- ✓ Llevar a cabo un seguimiento jurídico de la ejecución del contrato de obra, a través de la verificación, aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de obra, así como a través del apoyo a la CAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato.

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 Generalidades del contrato de obra

CONTRATO DE OBRA	01513 de 2025
FECHA:	30 de diciembre de 2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación Pública No. LP2-009–2025.
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de obra.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA R.L MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE. C.C. 1.096.211.185 de Barrancabermeja
NIT:	902.020.635-4
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
INTERVENTOR:	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S. R.L JUAN JOSÉ BONET PARADA. C.C. 1.065.912.454 de Aguachica.
NIT:	900.043.668-9
OBJETO DEL CONTRATO:	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS.
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($3.844.989.807,72).
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses.
PRORROGA No. 01:	Dos (2) meses.
PLAZO TOTAL:	Seis (6) meses.
FECHA DE INICIACIÓN:	Diecinueve (19) de enero de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Dieciocho (18) de mayo de 2026.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	Dieciocho (18) de Julio de 2026.
PERIODO DEL INFORME:	19/04/2026 Al 18/05/2026.

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 01513 de 2025.

4.2 Seguimiento a las garantías

Las pólizas que amparan el contrato de obra son las siguientes:

Garantías aprobadas según oficio al contrato de obra:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	30-12-2025	30-11-2026	14-44-101252483 Anexo 0	$ 768.997.961,00
Pago de Salarios	30-12-2025	30-05-2029	14-44-101252483 Anexo 0	$ 768.997.961,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	30-12-2025	30-05-2027	14-44-101252483 Anexo 0	$ 768.997.961,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	30-12-2025	30-05-2026	14-40-101078942 Anexo 0	$ 698.752.800,00

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías Id. CO1.WRT.18799449 y CO1.WRT.18799463 del 08 de ENERO de 2026.

Garantías aprobadas con el acta de inicio del contrato de obra:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	19-01-2026	20-12-2026	14-44-101252483 Anexo 2	$ 768.997.961,00
Pago de Salarios	19-01-2026	19-06-2029	14-44-101252483 Anexo 2	$ 768.997.961,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	19-01-2026	19-06-2027	14-44-101252483 Anexo 2	$ 768.997.961,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	19-01-2026	19-06-2026	14-40-101078942 Anexo 2	$ 698.752.800,00

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías Id. CO1. WRT.19184673 y CO1. WRT.191855574 del 23 de FEBRERO de 2026.

Garantías aprobadas con la prórroga en tiempo No. 01 al contrato de obra:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	19-01-2026	19-02-2027	14-44-101252483 Anexo 3	$ 768.997.961,00
Pago de Salarios	19-01-2026	19-08-2029	14-44-101252483 Anexo 3	$ 768.997.961,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	19-01-2026	19-08-2027	14-44-101252483 Anexo 3	$ 768.997.961,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	19-01-2026	19-08-2026	14-40-101078942 Anexo 3	$ 698.752.800,00

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías Id. CO1. WRT.19869047 y CO1. WRT.19781817 del 19 de MAYO de 2026.

Tabla 2. Seguimiento garantías contrato de obra

Anexo 1. Garantías del contrato de obra.

4.3 Personal Equipo técnico Mínimo:

NOMBRE	PROFESION	CARGO
ROCIO SOLANO VILLAMIZAR	Ingeniera Ambiental y de Saneamiento.	Director de obra
YESI LOANA POLANCO RODRIGUEZ	Ingeniera de producción.	Profesional en salud y seguridad en el Trabajo.
WILDER ROJAS MEDINA	Ingeniero Ambiental y de Saneamiento.	Coordinador de entregas – Residente de Campo 1.
OLGA TERESITA PABON CARDENAS	Ingeniera Forestal	Coordinador de entregas – Residente de Campo 2.
MARIA TERESA CELIS ESTEBAN	Ingeniera Agronómica	Técnico Agroforestal 1.
YOLIMA GUERRERO DIAZ	Ingeniera Agrónomo	Técnico Agroforestal 2.
MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE	Administrador de Empresas	Administrador – Profesional Administrativo.
YASETH EDUARDO GUERRERO PINEDA	Abogado	Administrador – Abogado.
ADRIANA MARCELA ORTIZ CHAVEZ	Técnico laboral en auxiliar contable, de tesorería y financiera.	Secretaria.

Tabla 3. Personal Equipo técnico Mínimo.

Durante el mes del informe, el contratista **UNIÓN TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA** presentó a satisfacción los soportes correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social integral del personal vinculado al proyecto, cumpliendo con lo exigido en las obligaciones contractuales y garantizando la legalidad en la contratación del recurso humano.

Anexo 2. Planilla de seguridad social.

4.4 Información y seguimiento financiero e informe de inversión:

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
Anticipo	0%	$ 0,00
LA CORPORACION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: Mediante actas parciales de avance de obra, certificadas por la interventoría, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato.	90%	$ 3.460.490.826,95
el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la interventoría con la entrega del informe final	10%	$ 384.498.980,77
VALOR TOTAL:	100%	**$ 3.844.989.807,72**


Tabla 4. Forma de Pago.

A la presente fecha, el Contratista de Obra solo ha presentado el Acta parcial N° 1 con un porcentaje ejecutado del 49.77%, a la fecha se encuentra revisado y aprobado para ser desembolsado el pago por parte de la entidad; así mismo continua con el avance del contrato dando continuidad a la ejecución de las obras contratadas bajo su capacidad financiera, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA		
DESCRIPCION	**VALOR**	**%**
Valor Contratado	$ 3.844.989.807,72	100%
Anticipo	$ 0,00	0%
Acta Parcial N°1.	$ 1.913.576.054,05	49.77%
Acta Parcial N°2.	$ 0,00	0,00%
Acta Parcial N°3.	$ 0,00	0,00%
Valor Pendiente:	$ 1.931.413.753,67	50.23%

Tabla 5. Estado financiero del contratista

Para el presente periodo el avance de ejecución corresponde a un valor de: ($361.719.727,92) M/C equivalente a un porcentaje de 9.41% para un total ejecutado acumulado de: ($2.754.113.071,78), equivalente a un porcentaje de 71,63% del valor total del contrato, dejando así un saldo de 37,28% pendiente por ejecutar.

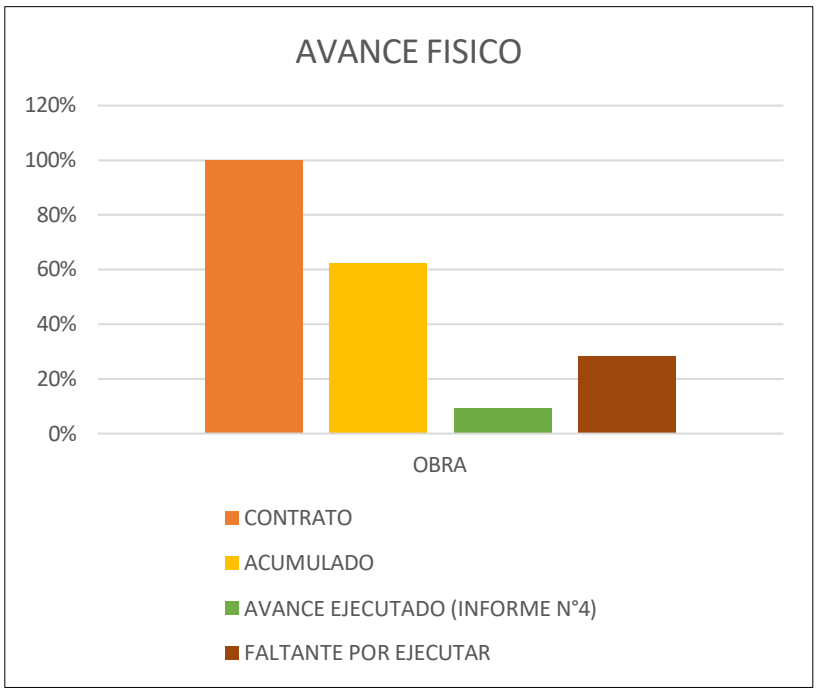


INFORMACION AVANCE FISICO INFORME No. 04	
AVANCE FISICO DEL INFORME:	9,41%
AVANCE FISICO ACUMULADO:	71,63%
AVANCE FISICO POR EJECUTAR:	28,37%

Actividad	Meta Contractual	Avance Total
Aislamiento Finca Ranchería	3,6 km	3.600 m
Aislamiento Finca la Vega del Ramal	3,522 km	0
Restauración Finca Ranchería	30 Ha	30 ha
Restauración Finca la Vega del Ramal	33 Ha	27 ha

Avance físico global estimado del contrato: 71,63 %

4.5 Actividades ejecutadas

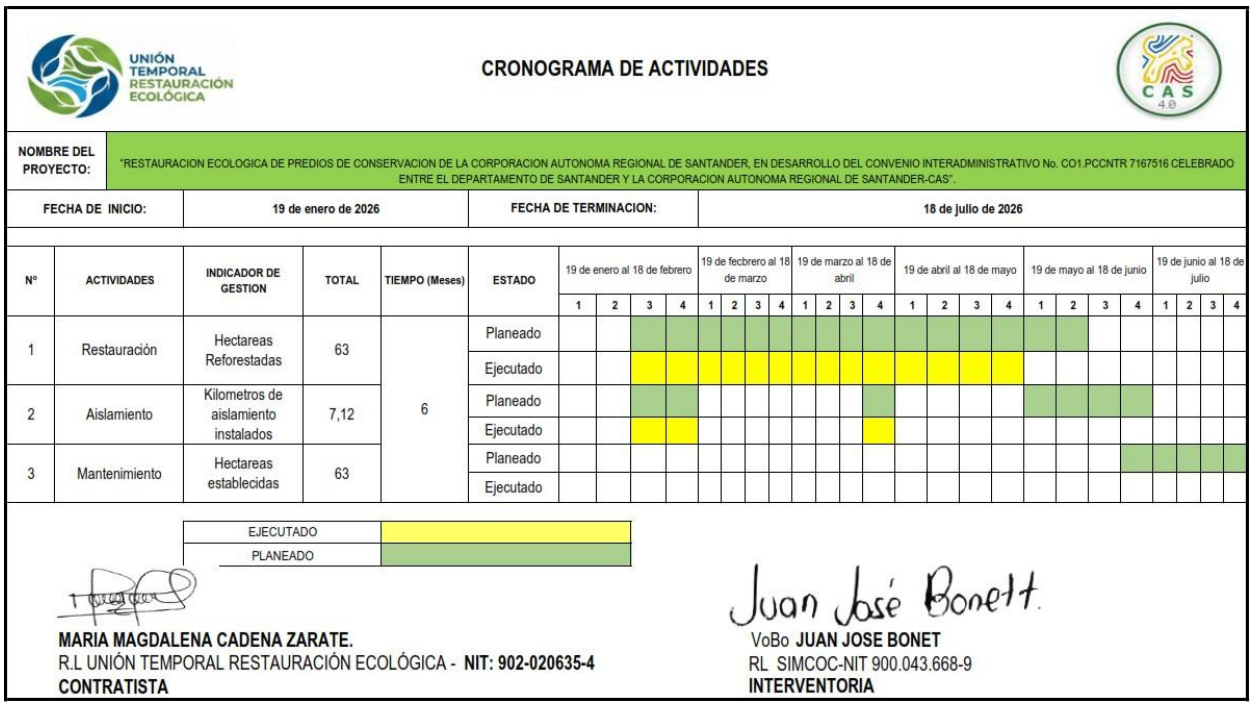

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO:	"RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".		
FECHA DE INICIO:	19 de enero de 2026	FECHA DE TERMINACION:	18 de julio de 2026

N°	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL	TIEMPO (Meses)	ESTADO	19 de enero al 18 de febrero				19 de fecbrero al 18 de marzo				19 de marzo al 18 de abril				19 de abril al 18 de mayo				19 de mayo al 18 de junio				19 de junio al 18 de julio			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Restauración	Hectareas Reforestadas	63	6	Planeado																								
					Ejecutado																								
2	Aislamiento	Kilometros de aislamiento instalados	7,12		Planeado																								
					Ejecutado																								
3	Mantenimiento	Hectareas establecidas	63		Planeado																								
					Ejecutado																								

EJECUTADO	
PLANEADO	

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.
R.L UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA - **NIT: 902-020635-4**
CONTRATISTA

VoBo **JUAN JOSE BONET**
RL SIMCOC-NIT 900.043.668-9
INTERVENTORIA

4.5.1 Aislamiento

- **Predio Ranchería:** Se instalaron los 1,150 metros faltantes para un total de **3,600 metros (3.6 km)**, alcanzando el **100% de la meta** para este predio.
- **Predio Vegas del Ramal:** Se iniciaron labores preliminares que incluyen rocería mecánica, trazado de alineamiento, ahoyado y traslado de insumos.
- **Progreso del Aislamiento:** 50.55 % de avance sobre la meta total de 7.12 km.

4.5.2 Establecimiento de Especies Nativas (restauración)

Durante este periodo se reporta la siembra acumulada de **57,50 hectáreas**, equivalentes a **63,825 individuos arbóreos**.

- **Predio Ranchería:** Se completaron las 31.5 hectáreas programadas (100% de la meta del predio), con un total de 34,650 árboles.
- **Predio Vegas del Ramal:** Se logró la siembra en este periodo de 8 hectáreas (8,800 árboles), alcanzando un **82.54%** de la meta específica de este predio.

- **progreso de Siembra:** 91,27% de avance sobre la meta total de 63 hectáreas.

4.6 Actas Efectuadas.

ACTA DE INICIO	ENERO 19 DE 2026
ACTA PARCIAL N°1	ABRIL 17 DE 2026
PRORROGA N°1	MAYO 19 DE 2026

4.7 Programación de trabajo

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE OBRA

OBJETO CONTRATO	PERIODO	Responsable
"RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCONTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".	CRONOGRAMA (SEMANAS)	INGENIERO WILDER ROJAS MEDINA

N° DE ACTIV	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL		19 de enero al 18 de febrero (1 2 3 4)	19 de fecbrero al 18 de marzo (1 2 3 4)	19 de marzo al 18 de abril (1 2 3 4)	19 de abril al 18 de mayo (1 2 3 4)	19 de mayo al 18 de junio (1 2 3 4)	19 de junio al 18 de julio (1 2 3 4)	INDICADOR	MEDIO DE CONTROL	FRECUENCIA DE REVISION	RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE
1	Restauración, reforestación por medio de siembra de árboles de especies nativas	Hectareas Reforestadas	63	Planeado							Hectareas reforestadas(Hectareas sembradas)/(Hectareas totales a sembrar)*100	Supervision de obra e informe	Mensual	MATERIALES (plantulas de especies nativas, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua)	PROFESIONAL COORDINADOR
				Ejecutado		13 Ha	12 Ha	24,5 Ha	8 Ha						
2	Instalación de cerramiento perimetral	Kilometros de aislamiento instalados	7,12	Planeado							Instacion de aislamientosl = (numero de kilometros de aislmiento instalados) / (Número total de kilometros a aislar) *100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (barra, machete, paladraga, pita, estacas, postes plasticoa, alambre pua, grapas, obreros)	
				Ejecutado		2,450 Km		1,150 km							
3	Mantenimiento, actividades de resiembra y reemplazo de especies dañadas	Hectareas establecidas	63	Planeado							Hectareas establecidas(Hectareas sembradas)/(Hectareas totales a mantener)*100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (plantulas de especies nativas, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua)	
				Ejecutado											

EJECUTADO	
PLANEADO	

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.
R.L UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA - **NIT: 902-020635-4**
CONTRATISTA

VoBo **JUAN JOSE BONET**
RL SIMCOC-NIT 900.043.668-9
INTERVENTORIA

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Generalidades del Contrato de Interventoría

CONTRATO NO	01514 DE 2025.
FECHA	31 de Diciembre de 2025.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Interventoría.
CONTRATISTA	**SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCION Y OBRAS CIVILES – SIMCOC S.A.S.** R.L. JUAN JOSE BONETT PARADA C.C. 1.065.912.454 de Aguachica.
NIT	900.043.668-9
SUPERVISOR (A)	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental.
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA ELPROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DEPREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ENDESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DESANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMAREGIONAL DE SANTANDER CAS.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.763.363)
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses.
PRORROGA No. 01:	Dos (2) meses.
PLAZO TOTAL:	Seis (6) meses.
FECHA DE INICIACIÓN:	Diecinueve (19) de enero de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Dieciocho (18) de mayo de 2026.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	Dieciocho (18) de Julio de 2026.
PERIODO DEL INFORME:	19/04/2026 A 18/05/2026.

Tabla 6. Generalidades del Contrato de Interventoría No. 01514 de 2025

5.2 Seguimiento a las garantías:

Las pólizas que amparan el contrato de Interventoría son las siguientes:

Garantías aprobadas con el contrato de interventoría:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	02-01-2026	02-11-2026	14-44-101252550 Anexo 1	$ 41.152.672,60
Calidad del Servicio	02-05-2026	02-05-2027	14-44-101252550 Anexo 1	$ 41.152.672,60
Pago de Salarios	02-01-2026	02-05-2029	14-44-101252550 Anexo 1	$ 41.152.672,60

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías con Id CO1.WRT.18834760del 08 de enero de 2026.

Garantías aprobadas con el acta de inicio del contrato de Interventoría:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	19-01-2026	19-11-2026	14-44-101252550 Anexo 3	$ 41.152.672,60
Calidad del Servicio	19-05-2026	19-05-2027	14-44-101252550 Anexo 3	$ 41.152.672,60
Pago de Salarios	19-01-2026	19-05-2029	14-44-101252550 Anexo 3	$ 41.152.672,60

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías con Id CO1.WRT.19174409 del 05 de febrero de 2026.

Garantías aprobadas con la prórroga en tiempo No. 01 al contrato de Interventoría:

GARANTIA UNICA	VIGENCIA		POLIZA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	19-01-2026	18-01-2027	14-44-101252550 Anexo 4	$ 41.152.672,60
Calidad del Servicio	19-05-2026	19-05-2027	14-44-101252550 Anexo 4	$ 41.152.672,60
Pago de Salarios	19-01-2026	18-07-2029	14-44-101252550 Anexo 4	$ 41.152.672,60

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de Aprobación de Garantías con Id CO1.WRT.19937102 del 19 de Mayo de 2026.

Tabla 7. Seguimiento a las garantías del contrato de interventoría No. 01514 de 2025.

Anexo 3. Garantía**s**

5.3 Descripción de las actividades ejecutadas por parte de la Interventoría

🟩 Supervisión y Amparos Contractuales

La interventoría adelantó la revision y control periódico al estado de las garantías que respaldan el contrato durante el presente periodo evaluado ya que dentro del mismo se suscribió prorroga N°1 y estas fueron aprobadas por la interventoria como la entidad contratante desde la plataforma secop 2. Mediante la revisión del cuadro de control de pólizas, se constató la vigencia y suficiencia de los amparos de cumplimiento, responsabilidad civil, salarios y prestaciones sociales, y estabilidad de la obra. Con este esquema de validación, se garantiza que la entidad permanezca debidamente blindada ante cualquier eventualidad jurídica o económica durante el desarrollo del proyecto.

🟩 Verificación de Talento Humano y Operativo

Se mantuvo el control y fiscalización del personal técnico y operativo dispuesto en el equipo mínimo y personal en campo. A través de inspecciones directas, la interventoría constató el número de operarios frente a los perfiles exigidos para las actividades de restauración y cerramiento. Asimismo, se supervisó de manera estricta el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP), velando por la seguridad industrial y la continuidad operativa en los diferentes frentes de trabajo.

🟩 Control de Obligaciones de Seguridad Social

Se realizó la revisión mensual de los soportes de pago del personal mediante el análisis de las planillas de Autoliquidación de Aportes (PILA). Esta labor permitió ratificar que el contratista se encuentra al día con sus obligaciones prestacionales (salud, pensión y ARL), mitigando de forma oportuna cualquier riesgo de reclamación laboral o responsabilidad solidaria para la institución.

🟩 Verificación Técnica de Aislamientos y Cerramientos

A través de comisiones de campo e inspecciones técnicas itinerantes, la interventoría realizó el control de calidad al componente de cercado, enfocándose en los siguientes aspectos:

- **Constatación de Metas:** Se validó que el rendimiento presentado a la fecha alcanza el **50.55% de avance respecto** a los 7.12 kilómetros totales contractuales, correspondientes al aislamiento ya ejecutado en el predio Ranchería. Asimismo, se constató un **0% de avance de aislamiento físico en el predio Vegas del Ramal**, el cual cuenta con una meta específica de 3.520 kilómetros para esta actividad.
- **Control de Calidad:** Se supervisó que el acopio en sitio de los materiales (postes, alambre y tensores) cumpliera con las especificaciones técnicas requeridas, asegurando que se encuentren listos para su posterior instalación conforme a las directrices contractuales.

- **Validación de Actividades Preliminares:** Ante la ausencia de establecimiento físico de cerca en Vegas del Ramal durante este mes, la interventoría concentró sus esfuerzos en supervisar las fases previas indispensables. Se validaron las labores de rocería mecánica para el despeje de vegetación arbustiva, el trazado del alineamiento, el ahoyado y el traslado estratégico de insumos hasta los puntos exactos de intervención.

🟩 Supervisión del Establecimiento Forestal (Siembra)

La interventoría desplegó acciones de seguimiento técnico al componente de restauración vegetal para asegurar la correcta inversión de los recursos y el cumplimiento de las densidades:

- **Control de Insumos:** Se efectuó la inspección fitosanitaria y de vigor del material vegetal antes de su siembra, garantizando que los individuos correspondan a especies nativas aptas para el ecosistema objetivo y verificando la logística de distribución.
- **Control de Densidad y Avances:** Mediante recorridos de verificación en campo, se auditó el registro acumulado de **57.50 hectáreas establecidas**, representadas por más de **63.825 individuos arbóreos**. Se validó específicamente el avance significativo en el predio Vegas del Ramal, donde se logró el establecimiento de **8 hectáreas con más de 8.880 árboles** de diferentes especies forestales durante este periodo. Esto sitúa el proyecto en un **41.27% de avance** respecto a las 63 hectáreas totales contractuales, y en un **82.54% de avance** frente a la meta específica de la Vega del Ramal (31.5 ha), restando únicamente 5.50 hectáreas de siembra para consolidar la meta global.
- **Seguimiento a la Inversión:** Se auditó la incorporación de insumos edáficos (hidrorretenedores y planes de fertilización base) orientados a maximizar la tasa de sobrevivencia del material vegetal.

🟩 Monitoreo de Factores Limitantes y Logística

Dadas las particularidades geográficas del predio Vegas del Ramal, las actividades de la interventoría se enfocaron en:

- **Validación de Rendimientos:** Se evaluaron y consignaron en bitácora las variables críticas que condicionaron el rendimiento mensual en campo, tales como la compleja topografía del predio, pendientes severas, presencia de un cuerpo hídrico, limitaciones severas para el transporte mular y las variables climáticas adversas registradas en el área a intervenir.
- **Inspección de Vías:** Se realizó el seguimiento a las rutas de acceso y las maniobras operativas ejecutadas por el contratista para el traslado manual y mular de insumos y material forestal, garantizando que el flujo logístico se realizara bajo condiciones viables de seguridad.

🟩 Verificación de Información Geográfica y Reportes

- **Georreferenciación:** Se procesó la información cartográfica obtenida en campo mediante herramientas SIG, permitiendo delimitar con precisión geográfica las poligonales y áreas reales intervenidas durante el periodo.
- **Consolidación de Avances:** Se estructuró el balance físico-financiero del proyecto del presente mes. Si bien se registran hitos importantes en el componente forestal y actividades preliminares de cerramiento, la interventoría mantiene un estricto control sobre la curva de programación para mitigar los impactos de los factores limitantes del entorno.

🟩 Evaluación de Ejecución Física y Financiera

Se llevó a cabo el corte técnico del periodo para evaluar el comportamiento financiero y el avance físico de las obras con corte a este informe. La interventoría analizó el rendimiento de las actividades preliminares y de siembra frente a las metas contractuales; ante las restricciones logísticas evidenciadas en Vegas del Ramal, donde se continuó con el monitoreo estricto de las programaciones semanales para asegurar que los tiempos restantes permitan finiquitar las 5.50 hectáreas de siembra y los 3.522 km de aislamiento pendientes.

🟩 Revisión y Curaduría Documental

Se desarrolló el control de calidad, revisión y corrección del acervo documental e informes presentados por el contratista. Mediante la formulación de observaciones técnicas y metodológicas, se aseguró la correcta estructuración de las evidencias que soportan las cantidades de obra ejecutadas, garantizando la trazabilidad institucional del informe final.

5.4 Seguimiento Ambiental

Durante el periodo evaluado (19 de abril al 18 de mayo), las acciones de la interventoría se orientaron a vigilar el cumplimiento de las medidas de mitigación y protección del entorno natural. En tal sentido, se constató que las actividades de preparación del terreno en Vegas del Ramal, orientadas al trazado, ahoyado y rocería mecánica para futuras cercas, se ejecutaran con un criterio de mínimo impacto, evitando generar procesos erosivos o desestabilización en pendientes pronunciadas, y respetando los parches de regeneración natural encontrados en la zona de influencia. Asimismo, se supervisó que el cruce de cuerpos hídricos por parte del personal y la logística mular no alterara el flujo natural de escorrentías ni generara contaminación por residuos, asegurando que los materiales sobrantes e insumos forestales fueran acopiados fuera de las zonas de protección hídrica.

En lo concerniente al establecimiento forestal, se verificó el estricto empleo de especies nativas en las 8 hectáreas sembradas este mes en Vegas del Ramal, validando la correcta aplicación de técnicas de siembra para los más de 8.880 nuevos árboles. Ante la variabilidad de las condiciones

climáticas registradas en la zona, se priorizó la inspección en la aplicación de hidrorretenedores para salvaguardar el sistema radicular de las plántulas y mitigar el estrés post-siembra. Finalmente, se constató el estado de las parcelas de monitoreo en campo, validando que su disposición actual permite recolectar datos científicos confiables sobre la dinámica de sucesión vegetal, sin alterar la estabilidad estructural del suelo ni los servicios ecosistémicos del área intervenida.

5.5 Personal técnico y de trabajo

NOMBRE	PROFESION	CARGO
JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO	Ing. Sanitario y Ambiental.	Director de Interventoría
JAVIER ENRIQUE REDONDO RUEDA	Ing. Civil	Profesional SST
DANIELA FLOREZ ROBLEZ	Ing. Ambiental y de Saneamiento.	Técnico Forestal
BIBIANA ROCIO MERCADO NIETO	Ing. Ambiental y de Saneamiento.	Técnico Forestal
SANDRA PATRICIA VEGA	Ing. Ambiental y de Saneamiento.	Ingeniero Forestal

Tabla 8. Personal técnico y equipo de trabajo

Se presenta a satisfacción los soportes correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social integral del personal vinculado al proyecto, cumpliendo con lo exigido en las obligaciones contractuales y garantizando la legalidad en la contratación del recurso humano.

Anexo 4. Planillas de seguridad social.

5.6 Información financiera del contrato de Interventoría:


Concepto	Porcentaje	Valor
Anticipo	0,00%	$ 0,00
LA CORPORACION cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados con soportes y evidencias de ejecución.	90%	$ 185.187.026,70
Un último pago del DIEZ POR CIENTO (10%) al cumplimiento final de las labores contratadas y liquidación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar con la respectiva aprobación por parte del supervisor.	10%	$ 20,576.336,30
TOTAL:	**100%**	**$ 205.763.363,00**

Tabla 9. Forma de pago estipulada en el contrato de interventoría No. 01514 de 2025.

A la presente fecha, el Contratista de Interventoría presentó el Acta parcial N° 1 con un porcentaje ejecutado del 49.77%, a la fecha se encuentra aprobada y a la espera de ser desembolsado el pago; así mismo continua con el avance del contrato dando continuidad a la ejecución de las obras contratadas bajo su capacidad financiera, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

ESTADO FINANCIERO INTERVENTORIA		
DESCRIPCION	**VALOR**	**%**
Valor Contratado	$ 205.763.363,00	100%
Anticipo	$ 0,00	0%
Acta Parcial N°1.	$ 102.408.425,76	49.77%
Acta Parcial N°2.	$ 0,00	0,00%
Acta Parcial N°3.	$ 0,00	0,00%
Valor Pendiente:	$ 103.354.937,23	50.23%

Tabla 10. Estado financiero del contratista

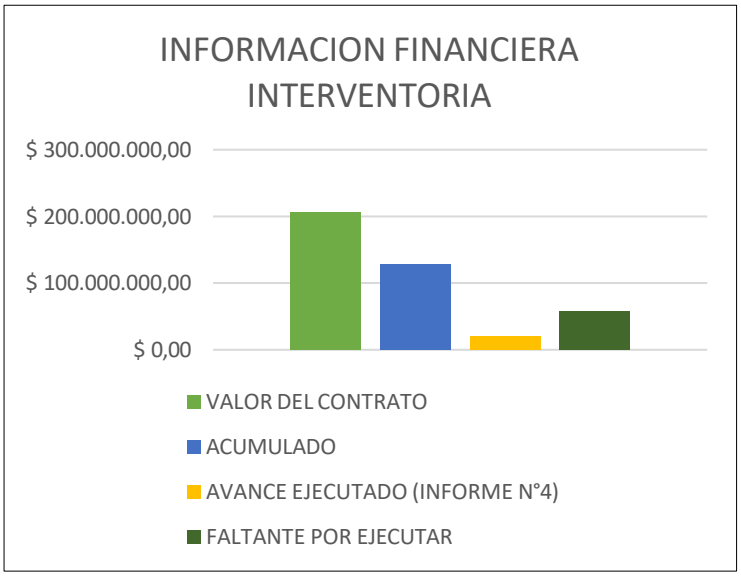

5.7 Avance en tiempo

CONTROL AVANCE EN TIEMPO					
Fecha Inicio:	19/01/2026	**Cantidad**		**Tiempo total transcurrido:**	67,23%
Fecha actual:	18/05/2026	129	[días]		
Fecha terminación:	15/07/2026	177	[días]		
Falta por Ejecucion:		48	[días]	**Tiempo faltante:**	32,77%

Tabla 11. Control de avance en el tiempo para la ejecución del contrato

La interventoría realizó un seguimiento exhaustivo—técnico, administrativo, social y ambiental—de las actividades ejecutadas por el contratista, en la capacidad operativa y en la coherencia de acuerdo a condiciones climáticas y acceso a las vías.

5.8 Actas efectuadas

ACTA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026
ACTA PARCIAL N°1	20 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA N°1	19 DE MAYO DE 2026

5.9 Relación de la correspondencia.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
Fecha	**Consecutivo**	**Remitente**	**Destinatario**	**Asunto**
27/04/2026	SPL.762.2026	CAS	RL – SIMCOC SAS	REQUERIMIENTO DOCUMENTACION TRAMITE CUENTA DE COBRO ACTA PARCIAL No. 01 OBRA
30/04/2026	OFC-011-UTRE	UT RESTAURACION ECOLOGICA	RL – SIMCOC SAS	ENTREGA DE INFORME No. 03
05/05/2026	OFC-012-UTRE	UT RESTAURACION ECOLOGICA	CAS	SOLICITUD PRORROGA No. 01
07/05/2026	OFC-013-UTRE	UT RESTAURACION ECOLOGICA	RL – SIMCOC SAS	MODIFICACION CRONOGRAMA
CORRESPONDENCIA ENVIADA				
Fecha	**Consecutivo**	**Remitente**	**Destinatario**	**Asunto**
20/04/26	OFICIO No. 011	RL – SIMCOC SAS	SUPERVISORA CAS	ENVIO ACTA PARCIAL INTER 01
05/05/26	OFICIO No. 012	RL – SIMCOC SAS	PLANEACION CAS	APROBACION PRORROGA No. 01
06/05/26	OFICIO No. 013	RL – SIMCOC SAS	CAS	ENTREGA DE REQUERIMIENTOS
08/05/26	OFICIO No. 014	RL – SIMCOC SAS	CAS	SOLICITUD PRORROGA INTERVENTORIA
08/05/26	OFICIO No. 015	RL – SIMCOC SAS	CAS	ENTREGA DOCUMENTOS PRORROGA OBRA

Anexo 5. Copias de las correspondencias enviadas y recibidas.

5.10 Seguimiento Bitácora


Se registran todas las actividades diarias y acontecimientos de la ejecución de la obra

Anexo 6. Copia Bitácora

5.11 Registro fotográfico







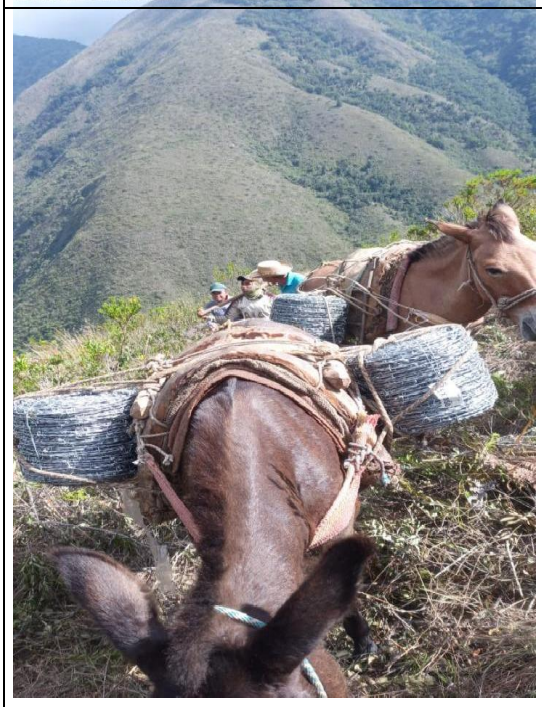





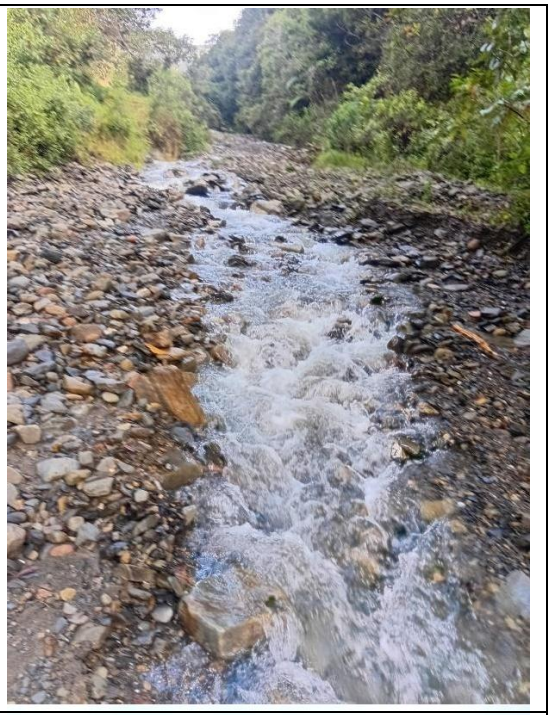

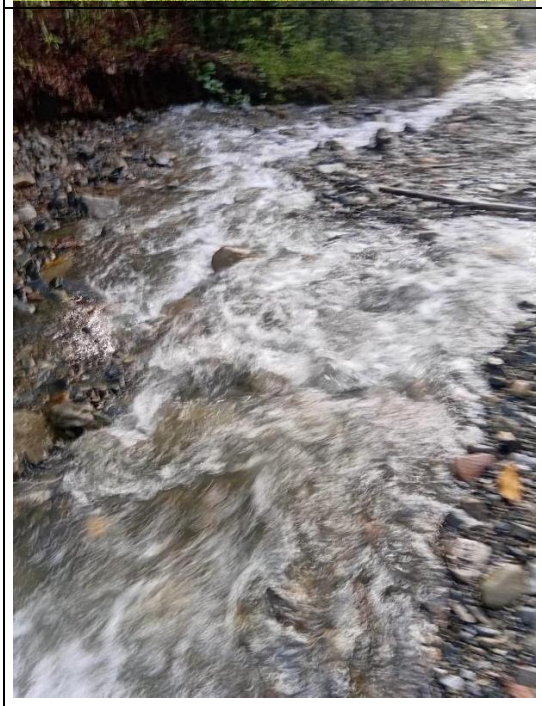



Km 2 Anillo vial Conjunto Natura Ecoparque Empresarial T1 Oficina 417
6076852120 - 3102007899
interventoriasimcoc@gmail.com



5.12 Estado Del Tiempo.

A continuación, se relaciona el estado del tiempo para el municipio de Onzaga – Santander.


En resumen, para el periodo desde el día 19 de Abril de 2026 al día 18 de Mayo de 2026, tenemos lo siguiente:

Abril: se caracterizó por ser uno de los más lluviosos del primer semestre. Se dieron lluvias intensas y constantes, con mayores acumulados en comparación con marzo, elevando el riesgo de saturación de suelos.


Mayo: Continuaron las lluvias intensas y constantes, durante todos los dias del mes de mayo correspondientes hasta el día 18 del presente informe.

Temperaturas: Han oscilado generalmente entre los 20°C y 23°C.

Precipitaciones recientes: Se dio un incremento de lluvias, con un 10% y 90% de probabilidad de lluvias sobre lo normal.

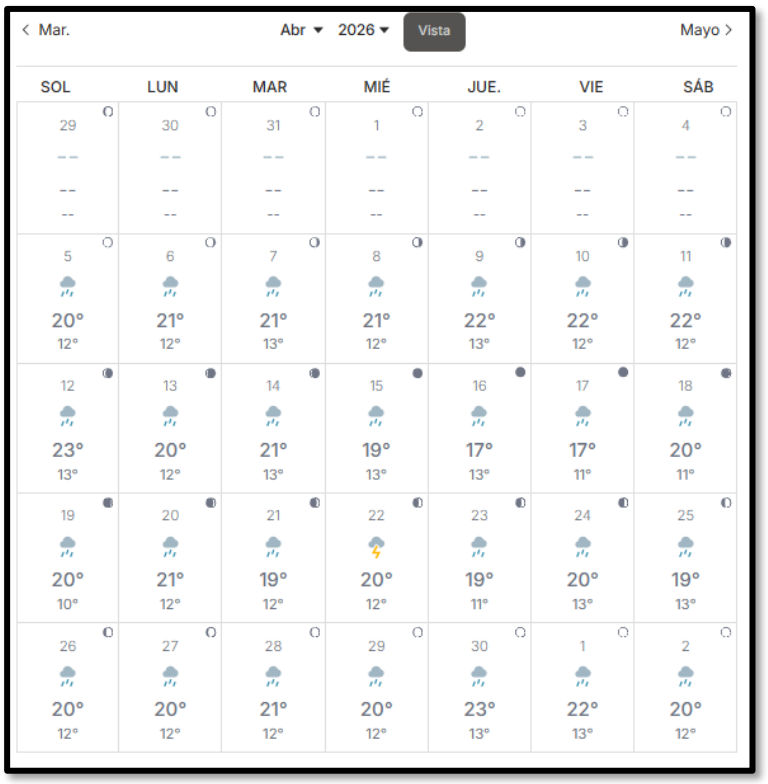

Se presenta CLIMA para el mes de ABRIL de 2026.

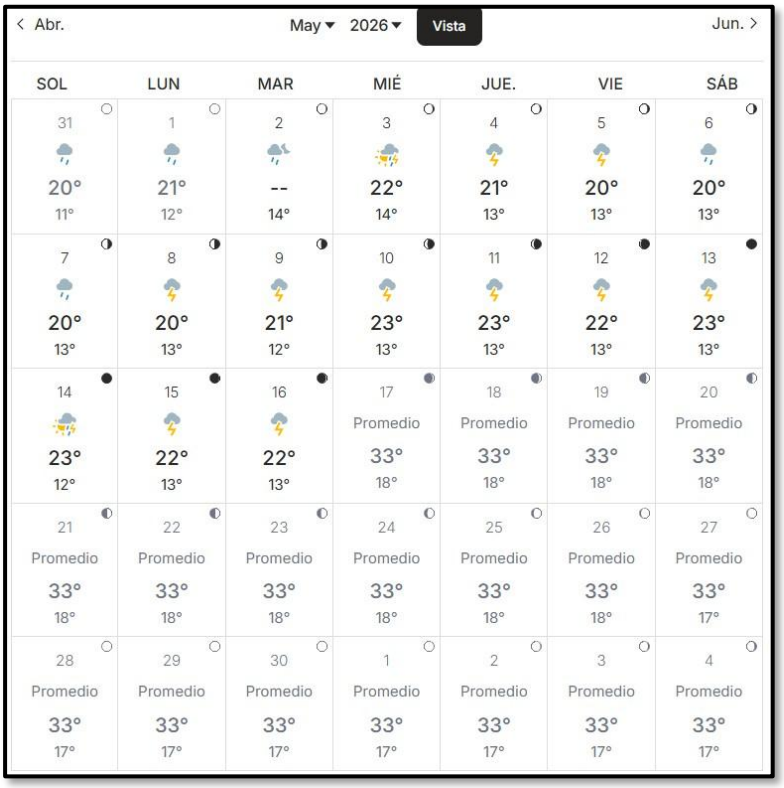

Se presenta CLIMA para el mes de MAYO de 2026

Km 2 Anillo vial Conjunto Natura Ecoparque Empresarial T1 Oficina 417
6076852120 - 3102007899
interventoriasimcoc@gmail.com

6. Conclusiones

Durante el periodo evaluado correspondiente al mes de abril a mayo de 2026, el proyecto evidenció un avance físico del **71.63%**.

Al cierre del cuarto mes, el contrato presenta un avance físico acumulado del **71.63%**, frente a una programación esperada del **71.63%** debido a la reprogramación realizada en el mes de mayo según prorroga N°1 efectuada por 2 meses para culminar las metras contractuales.

También se continuará realizando el seguimiento correspondiente para asegurar que los recursos pendientes se ejecuten de manera eficiente, transparente y conforme a los objetivos establecidos en el marco del contrato.

Para el componente de establecimiento de especies nativas registró un avance sobresaliente, alcanzando un acumulado de 57.50 hectáreas intervenidas con más de 63.825 árboles sembrados. Destaca especialmente la ejecución en el predio Vegas del Ramal con 8 hectáreas establecidas (más de 8.880 individuos), lo que sitúa esta actividad en un 41.27% del total contractual y a tan solo 5.50 hectáreas de consolidar el cumplimiento de la meta global de 63 hectáreas.

Aunque el establecimiento físico de cercas en el predio Vegas del Ramal se reporta en un 0% (manteniendo el avance global del contrato en un 50.55% gracias a lo ejecutado en Ranchería), la interventoría constató la ejecución efectiva de las actividades preliminares indispensables. Las labores de rocería mecánica, trazado, ahoyado y traslado de insumos prepararon el terreno de forma idónea, dejando el frente listo para el montaje estructural de los 3.522 kilómetros pendientes.
Los rendimientos operativos del cuarto mes se vieron condicionados por variables externas de tipo logístico, geográfico y climático. La ubicación crítica del predio Vegas del Ramal, caracterizada por pendientes pronunciadas, cruces de cuerpos hídricos y restricciones para el transporte mular, sumada a las condiciones climáticas adversas, limitó la velocidad de ejecución, obligando al contratista a priorizar el esfuerzo manual y la planeación por microfrentes.

Se concluye que el contratista mantiene al día el blindaje jurídico y financiero del proyecto, debido a la reprogramación realizada según prorroga n°1 habiéndose verificado la vigencia total de los amparos contractuales (pólizas). De igual forma, el análisis de las planillas PILA ratifica el cumplimiento estricto de las obligaciones de seguridad social del personal operativo, eximiendo a la entidad contratante de cualquier riesgo de responsabilidad solidaria.

Indicadores de cumplimiento

Indicador	Resultado
Cumplimiento del cronograma	Adecuado
Ejecución de actividades programadas	Adecuado
Cumplimiento ambiental	Adecuado
Implementación de SST	Adecuado
Gestión logística	Adecuado

7. Recomendaciones

Se recomienda al contratista diseñar y activar un plan de distribución logística alternativo para el predio Vegas del Ramal. Ante las restricciones del transporte mular por la topografía y los cuerpos hídricos, es imperativo establecer centros de acopio intermedios y reforzar las cuadrillas de traslado manual, garantizando el suministro continuo de postes, alambres y tensores para iniciar la instalación física de la cerca sin más dilaciones.


Dado que restan únicamente **5.50 hectáreas** para cumplir la meta contractual de establecimiento forestal, se recomienda concentrar los esfuerzos iniciales del próximo periodo en culminar esta actividad aprovechando las condiciones de humedad actuales del suelo, asegurando así el uso eficiente de los hidrorretenedores y el material vegetal remanente.

Ante las pendientes pronunciadas de la zona de intervención, se recomienda al contratista extremar las medidas de conservación de suelos durante las actividades de ahoyado y cercado. La interventoría sugiere realizar el cerramiento siguiendo las curvas de nivel del terreno en la medida de lo posible, evitando remover cobertura vegetal de forma masiva para prevenir procesos de erosión o escorrentía que afecten las microcuencas perimetrales.

Se insta al contratista a mantener un monitoreo constante de los reportes meteorológicos locales para programar las jornadas de campo más intensas durante las ventanas de buen tiempo, optimizando los rendimientos diarios y garantizando la seguridad industrial del talento humano en frentes de trabajo con alta inclinación.

La interventoría llama urgentemente a iniciar los trabajos de mantenimiento de las plantaciones a establecer, especialmente en predios ubicados en zonas con alta presencia de herbívora o baja disponibilidad hídrica, a fin de asegurar la supervivencia de las plántulas y la estabilidad del proceso de restauración.

Finalmente, se recomienda continuar con la información técnica y documental hacia la interventoría, facilitando el cierre ordenado de actividades y asegurando el cumplimiento integral del proyecto dentro de los plazos establecidos.



JUAN JOSE BONETT PARADA
REPRESENTANTE LEGAL
SIMCOC S.A.S.

ANEXO 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101078942	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	05	2026	19	01	2026	00:00	19	08	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA		NIT: 902.020.635-4
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 28 C - 68	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3115376740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		NIT: 804.000.292-0
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 09 - 06 BARRIO LA PLAYA	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER	TELÉFONO	7238925
BENEFICIARIO:	804000292 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LAVIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO SEGUN CONTRATO OBRA PUBLICA No. 01513-2025 OBJETO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	19/08/2026	$698,752,800.00	$698,752,800.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	19/08/2026	$698,752,800.00	$698,752,800.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	19/08/2026	$698,752,800.00	$698,752,800.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y EN ATENCION AL OTROSI AL CONTRATO DE OBRA No. 01513-2025, MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN DOS (02) MESES, SE PROCEDE A AMPLIAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA EN LOS MISMOS TERMINOS CONTRACTUALES, SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACION EN LOS VALORES ASEGURADOS NI EN LOS AMPAROS OTORGADOS.

-LOS DEMAS TERMINOS DE LA POLIZA SIN MODIFICAR POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****291,944.00	$ *******3,000.00	$ ******56,039.00	$ **********350,984.00	$ ******698,752,800.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FAMISEGUR LTDA	133521	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101078942

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101078942	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	05	2026	19	01	2026	00:00	19	08	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA		**NIT: 902.020.635-4**
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 28 C - 68	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3115376740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 804.000.292-0**
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 09 - 06 BARRIO LA PLAYA	**CIUDAD:** SAN GIL, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7238925

BENEFICIARIO: 804000292 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	19/08/2026	$698,752,800.00	$698,752,800.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	19/08/2026	$698,752,800.00	$698,752,800.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	19/08/2026	$698,752,800.00	$698,752,800.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101078942

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-40-101078942**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	**05**	**2026**	**19**	**01**	**2026**	**00:00**	**19**	**08**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA	**NIT: 902.020.635-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 44 NRO. 28 C - 68	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3115376740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	**NIT: 804.000.292-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 12 NRO. 09 - 06 BARRIO LA PLAYA	SAN GIL, SANTANDER	7238925

BENEFICIARIO:





VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****291,944.00	$ *******3,000.00	$ ******56,039.00	$ **********350,984.00	$ ******698,752,800.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FAMISEGUR LTDA	133521	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002119360420 (3900) 000000350984 (96) 20260218

REFERENCIA PAGO:

1100211936042-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101078942	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	05	2026	19	01	2026	00:00	19	08	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA		**NIT: 902.020.635-4**
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 28 C - 68	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3115376740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		**NIT: 804.000.292-0**
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 09 - 06 BARRIO LA PLAYA	**CIUDAD:** SAN GIL, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7238925

BENEFICIARIO: 804000292 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
TRANSTECOL S.A.S.	804004470-3	10.00
ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE	900860154-1	80.00
CORPORACION PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA	804007757-5	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101078942

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101252483	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	05	2026	19	01	2026	00:00	19	08	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA	NIT: 902.020.635-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 NRO. 28 C - 68	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3115376740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	NIT: 804.000.292-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 NRO. 09 - 06 BARRIO LA PLAYA	SAN GIL, SANTANDER	7238925

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO OBRA PUBLICA No. 01513-2025, CUYO OBJETO ES: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/01/2026	19/02/2027	$768,997,961.54	$768,997,961.54
CALIDAD DEL SERVICIO	19/01/2026	19/08/2027	$768,997,961.54	$768,997,961.54
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/01/2026	19/08/2029	$768,997,961.54	$768,997,961.54

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y EN ATENCION AL OTROSI AL CONTRATO DE OBRA No. 01513-2025, MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN DOS (02) MESES, SE PROCEDE A AMPLIAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA EN LOS MISMOS TERMINOS CONTRACTUALES, SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACION EN LOS VALORES ASEGURADOS NI EN LOS AMPAROS OTORGADOS.

-LOS DEMAS TERMINOS DE LA POLIZA SIN MODIFICAR POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****578,328.00	$ *******8,000.00	$ *****111,402.00	$ **********697,731.00	$ ****2,306,993,884.62	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FAMISEGUR LTDA	133521	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101252483

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101252483**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	**05**	**2026**	**19**	**01**	**2026**	**00:00**	**19**	**08**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA		**NIT: 902.020.635-4**
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 28 C - 68	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3115376740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		**NIT: 804.000.292-0**
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 09 - 06 BARRIO LA PLAYA	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER	TELÉFONO	7238925

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Cambiando Contigo — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****578,328.00	$ *******8,000.00	$ *****111,402.00	$ **********697,731.00	$ ****2,306,993,884.62	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FAMISEGUR LTDA	133521	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002119360406(3900)000000697731(96)20270119

REFERENCIA PAGO:
1100211936040-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101252483	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	05	2026	19	01	2026	00:00	19	08	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA		**NIT: 902.020.635-4**
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 28 C - 68	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3115376740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		**NIT: 804.000.292-0**
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 09 - 06 BARRIO LA PLAYA	**CIUDAD:** SAN GIL, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7238925

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
TRANSTECOL S.A.S.	804004470-3	10.00
ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE	900860154-1	80.00
CORPORACION PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA	804007757-5	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101252483

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101252483, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 06 días del mes de MAYO de 2026

14-44-101252483

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ANEXO 2

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902020635	4	UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CLL 44#28C-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3115376740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	293031554	9504528770	E	2026/05/11	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$1,889,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	60398467	CELIS MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	13569455	GUERRERO YASETH	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	63460483	GUERRERO YOLIMA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	60441173	PABON OLGA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$5,252,715**	**$840,600**			**$7,003,620**	**$280,400**			**$7,003,620**	**$280,400**			**$7,003,620**	**$487,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$0	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$487,600	$0	$0	$487,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$487,600	$0	$0	$487,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$280,400	$0	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				**4**	**$1,889,000**	**$0**	**$0**	**$1,889,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860154	1	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 2017	CALLE 44 28C-68	BUCARAMANGA-SANTANDER	6126805	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	307043017	9504515091	E	2026/05/14	2026/05/14	BANCOLOMBIA	0	$156,018,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO 2017 (270 Afiliados)						**$542,843,286**	**$86,870,200**			**$543,559,038**	**$21,730,400**			**$557,793,733**	**$22,300,400**			**$557,566,278**	**$25,117,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (270 Afiliados)						**$542,843,286**	**$86,870,200**			**$543,559,038**	**$21,730,400**			**$557,793,733**	**$22,300,400**			**$557,566,278**	**$25,117,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						**$1,858,243**	**$297,400**			**$1,858,243**	**$69,400**			**$1,858,243**	**$69,400**			**$1,858,243**	**$42,300**		**$0**	**$0**
1	CC	1090427168	MONTEJO ALEIDA	230301	28	$1,734,360	$277,500	ESSC24	28	$1,734,360	$69,400	CCF67	28	$1,734,360	$69,400	14-4	28	$1,734,360	$42,300	28	$0	$0
2	CC	1090427168	MONTEJO ALEIDA	230301	2	$123,883	$19,900	ESSC24	2	$123,883	$0	CCF67	2	$123,883	$0	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)						**$18,407,241**	**$2,945,700**			**$21,909,054**	**$868,200**			**$23,589,053**	**$935,400**			**$21,909,054**	**$488,800**		**$0**	**$0**
3	CC	37575479	CORPAS NANCY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1096183655	FLOREZ SARA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	7	$408,545	$16,400	CCF38	7	$408,544	$16,400	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
6	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	1	$58,364	$0	CCF38	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
7	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF38	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
8	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	2	$116,727	$0	CCF38	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
9	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF38	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	$0	4	$0	$0
10	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF38	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
11	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	1	$58,364	$0	CCF38	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
12	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF38	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
13	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	7	$408,545	$16,400	CCF38	7	$408,545	$16,400	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
14	CC	91429734	JIMENEZ WALTER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
15	CC	1137195076	MERCADO ALBERTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
16	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF38	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
17	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF38	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	$0	4	$0	$0
18	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF38	15	$875,453	$35,100	14-4	15	$875,453	$0	15	$0	$0
19	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF38	10	$583,635	$23,400	14-4	10	$583,635	$0	10	$0	$0
20	CC	37939658	NUÑEZ MARTHA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
21	CC	13887226	PINEDA GUILLERMO		0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
22	CC	5793827	ROJAS WILDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
23	CC	63462070	SOLANO ROCIO	25-14	28	$3,920,000	$627,200	EPS037	28	$3,920,000	$156,800	CCF38	28	$5,600,000	$224,000	14-4	28	$3,920,000	$272,900	28	$0	$0
24	CC	63462070	SOLANO ROCIO	25-14	2	$280,000	$44,800	EPS037	2	$280,000	$11,200	CCF38	2	$280,000	$11,200	14-4	2	$280,000	$19,500	2	$0	$0
25	CC	1096254945	TRIANA DAYANNA	230301	30	$1,950,905	$312,200	EPS037	30	$1,950,905	$78,100	CCF38	30	$1,950,905	$78,100	14-4	30	$1,950,905	$10,200	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$3,939,537**	**$630,500**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,117,753**	**$124,900**			**$5,252,715**	**$70,200**		**$0**	**$0**
26	CC	1031819067	GALINDO ANGIE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
27	CC	52758815	ORTEGA MIREYA	230201	4	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF22	4	$437,727	$17,600	14-4	30	$1,750,905	$18,300	4	$0	$0
28	CC	53067356	RAMIREZ JOHANNA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$929,121	$37,200	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (248 Afiliados)						**$506,381,930**	**$81,035,200**			**$511,037,216**	**$20,442,300**			**$516,972,349**	**$20,680,000**			**$516,289,931**	**$24,388,400**		**$0**	**$0**
29	CC	37557999	ACASIO MARIA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
30	CC	1098660270	AGUDELO EDSON	230201	30	$2,307,121	$369,200	EPS037	30	$2,307,121	$92,300	CCF39	30	$2,307,121	$92,300	14-4	30	$2,307,121	$160,600	30	$0	$0
31	CC	1096949337	ALBARRACIN MARIA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS002	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
32	CC	1098717452	ALVARADO INGRITH	230201	2	$123,883	$19,900	EPS002	2	$123,883	$5,000	CCF39	2	$123,883	$5,000	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
33	CC	1098717452	ALVARADO INGRITH	230201	28	$1,734,360	$277,500	EPS002	28	$1,734,360	$69,400	CCF39	28	$1,734,360	$69,400	14-4	28	$1,734,360	$42,300	28	$0	$0
34	CC	1095845530	ALVARADO YAIRET	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS041	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC	63516981	ALVAREZ MARITZA	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
36	CC	28414115	AMADO JULIETA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
37	CC	63467357	AMARIS ANDREA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
38	CC	1102357446	ANAYA JACKELINE	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS041	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
39	CC	1096957169	ARCINIEGAS JUAN	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
40	CC	1095932048	ARDILA ERICK	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$129,400	30	$0	$0
41	CC	1091972075	ARENGAS ANGIE	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS005	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
42	CC	91244374	ARGUELLO LUIS	230201	30	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
43	CC	1101546580	ARIAS MAURICIO	230301	24	$1,983,986	$317,500	EPS005	24	$1,983,986	$79,400	CCF39	24	$1,983,986	$79,400	14-4	24	$1,983,986	$138,100	24	$0	$0
44	CC	1101546580	ARIAS MAURICIO	230301	6	$454,663	$72,800	EPS005	6	$454,663	$18,200	CCF39	6	$454,663	$18,200	14-4	6	$454,663	$0	6	$0	$0
45	CC	1098607775	ARIZA JENNYFER	230201	30	$1,830,492	$292,900	EPS046	30	$1,830,492	$73,300	CCF39	30	$1,830,492	$73,300	14-4	30	$1,830,492	$127,500	30	$0	$0
46	CC	63467868	ARNACHE LUZ	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS005	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
47	CC	91018499	BALLESTEROS RAMIRO	230301	30	$2,199,198	$351,900	ESSC24	30	$2,199,198	$88,000	CCF39	30	$2,199,198	$88,000	14-4	30	$2,199,198	$153,100	30	$0	$0
48	CC	28152784	BARAJAS EMILSE	230301	30	$1,930,672	$309,000	EPS002	30	$1,930,672	$77,300	CCF39	30	$1,930,672	$77,300	14-4	30	$1,930,672	$47,100	30	$0	$0
49	CC	1102360381	BARAJAS JULIO	230301	30	$2,604,859	$416,800	EPS037	30	$2,604,859	$104,200	CCF39	30	$2,604,859	$104,200	14-4	30	$2,604,859	$181,300	30	$0	$0
50	CC	1090392041	BARRERA JORGE	230301	30	$2,479,984	$396,800	ESSC24	30	$2,479,984	$99,200	CCF39	30	$2,479,984	$99,200	14-4	30	$2,479,984	$172,700	30	$0	$0
51	CC	1098804712	BARRERA MICHEL	230301	30	$2,124,308	$339,900	EPS037	30	$2,124,308	$85,000	CCF39	30	$2,124,308	$85,000	14-4	30	$2,124,308	$51,800	30	$0	$0
52	CC	91324515	BASTIDAS JOSE	25-14	30	$2,273,318	$363,800	EPS002	30	$2,273,318	$91,000	CCF39	30	$2,273,318	$91,000	14-4	30	$2,273,318	$158,300	30	$0	$0
53	CC	1098787128	BAUTISTA INGRID	230301	30	$1,858,242	$297,400	ESSC24	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
54	CC	37555125	BAYONA MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
55	CC	1007775952	BECERRA JUAN	230301	30	$2,376,651	$380,300	EPS037	30	$2,376,651	$95,100	CCF39	30	$2,376,651	$95,100	14-4	30	$2,376,651	$165,500	30	$0	$0
56	CC	1005447666	BECERRA YEFERSON	230201	30	$2,721,509	$435,500	EPS037	30	$2,721,509	$108,900	CCF39	30	$2,721,509	$108,900	14-4	30	$2,721,509	$189,500	30	$0	$0
57	CC	1007785615	BELEÑO YESICA	230301	30	$2,207,085	$353,200	EPS046	30	$2,207,085	$88,300	CCF39	30	$2,207,085	$88,300	14-4	30	$2,207,085	$53,800	30	$0	$0
58	CC	63543362	BERNAL BIBIANA	230301	30	$2,207,085	$353,200	EPS002	30	$2,207,085	$88,300	CCF39	30	$2,207,085	$88,300	14-4	30	$2,207,085	$53,800	30	$0	$0
59	CC	37949409	BERNAL CLAUDIA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS041	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
60	CC	1098719806	BERNAL ERIKA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
61	CC	1102863911	BERTEL LISETH	230301	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF39	17	$1,867,632	$74,800	14-4	17	$992,180	$10,400	17	$0	$0
62	CC	1102863911	BERTEL LISETH	230301	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF39	13	$758,726	$30,400	14-4	13	$758,726	$8,000	13	$0	$0
63	CC	1098679470	BLANCO OLGA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
64	CC	1003249559	BONETT JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
65	CC	1096211185	CADENA MARIA	25-14	30	$5,044,800	$807,200	EPS037	30	$5,044,800	$201,800	CCF39	30	$5,044,800	$201,800	14-4	30	$5,044,800	$26,400	30	$0	$0
66	CC	1098639669	CALDERON WILMAR	230301	30	$2,475,349	$396,100	EPS037	30	$2,475,349	$99,100	CCF39	30	$2,475,349	$99,100	14-4	30	$2,475,349	$172,300	30	$0	$0
67	CC	13570873	CALIZ MANUEL	230301	30	$2,519,083	$403,100	EPS017	30	$2,519,083	$100,800	CCF39	30	$2,519,083	$100,800	14-4	30	$2,519,083	$175,400	30	$0	$0
68	CC	63452829	CARDENAS GLORIA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS046	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
69	CC	63561897	CARREÑO LUDY	230301	30	$2,280,991	$365,000	EPS002	30	$2,280,991	$91,300	CCF39	30	$2,280,991	$91,300	14-4	30	$2,280,991	$55,600	30	$0	$0
70	CC	1098618166	CARRILLO SERGIO	230201	30	$2,199,198	$351,900	EPS010	30	$2,199,198	$88,000	CCF39	30	$2,199,198	$88,000	14-4	30	$2,199,198	$153,100	30	$0	$0
71	CC	63496723	CARVAJAL LUDY	230201	30	$1,858,242	$297,400	EPS002	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
72	CC	1014292914	CASAS PEDRO	230201	30	$1,914,410	$306,400	EPS002	30	$1,914,410	$76,600	CCF39	30	$1,914,410	$76,600	14-4	30	$1,914,410	$46,700	30	$0	$0
73	CC	1095921730	CASTELLANOS DIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
74	CC	1102349207	CASTELLANOS SANDRA	230301	14	$867,180	$138,800	EPS002	14	$867,180	$34,700	CCF39	14	$1,102,041	$44,100	14-4	14	$867,180	$21,200	14	$0	$0
75	CC	63453194	CASTELLANOS SANDRA	230301	30	$2,094,746	$335,200	EPS002	30	$2,094,746	$83,800	CCF39	30	$2,094,746	$83,800	14-4	30	$2,094,746	$51,100	30	$0	$0
76	CC	91518672	CASTILLO FREDY	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS010	23	$1,342,361	$53,700	CCF39	23	$1,342,361	$53,700	14-4	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
77	CC	91518672	CASTILLO FREDY	230301	2	$116,728	$18,700	EPS010	2	$116,728	$4,700	CCF39	2	$116,728	$4,700	14-4	2	$116,728	$0	2	$0	$0
78	CC	91518672	CASTILLO FREDY	230301	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF39	5	$291,818	$11,700	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0
79	CC	63526811	CASTILLO MATILDE	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS005	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
80	CC	37747833	CASTRO YUDITH	230201	2	$123,883	$19,900	EPS046	2	$123,883	$5,000	CCF39	2	$123,883	$5,000	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
81	CC	37747833	CASTRO YUDITH	230201	28	$1,734,360	$277,500	EPS046	28	$1,734,360	$69,400	CCF39	28	$1,734,360	$69,400	14-4	28	$1,734,360	$42,300	28	$0	$0
82	CC	1098758144	CEPEDA LEIDY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
83	CC	63397423	CHAPARRO MARIA	230301	30	$1,976,494	$316,300	EPS005	30	$1,976,494	$79,100	CCF39	30	$1,976,494	$79,100	14-4	30	$1,976,494	$48,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
84	CC	1098814538	CHAPARRO YULIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
85	CC	91108127	CHINCHILLA MARCO	230301	30	$2,628,552	$420,600	EPS037	30	$2,628,552	$105,200	CCF39	30	$2,628,552	$105,200	14-4	30	$2,628,552	$183,000	30	$0	$0
86	CC	37273320	CONTRERAS ELIZABETH	230201	30	$1,942,708	$310,900	EPS002	30	$1,942,708	$77,800	CCF39	30	$1,942,708	$77,800	14-4	30	$1,942,708	$135,300	30	$0	$0
87	CC	37711095	CONTRERAS EMILSEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
88	CC	1234342779	CONTRERAS YUSMARI	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS041	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
89	CC	1098730977	CORTES LAURA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS010	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
90	CC	1110470633	CORZO DIANA	230201	30	$1,858,242	$297,400	EPS041	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
91	CC	1101697901	CORZO DUVAN	230201	30	$2,359,140	$377,500	EPS041	30	$2,359,140	$94,400	CCF39	30	$2,359,140	$94,400	14-4	30	$2,359,140	$164,200	30	$0	$0
92	CC	63447201	CRISTANCHO MAGDA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
93	CC	1098688703	CRUZ DIEGO	231001	30	$2,250,000	$360,000	EPS037	30	$2,250,000	$90,000	CCF39	30	$2,250,000	$90,000	14-4	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
94	CC	1101684191	CRUZ MANUEL	230301	30	$2,199,198	$351,900	EPS005	30	$2,199,198	$88,000	CCF39	30	$2,199,198	$88,000	14-4	30	$2,199,198	$153,100	30	$0	$0
95	CC	8525256	DE LA CRUZ JAVIER	25-14	30	$2,479,984	$396,800	EPS037	30	$2,479,984	$99,200	CCF39	30	$2,479,984	$99,200	14-4	30	$2,479,984	$172,700	30	$0	$0
96	CC	13537226	DELGADO PEDRO	25-14	30	$2,479,984	$396,800	EPS037	30	$2,479,984	$99,200	CCF39	30	$2,479,984	$99,200	14-4	30	$2,479,984	$172,700	30	$0	$0
97	CC	1096958700	DIAZ JENNY	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
98	CC	5759212	DIAZ LUIS	25-14	30	$2,299,162	$367,900	EPS037	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
99	CC	1098707236	DIAZ ROSSY	230301	3	$185,824	$29,800	EPS037	3	$185,824	$7,500	CCF39	3	$185,824	$7,500	14-4	3	$185,824	$0	3	$0	$0
100	CC	1098707236	DIAZ ROSSY	230301	27	$1,672,418	$267,600	EPS037	27	$1,672,418	$66,900	CCF39	27	$1,672,418	$66,900	14-4	27	$1,672,418	$40,800	27	$0	$0
101	CC	63532783	DIAZ YURANY	231001	23	$1,509,118	$241,500	EPS010	23	$1,509,118	$60,400	CCF39	23	$1,509,118	$60,400	14-4	23	$1,509,118	$36,800	23	$0	$0
102	CC	63532783	DIAZ YURANY	231001	3	$185,824	$29,800	EPS010	3	$185,824	$7,500	CCF39	3	$185,824	$7,500	14-4	3	$185,824	$0	3	$0	$0
103	CC	63532783	DIAZ YURANY	231001	3	$185,824	$29,800	EPS010	3	$185,824	$7,500	CCF39	3	$185,824	$7,500	14-4	3	$185,824	$0	3	$0	$0
104	CC	63532783	DIAZ YURANY	231001	1	$61,941	$10,000	EPS010	1	$61,941	$2,500	CCF39	1	$61,941	$2,500	14-4	1	$61,941	$0	1	$0	$0
105	CC	1100889166	DOMINGUEZ JOAQUIN	25-14	30	$2,299,162	$367,900	EPS041	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
106	CC	1005210095	DUARTE CESAR	230301	25	$1,932,629	$309,300	EPS005	25	$1,932,629	$77,400	CCF39	25	$1,932,629	$77,400	14-4	25	$1,932,629	$134,600	25	$0	$0
107	CC	1005210095	DUARTE CESAR	230301	2	$146,613	$23,500	EPS005	2	$146,613	$5,900	CCF39	2	$146,613	$5,900	14-4	2	$146,613	$0	2	$0	$0
108	CC	1005210095	DUARTE CESAR	230301	3	$219,920	$35,200	EPS005	3	$219,920	$8,800	CCF39	3	$219,920	$8,800	14-4	3	$219,920	$0	3	$0	$0
109	CC	1096957615	DUARTE DANIA	230201	30	$3,550,000	$568,000	EPS005	30	$3,550,000	$142,000	CCF39	30	$3,550,000	$142,000	14-4	30	$3,550,000	$247,100	30	$0	$0
110	CC	1096957274	FAYAD NICOLAS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
111	CC	1102357436	FIGUEROA ZEYIL	25-14	30	$1,926,237	$308,200	EPS037	30	$1,926,237	$77,100	CCF39	30	$1,926,237	$77,100	14-4	30	$1,926,237	$47,000	30	$0	$0
112	CC	1002255665	FLOREZ CARLOS	230301	30	$2,379,633	$380,800	EPS005	30	$2,379,633	$95,200	CCF39	30	$2,379,633	$95,200	14-4	30	$2,379,633	$165,700	30	$0	$0
113	CC	1048554693	FLOREZ JOHN	230301	30	$2,299,162	$367,900	EPS005	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
114	CC	91526986	FLOREZ NOLBERTO	230201	30	$2,404,122	$384,700	EPS005	30	$2,404,122	$96,200	CCF39	30	$2,404,122	$96,200	14-4	30	$2,404,122	$167,400	30	$0	$0
115	CC	1098806839	FLOREZ WILMER	230301	30	$2,411,621	$385,900	EPS002	30	$2,411,621	$96,500	CCF39	30	$2,411,621	$96,500	14-4	30	$2,411,621	$167,900	30	$0	$0
116	CC	52115237	FLOREZ YANEHT	25-14	25	$1,548,535	$247,800	EPS046	25	$1,548,535	$62,000	CCF39	25	$1,548,535	$62,000	14-4	25	$1,548,535	$37,800	25	$0	$0
117	CC	52115237	FLOREZ YANEHT	25-14	5	$309,707	$49,600	EPS046	5	$309,707	$12,400	CCF39	5	$309,707	$12,400	14-4	5	$309,707	$0	5	$0	$0
118	CC	1096226215	FONTALVO ADOLFO	230301	30	$1,830,492	$292,900	EPS010	30	$1,830,492	$73,300	CCF39	30	$1,830,492	$73,300	14-4	30	$1,830,492	$127,500	30	$0	$0
119	CC	1095841163	FORERO WILLIAM	230301	28	$2,413,703	$386,200	EPS002	28	$2,413,703	$96,600	CCF39	28	$2,413,703	$96,600	14-4	28	$2,413,703	$168,000	28	$0	$0
120	CC	1095841163	FORERO WILLIAM	230301	2	$146,613	$23,500	EPS002	2	$146,613	$5,900	CCF39	2	$146,613	$5,900	14-4	2	$146,613	$0	2	$0	$0
121	CC	1096800715	GALVIS MARLON	230301	4	$293,227	$47,000	EPS005	4	$293,227	$11,800	CCF39	4	$293,227	$11,800	14-4	4	$293,227	$20,500	4	$0	$0
122	CC	91217067	GAMEZ FELIX		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
123	CC	63332855	GARCIA ISABEL	230301	30	$2,299,162	$367,900	EPS005	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
124	CC	1097912054	GARCIA JHONNATHAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
125	CC	91248197	GARCIA JULIAN	25-14	30	$2,404,124	$384,700	EPS037	30	$2,404,124	$96,200	CCF39	30	$2,404,124	$96,200	14-4	30	$2,404,124	$167,400	30	$0	$0
126	CC	1095823413	GARCIA LAURA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
127	CC	37896691	GARCIA LILIANA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS002	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
128	CC	28351864	GOMEZ LILIANA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
129	CC	1095825849	GOMEZ NELSON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
130	CC	85449261	GONZALEZ EDUARDO	230301	30	$2,872,704	$459,700	EPS010	30	$2,872,704	$115,000	CCF39	30	$2,872,704	$115,000	14-4	30	$2,872,704	$200,000	30	$0	$0
131	CC	1095950052	GONZALEZ INGRID	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS005	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
132	CC	1095301092 GRANADOS SHARITH	230301	1	$61,941	$10,000	EPS002	1	$61,941	$2,500	CCF39	1	$61,941	$2,500	14-4	1	$61,941	$0	1	$0	$0
133	CC	1095301092 GRANADOS SHARITH	230301	29	$1,796,301	$287,500	EPS002	29	$1,796,301	$71,900	CCF39	29	$1,796,301	$71,900	14-4	29	$1,796,301	$43,800	29	$0	$0
134	CC	37948962 GUAITERO NUBIA	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
135	CC	1098760058 GUARIN ADRIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
136	CC	1005210558 GUARIN JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
137	CC	91514289 GUARIN JUAN	230201	29	$2,175,000	$348,000	EPS037	29	$2,175,000	$87,000	CCF39	29	$2,175,000	$87,000	14-4	29	$2,175,000	$151,400	29	$0	$0
138	CC	91514289 GUARIN JUAN	230201	1	$75,000	$12,000	EPS037	1	$75,000	$0	CCF39	1	$75,000	$0	14-4	1	$75,000	$0	1	$0	$0
139	CC	63538204 GUEVARA YEISI	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS002	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
140	CC	63480551 GUTIERREZ ADRIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
141	CC	13716170 GUTIERREZ ANDRES	230201	30	$1,830,492	$292,900	EPS017	30	$1,830,492	$73,300	CCF39	30	$1,830,492	$73,300	14-4	30	$1,830,492	$127,500	30	$0	$0
142	CC	1098658371 GUTIERREZ HAROLD	231001	30	$2,360,390	$377,700	ESSC24	30	$2,360,390	$94,500	CCF39	30	$2,360,390	$94,500	14-4	30	$2,360,390	$164,300	30	$0	$0
143	CC	63483671 HERNANDEZ AURORA	231001	30	$1,858,242	$297,400	EPS010	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
144	CC	1098617328 HERNANDEZ YENNY	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS002	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
145	CC	72172212 HERRERA MIGUEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
146	CC	1098734602 HOYOS LUZ	25-14	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF39	25	$1,459,088	$58,400	14-4	25	$1,459,088	$15,300	25	$0	$0
147	CC	1098734602 HOYOS LUZ	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF39	5	$291,817	$11,700	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0
148	CC	1007095948 HURTADO SONIA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
149	CC	1102370695 JAIMES MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
150	CC	63474657 JAIMES YASMITH	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
151	CC	13924885 JIMENEZ APOSTOL	25-14	30	$2,659,030	$425,500	EPS037	30	$2,659,030	$106,400	CCF39	30	$2,659,030	$106,400	14-4	30	$2,659,030	$185,100	30	$0	$0
152	CC	28152771 JIMENEZ EDITH	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS046	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
153	CC	37615503 JIMENEZ MARYURY	230201	30	$2,032,663	$325,300	EPS010	30	$2,032,663	$81,400	CCF39	30	$2,032,663	$81,400	14-4	30	$2,032,663	$49,600	30	$0	$0
154	CC	1002330045 JUNCO JUAN	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF39	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
155	CC	63471697 LASCARRO YESENIA	230301	16	$1,866,667	$298,700	EPS005	16	$1,866,667	$74,700	CCF39	16	$1,866,667	$74,700	14-4	16	$1,866,667	$45,500	16	$0	$0
156	CC	1098667743 LEON YENNIFER	230301	30	$1,914,410	$306,400	EPS046	30	$1,914,410	$76,600	CCF39	30	$1,914,410	$76,600	14-4	30	$1,914,410	$46,700	30	$0	$0
157	PT	4978415 LIEVANO DANIEL	230301	30	$2,510,335	$401,700	EPS017	30	$2,510,335	$100,500	CCF39	30	$2,510,335	$100,500	14-4	30	$2,510,335	$174,800	30	$0	$0
158	CC	1096188619 LOBO JUAN	230301	30	$2,545,323	$407,300	EPS037	30	$2,545,323	$101,900	CCF39	30	$2,545,323	$101,900	14-4	30	$2,545,323	$177,200	30	$0	$0
159	CC	1096225254 LOPEZ KELLY	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF39	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
160	CC	63308866 LOPEZ PATRICIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
161	CC	63523782 LOZADA ROCIO	230201	30	$1,942,708	$310,900	EPS046	30	$1,942,708	$77,800	CCF39	30	$1,942,708	$77,800	14-4	30	$1,942,708	$135,300	30	$0	$0
162	CC	1095957256 LOZANO KAROL	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS017	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
163	CC	1099202612 LUQUE ALFREDO	25-14	30	$2,199,198	$351,900	ESSC24	30	$2,199,198	$88,000	CCF39	30	$2,199,198	$88,000	14-4	30	$2,199,198	$153,100	30	$0	$0
164	CC	1099210061 MACHUCA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
165	CC	1102380074 MARTINEZ SAIBO	230301	30	$2,765,243	$442,500	EPS002	30	$2,765,243	$110,700	CCF39	30	$2,765,243	$110,700	14-4	30	$2,765,243	$192,500	30	$0	$0
166	CC	1096186792 MARULANDA JOHANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
167	CC	1151472181 MEDINA GIOVANNY	25-14	30	$2,299,162	$367,900	EPS041	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
168	CC	91211674 MENDEZ LUIS	25-14	30	$2,199,198	$351,900	EPS010	30	$2,199,198	$88,000	CCF39	30	$2,199,198	$88,000	14-4	30	$2,199,198	$153,100	30	$0	$0
169	CC	13853709 MENDEZ SABAS	230301	30	$2,359,140	$377,500	EPS002	30	$2,359,140	$94,400	CCF39	30	$2,359,140	$94,400	14-4	30	$2,359,140	$164,200	30	$0	$0
170	CC	1005461995 MENDOZA CARMEN	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS017	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
171	CC	1005151309 MENDOZA DANIEL	230201	25	$1,548,535	$247,800	ESSC24	25	$1,548,535	$62,000	CCF39	25	$1,548,535	$62,000	14-4	25	$1,548,535	$37,800	25	$0	$0
172	CC	1005151309 MENDOZA DANIEL	230201	2	$123,883	$19,900	ESSC24	2	$123,883	$0	CCF39	2	$123,883	$0	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
173	CC	1005151309 MENDOZA DANIEL	230201	3	$185,824	$29,800	ESSC24	3	$185,824	$7,500	CCF39	3	$185,824	$7,500	14-4	3	$185,824	$0	3	$0	$0
174	CC	1007470412 MENESES DIEGO	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
175	CC	1096236487 MERCADO BERALDO	230301	30	$1,910,079	$305,700	EPS037	30	$1,910,079	$76,500	CCF39	30	$1,910,079	$76,500	14-4	30	$1,910,079	$133,000	30	$0	$0
176	CC	63394786 MEZA DORA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
177	CC	37843508 MONTAÑEZ ANGELICA	231001	28	$1,734,360	$277,500	EPS002	28	$1,734,360	$69,400	CCF39	28	$1,734,360	$69,400	14-4	28	$1,734,360	$42,300	28	$0	$0
178	CC	37843508 MONTAÑEZ ANGELICA	231001	2	$123,883	$19,900	EPS002	2	$123,883	$5,000	CCF39	2	$123,883	$5,000	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
179	CC	37615393 MONTAÑEZ SONIA	231001	30	$1,858,242	$297,400	EPS010	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
180	CC	91534797 MORALES DEYBER	230301	30	$2,606,550	$417,100	EPS046	30	$2,606,550	$104,300	CCF39	30	$2,606,550	$104,300	14-4	30	$2,606,550	$181,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
181	CC	1005337697	MORALES MICHAEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
182	CC	1098170570	MORENO SANDRA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS002	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
183	CC	37617625	MOYANO EMY	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS002	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
184	CC	91042446	MURILLO JORGE	25-14	30	$2,628,552	$420,600	EPS005	30	$2,628,552	$105,200	CCF39	30	$2,628,552	$105,200	14-4	30	$2,628,552	$183,000	30	$0	$0
185	CC	1098795855	NAVARRO OTTO	231001	30	$2,386,630	$381,900	EPS005	30	$2,386,630	$95,500	CCF39	30	$2,386,630	$95,500	14-4	30	$2,386,630	$166,200	30	$0	$0
186	CC	1098710200	NIEVES JAVIER	230301	30	$2,307,121	$369,200	EPS002	30	$2,307,121	$92,300	CCF39	30	$2,307,121	$92,300	14-4	30	$2,307,121	$160,600	30	$0	$0
187	CC	1022934005	NIÑO INGRETH	230301	8	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF39	8	$875,453	$35,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	8	$0	$0
188	CC	91512633	NIÑO JUAN	230201	30	$2,384,880	$381,600	EPS046	30	$2,384,880	$95,400	CCF39	30	$2,384,880	$95,400	14-4	30	$2,384,880	$166,000	30	$0	$0
189	CC	80103391	NOVA JAVIER	230201	30	$2,499,839	$400,000	EPS010	30	$2,499,839	$100,000	CCF39	30	$2,499,839	$100,000	14-4	30	$2,499,839	$174,000	30	$0	$0
190	CC	1098757812	OCHOA FABIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
191	CC	63507990	OJEDA BETSABE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
192	PT	5382016	OJEDA YUSMARY	230301	30	$1,858,242	$297,400	ESSC24	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
193	CC	1098673745	ORDOÑEZ JONH	231001	30	$2,299,162	$367,900	EPS002	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
194	CC	1090363811	ORDOÑEZ JOSE	230201	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF39	30	$2,250,000	$90,000	14-4	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
195	CC	1096219631	ORTIZ ADRIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
196	CC	63500836	ORTIZ ELVA	25-14	30	$2,032,663	$325,300	EPS005	30	$2,032,663	$81,400	CCF39	30	$2,032,663	$81,400	14-4	30	$2,032,663	$49,600	30	$0	$0
197	CC	1002421578	ORTIZ ESTEBANA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
198	CC	1096950368	ORTIZ LUIS	230301	30	$1,976,494	$316,300	EPS005	30	$1,976,494	$79,100	CCF39	30	$1,976,494	$79,100	14-4	30	$1,976,494	$48,200	30	$0	$0
199	CC	1098635217	ORTIZ WALTER	25-14	30	$2,660,281	$425,700	EPS037	30	$2,660,281	$106,500	CCF39	30	$2,660,281	$106,500	14-4	30	$2,660,281	$185,200	30	$0	$0
200	CC	37615304	OSORIO ELIZABETH	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
201	CC	42484201	OSORIO LUZ		0	$0	$0	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF39	29	$1,692,542	$67,800	14-4	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
202	CC	42484201	OSORIO LUZ		0	$0	$0	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
203	CC	1052217120	OVIEDO ALBEIRO	230301	30	$2,299,162	$367,900	EPS037	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
204	CC	1098617741	PACHON EDINSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
205	CC	1143262515	PAIMA BRAYAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
206	CC	1121300921	PALOMINO JOSE	230301	30	$2,359,140	$377,500	ESSC24	30	$2,359,140	$94,400	CCF39	30	$2,359,140	$94,400	14-4	30	$2,359,140	$164,200	30	$0	$0
207	CC	37863327	PALOMINO YEILLY	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS017	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
208	CC	13723772	PARADA JHON	230301	30	$2,360,390	$377,700	ESSC24	30	$2,360,390	$94,500	CCF39	30	$2,360,390	$94,500	14-4	30	$2,360,390	$164,300	30	$0	$0
209	CC	1096950420	PARRA HERWIN	230301	30	$2,656,532	$425,100	EPS037	30	$2,656,532	$106,300	CCF39	30	$2,656,532	$106,300	14-4	30	$2,656,532	$184,900	30	$0	$0
210	CC	1098638768	PARRA LUIS	230301	30	$1,785,905	$285,800	EPS005	30	$1,785,905	$71,500	CCF39	30	$1,785,905	$71,500	14-4	30	$1,785,905	$124,300	30	$0	$0
211	CC	32880114	PEÑA LILIANA	25-14	6	$371,648	$59,500	ESSC24	6	$371,648	$14,900	CCF39	6	$371,648	$14,900	14-4	6	$371,648	$0	6	$0	$0
212	CC	32880114	PEÑA LILIANA	25-14	24	$1,486,594	$237,900	ESSC24	24	$1,486,594	$59,500	CCF39	24	$1,486,594	$59,500	14-4	24	$1,486,594	$36,300	24	$0	$0
213	CC	91493105	PEÑALOZA PEDRO	25-14	30	$2,376,651	$380,300	EPS010	30	$2,376,651	$95,100	CCF39	30	$2,376,651	$95,100	14-4	30	$2,376,651	$165,500	30	$0	$0
214	CC	1096234052	PEREIRA ANGIE	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF39	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
215	CC	63552214	PEREZ JHOENY	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
216	CC	1095946551	PEREZ MARY	230301	30	$2,207,085	$353,200	ESSC24	30	$2,207,085	$88,300	CCF39	30	$2,207,085	$88,300	14-4	30	$2,207,085	$53,800	30	$0	$0
217	CC	91449316	PETALUA JOHN	230301	30	$2,376,651	$380,300	EPS005	30	$2,376,651	$95,100	CCF39	30	$2,376,651	$95,100	14-4	30	$2,376,651	$165,500	30	$0	$0
218	CC	91500408	PICON ELISAIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
219	CC	63561982	PINTO HELGA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS010	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
220	CC	1005327428	PINTO JENNYFER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
221	CC	1101693507	PINZON YESICA	25-14	30	$1,858,242	$297,400	ESSC24	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
222	CC	1098628285	PLATA NANCY	230301	30	$1,830,492	$292,900	EPS010	30	$1,830,492	$73,300	CCF39	30	$1,830,492	$73,300	14-4	30	$1,830,492	$127,500	30	$0	$0
223	CC	37576001	POLANCO YESY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF39	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
224	CC	1232888094	PORRAS KAREN	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS005	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
225	CC	91496427	POVEDA GERARDO	231001	30	$2,604,859	$416,800	EPS046	30	$2,604,859	$104,200	CCF39	30	$2,604,859	$104,200	14-4	30	$2,604,859	$181,300	30	$0	$0
226	CC	1096230822	POZOS MIGUEL	230301	30	$2,199,198	$351,900	EPS037	30	$2,199,198	$88,000	CCF39	30	$2,199,198	$88,000	14-4	30	$2,199,198	$153,100	30	$0	$0
227	CC	63321111	QUINTERO ROSA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS010	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
228	PT	4720922	RAMOS AIRONAH	230301	2	$123,883	$19,900	EPS005	2	$123,883	$5,000	CCF39	2	$123,883	$5,000	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
229	PT	4720922	RAMOS AIRONAH	230301	28	$1,734,360	$277,500	EPS005	28	$1,734,360	$69,400	CCF39	28	$1,734,360	$69,400	14-4	28	$1,734,360	$42,300	28	$0	$0
230	CC	28020791	REINA GIRLEZA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
231	CC	1098695331	REYES LEIDY	230301	30	$2,207,085	$353,200	EPS037	30	$2,207,085	$88,300	CCF39	30	$2,207,085	$88,300	14-4	30	$2,207,085	$53,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
232	CC 1118537319	REYES MARISOL	230201	30	$1,858,242	$297,400	EPS041	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
233	CC 37546799	RICO JACKELINNE	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
234	CC 63525458	RINCON MAYERLY	25-14	30	$1,858,242	$297,400	ESSC24	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
235	CC 91538932	RIVERA CRISTIAN	230301	30	$2,449,108	$391,900	EPS017	30	$2,449,108	$98,000	CCF39	30	$2,449,108	$98,000	14-4	30	$2,449,108	$170,500	30	$0	$0
236	CC 13719299	RIVERA JUAN	25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF39	30	$2,250,000	$90,000	14-4	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
237	CC 63481169	ROA CLAUDIA	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS010	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
238	CC 1098665863	RODRIGUEZ ADRIANA	231001	30	$1,858,242	$297,400	ESSC24	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
239	CC 1096243605	RODRIGUEZ FRANCO	25-14	1	$73,307	$11,800	EPS041	1	$73,307	$3,000	CCF39	1	$73,307	$3,000	14-4	1	$73,307	$0	1	$0	$0
240	CC 1096243605	RODRIGUEZ FRANCO	25-14	29	$2,348,310	$375,800	EPS041	29	$2,348,310	$94,000	CCF39	29	$2,623,210	$105,000	14-4	29	$2,348,310	$163,500	29	$0	$0
241	CC 1005107015	RODRIGUEZ HANS	25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS017	30	$2,250,000	$90,000	CCF39	30	$2,250,000	$90,000	14-4	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
242	CC 91526671	RODRIGUEZ JHON	230301	30	$2,307,121	$369,200	EPS041	30	$2,307,121	$92,300	CCF39	30	$2,307,121	$92,300	14-4	30	$2,307,121	$160,600	30	$0	$0
243	CC 13507666	ROJAS JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
244	CC 1022976491	ROJAS LEIDY	230301	2	$123,883	$19,900	EPS037	2	$123,883	$5,000	CCF39	2	$123,883	$5,000	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
245	CC 1022976491	ROJAS LEIDY	230301	2	$123,883	$19,900	EPS037	2	$123,883	$5,000	CCF39	2	$123,883	$5,000	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
246	CC 1022976491	ROJAS LEIDY	230301	26	$1,610,477	$257,700	EPS037	26	$1,610,477	$64,500	CCF39	26	$1,610,477	$64,500	14-4	26	$1,610,477	$39,300	26	$0	$0
247	CC 13744232	ROJAS NESTOR	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
248	CC 1005188337	ROMERO DAYRO	230301	30	$2,299,162	$367,900	EPS037	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
249	CC 1096241076	ROMERO JULIETH	25-14	30	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
250	CC 63343647	RONDON CLARA	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF39	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
251	CC 63343647	RONDON CLARA	25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS010	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-4	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
252	CC 28015815	ROSADO MARIELA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
253	CC 1098792345	RUEDA BRANDON	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF39	27	$1,748,473	$70,000	14-4	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
254	CC 1098792345	RUEDA BRANDON	230201	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF39	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
255	CC 1098666573	RUEDA JHONATTAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
256	CC 1096216524	RUEDA JOSE	230301	30	$2,359,140	$377,500	EPS005	30	$2,359,140	$94,400	CCF39	30	$2,359,140	$94,400	14-4	30	$2,359,140	$164,200	30	$0	$0
257	CC 26748222	SAAVEDRA NELYS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,921,591	$76,900	CCF39	30	$1,921,591	$76,900	14-4	30	$1,921,591	$46,900	30	$0	$0
258	CC 63347291	SALON MARGOTH	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS037	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
259	CC 1116276189	SANABRIA JAIRO	230301	30	$2,449,108	$391,900	EPS041	30	$2,449,108	$98,000	CCF39	30	$2,449,108	$98,000	14-4	30	$2,449,108	$170,500	30	$0	$0
260	CC 91496105	SANCHEZ ARLES	230301	30	$2,560,318	$409,700	ESSC24	30	$2,560,318	$102,500	CCF39	30	$2,560,318	$102,500	14-4	30	$2,560,318	$178,200	30	$0	$0
261	CC 1005994670	SANCHEZ DIANA	25-14	30	$2,479,096	$396,700	EPS041	30	$2,479,096	$99,200	CCF39	30	$2,479,096	$99,200	14-4	30	$2,479,096	$60,400	30	$0	$0
262	CC 1003828910	SANCHEZ JUAN	230301	2	$123,883	$19,900	EPS037	2	$123,883	$0	CCF39	2	$123,883	$0	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
263	CC 1003828910	SANCHEZ JUAN	230301	28	$1,734,360	$277,500	EPS037	28	$1,734,360	$69,400	CCF39	28	$1,734,360	$69,400	14-4	28	$1,734,360	$42,300	28	$0	$0
264	CC 1234338138	SANCHEZ RONAL	230301	4	$293,226	$47,000	EPS005	4	$293,226	$11,800	CCF39	4	$293,226	$11,800	14-4	4	$293,226	$0	4	$0	$0
265	CC 1234338138	SANCHEZ RONAL	230301	26	$2,102,150	$336,400	EPS005	26	$2,102,150	$84,100	CCF39	26	$2,102,150	$84,100	14-4	26	$2,102,150	$146,400	26	$0	$0
266	CC 91218564	SANCHEZ VICTOR	25-14	30	$2,748,032	$439,700	EPS037	30	$2,748,032	$110,000	CCF39	30	$2,748,032	$110,000	14-4	30	$2,748,032	$191,300	30	$0	$0
267	CC 1005236279	SANDOVAL KAROL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
268	CC 1095844832	SANDOVAL MIYER	230201	30	$2,299,162	$367,900	EPS037	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
269	CC 37722410	SANDOVAL YOLANDA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
270	CC 91347830	SANTOS JORGE	230201	30	$2,756,496	$441,100	EPS002	30	$2,756,496	$110,300	CCF39	30	$2,756,496	$110,300	14-4	30	$2,756,496	$191,900	30	$0	$0
271	CC 1098679492	SANTOYO MONICA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
272	CC 1100961858	SARABIA JERSON	230301	30	$2,438,650	$390,200	ESSC24	30	$2,438,650	$97,600	CCF39	30	$2,438,650	$97,600	14-4	30	$2,438,650	$169,800	30	$0	$0
273	CC 1007669184	SARMIENTO CAMILO	230301	30	$2,660,281	$425,700	EPS037	30	$2,660,281	$106,500	CCF39	30	$2,660,281	$106,500	14-4	30	$2,660,281	$185,200	30	$0	$0
274	CC 63352680	SARMIENTO CENAIDA	25-14	18	$1,050,543	$168,100	EPS005	18	$1,050,543	$42,100	CCF39	18	$1,050,543	$42,100	14-4	18	$1,050,543	$0	18	$0	$0
275	CC 63352680	SARMIENTO CENAIDA	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS005	12	$700,362	$28,100	CCF39	12	$700,362	$28,100	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
276	CC 63562039	SARMIENTO LEIDY	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS005	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
277	CC 37931526	SERRANO CATALINA	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS005	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
278	CC 1097095966	SILVA JOHAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
279	CC 1099370886	SILVA JOHN	230301	30	$2,610,300	$417,700	EPS005	30	$2,610,300	$104,500	CCF39	30	$2,610,300	$104,500	14-4	30	$2,610,300	$181,700	30	$0	$0
280	PT 6387440	SILVA MILEXI	230301	30	$2,032,663	$325,300	EPS041	30	$2,032,663	$81,400	CCF39	30	$2,032,663	$81,400	14-4	30	$2,032,663	$49,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
281	CC	37949596	SILVA RUTH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
282	CC	1098733865	SISA JOHAN	230301	15	$1,396,742	$223,500	EPS010	15	$1,396,742	$55,900	CCF39	15	$1,396,742	$55,900	14-4	15	$1,396,742	$97,300	15	$0	$0
283	CC	1099215684	SOSA ZAYRA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS041	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
284	CC	1102774674	SUAREZ ADRIANA	230201	30	$1,858,242	$297,400	ESSC24	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
285	CC	37615301	SUAREZ DIVA	230901	30	$2,058,365	$329,400	EPS037	30	$2,058,365	$82,400	CCF39	30	$2,058,365	$82,400	14-4	30	$2,058,365	$143,300	30	$0	$0
286	CC	91077329	SUAREZ EFRAIN	25-14	30	$2,376,651	$380,300	EPS037	30	$2,376,651	$95,100	CCF39	30	$2,376,651	$95,100	14-4	30	$2,376,651	$165,500	30	$0	$0
287	CC	45556706	TAPIA LILIANA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS041	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
288	CC	13716368	TIRADO FREDY	230301	30	$2,484,095	$397,500	EPS037	30	$2,484,095	$99,400	CCF39	30	$2,484,095	$99,400	14-4	30	$2,484,095	$172,900	30	$0	$0
289	CC	1098703224	TOLOSA KAREN	25-14	4	$247,766	$39,700	EPS017	4	$247,766	$10,000	CCF39	4	$247,766	$10,000	14-4	4	$247,766	$6,100	4	$0	$0
290	CC	1005160727	TORRADO LUZ	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS010	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
291	CC	1098731297	TORRES MARY	230201	30	$1,858,242	$297,400	ESSC24	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
292	CC	1235251848	URIBE EDISON	230301	30	$2,376,651	$380,300	EPS010	30	$2,376,651	$95,100	CCF39	30	$2,376,651	$95,100	14-4	30	$2,376,651	$165,500	30	$0	$0
293	CC	91047275	URIBE OSCAR	230301	30	$2,376,651	$380,300	EPS046	30	$2,376,651	$95,100	CCF39	30	$2,376,651	$95,100	14-4	30	$2,376,651	$165,500	30	$0	$0
294	CC	1232888238	URIBE SOL	230301	2	$123,883	$19,900	EPS010	2	$123,883	$5,000	CCF39	2	$123,883	$5,000	14-4	2	$123,883	$0	2	$0	$0
295	CC	1232888238	URIBE SOL	230301	1	$61,941	$10,000	EPS010	1	$61,941	$2,500	CCF39	1	$61,941	$2,500	14-4	1	$61,941	$0	1	$0	$0
296	CC	1232888238	URIBE SOL	230301	27	$1,846,839	$295,500	EPS010	27	$1,846,839	$73,900	CCF39	27	$1,846,839	$73,900	14-4	27	$1,846,839	$45,000	27	$0	$0
297	CC	1096190239	VALLE LAURA	230301	30	$1,921,591	$307,500	EPS041	30	$1,921,591	$76,900	CCF39	30	$1,921,591	$76,900	14-4	30	$1,921,591	$46,900	30	$0	$0
298	CC	91292774	VARGAS CARLOS	231001	30	$2,299,162	$367,900	EPS002	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
299	CC	1102373206	VARGAS JOAN	230301	30	$2,299,162	$367,900	EPS037	30	$2,299,162	$92,000	CCF39	30	$2,299,162	$92,000	14-4	30	$2,299,162	$160,100	30	$0	$0
300	CC	1099542523	VASQUEZ SANDRA	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS041	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
301	CC	1098702029	VEGA ERIKA	230301	30	$1,858,242	$297,400	EPS010	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
302	CC	63501438	VELANDIA MARIA	231001	30	$2,171,608	$347,500	EPS037	30	$2,171,608	$86,900	CCF39	30	$2,171,608	$86,900	14-4	30	$2,171,608	$53,000	30	$0	$0
303	CC	1096224300	VESGA MAYRA	230201	11	$681,356	$109,100	EPS017	11	$681,356	$27,300	CCF39	11	$681,356	$27,300	14-4	11	$681,356	$16,600	11	$0	$0
304	CC	37930029	VILLALBA YULMARY	25-14	30	$1,858,242	$297,400	EPS005	30	$1,858,242	$74,400	CCF39	30	$1,858,242	$74,400	14-4	30	$1,858,242	$45,300	30	$0	$0
305	CC	63534725	VILLAMIZAR CLAUDIA	230301	30	$2,464,283	$394,300	EPS002	30	$2,464,283	$98,600	CCF39	30	$2,464,283	$98,600	14-4	30	$2,464,283	$60,100	30	$0	$0
306	CC	1095802894	VILLAMIZAR ESLEYDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
307	CC	91352737	VILLAMIZAR JAIZO	231001	30	$2,604,859	$416,800	EPS041	30	$2,604,859	$104,200	CCF39	30	$2,604,859	$104,200	14-4	30	$2,604,859	$181,300	30	$0	$0
308	PT	5287641	ZACARIAS SIMON	230301	30	$2,624,044	$419,900	EPS041	30	$2,624,044	$105,000	CCF39	30	$2,624,044	$105,000	14-4	30	$2,624,044	$182,700	30	$0	$0
309	CC	91507321	ZUÑIGA EDGAR	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF39	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (2 Afiliados)						**$3,501,810**	**$560,400**			**$0**	**$0**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,501,810**	**$36,600**		**$0**	**$0**
310	CC	41056195	DEL AGUILA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
311	CC	41058537	PEÑA LILIANA	230301	23	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF65	23	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	23	$0	$0
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (4 Afiliados)						**$7,003,620**	**$1,120,800**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$7,003,620**	**$280,400**			**$7,003,620**	**$73,200**		**$0**	**$0**
312	CC	1012414948	BALANTA BELKIS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
313	CC	42548845	GAITAN ENEILA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
314	CC	1126705610	LEMUS MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
315	CC	1127384990	RAMIREZ LEYDI	230301	30	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
316	CC	40989228	JARAMILLO ANGELA	230301	30	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF64	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(270)**					**$542,843,286**	**$86,870,200**			**$543,559,038**	**$21,730,400**			**$557,793,733**	**$22,300,400**			**$557,566,278**	**$25,117,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				263	$86,870,200	$0	$0	$86,870,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$4,537,200	$0	$0	$4,537,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	$18,607,600	$0	$0	$18,607,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	149	$48,989,700	$0	$0	$48,989,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	$14,406,300	$0	$0	$14,406,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$329,400	$0	$0	$329,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				270	$25,117,800	$0	$0	$25,117,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	270	$25,117,800	$0	$0	$25,117,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				270	$22,300,400	$0	$0	$22,300,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	11	$935,400	$0	$0	$935,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	248	$20,680,000	$0	$0	$20,680,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$124,900	$0	$0	$124,900
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	$280,400	$0	$0	$280,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$69,400	$0	$0	$69,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				262	$21,730,400	$0	$0	$21,730,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	26	$2,071,800	$0	$0	$2,071,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	26	$2,121,900	$0	$0	$2,121,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$1,064,600	$0	$0	$1,064,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	70	$6,128,200	$0	$0	$6,128,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	25	$2,052,500	$0	$0	$2,052,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	14	$1,152,800	$0	$0	$1,152,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	41	$3,327,400	$0	$0	$3,327,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	$3,671,000	$0	$0	$3,671,000
TOTAL				**270**	**$156,018,800**	**$0**	**$0**	**$156,018,800**

ANEXO 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101252550	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2026	19	01	2026	00:00	18	07	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS		NIT: 900.043.668-9
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 20 - 41	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3102007899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		NIT: 804.000.292-0
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 09 - 06 BARRIO LA PLAYA	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER	TELÉFONO	7238925

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS O DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO INTERVENTORIA 01514-2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/01/2026	18/01/2027	$41,152,672.60	$41,152,672.60
CALIDAD DEL SERVICIO	19/05/2026	19/05/2027	$41,152,672.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/01/2026	18/07/2029	$41,152,672.60	$41,152,672.60

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN PRORROGA NO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01514 DE 2025 SE AJUSTA FECHA FINAL DEL CONTRATO A 18/7/2026.

- SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 1 AÑO CONTADO APARTIR DEL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION.

-DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******25,706.00	$ *******8,000.00	$ *******6,404.00	$ **********40,110.00	$ ******123,458,017.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FAMISEGUR LTDA	133521	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101252550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Juan José Bonett.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101252550	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2026	19	01	2026	00:00	18	07	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS		**NIT: 900.043.668-9**
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 20 - 41	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3102007899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		**NIT: 804.000.292-0**
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 09 - 06 BARRIO LA PLAYA	**CIUDAD:** SAN GIL, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7238925

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101252550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Juan José Bonett.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101252550, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de MAYO de 2026

14-44-101252550

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 67139049

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	19/05/2026	133521	FAMISEGUR LTDA

Tomador:	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS	**NIT/CC** 900043668
Suma de:	CUARENTA MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE.******	
Pagador:	SIMCOC SAS	**NIT/CC** 900043668
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #1745544117	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
14-CHAPINERO-44-CU. ENTIDAD.EST.-101252550-4-1	$25.706,33	$8.000,00	$6.404,20	$0,00	$40.110,53

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$40.110,00
APROVECHAMIENTOS	$-0,53

Forma de pago

Ahorro:	$0,00		
		Corriente:	$0,00
		Tarjeta:	$0,00
		Otro:	$0,00
Transacción:	18165432	**Total:**	**$40.110,00**
		Cajero:	PAGUESTADO

ANEXO 4

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	319204653	9504838980	E	2026/05/19	2026/05/19	BANCOLOMBIA	0	$5,739,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (3 Afiliados)																						$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,700		$0	$0		$2,550,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																						$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,700		$0	$0		$2,550,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$10,403,000	$1,664,600			$10,403,000	$416,300			$10,403,000	$416,300			$10,403,000		$53,700		$0	$0		$2,550,900
1	CC	1098673789	ARIAS MARIA													X				230301	1	$126,000	$20,200	EPS046	1	$126,000	$5,100	CCF39	1	$126,000	$5,100	14-4	1	$126,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,400
2	CC	1098673789	ARIAS MARIA																	230301	29	$3,654,000	$584,700	EPS046	29	$3,654,000	$146,200	CCF39	29	$3,654,000	$146,200	14-4	29	$3,654,000	0.522%	$19,100	29	$0	$0	Si	$896,200
3	CC	1098741804	BALLESTEROS GISSELL																	230201	30	$2,773,000	$443,700	EPS005	30	$2,773,000	$111,000	CCF39	30	$2,773,000	$111,000	14-4	30	$2,773,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$680,200
4	CC	1065912454	BONETT JUAN																	230301	30	$3,850,000	$616,000	EPS037	30	$3,850,000	$154,000	CCF39	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	Si	$944,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)																						$4,614,000	$738,300			$4,614,000	$184,700			$4,614,000	$184,700			$4,614,000		$24,200		$0	$0		$1,131,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$4,614,000	$738,300			$4,614,000	$184,700			$4,614,000	$184,700			$4,614,000		$24,200		$0	$0		$1,131,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$4,614,000	$738,300			$4,614,000	$184,700			$4,614,000	$184,700			$4,614,000		$24,200		$0	$0		$1,131,900
5	CC	63549693	DURAN JENNY																	25-14	30	$1,841,000	$294,600	EPS005	30	$1,841,000	$73,700	CCF39	30	$1,841,000	$73,700	14-4	30	$1,841,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$451,700
6	CC	63545630	MARTINEZ DORA																	230201	30	$2,773,000	$443,700	EPS010	30	$2,773,000	$111,000	CCF39	30	$2,773,000	$111,000	14-4	30	$2,773,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$680,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON BARRANCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
7	CC	91434220	RODRIGUEZ EDINSON																	230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF38	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
Centro de Trabajo: INTERONZAGA (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
Ciudad: ONZAGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,626,900
8	CC	37576601	MERCADO BIBIANA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	91505590	REDONDO JAVIER																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	28070484	VEGA SANDRA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total	**Afiliados(9)**																					$22,020,620	$3,523,700			$22,020,620	$881,400			$22,020,620	$881,400			$22,020,620		$452,800		$0	$0		$5,739,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,523,700	$0	$0	$3,523,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$574,800	$0	$0	$574,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,781,300	$0	$0	$1,781,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,167,600	$0	$0	$1,167,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$452,800	$0	$0	$452,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$452,800	$0	$0	$452,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$881,400	$0	$0	$881,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$811,300	$0	$0	$811,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$881,400	$0	$0	$881,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$111,000	$0	$0	$111,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,000	$0	$0	$154,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$151,300	$0	$0	$151,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$254,800	$0	$0	$254,800
TOTAL				**9**	**$5,739,300**	**$0**	**$0**	**$5,739,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900043668	9	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO,CONSTUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM 2 ANILLO VIAL TORRE 1 OFI 417 NATURA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6852120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	319214655	9504647882	Y	2026/05/19	2026/05/19	BANCOLOMBIA	0	$243,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERONZAGA (2 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Centro de Trabajo: INTERONZAGA (2 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Ciudad: ONZAGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
1	CC	1096238768	FLOREZ DANIELA																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	13874773	SUAREZ JOHAN																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total			**Afiliados(2)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$0	$0	$243,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$243,800	$0	$0	$243,800
TOTAL				2	$243,800	$0	$0	$243,800

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-28, 03:16:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 13874773
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85263586
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	260653730
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.160.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 640.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 500.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 20.900	$ 0
		SubTotales:		$ 1.160.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.160.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096238768		FLOREZ ROBLES DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 n 29-41	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	146818073	9500544707	I	2026/04/17	2026/03/17	BANCOLOMBIA	0	$680,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
1	CC	1096238768	FLOREZ DANIELA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,200,000	$53,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096238768		FLOREZ ROBLES DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71 n 29-41	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	146818073	9500544707	I	2026/04/17	2026/03/17	BANCOLOMBIA	0	$680,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$0	$0	$53,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				**1**	**$680,600**	**$0**	**$0**	**$680,600**

ANEXO 5

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Barrancabermeja 30 de abril de 2026 OFC 011-UTRE

Ingeniero
JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO
Director
Interventoría SIMCOC

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA 01513-2025 "RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS."**


ASUNTO: **ENTREGA DE INFORME No 3 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No 1513-2025**

Cordial saludo

Respetuosamente nos dirigimos a usted en calidad de interventor de obra del contrato en referencia para hacer entrega del informe de las actividades realizadas entre el 19 de marzo y 18 de abril de 2026, se anexa:

1- Informe de actividades
2- Planillas de seguridad social
3- Cuadro de avance
4- Bitácora de campo

Atentamente,



MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE
C.C: 1.096.211.185 DE BARRANCABERMEJA
CEL: 317 3841209
CALLE 44 # 28C – 68 BARRIO PALMIRA, BARRANCABERMEJA
CORREO: asociacioninaire@gmail.com
Anexos: archivo digital con los documentos, enviado al correo interventoriasimcoc@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Barrancabermeja, 05 de mayo de 2026

Dra,

CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS

Secretaria General

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS

San Gil, Santander

Referencia: Contrato de Obra No. 01513-2025.

Objeto: "RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".

Asunto: Solicitud formal de prórroga al plazo de ejecución por dos (02) meses.

Cordial saludo,

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA** (NIT No. 902020635-4), en adelante el CONTRATISTA, me permito elevar ante su despacho solicitud formal de **prórroga al plazo de ejecución por el término inicialmente pactado en el contrato de la referencia, por un tiempo de dos (02) meses adicionales**, con fundamento en las siguientes consideraciones de orden técnico y jurídico:

ANTECEDENTES CONTRACTUALES

El **Contrato de Obra No. 01513-2025** tiene su origen y fundamento en el **Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR 7167516**, cuyo objeto es la ejecución de acciones de restauración ecológica en diversos predios.

El contratista se obligó a realizar la intervención técnica y operativa necesaria para la recuperación de ecosistemas en la jurisdicción del municipio de **Onzaga – Santander, en los predios Ranchería y Vegas del Ramal.**

A la fecha, el contratista ha desplegado la capacidad técnica y operativa requerida para cumplir con los objetivos de restauración contratados; no obstante, factores externos y ajenos a su control han impactado el plan de

trabajo y cronograma de ejecución de obra propuesto y aprobado por la interventoría, lo cual conlleva a solicitar una revisión del término de ejecución para garantizar el cumplimiento integral del alcance contractual.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El desarrollo de las actividades de restauración, aislamiento y mantenimiento en los predios Ranchería y Vegas del Ramal (municipio de Onzaga) ha enfrentado obstáculos externos e imprevisibles que han alterado el cronograma inicialmente previsto:

PRIMERO: Las condiciones climáticas adversas. Conforme a los reportes oficiales del IDEAM, y lo evidenciado en el área directa de ejecución de las obras de restauración ecológica en el municipio de Onzaga (S), ha experimentado precipitaciones extremas y la consolidación de una temporada de lluvias recurrentes que han generado saturación de suelos e incremento de caudales en los cuerpos hídricos que interceptan las rutas de acceso y de transporte de materiales e insumos (Plantas, fertilizantes, hidroretenedor, herramientas, postería, alambre, grapas, entre otros). Estas condiciones climáticas, de carácter externo, no controlables, han derivado situaciones que han impedido la transitabilidad carreteable hasta el sitio más cercano, y más importante aún, la afectación de los caminos de herradura por los cuales se accede a cada uno de los predios; esta situación se hace más particular en el acceso al predio Vegas del Ramal, en donde el aumento de caudal ha impedido las actividades de transporte menor de materiales e insumos y por ende la continua ejecución de labores de siembra y aislamiento. Aunado a lo anterior, y no menos importante se elevan los riesgos en la seguridad del personal y la estabilidad del material vegetal que se ven comprometidas bajo tales circunstancias.

SEGUNDO: El Terreno y la inestabilidad. Las intensas lluvias han provocado fenómenos de inestabilidad geológica, incluyendo movimientos en masa que han obstruido los corredores de tránsito hacia los predios; obligando a la destinación de recursos humanos y tiempo operativo en labores de despeje manual y adecuación de accesos no previstas originalmente, y lo cual ha venido impactando la ruta crítica del proyecto.

TERCERO: Dificultades logísticas y distancias. El predio Vegas del Ramal se ubica a 16 kilómetros del casco urbano, de los cuales 6 kilómetros carecen de infraestructura vial habilitada. La topografía de pendientes pronunciadas y terrenos ondulados ha limitado el uso de medios convencionales, obligando al transporte manual y mular de insumos y materiales para el establecimiento del material vegetal y la instalación del cercado de protección, lo cual a la fecha ha incrementado significativamente los tiempos de movilización y disminuyendo la capacidad de carga operativa por jornada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Principio de mutabilidad y fines del Estado: La Corte Constitucional, en Sentencia C-949 de 2001, M.P Dra. Clara Inés Vargas Hernández, manifiesta que; "(…) por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado". por lo que ha establecido que los contratos estatales pueden modificarse cuando sea indispensable para lograr su finalidad y realizar los fines del Estado. Las prórrogas son el instrumento jurídico útil para que el objeto contractual no quede inconcluso y se cumpla efectivamente la función social de la contratación.

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Prevalencia de la finalidad sobre la forma: la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. La administración tiene el derecho y deber de variar las obligaciones (mutabilidad) cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto. Lo anterior implica que la esencia del contrato es el cumplimiento de la obra o servicio, y los demás elementos deben ajustarse para asegurar dicho fin.

Discrecionalidad administrativa para precaver perjuicios: La ley otorga a la entidad una facultad discrecional para modificar contratos con el fin de mantener las condiciones técnicas y económicas (Art. 4.8, Ley 80) y evitar la afectación de los servicios públicos o fines institucionales (Art. 14, Ley 80). En este caso, la prórroga evita la parálisis de la restauración ecológica.

Mantenimiento de la ecuación contractual (Art. 4 y 27, Ley 80 de 1993): Ante hechos de la naturaleza, lluvias e inestabilidad no imputables al contratista, la Entidad debe adoptar medidas para que el contrato mantenga su equilibrio y no se genere una onerosidad excesiva o un incumplimiento forzado por causas externas.

SOLICITUD

Con base en lo anterior, solicito formalmente la suscripción de un acta modificatoria para ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 01513-2025 en **dos (02) meses adicionales**.

El CONTRATISTA se compromete, una vez aprobada la prórroga, a realizar la respectiva **ampliación de la Garantía Única de Cumplimiento**, asegurando que los amparos cubran el nuevo periodo de ejecución de conformidad con las exigencias de la Entidad.

Atentamente,



MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE
C.C. No. 1.096.211.185 de Barrancabermeja
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Barrancabermeja 7 de mayo de 2026 OFC 013-UTRE

Ingeniero
JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO
Director
Interventoría SIMCOC

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA 01513-2025 "RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS."**

ASUNTO: **MODIFICACION DE CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA No 1513-2025**

Respetuosamente nos dirigimos a usted, en su calidad de interventor del contrato suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, con el fin de presentar para su revisión y aprobación la modificación del cronograma de trabajo inicialmente establecido para la ejecución del Contrato No. 01513 de 2025.

Lo anterior, en atención a la prórroga aprobada por un término adicional de dos (2) meses, mediante la cual el plazo contractual pasó de cuatro (4) meses inicialmente pactados a un plazo total de seis (6) meses.

En este sentido, se remite la programación ajustada, la cual contempla la redistribución de las actividades pendientes de ejecución, la actualización de los porcentajes de avance programado y acumulado, así como el ajuste de la secuencia operativa y de los tiempos de ejecución, garantizando la continuidad de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La presente reprogramación obedece a las condiciones técnicas, logísticas y operativas evidenciadas durante el desarrollo del contrato, las cuales han incidido en el normal avance de las actividades programadas, haciendo necesaria la reorganización de los tiempos de ejecución para asegurar el cumplimiento de las metas físicas y contractuales establecidas.

Por lo anterior, se anexa el cronograma ajustado para su respectiva revisión, evaluación y aprobación.

Atentamente,

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE
C.C: 1.096.211.185 DE BARRANCABERMEJA
CEL: 317 3841209
CALLE 44 # 28C – 68 BARRIO PALMIRA, BARRANCABERMEJA
CORREO: asociacioninaire@gmail.com

Anexos: cronograma y flujo de caja en formato Excel

ANALISIS DE TIEMPOS EN OBRA CON PRORROGA.

BALANCE GENERAL DE TIEMPOS.	
FECHA DE INICIO	19/01/2026
TIEMPO INICIAL	Cuatro (4) meses.
TIEMPO ADICIONAL	Dos (2) meses
TIEMPO FINAL	Seis (6) meses
FECHA FINAL	18/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO	Tres meses y 18 días
TIEMPO RESTANTE	Dos (2) meses y 12 días
% TIEMPO EJECUTADO	59%
% TIEMPO RESTANTE	41%

RESUMEN DE LOS PORCENTAJES DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES A CORTE 18 DE ABRIL.

ÍTEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE RESTANTE
1	Restauración	78,57%	21,43%
2	Aislamiento	50,55%	49,45%
3	Mantenimiento	0%	100%
4	Total del contrato	62,22%	37,78%

CRONOGRAMA

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAS 4.0

NOMBRE DEL PROYECTO:	"RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".		
FECHA DE INICIO:	19 de enero de 2026	FECHA DE TERMINACION:	18 de julio de 2026

N°	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL	TIEMPO (Meses)	ESTADO	19 de enero al 18 de febrero				19 de fecbrero al 18 de marzo				19 de marzo al 18 de abril				19 de abril al 18 de mayo				19 de mayo al 18 de junio				19 de junio al 18 de julio			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Restauración	Hectareas Reforestadas	63	6	Planeado																								
					Ejecutado																								
2	Aislamiento	Kilometros de aislamiento instalados	7,12		Planeado																								
					Ejecutado																								
3	Mantenimiento	Hectareas establecidas	63		Planeado																								
					Ejecutado																								

EJECUTADO	
PLANEADO	

Página 1

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.
R.L UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA - **NIT: 902-020635-4**
CONTRATISTA

VoBo **JUAN JOSE BONET**
RL SIMCOC-NIT 900.043.668-9
INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

FLIJO DE CAJA

UNIÓN TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA 022020635-4

OBJETO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS

CAS

DESCRIPCIÓN DE LA RESTAURACIÓN ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CON FLUJO DE CAJA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRAMACIÓN	19 de enero al 18 de febrero		19 de febrero al 18 de marzo				19 de marzo al 18 de abril				19 de abril al 18 de mayo				19 de mayo al 18 de junio				19 de junio al 18 de julio			
							3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	RESTAURACIÓN	HECTÁREA	63	$ 34.529.420,00	$ 2.175.290.460,00	CANTIDAD	6,5	6,5	3	3	3	3	5	5	5	6,5	2	2	2	2	3	2,5		0			0	0
						VALOR	$ 224.434.730,00	224.434.730	103.595.260	103.595.260	103.595.260	103.595.260	172.642.100	172.642.100	172.642.100	328.019.990	69.056.840	69.056.840	$ 69.056.840,00	$ 69.056.840,00	103.595.260	86.321.050	$ -	0	-	-	0	0
2	AISLAMIENTO	KILOMETRO	7,12	$ 32.720.828,00	$ 233.042.825,72	CANTIDAD	1,20	1,26				1,15					1	1		0,92								
						VALOR	$ 39.264.994	$ 40.901.035	$ -	$ -	$ -		$ -	0	0	$ 37.628.952					$ 32.720.828,00	$ 32.720.828,00	$ 32.720.828,00	$ 17.065.340,72	$ -	$ -	$ -	0
3	MANTENIMIENTO	HECTÁREA	63	$ 8.379.272,00	$ 527.894.136,00	CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0									13	13	13	13	14
						VALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ -					$ -	$ -	$ -	$ 83.792.720	$ 109.930.536	$ 109.930.536	$ 109.930.536	$ 117.309.808
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 2.936.227.421,72		$ 263.699.724	$ 265.335.765	$ 103.595.260	$ 103.595.260	$ 103.595.260	$ 103.595.260	$ 172.642.100	$ 172.642.100	$ 172.642.100	$ 365.648.942	$ 69.056.840	$ 69.056.840	$ 69.056.840	$ 69.056.840	$ 136.316.088	$ 119.041.878	$ 32.720.828	$ 100.870.081	$ 109.930.536	$ 109.930.536	$ 109.930.536	$ 117.309.808
4	COSTOS INDIRECTOS				$ 909.762.396,00		$ 81.615.064,00	$ 82.121.420	$ 32.059.638	$ 32.059.638	$ 32.059.638	$ 32.059.638	$ 53.432.729	$ 53.432.730	$ 53.432.730	$ 113.168.347	$ 21.373.092	$ 21.373.092	$ 21.373.092	$ 21.373.092	$ 42.186.724	$ 36.843.492	$ 10.127.096	$ 31.221.786	$ 33.714.001	$ 33.714.001	$ 33.714.001	$ 36.307.395
4.1	ADMINISTRACIÓN			24,00%	$ 704.694.581,00		$ 63.287.934	$ 63.680.584	$ 24.860.462	$ 24.860.462	$ 24.860.462	$ 24.860.462	$ 41.434.104	$ 41.434.104	$ 41.434.104	$ 87.755.746	$ 16.573.642	$ 16.573.642	$ 16.573.642	$ 16.573.642	$ 32.713.461	$ 26.570.051	$ 7.852.999	$ 24.210.739	$ 26.143.329	$ 26.143.329	$ 26.143.329	$ 28.154.354
4.2	IMPREVISTOS			1,00%	$ 29.362.274,00		$ 2.636.997	$ 2.653.358	$ 1.035.853	$ 1.035.853	$ 1.035.853	$ 1.035.853	$ 1.726.421	$ 1.726.421	$ 1.726.421	$ 3.656.489	$ 690.568	$ 690.568	$ 690.568	$ 690.568	$ 1.363.061	$ 1.190.419	$ 327.208	$ 1.030.781	$ 1.089.305	$ 1.089.305	$ 1.089.305	$ 1.173.098
4.3	UTILIDAD			5,00%	$ 146.811.371,00		$ 13.184.986	$ 13.266.768	$ 5.179.263	$ 5.179.263	$ 5.179.263	$ 5.179.263	$ 8.632.104	$ 8.632.105	$ 8.632.105	$ 18.282.447	$ 3.452.842	$ 3.452.842	$ 3.452.842	$ 3.452.842	$ 6.815.304	$ 5.952.094	$ 1.636.041	$ 5.043.904	$ 5.446.527	$ 5.446.527	$ 5.446.527	$ 5.865.490
4.4	IVA			19,00%	$ 27.894.160,00	COSTOS INDIRECTOS	$ 2.505.147	$ 2.520.690	$ 984.000	$ 984.000	$ 984.000	$ 984.000	$ 1.640.100	$ 1.640.100	$ 1.640.100	$ 3.473.665	$ 656.040	$ 656.040	$ 656.040	$ 656.040	$ 1.294.908	$ 1.130.898	$ 310.848	$ 958.342	$ 1.034.840	$ 1.034.840	$ 1.034.840	$ 1.114.443
	VALOR TOTAL				$ 3.844.989.817,72		$ 345.314.788	$ 347.457.185	$ 135.644.898	$ 135.644.898	$ 135.644.898	$ 135.644.898	$ 226.074.829	$ 226.074.830	$ 226.074.830	$ 478.817.289	$ 910.429.932	$ 90.429.932	$ 90.429.932	$ 90.429.932	$ 178.492.822	$ 155.895.340	$ 42.847.924	$ 132.099.847	$ 142.644.537	$ 142.644.537	$ 142.644.537	$ 153.617.193
SEMANA	Inversión semanal						$ 345.314.788	$ 347.457.185	$ 135.644.898	$ 135.644.898	$ 135.644.898	$ 135.644.898	$ 226.074.829	$ 226.074.830	$ 226.074.830	$ 478.817.289	$ 910.429.932	$ 90.429.932	$ 90.429.932	$ 90.429.932	$ 178.492.822	$ 155.895.340	$ 42.847.924	$ 132.099.847	$ 142.644.537	$ 142.644.537	$ 142.644.537	$ 153.617.193
	% de Inversión semanal						8,98%	9,04%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	5,88%	5,88%	5,88%	12,45%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	4,64%	4,05%	1,11%	3,44%	3,71%	3,71%	3,71%	4,00%
	Inversión Acumulada Semanal						$ 345.314.788	$ 692.771.972,60	$ 828.416.871	$ 964.061.769	$ 1.099.706.667	$ 1.235.351.565	$ 1.461.426.394	$ 1.687.501.224	$ 1.913.576.054	$ 2.392.393.343	$ 783.201.904,60	$ 873.631.836	$ 964.061.768	$ 1.054.491.700	$ 1.232.984.522	$ 1.388.869.861	$ 1.431.717.785	$ 1.563.817.632	$ 2.535.037.879,80	$ 2.677.682.416	$ 2.820.326.953	$ 2.973.944.146
	% de Inversión Acumulada						8,98%	18,02%	21,55%	25,07%	28,60%	32,13%	38,01%	43,89%	49,77%	62,22%	20,37%	22,72%	25,07%	27,43%	32,07%	36,12%	37,24%	40,67%	65,93%	69,64%	73,35%	77,35%
MES	Inversión mensual						$ 692.771.972,600		$ 542.579.592				$ 1.157.041.776				$ 361.719.728				$ 509.325.933				$ 581.950.804			
	% de Inversión mensual						18,02%		14,11%				30,09%				9,41%				13,25%				15,12%			
	Inversión Acumulada Mensual						$ 692.771.973		$ 1.235.351.565				$ 2.392.393.343				$ 2.754.113.070,80				$ 3.263.439.003,72				$ 3.844.989.807,72			
	% de Inversión Acumulada						18,02%		32,13%				62,22%				71,63%				84,88%				100,00%			
																									$ -			

Atentamente,

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE
CC 1.096.211.185
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo JUAN JOSE BONET
RL SIMCOC-NIT 900.043.668-9
INTERVENTORIA

Barrancabermeja, 20 Abril de 2026

Señores:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
Edna Rocío Castellanos Martínez
Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental – CAS
Supervisora
San gil - Santander
planeacion@cas.gov.co

OFICIO No 011

REFERENCIA: CONTRATO **No 01514-2025** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".

Asunto: RADICACION ACTA PARCIAL 01 CONTRATO 01514 DE 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente, en mi calidad de contratista me permito hacer entrega formal de toda la documentación necesaria para el **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01**, correspondiente al periodo comprendido entre el día Diecinueve (19) de Enero de 2026 y el día Doce (12) de Abril de 2026.

Debido al tamaño y cantidad de documentos, la documentación completa ha sido cargada en el siguiente enlace para su revisión y aprobación:

Enlace drive:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UN1kWLb_wYzwO5KHPAt90nkFs2JiqBih

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

Juan José Bonett.

JUAN JOSE BONETT PARADA
Cargo: Representante Legal SIMCOC S.A.S
Documento de identidad: 1.065.912.454 de Aguachica

Barrancabermeja, 05 Mayo de 2026

Claudia Patricia Barajas Barajas
Secretaria General – CAS

Edna Rocío Castellanos Martínez
Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental – CAS **OFICIO No 012**
Supervisora

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
SAN GIL
planeacion@cas.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO **No 01514-2025** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".

ASUNTO: CONCEPTO DE VIABILIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA SOBRE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 01513 DE 2025.

Cordial saludo,

Tras realizar el análisis detallado de la solicitud radicada por la representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA**, esta Interventoría procede a emitir concepto favorable basándose en los siguientes pilares:

1. Análisis Técnico y Operativo.

La Interventoría ha constatado en visitas de campo y mediante el seguimiento a diario de la ejecución de la obra que:

- **Eventos Climáticos:** Se certifica que en el municipio de Onzaga - Santander se han presentado precipitaciones superiores al promedio histórico para el periodo, lo cual ha generado la saturación de los suelos en los predios *Ranchería* y *Vegas del Ramal*.

- **Accesos Críticos:** El aumento del caudal de las fuentes hídricas y la inestabilidad de los taludes en las rutas de acceso NO viales, han imposibilitado el transporte de material vegetal, postería y demás como el mismo personal. Forzar la ejecución en estas condiciones pondría en riesgo la integridad física de las mismas cuadrillas.

- **Rendimientos:** Se valida que el transporte manual y/o mular, aunque ha sido implementado como contingencia, no alcanza la velocidad del cronograma original, justificando técnicamente el tiempo adicional de **dos (02) meses** para garantizar la calidad y la cantidad de la restauración y el aislamiento.

2. Análisis Administrativo

Desde el componente administrativo, la Interventoría verifica que:

- El Contratista se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales, sobre todo su equipo de trabajo.

- Existe una debida planeación para la extensión del equipo minimo y operativo durante el plazo de prórroga solicitado.

- La prórroga permitirá el cumplimiento total de las metas físicas sin afectar la estructura organizacional del proyecto.

3. Análisis Financiero y Contable

- **Equilibrio Económico:** La prórroga se solicita **sin incremento en el valor inicial del contrato**. El Contratista asumirá los costos indirectos derivados de la permanencia adicional en el sitio, manteniendo la ecuación financiera original.

- **Ejecución Presupuestal:** No se requiere la adición de nuevos recursos por parte de la Entidad. El flujo de caja proyectado permite la finalización de las actividades dentro del presupuesto inicialmente asignado.

- **Contabilidad:** Los pagos por actas parciales coinciden con los informes de avance aprobados por esta Interventoría.

4. Análisis Jurídico - Sustento Legal.

Esta Interventoría encuentra que la solicitud se ajusta a derecho bajo los siguientes principios:

- **Fuerza Mayor o Caso Fortuito:** Las condiciones climáticas extremas e imprevisibles se enmarcan en el Art. 64 del Código Civil, eximiendo de responsabilidad por el retraso al contratista y permitiendo el ajuste del plazo.

- **Principio de Eficacia:** De acuerdo con la Ley 80 de 1993, la administración debe buscar el cumplimiento del objeto contractual. Negar la prórroga ante eventos externos probados llevaría al incumplimiento de las metas contratadas por la entidad.

- **Debido Proceso:** El contratista presentó la solicitud antes del vencimiento del plazo contractual, permitiendo el trámite legal del Otrosí.

5. Recomendación de Interventoría

Basado en lo expuesto anteriormente, la presente Interventoría **RECOMIENDA Y APRUEBA** la prórroga de dos (02) meses al Contrato No. 01513-2025.

Condicionamiento: El Contratista deberá, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del acta, presentar:

1. Cronograma actualizado de ejecución.
2. Ampliación de la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento.

Cordialmente,

Juan José Bonett.

Juan José Bonett Parada
Cargo: Representante Legal SIMCOC S.A.S
Documento de identidad: 1.065.912.454 de Aguachica

Barrancabermeja, 06 mayo de 2026

Claudia Patricia Barajas Barajas
Secretaria General – CAS

Edna Rocío Castellanos Martínez
Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental – CAS **OFICIO No 013**
Supervisora

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
San GIL

REFERENCIA: CONTRATO **No 01514-2025** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".

Asunto: ENTREGA REQUERIMIENTOS OFICIO No SPL.762-2026

Cordial saludo,

Atendiendo la solicitud, en mi calidad de Interventor, me permito hacer entrega de los documentos solicitados mediante el oficio SPL.762-2026 sobre el Acta **Parcial de Obra No. 1**, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de enero de 2026 y el 12 de abril de 2026.

Debido al volumen de los anexos, la documentación completa ha sido cargada en el siguiente enlace para su revisión y aprobación:

Enlace drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Xf-eD9fX7GC4N2nst73h2hoOmm-EJTor

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Juan José Bonett.

Juan José Bonett Parada
Cargo: Representante Legal SIMCOC S.A.S
Interventoría

6076852120-3102007899
interventoriasimcoc@gmail.com
Barrancabermeja, Col

Barrancabermeja, 8 mayo de 2026

Claudia Patricia Barajas Barajas
Secretaria General – CAS

Edna Rocío Castellanos Martínez
Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental – CAS **OFICIO No 014**
Supervisora

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
San GIL

REFERENCIA: CONTRATO **No 01514-2025** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS".

Asunto: SOLICITUD DE PRORRGA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento y control, esta Interventoría recibió por parte del contratista de obra la solicitud de prórroga para el Contrato de Obra No. 01513-2025, cuyo objeto es RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS".

Tras el análisis de la ruta crítica y el cronograma de ejecución de la obra que se tiene a la fecha, esta Interventoría emitió el **Concepto de Viabilidad Técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica con oficio No 012** con fecha del 5 de mayo de 2026 recomendando la ampliación del plazo de ejecución de la obra por un término de (2) dos meses.

Dicha viabilidad se fundamenta en eventos de Fuerza mayor debido a las condiciones climáticas extremas en el municipio de Onzaga - Santander, que han afectado los suelos en los predios Ranchería y Vegas del Ramal, dificultando los accesos y rendimientos operativos.

Considerando que la labor de Interventoría es primordial para el acompañamiento a la ejecución de la obra y que su objeto es garantizar la vigilancia permanente, el control técnico, administrativo, financiero y jurídico hasta el recibo a satisfacción de las obras y la posterior liquidación del proyecto, se hace imperativo extender el plazo del contrato de interventoría bajo las mismas condiciones de tiempo otorgadas con el nuevo plazo de la obra.

Por lo expuesto, solicito formalmente el trámite de una prórroga al plazo del **Contrato de Interventoría No. 01514 de 2025**, bajo las siguientes condiciones:

- **Tiempo solicitado:** (2) dos meses, igual al de la obra.
- **Nueva fecha de finalización del contrato:** 18 de julio de 2026
- **Condiciones:** Se mantendrán las mismas condiciones contractuales técnicas y alcances pactados inicialmente para el acompañamiento del proyecto.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Juan José Bonett.

Juan José Bonett Parada
Cargo: Representante Legal SIMCOC S.A.S
Interventoría

6076852120-3102007899
interventoriasimcoc@gmail.com
Barrancabermeja, Col

Barrancabermeja, 8 mayo de 2026

Claudia Patricia Barajas Barajas
Secretaria General – CAS

Edna Rocío Castellanos Martínez
Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental – CAS **OFICIO No 015**
Supervisora

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
San GIL

REFERENCIA: CONTRATO **No 01514-2025** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".

Asunto: ENRTEGA DE DOCUMENTOS PARA PRORROGA CONTRATO DE OBRA

Cordial saludo,

En calidad de Interventoría y en atención a la revisión de la solicitud de prórroga en tiempo presentada por el contratista de obra y viabilizada por nosotros; por medio de la presente remito de manera formal la entregar los documentos anexos.

Los documentos que se adjuntan corresponden a:

1. **Cronograma de trabajo** Cronograma de ejecución reprogramado y ajustado.
2. **Flujo de Caja**
3. **Plan de trabajo**
4. **Concepto Técnico de Interventoría:** Documento donde esta Interventoría avala la viabilidad de la prórroga solicitada tras el análisis de los anexos mencionados.

Lo anterior tiene como fin brindar a la Entidad los elementos necesarios para continuar con el trámite administrativo de suscripción del modificatorio correspondiente, garantizando así la continuidad de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las metas contractuales.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Juan José Bonett.

Juan José Bonett Parada
Cargo: Representante Legal SIMCOC S.A.S
Interventoría

6076852120-3102007899
interventoriasimcoc@gmail.com
Barrancabermeja, Col

ANEXO 6

4. Marcación y trazado del perímetro de aislamiento
- Se presentan lluvias después de las 11 am.
Predio Ranchería:
1- Transporte mular de materiales e insumo para aislamiento (postes, alambre y grapas)
2- Marcación y trazado del perímetro de aislamiento
3. Ahoyado, hincado, templado y grapado de postes.
Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde, que conllevaron a la suspensión de labores.

18/04/2026

Para el día de hoy se realizaron las siguientes actividades:
- Predio Vegas del Ramal
1- Marcación y trazado del perímetro de establecimiento y aislamiento
2. Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambre grapas)
3. Ahoyado, distribución de material vegetal, Correctivo para suelo e hidroretenedor y siembra.
4. Marcación y trazado del perímetro de aislamiento
- Se presentan lluvias después de 10 am.
Predio Ranchería:
1- Transporte mular de materiales e insumos para aislamiento (postes, alambre y grapas)
2. Marcación y trazado del perímetro de aislamiento
3. Ahoyado, hincado, templado y grapado de postes. Se concluyen con las actividades de aislamiento en este predio.

Powered by CamScanner

20/04/2026 Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
- Predio Vegas del Ramal:
1- Transporte mular de materiales e insumo para siembra y aislamiento (plántulas, abono organico, hidroretenedor, cal, postes, alambre y grapas)
2- Ahoyado, distribución de material vegetal, correctivo para suelo e hidroretenedor y siembra.

- Se presentan fuertes lluvias desde las 10 de la mañana.

21/04/2026 Llegan al punto de acopio, hasta donde la vía permite el acceso del vehiculo automotor 7.650 plantulas forestales de 60cm, y 50 bultos de cal; y se procede a su descargue. durante la jornada de trabajo; y se proyecta llevar los próximos dias a Vegas del Ramal

Se presenta fuertes lluvias después de medio dia.

22/04/2026 Se presentan lluvias desde horas de la madrugada hasta las 9 de la mañana, Condición que permitió iniciar labores aproximadamente a lois 10:00 am desarrollando las siguientes actividades en el predio Vegas del Ramal:

1. Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas, abono organico, hidroretenedor, cal, postes. alambre y grapas)

23/04/2026 Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal:
1- Transporte mular de materiales e insumo, para siembra y aislamiento (plántulas, abono organico, hidroretenedor, cal, postes, alambre y grapas)
2. Plateo, 'Ahoyado', distribución de material vegetal, correctivo para el suelo e hidroretenedor y siembra. Nota: Se suspenden actividades a la 1 de la tarde por lluvias.

Powered by CamScanner

24/04/2026	Para el día de hoy se realizaron las siguientes actividades: - Predio Vegas del Ramal 1- Transporte mular de materiales e insumo para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambres y grapas) 2. plateo, Ahoyado, distribucción de material Vegetal, correctivo para suelo e hidroretenedor y siembra.
25/04/2026 1	Para el día de hoy se realizaron las siguientes actividades: - Predio Vegas de Ramal 1- Transporte mular de materiales e insumo para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambres y grapas) 2. Plateo, Ahoyado, distribucción de material Vegetal, correctivo para suelo e hidroretenedor y siembra. - Se Suspende actividades a las 11am por lluvias.
27/04/2026	Se presenta lluvias desde horas de la madrugada hasta las 9:30 de la mañana, condición que permitió iniciar labores aproximadamente a las 10:00am desarrollando las siguientes actividades en el Predio Vegas del Ramal 1-Transporte mular de materiales e insumo para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambre y grapas).
28/04/2026	Para el día de hoy se realizaron las siguientes actividades: predio Vegas del Ramal: 1. Marcación y trazado del perímetro de establecimiento y aislamiento 2. Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas, abono organico, hidroretenedor, cal, postes, alambre y grapas).

Powered by CamScanner

29/04/26 Llegan al punto de acopio, hasta donde la vía permite el acceso de vehículo automotor 200 bultos de abono y 45 Kilogramos de hidroretenedor, y se procede a su descargue durante la jornada de trabajo; y se proyecta llevar los próximos días a Vegas del Ramal

Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambre y grapas)

30/04/26 Para el día de hoy se realizaron las siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal:
1- Marcación y trazado del perímetro de establecimiento y aislamiento
2. Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambre y grapas)

- Se suspenden actividades después de medio día por presencia de fuertes lluvias.

1/05/2026 Día festivo no laboral - Día del trabajo

02/05/2026 Se retoman labores en el campo realizando las siguientes actividades
Predio Vegas del Ramal:
1- Marcación y trazado del perímetro de establecimiento
2- plateo y Ahoyado.

04/05/2026 Para el predio de hoy se realizaron las siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal
1- Plateo y Ahoyado
2- Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal. [illegible]

Powered by CamScanner

05/05/2026	Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades: Predio Vegas del Ramal 1- Marcacion y trazado del perimetro de establecimiento 2. Transporte mular de materiales e insumo para siembra y aislamiento (plantulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal postes, alambre y grapas).
06/05/2026	Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades: Predio Vegas del Ramal: 1- Transporte mular de insumos para siembra y aislamiento (abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambres y grapas) 2- Plateo, Ahoyado, distribucion de material vegetal, correctivo para el suelo e hidroretenedor y siembra. -Se suspenden actividades a las 11 de la mañana por lluvias
07/05/2026	Llegan al punto de acopio, hasta donde la vía permite el acceso de Vehiculo automotor 7.000 plantulas forestales de 60 cm, y 90 bultos de abono, y se procede a su descargue durante la jornada de trabajo; y se proyecta llevar los próximos dias a Vegas del Ramal. Se presenta fuertes lluvias después de medio dia.
08/05/2026	Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades: Predio Vegas del ramal: 1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambre y grapa 2. plateo, Ahoyado, distribucion de material vegetal, correctivo para el suelo e hidroretenedor y siembra.

Powered by CamScanner

09/05/2026 Para el dia de hoy se realizaron los siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal:
1. Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambre y grapas).
2. Plateo, Ahoyado, distribución de material Vegetal, correctivo para suelo e hidroretenedor y siembra.

11/05/2026 Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal
1. Transporte mular de insumos para siembra y aislamiento (abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes y alambre)
2. plateo, ahoyado, distribución de materia Vegetal, correctivo para el suelo e hidroretenedor y siembra.
- Se suspenden actividades a la 1 de la tarde por lluvias.

12/05/2026 Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal:
1. Marcación, trazado, y plateo de perimetro de establecimiento
2. Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas abono organico, hidroretenedor, cal, postes y alambre)

13/05/2026 Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal:
1. Marcación, trazado, y plateo del perimetro de establecimiento.
2. Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes y alambre.)

Powered by CamScanner

14/05/2026

Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal:
1- Plateo del perimetro de establecimiento
2. Transporte mular de materiales e insumo para siembra y aisla-
ento, (plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, poste, ala-

- Se presentan lluvias después de la 3:00 de la tarde.

15/05/2026

Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal:
1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamien
(plántulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, alambre).
2. Plateo, Ahoyado, distribución de material vegetal, correctivo para sel
e hidroretenedor y siembra.

16/05/2026

Para el dia de hoy se realizaron las siguientes actividades:
Predio Vegas del Ramal:
1- Transporte mular de materiales e insumos para siembra y aislamiento (pl
tulas, abono orgánico, hidroretenedor, cal, postes, y alambre)
2. plateo, Ahoyado, distribución de material Vegetal, correctivo para
Suelo e hidroretenedor y siembra.

Powered by CamScanner
