Viernes 22 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: Se hace toma de muestras para ensayos de laboratorio al material de canteras para Sub-base granular y base granular en la cantera CONAMBIEN SAS, del municipio de Caucasia, Antioquia.

Pablo A. Moreno
Ing. Resd. Interventoría

Sábado 23 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: El contratista continúa con los ajustes a los estudios y diseños

Pablo A. Moreno
Ing. Resd. Interventoría

Domingo 24 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
No se programaron actividades para esta fecha.

Pablo A. Moreno
Ing Resd. Interventoría

Lunes 25 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: El contratista realiza el inicio de obra con actividades de desplazamiento de cercas de las fincas aledañas, limpieza de cunetas. Hace acopio de material de construcción con dos viajes de cemento. Entrega reprogramación de actividades.

Pablo A. Moreno
Ing. Res. Interventoría

Martes 26 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: El contratista continúa con la limpieza de cunetas manualmente, hace acopio de cemento y varilla en el campamento. Se hace la solicitud reiterada de entrega de planillas de seguridad social a interventoría, pero aún no las entrega

El contratista hace entrega a interventoría, de los diseños de placa huella del proyecto.

Pablo A. Moreno
Ing Resd. Interventoría

Miércoles 27 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: El contratista continúa con el acopio de materiales de construcción: cemento y varilla, limpieza de cunetas, continua los ajustes a estudios y diseños

Pablo A Moreno
Ing Resd. Interventoría

Jueves 28 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: El contratista continúa con el acopio de materiales en el campamento, lleva la motoniveladora y trompos para mezcla de concreto. No hace entrega de las planillas de seguridad social del personal de obra.

Pablo A. Moreno
Ing. Resd interventoría

Viernes 29 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: se lleva a obra varilla corrugada, tablas para formaleta, tanques para recolección de agua con capacidad para 2000 litros cada uno. Se inicia a conformar la vía para la placa huella. El contratista aún no hace entrega de las planillas de seguridad social del personal de obra.

Pablo A. Moreno
Ing. Resd. Interventoría

Sábado 30 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: llega a obra cemento que es acopiado en el campamento, se continúa con la conformación de la vía para la placa huella. Se le recuerda al contratista la obligación de presentar las planillas de seguridad

social del personal, ya que es causal de incumplimiento
pues está estipulado en el contrato 014 de 2020 dentro
de las "obligaciones específicas del Contratista"

Pablo A. Moreno
Ing. Resd. Interventoría

Domingo 31 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
No se programaron actividades para esta fecha.

Pablo A. Moreno
Ing. Resd. Interventoría

BITÁCORA "MOÑITOS"

Miercoles, Diciembre 30 de 2020
La interventorra mediante OFICIO INT-MONITOS-2020-009, Le Solicita la socialización del protocolo de bioseguridad del contrato de obra, debido que fue aprobado mediante oficio INT-MONITOS-2020-005, su protocolo de bioseguridad, en cumplimiento de las directrices del Instituto Nacional de vías.

Jeseves, Diciembre 31 de 2020.
" No se ejecutan actividades en obra
La interventorra manifiesta que hoy se cumple la fecha de vencimiento del contrato de obra e interventorra, Lo cual es pertinante dar celeridad al tramite de la prorroga de los contratos para el proyecto, con el fin de que la ejecución de las obras, no se generen atrasos.

El residente de interventorra manifiesta que no tuvo contrato desde el 18 de diciembre de 2020, hasta el 21 de enero de 2021, por lo tanto no registra en el libro de obra, durante ese lapso de tiempo. Igualmente, manifiesta que en ese periodo el contratista no inició actividades en obra, es decir, el contratista adelantó los estudios y Diseños para ejecución del proyecto.

Los dias 22 de enero de 2021 hasta el domingo 24 de enero de 2021, no se ejecutaron actividades en el sitio de obra.

Residente de Interventorra.

Lunes, enero 25 de 2021
Estado Tiempo: Soleado
personal en obra: Residente de obra, Topografo (1), Cadenero (2), Residente interventoria.


Escaneado con CamScanner

Actividades
Se inicia la localización y replanteo para los muros de contención Tipo I y Tipo II.
Se deja señalizado el adsasado para los muros de contención. para las longitudes de 6 y 14 m respectivamente
Se terminan las actividades en completa normalidad.



Residente Interventoria.

Martes, Enero 26 de 2021.
Estado Tiempo: Muy soleado.
personal en obra: Residente de obra, Residente interventoria, Maestro(s), Ayudantes (2).
Herramientas Menores, (palas, picas, etc).
Actividades en obra:
Se inicia la excavación varia en material seco a mano para el muro de contención tipo I, long: 6m. Ancho: 2,70 h=2,60m; de acuerdo a la geometria planteada por el contratista




Residente Interventorra

Miercoles, Enero 27 de 2021
Estado Tiempo: Muy soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventorra, Maestro (1), Ayudantes (2)
Herramientas Menores (palas, barras, etc).
Actividades:
Continúa la excavación manual en seco para el muro de contención tipo I.
La interventorra recomienda al contratista señalizar la


Escaneado con CamScanner

vía y el sitio de obra, con el fin de evitar posibles accidentes.
La interventoría insta al contratista a instalar la valla informativa para la obra.



Residente Interventoría

Jueves, Enero 28 de 2021.
Estado Tiempo: Muy soleado.
personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Maestro(1), ayudantes(2).
Actividades
Se avanza en la excavación varias en material seco en el muro de contención para el muro de contención tipo I.
El contratista instala señal preventiva en la vía y en el sitio de obra.
Se terminan las actividades en completa normalidad a las 5:00 p.m.




Residente Interventoría.

Viernes, Enero 29 de 2021
Estado tiempo: Muy soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Maestro(1) Ayudantes (2)
Actividades:
Se continúa con la excavación manual en seco en el muro de contención tipo I.
Se inicia la excavación manual en seco en el muro de contención tipo II
Se recibe la visita del especialista estructural por parte de la interventoría, donde hace entrega del

Escaneado con CamScanner

diseño definitivo para los muros de contención tipo I y tipo II.
la interventoría recomienda al contratista revizar el tema de los demás puntos críticos a lo largo del eje de la vía, porque lo propuesto por el contratista no es la solución ideal dado a que no se requiere de estructuras de contención, si no de estructuras hidraulicas, por lo tanto se requiere de especialistas hidraulicos para la solución de los mismos.




Residente Interventoría.

Sabado, Enero 30 de 2021.
Estado tiempo: Muy soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Maestro (1), Ayudantes(2).
Actividades.
Se avanza en la excavación manual en seco para los muros de contención para los muros Tipo I y Tipo II
Se señaliza la vía con el Fin de evitar accidentes en la obra.
Se terminan las actividades en completa normalidad



Residente Interventoría.

Domingo, Enero 31 de 2021
"No se realizaron actividades en obra, por ser día feriado"



Residente interventoría..

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA "COTORRA"

CONTRATO DE OBRA No. 001 - 2020

OBJETO - OBRA

MANTENIMIENTO DE LA INTERSECCION TRONCAL DEL CARIBE - VEREDA CAIMAN DEL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA

JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 1283 - 2020

OBJETO

INTERVENTORIA TECTICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA - MIENTOS DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTERVENTOR

CONSORCIO CORDOBA ET.

Escaneado con CamScanner

Miercoles, 6 de enero de 2021
Luego de realizar la visita técnica al corredor vial en la vereda caiman-cotorra, se realiza la reunión tecnica inicial del proyecto en instalaciones de la Alcaldia Municipal de Cotorra, con presencia del contratista, interventoria, INVIAS y Alcaldia Municipal.
Con la reunión técnica inicial se dió la apertura al libro de bitácora del proyecto en este se consignaron dia a dia las actividades realizadas y las decisiones tomadas en campo durante la ejecución de la obra.
Este libro será firmado por los residentes de obra e interventoria, previamente autorizados.

Diana F. Corralsel.
Residente Interventoria
M.P.

Director de Interventoria

Jueves, 7 de enero 2021

Sin Novedad en Obra. Sin Actividad.


Viernes, 8 de Enero 2021

Sin Novedad en Obra. Sin actividad.

Escaneado con CamScanner

Sábado, 9 de Enero 2021

Sin Actividad en Obra, sin novedad.



Domingo, 10 de Enero 2021

Sin Novedad, día no laboral



Lunes, 11 de Enero 2021

Sin Novedad, día no laboral.




Martes, 12 de Enero 2021

Sin Actividad en Obra, Sin novedad.



Miercoles, 13 de Enero 2021

Sin Actividad en Obra, Sin Novedad.



Escaneado con CamScanner

Jueves, 14 Enero 2021

Sin Actividad en Obra, sin novedad.

Viernes, 15 Enero 2021

La comisión topográfica de la interventoría realiza los levantamientos del tramo de vía a intervenir (828 ml).

Sabado, 16 Enero 2021

Sin Actividad en Obra, sin novedad.


Domingo, 17 Enero 2021

Sin novedad, dia no laboral.

Escaneado con CamScanner


Lunes, 18 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.




Martes, 19 de enero 2021

sin actividad en obra, sin novedad.



Miercoles, 20 de enero 2021

sin actividad en obra, sin novedad.




Jueves, 21 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.



Viernes, 22 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.



Escaneado con CamScanner

Sabado, 23 de enero 2021

sin actividad en obra, sin novedad.

Domingo, 24 de enero 2021

sin novedad, dia no laboral.

Lunes, 25 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.

Martes, 26 de enero 2021

sin actividad en obra, sin novedad.

Miercoles, 27 de enero 2021

sin actividad en obra, sin novedad.

Escaneado con CamScanner

Jueves, 28 de enero 2021

sin actividad en obra, sin novedad.

Viernes, 29 de Enero 2021

sin actividad en obra, sin novedad.

sabado, 30 de Enero 2021

sin actividad en obra, sin novedad.

Domingo, 31 de Enero 2021

sin novedad, dia no laboral.

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA "CERETE"

CONTRATO DE OBRA No 120 - 2020

OBJETO. - OBRA

Mantenimiento y Mejoramiento de Vias rurales en el municipio de cereté, cordoba del programa colombia rural.

CONTRATISTA.

CONSTRUARQUING LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1283-2020

OBJETO.

Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para el Mantenimiento y Mejoramiento de Vias Terciarias del Programa "Colombia Rural" en los municipios del departamento de Córdoba.

INTERVENTOR.

CONSORCIO CORDOBA ET.

Escaneado con CamScanner

Martes, 29 de diciembre /2020

actividades suspendidas, sin Novedad

Miercoles, 30 de diciembre /2020

Actividades suspendidas, sin Novedad

Jueves, 31 de diciembre /2020

Actividades suspendidas, sin Novedad

Viernes, 01 de diciembre de 2021

Dia no laboral, sin novedad, se incorpora nuevamente el residente de interventoria al proyecto.
Nota: la fecha es del 01 de enero de 2021

MP. 22202097114COR.

sabado, 02 de enero de 2021

Actividades suspendidas, sin Novedad

MP. 22202097114COR

Escaneado con CamScanner

Domingo, 3 de enero de 2021

Dia no laboral, sin novedad

Lunes, 4 de enero de 2021

actividades suspendidas, sin novedad

M.P. 22202097114COR.

Martes, 5 de enero de 2021

se realiza la socializacion del proyecto, con asistensia de la veeduria, la interventoria, el contratista, Secretaria de planeacion en instalaciones de la biblioteca municipal de Ceretè y desde Plataforma virtual la supervisora de INVIAS y los representantes de red terciaria de la misma entidad.
aun siguen pendientes ensayos e informacion de importancia para el visto bueno al reinicio de las obras.

M.P. 22202097114COR

Miercoles, 6 de enero de 2021

actividades Suspendidas, sin novedad

Escaneado con CamScanner

Jueves, 7 de enero de 2021

Se organizan los frentes de trabajo para dar inicio a las obras de drenaje, el contratista hace el acopio de material y de equipos para dar inicio a las actividades de excavacion una vez se le autorice por parte de la interventoria.

M.P. 2220209711 4COR

Viernes, 8 de enero de 2021
se espera la autorizacion del inicio de las obras de drenaje. la placa huella continúa suspendida y se realizara unos ensayos de laboratorio adicionales para determinar los tramos que requieren mejoramiento de subrasante de manera mas exacta para optimizar los recursos.

M.P 2220209711 4COR

Sabado, 9 de enero de 2021

Sin novedad en la obra.

Domingo, 10 de enero 2021

M.P. 2220209711 4COR

Sin novedad en obra, Dia no laboral

Escaneado con CamScanner

Lunes, 11 de enero 2021

Sin novedad en obra, dia no laboral.

Martes, 12 de enero 2021
se realiza reunion tecnica de informacion con la Veeduria del proyecto para colocarlos al tanto de los pormenores que han impedido el reinicio de los trabajos en la placa huella.
se le explica sobre los ensayos adicionales a realizar y que si el mejoramiento llegara a ser sectorizado quedaran recursos disponibles para ejecutar mayores cantidades de obra y ampliar el alcance del proyecto.
se les informa que apartir del 13 de enero se autoriza el inicio de la construccion de las obras de drenaje.
la veeduria manifiesta que la comunidad está molesta por el retraso con la construccion de la placa huella. y que el contratista realizó una excavaciones el fin de semana que obstruyó el paso de vehiculos y motos en la via.
La interventoria le aclara que esa actividad se hizo sin autorizacion de la interventoria y que oficiara al contratista para que de manera inmediata habilite el paso en la via, Para constancia se firma acta de Reunion No 3.

1222020971141OR

Escaneado con CamScanner

Miercoles, 13 enero de 2021
se autoriza el inicio de construccion de las obras de drenaje, se construiran 4 alcantarillas y un Box en los sitios determinados en los anexos tecnicos del proyecto.
La interventoria cita al contratista y a la secretaría de planeacion para realizar reunion informativa de las obras a iniciar y del estado del reinicio en la placa huello. se le exige al contratista que de manera inmediata realice los trabajos de adecuacion de pasos provicionales para garantizar el transito en la via al menos de Motos. y se le recuerda que no puede iniciar ninguna actividad en la via sin la autorizacion de la interventoria.
Las actividades en la obra inician con la implementación de los protocolos de bioseguridad, posteriormente y con el consentimiento de la comunidad se adecuan unos pasos provicionales para garantizar la movilidad de motos, Bicicletas y Peatones en el tramo a intervenir.
De acuerdo a los diseños de la cartilla de colombia rural se realizan excavaciones en las 2 primeras alcantarillas estipulados en los estudios previos haciendo el retiro de las alcantarillas existentes de 90 cm de diametro en la primera y 60 cm de diametro en la segunda, ambas se encontraban deterioradas y sin cabeceras, ademas para el caso de la segunda sin una capacidad hidraulica adecuada para el flujo de agua que maneja el punto.
El terreno es mejorado con una capa de 20 cm de material seleccionado en la zona de desplante de los usillos y en el area de tncole y descole.

22202097114COR

Rondo Castellón
MP. 132021206298LV

Escaneado con CamScanner

Jueves, 14 de enero 2021
se realizan las actividades de implementacion de los protocolos de Bioseguridad. y PMT continúan los trabajos constructivos en las alcantarillas 1 y 2, se hace el trazado de acuerdo a los planos y las indicaciones de la topografia y se funde el solado de la alcantarilla 2. El solado tiene 5 cm y se fundió en concreto clase F.
En la obra se cuenta con los usillos de 36 Pulg. que seran instalados en las alcantarillas.
No se presentaron lluvias durante el dia.

22202097114COR

Cindo Castellán
MP. 13202120629BLV

Viernes, 15 de enero 2021
se realizan las actividades de implementacion del protocolo de Bioseguridad, y PMT
Continúa la construccion de las alcantarillas 1 y 2. En la alc 1, se hace el trazado de acuerdo a los planos y se funde el solado en concreto clase F con un espesor de 5cm en la zona de alcantarilla y Soleras.
En la alcantarilla 2 se realiza la instalacion de los usillos, se le hace un sello en las uniones con mortero y en horas de la tarde se inician las labores de relleno con material de excavación.
No se presentan lluvias en el día.

22202097114COR

Cindo Castellán
MP. 13202120629BLV

Escaneado con CamScanner

Sabado, 16 de enero de 2024.
se realizan las actividades de implementacion del Protocolo de Bioseguridad y PMT
se continúa con la construcción de las alcantarillas 1 y 2. En la alcantarilla 1. se instalan los usillos y se hace el sello de juntas. En horas de la tarde se realiza el relleno, compactacion y adecuacion de la alcantarilla y queda habilitada para el paso vehicular a un carril.
En la alcantarilla 2 se termina de rellenar y compactar la alcantarilla quedando habilitada para el transito vehicular.
De manera simultanea se realizó la excavación de la alcantarilla. 3 y para ello se adecuó un paso provicional vehicular. En el punto de la alcantarilla 3 Figuraba un Box de 1x1, teniendo en cuenta que el flujo de agua que maneja el punto es poco y que existe un punto por atender con mucha mas necesidad hidraulica se autoriza un cambio de Box a alcantarilla y asi reservar la obra de mayor capacidad hidraulica para el punto que mas la necesita.
con la excavacion de la alcantarilla 3 se hizo el retiro de una alcantarilla existente de 60 cm de diametro la cual sera remplazada por una de 36 pulg de diametro.
por indicaciones de INVIAS se realizan los ensayos de expansividad en los mismos puntos donde el contratista realizo sus apiques iniciales para la placa huella, El laboratorio contratado por la interventoria realizo la toma de muestras en las abscisas K0+010, K0+260, K0+585, K0+970. Con el ensayo se busca realizar mejoramientos secterizados de la Subrasante y optimizar los recursos.

Rondo Castellar
MP. 13202120629BLV

2220209+114Cotz

Escaneado con CamScanner

Domingo, 17 de enero de 2021

Dia no laboral, sin novedad.

Lunes, 18 de enero de 2021
Se realizan las actividades de implementacion del protocolo de bioseguridad, y PMT
Continúa el trabajo en la alcantarilla 3, se hace el relleno con material seleccionado con espesor de 20 cm, se compacta con una rana y se hace el trazado y fundida del solado en concreto clase F en el area de instalacion de los usillos y la solera de encole y descole.
Se inicia la excavacion en la alcantarilla No 4 de acuerdo a las indicaciones de la topografia.
No se presentan lluvias en la jornada laboral

1222020971140R

Rondo Castellar
MP. 13202120629BLV

Martes, 19 de enero de 2021
Se realizan las actividades de implementacion de los protocolos de bioseguridad, y PMT
continuan los trabajos en las alcantarillas No 2 y No 4. En la 2 se inicia el trazado de la solera y dentellon, para la construcción de las cabeceras se realiza la figuracion del hierro para las cabeceras, las cuales estan conformadas por un muro pantalla y 2 aletas.

Escaneado con CamScanner

En la alcantarilla No 4 se hace el trazado, y relleno con material seleccionado, el relleno es de 20 cm de espesor, es compactado con una placa vibratoria posteriormente se funde el solado en la zona de instalacion de los usillos, el solado es de 5cm en concreto clase F.

2220209711401R

Cando Castellar
MP. 132021206291BLV

Miercoles, 20 de enero de 2021.
Se realizan las actividades de implementacion del protocolo de bioseguridad, y PMT
se trabajo en las cabeceras de la alcantarilla No 2
Se construlle el dentellon y la zapata del muro Pantalla, de acuerdo a los diseños de la cartilla colombia rural.
se espera la llegada de los usillos de las alcantarillas 3 y 4 para instalarlos y rellenar para habilitar el paso.
No se presentaron lluvias durante el día.


2220209711401R

Cando Castellar
MP. 132021206291BLV

Jueves, 21 de enero de 2021
Se realizan las actividades de implementacion del protocolo de bioseguridad, y PMT
Se continúan los trabajos de construcción de las cabeceras de la alcantarilla No2, se continúa la figuración del hierro de cabeceras.
Aun no se completan los usillos necesarios para las alcantarillas 3 y 4, por inconvenientes con


Escaneado con CamScanner

el transporte.
No se presentan lluvias durante el dia de trabajo



Oando Castellón
MP. 1320212062981V

Viernes, 22 de enero de 2021
Se realizan las actividades de implementacion del protocolo de bioseguridad, y PMT
Se continúan los trabajos en las cabeceras de la alcantarilla No 2, se comienza la instalación del acero de refuerzo de la losa de Solera y la cimentacion de las aletas.
En la alcantarilla No 1 se inicia la Construcción de la cimentacion de las cabeceras de acuerdo a los planos de la cartilla Colombia rural.
No se presentaron lluvias durante el día.



Oando Castellón
MP. 1320212062981V

Sabado, 23 de enero de 2021
se realizan las actividades de implementacion del protocolo de bioseguridad, y PMT
Se continuan los trabajos en las alcantarillas 1 y 2. En la alcantarilla No 1 se funde el dentellon y la zapata del muro pantalla de acuerdo a los diseños, se usa concreto de 3000 PSI hecho en obra con triturado y arena de rio. En la alcantarilla No 2, se continua la instalacion del hierro de la Solera, aletas, muro pantalla y se formaletea la losa de Solera.

Escaneado con CamScanner

No se presentan lluvias durante la jornada de trabajo.

222020971140R

Domingo, 24 de enero de 2021

Dia no laboral, Sin novedad.

Lunes, 25 de enero de 2020
se realizan las actividades de implementacion del protocolo de Bioseguridad, y PMT
se trabaja en la instalacion de usillos en las alcantarillas 3 y 4. se hace el sello de uniones con mortero, Por construccion solo se instalan 5 usillos en el Sobado para cada alcantarilla los usillos de los extremos se instalan luego de fundir la zapata del Muro de Pantalla.
continuan los trabajos en las cabeceras de las alcantarillas 1 y 2, quedando la No2 Lista para ser fundida la losa de solera.
No se presentan lluvias en la jornada de trabajo.

222020971140R

Cando Castellar
MP. 13202120629BLV

Escaneado con CamScanner

Martes, 26 de enero de 2021
Se realizan las actividades de implementación del Protocolo de Bioseguridad y PMT, y PMA Se revisa el acero instalado para la losa de Solera y aletas en la alcantarilla No 2, Se instaló correctamente de acuerdo a las especificaciones de los diseños.
Se funde la losa de solera y la cimentación delas aletas en concreto clase D (3000PSI) con una dosificacion 1:2:3 con triturado y arena de rio. Se realizan las ensayos de control de calidad con la toma de cilindros y ensayo de acentamiento, con resultado favorable de 8 cm, se tomaron 4 cilindros que seran fallados 2 a los 7 dias y 2 a los 28 dias, de acuerdo al Plan de ensayos de la interventoría. El contratista tambien toma muestras del concreto de acuerdo a su plan de ensayos de control de calidad.
Se continuan los trabajos en la alcantarilla No 1, se instala el hierro de losa, muro pantalla y aletas de acuerdo a los planos.
En la alcantarilla N3 se hace el relleno con material de excavación y se compacta a capas de 20 cm con una placa vibratoria quedando habilitado el paso a un solo carril.
No se presentaron lluvias durante el dia.

Rondo Castellar
MP. 132021206291LV
22202097114COR.

Escaneado con CamScanner

Miercoles, 27 de enero de 2021.
Se realizan las actividades de implementación del protocolo de bioseguridad y PMT, y PAGA.
Se funde la losa de solera y zapata de aletas en la cabecera derecha de la alcantarilla No2
Se hace ensayo de acentamiento y se mantienen los agregados usados en la cabecera izquierda al igual que la dosificacion.
Se trabaja en las dosi cabeceras de la alcantarilla No 1, instalando el hierro de losa de solera muro pantalla y aletas, y fundiendo la losa izquierda.
No se presentaron lluvias durante la jornada laboral.

2220209711 4COR

Pedro Castellar
MP. 13202120629BLV

Jueves, 28 de enero de 2021
Se realizan las actividades de implementacion del protocolo de bioseguridad y el PMT. y PAGA.
se trabaja
se trabaja en la formaleta del muro pantalla y aletas de la cabecera izquierda de la alcantarilla No2
En la alcantarilla No 3, se instala el acero de losa de solera, zapata de aletas y acero longitudinal de aletas, posteriormente se formaletea y se funde monoliticamente el area de losa de solera y cimentacion de aletas en concreto de 3000 psi con espesor de 20 cm. La interventoria hace control de calidad a los materiales y actividades desarrolladas por el contratista.
En la alcantarilla No 1 se trabaja en la instalacion del acero de losa de solera y zapatas de aletas-

Escaneado con CamScanner

No se presentaron lluvias durante la jornada laboral.
se presentó visita programada con los especialistas de pavimentos de obra e interventoría, en la cual se hizo un recorrido por la placa huella para tomar decisiones con miras a finalizar la etapa de ajustes a diseños y reiniciar actividades en la placa huella.

2220209711 4COR

Cando Castellar
MP. 132021206291BLV

Viernes, 29 de enero de 2021
se realizan las actividades de implementacion del protocolo de bioseguridad, Plan de manejo de transito y PAGA aprobados por la interventoria.
se trabaja en la formaleta del muro pantalla y aletas de la alcantarilla No 2. la cuadrilla de figuracion de hierro sigue trabajando en el acero de las cabeceras.
en la alcantarilla No 1 se trabaja en la instalacion del hierro de la cabecera Derecha.
en la alcantarilla No 3 se trabaja en la instalación del acero de la cabecera derecha.
en la alcantarilla No 4 se instalan los usillos y se habilita el paso vehicular a un carril.
No se presentan lluvias.

2220209711 4COR

Cando Castellar
MP. 132021206291BLV

Escaneado con CamScanner

Sabado, 30 de enero de 2021
Se realizan las actividades de implementacion del protocolo de bioseguridad, PMT y PAGA.
Se trabaja en la fundida del muro de pantalla y aletas de la cabecera izquierda de la alcantarilla No 2, se funde con concreto de 3000 PSI en dosificacion 1:2:3 con triturado y arena lavada del rio Sinú. La interventoria hace seguimiento a la actividad y realiza el control de calidad de los materiales.

Ondo Castellán
MP. 132021206291BLV

22202097114COR

Domingo, 31 de enero de 2021

DIO no laboral, sin novedad.

Febrero, 1 de 2021
Se realizan las actividades de implementacion del protocolo de bioseguridad, PMT y PAGA.
Se trabaja en la alcantarilla No 2 en la fundida de la losa de solera y cimentacion de la cabecera derecha, al igual que la alcantarilla No 1. El concreto se dosifica 1:2:3 para una resistencia esperada de 3000 PSI.

22202971140OR.

Ondo Castellán
MP. 132021206291BLV

Escaneado con CamScanner

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1283 – 2020	
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO CÓRDOBA ET**
REGISTRO FOTOGRÁFICO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO
CIÉNAGA DE ORO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PS 2020	**CONTRATO N°**	00280 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORDOBA ET	**CONTRATO N°**	1283 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO					



Descripción: Levantamiento topográfico contratista



Descripción: Levantamiento topográfico contratista



Descripción: Levantamiento topográfico interventoría



Descripción: Levantamiento topográfico interventoría

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PS 2020	**CONTRATO N°**	00280 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORDOBA ET	**CONTRATO N°**	1283 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO					




Descripción: Comité de obra



Descripción: Acta de vecinidad las Palmitas



Descripción: Conformación de veeduría Las Palmitas

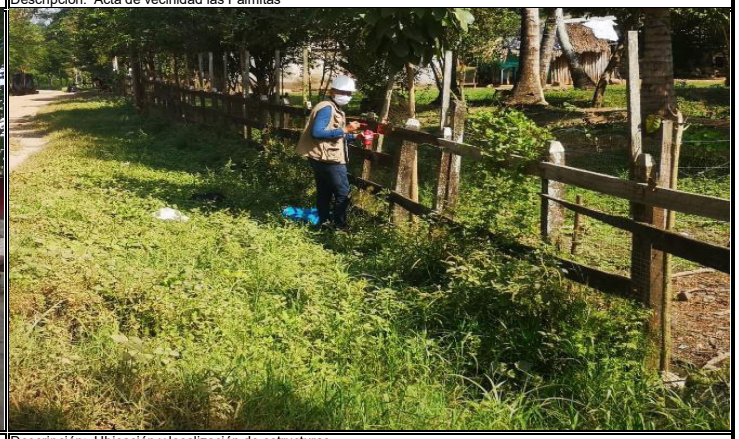

Descripción: Ubicación y localización de estructuras

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PLANETA RICA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMD-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	4

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO M RURALES	**CONTRATO N°**	076 DE 2020
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CÓRDOBA ET	**CONTRATO N°**	1283 DE 2020
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2760 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS".**		



Descripción: 28-1-21. Identificación de Boxcoulvert a construir K8+900 (1160253 - 1413352) Aun sin definir la intervención



Descripción: 28-1-21. Localización de Box Culvert a construir K9+550 (1160663 - 1412830) (1x1) Excavaciones varias



Descripción: 21-1-21. Identificación de Boxcoulvert a construir K8+900 (1160253 - 1413352) Aun sin definir la intervención



Descripción: 21-1-21. Visita en obra con el secretario de infraestructura y el ing de infraestructura de CERRO MATOSO.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMD-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	2	DE	4

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO M RURALES	**CONTRATO N°**	076 DE 2020
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CÓRDOBA ET	**CONTRATO N°**	1283 DE 2020
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2760 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS".**		



Descripción: 22-01-21. Identificación de Boxcoulvert a construir K8+900 (1160253 - 1413352) Aun sin definir la intervención



Descripción:25-1-21. Contrato de mejoramiento en la via Planeta Rica -Punta Verde



Descripción: 26-01-21. Presencia de fibra optica en la via, debe ser retirada informar a la empresa propietaria.



Descripción: 27-01-21. Estado inicial Box No.3 PR12+300

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMD-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	3	DE	4

FECHA ELABORACIÓN	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO M RURALES	**CONTRATO N°**	076 DE 2020
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CÓRDOBA ET	**CONTRATO N°**	1283 DE 2020
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2760 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS".**		



Descripción: 28-1-21. Identificación de Boxcoulvert a construir K8+900 (1160253 - 1413352) Aun sin definir la intervención



Descripción:28-01-21. Visita de la especialista de interventoria Ing Natalia García López.



Descripción: 28-1-21. Box No.2 PR9+550. Excavaciones varias y alcantarilla existenjte fracturada y en demolición.



Descripción: 29-1-21. Box No.2 PR9+550. Excavaciones varias y alcantarilla existenjte fracturada y en demolición.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMD-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	4	DE	4

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO M RURALES	**CONTRATO N°**	076 DE 2020
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CÓRDOBA ET	**CONTRATO N°**	1283 DE 2020
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2760 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS".**		



Descripción: 30-1-21. Box No.2. K9+550 (1160663 - 1412830 solado concreto de 2000psi.





Descripción: 30-1-21. Boc No.3. K12+300 solado concreto de 2000psi, se rompio tubo del agua y se inundo.



Descripción: 30-1-21. K9+550 (1160663 - 1412830 solado concreto de 2000psi.



Descripción: 30-1-21. Sealización presente en la vía Planeta Rica - Maraonal. Dentro del tramo a intervenir.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
LOS CÓRDOBAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
		VERSIÓN	1			
		PAGINA		DE		

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL 2019	**CONTRATO N°**	LP-001-2010	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CÓRDOBA ET	**CONTRATO N°**	1283 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO					



compactación del tramo 2 (k3+290-k3+490)



Instalación de valla



Implementacion del PMT



Llegada de material de subbase

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
"LA APARTADA"

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO LP 02-2020 LA APARTADA	**CONTRATO N°**	014 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CÓRDOBA ET	**CONTRATO N°**	1283 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**				



Descripción: Mecladores de concreto en obra



Descripción: acopio de cemento en el campamento



Descripción: conformación de vía



Descripción: Maquinaria usada en la conformación de vía

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO "MOÑITOS"

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	HERSA CONSTRUCTORES SAS	**CONTRATO N°**	LP N°002 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CORDOBA ET	**CONTRATO N°**	1283 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO 002508 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOÑITOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS**				



Descripción: Señalización de Obra



Descripción: Puntos crititos a lo largo del eje la via.



Descripción: Puntos Criticos donde se construiran los muros Tipo I y tipo II.



Descripción: Inicio Excavación manual en seco para el muro de contención tipo I.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO "COTORRA"

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	(Día)	(Mes)	(Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA		**CONTRATO N°**		**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA		**CONTRATO N°**			
NOMBRE DEL PROYECTO					



Descripción: Levantamiento topografico realizado por interventoría



Descripción: Levantamiento topografico realizado por interventoría



Descripción: Levantamiento topografico realizado por interventoría



Descripción: Levantamiento topografico realizado por interventoría

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO "CERETE"



Foto 1,2,3,4,5,6. Recorrido por el corredor vial. Visita y acta de reunión técnica inicial.



Foto 7 y 8. Reunión con la veeduría el día 12 de enero, previo al reinicio de las obras.



Foto 9 y 10. Reunión con la veeduría, personal del contratista, municipio e interventoría el día 13 de enero, impartiendo directrices en el inicio de actividades.



Foto 11 y 12. Excavaciones para alcantarillas



Foto 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Excavaciones para alcantarillas y construcción de paso provisional vehicular



Foto 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Mejoramiento de desplante con material seleccionado, materiales para la construcción de los concretos.



Foto 25, 26, 27, 28, 29, 30. Construcción de solado para alcantarillas, espesor 5cm



Foto 31, 32, 33, 34, 35, 36. Instalación de usillos de 36 pulgadas de diámetro, se construyen 4 alcantarillas.



Foto 37, 38, 39, 40, 41, 42. Proceso Constructivo de cimentación de muro pantalla y aletas de cabeceras.



Foto 43, 44, 45, 46, 47, 48. Proceso Constructivo de cimentación de muro pantalla y aletas de cabeceras.



Foto 49, 50, 51, 52, 53, 54. Proceso Constructivo muro pantalla y aletas de cabeceras.



Foto 55, 56, 57, 58, 59, 60. Implementación del plan de manejo de tránsito en la vía.



Foto 61, 62, 63, 64. Implementación de protocolos de bioseguridad y PAGA



Foto 65, 66, 67, 68. Implementación de protocolos de bioseguridad y PAGA. Charlas de capacitación PAGA y Protocolo.



Foto 69, 70, 71, 72, 73, 74. Toma de muestras para ensayo de expansividad en el aparato de lambe



Foto 75, 76, 77, 78, 79, 80. Control de calidad al concreto hecho en sitio, ensayos de asentamiento y toma de muestras de concreto
