DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DARINCOL SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a061f24ef342967ea0f856a7d0f24fbed42f32a49a7d6abb575ef67d40040e7eb1e54da83a14fccbef94ffab8a9b44c7

Número de Factura: FE-49
Fecha de Emisión: 11/08/2026
Fecha de Vencimiento: 10/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901760595
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4220

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Villeta
Dirección: CR 3 E 7 00 TO 28 AP 402
Teléfono / Móvil: 3142376219
Correo: darincolsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981868
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Andrés De Cuerquía
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	07	COSTOS DIRECTOS ACT A PARCIAL 1 CONTRATO SASI 100.06.04 01 2026	NIU	1,00	$ 44.096.140,35	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.096.140,35
2	03	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 12.346.919,30	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.346.919,30
3	04	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 2.204.807,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.913,33	19.00			$ 2.204.807,02

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/08/2026 12:43:43
Documento validado por la DIAN:
11/08/2026 12:43:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			58647866.67
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			58647866.67
IVA			418913.33
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			418913.33
Total neto factura (=)			59066780
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	59066780

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			58.647.866,67
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			58.647.866,67
IVA			418.913,33
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			418.913,33
Total neto factura (=)			59.066.780,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	59.066.780,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111583303 Rango desde: 46 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-06-23

Bancolombia

Neiva, 03 de Junio de 2026

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente DISE#O, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS identificado con Nit No 901760595, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	ESTADO
CUENTA DE AHORROS	455-000074-66	2026/06/03	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8631043 Ext. 151 o en nuestra sucursal Las Ceibas.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Neiva Of. 455 Las Ceibas

Asesor de servicios N° 151

Cédula N° 36066905

CLAUDIA LEONOR MUÑOZ
Asesor pyme
Oficina. Las Ceibas

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA y **DOLLY JIMENA CERQUERA SANDOVAL** identificados con el número de identificación 83.225.095 y 1.081.516.817, actuando respectivamente como Representante Legal y Contador de **DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. – DARINCOL S.A.S. identificada con el NIT 901.760.595 - 9,**En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes,

CERTIFICAMOS:

Que la sociedad **DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COLOMBIA SAS (DARINCOL SAS)**, identificada con NIT **901.760.595-9**, se encuentra al día y ha cumplido de manera oportuna con la totalidad de los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales - ARL), así como con los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de todo el personal vinculado laboralmente y destinado a la ejecución del **Contrato No. SASI-100.06.04-01-2026,** cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,** celebrado con el **MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA.**

Que a la fecha de expedición de la presente certificación, la empresa no presenta saldos pendientes ni mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral ni parafiscales correspondientes al periodo del 12/06/2026, al 30/07/2026

Se expide en San Andrés de Cuerquia., a los once (11) día del mes de agosto de 2026, con destino al **MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUEQUIA**, para el trámite del **Acta Parcial de Obra No. 1** y el cobro respectivo del Contrato No. SASI-100.06.04-01-2026,.

En constancia de lo anterior,

firma:


ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA
C.C. No. 83.225.095 de Teruel
Representante Legal / Gerente General
DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COLOMBIA SAS - DARINCOL SAS


DOLLY JIMENA CERQUERA SANDOVAL
TP 248902-T


Contadora
DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COLOMBIA SAS - DARINCOL SAS

*

DOLLY JIMENA CERQUERA SANDOVAL
CONTADOR PUBLICO

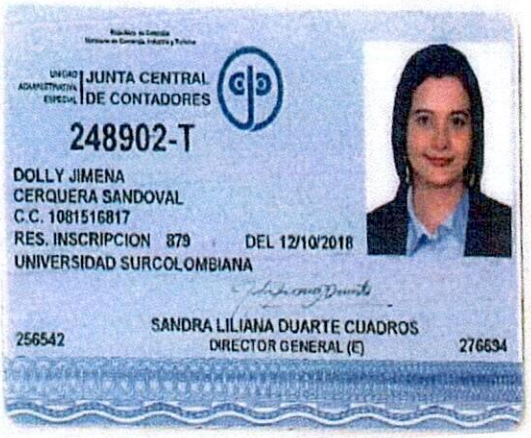

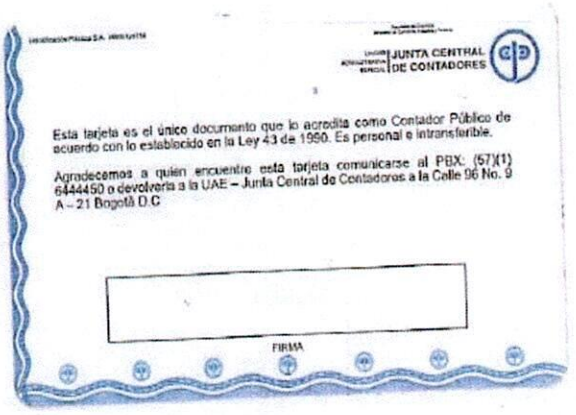

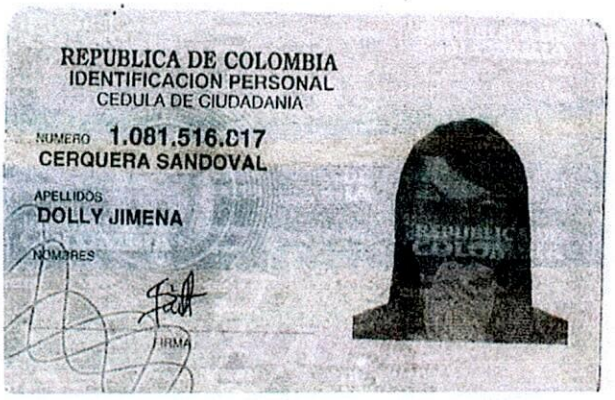



Neiva-Huila
Asesoriasdj22@gmail.com
3195755861

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A64508B9E1DFDCC2Z2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DOLLY JIMENA CERQUERA SANDOVAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081516817 de TARQUI (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 248902-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SEGURIDAD SOCIAL RESIDENTE DE OBRA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1081513985	0	JEISON ALBEIRO TRUJILLO ANTURI	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4330	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 42 18A		3143956118			JEISSONTRUJILLO1642@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	38017785	I	2026-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	816.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38017785	2026-08-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1081513985	TRUJILLO ANTURI JEISSON ALBEIRO	2.640.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	2.640.000	422.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.640.000	330.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.640.000	64.400	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	816.800	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1081513985	0	JEISON ALBEIRO TRUJILLO ANTURI	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4330	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 42 18A		3143956118			JEISSONTRUJILLO1642@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	38017785	I	2026-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	816.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38017785	2026-08-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.640.000	2.640.000	2.640.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	422.400	0	0	0	422.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	422.400	0	0	0	422.400
EPS(Administradoras: 1)				1	330.000	0	0	0	330.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	330.000	0	0	0	330.000
ARP(Administradoras: 1)				1	64.400	0	0	0	64.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	64.400	0	0	0	64.400
Gran Total					816.800	0	0	0	816.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38064151
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-22

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DARINCOL SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901760595	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	KR 20 7 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	DARINCOLSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3142376219
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDINTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	83225095	PRIMER APELLIDO	PATRANA	SEGUNDO APELLIDO	ARDILA
PRIMER NOMBRE	ISMAEL	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 07	Año: 2026	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		38064151

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1081513985	59	No	No	No	41	1	5411101	Salario	TRUJILLO ANTURI JEISSON ALBEIRO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1081513985																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1081513985	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081513985	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	90176059 5	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1081513985	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$121.900	0	$0	$0	$121.900	0	$0	$121.900	0	$0	$0	$121.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$121.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$121.900

SEGURIDAD PERSONAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901760595	9	DARINCOL SAS	B	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	KR 20 7 18		3142376219			DARINCOLSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37970767	E	2026-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.458.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	37970767	2026-07-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7713491	RENDON TOBAR DANIEL ENRIQUE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
2	CC 7723434	CHACON JAVELA ROBIR	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
3	CC 1003801176	VALDERRAMA QUINTERO DIEGO ARMANDO	1.750.905	F		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
4	CC 1075238348	VALDERRAMA TOVAR JOSE LEONARDO	1.750.905	F	X	X														0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	933.816	149.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	933.816	37.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	933.816	37.400	933.816	65.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	289.300	S	5421001
5	CC 1075303303	GONZALEZ TOVAR SAMUEL EDUARDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901760595	9	DARINCOL SAS	B	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	KR 20 7 18		3142376219			DARINCOLSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37970767	E	2026-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2,458,500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	37970767	2026-07-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7,937,436	7,937,436	7,937,436	7,937,436	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1,270,300	0	0	0	1,270,300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	149,500	0	0	0	149,500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280,200	0	0	0	280,200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	840,600	0	0	0	840,600
EPS(Administradoras: 3)				5	317,800	0	0	0	317,800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70,100	0	0	0	70,100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	177,600	0	0	0	177,600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	70,100	0	0	0	70,100
ARP(Administradoras: 1)				5	552,600	0	0	0	552,600
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	552,600	0	0	0	552,600
CCF(Administradoras: 1)				5	317,800	0	0	0	317,800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	5	317,800	0	0	0	317,800
Gran Total					2,458,500	0	0	0	2,458,500

SEGURIDAD REPRESENTANTE LEGAL

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38112083
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-22

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DARINCOL SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901760595	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	KR 20 7 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	DARINCOLSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3142376219
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	83225095	PRIMER APELLIDO	PATRANA	SEGUNDO APELLIDO	ARDILA
PRIMER NOMBRE	ISMAEL	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 07	Año: 2026	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.750.905		38112083

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83225095	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	PASTRANA ARDILA ISMAEL ENRIQUE	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83225095																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83225095	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83225095	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5	0.0052200	$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83225095	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$9.200	0	$0	$0	$9.200	0	$0	$9.200	0	$0	$0	$9.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$70.100	0	$0	$70.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$70.100
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$70.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$429.600

INFORME PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No. SASI-100.06.04-01-2026

OBJETO:
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

AGOSTO 2026

*

GENERALIDADES

CONTRATO:	SASI-100.06.04-01-2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 170.009.507,00
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA DEL INICIO:	12 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DEL INFORME:	05 DE AGOSTO 2026
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1:	$ 59.066.780,00 M/CTE
SALDO POR EJECUTAR	$ 110.942.727,00 M/CTE
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO / FINANCIERO	34,74 %

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Parcial de Obra No. 01 tiene como propósito exponer de forma detallada y sustentada los avances técnicos, operativos, administrativos, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) alcanzados en la ejecución del Contrato No. SASI-100.06.04-01-2026. El periodo reportado corresponde al corte del Acta Parcial No. 01, comprendido entre el 12 de junio y el 05 de agosto de 2026.

Durante este lapso se logró la ejecución física del 50% de la longitud del trazado (150 metros lineales de placa huella de los 300 ml contemplados), lo que equivale a un avance financiero acumulado y cobrado del 34,74% sobre el valor total del contrato, con un importe ejecutado de $59.066.780,00 M/CTE de un presupuesto general de $170.009.507,00 M/CTE.

*

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende la prestación de servicios de mano de obra y ejecución técnica para la construcción de 300 metros lineales de pavimento en sistema placa huella en la vía El Vergel del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Las labores ejecutadas en este primer periodo incluyen:

Trabajos Preliminares: Localización, trazado y replanteo topográfico del tramo inicial. Preparación de Calzada: Conformación general con maquinaria pesada (bulldozer) en una área de 1.200 m². Estructura de Soporte: Suministro, extensión y compactación de 180 m³ de subbase granular. Estructura de Pavimento: Armado e instalación de acero de refuerzo (3.105 kg), vaciado de 50.40 m³ de concreto clase D (21 MPa) para las cintas huellas laterales y vigas riostras transversales, y la colocación de 20.25 m³ de concreto ciclópeo clase G (14 MPa + piedra rajón) en la franja central. Obras de Drenaje Longitudinal: Inicio de excavación manual para la conformación de la sección de cunetas laterales.

3. PERIODO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe comprende las actividades desde 12 de junio al 05 de agosto del presente año, actividades realizadas bajo la supervisión delegado para el contrato el Ingeniero **CARLOS ANDRES ESTRADA VERGARA** secretario de Planeación E Infraestructura Municipio San Andrés de Cuerquia.

4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL.

4.1. Descripción del contrato

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO Nº	SASI-100.06.04-01-2026
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."**
CONTRATISTA	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. – DARINCOL S.A.S
NIT	901.760.595-9
REPRESENTANTE LEGAL	ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA

CEDULA	83225095		
DIRECCIÓN PRINCIPAL	Carrera 3E # 7-00		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA		
ESTADO ACTUAL CONTRATO	En ejecución		
FECHA INICIACIÓN	12 de junio del 2026		
PLAZO ADICIONAL	Cero (0) días		
FECHA TERMINACIÓN			
PLAZO TOTAL	3 meses		
VALOR INICIAL	$ 170.009.507	VALOR ADICIONAL	$ 00,00
VALOR TOTAL OBRA	$ 170.009.507		
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	Valor Costo Directo Obras Civiles		$ 170.009.507
	Valor Total Presupuesto Obras Civiles		**$ 170.009.507**

*

4.2. Presupuesto.

Código CCE-EICP-FM-2 Versión 1

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA DARINCOL SAS

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma precio]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				PRELIMINARES				
	1.01.	X		Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	Día	1,00	$ 1.451.900,00	$ 1.451.900,00
Subtotal								$ 1.451.900,00
2				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA				
	2.01	X		Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	m3	18,36	$ 123.500,00	$ 2.267.460,00
	2.02	X		Conformación de la calzada existente con bulldozer. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	1.200,00	$ 5.200,00	$ 6.240.000,00
	2.03		X	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	180,00	$ 7.600,00	$ 1.368.000,00
	2.04		X	Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	99,36	$ 437.000,00	$ 43.420.320,00
	2.05		X	Concreto Clase G (Ciclópeo con concreto clase F - 14 MPa y Piedra de 2" a 4")	m3	40,50	$ 241.100,00	$ 9.764.550,00
	2.06	X		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	6.212,50	$ 5.600,00	$ 34.790.000,00
	2.07	X		Transporte de sobrantes de demoliciones. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye30% de expansión)	m3	14,69	$ 1.900,00	$ 27.907,00
Subtotal								$ 97.878.237,00
3				CONSTRUCCIÓN CUNETAS				
	3.01	X		Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	m3	247,50	$ 107.600,00	$ 26.631.000,00
	3.02		X	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	66,30	$ 329.900,00	$ 21.872.370,00
	3.03	X		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	3.960,00	$ 5.600,00	$ 22.176.000,00
Subtotal								$ 70.679.370,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 170.008.507,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 170.009.507,00
VALOR TOTAL		$ 170.008.507,00

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	28%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	0%
NOTA 4: [Determinar por la Entidad]	UTILIDAD	U=	5%
NOTA 5: [Determinar por la Entidad]	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%
NOTA 6: [Determinar por la Entidad]			

*

5. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

1. PRELIMINARES

1.01. Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión: La localización del sitio de ubicación de la placa huella se realizó en compañía del secretario de planeación municipal y contratista; el replanteo se realizó de acuerdo a lo previsto en el contrato, donde se logra constatar el punto de inicio y el punto de terminación del proyecto y se marca el eje central de la vía.

2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

2.01. Excavación manual en material común.: Se realiza esta actividad en las excavaciones de las huellas, centros y vigas riostras donde se logra una nivelación y una precisión en las medidas para evitar desperdicio de concreto.

2.02. Conformación de la calzada existente: Se realizó la conformación de la calzada con retroexcavadora, y se logra aumentar el rendimiento para el inicio de los trabajos de excavación, instalación de aceros y posterior fundición de concretos.

2.03. Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular: Esta actividad se realizó de acuerdo a las condiciones del proyecto y constatadas por el laboratorio.

2.04. Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto: Esta actividad se realizó con mezclado en obra de acuerdo a las condiciones dadas por el laboratorio.

2.05. Concreto Clase G (Ciclópeo con concreto clase F - 14 MPa y Piedra de 2" a 4"): Se instaló con concreto mezclado en obra, de acuerdo condiciones dadas por el laboratorio.

2.06. Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60): Se realiza la instalación del acero de acuerdo al diseño del proyecto entregado por la administración municipal.

2.07. Transporte de sobrantes de demoliciones. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye30% de expansión: Luego de realizada la conformación de la calzada se realiza un acopio y se coordina el retiro del material sobrante.

*

3. **CONSTRUCCIÓN CUNETAS**

3.01. Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. Se realiza esta actividad en las excavaciones de las huellas, centros y vigas riostras donde se logra una nivelación y una precisión en las medidas para evitar desperdicio de concreto

3.02. Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas: Esta actividad se realizó con mezclado en obra de acuerdo a las condiciones dadas por el laboratorio.

3.03. Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60): Se realiza la instalación del acero de acuerdo al diseño del proyecto entregado por la administración municipal.

6. PERSONAL DE OBRA

En Obra se cuenta con el siguiente personal en la obra para el desarrollo de las actividades correspondientes al contrato:

- ✓ Contratista
- ✓ Residente de obra
- ✓ Oficiales (2)
- ✓ Ayudantes (5)

7. MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

En Obra ha contado para este periodo con el siguiente equipo:

- ✓ Retrocargador de llantas (no propio)
- ✓ Rodillo vibro compactador (no propio)
- ✓ Mezcladora de Concretos (1)
- ✓ Herramienta Menor
- ✓ Equipo de seguridad (camilla, botiquín de primeros auxilios)

8. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y GESTIÓN AMBIENTAL

*

Durante el periodo de ejecución correspondiente a la **Acta Parcial No. 01**, la empresa **DARINCOL S.A.S.** implementó los protocolos y controles previstos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), conforme a la normatividad colombiana vigente (Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015 y guía de manejo ambiental vial).

4.1. Seguridad Social y Contratación de Personal

- **Cumplimiento Legal y Parafiscales:** Se garantizó la afiliación y cobertura continua en el Sistema General de Seguridad Social Integral (EPS, ARL Riesgo V de alta peligrosidad para construcción, y AFP) de la totalidad del personal operativo y técnico vinculado a la obra (oficiales y ayudantes), dando estricto cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012.

4.2. Elementos de Protección Personal (EPP) y Señalización de Seguridad

- **Dotación y Control de EPP:** Suministro obligatorio, inspección diaria y verificación de uso continuo de Elementos de Protección Personal certificados para todo el personal en frente de trabajo: casco de seguridad industrial con barbuquejo, botas de seguridad con puntera de acero, chaleco reflectivo de alta visibilidad, gafas de protección policarbonato y guantes de vaqueta/carnaza para la manipulación de acero y concreto.

4.3. Indicadores de Gestión SST (Periodo Evaluado)

Indicador SST / Siniestralidad	Valor Registrado	Meta	Estado / Diagnóstico Operativo
Número de Accidentes de Trabajo (AT)	**0**	0	**Cumplido.** Sin eventos que afectaran la integridad del personal.
Número de Incidentes Laborales	**0**	0	**Cumplido.** Sin registro de casi-accidentes en las áreas de trabajo.
Enfermedades Laborales Diagnosticadas (EL)	**0**	0	**Cumplido.** Sin patologías asociadas a las labores de construcción.
Días Perdidos por Incapacidad	**0**	0	**Cumplido.** Continuidad operativa al 100% sin ausentismo por salud.

*

Horas Hombre Trabajadas (HHT)	**336 HHT**	100%	Jornadas completadas en el frente de obra sin interrupción por emergencias.

Gracias a las inspecciones de campo para el uso de EPP certificados y al control de señalización vial en el tramo intervenido, el Índice de Frecuencia y la Tasa de Accidentalidad de la obra se mantienen en 0,00%, garantizando la protección del personal técnico y operativo contratado.

4.4. Gestión Ambiental y Manejo de Residuos (PMA)

- **Manejo y Apilamiento de Materiales de Construcción:** Acopio técnico de pétreos (triturados y arenas) e insumos en áreas previamente delimitadas, protegidos con cubiertas plásticas para evitar el arrastre de finos por escorrentía pluvial y la emisión de material particulado por viento.
- **Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD):** Cargue, transporte y disposición final de **7.80 m³** de material de excavación sobrante hacia el sitio autorizado de disposición final de RCD, evitando afectaciones a predios vecinos o fuentes de agua.
- **Protección de Fuentes Hídricas y Laderas:** Control estricto en la preparación y vaciado de concreto para evitar el vertimiento de lechadas de cemento o aceites sobre cunetas naturales, vertientes de agua o taludes colindantes.

9. Estado Financiero y Flujo de Caja del Contrato

Se debe presentar el balance económico consolidado a la fecha de corte, incluyendo el control del anticipo (si aplicó) o retenciones:

- **Valor Total del Contrato:** $ 170.009.507,00 M/CTE
- **Valor Valor Parcial Cobrado (Acta No. 1):** $ 59.066.780,00 M/CTE
- **Saldo Contractual por Ejecutar:** $ 110.942.727,00 M/CTE
- **Amortización de Anticipo (0%):** $ 0,00 (según el acta parcial, no hubo descuento o amortización en este corte).

*

- **Valor Neto a Cancelar al Contratista:** $ 59.066.780,00 M/CTE
- **Porcentaje de Ejecución Financiera Acumulada:** 34,74%

Ítem	Descripción de la Actividad	Und	Cant	Cantidad Ejecutada	% Avance	Estado del Ítem	Observaciones Técnicas / Operativas
CAPÍTULO 1	**PRELIMINARES**						
1.01	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión	Día	1,00	1,00	**100,00%**	**FINALIZADO**	Topografía inicial y fijación de ejes de la vía completada.
CAPÍTULO 2	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**						
2.01	Excavación manual en material común (Placa Huella)	m^3	50,70	25,35	**50,00%**	**EN EJECUCIÓN**	Excavación de caja vial en los primeros 150 ml de vía.
2.02	Conformación de la calzada existente con bulldozer	m^2	1.200,00	1.200,00	**100,00%**	**FINALIZADO**	Conformación y nivelación de la superficie vial.
2.03	Subbase granular	m^3	180,00	180,00	**100,00%**	**FINALIZADO**	Extensión y compactación de subbase en el tramo proyectado.
2.04	Concreto Clase D (21 MPa) - Placa huella	m^3	100,80	50,40	**50,00%**	**EN EJECUCIÓN**	Vaciado de cintas huellas y vigas riostras en 150 ml.
2.05	Concreto Clase G (Ciclópeo 14 MPa + Piedra)	m^3	40,50	20,25	**50,00%**	**EN EJECUCIÓN**	Relleno y confinamiento de la franja central en 150 ml.
2.06	Acero de refuerzo $f_y=420\text{ MPa}$ (Grado 60)	Kg	6.334,64	3.105,00	**49,02%**	**EN EJECUCIÓN**	Armado de parrillas para huellas y vigas riostras.
2.07	Transporte de sobrantes de demoliciones / excavación	m^3	8,40	7,80	**92,86%**	**EN EJECUCIÓN**	Retiro y acarreo de material hacia sitio autorizado.
CAPÍTULO 3	**CONSTRUCCIÓN CUNETAS**						
3.01	Excavación manual en material común (Cunetas)	m^3	76,26	23,85	**31,28%**	**INICIADO**	Apertura preliminar del canal de drenaje lateral.
3.02	Concreto Clase D (21 MPa) - Cunetas	m^3	100,50	0,00	**0,00%**	**PENDIENTE**	Programado para ejecución en el Acta No. 02.
3.03	Acero de refuerzo $f_y=420\text{ MPa}$ - Cunetas	Kg	4.290,00	0,00	**0,00%**	**PENDIENTE**	Programado para ejecución en el Acta No. 02.


*

ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA
Representante legal
Contratista


*

REGISTRO FOTOGRAFICO




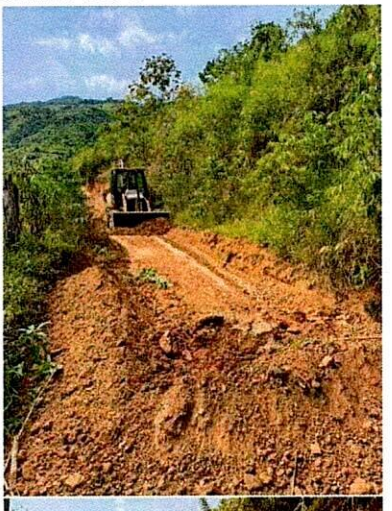




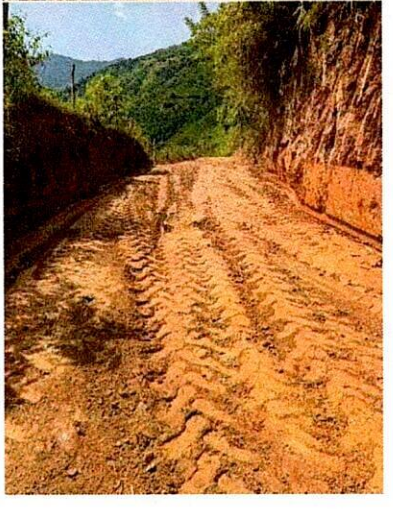




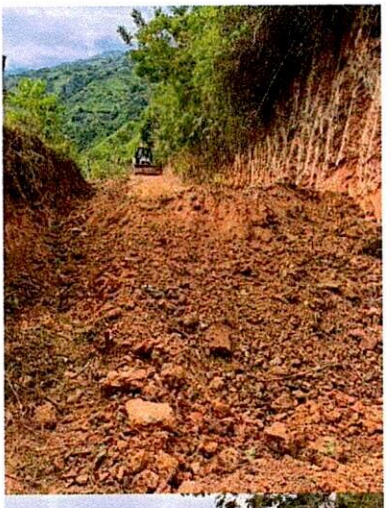




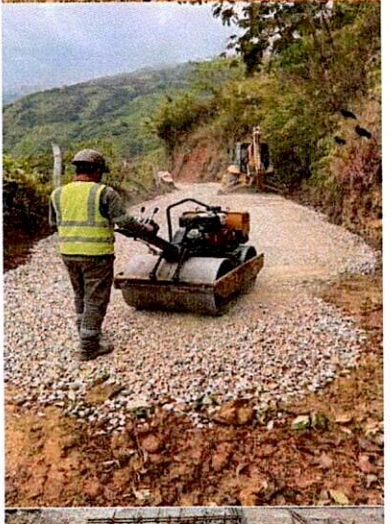

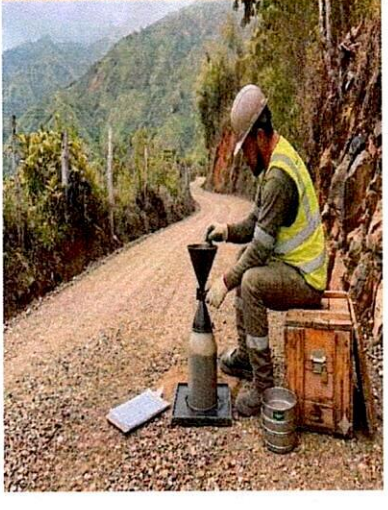




*

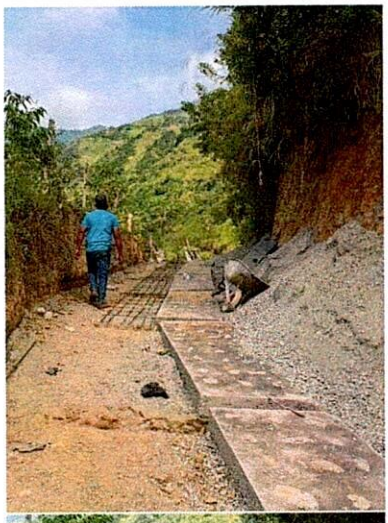








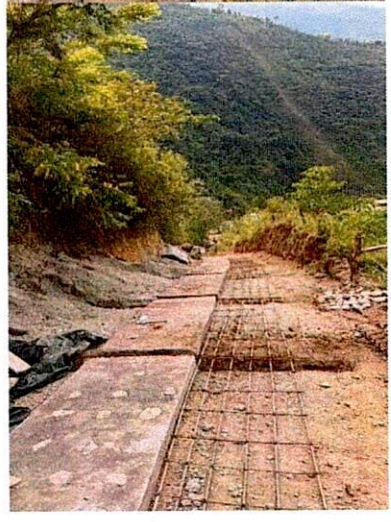

*

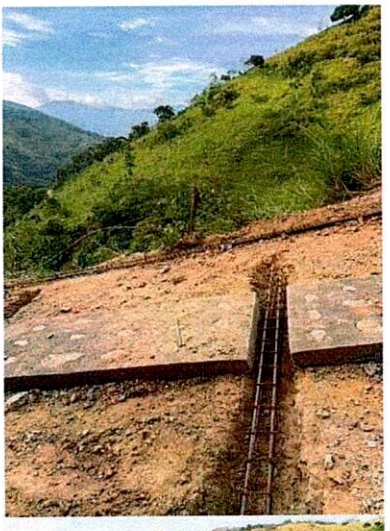

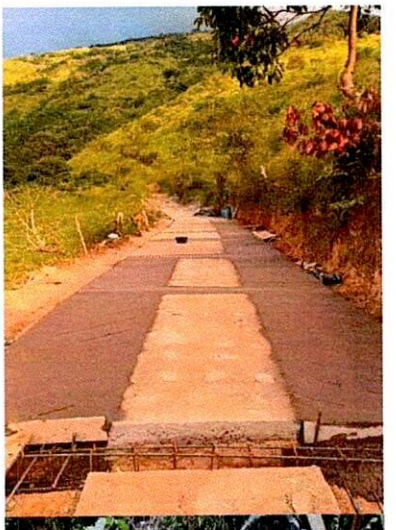

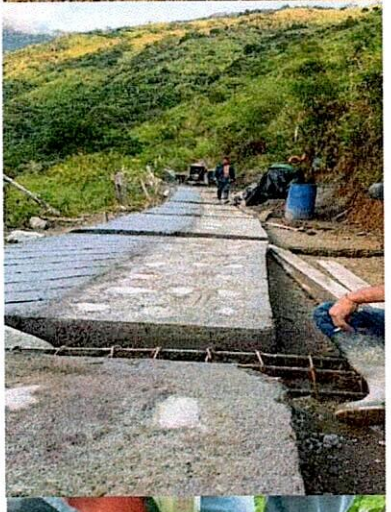









*






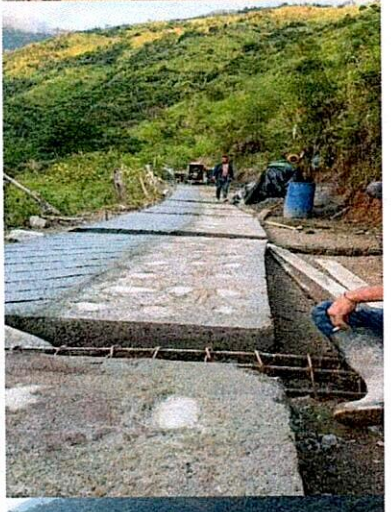





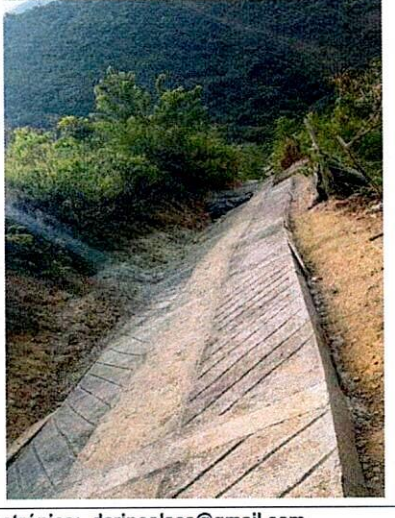

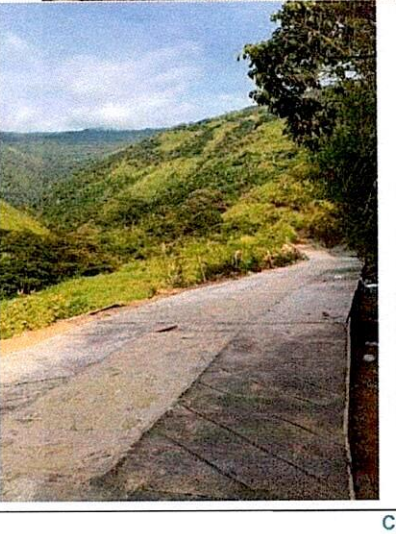

*

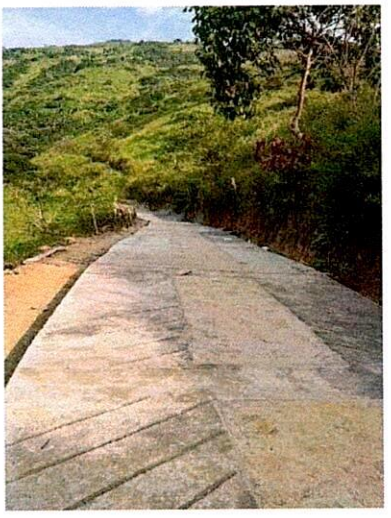

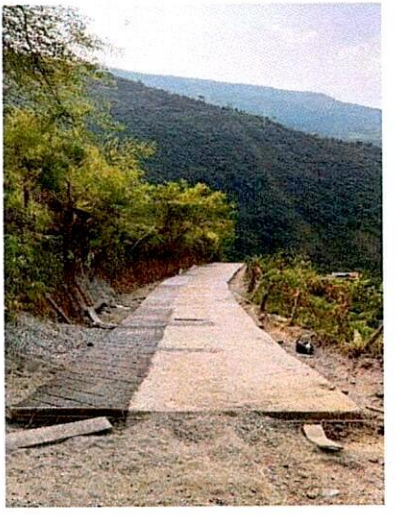

*

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE OBRA No 1

				FECHA DE ACTA:	24/07/2026
CONTRATO No:	SASI-100.06.04-01-2026			FECHA DE INCIO:	12/06/2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	CONTRATISTA:	DISEÑOS ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	PLAZO CONTRACTUAL:	45 DIAS
SUPERVISOR	CARLOS ANDRES ESTRRADA VERGARA SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO	REPRESENTANTE LEGAL:	ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA	VALOR CONTRATO:	$170.009.507,00
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			VALOR PRESENTE ACTA:	$59.066.780,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES 1		PRESENTE ACTA DE RECIBO No 1		SALDO SIN EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNID	CANT. CONTRATO	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT. EJECUTADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES										
1.01.	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	Dia	1,00	$1.451.900,00	$1.451.900,00	1,00	$1.451.900,00	1,00	$1.451.900,00	0,00	$0,00
2	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA										
2.01	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	m3	18,36	$123.500,00	$2.267.460,00	50,70	$6.261.450,00	25,35	$3.130.725,00	25,35	$3.130.725,00
2.02	Conformación de la calzada existente con bulldozer. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	1.200,00	$5.200,00	$6.240.000,00	1.200,00	$6.240.000,00	1.200,00	$6.240.000,00	0,00	$0,00
2.03	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	180,00	$7.600,00	$1.368.000,00	180,00	$1.368.000,00	180,00	$1.368.000,00	0,00	$0,00
2.04	Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	99,36	$437.000,00	$43.420.320,00	100,80	$44.049.600,00	50,40	$22.024.800,00	50,40	$22.024.800,00
2.05	Concreto Clase G (Ciclópeo con concreto clase F - 14 MPa y Piedra de 2" a 4")	m3	40,50	$241.100,00	$9.764.550,00	40,50	$9.764.550,00	20,25	$4.882.275,00	20,25	$4.882.275,00
2.06	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	6.212,50	$5.600,00	$34.790.000,00	6.334,64	$35.473.984,00	3.105,00	$17.388.000,00	3.229,64	$18.085.984,00
2.07	Transporte de sobrantes de demoliciones. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye30% de expansión)	m3	14,69	$1.900,00	$27.907,00	8,40	$15.960,00	7,80	$14.820,00	0,60	$1.140,00
3	CONSTRUCCIÓN CUNETAS										
3.01	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	m3	247,50	$107.600,00	$26.631.000,00	76,26	$8.205.113,00	23,85	$2.566.260,00	52,41	$5.638.853,00
3.02	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	66,30	$329.900,00	$21.872.370,00	100,50	$33.154.950,00	0,00	$0,00	100,50	$33.154.950,00
3.03	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	3.960,00	$5.600,00	$22.176.000,00	4.290,00	$24.024.000,00	0,00	$0,00	4.290,00	$24.024.000,00
TOTAL					$170.009.507,00		$170.009.507,00		$59.066.780,00		$110.942.727,00
COSTO DIRECTO ANTES DE AIU					$126.920.124,67		$126.920.124,67		$44.096.140,35		$82.823.984,32
ADMINISTRACIÓN (28,00%)					$35.537.634,91		$35.537.634,91		$12.346.919,30		$23.190.715,61
IMPREVISTOS (0,00%)					$0,00		$0,00		$0,00		$0,00
UTILIDAD (5,00%)					$6.346.006,23		$6.346.006,23		$2.204.807,02		$4.141.199,21
IVA SOBRE UTILIDAD (19,00%)					$1.205.741,18		$1.205.741,18		$418.913,33		$786.827,85
AJUSTE AL PESO					$0,01		$0,01				
VALOR TOTAL DEL ACTA DE OBRA (CON AIU E IVA)					$170.009.507,00		$170.009.507,00		$59.066.780,00		$110.942.727,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 59.066.780,00
MENOS VALOR OTROSI	$ -
SUBTOTAL	$ 59.066.780,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO(%)	$ -
VALOR A PAGAR	$ 59.066.780,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Por el Contratista:

ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA
Representante Legal

Por el Contratista:

JEISSON ALBEIRO TRUJILLO ANTURI
Residente de Obra

Por el Contratante / Supervisión:

CARLOS ANDRES ESTRRADA VERGARA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPI
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

CONTRATO No:	SASI-100.06.04-01-2026			**FECHA DE ACTA:**	1/07/2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	**CONTRATISTA:**	DISEÑOS ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**FECHA DE INCIO:**	11/06/2026
SUPERVISOR	CARLOS ANDRES ESTRRADA VERGARA SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO	**REPRESENTANTE:**	ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA	**PLAZO CONTRACTUAL:**	45 DIAS
OBJETO:	**(SG-255) CONTRATAR LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL AREA OPERATIVA 2 DEL IDEAM UBICADO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.**			**VALOR CONTRATO:**	$170.009.507,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES FINALES	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNID	CANT. CONTRATO	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES	MENORES	CANTI. FINAL	VALOR PARCIAL FINAL
1	**PRELIMINARES**								
1.01.	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	Dia	1,00	$1.451.900,00	$1.451.900,00	-	-	1,00	$1.451.900
2	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**								
2.01	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	m3	18,36	$123.500,00	$2.267.460,00	32,34	-	50,70	$6.261.450
2.02	Conformación de la calzada existente con bulldozer. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	1.200,00	$5.200,00	$6.240.000,00	-	-	1.200,00	$6.240.000
2.03	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	180,00	$7.600,00	$1.368.000,00	-	-	180,00	$1.368.000
2.04	Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su item respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	99,36	$437.000,00	$43.420.320,00	1,44	-	100,80	$44.049.600
2.05	Concreto Clase G (Ciclópeo con concreto clase F - 14 MPa y Piedra de 2" a 4")	m3	40,50	$241.100,00	$9.764.550,00	-	-	40,50	$9.764.550
2.06	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	6.212,50	$5.600,00	$34.790.000,00	122,14	-	6.334,64	$35.473.984
2.07	Transporte de sobrantes de demoliciones. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye30% de expansión)	m3	14,69	$1.900,00	$27.907,00	-	- 6,29	8,40	$15.960
3	**CONSTRUCCIÓN CUNETAS**								
3.01	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	m3	247,50	$107.600,00	$26.631.000,00	-	- 171,24	76,26	$8.205.113
3.02	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	66,30	$329.900,00	$21.872.370,00	34,20	-	100,50	$33.154.950
3.03	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	3.960,00	$5.600,00	$22.176.000,00	330,00	-	4.290,00	$24.024.000

VALOR TOTAL	**$170.009.507,00**	**$170.009.507,00**
COSTO DIRECTO ANTES DE AIU	**$126.920.124,67**	**$126.920.124,67**
ADMINISTRACIÓN (28,00%)	$35.537.634,91	$35.537.634,91
IMPREVISTOS (0,00%)	$0,00	$0,00
UTILIDAD (5,00%)	$6.346.006,23	$6.346.006,23
IVA SOBRE UTILIDAD (19,00%)	$1.205.741,18	$1.205.741,18
AJUSTE AL PESO	$0,01	$0,01
VALOR TOTAL DEL ACTA DE OBRA (CON AIU E IVA)	**$170.009.507,00**	**$170.009.507,00**

Por el Contratista:

ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA
Representante Legal
DARINCOL SAS

Por el Contratista:

JEISSON ALBEIRO TRUJILLO ANTURI
Residente de Obra
DARINCOL SAS

Por el Contratante / Supervisión:

CARLOS ANDRES ESTRRADA VERGARA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO SAN ANDRES DE CUERQUIA

DARINCOL SAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.SASI- 100.06.04-01-2026 DE FECHA 09/06/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO 1	PRELIMINARES	ITEM 1.01.	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehiculo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	UNIDAD	DIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO		
Via El Vergel				1	1
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				SUBTOTAL	1,00
				Vienen	
				TOTAL	**1,00**

OBSERVACIONES:

Jeisson Albeiro Trujillo A.

Ing. Jeisson Albeiro Trujillo Anturi
Residente de Obra

Visto bueno Supervisor

Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara
Secretario de Planeación e infraestructura

DARINCOL SAS


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.SASI- 100.06.04-01-2026 DE FECHA 09/06/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO 2	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ITEM 2.01	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	UNIDAD	M3



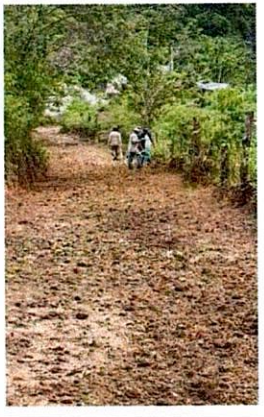

	DIMENSIONES			No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Largo	Ancho	Profundidad		
PLACA HUELLA	150	2,7	0,05	1	20,25
VIGAS RIOSTRAS	3	0,2	0,15	50	4,50
DENTELLONES	4	1,5	0,1	1	0,60
					0,00
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				SUBTOTAL	25,35
				Vienen	
				TOTAL	25,35

OBSERVACIONES:

Jeisson Albeiro Trujillo A.

Ing. Jeisson Albeiro Trujillo Anturi
Residente de Obra

Visto bueno Supervisor

Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara
Secretario de Planeación e infraestructura

DARINCOL SAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.SASI- 100.06.04-01-2026 DE FECHA 09/06/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO 2	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ITEM 2.02	Conformación de la calzada existente con bulldozer. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	UNIDAD	M2





DIMENSIONES				No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Abcisa Inicio	Abcisa Fin	Ancho	Espesor		
K00+00	K00+300	4			1200,00
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				SUBTOTAL	1200,00
				Vienen	
				TOTAL	**1200,00**

OBSERVACIONES:

Jeisson Albeiro Trujillo A.

Ing. Jeisson Albeiro Trujillo Anturi
Residente de Obra

Visto bueno Supervisor

Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara
Secretario de Planeación e infraestructura

DARINCOL SAS


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.SASI- 100.06.04-01-2026 DE FECHA 09/06/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO 2	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ITEM 2.03	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	UNIDAD	M3







DIMENSIONES				No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Abcisa Inicio	Abcisa Fin	Ancho	Espesor		
K00+00	K00+300	4	0,15		180,00
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				SUBTOTAL	180,00
				Vienen	
				TOTAL	180,00

OBSERVACIONES:

Jeisson Albeiro Trujillo A.

Ing. Jeisson Albeiro Trujillo Ahturi
Residente de Obra

Visto bueno Supervisor

Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara
Secretario de Planeación e infraestructura



DARINCOL SAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.SASI- 100.06.04-01-2026 DE FECHA 09/06/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO 2	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ITEM 2.04	Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	UNIDAD	M3



DIMENSIONES				No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Longitud		Ancho	Espesor		
Cinta huella lateral					
150		0,9	0,15	2	40,50
Dentellones					
1,5		4	0,15	1	0,90
Vigas riostras sección 20x30 cms					
Ancho	Alto	Largo			
0,20	0,3	3		50	9,00
				SUBTOTAL	50,40
				Vienen	
				TOTAL	**50,40**

OBSERVACIONES:

Jeisson Albeiro Trujillo A.

Ing. Jeisson Albeiro Trujillo Anturi
Residente de Obra

Visto bueno Supervisor

Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara
Secretario de Planeación e infraestructura

DARINCOL SAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.SASI- 100.06.04-01-2026 DE FECHA 09/06/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO 2	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ITEM 2.05	Concreto Clase G (Ciclópeo con concreto clase F - 14 MPa y Piedra de 2" a 4")	UNIDAD	M3






DIMENSIONES				No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Longitud		Ancho	Espesor		
Huellas Estándar					
150		0,9	0,15	1	20,25
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				SUBTOTAL	20,25
				Vienen	
				TOTAL	20,25

OBSERVACIONES:

Jeisson Albeiro Trujillo A.

Ing. Jeisson Albeiro Trujillo Anturi
Residente de Obra

Visto bueno Supervisor

Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara
Secretario de Planeación e infraestructura

DARINCOL SAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.SASI- 100.06.04-01-2026 DE FECHA 09/06/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO 2	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ITEM 2.06	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	KG









	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
Riostras					
Ubnicación	Longitud	No de Varillas	Peso (kg/m)	No de elementos	
Longitudinal	3	4	1	50	600
Transversal	1	25	0,25	50	312,5
Cinta huellas					
Longitudinal	165	6	1	2	1980
Transversal	0,85	500	0,25	2	212,5
				SUBTOTAL	3105,00
				Vienen	
				TOTAL	**3105,00**

OBSERVACIONES:

Jeisson Albeiro Trujillo A.

Ing. Jeisson Albeiro Trujillo Anturi
Residente de Obra

Visto bueno Supervisor

Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara
Secretario de Planeación e infraestructura

DARINCOL SAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.SASI- 100.06.04-01-2026 DE FECHA 09/06/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO 2	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ITEM 2.07	Transporte de sobrantes de demoliciones. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye30% de expansión)	UNIDAD	M3



DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
Vigas					
	Alto	Ancho	Largo		
	0,2	0,2	3,6	50	7,2
Dentellones					
	Alto	Ancho	Largo		
	0,1	4	1,5	1	0,6
				SUBTOTAL	7,80
				Vienen	
				TOTAL	7,80

Jeisson Albeiro Trujillo A.

Ing. Jeisson Albeiro Trujillo Anturi
Residente de Obra

Visto bueno Supervisor

Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara
Supervisor de obra

DARINCOL SAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.SASI- 100.06.04-01-2026 DE FECHA 09/06/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA PLACA HUELLA DE LA VÍA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO 3	CONSTRUCCIÓN CUNETAS	ITEM 3.01	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	UNIDAD	M3



DIMENSIONES				No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Cunetas					
Cant	Alto	Ancho	Largo		
2	0,15	0,53	150		23,85
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				SUBTOTAL	23,85
				Vienen	
				TOTAL	23,85

OBSERVACIONES:

Jeisson Albeiro Trujillo A.

Ing. Jeisson Albeiro Trujillo Anturi
Residente de Obra

Visto bueno Supervisor

Ing. Carlos Andrés Estrada Vergara
Supervisor de obra
