

PROGRAMACION DE OBRA - VILLA JAVIER

Id	Ubicación	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	PROYECTO	VILLA JAVIER - 104 APTOS	325,72 d	24/11/25	16/02/27
2		Inicio de obra	0 d	24/11/25	24/11/25
3	GASTOS GENERALES	Demoliciones	20 d	24/11/25	18/12/25
4	GASTOS GENERALES	Preliminares (plataforma para pilotaje)	20 d	19/12/25	30/01/26
5	TORRES	CICLO (T3-T2-T1-T6-T5-T4)	283,72 d	2/02/26	16/02/27
6	CAPITULO	PILOTAJE	46 d	2/02/26	1/04/26
7	TORRE 03	PILOTAJE	7 d	2/02/26	10/02/26
8	TORRE 03	Pilote preexcavado D=50cm	7 d	2/02/26	10/02/26
9	TORRE 02	PILOTAJE	7 d	11/02/26	19/02/26
10	TORRE 02	Pilote preexcavado D=50cm	7 d	11/02/26	19/02/26
11	TORRE 01	PILOTAJE	12 d	20/02/26	9/03/26
12	TORRE 01	Pilote preexcavado D=50cm	12 d	20/02/26	9/03/26
13	TORRE 06	PILOTAJE	5 d	10/03/26	16/03/26
14	TORRE 06	Pilote preexcavado D=50cm	5 d	10/03/26	16/03/26
15	TORRE 05	PILOTAJE	5 d	17/03/26	24/03/26
16	TORRE 05	Pilote preexcavado D=50cm	5 d	17/03/26	24/03/26
17	TORRE 04	PILOTAJE	5 d	25/03/26	1/04/26
18	TORRE 04	Pilote preexcavado D=50cm	5 d	25/03/26	1/04/26
19	CAPITULO	M. TIERRAS	26 d	6/04/26	8/05/26
20	TORRE 03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 d	6/04/26	9/04/26
21	TORRE 03	Excavacion mecanica	2 d	6/04/26	7/04/26
22	TORRE 03	Relleno recebo nivelacion	2 d	7/04/26	9/04/26
23	TORRE 02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 d	9/04/26	15/04/26
24	TORRE 02	Excavacion mecanica	2 d	9/04/26	13/04/26
25	TORRE 02	Relleno recebo nivelacion	2 d	13/04/26	15/04/26
26	TORRE 01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	6 d	15/04/26	22/04/26
27	TORRE 01	Excavacion mecanica	3 d	15/04/26	17/04/26
28	TORRE 01	Relleno recebo nivelacion	3 d	17/04/26	22/04/26
29	TORRE 06	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 d	22/04/26	28/04/26
30	TORRE 06	Excavacion mecanica	2 d	22/04/26	24/04/26
31	TORRE 06	Relleno recebo nivelacion	2 d	24/04/26	28/04/26
32	TORRE 05	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 d	28/04/26	4/05/26
33	TORRE 05	Excavacion mecanica	2 d	28/04/26	29/04/26
34	TORRE 05	Relleno recebo nivelacion	2 d	29/04/26	4/05/26
35	TORRE 04	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 d	4/05/26	8/05/26
36	TORRE 04	Excavacion mecanica	2 d	4/05/26	6/05/26
37	TORRE 04	Relleno recebo nivelacion	2 d	6/05/26	8/05/26
38	CAPITULO	EXCAVACION MANUAL REDES	24 d	8/05/26	10/06/26
39	TORRE 03	Excavacion manual redes y filtro	4 d	8/05/26	13/05/26
40	TORRE 02	Excavacion manual redes y filtro	4 d	13/05/26	20/05/26
41	TORRE 01	Excavacion manual redes y filtro	4 d	20/05/26	25/05/26
42	TORRE 06	Excavacion manual redes	4 d	25/05/26	29/05/26
43	TORRE 05	Excavacion manual redes	4 d	29/05/26	3/06/26
44	TORRE 04	Excavacion manual redes	4 d	4/06/26	10/06/26
45	CAPITULO	CIMENTACIÓN	40 d	20/05/26	13/07/26
46	TORRE 03	CIMENTACIÓN	5 d	20/05/26	26/05/26
47	TORRE 03	Concreto de limpieza	0,5 d	20/05/26	20/05/26
48	TORRE 03	Armado y fundida vigas de cimentación	2 d	20/05/26	22/05/26
49	TORRE 03	Instalaciones redes hidrosanitarias cimentación - TORRE	1 d	20/05/26	21/05/26
50	TORRE 03	Instalaciones redes eléctricas cimentación - TORRE	1 d	20/05/26	21/05/26
51	TORRE 03	Caseton	0,5 d	22/05/26	22/05/26
52	TORRE 03	Armado y fundida placa de cimentacion	2 d	25/05/26	26/05/26
53	TORRE 02	CIMENTACIÓN	5 d	27/05/26	3/06/26
54	TORRE 02	Concreto de limpieza	0,5 d	27/05/26	28/05/26
55	TORRE 02	Armado y fundida vigas de cimentación	2 d	28/05/26	29/05/26
56	TORRE 02	Instalaciones redes hidrosanitarias cimentación - TORRE	1 d	29/05/26	1/06/26
57	TORRE 02	Instalaciones redes eléctricas cimentación - TORRE	1 d	29/05/26	1/06/26
58	TORRE 02	Caseton	0,5 d	1/06/26	2/06/26
59	TORRE 02	Armado y fundida placa de cimentacion	1 d	2/06/26	3/06/26
60	TORRE 01	CIMENTACIÓN	10 d	4/06/26	18/06/26
61	TORRE 01	Concreto de limpieza	1 d	4/06/26	4/06/26
62	TORRE 01	Armado y fundida vigas de cimentación	4 d	4/06/26	11/06/26
63	TORRE 01	Instalaciones redes hidrosanitarias cimentación - TORRE	1 d	11/06/26	12/06/26
64	TORRE 01	Instalaciones redes eléctricas cimentación - TORRE	1 d	11/06/26	12/06/26
65	TORRE 01	Caseton	1 d	12/06/26	16/06/26
66	TORRE 01	Armado y fundida placa de cimentacion	3 d	16/06/26	18/06/26
67	TORRE 06	CIMENTACIÓN	5 d	19/06/26	26/06/26
68	TORRE 06	Concreto de limpieza	0,5 d	19/06/26	22/06/26
69	TORRE 06	Armado y fundida vigas de cimentación	2 d	22/06/26	23/06/26
70	TORRE 06	Instalaciones redes hidrosanitarias cimentación - TORRE	1 d	24/06/26	24/06/26
71	TORRE 06	Instalaciones redes eléctricas cimentación - TORRE	1 d	24/06/26	24/06/26
72	TORRE 06	Caseton	0,5 d	24/06/26	25/06/26
73	TORRE 06	Armado y fundida placa de cimentacion	1 d	25/06/26	26/06/26
74	TORRE 05	CIMENTACIÓN	5 d	30/06/26	6/07/26
75	TORRE 05	Concreto de limpieza	0,5 d	30/06/26	30/06/26
76	TORRE 05	Armado y fundida vigas de cimentación	2 d	30/06/26	2/07/26
77	TORRE 05	Instalaciones redes hidrosanitarias cimentación - TORRE	1 d	2/07/26	3/07/26
78	TORRE 05	Instalaciones redes eléctricas cimentación - TORRE	1 d	2/07/26	3/07/26
79	TORRE 05	Caseton	0,5 d	3/07/26	3/07/26
80	TORRE 05	Armado y fundida placa de cimentacion	1 d	3/07/26	6/07/26
81	TORRE 04	CIMENTACIÓN	5 d	7/07/26	13/07/26
82	TORRE 04	Concreto de limpieza	0,5 d	7/07/26	7/07/26
83	TORRE 04	Armado y fundida vigas de cimentación	2 d	7/07/26	9/07/26
84	TORRE 04	Instalaciones redes hidrosanitarias cimentación - TORRE	1 d	9/07/26	10/07/26
85	TORRE 04	Instalaciones redes eléctricas cimentación - TORRE	1 d	9/07/26	10/07/26
86	TORRE 04	Caseton	0,5 d	10/07/26	10/07/26
87	TORRE 04	Armado y fundida placa de cimentacion	1 d	13/07/26	13/07/26
88	CAPITULO	MURO CONTENCION	34,92 d	20/05/26	7/07/26
89	TORRE 03	MURO CONTENCION SISTEMA TRINCHERAS TORRE 3	11,92 d	20/05/26	4/06/26
90	TORRE 03	Excavacion manual trincheras	8 d	20/05/26	29/05/26
91	TORRE 03	Armado y fundida muro de contencion	8 d	26/05/26	4/06/26
92	TORRE 02	MURO CONTENCION SISTEMA TRINCHERAS TORRE 2	10 d	5/06/26	22/06/26
93	TORRE 02	Excavacion manual trincheras	8 d	5/06/26	18/06/26
94	TORRE 02	Armado y fundida muro de contencion	8 d	10/06/26	22/06/26
95	TORRE 01	MURO CONTENCION SISTEMA TRINCHERAS TORRE 1	11 d	23/06/26	7/07/26
96	TORRE 01	Excavacion manual trincheras	9 d	23/06/26	6/07/26
97	TORRE 01	Armado y fundida muro de contencion	9 d	24/06/26	7/07/26
98	CAPITULO	PANTALLAS SEMISÓTANO	18,42 d	27/05/26	23/06/26
99	TORRE 03	Pantallas - SEMISÓTANO SS1	1,42 d	27/05/26	28/05/26
100	TORRE 02	Pantallas - SEMISÓTANO SS1	1,42 d	4/06/26	5/06/26
101	TORRE 01	Pantallas - SEMISÓTANO SS1	1,42 d	19/06/26	23/06/26
102	CAPITULO	ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA	69,8 d	7/07/26	6/10/26
103		Pantallas P1 a P4, son 24 fundidas / (3.2 fundidas x semana) = 7,5 semanas	45,2 d	7/07/26	4/09/26
104	TORRE 06	Pantallas - PISO 1	1,5 d	7/07/26	9/07/26
105	TORRE 05	Pantallas - PISO 1	1,5 d	9/07/26	10/07/26

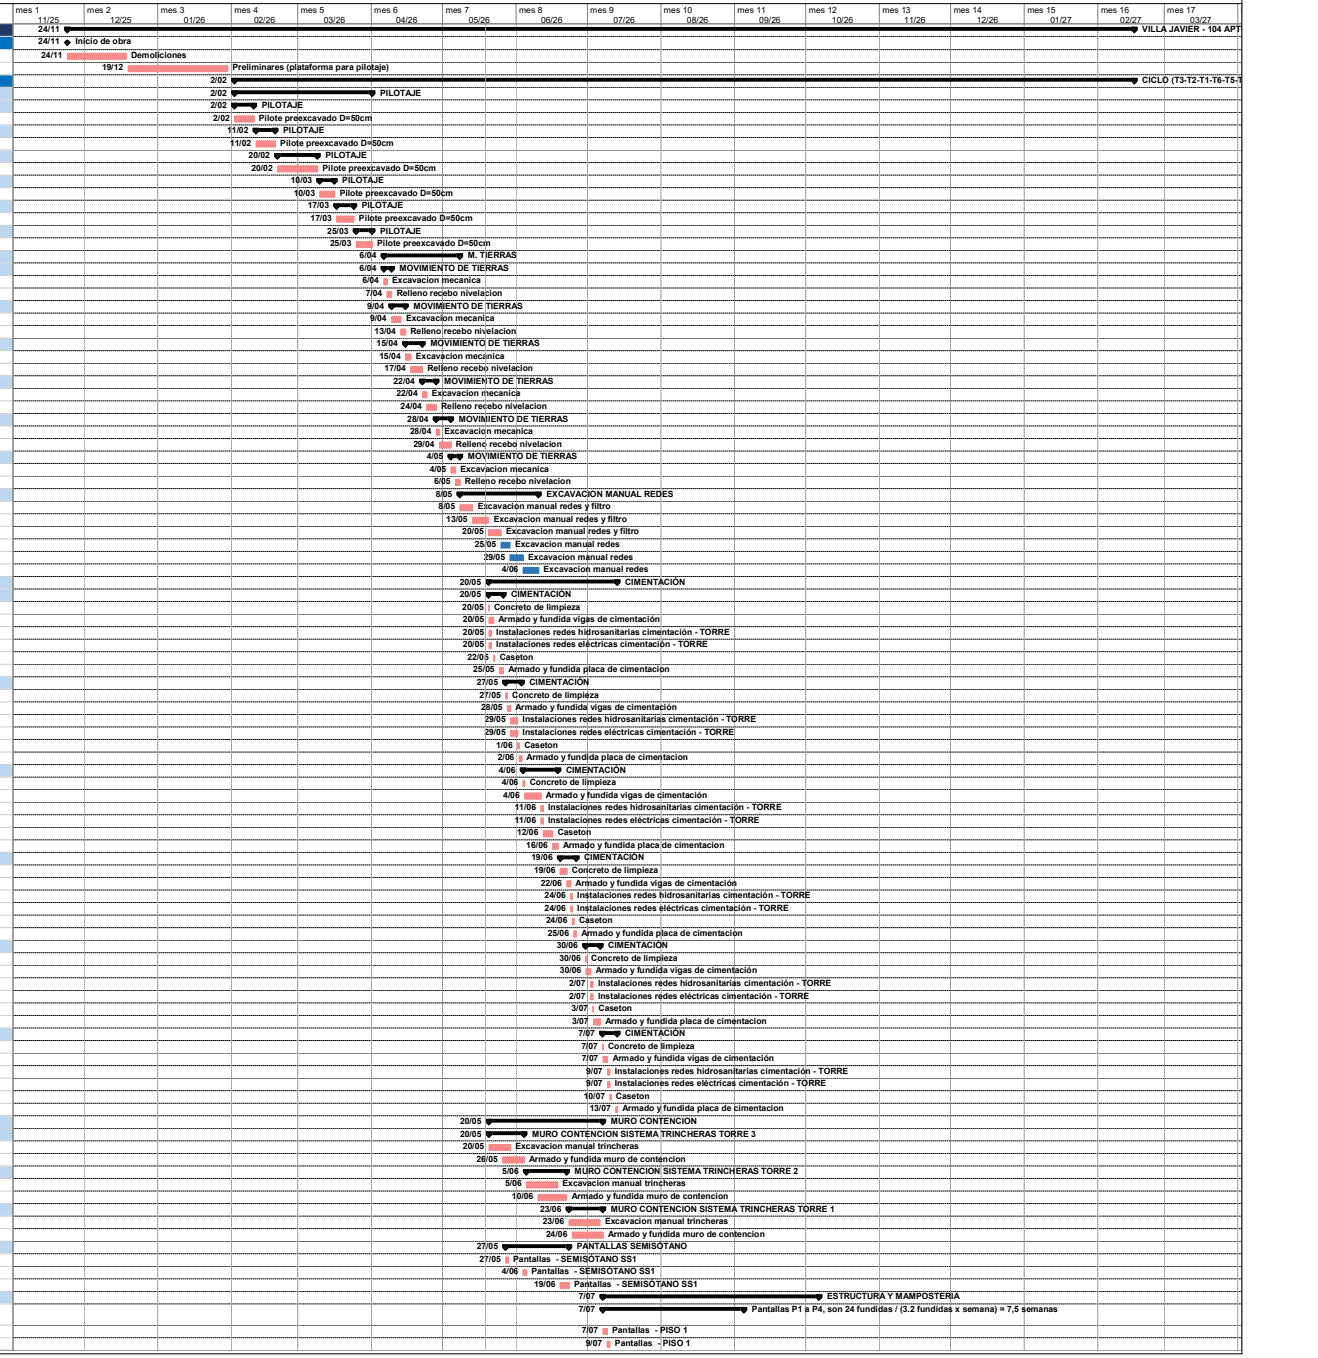


PROGRAMACION DE OBRA - VILLA JAVIER

Id	Ubicación	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
106	TORRE 04	Pantallas - PISO 1	1,5 d	14/07/26	16/07/26
107	TORRE 03	Pantallas - PISO 1	1,5 d	17/07/26	21/07/26
108	TORRE 02	Pantallas - PISO 1	1,5 d	21/07/26	23/07/26
109	TORRE 01	Pantallas - PISO 1	1,7 d	23/07/26	27/07/26
110	TORRE 06	Pantallas - PISO 2	1,5 d	27/07/26	28/07/26
111	TORRE 05	Pantallas - PISO 2	1,5 d	28/07/26	29/07/26
112	TORRE 04	Pantallas - PISO 2	1,5 d	30/07/26	3/08/26
113	TORRE 03	Pantallas - PISO 2	1,5 d	3/08/26	4/08/26
114	TORRE 02	Pantallas - PISO 2	1,5 d	4/08/26	6/08/26
115	TORRE 01	Pantallas - PISO 2	1,7 d	6/08/26	11/08/26
116	TORRE 06	Pantallas - PISO 3	1,5 d	11/08/26	12/08/26
117	TORRE 05	Pantallas - PISO 3	1,5 d	12/08/26	13/08/26
118	TORRE 04	Pantallas - PISO 3	1,5 d	13/08/26	18/08/26
119	TORRE 03	Pantallas - PISO 3	1,5 d	18/08/26	19/08/26
120	TORRE 02	Pantallas - PISO 3	1,5 d	19/08/26	21/08/26
121	TORRE 01	Pantallas - PISO 3	1,7 d	21/08/26	25/08/26
122	TORRE 06	Pantallas - PISO 4	1,5 d	25/08/26	26/08/26
123	TORRE 05	Pantallas - PISO 4	1,5 d	26/08/26	27/08/26
124	TORRE 04	Pantallas - PISO 4	1,5 d	27/08/26	31/08/26
125	TORRE 03	Pantallas - PISO 4	1,5 d	31/08/26	1/09/26
126	TORRE 02	Pantallas - PISO 4	1,5 d	1/09/26	3/09/26
127	TORRE 01	Pantallas - PISO 4	1,7 d	3/09/26	4/09/26
128		**Mamposteria SS1 a P4, son 27 armadas / (3.2 armadas x semana) = 8,5 semanas**	**47 d**	**10/07/26**	**10/09/26**
129	TORRE 03	Mamposteria fachada e interiores - SEMISÓTANO SS1	2 d	10/07/26	13/07/26
130	TORRE 02	Mamposteria fachada e interiores - SEMISÓTANO SS1	2 d	13/07/26	15/07/26
131	TORRE 01	Mamposteria fachada e interiores - SEMISÓTANO SS1	3 d	15/07/26	21/07/26
132	TORRE 06	Mamposteria fachada e interiores - PISO 1	1,6 d	21/07/26	22/07/26
133	TORRE 05	Mamposteria fachada e interiores - PISO 1	1,6 d	22/07/26	24/07/26
134	TORRE 04	Mamposteria fachada e interiores - PISO 1	1,6 d	24/07/26	27/07/26
135	TORRE 03	Mamposteria fachada e interiores - PISO 1	1,6 d	27/07/26	28/07/26
136	TORRE 02	Mamposteria fachada e interiores - PISO 1	1,6 d	28/07/26	30/07/26
137	TORRE 01	Mamposteria fachada e interiores - PISO 1	2 d	30/07/26	3/08/26
138	TORRE 06	Mamposteria fachada e interiores - PISO 2	1,6 d	3/08/26	4/08/26
139	TORRE 05	Mamposteria fachada e interiores - PISO 2	1,6 d	4/08/26	5/08/26
140	TORRE 04	Mamposteria fachada e interiores - PISO 2	1,6 d	5/08/26	10/08/26
141	TORRE 03	Mamposteria fachada e interiores - PISO 2	1,6 d	10/08/26	11/08/26
142	TORRE 02	Mamposteria fachada e interiores - PISO 2	1,6 d	11/08/26	13/08/26
143	TORRE 01	Mamposteria fachada e interiores - PISO 2	2 d	13/08/26	18/08/26
144	TORRE 06	Mamposteria fachada e interiores - PISO 3	1,6 d	18/08/26	19/08/26
145	TORRE 05	Mamposteria fachada e interiores - PISO 3	1,6 d	19/08/26	20/08/26
146	TORRE 04	Mamposteria fachada e interiores - PISO 3	1,6 d	20/08/26	24/08/26
147	TORRE 03	Mamposteria fachada e interiores - PISO 3	1,6 d	24/08/26	25/08/26
148	TORRE 02	Mamposteria fachada e interiores - PISO 3	1,6 d	25/08/26	27/08/26
149	TORRE 01	Mamposteria fachada e interiores - PISO 3	2 d	27/08/26	28/08/26
150	TORRE 06	Mamposteria fachada e interiores - PISO 4	1,6 d	28/08/26	1/09/26
151	TORRE 05	Mamposteria fachada e interiores - PISO 4	1,6 d	1/09/26	2/09/26
152	TORRE 04	Mamposteria fachada e interiores - PISO 4	1,6 d	2/09/26	4/09/26
153	TORRE 03	Mamposteria fachada e interiores - PISO 4	1,6 d	4/09/26	7/09/26
154	TORRE 02	Mamposteria fachada e interiores - PISO 4	1,6 d	7/09/26	9/09/26
155	TORRE 01	Mamposteria fachada e interiores - PISO 4	2 d	9/09/26	10/09/26
156		**Placas entrepiso son 27 fundidas / (3.2 fundidas x semana) = 8,5 semanas**	**46,4 d**	**16/07/26**	**16/09/26**
157	TORRE 03	Armado y fundida placa - PISO 1	1,6 d	16/07/26	17/07/26
158	TORRE 02	Armado y fundida placa - PISO 1	1,6 d	17/07/26	21/07/26
159	TORRE 01	Armado y fundida placa - PISO 1	2 d	21/07/26	23/07/26
160	TORRE 06	Armado y fundida placa - PISO 2	1,6 d	23/07/26	27/07/26
161	TORRE 05	Armado y fundida placa - PISO 2	1,6 d	27/07/26	28/07/26
162	TORRE 04	Armado y fundida placa - PISO 2	1,6 d	29/07/26	30/07/26
163	TORRE 03	Armado y fundida placa - PISO 2	1,6 d	30/07/26	3/08/26
164	TORRE 02	Armado y fundida placa - PISO 2	1,6 d	3/08/26	4/08/26
165	TORRE 01	Armado y fundida placa - PISO 2	2 d	4/08/26	6/08/26
166	TORRE 06	Armado y fundida placa - PISO 3	1,6 d	6/08/26	11/08/26
167	TORRE 05	Armado y fundida placa - PISO 3	1,6 d	11/08/26	12/08/26
168	TORRE 04	Armado y fundida placa - PISO 3	1,6 d	12/08/26	13/08/26
169	TORRE 03	Armado y fundida placa - PISO 3	1,6 d	13/08/26	18/08/26
170	TORRE 02	Armado y fundida placa - PISO 3	1,6 d	18/08/26	19/08/26
171	TORRE 01	Armado y fundida placa - PISO 3	2 d	19/08/26	21/08/26
172	TORRE 06	Armado y fundida placa - PISO 4	1,6 d	21/08/26	25/08/26
173	TORRE 05	Armado y fundida placa - PISO 4	1,6 d	25/08/26	26/08/26
174	TORRE 04	Armado y fundida placa - PISO 4	1,6 d	26/08/26	27/08/26
175	TORRE 03	Armado y fundida placa - PISO 4	1,6 d	27/08/26	31/08/26
176	TORRE 02	Armado y fundida placa - PISO 4	1,6 d	31/08/26	1/09/26
177	TORRE 01	Armado y fundida placa - PISO 4	2 d	1/09/26	3/09/26
178	TORRE 06	Armado y fundida placa - CUBIERTA	1,6 d	3/09/26	4/09/26
179	TORRE 05	Armado y fundida placa - CUBIERTA	1,6 d	4/09/26	8/09/26
180	TORRE 04	Armado y fundida placa - CUBIERTA	1,6 d	8/09/26	9/09/26
181	TORRE 03	Armado y fundida placa - CUBIERTA	1,6 d	9/09/26	11/09/26
182	TORRE 02	Armado y fundida placa - CUBIERTA	1,6 d	11/09/26	14/09/26
183	TORRE 01	Armado y fundida placa - CUBIERTA	2 d	14/09/26	16/09/26
184		**Dovelas SS1 a Cub, son 33 fundidas / (3.2 fundidas x semana) = 10,3 semanas**	**57,8 d**	**13/07/26**	**28/09/26**
185	TORRE 03	Dovelas - SEMISÓTANO SS1	1,6 d	13/07/26	15/07/26
186	TORRE 02	Dovelas - SEMISÓTANO SS1	1,6 d	15/07/26	16/07/26
187	TORRE 01	Dovelas - SEMISÓTANO SS1	2 d	16/07/26	21/07/26
188	TORRE 06	Dovelas - PISO 1	1,6 d	22/07/26	23/07/26
189	TORRE 05	Dovelas - PISO 1	1,6 d	23/07/26	24/07/26
190	TORRE 04	Dovelas - PISO 1	1,6 d	27/07/26	29/07/26
191	TORRE 03	Dovelas - PISO 1	1,6 d	29/07/26	30/07/26
192	TORRE 02	Dovelas - PISO 1	1,6 d	30/07/26	3/08/26
193	TORRE 01	Dovelas - PISO 1	2 d	3/08/26	4/08/26
194	TORRE 06	Dovelas - PISO 2	1,6 d	4/08/26	6/08/26
195	TORRE 05	Dovelas - PISO 2	1,6 d	6/08/26	10/08/26
196	TORRE 04	Dovelas - PISO 2	1,6 d	10/08/26	12/08/26
197	TORRE 03	Dovelas - PISO 2	1,6 d	12/08/26	13/08/26
198	TORRE 02	Dovelas - PISO 2	1,6 d	13/08/26	18/08/26
199	TORRE 01	Dovelas - PISO 2	2 d	18/08/26	19/08/26
200	TORRE 06	Dovelas - PISO 3	1,6 d	19/08/26	21/08/26
201	TORRE 05	Dovelas - PISO 3	1,6 d	21/08/26	24/08/26
202	TORRE 04	Dovelas - PISO 3	1,6 d	24/08/26	26/08/26
203	TORRE 03	Dovelas - PISO 3	1,6 d	26/08/26	27/08/26
204	TORRE 02	Dovelas - PISO 3	1,6 d	27/08/26	28/08/26
205	TORRE 01	Dovelas - PISO 3	2 d	28/08/26	1/09/26
206	TORRE 06	Dovelas - PISO 4	1,6 d	1/09/26	3/09/26
207	TORRE 05	Dovelas - PISO 4	1,6 d	3/09/26	4/09/26
208	TORRE 04	Dovelas - PISO 4	1,6 d	4/09/26	7/09/26

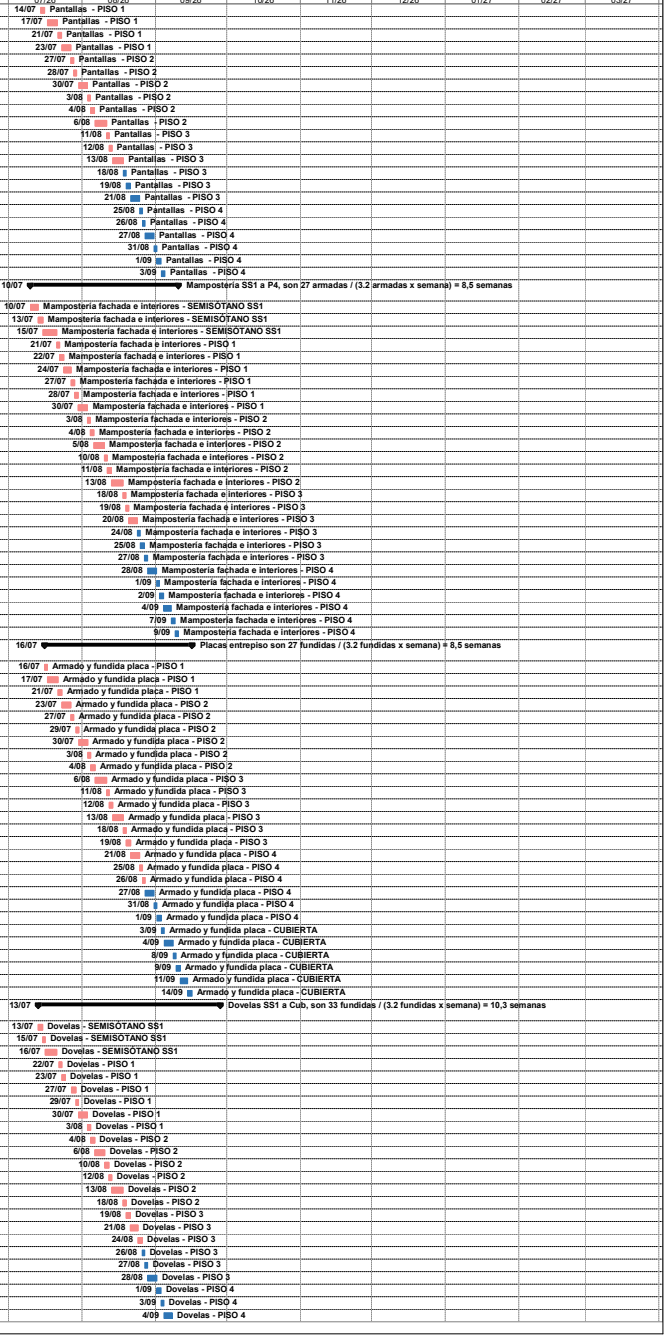


PROGRAMACION DE OBRA - VILLA JAVIER

Id	Ubicación	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
209	TORRE 03	Dovelas - PISO 4	1,6 d	7/09/26	9/09/26
210	TORRE 02	Dovelas - PISO 4	1,6 d	9/09/26	10/09/26
211	TORRE 01	Dovelas - PISO 4	2 d	10/09/26	14/09/26
212	TORRE 03	Dovelas - CUBIERTA	1 d	14/09/26	15/09/26
213	TORRE 02	Dovelas - CUBIERTA	1 d	15/09/26	16/09/26
214	TORRE 01	Dovelas - CUBIERTA	1,5 d	17/09/26	21/09/26
215	TORRE 06	Dovelas - CUBIERTA	1 d	21/09/26	22/09/26
216	TORRE 05	Dovelas - CUBIERTA	1 d	23/09/26	24/09/26
217	TORRE 04	Dovelas - CUBIERTA	1 d	25/09/26	28/09/26
218		**Escaleras**	**35,8 d**	**21/07/26**	**7/09/26**
219	TORRE 03	Armado y fundida escalera - SEMISÓTANO SS1	1 d	21/07/26	22/07/26
220	TORRE 02	Armado y fundida escalera - SEMISÓTANO SS1	1 d	22/07/26	23/07/26
221	TORRE 01	Armado y fundida escalera - SEMISÓTANO SS1	1 d	24/07/26	27/07/26
222	TORRE 06	Armado y fundida escalera - PISO 1	1 d	28/07/26	28/07/26
223	TORRE 05	Armado y fundida escalera - PISO 1	1 d	29/07/26	30/07/26
224	TORRE 04	Armado y fundida escalera - PISO 1	1 d	31/07/26	3/08/26
225	TORRE 03	Armado y fundida escalera - PISO 1	1 d	4/08/26	5/08/26
226	TORRE 02	Armado y fundida escalera - PISO 1	1 d	5/08/26	6/08/26
227	TORRE 01	Armado y fundida escalera - PISO 1	1 d	10/08/26	11/08/26
228	TORRE 06	Armado y fundida escalera - PISO 2	1 d	12/08/26	12/08/26
229	TORRE 05	Armado y fundida escalera - PISO 2	1 d	13/08/26	14/08/26
230	TORRE 04	Armado y fundida escalera - PISO 2	1 d	14/08/26	18/08/26
231	TORRE 03	Armado y fundida escalera - PISO 2	1 d	19/08/26	20/08/26
232	TORRE 02	Armado y fundida escalera - PISO 2	1 d	20/08/26	21/08/26
233	TORRE 01	Armado y fundida escalera - PISO 2	1 d	24/08/26	25/08/26
234	TORRE 06	Armado y fundida escalera - PISO 3	1 d	25/08/26	26/08/26
235	TORRE 05	Armado y fundida escalera - PISO 3	1 d	27/08/26	28/08/26
236	TORRE 04	Armado y fundida escalera - PISO 3	1 d	28/08/26	31/08/26
237	TORRE 03	Armado y fundida escalera - PISO 3	1 d	1/09/26	2/09/26
238	TORRE 02	Armado y fundida escalera - PISO 3	1 d	2/09/26	3/09/26
239	TORRE 01	Armado y fundida escalera - PISO 3	1 d	4/09/26	7/09/26
240		**Antepechos y vigas cubierta**	**21,5 d**	**9/09/26**	**6/10/26**
241	TORRE 03	Antepecho de cubierta - CUBIERTA	2 d	9/09/26	11/09/26
242	TORRE 02	Antepecho de cubierta - CUBIERTA	2 d	11/09/26	15/09/26
243	TORRE 01	Antepecho de cubierta - CUBIERTA	3 d	15/09/26	17/09/26
244	TORRE 06	Antepecho de cubierta - CUBIERTA	2 d	17/09/26	21/09/26
245	TORRE 05	Antepecho de cubierta - CUBIERTA	2 d	21/09/26	23/09/26
246	TORRE 04	Antepecho de cubierta - CUBIERTA	2 d	23/09/26	25/09/26
247	TORRE 03	Vigas de cubierta - CUBIERTA	1 d	15/09/26	16/09/26
248	TORRE 02	Vigas de cubierta - CUBIERTA	1 d	16/09/26	17/09/26
249	TORRE 01	Vigas de cubierta - CUBIERTA	2 d	21/09/26	23/09/26
250	TORRE 06	Vigas de cubierta - CUBIERTA	1 d	23/09/26	23/09/26
251	TORRE 05	Vigas de cubierta - CUBIERTA	1 d	24/09/26	25/09/26
252	TORRE 04	Vigas de cubierta - CUBIERTA	1 d	28/09/26	29/09/26
253	TORRE 03	Viga canchada - CUBIERTA	1 d	29/09/26	29/09/26
254	TORRE 02	Viga canchada - CUBIERTA	1 d	29/09/26	30/09/26
255	TORRE 01	Viga canchada - CUBIERTA	1,5 d	30/09/26	2/10/26
256	TORRE 06	Viga canchada - CUBIERTA	1 d	2/10/26	5/10/26
257	TORRE 05	Viga canchada - CUBIERTA	1 d	5/10/26	5/10/26
258	TORRE 04	Viga canchada - CUBIERTA	1 d	5/10/26	6/10/26
259	**CAPITULO**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**61,6 d**	**10/07/26**	**29/09/26**
260	TORRE 03	Instalaciones hidrosanitarias - TORRE	52 d	10/07/26	17/09/26
261	TORRE 02	Instalaciones hidrosanitarias - TORRE	51 d	13/07/26	18/09/26
262	TORRE 01	Instalaciones hidrosanitarias - TORRE	52 d	15/07/26	22/09/26
263	TORRE 06	Instalaciones hidrosanitarias - TORRE	53 d	21/07/26	28/09/26
264	TORRE 05	Instalaciones hidrosanitarias - TORRE	53 d	22/07/26	29/09/26
265	TORRE 04	Instalaciones hidrosanitarias - TORRE	50 d	24/07/26	28/09/26
266	**CAPITULO**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**61,6 d**	**10/07/26**	**29/09/26**
267	TORRE 03	Instalaciones eléctricas - TORRE	52 d	10/07/26	17/09/26
268	TORRE 02	Instalaciones eléctricas - TORRE	51 d	13/07/26	18/09/26
269	TORRE 01	Instalaciones eléctricas - TORRE	52 d	15/07/26	22/09/26
270	TORRE 06	Instalaciones eléctricas - TORRE	53 d	21/07/26	28/09/26
271	TORRE 05	Instalaciones eléctricas - TORRE	53 d	22/07/26	29/09/26
272	TORRE 04	Instalaciones eléctricas - TORRE	50 d	24/07/26	28/09/26
273	**CAPITULO**	**PAÑETES**	**43,5 d**	**4/08/26**	**30/09/26**
274	**CAPITULO**	**REMATES**	**41 d**	**4/08/26**	**28/09/26**
275	TORRE 03	Remates - SEMISÓTANO SS1	1 d	4/08/26	5/08/26
276	TORRE 02	Remates - SEMISÓTANO SS1	1 d	19/08/26	20/08/26
277	TORRE 01	Remates - SEMISÓTANO SS1	1,5 d	21/08/26	24/08/26
278	TORRE 06	Remates - PISO 1	1 d	25/08/26	25/08/26
279	TORRE 05	Remates - PISO 1	1 d	26/08/26	27/08/26
280	TORRE 04	Remates - PISO 1	1 d	27/08/26	28/08/26
281	TORRE 03	Remates - PISO 1	1 d	28/08/26	31/08/26
282	TORRE 02	Remates - PISO 1	1 d	31/08/26	1/09/26
283	TORRE 01	Remates - PISO 1	1,5 d	1/09/26	2/09/26
284	TORRE 06	Remates - PISO 2	1 d	2/09/26	3/09/26
285	TORRE 05	Remates - PISO 2	1 d	3/09/26	4/09/26
286	TORRE 04	Remates - PISO 2	1 d	4/09/26	7/09/26
287	TORRE 03	Remates - PISO 2	1 d	7/09/26	8/09/26
288	TORRE 02	Remates - PISO 2	1 d	8/09/26	9/09/26
289	TORRE 01	Remates - PISO 2	1,5 d	9/09/26	10/09/26
290	TORRE 06	Remates - PISO 3	1 d	10/09/26	11/09/26
291	TORRE 05	Remates - PISO 3	1 d	11/09/26	14/09/26
292	TORRE 04	Remates - PISO 3	1 d	14/09/26	15/09/26
293	TORRE 03	Remates - PISO 3	1 d	15/09/26	16/09/26
294	TORRE 02	Remates - PISO 3	1 d	16/09/26	17/09/26
295	TORRE 01	Remates - PISO 3	1,5 d	17/09/26	18/09/26
296	TORRE 06	Remates - PISO 4	1 d	18/09/26	21/09/26
297	TORRE 05	Remates - PISO 4	1 d	21/09/26	22/09/26
298	TORRE 04	Remates - PISO 4	1 d	22/09/26	23/09/26
299	TORRE 03	Remates - PISO 4	1 d	23/09/26	23/09/26
300	TORRE 02	Remates - PISO 4	1 d	23/09/26	24/09/26
301	TORRE 01	Remates - PISO 4	1,5 d	24/09/26	28/09/26
302	**CAPITULO**	**PAÑETES**	**41,5 d**	**6/08/26**	**30/09/26**
303	TORRE 03	Pañetes muros - SEMISÓTANO SS1	1 d	6/08/26	10/08/26
304	TORRE 02	Pañetes muros - SEMISÓTANO SS1	1 d	21/08/26	24/08/26
305	TORRE 01	Pañetes muros - SEMISÓTANO SS1	1,5 d	25/08/26	27/08/26
306	TORRE 06	Pañetes muros baño - PISO 1	1 d	27/08/26	28/08/26
307	TORRE 05	Pañetes muros baño - PISO 1	1 d	28/08/26	31/08/26
308	TORRE 04	Pañetes muros baño - PISO 1	1 d	31/08/26	1/09/26
309	TORRE 03	Pañetes muros baño - PISO 1	1 d	1/09/26	2/09/26
310	TORRE 02	Pañetes muros baño - PISO 1	1 d	2/09/26	3/09/26
311	TORRE 01	Pañetes muros baño - PISO 1	1,5 d	3/09/26	7/09/26
312	TORRE 06	Pañetes muros baño - PISO 2	1 d	7/09/26	7/09/26
313	TORRE 05	Pañetes muros baño - PISO 2	1 d	7/09/26	8/09/26
314	TORRE 04	Pañetes muros baño - PISO 2	1 d	8/09/26	9/09/26

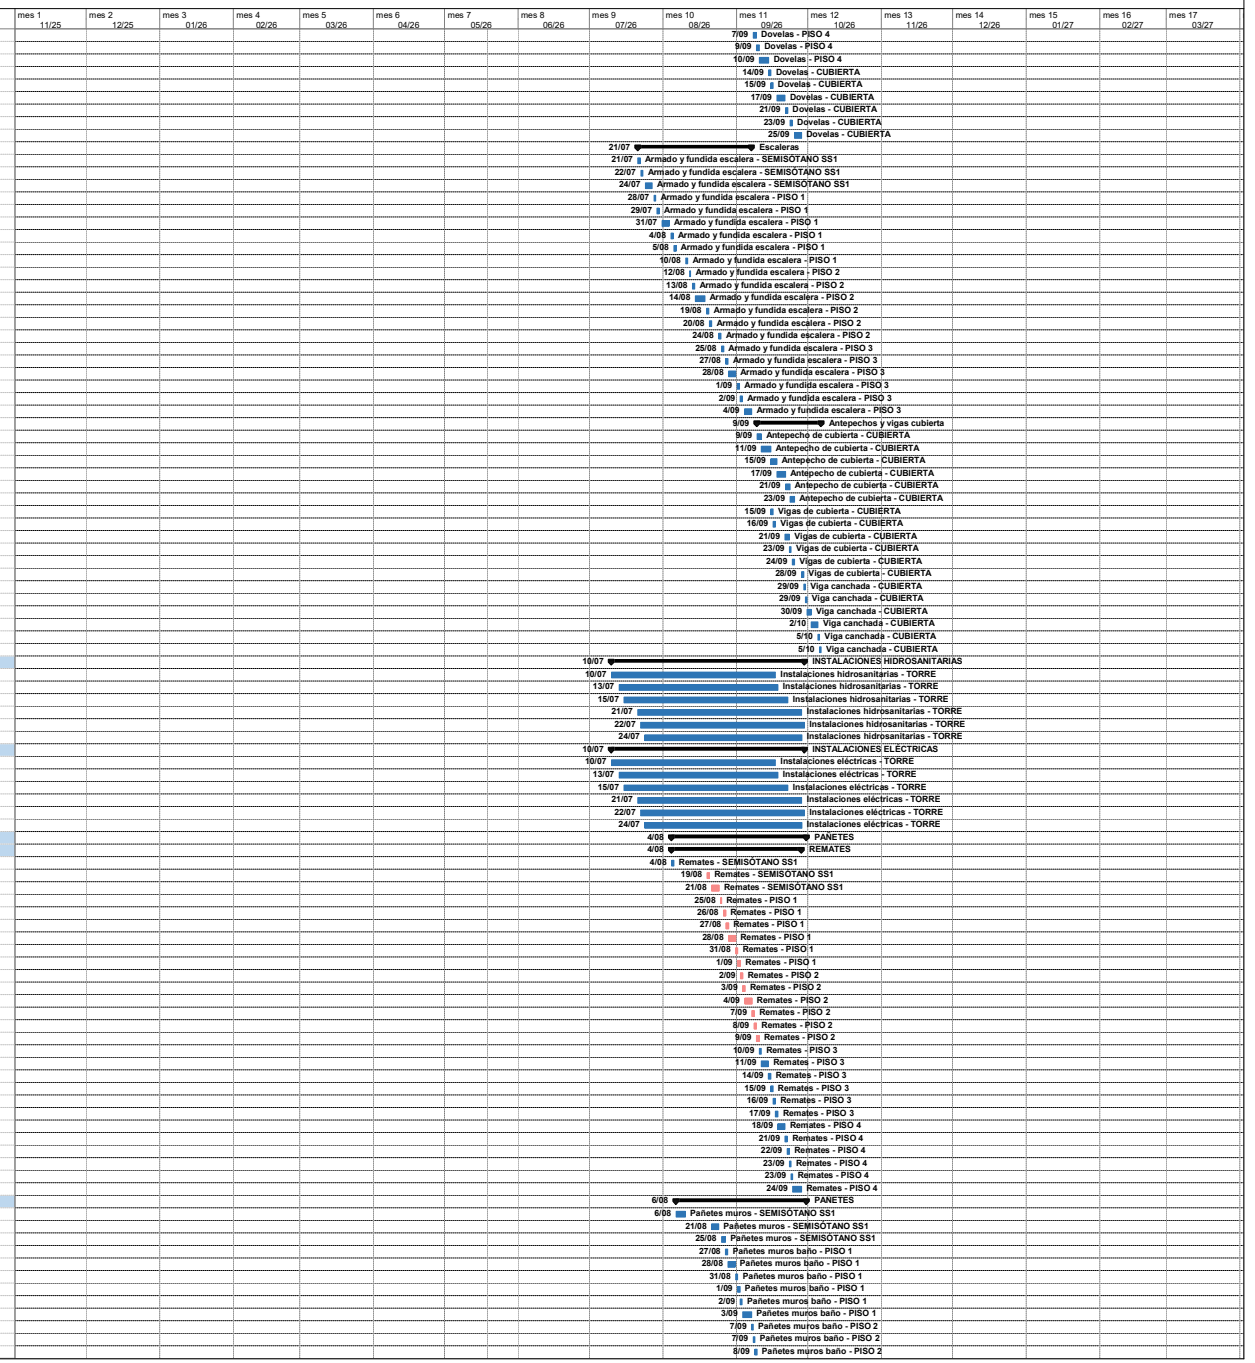


PROGRAMACION DE OBRA - VILLA JAVIER

Id	Ubicación	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
315	TORRE 03	Pañetes muros baño - PISO 2	1 d	9/09/26	10/09/26
316	TORRE 02	Pañetes muros baño - PISO 2	1 d	10/09/26	11/09/26
317	TORRE 01	Pañetes muros baño - PISO 2	1,5 d	11/09/26	14/09/26
318	TORRE 06	Pañetes muros baño - PISO 3	1 d	14/09/26	15/09/26
319	TORRE 05	Pañetes muros baño - PISO 3	1 d	15/09/26	16/09/26
320	TORRE 04	Pañetes muros baño - PISO 3	1 d	16/09/26	17/09/26
321	TORRE 03	Pañetes muros baño - PISO 3	1 d	17/09/26	18/09/26
322	TORRE 02	Pañetes muros baño - PISO 3	1 d	18/09/26	21/09/26
323	TORRE 01	Pañetes muros baño - PISO 3	1,5 d	21/09/26	22/09/26
324	TORRE 06	Pañetes muros baño - PISO 4	1 d	22/09/26	23/09/26
325	TORRE 05	Pañetes muros baño - PISO 4	1 d	23/09/26	24/09/26
326	TORRE 04	Pañetes muros baño - PISO 4	1 d	24/09/26	25/09/26
327	TORRE 03	Pañetes muros baño - PISO 4	1 d	25/09/26	28/09/26
328	TORRE 02	Pañetes muros baño - PISO 4	1 d	28/09/26	29/09/26
329	TORRE 01	Pañetes muros baño - PISO 4	1,5 d	29/09/26	30/09/26
330	**CAPITULO**	**REJILLAS DUCTOS CUBIERTA**	**6,5 d**	**29/09/26**	**7/10/26**
331	TORRE 03	Rejillas y tapas ductos cubierta	1 d	29/09/26	30/09/26
332	TORRE 02	Rejillas y tapas ductos cubierta	1 d	30/09/26	1/10/26
333	TORRE 01	Rejillas y tapas ductos cubierta	1 d	2/10/26	5/10/26
334	TORRE 06	Rejillas y tapas ductos cubierta	1 d	5/10/26	5/10/26
335	TORRE 05	Rejillas y tapas ductos cubierta	1 d	5/10/26	6/10/26
336	TORRE 04	Rejillas y tapas ductos cubierta	1 d	6/10/26	7/10/26
337	**CAPITULO**	**PINTURA Y CIELO RASOS**	**96,5 d**	**18/08/26**	**22/12/26**
338		**Caraplast bajo placa**	**87,5 d**	**18/08/26**	**10/12/26**
339	TORRE 03	Caraplast bajo placa - SEMISÓTANO SS1	2 d	18/08/26	20/08/26
340	TORRE 02	Caraplast bajo placa - SEMISÓTANO SS1	2 d	20/08/26	24/08/26
341	TORRE 01	Caraplast bajo placa - SEMISÓTANO SS1	3 d	24/08/26	27/08/26
342	TORRE 06	Caraplast bajo placa - PISO 1	2 d	27/08/26	31/08/26
343	TORRE 05	Caraplast bajo placa - PISO 1	2 d	31/08/26	2/09/26
344	TORRE 04	Caraplast bajo placa - PISO 1	2 d	2/09/26	3/09/26
345	TORRE 03	Caraplast bajo placa - PISO 1	2 d	3/09/26	7/09/26
346	TORRE 02	Caraplast bajo placa - PISO 1	2 d	7/09/26	9/09/26
347	TORRE 01	Caraplast bajo placa - PISO 1	3 d	9/09/26	14/09/26
348	TORRE 06	Caraplast bajo placa - PISO 2	2 d	14/09/26	15/09/26
349	TORRE 05	Caraplast bajo placa - PISO 2	2 d	15/09/26	17/09/26
350	TORRE 04	Caraplast bajo placa - PISO 2	2 d	17/09/26	21/09/26
351	TORRE 03	Caraplast bajo placa - PISO 2	2 d	21/09/26	23/09/26
352	TORRE 02	Caraplast bajo placa - PISO 2	2 d	23/09/26	25/09/26
353	TORRE 01	Caraplast bajo placa - PISO 2	3 d	25/09/26	29/09/26
354	TORRE 06	Caraplast bajo placa - PISO 3	2 d	29/09/26	1/10/26
355	TORRE 05	Caraplast bajo placa - PISO 3	2 d	1/10/26	5/10/26
356	TORRE 04	Caraplast bajo placa - PISO 3	2 d	5/10/26	7/10/26
357	TORRE 03	Caraplast bajo placa - PISO 3	2 d	7/10/26	8/10/26
358	TORRE 02	Caraplast bajo placa - PISO 3	2 d	8/10/26	13/10/26
359	TORRE 01	Caraplast bajo placa - PISO 3	3 d	19/11/26	23/11/26
360	TORRE 06	Caraplast bajo placa - PISO 4	2 d	23/11/26	25/11/26
361	TORRE 05	Caraplast bajo placa - PISO 4	2 d	25/11/26	27/11/26
362	TORRE 04	Caraplast bajo placa - PISO 4	2 d	27/11/26	1/12/26
363	TORRE 03	Caraplast bajo placa - PISO 4	2 d	1/12/26	3/12/26
364	TORRE 02	Caraplast bajo placa - PISO 4	2 d	3/12/26	4/12/26
365	TORRE 01	Caraplast bajo placa - PISO 4	3 d	4/12/26	10/12/26
366		**Empaste y pintura interior**	**57,5 d**	**24/09/26**	**10/12/26**
367	TORRE 03	Empaste y pintura interior - SEMISÓTANO SS1	2 d	24/09/26	28/09/26
368	TORRE 02	Empaste y pintura interior - SEMISÓTANO SS1	2 d	28/09/26	29/09/26
369	TORRE 01	Empaste y pintura interior - SEMISÓTANO SS1	3 d	30/09/26	5/10/26
370	TORRE 06	Empaste y pintura interior - PISO 1	2 d	5/10/26	6/10/26
371	TORRE 05	Empaste y pintura interior - PISO 1	2 d	5/10/26	7/10/26
372	TORRE 04	Empaste y pintura interior - PISO 1	2 d	7/10/26	9/10/26
373	TORRE 03	Empaste y pintura interior - PISO 1	2 d	9/10/26	14/10/26
374	TORRE 02	Empaste y pintura interior - PISO 1	2 d	9/10/26	14/10/26
375	TORRE 01	Empaste y pintura interior - PISO 1	3 d	9/10/26	15/10/26
376	TORRE 06	Empaste y pintura interior - PISO 2	2 d	20/10/26	22/10/26
377	TORRE 05	Empaste y pintura interior - PISO 2	2 d	22/10/26	23/10/26
378	TORRE 04	Empaste y pintura interior - PISO 2	2 d	23/10/26	27/10/26
379	TORRE 03	Empaste y pintura interior - PISO 2	2 d	27/10/26	29/10/26
380	TORRE 02	Empaste y pintura interior - PISO 2	2 d	27/10/26	29/10/26
381	TORRE 01	Empaste y pintura interior - PISO 2	3 d	27/10/26	30/10/26
382	TORRE 06	Empaste y pintura interior - PISO 3	2 d	5/11/26	9/11/26
383	TORRE 05	Empaste y pintura interior - PISO 3	2 d	9/11/26	10/11/26
384	TORRE 04	Empaste y pintura interior - PISO 3	2 d	10/11/26	12/11/26
385	TORRE 03	Empaste y pintura interior - PISO 3	2 d	12/11/26	17/11/26
386	TORRE 02	Empaste y pintura interior - PISO 3	2 d	17/11/26	19/11/26
387	TORRE 01	Empaste y pintura interior - PISO 3	3 d	19/11/26	23/11/26
388	TORRE 06	Empaste y pintura interior - PISO 4	2 d	23/11/26	25/11/26
389	TORRE 05	Empaste y pintura interior - PISO 4	2 d	25/11/26	27/11/26
390	TORRE 04	Empaste y pintura interior - PISO 4	2 d	27/11/26	1/12/26
391	TORRE 03	Empaste y pintura interior - PISO 4	2 d	1/12/26	3/12/26
392	TORRE 02	Empaste y pintura interior - PISO 4	2 d	3/12/26	4/12/26
393	TORRE 01	Empaste y pintura interior - PISO 4	3 d	4/12/26	10/12/26
394		**Plafón descolgado baños**	**44,5 d**	**25/09/26**	**24/11/26**
395	TORRE 03	Plafón descolgado baños - SEMISÓTANO SS1	1 d	25/09/26	28/09/26
396	TORRE 02	Plafón descolgado baños - SEMISÓTANO SS1	1 d	29/09/26	29/09/26
397	TORRE 01	Plafón descolgado baños - SEMISÓTANO SS1	1,5 d	1/10/26	2/10/26
398	TORRE 06	Plafón descolgado baños - PISO 1	1 d	5/10/26	6/10/26
399	TORRE 05	Plafón descolgado baños - PISO 1	1 d	6/10/26	7/10/26
400	TORRE 04	Plafón descolgado baños - PISO 1	1 d	8/10/26	9/10/26
401	TORRE 03	Plafón descolgado baños - PISO 1	1 d	13/10/26	14/10/26
402	TORRE 02	Plafón descolgado baños - PISO 1	1 d	14/10/26	15/10/26
403	TORRE 01	Plafón descolgado baños - PISO 1	1,5 d	15/10/26	16/10/26
404	TORRE 06	Plafón descolgado baños - PISO 2	1 d	21/10/26	22/10/26
405	TORRE 05	Plafón descolgado baños - PISO 2	1 d	22/10/26	23/10/26
406	TORRE 04	Plafón descolgado baños - PISO 2	1 d	26/10/26	27/10/26
407	TORRE 03	Plafón descolgado baños - PISO 2	1 d	28/10/26	29/10/26
408	TORRE 02	Plafón descolgado baños - PISO 2	1 d	29/10/26	30/10/26
409	TORRE 01	Plafón descolgado baños - PISO 2	1,5 d	30/10/26	3/11/26
410	TORRE 06	Plafón descolgado baños - PISO 3	1 d	6/11/26	9/11/26
411	TORRE 05	Plafón descolgado baños - PISO 3	1 d	10/11/26	10/11/26
412	TORRE 04	Plafón descolgado baños - PISO 3	1 d	11/11/26	12/11/26
413	TORRE 03	Plafón descolgado baños - PISO 3	1 d	13/11/26	17/11/26
414	TORRE 02	Plafón descolgado baños - PISO 3	2 d	17/11/26	19/11/26
415	TORRE 01	Plafón descolgado baños - PISO 3	3 d	20/11/26	24/11/26
416		**Empaste y pintura fachada**	**36 d**	**16/09/26**	**3/11/26**

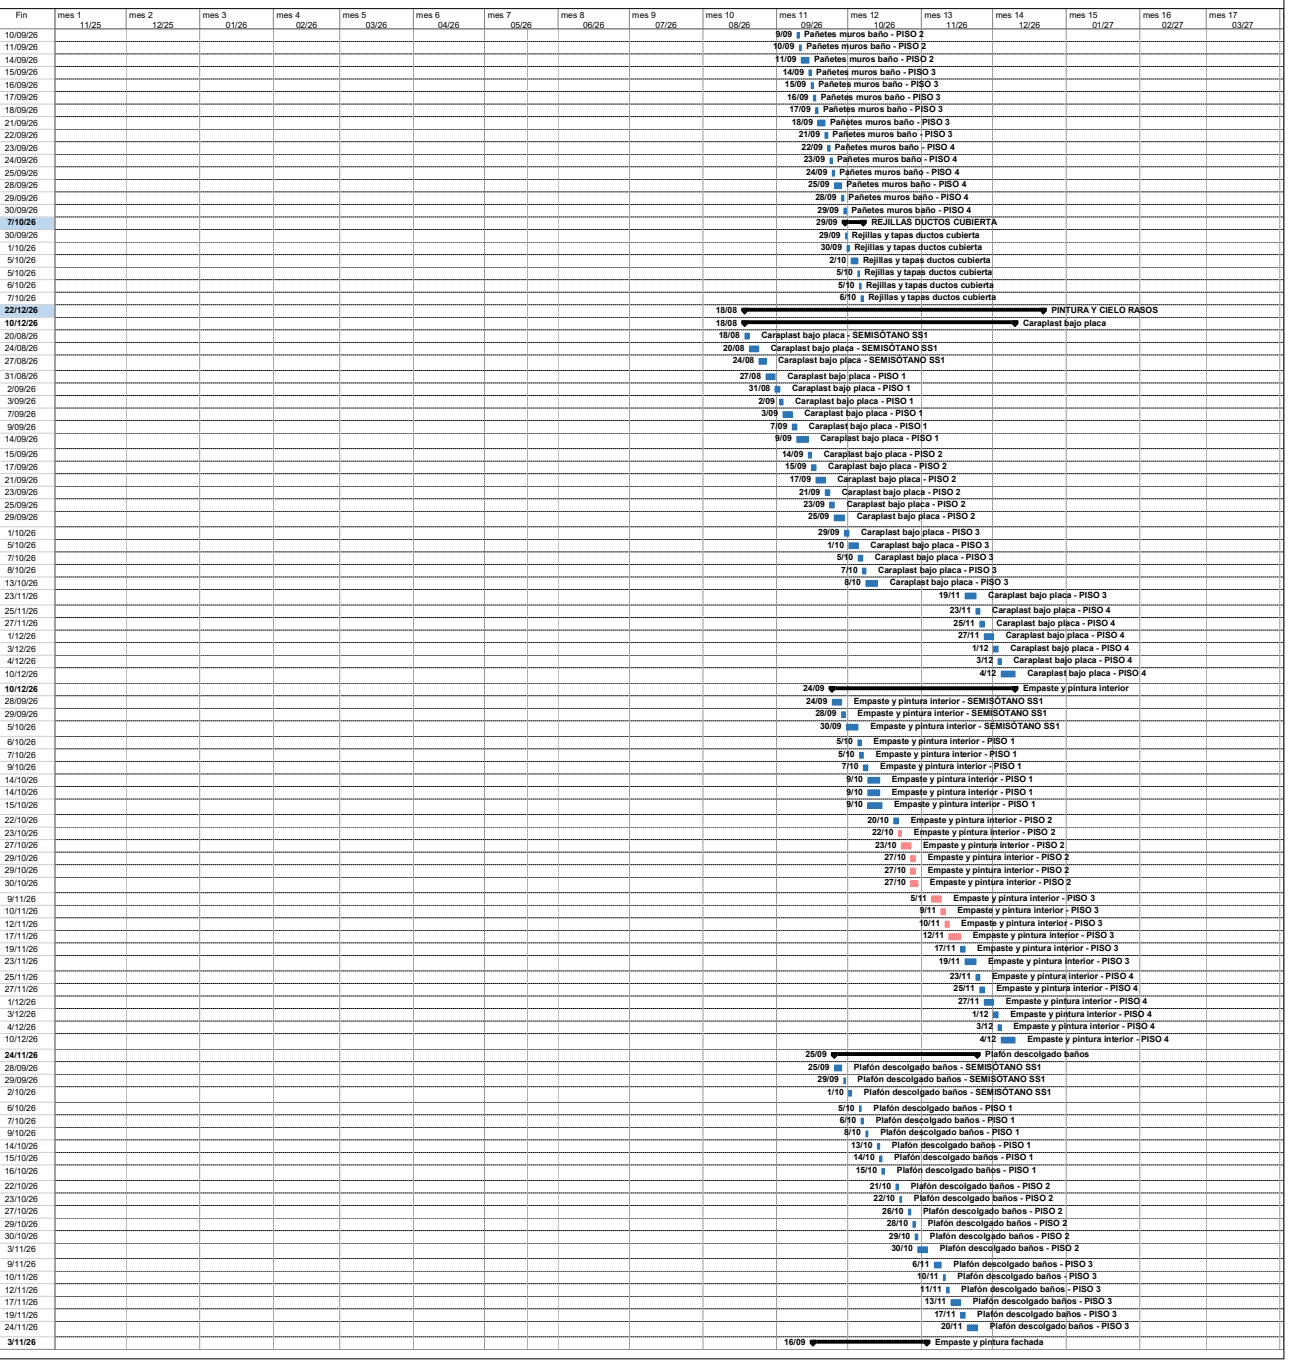


PROGRAMACION DE OBRA - VILLA JAVIER

Id	Ubicación	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
417	TORRE 03	Empaste y pintura fachada - TORRE	7 d	16/09/26	24/09/26
418	TORRE 02	Empaste y pintura fachada - TORRE	7 d	22/09/26	1/10/26
419	TORRE 01	Empaste y pintura fachada - TORRE	7 d	1/10/26	9/10/26
420	TORRE 06	Empaste y pintura fachada - TORRE	7 d	7/10/26	16/10/26
421	TORRE 05	Empaste y pintura fachada - TORRE	7 d	16/10/26	26/10/26
422	TORRE 04	Empaste y pintura fachada - TORRE	7 d	23/10/26	3/11/26
423		**Caraplast bajo placa punto fijo**	**18 d**	**27/11/26**	**22/12/26**
424	TORRE 03	Caraplast bajo placa punto fijo - TORRE	3 d	27/11/26	2/12/26
425	TORRE 02	Caraplast bajo placa punto fijo - TORRE	3 d	3/12/26	9/12/26
426	TORRE 01	Caraplast bajo placa punto fijo - TORRE	4 d	4/12/26	11/12/26
427	TORRE 06	Caraplast bajo placa punto fijo - TORRE	3 d	11/12/26	16/12/26
428	TORRE 05	Caraplast bajo placa punto fijo - TORRE	3 d	14/12/26	16/12/26
429	TORRE 04	Caraplast bajo placa punto fijo - TORRE	3 d	17/12/26	22/12/26
430	**CAPITULO**	**ASEO E IMPERMEABILIZACIÓN**	**108,5 d**	**20/08/26**	**13/01/27**
431		**Impermeabilización muros**	**41,5 d**	**26/08/26**	**19/10/26**
432	TORRE 03	Impermeabilización - SEMISÓTANO SS1	1 d	26/08/26	27/08/26
433	TORRE 02	Impermeabilización - SEMISÓTANO SS1	1 d	9/09/26	9/09/26
434	TORRE 01	Impermeabilización - SEMISÓTANO SS1	1,5 d	11/09/26	14/09/26
435	TORRE 06	Impermeabilización ducha - PISO 1	1 d	14/09/26	15/09/26
436	TORRE 05	Impermeabilización ducha - PISO 1	1 d	15/09/26	16/09/26
437	TORRE 04	Impermeabilización ducha - PISO 1	1 d	17/09/26	17/09/26
438	TORRE 03	Impermeabilización ducha - PISO 1	1 d	17/09/26	18/09/26
439	TORRE 02	Impermeabilización ducha - PISO 1	1 d	18/09/26	21/09/26
440	TORRE 01	Impermeabilización ducha - PISO 1	1,5 d	22/09/26	23/09/26
441	TORRE 06	Impermeabilización ducha - PISO 2	1 d	23/09/26	24/09/26
442	TORRE 05	Impermeabilización ducha - PISO 2	1 d	24/09/26	25/09/26
443	TORRE 04	Impermeabilización ducha - PISO 2	1 d	25/09/26	28/09/26
444	TORRE 03	Impermeabilización ducha - PISO 2	1 d	28/09/26	29/09/26
445	TORRE 02	Impermeabilización ducha - PISO 2	1 d	29/09/26	29/09/26
446	TORRE 01	Impermeabilización ducha - PISO 2	1,5 d	29/09/26	1/10/26
447	TORRE 06	Impermeabilización ducha - PISO 3	1 d	1/10/26	2/10/26
448	TORRE 05	Impermeabilización ducha - PISO 3	1 d	2/10/26	5/10/26
449	TORRE 04	Impermeabilización ducha - PISO 3	1 d	5/10/26	5/10/26
450	TORRE 03	Impermeabilización ducha - PISO 3	1 d	5/10/26	6/10/26
451	TORRE 02	Impermeabilización ducha - PISO 3	1 d	6/10/26	7/10/26
452	TORRE 01	Impermeabilización ducha - PISO 3	1,5 d	7/10/26	9/10/26
453	TORRE 06	Impermeabilización ducha - PISO 4	1 d	9/10/26	9/10/26
454	TORRE 05	Impermeabilización ducha - PISO 4	1 d	9/10/26	13/10/26
455	TORRE 04	Impermeabilización ducha - PISO 4	1 d	13/10/26	14/10/26
456	TORRE 03	Impermeabilización ducha - PISO 4	1 d	14/10/26	15/10/26
457	TORRE 02	Impermeabilización ducha - PISO 4	1 d	15/10/26	16/10/26
458	TORRE 01	Impermeabilización ducha - PISO 4	1,5 d	16/10/26	19/10/26
459		**Lavado muros y aseo interior**	**87 d**	**20/08/26**	**11/12/26**
460	TORRE 03	Lavado muros y aseo interior - SEMISÓTANO SS1	1 d	20/08/26	21/08/26
461	TORRE 02	Lavado muros y aseo interior - SEMISÓTANO SS1	1 d	24/08/26	25/08/26
462	TORRE 01	Lavado muros y aseo interior - SEMISÓTANO SS1	1,5 d	27/08/26	28/08/26
463	TORRE 06	Lavado muros y aseo interior - PISO 1	1 d	31/08/26	1/09/26
464	TORRE 05	Lavado muros y aseo interior - PISO 1	1 d	2/09/26	3/09/26
465	TORRE 04	Lavado muros y aseo interior - PISO 1	1 d	3/09/26	4/09/26
466	TORRE 03	Lavado muros y aseo interior - PISO 1	1 d	7/09/26	8/09/26
467	TORRE 02	Lavado muros y aseo interior - PISO 1	1 d	9/09/26	10/09/26
468	TORRE 01	Lavado muros y aseo interior - PISO 1	1,5 d	14/09/26	15/09/26
469	TORRE 06	Lavado muros y aseo interior - PISO 2	1 d	15/09/26	16/09/26
470	TORRE 05	Lavado muros y aseo interior - PISO 2	1 d	17/09/26	18/09/26
471	TORRE 04	Lavado muros y aseo interior - PISO 2	1 d	21/09/26	22/09/26
472	TORRE 03	Lavado muros y aseo interior - PISO 2	1 d	23/09/26	24/09/26
473	TORRE 02	Lavado muros y aseo interior - PISO 2	1 d	25/09/26	25/09/26
474	TORRE 01	Lavado muros y aseo interior - PISO 2	1,5 d	29/09/26	1/10/26
475	TORRE 06	Lavado muros y aseo interior - PISO 3	1 d	1/10/26	2/10/26
476	TORRE 05	Lavado muros y aseo interior - PISO 3	1 d	5/10/26	6/10/26
477	TORRE 04	Lavado muros y aseo interior - PISO 3	1 d	7/10/26	7/10/26
478	TORRE 03	Lavado muros y aseo interior - PISO 3	1 d	8/10/26	9/10/26
479	TORRE 02	Lavado muros y aseo interior - PISO 3	1 d	13/10/26	14/10/26
480	TORRE 01	Lavado muros y aseo interior - PISO 3	1,5 d	23/11/26	25/11/26
481	TORRE 06	Lavado muros y aseo interior - PISO 4	1 d	25/11/26	26/11/26
482	TORRE 05	Lavado muros y aseo interior - PISO 4	1 d	27/11/26	30/11/26
483	TORRE 04	Lavado muros y aseo interior - PISO 4	1 d	1/12/26	2/12/26
484	TORRE 03	Lavado muros y aseo interior - PISO 4	1 d	3/12/26	3/12/26
485	TORRE 02	Lavado muros y aseo interior - PISO 4	1 d	3/12/26	4/12/26
486	TORRE 01	Lavado muros y aseo interior - PISO 4	1,5 d	10/12/26	11/12/26
487		**Limpieza fachada**	**40 d**	**21/09/26**	**12/11/26**
488	TORRE 03	Limpieza fachada - TORRE	6 d	21/09/26	29/09/26
489	TORRE 02	Limpieza fachada - TORRE	6 d	29/09/26	6/10/26
490	TORRE 01	Limpieza fachada - TORRE	10 d	6/10/26	20/10/26
491	TORRE 06	Limpieza fachada - TORRE	6 d	20/10/26	27/10/26
492	TORRE 05	Limpieza fachada - TORRE	6 d	27/10/26	5/11/26
493	TORRE 04	Limpieza fachada - TORRE	6 d	5/11/26	12/11/26
494		**Impermeabilización cubierta**	**35,2 d**	**30/09/26**	**18/11/26**
495	TORRE 03	Impermeabilización cubierta - TORRE	3 d	30/09/26	5/10/26
496	TORRE 02	Impermeabilización cubierta - TORRE	3 d	6/10/26	9/10/26
497	TORRE 01	Impermeabilización cubierta - TORRE	5 d	20/10/26	26/10/26
498	TORRE 06	Impermeabilización cubierta - TORRE	3 d	27/10/26	30/10/26
499	TORRE 05	Impermeabilización cubierta - TORRE	3 d	5/11/26	9/11/26
500	TORRE 04	Impermeabilización cubierta - TORRE	3 d	12/11/26	18/11/26
501		**Impermeabilización fachada**	**45 d**	**30/09/26**	**30/11/26**
502	TORRE 03	Impermeabilización fachada - TORRE	7 d	30/09/26	9/10/26
503	TORRE 02	Impermeabilización fachada - TORRE	7 d	9/10/26	20/10/26
504	TORRE 01	Impermeabilización fachada - TORRE	10 d	20/10/26	3/11/26
505	TORRE 06	Impermeabilización fachada - TORRE	7 d	3/11/26	11/11/26
506	TORRE 05	Impermeabilización fachada - TORRE	7 d	11/11/26	20/11/26
507	TORRE 04	Impermeabilización fachada - TORRE	7 d	20/11/26	30/11/26
508		**Aseo viviendas**	**37 d**	**23/11/26**	**13/01/27**
509	TORRE 03	Aseo viviendas - TORRE	6 d	23/11/26	30/11/26
510	TORRE 02	Aseo viviendas - TORRE	6 d	30/11/26	7/12/26
511	TORRE 01	Aseo viviendas - TORRE	7 d	7/12/26	16/12/26
512	TORRE 06	Aseo viviendas - TORRE	6 d	16/12/26	28/12/26
513	TORRE 05	Aseo viviendas - TORRE	6 d	28/12/26	5/01/27
514	TORRE 04	Aseo viviendas - TORRE	6 d	5/01/27	13/01/27
515		**Aseo punto fijo**	**15 d**	**4/12/26**	**29/12/26**
516	TORRE 03	Aseo punto fijo - TORRE	3 d	4/12/26	10/12/26
517	TORRE 02	Aseo punto fijo - TORRE	3 d	10/12/26	15/12/26
518	TORRE 01	Aseo punto fijo - TORRE	4,5 d	11/12/26	17/12/26

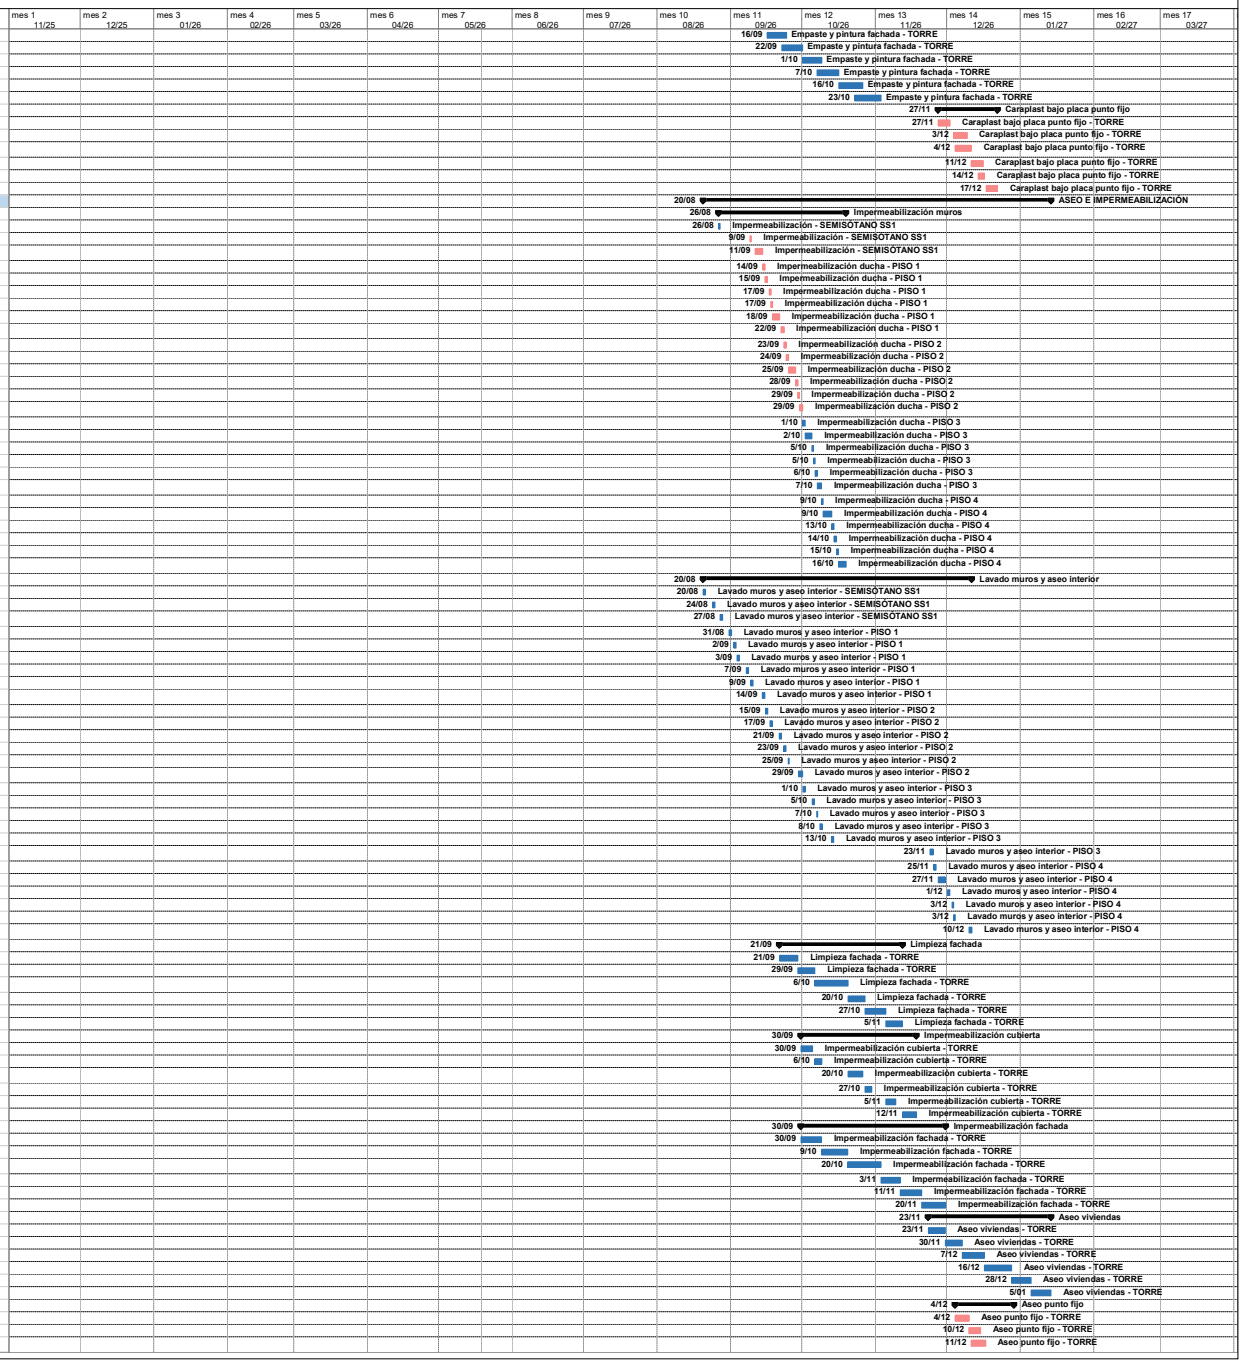


PROGRAMACION DE OBRA - VILLA JAVIER

Id	Ubicación	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
519	TORRE 06	Aseo punto fijo - TORRE	3 d	16/12/26	18/12/26
520	TORRE 05	Aseo punto fijo - TORRE	3 d	17/12/26	22/12/26
521	TORRE 04	Aseo punto fijo - TORRE	3 d	22/12/26	29/12/26
522	**CAPITULO**	**ENCHAPES**	**65,5 d**	**22/09/26**	**17/12/26**
523		**Enchape baños y cocina**	**50 d**	**22/09/26**	**27/11/26**
524	TORRE 03	Enchape baños y cocina - PISO 1	2 d	22/09/26	24/09/26
525	TORRE 02	Enchape baños y cocina - PISO 1	2 d	24/09/26	28/09/26
526	TORRE 01	Enchape baños y cocina - PISO 1	2,5 d	28/09/26	30/09/26
527	TORRE 06	Enchape baños y cocina - PISO 1	2 d	30/09/26	2/10/26
528	TORRE 05	Enchape baños y cocina - PISO 1	2 d	2/10/26	5/10/26
529	TORRE 04	Enchape baños y cocina - PISO 1	2 d	5/10/26	7/10/26
530	TORRE 03	Enchape baños y cocina - PISO 2	2 d	7/10/26	9/10/26
531	TORRE 02	Enchape baños y cocina - PISO 2	2 d	9/10/26	14/10/26
532	TORRE 01	Enchape baños y cocina - PISO 2	2,5 d	14/10/26	16/10/26
533	TORRE 06	Enchape baños y cocina - PISO 2	2 d	16/10/26	20/10/26
534	TORRE 05	Enchape baños y cocina - PISO 2	2 d	20/10/26	22/10/26
535	TORRE 04	Enchape baños y cocina - PISO 2	2 d	22/10/26	23/10/26
536	TORRE 03	Enchape baños y cocina - PISO 3	2 d	23/10/26	27/10/26
537	TORRE 02	Enchape baños y cocina - PISO 3	2 d	27/10/26	29/10/26
538	TORRE 01	Enchape baños y cocina - PISO 3	2,5 d	29/10/26	3/11/26
539	TORRE 06	Enchape baños y cocina - PISO 3	2 d	3/11/26	5/11/26
540	TORRE 05	Enchape baños y cocina - PISO 3	2 d	5/11/26	9/11/26
541	TORRE 04	Enchape baños y cocina - PISO 3	2 d	9/11/26	10/11/26
542	TORRE 03	Enchape baños y cocina - PISO 4	2 d	10/11/26	12/11/26
543	TORRE 02	Enchape baños y cocina - PISO 4	2 d	12/11/26	17/11/26
544	TORRE 01	Enchape baños y cocina - PISO 4	2,5 d	17/11/26	19/11/26
545	TORRE 06	Enchape baños y cocina - PISO 4	2 d	19/11/26	23/11/26
546	TORRE 05	Enchape baños y cocina - PISO 4	2 d	23/11/26	25/11/26
547	TORRE 04	Enchape baños y cocina - PISO 4	2 d	25/11/26	27/11/26
548		**Enchape punto fijo**	**19 d**	**23/11/26**	**17/12/26**
549	TORRE 03	Enchape punto fijo - TORRE	4 d	23/11/26	27/11/26
550	TORRE 02	Enchape punto fijo - TORRE	4 d	30/11/26	3/12/26
551	TORRE 01	Enchape punto fijo - TORRE	5 d	30/11/26	4/12/26
552	TORRE 06	Enchape punto fijo - TORRE	4 d	4/12/26	11/12/26
553	TORRE 05	Enchape punto fijo - TORRE	4 d	7/12/26	14/12/26
554	TORRE 04	Enchape punto fijo - TORRE	4 d	14/12/26	17/12/26
555	**CAPITULO**	**VENTANERÍA**	**50 d**	**1/10/26**	**7/12/26**
556	TORRE 03	Ventanería - TORRE	8 d	1/10/26	13/10/26
557	TORRE 02	Ventanería - TORRE	8 d	13/10/26	22/10/26
558	TORRE 01	Ventanería - TORRE	10 d	22/10/26	5/11/26
559	TORRE 06	Ventanería - TORRE	8 d	5/11/26	17/11/26
560	TORRE 05	Ventanería - TORRE	8 d	17/11/26	26/11/26
561	TORRE 04	Ventanería - TORRE	8 d	26/11/26	7/12/26
562	**CAPITULO**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**35 d**	**12/11/26**	**31/12/26**
563	TORRE 03	Carpintería metálica - TORRE	5 d	12/11/26	20/11/26
564	TORRE 02	Carpintería metálica - TORRE	5 d	20/11/26	26/11/26
565	TORRE 01	Carpintería metálica - TORRE	8 d	26/11/26	7/12/26
566	TORRE 06	Carpintería metálica - TORRE	5 d	7/12/26	15/12/26
567	TORRE 05	Carpintería metálica - TORRE	5 d	15/12/26	21/12/26
568	TORRE 04	Carpintería metálica - TORRE	5 d	21/12/26	30/12/26
569	TORRE 03	Barandas punto fijo - TORRE	3 d	10/12/26	15/12/26
570	TORRE 02	Barandas punto fijo - TORRE	3 d	15/12/26	17/12/26
571	TORRE 01	Barandas punto fijo - TORRE	3 d	17/12/26	22/12/26
572	TORRE 06	Barandas punto fijo - TORRE	3 d	18/12/26	23/12/26
573	TORRE 05	Barandas punto fijo - TORRE	3 d	22/12/26	28/12/26
574	TORRE 04	Barandas punto fijo - TORRE	3 d	29/12/26	31/12/26
575	**CAPITULO**	**APARATOS BAÑO Y COCINA**	**33 d**	**13/11/26**	**30/12/26**
576	TORRE 03	Plaquetas mesón cocina - TORRE	3 d	13/11/26	19/11/26
577	TORRE 02	Plaquetas mesón cocina - TORRE	3 d	23/11/26	25/11/26
578	TORRE 01	Plaquetas mesón cocina - TORRE	4 d	27/11/26	3/12/26
579	TORRE 06	Plaquetas mesón cocina - TORRE	3 d	9/12/26	14/12/26
580	TORRE 05	Plaquetas mesón cocina - TORRE	3 d	16/12/26	18/12/26
581	TORRE 04	Plaquetas mesón cocina - TORRE	3 d	22/12/26	29/12/26
582	TORRE 03	Mesón acero inoxidable - TORRE	4 d	17/11/26	23/11/26
583	TORRE 02	Mesón acero inoxidable - TORRE	4 d	23/11/26	27/11/26
584	TORRE 01	Mesón acero inoxidable - TORRE	5 d	30/11/26	4/12/26
585	TORRE 06	Mesón acero inoxidable - TORRE	4 d	10/12/26	16/12/26
586	TORRE 05	Mesón acero inoxidable - TORRE	4 d	16/12/26	22/12/26
587	TORRE 04	Mesón acero inoxidable - TORRE	4 d	23/12/26	30/12/26
588	TORRE 03	Instalación aparatos sanitarios - TORRE	3 d	18/11/26	23/11/26
589	TORRE 02	Instalación aparatos sanitarios - TORRE	3 d	23/11/26	26/11/26
590	TORRE 01	Instalación aparatos sanitarios - TORRE	5 d	30/11/26	4/12/26
591	TORRE 06	Instalación aparatos sanitarios - TORRE	3 d	10/12/26	15/12/26
592	TORRE 05	Instalación aparatos sanitarios - TORRE	3 d	16/12/26	21/12/26
593	TORRE 04	Instalación aparatos sanitarios - TORRE	3 d	23/12/26	30/12/26
594	TORRE 03	Instalación aparatos eléctricos - TORRE	3 d	18/11/26	23/11/26
595	TORRE 02	Instalación aparatos eléctricos - TORRE	3 d	23/11/26	26/11/26
596	TORRE 01	Instalación aparatos eléctricos - TORRE	5 d	30/11/26	4/12/26
597	TORRE 06	Instalación aparatos eléctricos - TORRE	3 d	10/12/26	15/12/26
598	TORRE 05	Instalación aparatos eléctricos - TORRE	3 d	16/12/26	21/12/26
599	TORRE 04	Instalación aparatos eléctricos - TORRE	3 d	23/12/26	30/12/26
600	**CAPITULO**	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**31 d**	**19/11/26**	**31/12/26**
601	TORRE 03	Puertas de baño - TORRE	4 d	19/11/26	24/11/26
602	TORRE 02	Puertas de baño - TORRE	4 d	24/11/26	30/11/26
603	TORRE 01	Puertas de baño - TORRE	6 d	1/12/26	9/12/26
604	TORRE 06	Puertas de baño - TORRE	4 d	11/12/26	16/12/26
605	TORRE 05	Puertas de baño - TORRE	4 d	17/12/26	23/12/26
606	TORRE 04	Puertas de baño - TORRE	4 d	28/12/26	31/12/26
607	**CAPITULO**	**CERTIFICACIONES DE OBRA Y LIBERACIÓN**	**57,5 d**	**30/11/26**	**16/02/27**
608		**Visita revisión certificado RETIE**	**28 d**	**30/11/26**	**8/01/27**
609	TORRE 03	Visita revisión certificado RETIE - TORRE	1 d	30/11/26	1/12/26
610	TORRE 02	Visita revisión certificado RETIE - TORRE	1 d	3/12/26	4/12/26
611	TORRE 01	Visita revisión certificado RETIE - TORRE	1 d	15/12/26	16/12/26
612	TORRE 06	Visita revisión certificado RETIE - TORRE	1 d	22/12/26	23/12/26
613	TORRE 05	Visita revisión certificado RETIE - TORRE	1 d	30/12/26	31/12/26
614	TORRE 04	Visita revisión certificado RETIE - TORRE	1 d	7/01/27	8/01/27
615		**Certificado RETIE**	**25 d**	**16/12/26**	**22/01/27**
616	TORRE 03	Certificado RETIE - TORRE	1 d	16/12/26	17/12/26
617	TORRE 02	Certificado RETIE - TORRE	1 d	17/12/26	18/12/26
618	TORRE 01	Certificado RETIE - TORRE	1 d	30/12/26	30/12/26
619	TORRE 06	Certificado RETIE - TORRE	1 d	7/01/27	8/01/27
620	TORRE 05	Certificado RETIE - TORRE	1 d	14/01/27	15/01/27
621	TORRE 04	Certificado RETIE - TORRE	1 d	21/01/27	22/01/27
622		**Certificado supervisión técnica**	**10,5 d**	**17/12/26**	**5/01/27**
623	TORRE 03	Certificado supervisión técnica - TORRE	1 d	17/12/26	18/12/26
624	TORRE 02	Certificado supervisión técnica - TORRE	1 d	22/12/26	23/12/26

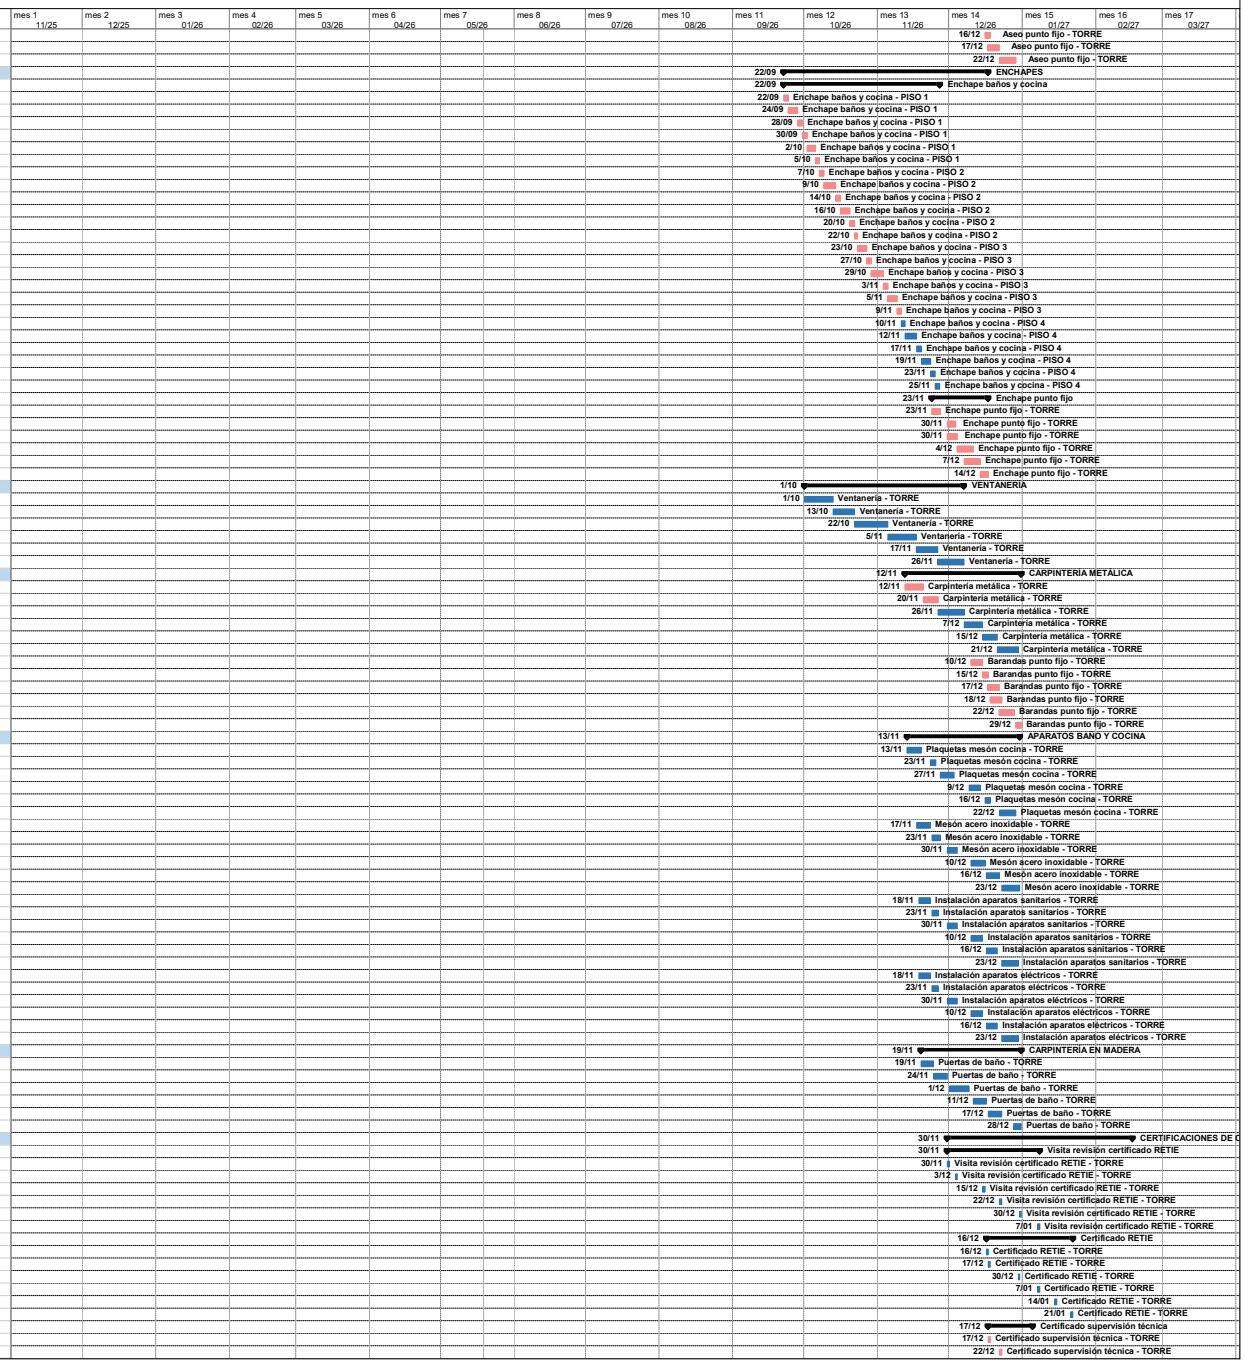

PROGRAMACION DE OBRA - VILLA JAVIER

Id	Ubicación	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
625	TORRE 01	Certificado supervisión técnica - TORRE	1 d	28/12/26	29/12/26
626	TORRE 06	Certificado supervisión técnica - TORRE	1 d	30/12/26	30/12/26
627	TORRE 05	Certificado supervisión técnica - TORRE	1 d	31/12/26	4/01/27
628	TORRE 04	Certificado supervisión técnica - TORRE	1 d	4/01/27	5/01/27
629		**Entrega y liberación**	**29 d**	**8/01/27**	**16/02/27**
630	TORRE 03	Entrega y liberación - TORRE	1,5 d	8/01/27	13/01/27
631	TORRE 02	Entrega y liberación - TORRE	1,5 d	18/01/27	19/01/27
632	TORRE 01	Entrega y liberación - TORRE	1,5 d	25/01/27	26/01/27
633	TORRE 06	Entrega y liberación - TORRE	1,5 d	1/02/27	2/02/27
634	TORRE 05	Entrega y liberación - TORRE	1,5 d	8/02/27	9/02/27
635	TORRE 04	Entrega y liberación - TORRE	1,5 d	15/02/27	16/02/27
636	**ZONAS COMUNES**	**ZONAS COMUNES**	**185,8 d**	**8/04/26**	**11/12/26**
637	**TANQUE DE AGUA POTABLE**	**TANQUE DE AGUA POTABLE**	**48,06 d**	**8/04/26**	**10/06/26**
638	TANQUE DE AGUA POTABLE	Excavación con retiro - TANQUE AP	1,06 d	8/04/26	8/04/26
639	TANQUE DE AGUA POTABLE	Concreto de limpieza	2 d	8/04/26	10/04/26
640	TANQUE DE AGUA POTABLE	Compactación subrasante - TANQUE AP	1 d	8/04/26	9/04/26
641	TANQUE DE AGUA POTABLE	Excavación manual - TANQUE AP	3 d	9/04/26	14/04/26
642	TANQUE DE AGUA POTABLE	Vigas de cimentación - TANQUE AP	2 d	14/04/26	16/04/26
643	TANQUE DE AGUA POTABLE	Placa de contrapiso - TANQUE AP	5 d	16/04/26	22/04/26
644	TANQUE DE AGUA POTABLE	Muros en concreto - TANQUE AP	5 d	22/04/26	29/04/26
645	TANQUE DE AGUA POTABLE	Resane muros en concreto tanque - TANQUE AP	3 d	29/04/26	4/05/26
646	TANQUE DE AGUA POTABLE	Placa superior tanque - TANQUE AP	5 d	4/05/26	11/05/26
647	TANQUE DE AGUA POTABLE	Impermeabilización interna y externa - TANQUE AP	5 d	11/05/26	15/05/26
648	TANQUE DE AGUA POTABLE	Carpintería metálica - TANQUE AP	2 d	15/05/26	20/05/26
649	TANQUE DE AGUA POTABLE	Relleno recebo - TANQUE AP	3 d	20/05/26	25/05/26
650	TANQUE DE AGUA POTABLE	Mamposteria fachada e interiores - TANQUE AP	8 d	25/05/26	3/06/26
651	TANQUE DE AGUA POTABLE	Escotilla de cubierta - TANQUE AP	5 d	3/06/26	10/06/26
652	TANQUE DE AGUA POTABLE	Desinfección, lavado y llenado de tanque - TANQUE AP	5 d	10/11/26	18/11/26
653	TANQUE DE AGUA POTABLE	Entrega y liberación - TANQUE AP	1 d	18/11/26	19/11/26
654	**SETU**	**SETU**	**51 d**	**1/10/26**	**10/12/26**
655	SETU	Excavación manual - SETU	5 d	1/10/26	8/10/26
656	SETU	Vigas de cimentación - SETU	7 d	8/10/26	19/10/26
657	SETU	Placa de contrapiso (maciza) - SETU	7 d	19/10/26	27/10/26
658	SETU	Mamposteria fachada e interiores - SETU	10 d	27/10/26	10/11/26
659	SETU	Instalaciones Hidrosanitarias - SETU	10 d	27/10/26	10/11/26
660	SETU	Instalaciones Eléctricas - SETU	10 d	27/10/26	10/11/26
661	SETU	Dovelas - SETU	3 d	10/11/26	13/11/26
662	SETU	Resane Ratonera Mamposteria - SETU	3 d	13/11/26	19/11/26
663	SETU	Vigas de cubierta - SETU	5 d	13/11/26	20/11/26
664	SETU	Placa de Cubierta - SETU	5 d	13/11/26	20/11/26
665	SETU	Hilada parada - SETU	5 d	20/11/26	27/11/26
666	SETU	Media Caña Cubierta - SETU	2 d	27/11/26	1/12/26
667	SETU	Impermeabilización Cubierta - SETU	2 d	1/12/26	2/12/26
668	SETU	Limpieza de fachada - SETU	2 d	2/12/26	4/12/26
669	SETU	Impermeabilización de fachada - SETU	2 d	4/12/26	9/12/26
670	SETU	Aseo muros internos - SETU	2 d	20/11/26	24/11/26
671	SETU	Afinado piso y pañete muros - SETU	4 d	24/11/26	30/11/26
672	SETU	Empaste y pintura interna - SETU	4 d	30/11/26	3/12/26
673	SETU	Carpinteria Metalica - SETU	3 d	30/11/26	2/12/26
674	SETU	Aseo final - SETU	2 d	2/12/26	4/12/26
675	SETU	Entrega y liberación - SETU	1 d	9/12/26	10/12/26
676	**PORTERIA**	**PORTERIA Y CUARTO TECNICO**	**52 d**	**1/10/26**	**11/12/26**
677	PORTERIA	Excavación manual - PORTERIA	2 d	1/10/26	5/10/26
678	PORTERIA	Vigas de cimentación - PORTERIA	3 d	5/10/26	8/10/26
679	PORTERIA	Placa de contrapiso - PORTERIA	3 d	8/10/26	14/10/26
680	PORTERIA	Columnas en concreto - PORTERIA	2 d	14/10/26	15/10/26
681	PORTERIA	Placa entrepiso aligerada -PORTERIA	6 d	20/10/26	27/10/26
682	PORTERIA	Instalaciones Hidrosanitarias - PORTERIA	2 d	27/10/26	29/10/26
683	PORTERIA	Instalaciones Eléctricas - PORTERIA	2 d	29/10/26	3/11/26
684	PORTERIA	Red contra incendios - PORTERIA	2 d	3/11/26	5/11/26
685	PORTERIA	Mamposteria fachada e interiores - PORTERIA	4 d	27/10/26	3/11/26
686	PORTERIA	Dovelas - PORTERIA	4 d	29/10/26	5/11/26
687	PORTERIA	Resane Ratonera Mamposteria - PORTERIA	2 d	5/11/26	6/11/26
688	PORTERIA	Bordillo Cubierta - PORTERIA	1 d	5/11/26	6/11/26
689	PORTERIA	Media Caña Cubierta - PORTERIA	1 d	6/11/26	6/11/26
690	PORTERIA	Impermeabilización Cubierta - PORTERIA	1 d	6/11/26	9/11/26
691	PORTERIA	Empaste y Pintura Fachada - PORTERIA	2 d	9/11/26	11/11/26
692	PORTERIA	Limpieza de fachada - PORTERIA	1 d	11/11/26	12/11/26
693	PORTERIA	Ventaneria en Aluminio - PORTERIA	2 d	12/11/26	17/11/26
694	PORTERIA	Impermeabilziación de fachada - PORTERIA	1 d	17/11/26	18/11/26
695	PORTERIA	Aseo muros internos - PORTERIA	1 d	3/11/26	4/11/26
696	PORTERIA	Afinado piso - PORTERIA	2 d	9/11/26	11/11/26
697	PORTERIA	Enchape pisos y muros - PORTERIA	3 d	17/11/26	19/11/26
698	PORTERIA	Empaste y Pintura Internos - PORTERIA	3 d	19/11/26	24/11/26
699	PORTERIA	Carpinteria Metalica - PORTERIA	2 d	24/11/26	26/11/26
700	PORTERIA	Puertas en Vidrio Acceso - PORTERIA	1 d	26/11/26	27/11/26
701	PORTERIA	Instalación de Equipos - PORTERIA	8 d	27/11/26	9/12/26
702	PORTERIA	Aseo final - PORTERIA	1 d	9/12/26	10/12/26
703	PORTERIA	Entrega y liberación - PORTERIA	1 d	10/12/26	11/12/26
704	**URBANISMO**	**URBANISMO INTERNO**	**107,6 d**	**19/08/26**	**12/01/27**
705	**RED SUMINISTRO**	**RED SUMINISTRO**	**60 d**	**31/08/26**	**17/11/26**
706	RED SUMINISTRO	Excavación - R.SUM	10 d	31/08/26	10/09/26
707	RED SUMINISTRO	Relleno en Arena - R.SUM	10 d	10/09/26	23/09/26
708	RED SUMINISTRO	Relleno en Recebo - R.SUM	10 d	23/09/26	6/10/26
709	RED SUMINISTRO	Trasciego de Materiales - R.SUM	10 d	6/10/26	20/10/26
710	RED SUMINISTRO	Tubería Red de Presión - R.SUM	20 d	20/10/26	17/11/26
711	**RED DE AGUAS RESIDUALES**	**RED DE AGUAS RESIDUALES**	**60 d**	**1/09/26**	**19/11/26**
712	RED DE AGUAS RESIDUALES	Excavación - R.AR	10 d	1/09/26	14/09/26
713	RED DE AGUAS RESIDUALES	Relleno en Arena - R.AR	10 d	14/09/26	25/09/26
714	RED DE AGUAS RESIDUALES	Relleno en Recebo - R.AR	10 d	25/09/26	8/10/26
715	RED DE AGUAS RESIDUALES	Trasciego de Materiales - R.AR	10 d	8/10/26	22/10/26
716	RED DE AGUAS RESIDUALES	Tubería PVC Red de Aguas Residuales - R.AR	20 d	22/10/26	19/11/26
717	RED DE AGUAS RESIDUALES	Accesorios residuales - R.AR	20 d	22/10/26	19/11/26
718	RED DE AGUAS RESIDUALES	Caja de Inspección 600 MM - R.AR	20 d	22/10/26	19/11/26
719	**RED DE AGUAS LLUVIAS**	**RED DE AGUAS LLUVIAS**	**73,5 d**	**3/09/26**	**9/12/26**
720	RED DE AGUAS LLUVIAS	Excavación - R.ALL	5 d	3/09/26	9/09/26
721	RED DE AGUAS LLUVIAS	Relleno en Arena - R.ALL	5 d	10/09/26	16/09/26
722	RED DE AGUAS LLUVIAS	Relleno en Recebo - R.ALL	5 d	16/09/26	22/09/26
723	RED DE AGUAS LLUVIAS	Trasciego de Materiales - R.ALL	5 d	22/09/26	29/09/26
724	RED DE AGUAS LLUVIAS	Cañuela - R.ALL	2 d	18/11/26	20/11/26
725	RED DE AGUAS LLUVIAS	Sumidero - R.ALL	2 d	20/11/26	24/11/26
726	RED DE AGUAS LLUVIAS	Pozo de Inspección - R.ALL	2 d	24/11/26	25/11/26
727	RED DE AGUAS LLUVIAS	Tubería Red de Aguas Lluvias - R.ALL	10 d	26/11/26	9/12/26
728	RED DE AGUAS LLUVIAS	Accesorio aguas lluvias - R.ALL	10 d	26/11/26	9/12/26
729	**RED CONTRAINCENDIO Y DETECCIÓN**	**RED CONTRAINCENDIO Y DETECCIÓN**	**50 d**	**9/09/26**	**12/11/26**

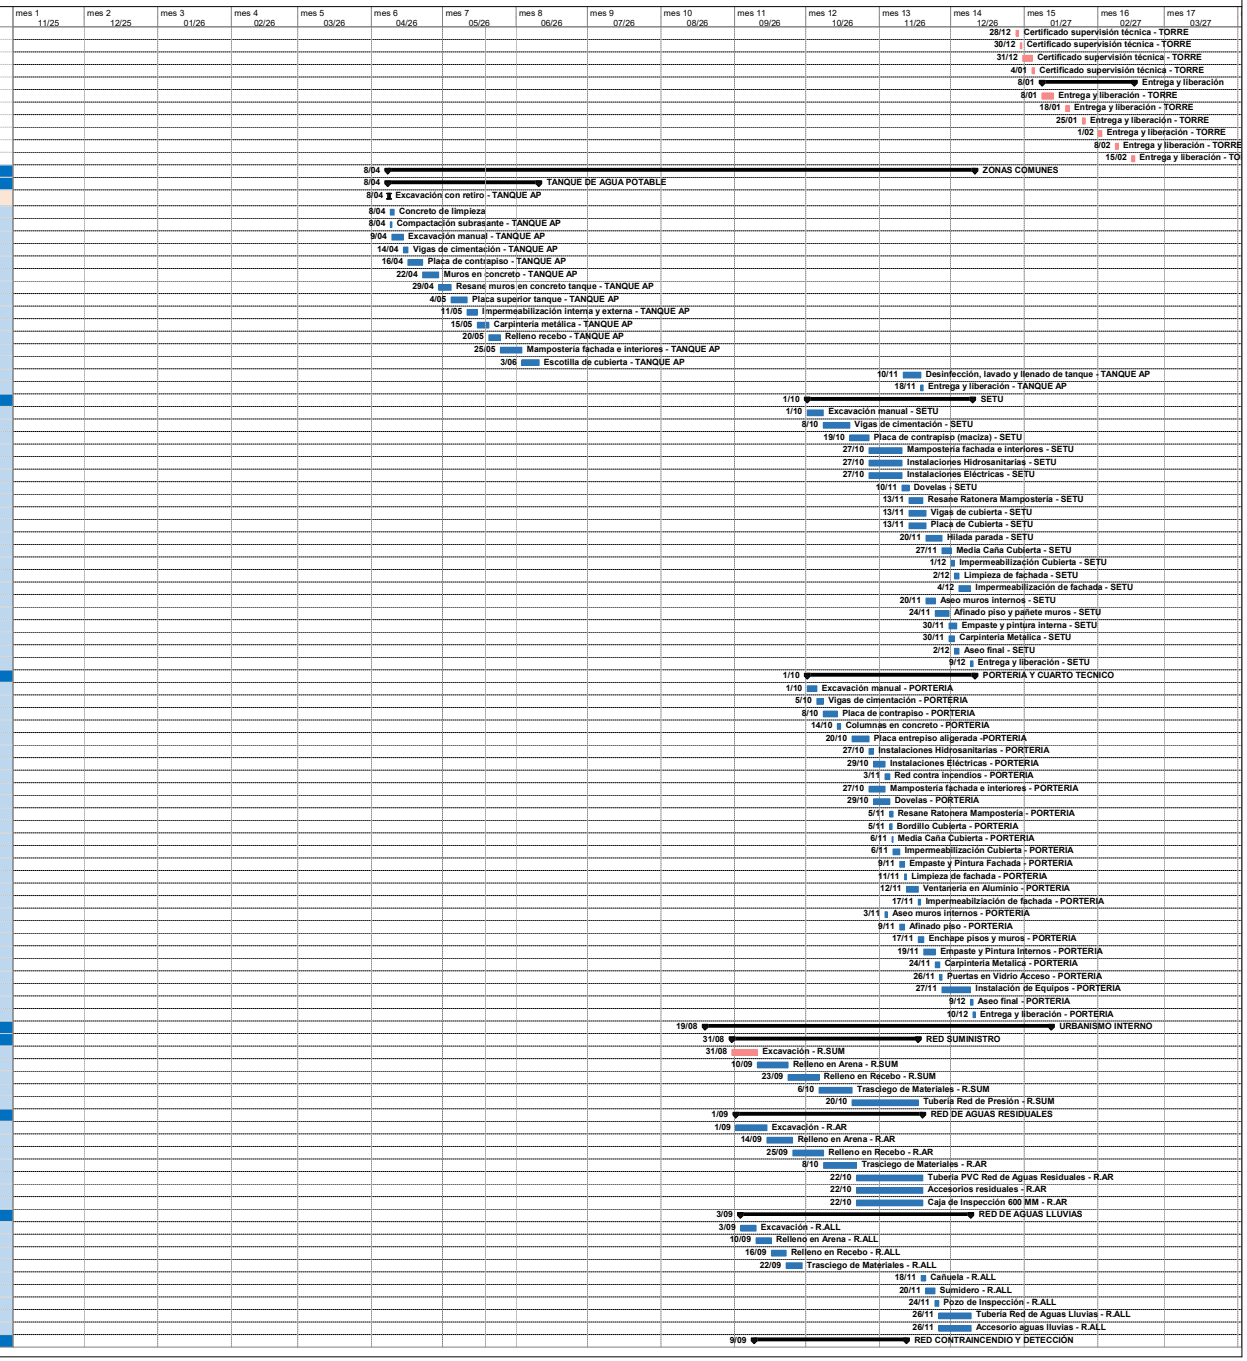

PROGRAMACION DE OBRA - VILLA JAVIER

Id	Ubicación	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
730	RED CONTRAINCENDIO Y DETECCIÓN	Excavación - RCI	10 d	9/09/26	21/09/26
731	RED CONTRAINCENDIO Y DETECCIÓN	Relleno en Arena - RCI	10 d	22/09/26	2/10/26
732	RED CONTRAINCENDIO Y DETECCIÓN	Relleno en Recebo - RCI	10 d	2/10/26	16/10/26
733	RED CONTRAINCENDIO Y DETECCIÓN	Trasciego de Materiales - RCI	20 d	16/10/26	12/11/26
734	RED CONTRAINCENDIO Y DETECCIÓN	Tubería C900 6" - RCI	20 d	16/10/26	12/11/26
735	RED CONTRAINCENDIO Y DETECCIÓN	Accesorio contra incendio - RCI	20 d	16/10/26	12/11/26
736	**RED DE ENERGÍA**	**RED DE ENERGÍA**	**72 d**	**10/09/26**	**15/12/26**
737	**RED DE ENERGÍA**	**RED DE BAJA TENSIÓN**	**46 d**	**10/09/26**	**10/11/26**
738	RED DE ENERGÍA	Red de Baja Tensión - RED ENERGÍA	12 d	10/09/26	25/09/26
739	RED DE ENERGÍA	Banco de ductos - RED ENERGÍA	17 d	25/09/26	19/10/26
740	RED DE ENERGÍA	Red de Media Tensión - RED ENERGÍA	17 d	19/10/26	10/11/26
741	**RED DE ENERGÍA**	**COMUNICACIONES**	**40 d**	**22/10/26**	**15/12/26**
742	RED DE ENERGÍA	Red de Comunicaciones - RED ENERGÍA	40 d	22/10/26	15/12/26
743	**RED DE ENERGÍA**	**ILUMINACIÓN**	**30 d**	**22/10/26**	**1/12/26**
744	RED DE ENERGÍA	Red de Iluminación - RED ENERGÍA	30 d	22/10/26	1/12/26
745	**RED DE GAS**	**RED DE GAS**	**52 d**	**17/09/26**	**25/11/26**
746	RED DE GAS	Excavación - RED DE GAS	7 d	17/09/26	25/09/26
747	RED DE GAS	Relleno en Recebo - RED DE GAS	15 d	25/09/26	15/10/26
748	RED DE GAS	Tubería Acero Galvanizada Gas 2" - RED DE GAS	30 d	15/10/26	25/11/26
749	RED DE GAS	Accesorio Red de GAS - RED DE GAS	30 d	15/10/26	25/11/26
750	**ZONAS DURAS**	**ZONAS DURAS**	**106,6 d**	**19/08/26**	**8/01/27**
751	ZONAS DURAS	Relleno material seleccionado	20 d	19/08/26	14/09/26
752	ZONAS DURAS	Sub Base Granular - ZONAS DURAS	15 d	14/09/26	1/10/26
753	ZONAS DURAS	Base Granular - ZONAS DURAS	15 d	2/10/26	22/10/26
754	ZONAS DURAS	Geotextil Tejido - ZONAS DURAS	7 d	13/10/26	21/10/26
755	ZONAS DURAS	Gramoquin - ZONAS DURAS	25 d	20/10/26	23/11/26
756	ZONAS DURAS	Empradización - ZONAS DURAS	8 d	23/11/26	2/12/26
757	ZONAS DURAS	Adoquin trafico peatonal - ZONAS DURAS	17 d	26/10/26	18/11/26
758	ZONAS DURAS	Bordillo y sardinel - ZONAS DURAS	20 d	3/11/26	27/11/26
759	ZONAS DURAS	Cinta de Confinamiento en adoquin - ZONAS DURAS	20 d	13/11/26	11/12/26
760	ZONAS DURAS	Pintura y nomenclatura parqueadero - ZONAS DURAS	5 d	11/12/26	18/12/26
761	ZONAS DURAS	Topellantas - ZONAS DURAS	10 d	13/11/26	27/11/26
762	ZONAS DURAS	Plaquetas prefabricadas - ZONAS DURAS	1 d	13/11/26	17/11/26
763	ZONAS DURAS	Reja cerramiento perfil tubular - ZONAS DURAS	15 d	27/11/26	18/12/26
764	ZONAS DURAS	Puerta de acceso vehicular - ZONAS DURAS	2 d	5/01/27	6/01/27
765	ZONAS DURAS	Parque infantil	2 d	6/01/27	8/01/27
766	**ZONAS DURAS**	**FIN URBANISMO**	**1 d**	**8/01/27**	**12/01/27**
767	ZONAS DURAS	Fin urbanismo - ZONAS DURAS	1 d	8/01/27	12/01/27
768	**URBANISMO EXTERNO**	**URBANISMO EXTERNO**	**54 d**	**25/09/26**	**7/12/26**
769	**RED DE ENERGÍA**	**RED DE ENERGÍA**	**50 d**	**25/09/26**	**1/12/26**
770	**RED DE ENERGÍA**	**RED DE MEDIA TENSIÓN**	**50 d**	**25/09/26**	**1/12/26**
771	RED DE ENERGÍA	Red de Media Tensión - RED ENERGÍA	20 d	25/09/26	22/10/26
772	RED DE ENERGÍA	Banco de ductos - RED ENERGÍA	30 d	22/10/26	1/12/26
773	**ZONAS DURAS**	**ZONAS DURAS**	**23 d**	**5/11/26**	**4/12/26**
774	ZONAS DURAS	Sub Base Granular - ZONAS DURAS	8 d	5/11/26	17/11/26
775	ZONAS DURAS	Base Granular - ZONAS DURAS	8 d	17/11/26	26/11/26
776	ZONAS DURAS	Anden exterior - ZONAS DURAS	10 d	20/11/26	3/12/26
777	ZONAS DURAS	Bordillo y sardinel - ZONAS DURAS	8 d	25/11/26	4/12/26
778	**ZONAS DURAS**	**FIN URBANISMO EXTERNO**	**1 d**	**4/12/26**	**7/12/26**
779	ZONAS DURAS	Fin urbanismo externo - ZONAS DURAS	1 d	4/12/26	7/12/26
780		**Fin de obra y entregas**	**0 d**	**16/02/27**	**16/02/27**

