INFORME REFERENTE A LA VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CANCHA EL PRADOO

FECHA DE VISITA:	18/03/2025	**FECHA DE INFORME**	19/03/2025
SOLICITANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE TURBACO - IMDERT		
NO. RADICADO:	N.A.		
ASUNTO:	INSPECCION TECNICA CANCHA EL PRADO		
UBICACIÓN:	BARRIO EL PRADO – TURBACO		
NUMERO DE INFORME:	001		

ASUNTO: VISITA DE INSPECCIÓN TECNICA CANCHA EL PRADO

INFORMACIÓN GENERAL:

En atención a la solicitud realizada por el director del IMDERT, se llevó a cabo una visita de inspección técnica el día martes 18 de marzo de 2025, a las 10:00 a.m., con el objetivo de evaluar el estado actual del escenario deportivo y emitir un concepto técnico orientado a la reconstrucción de un nuevo escenario deportivo, para beneficio de la comunidad.

La inspección se realizó mediante evaluación visual directa, sin ensayos, enfocándose en las condiciones físicas en las que se encontraron los diferentes elementos que hacen parte de la infraestructura existente.

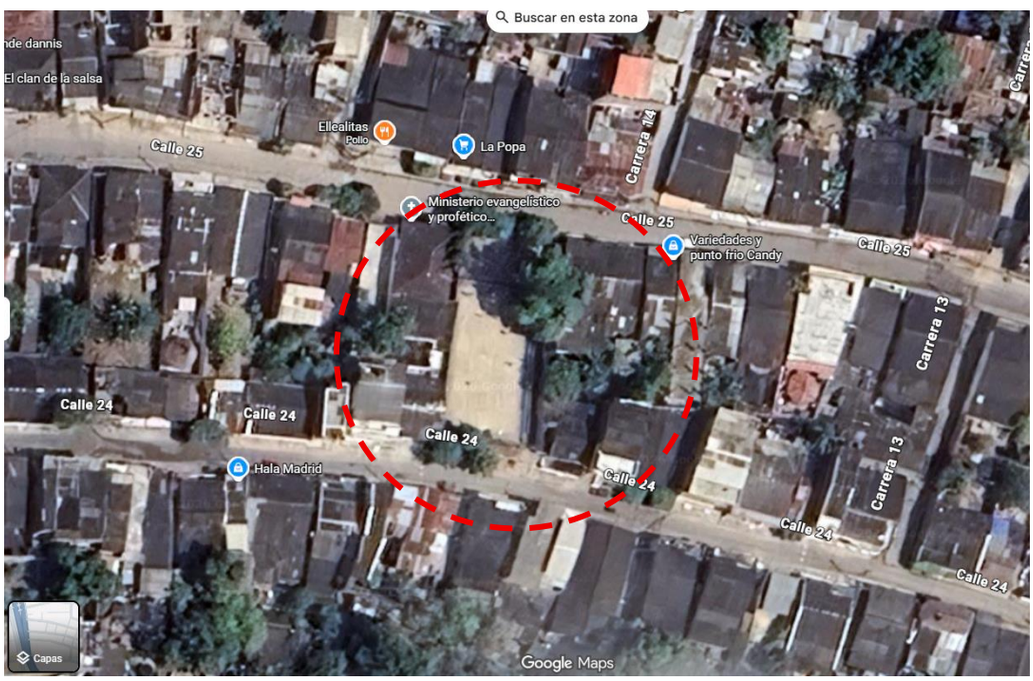


Figura 1. Localización de la cancha en el barrio El Prado – Turbaco.

Concepto técnico y/o diagnóstico:

De conformidad con la visita efectuada, se pudo constatar que el escenario deportivo presenta las siguientes condiciones físicas y estructurales:

Acceso: la cancha cuenta con un pasillo que da acceso a ambas calles que rodean el escenario, lo cual no permite dar seguridad a la infraestructura y controlar el acceso de todas las personas. Se recomienda eliminar el pasillo de acceso para el control del ingreso.

Estado físico: la cancha se encuentra en estado de deterioro visible, algunas placas de la cancha se encuentran asentadas, los arcos metálicos se encuentran oxidados y no cumplen con la normativa, los muros de cerramiento e intermedios muchos se encuentran deteriorados, con exposición de los blocks, las mallas están en mal estado, en cuanto a la pintura de la cancha esta es inexistente y las gradas se encuentran en deterioro físico, además que no cumplen con normativa.

Adicionalmente se cuenta con un parque de niños metálico, el cual ya no está de avanzado estado de deterioro y no funcional.

Se recomienda el replanteo completo, ubicación, diseño y reconstrucción de la cancha y el parque infantil.

Medidas de la cancha: la cancha tiene 10 m de ancho por 20 m de largo, el pasillo es de 80 cm y las gradas tienen un ancho de 80 cm.

Registro fotográfico

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las condiciones actuales en las que se encontraron los diferentes elementos que conforman la cancha del barrio el prado.



Figuras 1 y 2. Cerramiento, malla y gradas.




Figuras 3 y 4. Estado de la cancha y arcos.




Figuras 5 y 6. Estado de los muros y enchapes.




Figuras 7 y 8. Estado del parque infantil.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en la inspección realizada y el análisis técnico correspondiente, se concluye lo siguiente:

Se recomienda realizar el replanteo, ubicación, diseño y construcción de una nueva infraestructura deportiva acorde con la normativa colombiana NSR -10 y las medidas de una cancha de futbol ya sea de futbol 5 o 7 de acuerdo a la disponibilidad del área del terreno. Lo anterior, debido a que la infraestructura existente se encuentra en deterioro en un 80% y con pocas condiciones de seguridad para la población beneficiada.

Elaboró:
Lucia Lombana Ortiz - Contratista IMDERT
