
INFORME MENSUAL EJECUTIVO No. 16
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

PERIODO
DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2026

CONTROL DE REVISIONES

Elaborado por: **CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES** Residente de Obra **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S**	Firma 
Presentado por: **ALEXANDER ANDRES SEGURA PÉREZ** Director de Obra **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S**	Firma 
Aprobado por: **JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ** Director de Interventoría **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI**	Firma 

CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Descripción	Observaciones y/o modificaciones
0	18/06/2026	Versión Inicial	
1	09/07/2026	Versión 1	Atención de observaciones por parte de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
3 AVANCE DE OBRA 5
3.1 Relación de ID´s asignados 5
3.2 Relación de Obras ejecutadas 8
3.3 Relación de ID´s presentados a facturación 14
3.4 Relación de avance de obra por ítem 17
3.5 Relación de suministros por ítem 28
3.6 Estado de Georreferenciación 28
3.7 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo 29
4 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA 30
5 TRÁMITE DE PMT´S 30
6 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resumen ejecutivo de lo incluido en el Informe Mensual de Obra No. 16, correspondiente al periodo del 11 de mayo al 10 de junio de 2026, para la ejecución del Contrato de Obra No. 2024-3648 cuyo objeto corresponde a "**REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - ZONA 2 NORTE CENTRO**.

A continuación, se realizará el respectivo reporte de actividades ejecutadas durante el periodo reportado, teniendo en cuenta que se procedió con la suscripción del acta de inicio el pasado 11 de febrero de 2025.

Con el objetivo de dar una atención integral a la ciudad de Bogotá D.C., en temas de seguridad vial, la Secretaria Distrital de Movilidad adelantó el proceso licitatorio con el cual se están desarrollando actividades de suministro e implementación de señalización vertical, horizontal y otros elementos de seguridad vial.

Para el desarrollo del proyecto, se dividió la ciudad en siete (7) zonas con el fin de tener una cobertura y límites geográficos para cada zona y así optimizar las acciones y logística de atención integral de las medidas e intervenciones en materia de seguridad vial y señalización de la ciudad.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se relaciona la información general del contrato de obra, es importante precisar, durante el periodo del presente informe no han surgido cambios contractuales.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

ZONA 2 – NORTE CENTRO	
CONTRATO No.	2024-3648
OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA 2 NORTE CENTRO
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA´S**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	GERARDO SEGURA PÉREZ
NIT	901.899.867-5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	ANGÉLICA MARIA CONTRERAS ORJUELA
PLAZO INICIAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
FECHA DE INICIO	11/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2027
VALOR INICIAL	$ 18.771.473.428
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 1.276.983.847
VALOR TOTAL	$ 20.048.457.275
INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.	2024-3663
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

Fuente: Elaboración propia

3 AVANCE DE OBRA

3.1 Relación de ID´s asignados

A continuación, se presenta el listado de ID´s asignados para inspección e implementación hasta el periodo comprendido en el presente informe.

Tabla 2. Relación de ID´s asignados

No.	ID Diseño	Localidad
1	MV_AV_CALI_941_09_T1 (ADICIÓN No. 1 Y CONTRACTUAL)	11. Suba
2	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1	11. Suba
3	MV_AV_SUBA_1238_24	11. Suba
4	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	12. Barrios Unidos
5	MV_01_033_1560_10	11. Suba
6	MV_01_032_945_10	11. Suba
7	MV_AV_NQS_1073_24	12. Barrios Unidos
8	MV_11_314_1236_11_V7	11. Suba
9	MV_12_102_1560_10_V11	12. Barrios Unidos
10	EX_11_394_1842_12	11. Suba
11	EX_11_414_1842_12	11. Suba
12	EX_11_012_1238_24	11. Suba
13	EX_11_011_1238_24	11. Suba
14	EX_11_319_1236_11	11. Suba
15	EX_12_141_1881_12	12. Barrios Unidos
16	EX_11_001_1238_24	11. Suba
17	EX_11_002_1238_24	11. Suba
18	EX_12_010_1560_10_V7	12. Barrios Unidos
19	EX_11_413_1842_12	11. Suba
20	EX_11_400_1842_12	11. Suba
21	EX_11_005_1238_24	11. Suba
22	EX_11_376_1842_12	11. Suba
23	EX_11_390_1842_12	11. Suba
24	EX_11_412_1842_12	11. Suba
25	EX_11_004_1238_24	11. Suba
26	EX_11_006_1238_24	11. Suba
27	EX_11_005_1560_10	11. Suba
28	EX_11_037_1238_24	11. Suba
29	EX_11_014_1238_24	11. Suba
30	EX_11_007_1238_24	11. Suba
31	EX_11_003_1238_24	11. Suba
32	EX_11_396_1842_12	11. Suba
33	EX_11_415_1842_12	11. Suba
34	EX_11_016_1238_24	11. Suba
35	EX_11_017_1238_24	11. Suba
36	EX_11_036_1238_24	11. Suba

No.	ID Diseño	Localidad
37	EX_11_001_2484_21	11. Suba
38	EX_11_015_1238_24	11. Suba
39	EX_12_007_1249_11	12. Barrios Unidos
40	KR 58 No 66A 04	12. Barrios Unidos
41	SH_SV_ZPP_2470_2021_7_DE_AGOSTO_V0	12. Barrios Unidos
42	EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO)	11. Suba
43	IMPLEMENTACIÓN PASACALLES AV SUBA-COTA	11. Suba
44	CP-AK72 - AC170 (E-W_W-E)_SUBA	11. Suba
45	CP-CAM05XTS AV CL 80 - AV CR 24_BARRIOS_UNIDOS	12. Barrios Unidos
46	CP_AV_SUBA_X_AC_127_SUBA	11. Suba
47	SUMINISTROS_001	No aplica
48	CP 20243648_004 KR19 x CL 63A	12. Barrios Unidos
49	CP20243648_005 AC68 x CR57	12. Barrios Unidos
50	CICLORRUTA DE CL 83A con KR 116A	11. Suba
51	CP20243648_006 KR28_CL74_CL74A	12. Barrios Unidos
52	CP20243648_007 AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	11. Suba
53	CP20243648_008 CL71A entre KR19 y KR 20	12. Barrios Unidos
54	CONTINGENCIA IDU Ac 127 x Av Suba	11. Suba
55	CP20243648_009 CL 71A KR19-17	12. Barrios Unidos
56	CP20243648_010 INGRESO A BOGOTA	11. Suba
57	CP20243648_011 AC 68 x KR 15 - Semaf	12. Barrios Unidos
58	Pasacalles PyP regional	11. Suba
59	CP20243648_012 AK 24 x CL 66	12. Barrios Unidos
60	CP20243648_013 KR 17 x CL 66	12. Barrios Unidos
61	CP20243648_014 AV BOYACÁ x CL 138	11. Suba
62	CP20243648_015 CL 138 x AV BOYACÁ	11. Suba
63	CP20243648_016 CAM AV BOYACÁx131	11. Suba
64	CP20243648_017 CAM A. NORTEx95	12. Barrios Unidos
65	CP20243648_018 CAM CALIx135A	11. Suba
66	CP20243648_019 AC 72 X TV 56A	12. Barrios Unidos
67	CP20243648_020 CL139xKR132	11. Suba
68	CP20243648_021 AV NQSxCL72	12. Barrios Unidos
69	CP20243648_022 AK 45xCL95	11. Suba
70	CP20243648_023 AK 104 x CL 135A	11. Suba
71	PASACALLES AV CARRERA 7	Múltiple
72	IMPLEMENTACIÓN SEÑAL SI-27A VÍA SUBA COTA	11. Suba
73	PASACALLES PAR VIAL BILBAO	11. Suba
74	PROYECTO PEP COLOMBIA	12. Barrios Unidos
75	CICLORRUTA CL 127 D	11. Suba
76	CP20243648_024 CICLORRUTA AV. CALI CON KR 91	11. Suba
77	CP20243648_025 CONEXION CICLORRUTA	11. Suba
78	CP20243648_026 ALCAPARROS	11. Suba
79	CP20243648_027 MORATOS	11. Suba
80	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIDRIVE	11. Suba

No.	ID Diseño	Localidad
81	CP20243648_028 COLEGIO 21 ANGELES	11. Suba
82	CP20243648_029 KR 52A con CL 174A	11. Suba
83	CP20243648_030 CL144xKR136A	11. Suba
84	CP20243648_031 AK 45xCL127C	11. Suba
85	CP20243648_032 COLEGIO EL CAMINO ACADEMY (11_1687)	11. Suba
86	CP20243648_033 COLEGIO BILBAO	11. Suba
87	CP20243648_034 21 ANGELES_CARRERA 90	11. Suba
88	CP20243648_035 CP-AUTOPISTA. NORTE X CL 169	11. Suba
89	CP20243648_036 AV SUBA-COTA Vertical	11. Suba
90	CP20243648_037 Av Suba - Cota - Horizontal	11. Suba
91	Ciclorruta Av Boyacá_127_Av_Suba	11. Suba
92	CP20243648_038 PASACALLE AK45xCL235	11. Suba
93	CP20243648_039 VERTICAL AK45xCL235	11. Suba
94	CP20243648_040 PASACALLE AV SUBACOTAxCL116	11. Suba
95	CP20243648_041 VERTICAL AV SUBACOTAxCL116	11. Suba
96	CP20243648_042 Semaforizada Av. Boyacá con Calle 147	11. Suba
97	CP20243648_043 Vertical - SR-42 - 7 Agosto	12. Barrios Unidos
98	SUMINISTRO 002	No aplica
99	CP20243648_044 GERARDO PAREDES (ADICIÓN No. 1)	11. Suba
100	MV_AV_NQS_1073_24_V5 (ADICIÓN No. 1)	12. Barrios Unidos
101	CP20243648_045 AK 45 con CL 134D	11. Suba
102	CP20243648_046 AK 1404 X CL 133A	11. Suba
103	CP20243648_047 PLAZA FUNDACIONAL DE SUBA	11. Suba
104	CP20243648_048 COLEGIO LA GAITANA-DOMINICANA	11. Suba
105	CP20243648_049 DETECCIÓN E_AV CALI x AV SUBA	11. Suba
106	CP20243648_050 MANTENIMIENTO DE CAMARAS AV SUBA X CALLE 127	11. Suba
107	CP20243648_051 SECTOR POLO	11. Suba
108	CP20243648_052 - 11_1228 IMPLEMENTACIÓN VERTICAL	11. Suba
109	CP20243648_053 - 11_1865 INSTALACIÓN SR-28	11. Suba
110	CP20243648_054 - 11_1938 INSTALACIÓN SR-28	11. Suba
111	CP20243648_055 - 11-828 INSTALACIÓN SR-28	11. Suba
112	SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_LA_COLINA_V1	11. Suba
113	SH_SV_ZPP_2470_2021_KR47A_CL98_AC100_Olimpica	12. Barrios Unidos
114	CP 11_2116 CP20243648_056 AK45 con CL135	11. Suba
115	CP20243648_058 CL 133_KR 95B BIS	11. Suba
116	CP20243648_059 Globito Rojo	11. Suba
117	CP20243648_060 Barrio Alhambra	11. Suba
118	CP 20243648_061 11_2209 AK72 X CL 131	11. Suba
119	CP20243648_062 11_2212- AV CALI - CL 135A	11. Suba
120	CP20243648_063 11_2206 AV BOYACA X SAN JOSE	11. Suba
121	CP20243648_064 11_2218.AV BOYACÁ - CL 168	11. Suba
122	CP20243648_065 11_2219.AV BOYACÁ - CL 167	11. Suba
123	CP20243648_066 11_2220.AUTP. NORTE - CL 127B	11. Suba

No.	ID Diseño	Localidad
124	CP20243648_067 11_2221. AK 45-CL 127B	11. Suba
125	CP20243648_068 11_2215 AK 45-CL 108	11. Suba
126	CP20243648_069 11_2213 AK45-CL 102A	11. Suba
127	CP20243648_070 12_2211.AK45-CL 95	12. Barrios Unidos
128	CP20243648_071 12_2210. AK45-CL 95	12. Barrios Unidos
129	CP_20243616_072 resaltos parabólicos Calle 222 convenio UMV	11. Suba
130	CP 20243648_073 MORATOS	11. Suba

Fuente: Elaboración propia

***Nota:** Los ID´s resaltados en NARANJA corresponden a retiro de asignaciones.*

Los ID´s resaltados en AZUL corresponden a las asignaciones con recursos de la Adición No. 1

Los ID´s resaltados en AMARILLO corresponden a las asignaciones realizadas durante el periodo del presente informe MES 16.

3.2 Relación de Obras ejecutadas

Para el periodo comprendido en el presente informe, se adelantaron trabajos de implementación de señalización vial en los siguientes puntos, utilizando recursos contractuales:

Tabla 3. Relación de obras ejecutadas en el periodo – Recursos Contractuales

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
1	CP20243648_050 MANTENIMIENTO DE CAMARAS AV SUBA X CALLE 127	Avenida Suba con Avenida Calle 127	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
2	SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_LA_COLINA_V1	Carrera 73 entre Calle 164 y Calle 167	11. Suba	Horizontal y vertical	TERMINADO
3	CP20243648_056 - SH_SV_ZPP_2470_2021_KR47A_CL98_AC100	Carrera 47A entre Calle 98 y Av Calle 100 y Calle 99 entre Carrera 47A y Carrera 48	12. Barrios Unidos	Horizontal	TERMINADO
4	CP 11_2116 CP20243648_057 AK45 con CL135	AK 45 entre CL 135 y CL 134D	11. Suba	Vertical	TERMINADO
5	CP20243648_058 CL 133_KR 95B BIS	Calle 133 x Carrera 59B Bis	11. Suba	Horizontal y vertical	TERMINADO
6	CP20243648_059 Globito Rojo	CL 127B entre KR 51A y KR 49 CL 127A entre KR 51A y KR 49 KR 50A entre CL 127B y CL 127B BIS	11. Suba	Horizontal y vertical	TERMINADO
7	CP20243648_060 Barrio Alhambra	CL 123B ENTRE KR 53 Y KR 52 CL 123A ENTRE KR 52 Y AK 50	11. Suba	Horizontal y vertical	TERMINADO
8	CP20243648_072 resaltos parabólicos Calle 222 convenio UMV	Calle 222 entre Carrera 54 y Autopista Norte	11. Suba	Horizontal y vertical	EN EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se presenta la relación de obras ejecutadas durante todo el periodo de ejecución del contrato, así:

Tabla 4.Relación de obras ejecutadas

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
1	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	AV Calle 80 entre AK 68 y Av Caracas (SIN CICLORRUTA)	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
2	MV_01_033_1560_10	Autopista Norte entre AC 170 y CL 193	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
3	MV_01_032_945_10	Autopista Norte entre AC 80 y AC 170	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
4	MV_AV_NQS_1073_24	AV NQS entre AC 63 y CL 92 (COSTADO OCCIDENTAL)	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
5	PMT de emergencia KR 58 No 66A 04	KR 58 66 A 04	12. Barrios Unidos	Vertical	TERMINADO
6	IMPLEMENTACIÓN PASACALLES AV SUBA-COTA	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical	TERMINADO
7	SUMINISTROS_001	Av Cra 30 # 12A-01 Sur	N/A	N/A	ENTREGADO
8	SH_SV_ZPP_2470_2021_7_DE_AGOSTO_V0	Calle 65 entre Carrera 22 y Carrera 24 y a la Carrera 23 entre Calle 64A y Calle 66A	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
9	EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO)	calle 144 entre carrera 141 A Bis y carrera 148, calle 143 B entre carrera 141 A Bis y Carrera 148, Carrera 141A Bis entre Calle 144 y Calle 143B y Carrera 148 entre Calle 144 y Calle 143B	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
10	CP20243648_001-AK72 - AC170 (E-W_W-E)_SUBA	CL 170 CON AK 72	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
11	CP20243648_002-CAM05XTS AV CL 80 - AV CR 24_BARRIOS_UNIDOS	Calle 80 * Carrera 24	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
12	CP20243648_003_AV_SUBA_X_AC_127_SUBA	Avenida Suba con Av Calle 127	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
13	CP20243648_004 KR19 x CL 63A	Carrera 19A con Calle 63A	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	DESASIGNADO
14	CP20243648_005 AC68 x CR57	AC 68 con KR 57	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
15	CP20243648_006 KR28_CL74_CL74A	Carrera 28 entre Calle 74 y Calle 74A	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
16	CP20243648_007 AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
17	CP20243648_008 CL71A entre KR19 y KR 20	CL 71 A entre KR 19 y KR 20	12. Barrios Unidos	Horizontal	TERMINADO
18	CONTINGENCIA IDU Ac 127 x Av Suba	Avenida Calle 127 entre Avenida Suba hasta la Carrera 71D	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
19	CP20243648_009 CL 71A KR19-17	CL 71 A entre KR 19 y KR 17	12. Barrios Unidos	Horizontal	TERMINADO
20	CP20243648_010 INGRESO A BOGOTA	Autopista Norte entre CL 242 y CL 245, sentido Norte - Sur	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
21	CP20243648_011 AC 68 x KR 15 - Semaf	AC 68 x KR 15	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	TERMINADO
22	Pasacalles PyP regional	Autopista Norte x Calle 193 Calle 80 x Carrera 119 Carrera 7 x Calle 193 Vía Suba Cota x Carrera 116	11. Suba	Vertical	TERMINADO
23	CP20243648_012 AK 24 x CL 66	AK 24 con CL 66	12. Barrios Unidos	Horizontal	DESASIGNADO
24	CP20243648_013 KR 17 x CL 66	KR 17 con CL 66	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	DESASIGNADO
25	CP20243648_014 AV BOYACÁ x CL 138	AV BOYACÁ con CL 138	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
26	CP20243648_015 CL 138 x AV BOYACÁ	CL 138 con AVENIDA BOYACÁ	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
27	CP20243648_016 CAM AV BOYACÁx131	AVENIDA BOYACÁ CON CL 131 SENTIDO (N-S) Y (S-N)	11. Suba	Vertical	TERMINADO
28	CP20243648_017 CAM A.NORTEx95	AU. NORTE CON CL 95 (N-S) C. RAP / (S-N) C. LENTA	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	TERMINADO
29	CP20243648_018 CAM CALIx135A	AV. CIUDAD DE CALI CON CL 135 A (N-S) Y (S-N)	11. Suba	Vertical	TERMINADO
30	CP20243648_019 AC 72 X TV 56A	INTERSECCION SEMAFORIZADA AC 72 X TV 56A	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	TERMINADO
31	CP20243648_020 CL139xKR132	CALLE 139 - CARRERA 131 (TRAMO ORIENTE - OCCIDENTE)	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
32	CP20243648_021 AV NQSxCL72	AV NQS - AV CL 72 (NS) Y (SN)	12. Barrios Unidos	Vertical	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
33	CP20243648_022 AK 45xCL95	AK 45 x CL 95	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
34	MV_01_033_1560_10 Ciclorruta	Autopista Norte entre AC 170 y CL 193	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
35	REPOSICIÓN PASACALLE AV SUBA-COTA	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical	TERMINADO
36	PASACALLES AV CARRERA 7	Avenida Carrera Séptima	Múltiple	Vertical	TERMINADO
37	MV_AV_CALI_941_09_T1	Avenida ciudad de Cali desde la Diagonal 91 hasta la Calle 166	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
38	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1	Avenida Boyacá entre la AC 170 y y Canal Salitre (SIN CICLORRUTA)	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
39	CP20243648_023 AK 104 x CL 135A	AK 104 con CL 135A	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
40	IMPLEMENTACIÓN SEÑAL SI-27A VÍA SUBA COTA	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical	TERMINADO
41	PASACALLES PAR VIAL BILBAO	Cl 144 con Kr 141A Kr 145 con Cl 144 Kr 141 A BIS con Cl 143B	11. Suba	Vertical	TERMINADO
42	PROYECTO PEP COLOMBIA	Cl 71A entre Kr 19 y Kr 21 Dg 71 A Bis entre Kr 20 y Ac 72 Kr 20 entre Cl 71 A Bis y Ac 72	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	TERMINADO
43	CICLORRUTA CL 127 D	CALLE 127 D ENTRE AV BOYACA Y AV SUBA	11. Suba	Vertical y Horizontal	DESASIGNADO
44	CP20243648_024 CICLORRUTA AV.CALI CON KR 91	CARRERA 91 POR AV CIUDAD DE CALI	11. Suba	Vertical	TERMINADO
45	CP20243648_025 CONEXION CICLORRUTA	CL 137 D con AV SUBA	11. Suba	Vertical y Horizontal	DESASIGNADO
46	CP20243648_026 ALCAPARROS	CL 133A entre CR 107B y AK 104	11. Suba	Vertical y Horizontal	DESASIGNADO
47	CP20243648_027 MORATOS	AK 70 con CL 98	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
48	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIDRIVE_V0	Carrea 59 entre Calle 152 y AC 153	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
49	CP20243648_028 COLEGIO 21 ANGELES	Carrera 128 entre Calle 144 y Calle 142D	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
50	CP20243648_029SEMAFORIZADA CL 174A-KR 52A	CL 174A-KR 52A	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
51	CP20243648_030 CL144xKR136A	Calle 144 con Carrera 136A	11. Suba	Horizontal	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
52	CP20243648_031 AK 45xCL127C	Autopista Norte entre CL 127C y CL 127D (N-S) C. LENT	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
53	CP20243648_032 COLEGIO EL CAMINO ACADEMY (11_1687)	Calle 221 por Carrera 52	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
54	CP20243648_033 COLEGIO BILBAO	Calle 144 por Carrera 127C Carrera 118 entre Calle 143A y Calle 144 Calle 143A entre Carrera 118 y Carrera 127C	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
55	CP20243648_034 21 ANGELES_CARRERA 90	Carrera 90 entre Calle 149 y Calle 159A	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
56	CP20243648_035 CP-AUTOPISTA. NORTE X CL 169	Autopista Norte x Calle 169	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
57	CP20243648_036 AV SUBA-COTA Vertical	Av Suba - Cota entre Ingreso a Bogotá y Calle 169B	11. Suba	Vertical	TERMINADO
58	CP20243648_037 Av Suba - Cota - Horizontal	Av Suba - Cota entre Carrera 111 y Carrera 112	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
59	Ciclorruta Av Boyacá_127_Av_Suba	ciclorruta de Av. Boyacá entre AC 127 y Av Suba	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
60	CP20243648_038 PASACALLE AK45xCL235	Autopista Norte por Calle 235	11. Suba	Vertical	TERMINADO
61	CP20243648_039 VERTICAL AK45xCL235	Autopista Norte por Calle 235	11. Suba	Vertical	TERMINADO
62	CP20243648_040 PASACALLE AV SUBACOTAxCL116	Av Suba-Cota por Calle 116	11. Suba	Vertical	TERMINADO
63	CP20243648_041 VERTICAL AV SUBACOTAxCL116	Av Suba-Cota por Calle 116	11. Suba	Vertical	TERMINADO
64	CP20243648_042 Semaforizada Av. Boyacá con Calle 147	Avenida Boyacá x Calle 147	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
65	CP20243648_043 Vertical - SR-42 - 7 Agosto	Carrera 23 entre Calle 65 y Calle 64	12. Barrios Unidos	Vertical	TERMINADO
66	SUMINISTRO 002	N/A	No aplica	Vertical	ENTREGADO
67	CP20243648_044 GERARDO PAREDES	DG 127 Bis entre KR 91 y CL 127C CL 127B entre KR 91C y KR 92B	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
68	MV_AV_NQS_1073_24_V5	AV NQS entre AC 63 y CL 92	12. Barrios Unidos	Horizontal	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
69	CP20243648_045 AK 45 con CL 134D	AK 45 x CL 134D	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
70	CP20243648_046 AK 1404 X CL 133A	AK 104 entre CL 133A y CL 137	11. Suba	Vertical y Horizontal	DESASIGNADO
71	CP20243648_047 PLAZA FUNDACIONAL DE SUBA	Desde la Calle 147 hasta la Calle 146B entre Carrera 90 y carrera 91	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
72	CP20243648_048 COLEGIO LA GAITANA-DOMINICANA	Desde la Transversal 126B hasta la Carrera 124 entre Calle 130F y Calle 135B	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
73	CP20243648_049 DETECCIÓN E_AV CALI x AV SUBA	Av. Ciudad de Cali con Av. Suba	11. Suba	Vertical y Horizontal	INSPECCIONADO
74	CP20243648_050 MANTENIMIENTO DE CAMARAS AV SUBA X CALLE 127	Avenida Suba con Avenida Calle 127	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
75	CP20243648_051 SECTOR POLO	Calle 85A con Carrera 22A	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
76	CP20243648_052 - 11_1228 IMPLEMENTACIÓN VERTICAL	Calle 130 entre Carrera 89 y Carrera 91	11. Suba	Vertical	TERMINADO
77	CP20243648_053 - 11_1865 INSTALACIÓN SR-28	Calle 152B entre Carrera 58 y Carrera 59	11. Suba	Vertical	TERMINADO
78	CP20243648_054 - 11_1938 INSTALACIÓN SR-28	Calle 147B entre Carrera 86 y Carrera 89	11. Suba	Vertical	TERMINADO
79	CP20243648_055 - 11-828 INSTALACIÓN SR-28	Carrera 158B entre Calle 138 y Calle 139	11. Suba	Vertical	TERMINADO
80	SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_LA_COLINA_V1	Carrera 73 entre Calle 164 y Calle 167	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
81	CP20243648_056 - SH_SV_ZPP_2470_2021_KR47A_CL98_AC100	Carrera 47A entre Calle 98 y Av Calle 100 y Calle 99 entre Carrera 47A y Carrera 48	12. Barrios Unidos	Horizontal	TERMINADO
82	CP 11_2116 CP20243648_057 AK45 con CL135	AK 45 entre CL 135 y CL 134D	11. Suba	Vertical	TERMINADO
83	CP20243648_058 CL 133_KR 95B BIS	Calle 133 x Carrera 59B Bis	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
84	CP20243648_059 Globito Rojo	CL 127B entre KR 51ª y KR 49 CL 127A entre KR 51ª y KR 49 KR 50ª entre CL 127B y CL 127B BIS	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
85	CP20243648_060 Barrio Alhambra	CL 123B ENTRE KR 53 Y KR 52 CL 123A ENTRE KR 52 Y AK 50	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
86	CP 20243648_061 11_2209 AK72 X CL 131	Avenida Boyacá x Calle 131	11. Suba	Vertical	INSPECCIONADO
87	CP20243648_062 11_2212-AV CALI - CL 135A	Av Ciudad de Cali x Calle 135A	11. Suba	Vertical	INSPECCIONADO
88	CP20243648_063 11_2206 AV BOYACA X SAN JOSE	Avenida Boyacá x Av San José	11. Suba	Vertical	INSPECCIONADO
89	CP20243648_064 11_2218.AV BOYACÁ - CL 168	Avenida Boyacá x Calle 168	11. Suba	Vertical	INSPECCIONADO
90	CP20243648_065 11_2219.AV BOYACÁ - CL 167	Avenida Boyacá x Calle 167	11. Suba	Vertical	INSPECCIONADO
91	CP20243648_066 11_2220.AUTP. NORTE - CL 127B	Autopista Norte x Calle 127B	11. Suba	Vertical	INSPECCIONADO
92	CP20243648_067 11_2221. AK 45-CL 127B	Autopista Norte x Calle 127B	11. Suba	Vertical	INSPECCIONADO
93	CP20243648_068 11_2215 AK 45-CL 108	Autopista Norte x Calle 108	11. Suba	Vertical	INSPECCIONADO
94	CP20243648_069 11_2213 AK45-CL 102A	Autopista Norte x Calle 102A	11. Suba	Vertical	INSPECCIONADO
95	CP20243648_070 12_2211.AK45-CL 95	Autopista Norte x Calle 95	12. Barrios Unidos	Vertical	INSPECCIONADO
96	CP20243648_071 12_2210. AK45-CL 95	Autopista Norte x Calle 95	12. Barrios Unidos	Vertical	DESASIGNADO
97	CP20243648_072 resaltos parabólicos Calle 222 convenio UMV	Calle 222 entre Carrera 54 y Autopista Norte	11. Suba	Horizontal y vertical	EN EJECUCIÓN
98	CP 20243648_073 MORATOS	Av de la Constitución por Calle 98	11. Suba	Horizontal	INSPECCIONADO

Fuente: Elaboración propia

3.3 Relación de ID´s presentados a facturación

A continuación, se presenta el consolidado de avance físico ejecutado por el contratista durante el presente mes:

Tabla 5. Discriminación de valor de implementación por ID – Contractual

ID	Inicio de implementación	Implementación Vertical	Implementación Horizontal	Valor Total
CP20243648_050 MANTENIMIENTO DE	08/05/2026	$ -	$ 40,840,449.00	$ 40,840,449.00

ID	Inicio de implementación	Implementación Vertical	Implementación Horizontal	Valor Total
CAMARAS AV SUBA X CALLE 127				
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_LA_COLINA_V1	06/05/2026	$ 6,584,416.00	$ 20,550,443.00	$ 27,134,859.00
CP20243648_056 - SH_SV_ZPP_2470_2021_KR47A_CL98_AC100_Olimpica	15/05/2026	$ -	$ 17,110,613.00	$ 17,110,613.00
CP 11_2116 CP20243648_057 AK45 con CL135	04/06/2026	$ 6,827,813.00	$ -	$ 6,827,813.00
CP20243648_058 CL 133_KR 95B BIS	22/05/2026	$ 1,154,421.00	$ 9,311,600.00	$ 10,466,021.00
CP20243648_059 Globito Rojo	27/05/2026	$ 9,893,975.00	$ 25,488,199.00	$ 35,382,174.00
CP20243648_060 Barrio Alhambra	24/05/2026	$ 18,927,632.00	$ 42,979,291.00	$ 61,906,923.00
VALOR TOTAL IMPLEMENTADO		**$ 43,388,257.00**	**$ 156,280,595.00**	**$ 199,668,852.00**

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se presenta el consolidado de implementación para los ID´s ejecutados en el contrato, así:

Tabla 6. Valores totales de implementación

No.	ID	Valor Total
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1	$2,657,445,033.00
2	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	$1,255,927,003.00
3	MV_01_033_1560_10	$305,103,255.00
4	MV_01_032_945_10	$2,342,378,207.00
5	MV_AV_NQS_1073_24	$536,881,886.00
6	PMT EMERGENCIA KR 58 No 66A 04	$6,329,522.00
7	SH_SV_ZPP_2470_2021_7_DE_AGOSTO_V0	$67,485,610.00
8	EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO)	$195,101,635.00
9	IMPLEMENTACIÓN PASACALLES AV SUBA-COTA	$8,874,383.00
10	CP001-AK72 - AC170 (E-W_W-E)_SUBA	$21,996,726.00
11	CP002-CAM05XTS AV CL 80 - AV CR 24_BARRIOS_UNIDOS	$19,469,693.00
12	CP003_AV_SUBA_X_AC_127_SUBA	$19,005,925.00
13	SUMINISTROS_001	$139,939,367.00
14	CP005 AC68 x CR57	$32,099,939.00
15	CP006 KR28_CL74_CL74A	$17,635,283.00
16	CP007 AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	$7,958,656.00
17	CP008 CL71A entre KR19 y KR 20	$6,682,290.00

No.	ID	Valor Total
18	CONTINGENCIA IDU Ac 127 x Av Suba	$7,303,204.00
19	CP20243648_009 CL 71A KR19-17	$4,384,188.00
20	CP20243648_010 INGRESO A BOGOTA	$5,701,039.00
21	CP20243648_011 AC 68 x KR 15 - Semaf	$55,232,976.00
22	Pasacalles PyP regional	$17,102,664.00
23	CP20243648_014 AV BOYACÁ x CL 138	$52,884,077.00
24	CP20243648_016 CAM AV BOYACÁx131	$11,366,096.00
25	CP20243648_017 CAM A.NORTEx95	$10,167,366.00
26	CP20243648_018 CAM CALIx135A	$7,566,631.00
27	CP20243648_019 AC 72 X TV 56A	$24,976,428.00
28	CP20243648_020 CL139xKR132	$57,540,788.00
29	CP20243648_021 AV NQSxCL72	$4,559,178.00
30	CP20243648_022 AK 45xCL95	$4,459,456.00
31	CP20243648_023 AK 104 x CL 135A	$60,834,586.00
32	PASACALLES AV CARRERA 7	$34,205,328.00
33	IMPLEMENTACIÓN SEÑAL SI-27A VÍA SUBA COTA	$1,865,238.00
34	PASACALLES PAR VIAL BILBAO	$3,347,688.00
35	CP20243648_024 CICLORRUTA AV.CALI CON KR 91	$537,348.00
36	CP20243648_026 ALCAPARROS	$4,448,220.00
37	CP20243648_027 MORATOS	$6,228,539.00
38	EX_12_141_1881_12_V9 (URB TACTICO)	$79,768,544.00
39	EX_11_380_1842_12_V5 CICLORRUTA CALLE 127D	$25,713,832.00
40	SH_SV_ZPP_2470_2021_ MULTIDRIVE_V0	$122,910,942.00
41	CP_20243648_031 AK 45 x CL 127C - MV_01_032_945_10	$1,693,353.00
42	CP20243648_035 CP-AUTOPISTA. NORTE X CL 169	$6,878,123.00
43	CP20243648_028 COLEGIO 21 ANGELES	$204,836,787.00
44	CP20243648_029SEMAFORIZADA CL 174A-KR 52A	$23,064,830.00
45	CP20243648_032 COLEGIO EL CAMINO ACADEMY	$3,274,678.00
46	CP20243648_036 AV SUBA-COTA Vertical	$15,417,423.00
47	CP20243648_037 Av Suba - Cota - Horizontal	$7,523,212.00
48	Ciclorruta Av Boyacá_127_Av_Suba	$409,900,243.00
49	CP20243648_042 Semaforizada Av. Boyacá con Calle 147	$30,351,418.00
50	CP20243648_030 CL144xKR136A	$27,139,850.00
51	CP20243648_038 PASACALLE AK45xCL235	$2,087,950.00
52	CP20243648_039 VERTICAL AK45xCL235	$1,977,087.00
53	CP20243648_040 PASACALLE AV SUBACOTAxCL116	$4,527,455.00
54	CP20243648_041 VERTICAL AV SUBACOTAxCL116	$1,575,720.00
55	CP20243648_043 Vertical - SR-42 - 7 Agosto	$472,981.00

No.	ID	Valor Total
56	SUMINISTRO 002	$46,214,529.00
57	CP20243648_044 GERARDO PAREDES	$42,842,580.00
58	MV_AV_NQS_1073_24	$836,937,745.00
59	CP20243648_033 COLEGIO BILBAO	$75,769,127.00
60	CP20243648_034 21 ANGELES_CARRERA 90	$124,972,010.00
61	CP20243648_045 AK 45 con CL 134D	$13,468,874.00
62	CP20243648_047 PLAZA FUNDACIONAL DE SUBA	$33,382,641.00
63	CP20243648_048 COLEGIO LA GAITANA-DOMINICANA	$261,907,455.00
64	MV_AV_CALI_941_09_T1	$397,203,522.00
	MV_AV_CALI_941_09_T1	$1,329,841,008.00
65	CP20243648_051 SECTOR POLO	$2,481,921.00
66	CP20243648_052 - 11_1228 IMPLEMENTACIÓN VERTICAL	$1,203,621.00
67	CP20243648_053 - 11_1865 INSTALACIÓN SR-28	$2,450,309.00
68	CP20243648_054 - 11_1938 INSTALACIÓN SR-28	$1,543,892.00
69	CP20243648_055 - 11-828 INSTALACIÓN SR-28	$3,035,969.00
70	CP20243648_050 MANTENIMIENTO DE CAMARAS AV SUBA X CALLE 127	$40,840,449.00
71	SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_LA_COLINA_V1	$27,134,859.00
72	CP20243648_056 - SH_SV_ZPP_2470_2021_KR47A_CL98_AC100_Olimpica	$17,110,613.00
73	CP 11_2116 CP20243648_057 AK45 con CL135	$6,827,813.00
74	CP20243648_058 CL 133_KR 95B BIS	$10,466,021.00
75	CP20243648_059 Globito Rojo	$35,382,174.00
76	CP20243648_060 Barrio Alhambra	$61,906,923.00
VALOR TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN		**$12,357,063,934.00**

Fuente: Elaboración propia

De la tabla anterior, se puede concluir que se han radicado para revisión y aprobación de la interventoría obras por un valor acumulado de *$ 12.357.063.934,00* equivalente al 61.64% del valor total del contrato.

3.4 Relación de avance de obra por ítem

A continuación, se presenta el consolidado de cantidades de obra ejecutadas por cada uno de los ítems presentados en la propuesta económica.

Tabla 7. Relación de obra por Item

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	0.60	$ 387,126.00	*$ 124,384.00*	2.00	$ 511,510.00	$ 306,906.00
	UND		2.00	$ 116,138.00	*$ 37,315.00*		$ 153,453.00	
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	2.00	$ 123,138.00	*$ 39,564.00*	2.00	$ 162,702.00	$ 325,404.00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	9.00	$ 170,387.00	*$ 54,745.00*	9.00	$ 225,132.00	$ 2,026,188.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	19.00	$ 292,116.00	*$ 93,857.00*	19.00	$ 385,973.00	$ 7,333,487.00
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	11.00	$ 462,430.00	*$ 148,579.00*	11.00	$ 611,009.00	$ 6,721,099.00
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina	5.00	$ 584,051.00	*$ 187,656.00*	5.00	$ 771,707.00	$ 3,858,535.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.						
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	1.80	$ 407,437.00	*$ 130,909.00*	9.00	$ 538,346.00	$ 969,022.80
	UND		9.00	$ 81,487.00	*$ 26,182.00*		$ 107,669.20	
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	3.00	$ 530,051.00	*$ 170,305.00*	3.00	$ 700,356.00	$ 2,101,068.00
17	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente,	2.00	$ 309,788.00	*$ 99,535.00*	2.00	$ 409,323.00	$ 818,646.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.						
18	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	13.00	$ 411,271.00	*$ 132,141.00*	13.00	$ 543,412.00	$ 7,064,356.00
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	3.00	$ 214,324.00	*$ 68,862.00*	3.00	$ 283,186.00	$ 849,558.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
22	UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	9.00	$ 165,333.00	*$ 53,122.00*	9.00	$ 218,455.00	$ 1,966,095.00
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	11.00	$ 46,410.00	*$ 14,911.00*	N/A	$ 61,321.00	$ 674,531.00
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	47.00	$ 24,888.00	*$ 7,996.00*	N/A	$ 32,884.00	$ 1,545,548.00
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	2,157.90	$ 1,863.00	*$ 598.00*	N/A	$ 2,461.00	$ 5,310,591.90

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
33	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	30.00	$ 2,517.00	*$ 809.00*	N/A	$ 3,326.00	$ 99,780.00
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	1,185.33	$ 13,096.00	*$ 4,208.00*	N/A	$ 17,304.00	$ 20,510,950.32
36	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	1,183.60	$ 4,418.00	*$ 1,420.00*	N/A	$ 5,837.00	$ 6,908,673.20
39	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	190.97	$ 41,679.00	*$ 13,391.00*	N/A	$ 55,070.00	$ 10,516,717.90
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	185.28	$ 45,075.00	*$ 14,482.00*	N/A	$ 59,557.00	$ 11,034,720.96

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	974.30	$ 6,173.00	*$ 1,983.00*	N/A	$ 8,156.00	$ 7,946,390.80
57	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	30.00	$ 11,703.00	*$ 3,760.00*	N/A	$ 15,463.00	$ 463,890.00
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	49.27	$ 55,433.00	*$ 17,810.00*	N/A	$ 73,243.00	$ 3,608,682.61

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	71.46	$ 57,360.00	*$ 18,430.00*	N/A	$ 75,790.00	$ 5,415,953.40
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	34.74	$ 94,112.00	*$ 30,238.00*	N/A	$ 124,350.00	$ 4,319,919.00
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	236.80	$ 97,508.00	*$ 31,329.00*	N/A	$ 128,837.00	$ 30,508,601.60
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa	168.00	$ 7,817.00	*$ 2,511.00*	168.00	$ 10,328.00	$ 1,735,104.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		de la NTC 4745 (Tabla 1).						
72	UN	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	3,134.00	$ 7,253.00	*$ 2,331.00*	3,134.00	$ 9,583.00	$ 30,033,122.00
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	72.00	$ 11,996.00	*$ 3,854.00*	72.00	$ 15,850.00	$ 1,141,200.00
75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye	23.00	$ 85,339.00	*$ 27,419.00*	23.00	$ 112,759.00	$ 2,593,457.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		accesorios y materiales para fijación.						
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	25.00	$ 53,705.00	*$ 17,256.00*	25.00	$ 70,961.00	$ 1,774,025.00
95	UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	33.00	$ 2,958.00	*$ 950.00*	N/A	$ 3,908.00	$ 128,964.00
98	UN	Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM	1.00	$ 879,927.00	*$ 282,721.00*	N/A	$ 1,162,647.00	$ 1,162,647.00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	228.33	$ 35,649.00	*$ 11,454.00*	N/A	$ 47,103.00	$ 10,755,027.99
127	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales con microesfera y	28.16	$ 39,637.00	*$ 12,735.00*	N/A	$ 52,373.00	$ 1,474,823.68

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas						
129	M2	Suministro e instalación de tableros y/o lamas en lamina galvanizada C-20, papel retroflectivo tipo XI; fondos, textos, flechas, pictogramas y orlas en impresión digital. Incluye papel antigrafitti, tornilleria, perfiles para marcos y abrazaderas.	7.44	$ 761,447.00	*$ 185,161.00*	1.00	$ 576,286.00	$ 5,665,166.00
	UND		1.00	$ 4,287,570.00	*$ 1,377,596.00*		$ 5,665,166.00	
TOTAL, OBRA								**$ 199,668,852.00**

Fuente: Elaboración propia

3.5 Relación de suministros por ítem

Para el periodo del presente informe, no se entregaron elementos por suministro.

3.6 Estado de Georreferenciación

Se presenta en la siguiente tabla el consolidado del reporte de Georreferenciación durante el plazo contractual.

Tabla 8. Estado de Georreferenciación

ID implementado	Revisión / Aprobación Interventoría Planilla	Compromiso de entrega	Estado de Georreferenciación
MV_AV_SUBA_1238_24	APROBADA	21/05/2026	APROBADA SDM
SH_SV_ZPP_2470_2021_KR47A_CL98_AC 100	APROBADA	2/06/2026	ATENCIÓN CONTRATISTA
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_LA_CO LINA	APROBADA	10/06/2026	REVISIÓN INTERVENTORÍA
EX_11_334_1236_11	APROBADA	10/06/2026	REVISIÓN INTERVENTORÍA
EX_11_011_1560_10	APROBADA	11/06/2026	EN ELABORACIÓN
EX_11_399_1842_12	APROBADA	10/06/2026	REVISIÓN INTERVENTORÍA

ID implementado	Revisión / Aprobación Interventoría Planilla	Compromiso de entrega	Estado de Georreferenciación
MV_01_032_945_10	APROBADA	11/06/2026	EN ELABORACIÓN

Fuente: Elaboración propia

3.7 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo

Para el periodo comprendido en el presente informe, se presentaron las siguientes situaciones:

- Teniendo en cuenta la actualización del Manual de Señalización de Colombia 2024, en los cuales se generaron cambios en algunas marcas, se evidenció mayor tiempo de elaboración de los Planos Récord, ya que estas marcas deben ser actualizados previo al envío de la georreferenciación.
- Durante el periodo del presente informe, aún se encuentra en estudio el estado actual de las reservas para el ID MV_AV_CALI_941_09_T1, lo anterior, ha implicado una pausa en la instalación de la señalización vertical sobre el corredor. Adicionalmente, y de acuerdo a lo presentado en los comités de seguimiento semanal, se encuentra en revisión la liberación de las reservas entre la Entidad y el IDU.
- A la fecha de corte del presente informe, aún no se levantan las reservas ni se obtiene respuesta por entidades externas respecto al aval para la implementación al compromiso prioritario CP20243648_049 DET. ELECTÓNICA AK 104 x AV SUBA, sin embargo, se encuentra a la espera una directriz por parte de la Entidad, luego de realizar comunicación directa con el IDU.
- Durante el periodo del presente informe se procedió con la implementación del CP20243648_058 CL 133_KR 95B BIS, teniendo en cuenta que, tal como se manifestó en el informe de inspección y según lo acordado en los comités, no se procedió con la instalación de las señales SP-25A, ni las señales ubicadas sobre el CIV 11008207, en razón a que se encuentra el elemento ANDÉN reservado por una Entidad Privada Externa “IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRITO INTERNACIONAL”. Adicionalmente, y de acuerdo a la limitación para la instalación de estas señales cuya función es prevenir del elemento de reducción de velocidad, sobre la calzada no se procedió con la construcción de las bandas en agregado.
- A la fecha de corte del presente informe, y de acuerdo a los ID´s asignados para IMPLEMENTACIÓN, se evidencian reservas activas relacionadas a continuación, es importante mencionar que, estas solicitudes fueron radicadas y a la fecha, no se ha obtenido respuesta:
    - CP20243648_063 11_2206 AV BOYACA X SAN JOSE – CIV´s 11000327 – 11000479 sobre el andén, se encuentran RESERVADOS por el IDU, comunicación de consulta **CE-UTZ2-390** con radicado **202652600795272**, del 20 de mayo de 2026.

- CP20243648_068 11_2215 AK 45-CL 108 – CIV´s 1006246 sobre andén, se encuentra RESERVADO por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, comunicación de consulta **CE-UTZ2-391**, radicada por correo electrónico el 20 de mayo de 2026.

❖ Durante el periodo del presente informe se realizaron diversas asignaciones para INSPECCIÓN, PRESUPUESTO y CRONOGRAMA, a los siguientes ID´s: Proyecto Carril Bus AC 63, SH_SV_ZPP_2470_2021_SU_PRESENCIA_V0, CP 11_2328_CP_RESALTOS_CL_169A, se encuentran reservas en los CIV´s por parte de entidades externas lo cual se debe evaluar y coordinar previo a la implementación. Por esta razón, en los casos que aplicara se remitieron comunicaciones de consulta sobre alcance de actividades de obra, a la fecha de corte del presente informe, se espera respuesta sobre el estado de las reservas.

4 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Para el periodo comprendido en el presente informe, no se evidenciaron en los puntos de obra cruces de proyectos con otras entidades.

5 TRÁMITE DE PMT´S

Para la elaboración y presentación de los PMT´s se toman en cuenta los CIV´s y se determinan los esquemas de cerramiento y/o desvíos a implementar según la necesidad y considerando el tipo de vía en la que se ejecutan las actividades.

A continuación, se relacionan los PMT´s solicitados durante el mes No. 16, entre los cuales se pasaron por modalidad normal y emergencia:

Tabla 9. Relación de PMT´s presentados

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACION	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Horario
ZPP OLIMPICA	ESPECIFICO	07/05/2026	coi_20_(2026_05_14)_ad_1	15/05/2026	15/05/2026	13/06/2026	22:00 A 5:00
ELEVADA AUTONORTE X CL134	NORMAL	07/05/2026	coi_20_(2026_05_14)_ad_1	14/05/2026	15/05/2026	26/06/2026	22:00 A 5:00
ZPP LA COLINA	NORMAL	07/05/2026	coi_20_(2026_05_14)_ad_1	14/05/2026	21/05/2026	31/05/2026	22:00 A 5:00
EMERGENCIA CL133 KR58B - 58C	EMERGENCIA	20/05/2026	EMERGENCIA SDM (CL 133 KR 59B - SUBA) 2026	21/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	22:00 A 5:00

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACION	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Horario
EMERGENCIA ALHAMBRA	EMERGENCIA	20/05/2026	EMERGENCIAS SDM (KR 53 CL 123 - SUBA) 2026	21/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	24 horas
EMERGENCIA GLOBITO ROJO	EMERGENCIA	20/05/2026	EMERGENCIAS SDM (CL 127A KR 51A - SUBA) 2026	21/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	22:00 A 5:00
GARANTIAS BILBAO CL 144 y o CL143A entre KR 118 y KR127C	NORMAL	21/05/2026	coi_22_(2026_05_28)	28/05/2026	29/05/2026	09/07/2026	22:00 a 5:00
CP 20243648_061 11_2209 AK72 X CL 131	NORMAL	28/05/2026	COI No. 23 JUNIO 04 DE 2026	04/06/2026	05/06/2026	16/07/2026	22:00-04:00
CP20243648_062 11_2212-AV CALI - CL 135A	NORMAL	28/05/2026	COI No. 23 JUNIO 04 DE 2026	04/06/2026	05/06/2026	16/07/2026	22:00-04:00
CP20243648_063 11_2206 AV BOYACA X SAN JOSE	NORMAL	28/05/2026	COI No. 23 JUNIO 04 DE 2026	04/06/2026	05/06/2026	16/07/2026	22:00-04:00
CP20243648_064 11_2218.AV BOYACÁ - CL 168	NORMAL	28/05/2026	COI No. 23 JUNIO 04 DE 2026	04/06/2026	05/06/2026	16/07/2026	22:00-04:00
CP20243648_065 11_2219.AV BOYACÁ - CL 167	NORMAL	28/05/2026	COI No. 23 JUNIO 04 DE 2026	04/06/2026	05/06/2026	16/07/2026	22:00-04:00
CP20243648_066 11_2220.AUTP. NORTE - CL 127B	NORMAL	28/05/2026	PMT NEGADO - SE ENCUENTRA EN REVISIÓN				
CP20243648_067 11_2221. AK 45-CL 127B	NORMAL	28/05/2026	PMT NEGADO - SE ENCUENTRA EN REVISIÓN				
CP20243648_068 11_2215	NORMAL	28/05/2026	PMT NEGADO - SE ENCUENTRA EN REVISIÓN				


ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACION	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Horario
AK 45-CL 108							
CP20243648_069 11_2213 AK45-CL 102A	NORMAL	28/05/2026	PMT NEGADO - SE ENCUENTRA EN REVISIÓN				
CP20243648_070 12_2211.AK45-CL 95	NORMAL	28/05/2026	COI No. 23 JUNIO 04 DE 2026	04/06/2026	05/06/2026	16/07/2026	22:00-04:00
ZPP MULTIDRIVE (GARANTIAS)	NORMAL	04/06/2026	COI No. 11 JUNIO 04 DE 2026	11/06/2026	12/06/2026	11/07/2026	22:00 a 5:00

Fuente: Elaboración propia

6 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha de corte del presente informe se asignaron ciento treinta (130) ID´s, correspondientes a cuarenta y cuatro (44) diseños normales, dos (2) suministros, nueve (9) medidas de gestión, setenta y tres (73) compromisos prioritarios y dos (2) emergencias, de los cuales se han inspeccionado un total de noventa y cuatro (94), discriminados de la siguiente forma:
  - Un (1) ID en ejecución
    - CP20243648_072 resaltos parabólicos Calle 222 convenio UMV
  - Doce (12) ID´s inspeccionados
    - CP20243648_049 DETECCIÓN E_AV CALI x AV SUBA
    - CP 20243648_061 11_2209 AK72 X CL 131
    - CP20243648_063 11_2206 AV BOYACA X SAN JOSE
    - CP20243648_064 11_2218.AV BOYACÁ - CL 168
    - CP20243648_065 11_2219.AV BOYACÁ - CL 167
    - CP20243648_066 11_2220.AUTP. NORTE - CL 127B
    - CP20243648_067 11_2221. AK 45-CL 127B
    - CP20243648_068 11_2215 AK 45-CL 108
    - CP20243648_069 11_2213 AK45-CL 102ª
    - CP 20243648_073 MORATOS
  - Ocho (8) ID´s desasignados por circunstancias externas al contratista, como inconvenientes con la comunidad
    - CICLORRUTA CL 127 D (Desasignado el 14 octubre de 2025)
    - CP20243648_025 CONEXION CICLORRUTA (Desasignado el 14 octubre de 2025)

        - CP20243648_026 ALCAPARROS (Desasignado 4 de octubre de 2025)
        - CP20243648_046 AK 1404 X CL 133ª (Desasignado 28 de enero de 2026)
        - CP004 KR19 x CL 63ª
        - CP20243648_012 AK 24 x CL 66
        - CP20243648_013 KR 17 x CL 66
        - CP20243648_071 12_2210. AK45-CL 95
    - Setenta y tres (73) ID´s terminados
    - Dos (2) suministros entregados
- A partir de la fecha de suscripción de la **ADICIÓN No. 1** y acumuladas al presente informe, con cargo al **RP 3169** se ha presentado una afectación presupuestal de **$ 559.347.359,00** (agotando su valor), y del **RP 3170** una afectación de **$ 120.450.694,00** (agotando su valor).
- A la fecha de corte del presente periodo MES 16, se han ejecutado actividades de obra contractual por un valor de **$ 12.357.063.934,00**, equivalente al **61.64%** del valor total del contrato.
- A la fecha no se presenta atraso en la ejecución del contrato, el valor ejecutado contractual de **$ 11.080.080.087,00**; presenta un **+5.21%** de desviación del mismo respecto a las metas de ejecución contractual que corresponden a **$ 10.102.806.996,00**. Lo anterior, se evidencia en el siguiente gráfico:

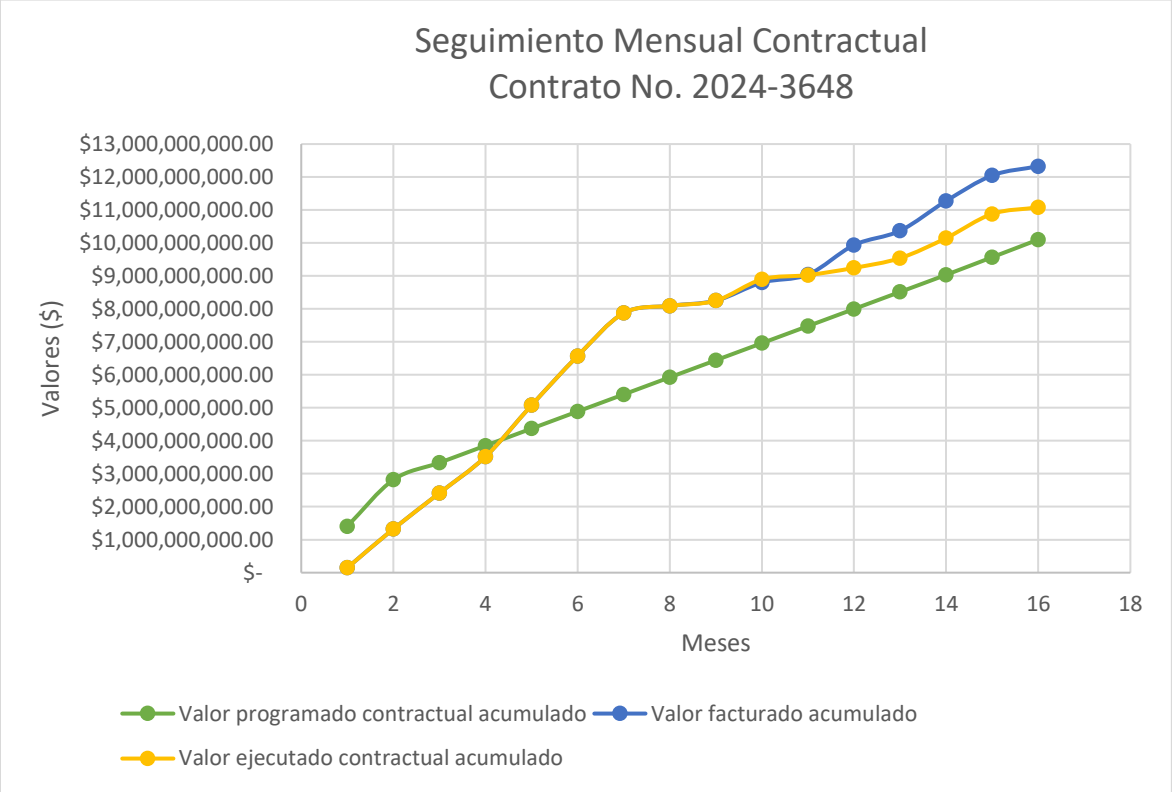

- De acuerdo a las actividades desarrolladas desde el componente de Georreferenciación, y según lo establecido contractualmente, se procederá con la facturación por georreferenciación del Mes 15, correspondiente a $ 109.832.175,00.
