INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 386 DE 2025

CONTRATO Nº 386 DE 2025


OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 654.689.664,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
SUPERVISOR	BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

INICIO CONTRATO	9-may-25
FECHA TERMINACION CONTRATO	30-may-26
ADICIÓN No 1	$ 51.732.240,00
ADICIÓN No 2	$ 9.778.866,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 716.200.770,00
VALOR EJECUTADO	$ 360.667.875
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 355.532.895
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE EJECUTADO	50%

CRP	
834	**833**
614.506.992	40.182.672
CDP	
434	**435**
614.506.992	40.182.672



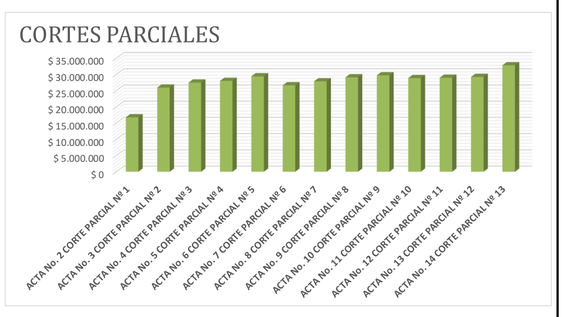

INFORMACION JURIDICA	
ACTA Nº	DESCRIPCIÓN
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1
3	ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2
4	ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3
5	ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4
6	ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5
7	ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6
8	ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7
9	ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8
10	ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9
11	ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10
12	ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11
13	ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12
14	ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 386-2025

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1	may-25	$ 16.760.645	$ 0	$ 16.760.645
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2	jun-25	$ 25.927.188	$ 0	$ 25.927.188
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3	jul-25	$ 27.466.838	$ 0	$ 27.466.838
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4	ago-25	$ 27.992.537	$ 0	$ 27.992.537
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5	sep-25	$ 29.392.107	$ 0	$ 29.392.107
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6	oct-25	$ 26.624.855	$ 0	$ 26.624.855
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7	nov-25	$ 27.864.929	$ 0	$ 27.864.929
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8	dic-25	$ 29.096.649	$ 0	$ 29.096.649
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9	ene-26	$ 29.712.509	$ 0	$ 29.712.509
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10	feb-26	$ 28.864.448	$ 0	$ 28.864.448
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11	mar-26	$ 28.958.498	$ 0	$ 28.958.498
ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12	abr-26	$ 29.210.490	$ 0	$ 29.210.490
ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13	may-26	$ 32.796.182	$ 0	$ 32.796.182
TOTAL EJECUTADO		**$ 360.667.875**	**$ 0**	**$ 360.667.875**
PORCENTAJE DE EJECUCION		**50%**	**0%**	**50%**

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1	may-25	$ 16.760.645	$ 0	$ 16.760.645
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2	jun-25	$ 25.927.188	$ 0	$ 25.927.188
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3	jul-25	$ 27.466.838	$ 0	$ 27.466.838
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4	ago-25	$ 27.992.537	$ 0	$ 27.992.537
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5	sep-25	$ 29.392.107	$ 0	$ 29.392.107
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6	oct-25	$ 26.624.855	$ 0	$ 26.624.855
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7	nov-25	$ 27.864.929	$ 0	$ 27.864.929
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8	dic-25	$ 29.096.649	$ 0	$ 29.096.649
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9	ene-26	$ 29.712.509	$ 0	$ 29.712.509
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10	feb-26	$ 28.864.448	$ 0	$ 28.864.448
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11	mar-26	$ 28.958.498	$ 0	$ 28.958.498
ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12	abr-26	$ 29.210.490	$ 0	$ 29.210.490
ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13	may-26	$ 32.796.182	$ 0	$ 32.796.182
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		**$ 360.667.875**	**$ 0**	**$ 360.667.875**
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		**$ 355.532.895**		**$ 355.532.895**
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		**50%**	**0%**	**50%**

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
MISIONALIDAD	**$ 716.200.770**	**$ 360.667.875**	**$ 355.532.895**



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 386-2025

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1	may-25	$ 16.760.645	$ 0	$ 16.760.645
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2	jun-25	$ 25.927.188	$ 0	$ 25.927.188
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3	jul-25	$ 27.466.838	$ 0	$ 27.466.838
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4	ago-25	$ 27.992.537	$ 0	$ 27.992.537
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5	sep-25	$ 29.392.107	$ 0	$ 29.392.107
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6	oct-25	$ 26.624.855	$ 0	$ 26.624.855
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7	nov-25	$ 27.864.929	$ 0	$ 27.864.929
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8	dic-25	$ 29.096.649	$ 0	$ 29.096.649
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9	ene-26	$ 29.712.509	$ 0	$ 29.712.509
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10	feb-26	$ 28.864.448	$ 0	$ 28.864.448
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11	mar-26	$ 28.958.498	$ 0	$ 28.958.498
ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12	abr-26	$ 29.210.490	$ 0	$ 29.210.490
ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13	may-26	$ 32.796.182	$ 0	$ 32.796.182
TOTAL PAGADO		**$ 327.871.693**	**$ 0**	**$ 327.871.693**
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		**$ 29.210.490**	**$ 0**	**$ 29.210.490**
PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO		**91%**	**0%**	**91%**
