CÓDIGO: MM-GI-DO-F-037

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR CONTROL TÉCNICO, AMBIENTAL Y JURÍDICO

1. Datos Generales del Contrato de obra:

1.1. Denominación del contrato	**Informe No.: 003**	**Periodo:** 26/04/2026 – 25/05/2026									
Contrato No.:	LP-016-2025										
Nombre del supervisor:	ALBERTO VASQUEZ – Secretaría Distrital de Obras Públicas										
Nombre del Interventor:	PEDRO MORA – EDUBAR S.A.										
1.2. De la etapa contractual											
Tipo de contrato:	Prestación de servicios		Obra	X	Consultoría		Suministro		Otro		
Nombre del contratista:	CONSORCIO VIAS 2025 COPRO										
No. de identificación del contratista:	N.I.T No. 800.091.140 – 4										
Objeto del contrato:	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027										
Localización:	Barranquilla, Atlántico										
Plazo:	21 meses, contados desde el acta de inicio (26/01/2026)										
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	N/A										
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	N/A										

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**26/01/2026**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	**25/09/2027**		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

1.3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio	Seguros del estado	85-44-101142748	29/12/2025	29/12/2032
Cumplimiento	Seguros del estado	85-44-101142748	29/12/2025	29/01/2028

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR CONTROL TÉCNICO, AMBIENTAL Y JURÍDICO

Pagos de salarios y prestaciones	Seguros del estado	85-44-101142748	29/12/2025	29/09/2030
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	Seguros del estado	85-40-101066262	29/12/2025	29/09/2027
Otros:				

Nota: Si se presentan modificaciones al contrato (prórrogas/adiciones), la vigencia y los valores asegurados deberán actualizarse en las pólizas.

1.4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$20.721.219.764
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$20.721.219.764
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$1.591.745.070
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$19.129.474.694
Valor a pagar en el presente informe:		$
Nota crédito (-):		$
No. factura o cuenta de cobro:		

2. Aspectos técnicos:


2.1. Control de programación.

- El día 17 de marzo de 2026 el contratista remitió el "Cronograma de Obra – Tramo 1 LP-016-2026" en el cual se presenta el cronograma del primer tramo de la obra que va sobre la calle 82 desde la carrera 64 hasta la carrera 58. Este cronograma proporcionado por el contratista tiene una duración de 79 días.

- A continuación, se presenta el avance físico acumulado del proyecto, con corte a la fecha del presente informe, en comparación con la programación general suministrada por el contratista, con el fin de evaluar el comportamiento del avance ejecutado frente al programado:

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR CONTROL TÉCNICO, AMBIENTAL Y JURÍDICO

MES	INICIO	FIN	FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO	FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO
1	26/01/2026	25/02/2026	0,13%	0,50%
2	26/02/2026	25/03/2026	1,76%	1,29%
3	26/03/2026	25/04/2026	7,41%	7,82%
4	26/04/2026	25/05/2026	12,08%	8,22%

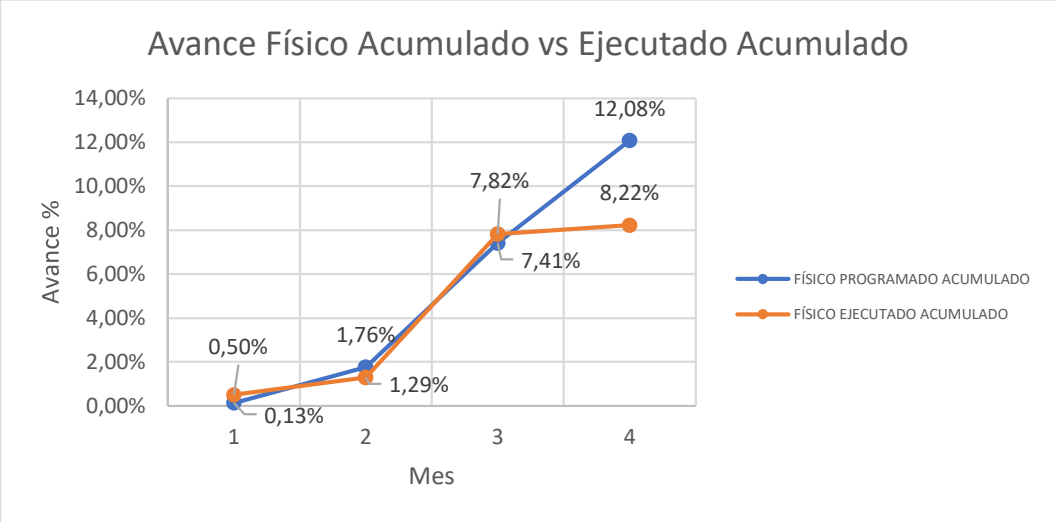

2.2. Control de personal en obra

Durante el periodo objeto del presente informe se registraron laborando 46 personas de las cuales 25 corresponden a mano de obra no calificada de la región, de esas mismas 2 personas MONC de la región mujer, y una persona dentro del decreto 1860, en cumplimiento con la política de empleo establecida en el pliego de condiciones y en el contrato de obra.

PERIODO	30% MONC	5% MONC Mujeres	Total
27 de abril 26 de mayo 2026	Cumple	cumple	N/A

2.3. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.

Durante el período objeto del presente informe, la interventoría efectuó seguimiento y control a la maquinaria y equipos empleados por el contratista en los distintos frentes de obra, verificando su correspondencia con las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y de seguridad requeridas para su utilización dentro del proyecto.

Asimismo, se constató la realización de inspecciones preoperacionales por parte del contratista, orientadas a evaluar el estado mecánico y funcional de la maquinaria y los equipos, permitiendo identificar oportunamente posibles anomalías o condiciones de riesgo que pudieran afectar el desarrollo seguro de las actividades constructivas.

La interventoría mantendrá el seguimiento periódico a la maquinaria y equipos vinculados al proyecto, verificando su estado de conservación, documentación soporte, condiciones de operación y cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad establecidos, con el fin de garantizar su adecuado desempeño durante la ejecución de las obras.

Lugar	Automotor	Placa	Modelo
Calle 82 Cra 64	Minicargador	97442	2022
Calle 82 Cra 64	Retrocargador	67090	2019
Calle 82 Cra 64	Minicargador	S18	2024
Calle 82 Cra 64	Retrocargador	MC095219	2018
Calle 82 Cra 64	Volqueta	UYX413	2007
Calle 82 Cra 64	Volqueta	SMH721	2009

2.4. Certificados de calidad de los materiales usados por el contratista.

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista suministró a la interventoría los certificados de calidad correspondientes a los materiales utilizados en la ejecución de las actividades de obra. Entre la documentación aportada se incluyen certificados de calidad del concreto premezclado y del acero de refuerzo empleado en el proyecto, los cuales fueron objeto de revisión por parte de la

interventoría. Como resultado de dicha verificación, se evidenció que los materiales cumplen con las especificaciones técnicas, requisitos normativos y estándares de calidad exigidos para su incorporación en la obra, garantizando su adecuada utilización y desempeño dentro del proyecto.

2.5. Control de calidad, pruebas y resultados de ensayos de laboratorios realizados.

Durante el periodo evaluado, el contratista remitió a la interventoría los informes y resultados de los ensayos de laboratorio realizados a los materiales utilizados en obra. La documentación revisada incluye ensayos de resistencia a la compresión y flexión del concreto suministrado, así como pruebas físico-mecánicas y químicas efectuadas al acero de refuerzo, tales como resistencia a la fluencia, resistencia a la tracción, alargamiento y composición química. Adicionalmente, se verificaron los certificados de calibración vigentes de los equipos de medición y pesaje utilizados por el laboratorio, garantizando la trazabilidad y confiabilidad de los resultados obtenidos. Una vez realizada la revisión técnica correspondiente, la interventoría evidenció que los resultados de los ensayos cumplen con las especificaciones técnicas, normas aplicables y parámetros de calidad establecidos para el proyecto.

2.6. Evidencias de ejecución del contrato

Actividades en Obra – 26 de Abril a 26 de Mayo de 2026	
	
Ilustración 1. Instalación de losetas peatonales	*Ilustración 2. Conformación de bordillo*

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-037

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR CONTROL TÉCNICO, AMBIENTAL Y JURÍDICO

Actividades en Obra – 26 de Abril a 26 de Mayo de 2026



Ilustración 3. Demolición de pavimento reforzado



Ilustración 4. Pavimento MR-45



Ilustración 5. Construcción de registros

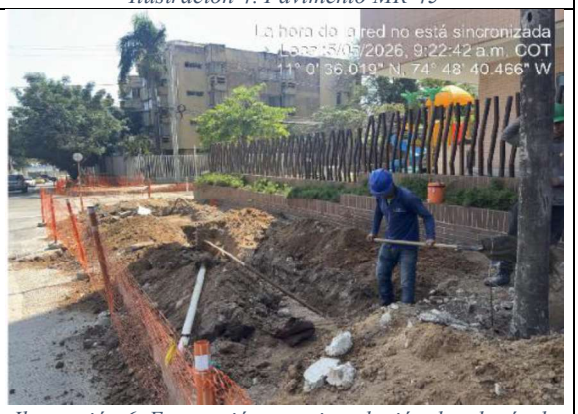


Ilustración 6. Excavación para instalación de tubería de alcantarillado



Ilustración 7. Excavación para instalación de tubería de alcantarillado



Ilustración 8. Registro de bancoducto

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

2.7. Seguimiento de los ajustes a los estudios y diseños realizados por el contratista. (en los casos que aplique).

- Durante el periodo presente no se realizaron modificaciones a los estudios y diseños presentados por el contratista.

2.8. Libro de obra.

- Se anexa la bitácora del proyecto debidamente diligencia para el periodo correspondiente.

2.9. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)

- N/A

3. Aspectos ambientales sociales y SST

- **Componente ambiental**

  - Se cuenta con Plan de Manejo Ambiental (PMA) el cual ya fue aprobado por la interventoría

  - Implementación de programas ambientales: manejo de residuos, control de emisiones, manejo de materiales RCD y recursos hídricos.

  - Gestión de RCD:

    - Generación durante el periodo: 435 m³ en abril
    - Disposición parcial en sitio autorizado presentando acopios de material en obra; certificados de abril y mayo pendientes

  - Manejo adecuado de residuos sólidos mediante código de colores (resolución 2184 de 2019).

- Campamento en operación con oficinas, almacén de materiales, punto ecológico, punto de hidratación, baño y disponibilidad de servicios sanitarios portátiles para el uso del personal de obra.

- Materiales de construcción:

  - Se registra uso de materiales en abril:
    - Material seleccionado: 45 m³
    - Arena: 45 m³
    - Concreto: 42 m³
  - El contratista no adjuntó el certificado de compra del material.

- Permisos ambientales:

  - Registro RCD: entregado
  - Permisos de tala y aprovechamiento forestal: en trámite
  - Plan integral de gestión de riesgos (PIGR): pendiente

- Manejo de aguas residuales mediante 2 unidades sanitarias con mantenimiento (8 reportados).

- No se reportan derrames, vertimientos ni incidentes ambientales.

- Se dio cumplimiento parcial al control de polvo ya que en varias ocasiones se evidenciaron acopios de arena sin la cobertura correspondiente.

Componente SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)

- Total personas en obra: 46 trabajadores.

- Identificación de riesgos: físicos, mecánicos, químicos, locativos, tránsito y naturales.

- Nivel de riesgo promedio: aceptable

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR CONTROL TÉCNICO, AMBIENTAL Y JURÍDICO

- Implementación de controles:
  - Uso de EPP
  - Señalización
  - Charlas diarias
  - ATS
- Capacitaciones:
  - 20 charlas SST
  - 7 inducciones
  - 2 pausas activas
- Seguridad en obra:
  - 14 ATS ejecutados
  - Inspecciones realizadas:
    - 10 maquinaria
    - 2 equipos de trabajo
    - 1 botiquín
    - 1 EPP
    - 1 extintor
- Sin accidentes laborales reportados
- Cumplimiento general de afiliación de seguridad social (EPS, ARL, pensión, caja de compensación familiar).
- Señalización vial implementada (preventiva, informativa, reglamentaria, canalizadores de tráfico e institucional)
- Observaciones de interventoría: cumplimiento estricto del PMT, charlas diarias de seguridad (pre operacionales), seguimiento al uso adecuado de los EPP, importancia de los auxiliares de tráfico.

- **Componente social**

  - PGS se encuentra revisado y aprobado por parte de la interventoría
  - Cumplimiento de:
    - 30% MONC
    - 5% participación de mujeres
  - Actividades sociales ejecutadas:
    - 2 actividades de divulgación a la comunidad
    - 17 socializaciones con la comunidad
    - 5 asistentes en promedio por socialización
  - Actas de vecindad:
    - Se reportan 0 actas de vecindad durante el periodo
  - Atención a la comunidad:
    - Se registraron 3 PQR que fueron atendidas y posteriormente cerradas.
    - Canales activos (correo, celular, sede física)
  - Sostenibilidad social:
    - 2 capacitaciones (relaciones con la comunidad, prevención del consumo de sustancias psicoactivas)
  - No se reportan afectaciones a predios ni procesos de indemnización

4. Aspectos legales:

4.1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal

- La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, verificando que el personal vinculado al proyecto se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral, incluyendo EPS, ARL, fondos de pensiones y cajas de compensación familiar. De igual manera, se revisó la documentación relacionada con el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, evidenciándose la entrega por parte del contratista de las respectivas planillas PILA y demás soportes correspondientes al periodo evaluado, para su verificación y control por parte de la interventoría.

4.2. Informe sobre solicitudes de cesión y/o subcontratación.

- N/A

4.3. Informe sobre desviaciones del contratista en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- N/A

5. Anexos Informe Final:

5.1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.

- N/A

5.2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales.

A continuación, se presentan las cantidades de obra ejecutadas durante el período objeto del presente informe.

Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
Ítem	**Capítulo - Demoliciones**			**$ 5.801.827,00**
1,3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	43,91	$ 5.801.826,93
2	**CAPITULO PAVIMENTO**			**$ 54.773.822,00**
2,2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	28,84	$ 4.097.385,32
2,3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE	M2	99,55	$ 33.099.044,80

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR CONTROL TÉCNICO, AMBIENTAL Y JURÍDICO

Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
	CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.			
2,8	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	868,52	$ 8.841.513,24
2,11	CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS	M2	76,56	$ 8.735.878,80
	Capitulo No Previstos			**$ 14.373.723,00**
NP-03	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	139,31	$ 675.498,43
NP-08	EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO	M3	105,35	$ 8.418.097,10
NP-12	LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO Y OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	15,86	$ 5.280.127,23

5.3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

- N/A

5.4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

- Se anexan certificados calidad y ensayos de laboratorio realizados por el contratista.

5.5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados.

- N/A

6. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

Durante el período evaluado se evidenciaron situaciones asociadas a interferencias con redes de servicios públicos existentes, las cuales incidieron en la secuencia constructiva prevista para algunos sectores de intervención del proyecto.

En el tramo comprendido entre las carreras 59 y 58 (costado izquierdo), se identificó la presencia de redes eléctricas de media tensión, cajas de inspección y acometidas ubicadas

dentro del área proyectada para la ampliación del pavimento rígido. Esta condición restringió la ejecución de actividades de excavación, conformación de estructura de pavimento y ampliación de la sección vial, debido a que las intervenciones requeridas sobre dichas redes deben ser ejecutadas por personal especializado y autorizado por la empresa prestadora del servicio. Como consecuencia, se presentaron limitaciones operativas en este frente de trabajo y fue necesaria la redistribución de recursos hacia otros sectores de la obra.

De igual forma, en el sector comprendido entre las carreras 59B y 59 (costado izquierdo), la reubicación de la red de gas natural existente generó afectaciones en la programación inicialmente establecida. Durante el desarrollo de las actividades se detectó una derivación tipo silla “T” que no había sido identificada en los apiques preliminares, situación que obligó a realizar ajustes en el procedimiento constructivo y a extender los tiempos previstos para la intervención. Adicionalmente, los tiempos requeridos para la reubicación de la red y la posterior indisponibilidad de suministro de concreto ocasionaron la reprogramación de actividades asociadas a la fundida de pavimento en dicho sector.

La interventoría realizó seguimiento permanente a estas situaciones, verificando las acciones implementadas por el contratista para mitigar sus efectos sobre el cronograma de obra y garantizar la continuidad de las actividades en los diferentes frentes de trabajo. No obstante, las interferencias identificadas generaron afectaciones temporales en los rendimientos previstos y en el avance programado de las actividades de ampliación de pavimento rígido durante el período objeto del presente informe.

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-037

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR CONTROL TÉCNICO, AMBIENTAL Y JURÍDICO

7. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Contrato No.:	CD-12-2025-9340		
Nombre del supervisor del contrato de Interventoría:	ALBERTO VASQUEZ Supervisor Secretaría Distrital de Obras Públicas		
Nombre del Interventor:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA – EDUBAR S.A.		
No. de identificación del Interventor:	800.091.140-4		
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024–2027.		
Plazo:	VEINTIÚN (21) meses desde el Acta de Inicio (26/01/2026) – terminación estimada 25/10/2027		
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	N/A		
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	N/A		
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**26/01/2026**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	25/10/2027		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

7.1. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:	SEGUROS DEL ESTADO	85-44-101142790	26-09-2027	30-09-2032

Cumplimiento:	SEGUROS DEL ESTADO	85-44-101142790	31-12-2025	31-01-2028
Salarios y prestaciones:	SEGUROS DEL ESTADO	85-44-101142790	31-12-2025	30-09-2030
Responsabilidad civil extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO	85-40-101066295	31-12-2025	30-09-2027
Otros:				
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

7.2. Ejecución del contrato

Descripción		**Valor**
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$1.982.706.600,00
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$1.982.706.600,00
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$1.982.706.600,00
Valor a pagar en el presente informe:		$
Nota crédito (-):		$
No. factura o cuenta de cobro:		

8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INTERVENTOR EN EL PERÍODO

Durante el período objeto del presente informe, la interventoría realizó seguimiento técnico permanente a las actividades ejecutadas por el contratista en los diferentes frentes de obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos y obligaciones contractuales establecidas para el proyecto. Entre las principales actividades

objeto de supervisión se destacan las labores de demolición de pavimento y retiro de material, excavaciones mecánicas y manuales, ejecución de apiques exploratorios, conformación de subrasante, suministro, extendido y compactación de material seleccionado para rellenos, instalación de acero de refuerzo y acero figurado, vaciado de concreto de 1.500 psi para bases de pavimento y construcción de pavimento rígido en concreto MR-45, así como el corte de juntas en pavimento.

De igual manera, la interventoría efectuó seguimiento a la ejecución de obras de urbanismo y espacio público, incluyendo la construcción de bordillos en concreto de 3.000 psi, vigas de confinamiento para losetas, rampas peatonales y la instalación de losetas planas, losetas guía y losetas alerta para accesibilidad universal. Así mismo, se verificó la construcción de registros domiciliarios, cámaras para redes de comunicaciones, suministro e instalación de tubería TDP de 4”, instalación de tubería Conduit PVC de 2”, registros y tapas antivandálicas, así como las actividades asociadas a la subterranización de redes y provisión de redes de acueducto y alcantarillado.

Adicionalmente, la interventoría realizó control y seguimiento a las actividades de tala de árboles con retiro de material vegetal y demás actividades complementarias requeridas para la adecuación de los frentes de trabajo, verificando la correcta ejecución de las labores, el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y manejo ambiental, y la conformidad de las cantidades ejecutadas con respecto a la programación y alcance contractual del proyecto.

8.1. Control de personal de interventoría en obra.

Para este proyecto la interventoría dispone el siguiente personal para el desarrollo de las obligaciones propias del contrato:

N.	NOMBRE	CARGO
1	Pedro Mora	Director de interventoría
2	Andrea Espitia	Residente de interventoría
3	Jorge Velásquez	Especialista eléctrico
4	Pedro Miranda	Especialista ambiental
5	Jonathan Beltran	Profesional SST
6	José Vásquez	Ingeniero auxiliar I
7	Daniela Zuluaga	Ingeniero auxiliar II
8	Anyelin Orozco	Profesional Social

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR CONTROL TÉCNICO, AMBIENTAL Y JURÍDICO

8.2. Control de los equipos dispuestos por la interventoría.

Los equipos dispuestos por la interventoría durante este periodo son los siguientes:

EQUIPOS	CANTIDAD
Estación total TOPCON	1
Nivel automático TOPCON	1
GNSS RTK marca South (base y rober)	1

PEDRO EDUARDO MORA CAMACHO, quien actúa en calidad de director de interventoría, deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones técnicas, ambientales y jurídicas del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada. (Nota: en caso de que no haya cumplido con las obligaciones, especificar las razones)

Se firma en Barranquilla a los 10 días del mes de junio 2026.

PEDRO EDUARDO MORA CAMACHO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EDUBAR S.A
