INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

	FORMATO **INFORME DE SUPERVISIÒN Y/O INTERVENTORÍA**	Código: F-GDC-28 Versión: 02 Fecha: 03/11/2023

No. CONTRATO:	452-2025	**No. CONVENIO:**			**No. INFORME:**	1
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ: BARBOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL".					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONINCIL URBANO					
NIT O CEDULA:	902019131-2	**SUPERVISOR:**	MARÍA CECILIA ARBELAEZ C.			
VALOR:	N.A.	**VALOR ADICIONAL:**	N/A		**PERIODO EVALUADO**	
PLAZO:	4 meses	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A		**DE:**	**HASTA:**
FECHA DE INICIO:	19 de enero del 2026	**FECHA REINICIO:**	N/A		Enero 2026	Febrero 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**DEPENDENCIA INTERESADA:**	Subdirección Proyectos			

En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, en la ley 1474 de 2011, en la ley 489 de 1998, en el decreto 1082 de 2015 y en especial en el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014 y del manual de contratación del Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001655 de 2023, se presenta informe de supervisión mensual.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

- **PERSONAL DE OBRA A LA FECHA:**

PERSONAL OPERATIVO - CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
NEIVER	CHÁVEZ CAVIEDES	RESIDENTE SST	1/28/2026	N/A
RUBEN DARIO	ORTIZ LOPEZ	DIRECTOR DE OBRA	28-01-2026	N/A
LAURA ANDREA	VILLADA SIERRA	RESIDENTE AMBIENTAL	5/2/2026	N/A
STEFANY	HENAO OROZCO	AUXILIAR RESIDENTE	22-01-2026	N/A
JENNY ALEXANDRA	MOSQUERA JARAMILLO	RESIDENTE SST	11/2/2026	N/A
SANDRA CAROLINA	PARRA GIRALDO	RESIDENTE OBRA	28-01-2026	N/A
LIZETH JOHANA	PEREZ NARVAEZ	RESIDENTE SOCIAL	22-01-2026	N/A
SANTIAGO	MUNERA ARANGO	AUXILIAR RESIDENTE	2/2/2026	N/A
ANA YOHANNA	MARRUGO TIRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	29-01-2026	N/A
OSCAR DAVID	ACOSTA CASTRO	RESIDENTE OBRA	2/23/2026	N/A
GERMAN IGNACIO	SALAS ERASO	RESIDENTE OBRA	3/4/2026	N/A
DANIELA	AUZAQUE GARCIA	AUXILIAR RESIDENTE	3/11/2026	N/A
DIANA PATRICIA	RODRIGUEZ DUQUE	AUXILIAR RESIDENTE	2/20/2026	N/A

PERSONAL OPERATIVO - CONSORCIO CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
LIBARDO	BOTERO TOBÓN	MENSAJERO	20/02/2026	N/A

PERSONAL OPERATIVO - VCR CONSTRUCCIONES			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ELMER JAIR	QUEJADA MENA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
JHONEIDER	OSPINA RAMIREZ	AYUDANTE	3/4/2026	N/A
BYRON HUMBERTO	HOYOS COSSIO	MAESTRO	16/03/2026	N/A
JUAN CAMILO	GIRALDO FRANCO	AYUDANTE	16/03/2026	N/A
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	17/03/2026	N/A
NEVER ENRRIQUE	CONEO GONZALEZ	OFICIAL	3/25/2026	N/A
ALVARO ANTONIO	RUIZ CIRO	AYUDANTE	3/25/2026	N/A
LEIVER ANTONIO	AVILA CONEO	AYUDANTE	08/04/2026	N/A

2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presenta novedad

3. **ASPECTOS TECNICOS (Incluye registro fotográfico)**

Institución Educativa Avelino Saldarriaga:

- Se realizó la demolición de vigas de cimentación existentes, encontradas durante el proceso de excavación, con el fin de eliminar elementos que interferían con el desarrollo de las actividades proyectadas.
- Se llevó a cabo el trasiego de escombros producto de la demolición, mediante el uso de carretilla, trasladándolos hasta el punto de acopio definido dentro de la obra.

	
Imagen 1: viga existentes en zona de cárcamo	**Imagen 2**: vigas existentes en zona de cárcamo

	
Imagen 3: Demolición de vigas de cimentación	

- **Institución Educativa San José:**
- Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la construcción del muro de contención de 16 metros lineales:
- Se realizó el desencofre de la zapata correspondiente al muro, verificando las condiciones del concreto y su correcta conformación.
- Se continuó con el desdoble de varilla (chipa) de 3/8”, necesaria para el armado estructural.
- Se ejecutó el curado de la zapata, garantizando las condiciones adecuadas para el fraguado del concreto y evitando fisuras.
- Se llevó a cabo la instalación del acero de refuerzo longitudinal para el muro de contención, conforme a los planos estructurales.
- Se finalizó la instalación del acero de refuerzo en el tramo faltante por fundir de la zapata del muro.
- Se realizaron actividades de excavación, reemplazo de suelo y compactación de subbase en la zona de desplante de la zapata correspondiente al muro colindante.

	
Imagen 1 : Compactación de base	**Imagen 2:** Desencofre de zapata
	
Imagen 3: Instalación de acero longitudinal para muro	**Imagen 4:** Instalación de acero de zapata

Institución Educativa Enrique Vélez.

- Se desarrollaron procesos de carácter administrativo dirigidos a supervisar y corroborar las cantidades ejecutadas en obra. De igual manera, se organizó la logística para el abastecimiento de materiales y se gestionaron los requerimientos relacionados con la disponibilidad, asignación y coordinación de equipos, asegurando así la adecuada ejecución de las labores constructivas.
- Se realizó la recepción de materiales destinados a la ejecución del proyecto, verificando su conformidad en cuanto a cantidades, especificaciones técnicas y condiciones de calidad, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el contrato y la programación de obra.
- Se dio continuidad de la ejecución del cerramiento perimetral, realizando la excavación, retiro y demolición por el perímetro de la institución, garantizando el control y la seguridad en el área intervenida.
- Se ejecuta el amarre del acero de refuerzo correspondiente a la viga de fundación y columnetas para la etapa 2 de la actividad, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la adecuada disposición, alineación, recubrimiento y fijación de las barras.
- Se ejecutó el vaciado de concreto de la viga de fundación, conforme a los criterios técnicos establecidos, y se llevaron a cabo las pruebas de control correspondientes.
- Se continúa la actividad de corte e instalación de bloque de concreto en el muro de cerramiento.

	
Imagen 1: Excavación, retiro y demolición de cerramiento existente	**Imagen 2:** Amarre y figurado de acero

	
Imagen 3: Encofrado viga de fundación	**Imagen 4:** Vaciado de concreto viga de fundación


Imagen 5: Vaciado de concreto viga de fundación

- Se ejecutaron actividades administrativas orientadas al control y verificación de cantidades de obra, la gestión y programación de suministro de materiales, así como la solicitud, asignación y coordinación de equipos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas.
- Se llevó a cabo la ejecución de la excavación manual en la zona de intervención del acceso nuevo de la institución donde se presentó en el transcurso de la excavación daño en las redes de acueducto de la institución realizando de manera inmediata las reparaciones pertinentes en la red de acueducto.
- Se realizó el traslado de plantas de la zona intermedia comprendida como bloque 2 de la etapa de construcción a su ubicación definitiva.
- Se da continúa la excavación con la mini excavadora para garantizar la instalación de la estructura granular
- Se llevó a cabo la ejecución de material proveniente de la excavación de la placa deportiva, realizando el trasiego con el minicargador y ejecutando la actividad por la puerta principal de la institución.

	
Imagen 1: Excavación zona placa deportiva	**Imagen 2:** Excavación manual acceso nuevo

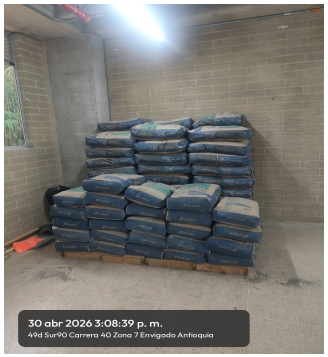
	
Imagen 3: Retiro y traslado de huerta	**Imagen 4:** Ingreso de mini excavadora
	
Imagen 5: Retiro y traslado de huerta	**Imagen 6:** Cargue material

Institución Educativa San Vicente.

- Se realizó mejoramiento del terreno en la zona de placa de bloques, mediante excavación adicional hasta encontrar estratos más secos y competentes para la conformación de la base.
- Posteriormente, se inició la colocación de base granular y se ejecutó compactación parcial utilizando equipo tipo benitín, con el fin de mejorar las condiciones de soporte del terreno.
- Se efectuó el trasiego parcial de material producto de excavación desde la zona de bloques hacia el área de acopio ubicada en el acceso principal.
- Se continuó con el armado y amarre de acero de refuerzo correspondiente a las vigas de cimentación del cerramiento perimetral.
- Se realizó el figurado de estribos en espiral destinados a los micropilotes, conforme a los requerimientos estructurales del proyecto.
- Se ejecutó la excavación de micropilotes en la zona de juegos, dando inicio a las actividades de cimentación profunda en este sector.
- Se llevó a cabo una exploración de la estructura de la placa deportiva existente, mediante apertura puntual (calas), con el objetivo de: Verificar la presencia y disposición del acero de refuerzo.
- Se realizó la recepción de material de mortero de pega, el cual fue trasladado mediante trasiego hasta la zona de bloques para su almacenamiento en condiciones adecuadas.
- Se recibió cemento, el cual fue trasladado mediante trasiego hasta la zona de bloques para su almacenamiento en condiciones adecuadas.
- Se recibió equipo tipo concretadora, necesario para la producción de concreto en obra.
- Se realizó el trazado de la placa y las escaleras en la zona de plazoleta, definiendo en campo la geometría y ubicación de estos elementos conforme a las condiciones reales del terreno.
- Se realizó la rectificación de medidas de la placa deportiva existente, con el fin de verificar su correspondencia con la información de diseño.

	
Imagen 1. Compactación parcial zona de bloques	**Imagen 2**. Figuración estribo en espiral micropilotes

	
Imagen 3. Excavación Micropilotes	**Imagen 4:** Excavación andén zona juegos

	
Imagen 5. Trasiego y acopio mortero	**Imagen 6:** Trasiego y acopio Cemento

Institución Educativa Ciudad Itagüí

- Se continúa figuración, armado y colocación de acero de refuerzo.
- Se continúan actividades de excavación manual en las áreas destinadas para la construcción de placas de concreto.
- Se continúa el trasiego del material producto de la excavación y su respectivo acopio en el área destinada.
- Ingresan a la obra 21 m3 de base granular BG-40.
- Se realiza trasiego de material de base granular BG-40
- Ingresa volqueta doble troque destinadas para el retiro del material proveniente de las actividades de excavación.
- Se realiza el extendido y compactación de material de base granular con canguro.
- Realizaron la limpieza de los baños móviles instalados en la obra.

	
Imagen 1 Acero de refuerzo.	**Imagen 2.** Trasiego de material.

	
Imagen 3. Excavación manual.	**Imagen 4.** Cargue de material de excavación.

	
Imagen 5. Colocación de acero.	**Imagen 6.** Ingreso de base granular.

	
Imagen 7. Compactación de base granular	**Imagen 8**. Trasiego de material de base.

Institución Educativa María Bernal

- Se reinician actividades constructivas en la institución.
- Se toman niveles para el trazado del cerramiento a construir.
- Se realiza excavación manual para viga de fundación del cerramiento a construir.
- Se realiza figuración, armado y colocación de acero de refuerzo.
- Se realiza trasiego de material de excavación.

	
Imagen 1. Trazado de niveles cerramiento.	**Imagen 2**. Excavación de viga de fundación.
	
Imagen 3. Acero de refuerzo.	**Imagen 4:** Trasiego de material de excavación

Institución Educativa Concejo de la estrella

- Se ejecutó de manera parcial la conformación de la rampa de acceso utilizando escombros provenientes de la institución educativa ubicada en Sabaneta, actividad realizada con apoyo de mini retroexcavadora.

- Se llevó a cabo el cerramiento de la piscina mediante instalación de tela tipo zaran, con el fin de delimitar el área e iniciar las actividades de demolición.
- Se realizó la desinstalación de la bomba de la piscina, así como el vaciado de dos 2 cuartos adicionales de almacenamiento de la institución.
- Se efectuó el retiro del pasamanos metálico de color azul ubicado en la parte inferior y superior de la piscina y puertas de cuartos en la parte inferior de la misma.
- Se ejecutaron actividades de descapote y desmonte de juegos infantiles en la zona de la placa, utilizando mini retroexcavadora.
- Se realizó rocería en la parte interna de la institución, a lo largo del cerramiento, hasta identificar el punto de encuentro con el cerramiento colindante.
- Se llevó a cabo la demolición de la zona de la piscina mediante el uso de compresor, preservando el cuarto donde se encuentra el tablero eléctrico de la institución, el cual no fue intervenido.

	
Imagen 1. Rampa de acceso	**Imagen 2.** Cerramiento piscina.

	
Imagen 3. Demolición de piscina.	**Imagen 4.** Retiro de pasamanos.

	
Imagen 5. Rocería y limpieza parte interior de la institución.	**Imagen 6.** Excavación zona de placa.

	
Imagen 7. Limpieza de cuarto.	**Imagen 8.** Retiro de puertas.

4. ASPECTOS AMBIENTALES.

En este periodo se realizan diferentes actividades enfocadas en mejorar la gestión ambiental del proyecto y tener mayor control de los impactos generados en las diferentes actividades constructivas. A continuación, se plasman las actividades de control que se implementaron en las diferentes I.E.

★ **AVANCE DE ACTIVIDADES :**

● **I.E SAN JOSÉ**

- Durante el periodo reportado se realiza vaciado de zapata de cimentación para muro de contención. Se tuvo un consumo de 23,36 m3. Se realizó acompañamiento a la actividad de vaciado, garantizando el manejo adecuado de vertimientos y disposición de residuos de concreto. El lavado de las canoas de las mixer se realizó directamente en la tolva de la bomba y el lavado de la bomba se realiza en caneca, se dejó sedimentar y posteriormente se vierte el agua y se dispone el sedimento como RCD.

- Se continua con la limpieza de los baños portátiles del proyecto, esta limpieza la realiza dos veces por semana.

- Se realiza disposición de residuos sólidos con la empresa INTERASEO, no se ha tenido un seguimiento a la planilla de forma adecuada. Sin embargo, si se ha realizado la disposición con gestor autorizado.

- Dentro de la IE se tiene presencia de equipo canguro, aprobado por la interventoría del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Vaciado zapata de cimentación para muro de contención I.E SAN JOSE	**Imagen 2.** Actividades de vaciado. I.E SAN JOSÉ.

- **I.E AVELINO SALDARRIAGA**

- Se realiza demolición de estructura encontrada en excavación. Se está a la espera de llegada de base para iniciar a compactar.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL**

- Se continúan actividades de excavación de viga en la zona externa de la I.E.

- Se realizó disposición del material de excavación y se inició con base para adecuación de suelo. En el proyecto se cuenta con equipos como: compactador y canguro para esta labor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Excavación y colocación de acero I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.	**Imagen 2.** Compactación material tipo base I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL**

- Se continúan, actividades de excavación en la I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL. En esta zona de trabajo se protegen los individuos forestales presentes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Imagen 1. Excavación para cerramiento I.E. CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL.


- **I.E JOSÉ FELIX DE RESTREPO**

- Se realiza cargue de material de excavación. Durante esta actividad se tiene una emergencia ambiental, que es atendida con los protocolos adecuados, controlando la situación.

- Se realiza instalación de señalización vertical aprobada en el PMT del proyecto.

- Se realiza el movimiento de plantas ubicadas en zona de intervención, esto está conciliado con la profesora Angelica Betancur y dentro de acta firmada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Movimiento plantas I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO.	**Imagen 2.** Ubicación plantas I.E JOSE FELIX DE RESTREPO.

	
Imagen 3. Kit antiderrames I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO.	**Imagen 4**. Atención derrame aceite hidráulico I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO.

- **I.E SAN VICENTE**

- Se continúan actividades de adecuación de ingreso de vehículos.

- **I.E CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA**

- Se realiza inicio de actividad de demolición de piscina de la I.E.

- Se realiza socialización de plan de contingencia, que permitirá realizar esta actividad de demolición de manera conjunta con la I.E.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Socialización plan de contingencia I.E CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.	**Imagen 2.** Inicio actividad de demolición I.E CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.

- **I.E ENRIQUE VELEZ**

- Se realiza actividad de vaciado de 60 mt lineales de viga para instalar el cerramiento. Esta actividad se realiza con supervisión del componente SST y ambiental del proyecto, garantizando el manejo adecuado de residuos de cemento y controlando el lavado de herramientas y canoa de mixer.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Protección de suelo y sumidero para vaciado I.E ENRIQUE VELEZ.	**Imagen 2.** Aplicación de concreto y vibrado I.E ENRIQUE VELEZ.

★ **PRESENTACIÓN PASAO DEL PROYECTO**

Se tiene pendiente para aprobación del PASAO del proyecto por parte de la interventoría:

- Resolución de aprobación del PMT de la I.E SAN VICENTE.
- Documento que legalice el suministro de agua y energía por parte de la I.E, Secretarías de educación o el ente competente.

Se esperan directrices de dirección de obra para subsanar estos temas.

5. ASPECTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALES

Durante la presente semana se desarrollaron diferentes acciones de acompañamiento, socialización y seguimiento en instituciones educativas del territorio, orientadas a garantizar procesos informativos adecuados y el avance de intervenciones programadas.

En primer lugar, se llevó a cabo la elaboración del plan de mitigación correspondiente a la intervención en la IE Concejo Municipal de La Estrella. Posteriormente, este plan fue socializado con el equipo directivo de la institución y con la Alcaldía Municipal, con el fin de articular acciones y garantizar una adecuada gestión del proceso.

De manera complementaria, se realizó jornada de volanteo dirigida a la comunidad vecina de la institución educativa, específicamente en unidades residenciales aledañas, informando sobre las actividades de demolición a ejecutar, sus implicaciones y recomendaciones para la comunidad.

Asimismo, se efectuó el cambio y actualización de carteleras informativas en la IE José Félix Restrepo y en la IE Concejo Municipal de La Estrella, fortaleciendo los canales de comunicación institucional con la comunidad educativa.

En el marco del seguimiento a obra, se brindó acompañamiento en sitio durante el inicio de la demolición de la piscina en la IE Concejo Municipal de La Estrella, verificando el desarrollo adecuado de las actividades programadas.

De igual forma, se realizó acompañamiento al proceso de vaciado programado en la IE Enrique Vélez Escobar, sede Providencia, como parte de las acciones de supervisión técnica.

Adicionalmente, se participó en el comité del área social, realizado de manera conjunta con el Área Metropolitana y la interventoría, con el propósito de hacer seguimiento a los avances, coordinar acciones y fortalecer la articulación interinstitucional.

Finalmente, se asistió a reunión programada con docentes de la IE José Félix Restrepo; sin embargo, esta fue cancelada en el lugar, quedando pendiente su reprogramación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 1. Actualización avance de gestión social



Imagen 2. Divulgación de actividad demolición I.E Concejo Municipal de La Estrella



Imagen 3. Divulgación de actividad demolición I.E Concejo Municipal de La Estrella

6. ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE HIGIENE, MEDICINA Y DE SEGURIDAD EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.

Se continua con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), se realiza actividades como:

- Inducción al personal propio nuevo contratado, actividad enfocado en la prevención de los riesgos laborales.
- Socialización de roles y responsabilidades.
- Diligenciamientos de las encuestas de salud.
- Diligenciamiento del perfil sociodemográfico.
- Entrega de los kits de elementos de protección personal por empleado (casco de seguridad, gafas, protector auditivo, protector respiratorio, guantes).
- Revisión planilla seguridad social empleados propios, subcontratistas y proveedores.
- Acompañamiento en las diferentes actividades de obra.
- Señalización general de obra.
- Demarcación y delimitación de áreas de trabajo.
- Revisión y validación de documentación del personal para ingreso a obra.
- Diligenciamiento de preoperacionales de equipos y maquinaria en obra.
- Inspecciones generales de obras, en las diferentes actividades de obra.
- Recorridos en las diferentes instituciones, previo a los inicios de obra tales como campamentos provisionales, cerramientos perimetrales y otros espacios para garantizar el desarrollo de las actividades de manera segura y aislada de la comunidad estudiantil.
- Charlas y capacitaciones enfocadas en la prevención y cuidado de la integridad física de los colaboradores propios y contratistas de obra.
- Capacitación SST, en compañía de asesores aliados.

- **Personal de obra (I.E SAN JOSÉ Y I.E AVELINO SALDARRIAGA):**

PERSONAL OPERATIVO - JUAN RUA			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ELMER JAIR	QUEJADA MENA	AYUDANTE	3/3/2026	25/04/2026
DIVINSON	SERNA	OFICIAL	3/3/2026	10/04/2026
EMILIO JOSE	QUINTANA	AYUDANTE	3/3/2026	30/032026
JHONEIDER	OSPINA RAMIREZ	AYUDANTE	3/4/2026	25/04/2026
BYRON HUMBERTO	HOYOS COSSIO	MAESTRO	16/03/2026	25/04/2026
CARLOS FERNEY	RUIZ RUIZ	OFICIAL	16/03/2026	16-03-2026
JUAN CAMILO	GIRALDO FRANCO	AYUDANTE	16/03/2026	25/04/2026
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	17/03/2026	25/04/2026
NEVER ENRRIQUE	CONEO GONZALEZ	OFICIAL	3/25/2026	25/04/2026
FABIO NELSON	GARCIA ACEVEDO	OFICIAL	3/25/2026	30-03-2026
ALVARO ANTONIO	RUIZ CIRO	AYUDANTE	3/25/2026	25/04/2026
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	3/17/2026	25/04/2026
LEIVER ANTONIO	AVILA CONEO	AYUDANTE	4/8/2026	25/04/2026
FRANCISCO JAVIER	CONTRERAS PARRA	AYUDANTE	4/10/2026	16/04/2026
PEDRO RAFAEL	ROMERO MONTERROSA	AYUDANTE	4/16/2026	25/04/2026

PERSONAL OPERATIVO - VCR CONSTRUCCIONES			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ELMER JAIR	QUEJADA MENA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
JHONEIDER	OSPINA RAMIREZ	AYUDANTE	3/4/2026	N/A
BYRON HUMBERTO	HOYOS COSSIO	MAESTRO	16/03/2026	N/A
JUAN CAMILO	GIRALDO FRANCO	AYUDANTE	16/03/2026	N/A
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	17/03/2026	N/A
NEVER ENRRIQUE	CONEO GONZALEZ	OFICIAL	3/25/2026	N/A
ALVARO ANTONIO	RUIZ CIRO	AYUDANTE	3/25/2026	N/A
LEIVER ANTONIO	AVILA CONEO	AYUDANTE	08/04/2026	N/A
LANDAZABAL	HIGUITA GRACIANO	OFICIAL	27/04/2026	N/A
BIL	GALVAN MARTINEZ		30/04/2026	N/A
EVER	GALVAN CASTRILLO		30/04/2026	N/A

- **Personal de obra (I.E JOSÉ FÉLIX - I.E ENRIQUE VELEZ Y SAN VICENTE):**

PERSONAL OPERATIVO - Construcciones Murillo Gil S.A.S			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ARBEY DE JESUS	MURILLO GIL	REPRESENTANTE LEGAL	3/24/2026	N/A
BRAYAN DANILO	DURANGO BELLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
DIANA ALEJANDRA	VELEZ CHAVARRIA	SST	3/24/2026	N/A
DIEGO ARCANGEL	MESA MIRA	ENCARGADO	3/24/2026	N/A
JHOAN JOSE	MARTINEZ CASTILLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
JOSE DE DIOS	RINCON BAYONA	OFICIAL	3/24/2026	N/A
MARIO ALBERTO	RUIZ VEGA	OFICIAL	31-03-2026	N/A
JUAN CAMILO	CIPRIAN LOPEZ	AYUDANTE	31-03-2026	N/A
EDMER JOSE	COLMENAREZ DIAZ	AYUDANTE	01-04-2026	N/A
JESUS IVAN	RIOS	AYUDANTE	01-04-2026	N/A
JUAN CAMILO	CIPRIAN LOPEZ	AYUDANTE	31-03-2027	N/A
JOSE DANIEL	HERNANDEZ SUAREZ	AYUDANTE	09-04-2026	N/A
MATEO ALBERTO	ROJAS HERNANDEZ	AYUDANTE	10-04-2026	N/A
LUIS JAVIER	QUIROZ PEREZ	OFICIAL	10-04-2026	N/A
NELSON CORDERO	PINTO	OFICIAL	10-04-2026	N/A

YORBIN ANTHONY	ESPINOZA GARCIA	AYUDANTE	10-04-2026	N/A
JUAN ALFREDO	RODRIGUEZ PEREZ	OFICIAL	13-04-2026	N/A
JUAN CARLOS	ESCOBAR MARIACA	AYUDANTE	15-04-2026	N/A
JUAN ALFREDO	RODRIGUEZ PEREZ	AYUDANTE	16-04-2026	N/A
FRANKLIN JOSÉ	TERAN HERNANDEZ	AYUDANTE	17/04/2026	N/A
JUAN CARLOS	ESCOBAR MARIACA	AYUDANTE	14/04/2026	N/A
JHONNATAN DAVID	AVENDAÑO CARABALLO	AYUDANTE	09/04/2026	N/A
JUAN DIEGO	LEAL RESTREPO	AYUDANTE	24/04/2026	N/A
NELSON	DÍAZ SECO	AYUDANTE	29/04/2026	N/A

- **Personal de obra (I.E. CIUDAD ITAGÜÍ SEDE CENTRAL Y I.E. MARIA BERNAL).**

PERSONAL OPERATIVO - ECR Construcciones			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
Fredy Alexander	Heredia Heredia	Oficial	30/03/2026	N/A
Edgar Antonio	Castañeda Ramírez	Representante legal	30/03/2026	N/A
Hernando	Cardona Mazo	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yeison Raul	Perez Cacique	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yeison Raul	Paternina Vargas	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yordi Alejandro	Osorio	Ayudante entendido	30/03/2026	N/A
David Alejandro	Osorio	Oficial	30/03/2026	6/4/2026
Ubaldo	Bermudez Mejia	Ayudante	30/03/2026	N/A
Salomé	Valencia	Aux SST	30/03/2026	N/A
Yeniffer	Suaza	Residente civil	30/03/2026	N/A
ERIK DANIEL	LAMAR URRUTIA	AYUDANTE	8/4/2026	N/A
ALEJANDRO	CHAVARRIA GIRALDO	AYUDANTE	8/4/2026	N/A
JUAN ESTEBAN	ZAPATA	AYUDANTE	8/4/2026	N/A
JOSE RAMON	AMAYA	OFICIAL	9/4/2026	N/A
SERGIO	GALEANO RINCON	AYUDANTE	9/4/2026	N/A
ERICK DANIEL	LAMAR URRUTIA	AYUDANTE	07/04/2026	N/A
JUAN ESTEBAN	ZAPATA HERNANDEZ	AYUDANTE	08/04/2026	N/A
JOSE RAMON	AMAYA	OFICIAL	08/04/2026	N/A
ANGEL EDUARDO	SILVA ACOSTA	AYUDANTE	15/04/2026	N/A
YERAMI ARMANDO	AGUILAR SILVA	AYUDANTE	15/04/2026	N/A

- **Tabla relación de personal provisional (contratista):**

PERSONAL PROVISIONAL DE OBRA						
NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL			EXAMEN
			ARL	EPS	AFP	
BERNABE DE JESUS CUERVO QUINCHIA	70164766	AUX TOPOGRAFIA	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	24/02/2026
JUAN ESTEBAN TABARES GARCIA	1128443068	TOPOGRAFO	SURA	SURA	PORVENIR	20/12/2025
RUBIAN ANTONIO MARTINEZ GIRALDO	71333548	TOPOGRAFO	SURA	SURA	COLPENSIONES	20/12/2025
EDISUN RUSBEL CARDONA	98640257	AYUDANTE	SURA	SURA	PORVENIR	16/03/2026
FERNANDO SALDARRIAGA	3551563	TALADOR	SURA	SURA	COLFONDOS	07/03/2026
HERIBERTO BETANCOURT	70580314	TALADOR	SURA	SURA	COLPENSIONES	12/04/2025
JOSE ANGEL CARMONA	71669356	TALADOR	SURA	SURA	COLPENSIONES	12/042025
CRISTIAN CAMILO SOTO	1007326634	OPERADOR	SURA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	24/01/2026
FERNEY GUTIERREZ HERRERA	1001772554	OPERADOR	SURA	SALUDTOTAL	PROTECCIÓN	02/01/2026

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO:**

1. Seguimiento accidente de trabajo Fredy Heredia.	2. Supervisión de trabajos con pulidora
	
3. Supervisión de trabajos con CANGURO .	4. Pausas Activas.

	
5. Acompañamiento en las evacuaciones	6. Uso adecuado de EPP
	
7. Inducciones	8. Capacitación y pausas activas

Tabla con formato

	
9. Acompañamiento en las actividades, verificación uso adecuado de los EPP.	10. Actividades de clima laboral
	
11. Socialización Plan de mitigación	12. Identificación y mitigación del riesgo

	
13. Señalización para salida de escombros	14. Acompañamiento en vaciado
	

7. BALANCE FINANCIERO:

Durante el periodo reportado el recurso proveniente del anticipo del proyecto se está invirtiendo en concordancia con las condiciones contractuales establecidas y con el respectivo seguimiento al plan de inversión presentado, garantizando la correcta destinación de los recursos para el desarrollo del proyecto.

8. CONCEPTO GENERAL SUPERVISOR ESTADO DEL CONTRATO EN EL MES DEL INFORME

Nombre del supervisor: MARIA CECILIA ARBELAEZ CASTAÑO.

Firma supervisor: _____

Profesional contratista Ambiental de apoyo Firma: Nombre:	Profesional contratista de apoyo gestión social y comunicacional Firma: Nombre:

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Contrato No. Xxx DE 2026
