1. INTRODUCCIÓN

El Plan De Manejo Ambiental, es un documento en el cual se establecen los programas o proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos socio-ambientales que se puedan generar, para el " MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", proyecto que contiene los obras necesarias para la instalación del pavimento articulado de la vía, ciclovia, andenes, sardineles, sumideros y la expansión del sistema de alcantarillado pluvial, los cuales son necesarios para mejorar los estándares y calidad de vida de la población aledaña.

A continuación, se presenta el primer informe de gestión ambiental del proyecto donde se evidencia la implementación del Plan de Manejo Ambiental con sus diferentes programas, junto con el seguimiento y control en el desarrollo de la obra. Dicho documento se irá actualizando durante la ejecución del proyecto.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohibe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Definir planes específicos que permitan prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos negativos causados por los impactos ambientales generados por la ejecución del proyecto en los medios abiótico, biótico y social, junto con los mecanismos de seguimiento y monitoreo de las medidas ambientales adoptadas, para atender las contingencias que se puedan generar en el desarrollo del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" sobre los recursos naturales y el entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el área de intervención del proyecto e identificar los grados de influencia directa e indirecta.
- Identificar los principales impactos ambientales y sociales que se generen durante el proyecto, definiendo su magnitud, área de influencia y temporalidad para asociarlo a las diferentes medidas de manejo, mitigación y compensación de los mismos, estableciendo los costos para su implementación.
- Evaluar los impactos ambientales que se generen por las actividades constructivas del proyecto en mención

Este documento pertenece a WER INGENIERÍA S.A.S. Queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS E INDICADORES POR PROGRAMA.

3.1. PROGRAMA 1 GESTIÓN DEL PROYECTO

3.1.1. Subprograma 1.1: conformación del grupo de gestión ambiental y social

Con el propósito de planificar todas las actividades de manejo ambiental relacionadas con el proceso constructivo, se conforma el Grupo de Gestión Socio-ambiental del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ liderado por:

Tabla 1. Grupo de Gestión Socio-ambiental.

DIRECTOR DE OBRA	Ing. William Eduardo Rojas Africano
INGENIERO RESIDENTE **MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**	Ing. Diego Fernando Orduz Rojas
GESTOR AMBIENTAL **MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**	Ing. Jennyfer Tatitana Franco Angarita
GESTOR SOCIAL **MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**	Ing. Diego Fernando Orduz Rojas

Fuente: Elaboración Propia

Se relaciona el número de profesionales socio-ambientales contratados sobre el número de profesionales requeridos, observando que el porcentaje de cumplimiento es del 100%.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Tabla 2. Indicadores número de profesionales contratados sobre número de profesionales requeridos.

Indicador	Descripción del indicador	Realizado en el periodo	Valor de indicador	Registro de cumplimiento
Vinculación = (Profesionales vinculados) x100 / Equipo mínimo de profesionales	Personal profesional socio-ambiental contratado para ejecutar las actividades de manejo del PMA	1/1	100%	Hojas de vida de los profesionales contratados

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2. Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra

Se realizará una capacitación mensual a los trabajadores, relacionadas con las actividades ambientales presentes en obra para el cumplimiento de las fichas ambientales

- "MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

En el mes que abarca junio 17 de 2026 al 16 de Julio del mismo año, se realizó una (1) capacitación ambiental (**Ver anexo I. Informe Ambiental - Capacitación personal de obra**) y capacitación al personal de obra sobre los protocolos de seguridad durante las actividades de obra. **(Ver anexo. Informe SG-SST Anexo 06: Charlas de seguridad y salud en el trabajo. Anexo 014: Programa de capacitaciones. Anexo 015: Registro de asistencia a capacitaciones. Anexo 06: Registro de charlas diarias).**

En la tabla 3 se relacionan las capacitaciones adelantadas en la obra durante el periodo evaluado

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Tabla 3. Capacitaciones Realizadas

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN	PROYECTO
junio- julio 2026	Se realizan capacitaciones y charlas de 5 minutos, sobre los protocolos de seguridad durante las actividades de obra.	Mejoramiento de la vía Monquirá - la reforma etapa 01 en el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 1. Capacitación ambiental.



Capacitación ambiental personal de obra.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4. Indicador número de trabajadores capacitados\número de total trabajadores.

Indicador	Descripción del indicador	Realizado en el periodo	Valor de indicador	Registro de cumplimiento
Capacitaciones = (Asistentes a reunión) x100 / Trabajadores del proyecto	% de trabajadores que reciben capacitación.	17/26	65.3%	Soportes de capacitación (paquetes de fotografías, listas de asistencia).

Fuente: Elaboración Propia

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

3.1.3. Subprograma 1.3: Seguimiento y control de los requerimientos legales

Las fuentes de materiales para el desarrollo del Contrato De Obra "MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"; se relacionan con todos los proveedores de obra en el periodo y que cumplen con todos los requerimientos exigidos para la disposición de material granular en obra. Igualmente, se relacionan los trámites requeridos para el correcto manejo del material RCD proveniente de la obra.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Tabla 5. Fuente de Materiales

RAZON SOCIAL	TITULAR	TIPO DE MATERIAL	PLACA DEL TITULO MINERO	NUMERO ACTO ADMINISTRATIVO	NUMERO DEL EXPEDIENTE AMBIENTAL	NUMERO ACTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL TITULO	TRAMO	OBSERVACIONES
EDUARD YAICID SALAMANCA VIANCHA Y JOSÉ NELSON CARDOZO PINEDA	EDUARD YAICID SALAMANCA VIANCHA Y JOSÉ NELSON CARDOZO PINEDA	ARENA	01515-15	Contrato de concesión	-----	RESOLUCIÓN No. 01780 17 Diiembre 2009	ACTIVO	1	Vigenica desde 01 de octubre del 2007 hasta 30 de septiembre 2037de
INVERSONES CALBOY SAS JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ	JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ	PIEDRA CALIZA	00908-15	----	OOLA-151-0	RESOLUCIÓN N° 00802 octubre 15 de 2004	ACTIVO	1	Vigencia 10 años a partir de fecha 04 de enero de 2008
AJARDO RINCON JULIO ELIECER	AJARDO RINCON JULIO ELIECER	MATERIAL ROCA O PIEDRA CALIZA EN BRUT	L685	Contrato de concesión	OOLA-0001/11	RESOLUCIÓN 1610	ACTIVO	1	Vigencia 30 años a partir de fecha 10 de MAYO de 2007

Elaboración: Elaboración propia

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

❖ INDICADOR DE MATERIAL GRANULAR INGRESADO A OBRA.

En la tabla el indicador refleja las fuentes de materiales aprobadas, sobre el número de fuente de materiales requeridas para el desarrollo de las actividades constructivas propias del contrato.

Tabla 6. Indicador número de fuente de materiales aprobadas/ número de fuentes de materiales requeridas.

Indicador	Descripción del indicador	Realizado en el periodo	Valor de indicador	Registro de cumplimiento
(Número de fuente de materiales aprobadas/ número de fuentes de materiales requeridas.) *100	% de fuentes e materiales requeridas.	3/3	100%	Soportes actos administrativos por la Corpoboyacá- Agencia Nacional Minera

Fuente: Elaboración Propia

❖ SEGUIMIENTO A PERMISOS AMBIENTALES.

El proyecto no requiere permisos ambientales

3.2. PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

3.2.1. subprograma 2.1: seguimiento, control y monitoreo al programa para el manejo integral de materiales de construcción.

Se realizan las siguientes actividades constructivas en el periodo evaluado.

- Excavación mecánica y manual
- Instalación de sardineles
- Instalación y compactación de material granular base

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

- Instalación de pavimento afirmado (Adoquin)
- Humectación

Imagen 2. Actividades constructivas en obra

Actividades constructivas realizadas





Actividades de cargue de material para la instalación de sardineles






Se realiza humectación en el tramo de la vía

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa



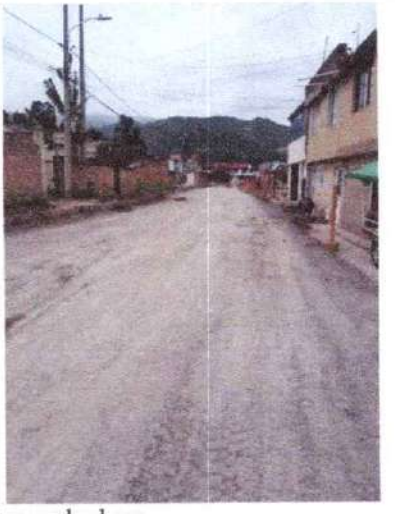

Instalación y compactación de material granular base.





Actividades de excavación de material

Fuente: Elaboración Propia

❖ Capacitaciones realizadas

Durante el periodo evaluado no se realizó capacitación al personal de obra.

En la siguiente tabla, el indicador refleja las medidas que se establecieron en obra para dar cumplimiento a lo establecido en las fichas ambientales del documento PMA

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Tabla 7. Indicador seguimiento /control de los materiales de construcción

INDICADORES DE GESTIÓN	Descripción del indicador	Realizado en el periodo	Valor de indicador	Registro de cumplimiento
Autorizaciones y/o permisos de explotación y comercialización de los materiales requeridos (AP) **AP =(AP tramitados en periodo) x100** **AP requeridos en periodo**	% de fuentes e materiales requeridas	3/3	100%	Soportes actos administrativos por Corpoboyacá y agencia nacional minera
Campañas de sensibilización ambiental y capacitación sobre el tema (CSA) **CSA=(Personas que asisten a capacitación) x100** **Total de personas**	% de trabajadores que reciben capacitación.	0/1	0%	Soportes de capacitación (paquetes de fotografías, listas de asistencia).

Fuente: Elaboración Propia


Se emplean proveedores, los cuales cuentan con los permisos minero ambientales vigentes, según requerimiento ambiental del proyecto, como se puede ver en la *tabla 6 fuentes de materiales.*

Durante el proceso constructivo de la obra, se dispuso el material necesario a aplicar para cada jornada de trabajo, evitando el almacenamiento de los materiales granulares en obra. Si llegado el caso se requiere acopiar, se cuenta con las medidas de protección necesarias, como el cubrimiento de los materiales con plástico tipo industrial de esta manera se evita la dispersión de material particulado en obra.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Imagen 3. Cubrimiento y señalización de materiales granulares



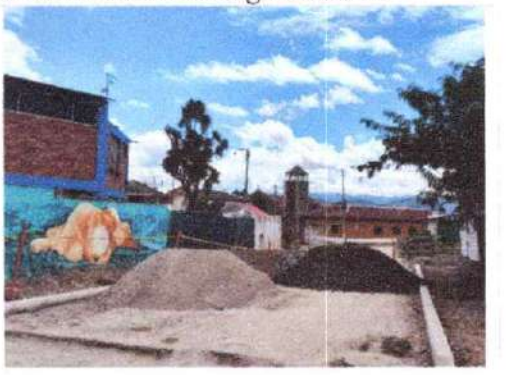

Señalización instalada en los acopios temporales de materia granulares de la obra.





Cubrimiento de materias granulares y

Fuente: Elaboración Propia

Las volquetas que ingresan a obra, con materiales granulares se encuentran carpadas, para evitar la dispersión de material particulado al medio.

3.2.2. Subprograma 2.2: seguimiento, control y monitoreo al manejo integral de explotación de fuentes de materiales.

Este programa no aplica al contrato debido a que todo el material que requiere el proyecto será suministrado por proveedores los cuales cuentan con los permisos ambientales vigentes, ver numeral 3.1.3. Subprograma 1.3: seguimiento y control de los requerimientos legales.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

3.2.3. Subprograma 2.3: Seguimiento y control a la señalización y aislamiento de la obra

Se siguen las especificaciones y recomendaciones de la interventoría para el buen desarrollo de las actividades.

La señalización preventiva, reglamentaria e informativa está avalada por parte del ente competente y la Interventoría e instaladas en obra, de acuerdo a lo estipulado en el PMT (Plan de Manejo de Transito). Sin embargo, se realiza verificación de la señalización instalada en obra en cada uno de los frentes de acuerdo a los requerimientos.

- **Informativas:** Como su nombre lo indica, su papel es proporcionar información, sobre los servicios y lugares que nos vamos a encontrar en el camino.
- **Reglamentarias:** Tienen como objetivo mostrar los límites y prohibiciones que hay en el camino; su violación constituye una falta que puede ser sancionable. Son Símbolos geométricos con borde rojo, fondo blanco y letra negra.
- **Preventivas:** La función de estas señales es mostrar al conductor los riesgos o factores de atención existentes en el recorrido. señales.

Tabla 8. Señalización instalada en obra

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANTIDAD
	BARRICADAS DE LISTONES CON SEÑAL DE DESVIO	SIO-05	2
	MALETINES O BARRERAS PLÁSTICAS	-	4


Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohibe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

	SEÑAL DE SENDERO PEATONAL	--	2
	SEÑALIZACIÓN OBRA	---	2
	COLOMBINAS	-	117


Fuente: Elaboración Propia

se realizan las siguientes actividades constructivas en el periodo evaluado.

Imagen 4. señalización instalada en obra

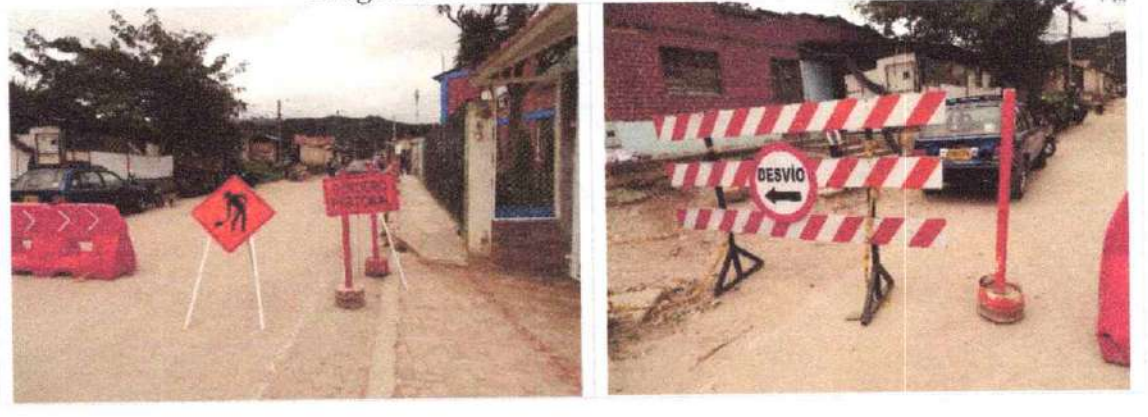

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

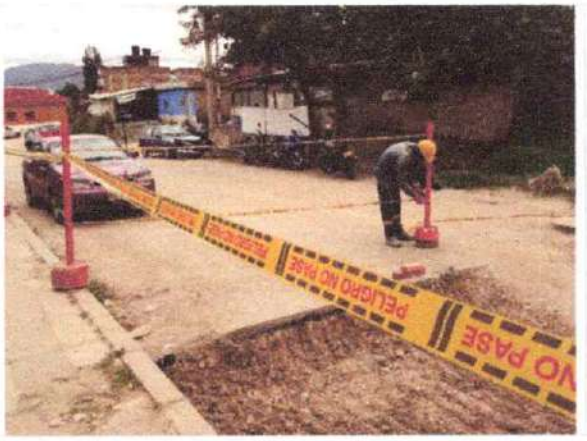





La señalización instalada en obra permanece las 24 horas, durante el día se realiza mantenimiento a la señalización dañada, de igual manera se mantienen los puntos de control de tráfico y senderos peatonales.

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla se relaciona el número de señales instaladas en obra, sobre número de señalización requerida en obra, realizando una descripción detallada de cada una.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Tabla 9 Indicador número de señales instaladas/número de señales requeridas

Indicador	Descripción del indicador	Realizado en el periodo	Valor de indicador	Registro de cumplimiento
S y D =(Señalización y demarcación Instalada) x100 / Señalización y demarcación propuesta	%Señalización Requerida	131/185	70%	Registro fotográfico,

Fuente: Elaboraión Propia.

3.2.4. Subprograma 2.4: seguimiento y control al manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.

- **Capacitaciones realizadas**

  Durante el mes de julio de 2026 no se realizó capacitación

- **Receptores**

Todo el material de excavación de tipo tierra fue dispuesto en predios aledaños a la obra, como material de relleno para nivelación de terrenos.

- Aplicando la Resolución 1257 del 2021, se realizó radicación de los documentos en la Alcaldía Municipal de Sogamoso, para la aprobación del sitio ZODME, donde se depositará el material de excavación producto del proyecto. (Ver Anexo III. Documentación Zodme)

Este documento pertenece a WER INGENIERÍA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Imagen 5. Sitio de Disposición de materiales RCD



Inicio de obra





16 de julio/2026

Sitio de Disposición de materiales de excavación
Fuente: Elaboración propia

- Nombre del propietario: Heiner Farid Castillo Avella - Apoderado
- Vereda: Monquira, Sogamoso.

- *Tabla 10. Indicadores de Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD)*

Indicadores De Gestión	Descripción Del Indicador	Realizado En El Periodo	Valor De Indicador	Registro De Cumplimiento
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se dispondrá el material (AERCD)	%predios autorizados	2/2	100%	Documentación del predio y certificados de la Alcaldia Municipal

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohibe su reproduccion total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

$AP = \left(\frac{\text{Predios utilizados para disposición en el periodo}}{\text{Autorizaciones propietarios en el periodo}} \right) * 100$				
Entrega de residuos RCD	% entrega de residuos	988.98/988.98	100%	Memorias material de excavación
$ERNA = \left(\frac{\text{Generación de residuos RCD en el periodo}}{\text{Cantidad de residuos entregados en el periodo}} \right) * 100$				
Capacitación	% personal capacitado	0	0	Registros fotográficos y planilla de asistencia
$Capacitaciones = \left(\frac{\text{Asistentes a capacitación}}{\text{Total de personal}} \right) * 100$				

Fuente: Elaboración Propia

3.2.5. Subprograma 2.5: seguimiento y control al manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales.

El personal de obra contribuyo a mantener las áreas de trabajo libres de residuos, realizando la recolección de los mismos diariamente a lo largo del proyecto.

Los residuos generados son recolectados y dispuestos de acuerdo a los requerimientos de disposición y se mantuvieron las áreas de trabajo libres de residuos, se adelantaron jornadas de orden y aseo en los corredores viales en el tramo.

- El proceso de disposición de residuos sólidos se realizó con la Compañía de Servicios públicos de Sogamoso COSERVICIOS S. A .E.S.P.
- La disposición se realizó los días jueves de cada semana, día estipulado por la empresa para la recolección y entrega, los residuos sólidos se seleccionaban con anterioridad en cada uno de los puntos ecológicos.
- Se disponen bolsas en frentes de obra de colores para la disposición de los residuos durante la jornada, por parte del personal de la obra.
- En la tabla se relacionan las cantidades generadas en el periodo de 2026, como también un acumulado total hasta la fecha.

Tabla 11. Residuos Sólidos Generados

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Control de residuos solidos

Periodo 2025	Julio de 2025		Cantidad total (kg)
	Residuos aprovechables	Residuos no aprovechables	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0.5	0.5	1

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 6. Disposición final de residuos solidos



Punto ecologico



Jornada de orden y aseo

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla 12 se relaciona el número de puntos ecológicos establecidos en obra, durante la ejecución del contrato de la referencia.

Tabla 12. Número de puntos ecológicos instalados/números de puntos ecológicos requeridos.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Indicador	Descripción del indicador	Realizado en el periodo	Valor de indicador	Registro de cumplimiento
(Número de puntos ecológicos instalados/números de puntos ecológicos requeridos) * 100	%cantidad de puntos ecológicos instalados.	1/1	100%	Registro fotográfico.

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 13 se relaciona la cantidad de residuos sólidos generados en obra durante toda la ejecución del contrato.

Tabla 13. Volumen de residuos sólidos dispuestos/ volumen de residuos sólidos generados.

Indicador	Descripción del indicador	Disposición Realizado en el periodo/kg	Valor de indicador	Registro de cumplimiento
(Volumen de residuos sólidos dispuestos/ volumen de residuos sólidos generados) * 100	%cantidad residuos generados.	1/1	100%	Registro fotográfico.

Fuente: Elaboración Propia

ORIGEN DEL MATERIAL PELIGROSO:

Los residuos peligrosos generados en obra, como filtros de aceite, filtros de aire, estopas y trapos contaminados, tierra contaminada, cartón, papel contaminado, epps entre otros, serán dispuestos cada mes, esto dependerá de la cantidad de residuos que existen en la obra.

- En el periodo evaluado de la obra no se generaron residuos peligrosos.

.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

3.3. PROGRAMA 3. GESTIÓN HÍDRICA.

3.3.1. Subprograma 3.1: seguimiento y control al manejo de aguas superficiales

Dentro del desarrollo del proyecto no se tramitará permiso de concesión de aguas superficiales, dado que el proyecto no requiere de recurso agua para los procesos constructivos.

3.3.2. Subprograma 3.2: seguimiento y control al manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. Para el manejo de los residuos líquidos domésticos e industriales se dio manejo con unidades sanitarias en las viviendas del área de influencia de la obra, con previo consentimiento por los propietarios.

Dentro del proyecto se encuentra 2 unidades sanitarias.

.Imagen 3. Unidades sanitarias en obra



Fuente: Elaboración Propia

3.4. PROGRAMA 4 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

Este programa no se desarrollará en la ejecución de la obra, en las actividades constructivas no se ve alterado algún ecosistema dado que en el tramo no hay existencia de dichos individuos.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

3.5. PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

3.5.1. Subprograma 5.1: seguimiento, control y monitoreo a la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales.

Se ubico un lugar de acopio temporal para herramientas menores y señalización en una vivienda aledaña a la obra. El lugar se encuentra techado y no interrumpe las actividades del personal de la obra, ni de la comunidad.

Las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a este subprograma en el periodo a reportar fueron:

Durante la instalación

- Ubicación del área de campamento y/o acopio temporal
- Delimitar las zonas de campamento y acopio.
- Implementar señalización ambiental y de seguridad.

Durante el funcionamiento

- Mantener orden y limpieza en las instalaciones.
- Inspeccionar periódicamente el estado de las áreas de almacenamiento.
- Contar con kits para atención de derrames y personal capacitado.

Imagen 8. Sitio de almacenamiento temporal

Este documento pertenece a WER INGENIERÍA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa



Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. N° de campamentos ubicados conforme a los criterios ambientales / N.° total de campamentos)

Indicador	Descripción del indicador	Realizado en el periodo	Valor de indicador	Registro de cumplimiento
(N.° de campamentos ubicados conforme a los criterios ambientales / N.° total de campamentos) × 100	%cantidad residuos generados.	1/1	100%	Registro fotográfico.

Fuente: Elaboración propia

3.5.2. Subprograma 5.3: seguimiento, control y monitoreo al manejo de maquinaria, equipos y vehículos

En la tabla 15 se relaciona la maquinaria empleada en obra se anexa la documentación junto con las hoja de vida. Ver anexo IV. Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Tabla 15. Relación de Maquinaria en obra.

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

No.	MAQUINARIA EN OBRA	CANTIDAD
1	Retroexcavadora de llanta	1
2	Motoniveladora	1
3	Volqueta sencilla	2
4	Compactador tipo cilindro y llanta	1
5	Volqueta Doble	2
6	Camión Tanque Agua	1
7	Mezcladora de concreto 1 Bulto	1
8	Pulidoras	2
9	Camioneta Estacas Kia 2700	1
10	Compactador tipo canguro	3
11	Martillo Neumático Eléctrico	1
12	Compactador tipo rana	1
13	Minicargador	1
14	Camión sencillo	1

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla16 se describe la relación de vehículos y maquinaria en obra, cumpliendo con la documentación completa SOAT, CERTIFICADO DE EMISIÓN DE GASES, y para la maquinaria la hoja de vida.

Tabla 16. Indicador de Relación de Vehículos en Obra

Indicador	Descripción del indicador	Realizado en el periodo	Valor de indicador	Registro de cumplimiento
Número de vehículos con Documentación completa (SOAT, certificado de Emisión de gases) / Número de vehículos adscritos al contrato en el periodo*100	Vehículos con Documentación completa.	14/14	100%	Documentación (SOAT, certificado de emisión de gases)

Fuente: Elaboración Propia

Este documento pertenece a WER INGENIERIA S.A.S. Se prohibe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

4. ANEXOS

1. Anexo I. Capacitación personal de obra
2. Anexo II. Certificaciones de Calidad
3. Anexo III. Documentación de ZODME
4. Anexo IV- Memorias material de excavación
5. Anexo V. Documentación de maquinaria, equipos y vehículos
6. Anexo VI. Incorporación de sumideros al plan de expansión de la red de alcantarillado pluvial

Este documento pertenece a WER INGENIERÍA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director de la empresa

Anexo 1.

563

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	P-FOR-09
		Versión	2.0
		Fecha	16/02/2026

Tema	Inducción Ambiental = Manejo de RCD, materiales (arena, base-) Residuos sólidos y señalización en obra.				
Responsable	Ing. Jennyfer Tatiana Franco Angarita				
Fecha	06 de julio/2026	Hora inicio	1:00 pm	Hora Final	1:30 pm.

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Rolando Vargas Montes	Ayudante	8395745	
2	Yeisa Estivel Lira	ayudante	1002740770	Yeisa
3	Johan Fernandez	cajadante	1007764878	
4	Oscar Talero	Oficial	7418122	
5	Santiago Lopez	OPERADOR MINI OFI. V	1142790892	S. Lopez
6	Luis A cardenas	AJ	13493491	
7	Jose Luis Lopez	OP. Retro	1093785461	Jose Luis Lopez
8	Nelson Guzman	OP. Vibro	1057593443	
9	José Nieto	Oficial	1052307730	José
10	Fabio E Flores	oficial	9530277	Fabio Flo
4	Fidel Polanco	OF	9590473	Fidel Pol.
12	Luis Alejandro Picciado	oficial	1057592348	
13	Roberto Lopez	Auxiliar	74185842	
14	JESUS ALFONSO	OF MUTO	9520553	
15	Julio F	Maestro	74181414	
16	Jhon Esteban Lopez	Auxiliar	1002760004	
17.	IVAN SUAREZ	AUXILIAR	1057597665	IVAN SUAREZ

Observaciones:

Alejandra Rojas	Yesica Murcia	William Rojas
Analista sst	Profesional SST	

Anexo 11
564

Rad: 20251013011423?

Ingeniero,
HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO
Secretario De Infraestructura Y Proyectos
Alcaldía Municipal De Sogamoso
Ciudad,

Asunto: Solicitud de permiso para recepción de material RCD y relleno de predio proveniente de la obra Mejoramiento De La Vía Monquirá - La Reforma Etapa 01 En El Municipio De Sogamoso, Departamento De Boyacá,

Ingeniero reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente, yo HEINER FARID CASTILLO AVELLA identificado (a) con cédula de ciudadanía 1.057.592.417 expedida en la ciudad de Sogamoso, y en calidad de , y en calidad de apoderado por los señores: Mery Castillo de Niño, Jorge Armando Castillo Rodríguez, José Alonso Castillo Rodríguez, Reiner Castillo Rodríguez y María Antonia Rodríguez de Gómez, quienes son los propietarios del predio denominado "la cuadrita" ubicado en la TV 1 # 3 SUR – 46, con matrícula mercantil **_095-129558__** y registro catastral **157590002000000011871000000000,** ubicado en la vereda **MONQUIRA** en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, como se evidencia en el certificado de libertad y tradición y los poderes adjuntos a este documento, del predio.

Solicito muy comedidamente me otorgue el permiso para recibir el material de excavación y residuos RCD generado por las actividades de mejoramiento vial ejecutado por la empresa WER INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT. 900.943.507-3, y que en el predio en mención se realicen las actividades de recepción y/o disposición final de residuos.

Cabe mencionar que estas actividades no generan ningún vínculo con la empresa contratista, tampoco un pago por el material recibido en nuestro predio; e igualmente, se exime a los contratistas y a la institución, de cualquier responsabilidad contractual, legal, jurídica, ambiental, económica, afectación y/o cualquiera que haya lugar.

Agradezco la atención prestada y pronta respuesta

Sin otro particular me suscribo de ustedes

Cordialmente,

HEINER FARID CASTILLO AVELLA
C.C. 1.057.592.417 Sogamoso
Apoderado del predio la Cuadrita

Señores:
WER INGENIERIA. S.A.S
Nit. 900.943.507 – 3
Ciudad,

Asunto: Solicitud de material de excavación proveniente de la obra Mejoramiento De La Vía Monquirá - La Reforma Etapa 01 En El Municipio De Sogamoso, Departamento De Boyacá, para nivelación de predios.

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente, yo HEINER FARID CASTILLO AVELLA, identificado (a) con cédula de ciudadanía 1.057.592.417 expedida en la ciudad de Sogamoso, y en calidad de apoderado por los señores: Mery Castillo de Niño, Jorge Armando Castillo Rodriguez, José Alonso Castillo Rodriguez, Reiner Castillo Rodriguez y Maria Antonia Rodriguez de Gomez, quienes son los propietarios del predio denominado "la cuadrita" ubicado en la TV 1 # 3 SUR – 46, con matricula mercantil **_095-129558__** y registro catastral **15759000200000001187100000000,** ubicado en la vereda **MONQUIRA** en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, como se evidencia en el certificado de libertad y tradición y los poderes adjuntos a este documento, del predio.

Solicito muy comedidamente a la empresa WER INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT. 900.943.507-3 sea proporcionado el material de excavación y residuos RCD generado por las actividades de mejoramiento vial ejecutado por la empresa, y que en el predio en mención se realicen las actividades de recepción y/o disposición final de residuos de construcción y demolición, provenientes de la obra. Cabe mencionar que estas actividades no generan ningún vínculo con la empresa, tampoco un pago por el material recibido en nuestro predio; e igualmente, se exime a la empresa WER INGENIERIA S.A.S, de cualquier responsabilidad contractual, legal, jurídica, ambiental, económica, afectación y/o cualquiera que haya lugar.

Agradezco la atención prestada y pronta respuesta

Sin otro particular me suscribo de ustedes

Cordialmente.

HEINER FARID CASTILLO AVELLA
C C 1.057.592.417 Sogamoso
Apoderado del predio la Cuadrita

WER INGENIERÍA S.A.S.

El anexo III del componente ambiental viene en el numeral:
G. CERTIFICADOS DE CALIDAD

320 491 4210 ingenieriawrtecnica@gmail.com Carrera 24 No. 16 -77 Edificio Rojas Ortegon
Sogamoso, Boyacá

Anexo IV
507

R INGENIERÍA S.A.S

Sogamoso, 14 de julio de 2026

WER-RF-003-2026

Ingeniero
PEDRO NEEL GONZÁLEZ
Director de Operaciones
COSERVICIOS E.S.P
E. S. D.

Referencia: Solicitud de anexión al plan de expansión de la red de alcantarillado pluvial de la ciudad de Sogamoso, los vertimientos provenientes de los sumideros proyectados en el contrato de obra No. 20260631 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Estimado ingeniero, reciba un cordial saludo desde WER INGENIERIA S.A.S,

William Eduardo Rojas Africano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 900.943.507 – 3 de Sogamoso, actuando como representante legal de WER INGENIERIA S.A.S., identificada con Nit 900.943.507-3, respetuosamente me permito solicitar que los vertimientos provenientes de los sumideros proyectados en el contrato de obra No. 20260631 con objeto "*MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ*" sean incorporados al plan de expansión de la red de alcantarillado pluvial de la ciudad de Sogamoso.

3.11	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO	und	12,0

I. NOTIFICACIONES

Téngase como datos de notificación los contenidos en el escrito de notificación al correo electrónico: ingenieriawrtecnica@gmail.com, dirección de domicilio: Carrera 24 # 16 -77 Sogamoso, y lo números celulares: 322 2415590 - 320 4914210

Agradezco la atención prestada
Sin otro particular me suscribo de usted

Cordialmente,

William Eduardo Rojas Africano
Representante legal WER INGENIERIA S.A.S
Nit 900.943 507-3

Recibí y se aprobó.
14/07/2026.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-2026

UBICACIÓN:	SOGAMOSO - BOYACÁ
DURACIÓN:	6 MESES
ARRENDATARIO:	WER INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 24#16-77 EDIFICIO ROJAS ORTEGON
TELÉFONO:	3204914210
ARRENDADOR:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S
NIT:	826.002.051-1
DIRECCIÓN:	KM 6 VIA SOGAMOSO BELENCITO
TELÉFONO:	315 649 6385

En el municipio de Sogamoso, a los 9 días del mes de marzo de 2026 entre el señor **EMILIANO VARGAS MESA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Sogamoso, identificado con la cedula de ciudadanía No 9.520.277, actuando en representación legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY SAS** con Nit 826.002.051-1 quien en adelante se denominara **EL ARRENDADOR**, por una parte, y el señor **WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. *9.534.232* de Sogamoso, actuando en representación legal de la empresa WER INGENIERIA SAS con Nit 900.943.507-3 domiciliado en la ciudad de Sogamoso, , quien en adelante será denominado **EL ARRENDATARIO**, se conviene en celebrar el presente **CONTRATO DE ALQUILER** sujeto a las siguientes cláusulas: **PRIMERA. -** El ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO en alquiler la siguiente maquinaria y equipo:

EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	VALOR
MOTONIVELADORA	2011	CATERPILLAR 120K	A convenir de acuerdo al sitio del alquiler

Los cuales son recibidos por EL ARRENDATARIO de conformidad. **SEGUNDA. -** El equipo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento en buenas condiciones de uso. **TERCERA.** -El precio del arrendamiento se establece a mes anticipado. **CUARTA.** -EL ARRENDATARIO destinará el equipo para el trabajo que se requiere en la orden de trabajo para el cual se destinara el uso y deberá manejarla la persona que se encuentra capacitada para ello. **QUINTA.** -En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá EL ARRENDATARIO arrogarse el carácter de representante, agente o mandatario del ARRENDADOR. **SEXTA. -E**L ARRENDATARIO es enteramente responsable mientras permanezca en la tenencia del equipo los siguientes perjuicios: **a)** Por cualquier daño a la propiedad causado al o el equipo arrendado. **b)** Por los daños causados a terceras personas. **c)** Por los daños causados a personas y/o bienes transportados. **OCTAVA. -** EL ARRENDATARIO abonará al ARRENDADOR al contado y en el domicilio de éste, el alquiler **NOVENA-** EL ARRENDATARIO no podrá dedicar el equipo arrendado a: **a)** Usos distintos

a los estipulados en este contrato. **b)** A hacer trabajos diferentes por el cual se contrató. **DÉCIMA** - EL ARRENDATARIO se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de estas cláusulas y acuerda que el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar al ARRENDADOR a declarar cancelado el arrendamiento sin necesidad de requerimiento y /o intimación previa alguna de parte de ésta, quedando a cargo del primero todas y cada una de las obligaciones que ha asumido con la firma del presente. Las contravenciones a las distintas cláusulas de este contrato configurarán para EL ARRENDATARIO la consumación de los delitos penales que las circunstancias indiquen al ARRENDADOR, se hubieran cometido, como por ejemplo la de conexión o cualquier tentativa para impedir el normal funcionamiento del equipo arrendado **DÉCIMA PRIMERA.** - EL ARRENDATARIO conviene que para toda diferencia y/o reclamo derivado de la presente, se somete a la jurisdicción de Sogamoso, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. A tal efecto constituye domicilio en la CARRERA 24#16-77 EDIFICIO ROJAS ORTEGON – SEDE PRINCIPAL.

Se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, entregándose la maquinaria al ARRENDATARIO.

EL ARRENDADOR:

CONSTRUCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY S.A.S
NIT 826.002.051-1
EMILIANO VARGAS MESA
Representante Legal

EL ARRENDATARIO:

WER INGENIERIA SAS
NIT 900.943.507-3
William Eduardo Rojas Africano
Representante Legal

570

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 62227

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC033860	CATERPILLAR	120K	2011

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MOTONIVELADORA	CAT0120KHSZN00550

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	KHX29786	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
17000 Kg	3326 mm	2449 mm	9769 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA

IDENTIFICACIÓN
NIT 826.002.051

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
12-02-2016	06-09-2019	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	48M2011000242176	07/12/2011



COSMO-ID-13-19

ESTA TARJETA [illegible] TERRITORIO NACIONAL

TM0700001019

CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 06/02/2026 - 15:38:36
Recibo No. S000392094, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN d1qv2mvHXU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=35 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S
Nit : 826002051-1
Domicilio: Nobsa, Boyacá

MATRÍCULA

Matrícula No: 25673
Fecha de matrícula: 24 de marzo de 2000
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : KM 6 VIA SOGAMOSO BELENCITO
Municipio : Nobsa, Boyacá
Correo electrónico : organizacion.evm@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3156496385
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3203423895

Dirección para notificación judicial : KM 6 VIA SOGAMOSO BELENCITO
Municipio : Nobsa, Boyacá
Correo electrónico de notificación : organizacion.evm@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 616 del 14 de marzo de 2000 de la Notaria 2a. De Sogamoso , inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2000, con el No. 6279 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA LIMITADA PAVIBOY LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 539 del 09 de marzo de 2010 de la Notaria Segunda de Sogamoso, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de abril de 2010, con el No. 9894 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTARIA- AMPLIACION VIGENCIA

Por Escritura Pública No. 205 del 31 de enero de 2013 de la Notaria Segunda de Sogamoso, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de marzo de 2013, con el No. 11479 del Libro IX, se decretó

CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 06/02/2026 - 15:38:36
Recibo No. S000392094, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN d1qv2mvHXU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=35 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

REFORMA DE ESTATUTOS - ATRIBUCIONES DEL GERENTE

Por Escritura Pública No. 1256 del 19 de junio de 2014 de la Notaria Segunda de Sogamoso, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2014, con el No. 12140 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTARIA: AUMENTO VIGENCIA

Por Acta No. 27 del 08 de marzo de 2022 de la Junta de Socios de Nobsa, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2022, con el No. 18092 del Libro IX, se inscribió TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LTDA A S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal la transformación producción y comercialización de mezclas asfálticas para pavimentos flexibles y productos minerales; construcción de a) Obras civiles b) Obras sanitarias y ambientales. c) Edificaciones y obras de urbanismo. d) Obras para minería e hidrocarburos (explotación minería) e) obras de transporte y complementarios, vías de comunicación en superficie, pavimentos rígidos, pavimentos flexibles señalización y semaforización, seguridad aérea, puentes atirantados y cables aéreos, perforaciones, túneles y excavaciones subterráneas alquiler y venta de maquinaria y equipo, y todos los actos directamente relacionados con las actividades indicadas en los puntos anteriores y los encaminados al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, derivadas de la existencia y actividad de la sociedad al tenor del artículo 99 del Código de Comercio. para el desarrollo y cabal realización de este objeto principal, la sociedad podrá: a) Adquirir muebles e inmuebles para usufructuarlos y eventualmente arrendarlos o enajenarlos. b) Formar parte como socia o accionista de sociedades de riesgo limitado. c) Llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito y actos jurídicos con títulos valores. d) En general celebrar toda clase de actos, operaciones y contratos que tengan relación directa con el objeto principal o cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y el funcionamiento de la compañía. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 5.000.000.000,00
No. Acciones	62.500,00
Valor Nominal Acciones	$ 80.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 80.000.000,00
No. Acciones	1.000,00

CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 06/02/2026 - 15:38:36
Recibo No. S000392094, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN d1qv2mvHXU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=35 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Valor Nominal Acciones	$ 80.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 80.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 80.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, quien a su vez tendrá un suplente denominado Representante legal suplente, designado por la asamblea general de accionistas para un término indefinido.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo: El representante legal suplente tendrá las mismas funciones y facultades del representante legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 616 del 14 de marzo de 2000 de la Notaria 2a. De Sogamoso, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2000 con el No. 6279 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	EMILIANO VARGAS MESA	C.C. No. 9.520.277
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LILIA MESA DE VARGAS	C.C. No. 24.107.842

REVISORES FISCALES

CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 06/02/2026 - 15:38:36
Recibo No. S000392094, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN d1qv2mvHXU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=35 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Por Acta No. 26 del 20 de agosto de 2020 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de agosto de 2020 con el No. 16840 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	MILLER OSWALDO ALARCON BARRERA	C.C. No. 74.180.038	73696-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 539 del 09 de marzo de 2010 de la Notaria Segunda Sogamoso	9894 del 06 de abril de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 205 del 31 de enero de 2013 de la Notaria Segunda Sogamoso	11479 del 22 de marzo de 2013 del libro IX
*) E.P. No. 1256 del 19 de junio de 2014 de la Notaria Segunda Sogamoso	12140 del 25 de junio de 2014 del libro IX
*) Acta No. 27 del 08 de marzo de 2022 de la Junta De Socios	18092 del 16 de marzo de 2022 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4210
Actividad secundaria Código CIIU: C1921
Otras actividades Código CIIU: F4290

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 06/02/2026 - 15:38:36
Recibo No. S000392094, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN d1qv2mvHXU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=35 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Nombre: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S
Matrícula No.: 25674
Fecha de Matrícula: 24 de marzo de 2000
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : KR 6 VIA SOGAMOSO BELENCITO
Municipio: Nobsa, Boyacá

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $5.061.365.339,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
ARIEL ANDRÉS MORALES CIFUENTES

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.520.277
VARGAS MESA
APELLIDOS
EMILIANO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-SEP-1955
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

28-FEB-1977 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0727700-00226495-M-0009520277-20100319 0021685664A 1 27703553

	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Codigo	H-FOR-25
		Version	2
		Fecha	2/02/2026

Responsable	Egdar Santiago Gonzalez Rojas	**Cargo**	Operario y servicios varios
Autorizado Por	William Eduardo Rojas Africano	**Area de Trabajo**	Proyecto via la reforma

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS

El minicargador es una máquina compacta autopropulsada sobre ruedas (o cadenas, en algunos modelos), diseñada para realizar tareas de carga, movimiento y nivelación de materiales en espacios reducidos. Gracias a su tamaño compacto, maniobrabilidad y gran versatilidad (por el uso de accesorios), es ampliamente utilizada en construcción, agricultura, paisajismo, obras viales y minería liviana.

DETALLE	CARACTERISTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	MINICARGADOR
TIPO DE MOTOR	Diésel, 4 cilindros
POTENCIA DEL MOTOR	45 – 100 HP (caballos de fuerza)
CAPACIDAD DE CARGA	600 – 1200 kg (dependiendo del modelo)
PESO OPERATIVO	2,500 – 4,000 kg
VELOCIDAD MAXIMA	10 – 18 km/h
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA	2.2 – 2.8 m
SISTEMA DE TRACCIÓN	4 RUEDAS



REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

FECHA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	TIPO DE MTO		MATERIALES	COSTOS	MANTENIMIENTO REALIZADO
		P	C			
5/06/2026	Revisión y cambio de aceite del motor	x		Aceite diésel, filtro de aceite, llave de drenaje, embudo	Mano de obra y materiales.	Mecanico externo
5/07/2025	Soldadura en brazos generales	X		Esquipo de soldadura	$ 350.000	Mecanico externo
5/08/2025	Cambio de aceite	X		Aceite diésel, filtro de aceite, llave de drenaje, embudo	Mano de obra y materiales.	Mecanico externo
5/09/2025	Cambio de aceite	X		Aceite diésel, filtro de aceite, llave de drenaje, embudo	Mano de obra y materiales.	Mecanico externo
19/06/2026	Cambio de aceite	X		Aceite diésel, filtro de aceite, llave	Mano de obra y materiales.	Mecanico externo

SYMAQ S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código: 1236 Versión: 1 Fecha: 26-02-2020

DATOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**RETROCARGADOR CATERPILLAR 416E**		
CÓDIGO:	MC007556	**MARCA:**	CATERPILLAR
MODELO:	2013	**N° DE SERIE:**	CAT416EKMFG04666
FABRICANTE:	CATERPILLAR	**FECHA DE ADQUISICIÓN:**	1 JUNIO DE 2023
IMPORTADOR:	**GECOLSA**	**TELEFONO:**	18000919920
ANCHO:	2300 mm	**LARGO:**	7290 mm
ALTO:	2820 mm	**PESO:**	6790 Kg
VOLTAJE:	12 V	**CLASE DE PROTECCIÓN:**	CABINA ABIERTA

FOTOGRAFIA DEL EQUIPO



TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA



DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
ENGRASE PASADORES, CHEQUEO DE FLUIDOS, PRESION O INFLADO DE LLANTAS, REVISIÓN DE LUCES, PITO DE REVERSA	DIARIO	GRASA, ACPM, REFRIGERANTE, ACEITES
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	CADA 250 HORAS	ACEITE MX 15W40, FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE)
REVISION Y/O AJUSTE DE PASADORES	CADA 1000 HORAS	
CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	CADA 2000 HORAS	ACEITE HIDRAULICO CAT

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA			DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
DIA	MES	AÑO				
1	JUNIO	2023	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 5371 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	OSVALDO
6	JUNIO	2023	INSTALACION VIDRIO IZQ INFERIOR FRONTAL	NO TIENE EL VIDRIO INDICADO	VIDRIO NUEVO	AUTOPARABRISAS SAN MARTIN
19	JUNIO	2023	INSTALACION FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE	NO TIENE FILTRO PRIMARIO SOLO SECUNDARIO	BASE FILTRO ACPM COMPLETO	GREGORIO SILVA
20	JUNIO	2023	CAMBIO BALDE TRASERO	BALDE USADO	BALDE 60 CM ANCHO	EDWIN RODRIGUEZ
21	JUNIO	2023	SELLADO CON SOLDADURA DE FISURA EN GEMELA DERECHA	ESCAPE DE ACEITE HIDRAULICO POR BASE DE GEMELA DERACHA	SOLDADURA	EDWIN RODRIGUEZ
9	JULIO	2023	CAMBIO BOTELLA DE GIRO DERECHA	CAMISA ROTA BOTELLA DE GIRO	BOTELLA DE GIRO USADA	EDWIN RODRIGUEZ
10	JULIO	2023	CAMBIO MANGUERA BALDE FRONTAL	MANGUERA ROTA	MANGUERA NUEVA	MULTITORNILLOS

SYMAQ S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERIA Y MAQUINARIA	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código: 1236 Versión: 1 Fecha: 26-02-2020

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA			DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
DIA	MES	AÑO				
20	JULIO	2023	CAMBIO MANGUERA ESTABILIZADORA	MANGUERA ROTA	MANGUERA NUEVA	MULTITORNILLOS
10	AGOSTO	2023	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 5621 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	EDWIN RODRIGUEZ
11	AGOSTO	2023	INSTALACION EXPLORADORA LATERAL TRASERA DERECHA	NO TIENE EXPLORADORA LATERAL	EXPLORADORA	EDWIN RODRIGUEZ
31	AGOSTO	2023	SOLDADURA BARRA SPULL MANDO BALDE FRONTAL	SE ROMPE UNA VARILLA DEL MANDO	SOLDADURA	EDWIN RODRIGUEZ
4	OCTUBRE	2023	INSTALACION BOMBA TRANSFERENCIA ACPM	BOMBA AUXILIAR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE H5835	BOMBA ELECTRICA	EDWIN RODRIGUEZ
7	OCTUBRE	2023	CAMBIO EMPAQUETADURA BOTELLA STICK Y ESTABILIZADORA DERECHA	FUJAS EN BOTELLAS INDICADAS	EMPAQUETADURAS	GREGORIO SILVA
9	OCTUBRE	2023	INSTALACION EXPLORADORA LATERAL TRASERA IZQUIERDA	NO TIENE EXPLORADORA LATERAL	EXPLORADORA	EDWIN RODRIGUEZ
17	OCTUBRE	2023	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 5871 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	EDWIN RODRIGUEZ
23	OCTUBRE	2023	ARREGLO CAPO MOTOR	PINTURA GENERAL CAPO Y EXOSTO	PINTURA	EDWIN RODRIGUEZ
2	NOVIEMBRE	2023	ARREGLO TAPA CAJÓN BATERIA Y SOPORTES MANGUERAS BALDE	PINTURA TAPA	PINTURA	EDWIN RODRIGUEZ
25	NOVIEMBRE	2023	CAMBIO BOTELLA DE GIRO DERECHA	BOTELLA DE GIRO SE DESCARGA	BOTELLA DE GIRO USADA	EDWIN RODRIGUEZ
23	DICIEMBRE	2023	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 6128 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
24	ENERO	2024	CAMBIO BUJES SILLIN, BOOM, STICK, VOLTEO, ESTABILIZADORAS	DESGASTE AVANZADO EN LOS BUJES MENCIONADOS	BUJES PASADORES	GREGORIO SILVA
20	MARZO	2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 6381 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	ELI NIÑO
22	ABRIL	2024	CAMBIO DE MANGUERA STICK, VULCANIZADA LLANTA DEL IZQ	MANGUERIA AVERIADA Y LLANTA CON DESPEGUE DE TACO	1/2 MANGUERA, VULCANIZADA LLANTA	MULTITORNILLOS - EDER
10	MAYO	2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 6633 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	ELI NIÑO
4	JUNIO	2024	CAMBIO DE MANGUERA ESTABILIZADORA	MANGUERIA AVERIADA	1/2 MANGUERA	MULTITORNILLOS
8	JULIO	2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 6903 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	ELI NIÑO
16	JULIO	2024	ARREGLO SWICH Y PITO TRASERO	SWICH MOLESTA AL ENCENDIDO Y SE REQUIERE PITO PARA CARGUE	PITO TRASERO	EDISON
25	JULIO	2024	VULCANIZADA LLANTA DEL IZQ	DESPEGUE DE TACO	VULCANIZADA LLANTA	EDER
9	AGOSTO	2024	CAMBIO DE MANGUERA STICK	MANGUERIA AVERIADA	MANGUERA NUEVA	MULTITORNILLOS
29	AGOSTO	2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 7188 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	ELI NIÑO
28	SEPTIEMBRE	2024	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN DE LA DOBLE	CAMBIO 7335 HORAS	CRUCETA CARDAN DOBLE	RICARDO MONTAÑEZ
29	OCTUBRE	2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 7465 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	CARLOS
1	NOVIEMBRE	2024	REFUERZO BALDE FRONTAL	FISURAS Y DESGASTE EN LA BASE	LAMINAS REFUERZO Y SOLDADURA	ORLANDO ALARCON
2	NOVIEMBRE	2024	CAMBIO DE MANGUERA BOOM	MANGUERIA CON DESGASTE PRONTO PUEDE ESTAR AVERIADA	1/2 MANGUERA	MULTITORNILLOS
5	NOVIEMBRE	2024	RETOQUE PINTURA GENERAL	PINTURA EN MAL ESTADO	PINTURA CAT	NELSON GUZMAN
20	ENERO	2025	CAMBIO DE DIENTES BALDE	DIENTES DESGASTADOS	DIENTES NUEVOS Y PASADORES	EDWIN RODRIGUEZ
23	ENERO	2025	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 7715 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	EDWIN RODRIGUEZ
29	MARZO	2025	MANTENIMIENTO ARRANQUE E INSTALACION	PROBLEMAS DE ENCENDIDO Y CABLES MAL CONECTADOS	MANTENIMIENTO ARRANQUE, AJUSTE INSTALACION ELECTRICA	JAIME SANABRIA
23	ABRIL	2025	CAMBIO BUJES Y PASADORES BALDE TRASERO Y BUJES BOTELLAS DE GIRO, CAMBIO EMPAQUETADURA CONTROL TRASERO Y BOTELLA DE GIRO DERECHA (H7926,4)	DESGASTE AVANZADO EN LOS BUJES MENCIONADOS, FUGA EN BOTELLA DE GIRO Y CONTROL TRASERO	BUJES PASADORES Y EMPAQUETADURAS	GREGORIO SILVA
30	ABRIL	2025	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 7977 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	JOSE LOPEZ
7	JUNIO	2025	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 8216 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	JOSE LOPEZ
14	JUNIO	2025	VULCANIZADA LLANTA TRASERA IZQUIERDA E INSTALACION CUCHILLAS CUCHARON FRONTAL	DESPEGUE DE TACO Y CUCHILLAS DELANTERAS PARA CAMBIO	DESPINCHE LLANTA Y CUCHILLAS CUCHARON FRONTAL NUEVAS	EDER CARDENAS Y JOSE LOPEZ
24	JUNIO	2025	CAMBIO DIENTES ESQUINEROS BALDE	DESGASTE EN DIENTES LATERALES BALDE TRASERO	DIENTES NUEVOS	JOSE LOPEZ

SYMAQ S.A.S.
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA

HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS

Código: 1236
Versión: 1
Fecha: 26-02-2020

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA DIA / MES / AÑO			DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
1	JULIO	2025	SOLDADURA ENCIA DIENTE IZQUIERDO BALDE TRASERO Y REFUERZO BALDE	ENCIA SE DESPRENDE DEL BALDE Y SE ABRE AGUJERO EN EL FONDO DEL BALDE	ENCIA Y SOLDADURA LAMINA	ORLANDO ALARCON
3	JULIO	2025	CAMBIO ALTERNADOR	ALTERNADOR FRENADO	ALTERNADOR	ELECTRICOS EL LIBERTADOR
18	JULIO	2025	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 8480 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	JOSE LOPEZ
28	AGOSTO	2025	INSTALACION NEUMATICO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	PINCHADA POR TACO DESPEGADO	DESPINCHE LLANTA E INSTALACION NEUMATICO	EVER CARDENAS
29	AGOSTO	2025	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 8740 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	JOSE LOPEZ
30	SEPTIEMBRE	2025	REPARACION BOMBA DE INYECCION, PUNTAS DE INYECTORES	MAQUINA NO PRENDE POR INYECCION	REPARACION BOMBA DE INYECCION, PUNTAS DE INYECTORES	GDIESEL Y GREGORIO SILVA
7	OCTUBRE	2025	INSTALACION BOTA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	PINCHADA POR TACO DESPEGADO	DESPINCHE LLANTA E INSTALACION BOTA	JOSE MARIAS
23	OCTUBRE	2025	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 9005 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	JOSE LOPEZ
15	DICIEMBRE	2025	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 9260 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	JOSE LOPEZ
7	FEBRERO	2026	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 9522 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	JOSE LOPEZ
10	FEBRERO	2026	CAMBIO DE CORREAS REPARTICION	CORREA SE REVIENTA Y OTRA EN MAL ESTADO	CORREAS REPARTICIÓN	JOSE LOPEZ
19	MARZO	2026	ARREGLO BALDE DIENTES ESQUINEROS	DIENTES DOBLADOS CON LAMINA	DIENTES CON BASES Y SOLDADURA	TALLERES SUAREZ
24	MARZO	2026	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 9777 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	JOSE LOPEZ
20	ABRIL	2026	CAMBIO ALTERNADOR	ALTERNADOR FRENADO	ALTERNADOR	ELECTRICOS JOSUE
20	MAYO	2026	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 10019 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	JOSE LOPEZ

REVISO Y APROBO:

HUGO ALEXANDER ALARCON GONZALEZ
ID - EGV – MSc Geotecnia
M.P. 1522313887BYC

SYMAQ S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código: 1236 Versión: 1 Fecha: 26-02-2020

DATOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**VIBROCOMPACTADOR CA152D**		
CÓDIGO:		**MARCA:**	DYNAPAC
MODELO:	2006	**N° DE SERIE:**	64221845
FABRICANTE:	DYNAPAC	**FECHA DE ADQUISICIÓN:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
IMPORTADOR:	DINAMICA S.I.A. LTDA	**TELEFONO:**	5448392
ANCHO RODILLO:	1676 mm	**LARGO:**	4800 mm
ALTO:	1852 mm	**PESO EN OPERACIÓN:**	7300 Kg
VOLTAJE:	12 V	**CLASE DE PROTECCIÓN:**	CABINA ABIERTA

FOTOGRAFIA DEL EQUIPO	TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
	

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
ENGRASE PASADORES Y ARTICULACIÓN, CHEQUEO DE FLUIDOS, REVISIÓN DE LUCES, PITO DE REVERSA	DIARIO	GRASA, ACPM, REFRIGERANTE, ACEITES
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	CADA 250 HORAS	ACEITE MX 15W40, FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE)
REVISION Y/O AJUSTE DE CILINDROS	CADA 1000 HORAS	

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA			DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
DIA / MES / AÑO						
20	DICIEMBRE	2025	CAMBIO TORNILLOS SUJECCIÓN BOMBA HIDRAULICA	TORNILLO PARTIDO	TORNILLOS	GREGORIO SILVA
26	DICIEMBRE	2025	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 916 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	MAURICIO BENITEZ
28	ENERO	2026	CAMBIO EMPAQUETADURA MOTOR, CASQUETES, REVISION BOMBA HIDRAULICA, LIMPIEZA RADIADOR	FUGAS EN EMPAQUETADURAS DE MOTOR, GOTEO EN MANGUERA REFRIGERANTE	KIT EMPAQUES, CASQUETES, MANGUERA RADIADOR	GREGORIO SILVA
7	FEBRERO	2026	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ARREGLO MOTOR	CAMBIO 965 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	GREGORIO SILVA
9	ABRIL	2026	CAMBIO BOMBA DE AGUA	BOTA AGUA X TARRO DE EXPANSION	BOMBA DE AGUA	RICARDO MONTAÑEZ

SIMAQ S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código: 1236 Versión: 1 Fecha: 26-02-2020

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA			DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
DIA	MES	AÑO				
16	MAYO	2026	RETOQUE PINTURA PARTES ROJAS	PARTES CON PINTURA ROJA DETERIORADA	PINTURA	NELSON GUZMAN
29	MAYO	2026	CAMBIO BOMBIN COMBUSTIBLE	BOMBIN PRESENTA ESCAPE Y POSIBLE FALLA	BOMBIM	GREGORIO SILVA
7	JULIO	2026	PUESTA A NIVEL ACEITE CILINDRO	NIVEL DE ACEITE DENTRO DEL CILINDRO BAJO	ACEITE MOBIL 24	NELSON GUZMAN

REVISO Y APROBO:

HUGO ALEXANDER ALARCÓN GONZÁLEZ
IG – EGV – MSc. Geotecnia.
M.P. 1522313887BYC



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023156386

PLACA: WLQ718
MARCA: HINO
LÍNEA: FG8JGSE
MODELO: 2015
CILINDRADA CC: 7.684
COLOR: BLANCO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 9700
NÚMERO DE MOTOR: J08EUD22406
REG: N
VIN: 9F3FG8JGSFXX10235
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9F3FG8JGSFXX10235
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ORDUZ CHAPARRO JORGE
IDENTIFICACIÓN
C.C. 9397002



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 247
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32014001242465
I/E: I
FECHA IMPORT: 14/08/2014
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA: 13/02/2015
FECHA EXP. LIC. TTO.: 17/06/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT07000799818

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180126077

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ NO. 1

NIT: 826002941

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2025/08/09

Fecha de vencimiento: 2026/08/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WLQ718	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	HINO	MODELO:	2015
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	7684	NRO. MOTOR:	J08EUD22406
NRO. CHASIS:	9F3FG8JGSFXX10235	VIN:	9F3FG8JGSFXX10235
LÍNEA:	FG8JGSE		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: JORGE ORDUZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUCIO CHAPARRO VARGAS

Scanned with CamScanner

585

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	DESDE LAS 24 HORAS DEL	HASTA LAS 24 HORAS DEL
2026-03-02	2026-03-03	2027-03-02

33080061698000S	WLQ718	CARGA O MIXTO	PUBLICO	7684	2015

PASAJEROS: 2	MARCA: HINO	
LINEA O REFERENCIA: FG8JGSE		COMPAÑIA: PLATON

NO. MOTOR	NO. CHASIS O NO. SERIE	NO. VIN	CILINDRAJE TON
J08EUD22406	9F3FG8JG3FXX10235	9F3FG8JGSFXX10235	9.70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	NÚMERO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	NO. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORDUZ CHAPARRO, JORGE	********139	CC	9397002	SOGAMOSO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NOS. SUCURSAL EXPEDICIÓN	CLASE VEHÍCULO	NO. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	14562	0	BOGOTA D.C

PÓLIZA	PRIMA BRUTA	EXTRAPRIMA O PRIMA ADICIONAL	CASA RUNT
320	$ 842400	$ 438000	$ 2400

$ 1282800

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE, Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
	750	

FIRMA AUTORIZADA

Decreto 2644 de 2022. Tarifas diferenciales a aplicar con base en la UVT 105, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 870, 910, 920...

- Es obligatorio portar la póliza del SOAT, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: Digital: a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o Físico: impreso en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia inicial del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera** sea diaria. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores requisitos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 197 del EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Recuerde portar siempre su SOAT, los autoridades de tránsito lo podrán solicitar en cualquier momento.

Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.

Tan pronto se presente un caso donde requiera su póliza. No tenga SOAT vigente acarrea multas, inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los gastos de atención de las víctimas del accidente.

Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

Ante un accidente de tránsito:

Algunas veces nadie debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar accidente aunque este no tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

Un prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denúncielo ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Los gastos médicos, el cobro ante la **aseguradora** o en Fosyga lo **debe** realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no es necesario acudir a terceros.

Vigencia de Cobertura de Pólizas:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del tomador, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT se halle que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en el sentido de indicar como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiero así como de otras ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a mis datos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 17 # 5-07 of. 9 ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3457055, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

Scanned with CamScanner

WER INGENIERÍA S.A.S.

PROGRAMA SOCIAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

CONTRATO: 20260631

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA:
WER INGENIERIA SAS
R.L. WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
JUNIO DE 2026

WER INGENIERÍA S.A.S.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS. 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. POBLACION BENEFICIADA 6
4. CRONOGRAMA DE ACCIONES 6
5. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA 7
6. CONCLUSIONES 10

WER INGENIERÍA S.A.S.

1. INTRODUCCIÓN

El presente **Programa Social de Movilidad Sostenible y Educación para la Sostenibilidad** se formula como una estrategia complementaria al Plan de Gestión Social para la ejecución del contrato de obra de mejoramiento de vías en el municipio de Sogamoso, Boyacá, con el propósito de fortalecer las acciones encaminadas a la protección del medio ambiente, la promoción de la movilidad sostenible y la generación de una cultura de responsabilidad social y ambiental entre el personal vinculado a la obra y la comunidad del área de influencia.

La ejecución de proyectos de infraestructura vial representa una oportunidad para promover prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible, mediante la implementación de acciones orientadas a reducir los impactos ambientales derivados de las actividades constructivas y fomentar hábitos responsables en materia de movilidad, uso eficiente de los recursos naturales y conservación del entorno.

En este contexto, el programa contempla la implementación de estrategias que garanticen al personal de la obra espacios adecuados para el uso de medios de transporte alternativos, incentivando el desplazamiento en bicicleta, la caminata y otras modalidades de movilidad sostenible cuando las condiciones lo permitan. Asimismo, establece el desarrollo de acciones de formación y sensibilización en temas relacionados con la sostenibilidad ambiental, dirigidas tanto a los trabajadores como a la comunidad, mediante jornadas de capacitación, talleres y campañas educativas que podrán ser desarrolladas con el apoyo de entidades como el SENA, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), autoridades ambientales, entidades territoriales y otras organizaciones con experiencia en educación ambiental.

WER INGENIERÍA S.A.S.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**
CONTRATISTA:	**WER INGENIERÍA SAS** R.L. WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO
RESIDENTE DEL PROYECTO:	**ING. DIEGO FERNANDO ORDUZ ROJAS** Profesión: Ingeniero Civil Especialista en geotecnia vial y pavimentos
DIRECTOR DEL PROYECTO:	FIRMA: _____ **ING. WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO** Profesión: Ingeniero Civil
RESIDENTE DE OBRA:	FIRMA: _____ Elaboro: **DIEGO FERNANDO ORDUZ ROJAS** C.C. 1.057.591.819 De Sogamoso M.P. 15202-398883 BYC
INTERVENTORÍA:	**LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** R.L. PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS C.C. 46.377.602 De Sogamoso

WER INGENIERÍA S.A.S.

2. OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Implementar estrategias de movilidad sostenible y educación ambiental dirigidas al personal de la obra y a la comunidad del área de influencia, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover el uso de medios de transporte alternativos entre los trabajadores de la obra.
- Disponer de espacios adecuados para el estacionamiento y resguardo de bicicletas y otros medios de movilidad sostenible.
- Desarrollar acciones de sensibilización sobre movilidad sostenible y reducción de emisiones.
- Ejecutar mínimo dos acciones de capacitación en temas de sostenibilidad para trabajadores y comunidad.
- Fortalecer la cultura ambiental mediante alianzas con entidades públicas o privadas

WER INGENIERÍA S.A.S.

3. POBLACION BENEFICIADA

- Personal administrativo.
- Personal operativo.
- Residentes de obra.
- Interventoría.
- Comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto.
- Líderes comunitarios.

4. CRONOGRAMA DE ACCIONES

El programa tendrá una duración de seis (6) meses, correspondiente al plazo de ejecución del contrato, durante los cuales se desarrollarán de manera programada dos (2) acciones mensuales, para un total de doce (12) actividades, orientadas al cumplimiento de los compromisos contractuales y al fortalecimiento de la participación ciudadana, la apropiación del proyecto y la construcción de una cultura de sostenibilidad que genere beneficios permanentes para el municipio de Sogamoso

Mes	Acción 1	Acción 2	Evidencias
1	Socialización del Proyecto	Levantamiento de Actas	Listas, fotos
2	Campaña de movilidad sostenible y uso de bicicleta	Capacitación: Construcción sostenible	Listas, fotos
3	Seguridad vial para trabajadores	Uso eficiente de agua y energía	Listas, fotos
4	Movilidad compartida	Capacitación cambio climático	Fotos
5	Protección de fuentes hídricas	Economía circular y reciclaje	Listas
6	Cierre campaña movilidad	Socialización de resultados y compromiso comunitario	Informe final

WER INGENIERÍA S.A.S.

5. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA

- **MES 1**

➢ **Acción 1. Socialización del proyecto**

Objetivo: Con la presente se realiza la reunión con la comunidad estableciendo la forma de ejecución del proyecto y la sensibilización a las personas con los beneficios que este proyecto generara para la comunidad.
Descripción de la actividad:

Se realizará una reunión donde se citará a toda la comunidad con el fin de orientar y aclarar dudas que surjan promoviendo el compromiso entre comunidad y trabajadores para el desarrollo de este proyecto

➢ **Acción 2. Levantamiento de Actas de Vecindad**

Objetivo: Se designa un profesional con el fin de acercarse vivienda a vivienda a realizar el levantamiento de actas de vecindad de las viviendas por donde se va a realizar la intervención.

Descripción de la actividad:

Se acercará un profesional con el fin de tomar datos de los propietarios y/o responsables de la vivienda en la cual se levantará el estado actual de la vivienda en la cual se plasmará una breve descripción y adicionalmente se tomará evidencia fotográfica de la misma

- **MES 2**

➢ **Acción 3. Campaña "Movilidad Sostenible en la Obra"**

Objetivo: Sensibilizar al personal sobre los beneficios del uso de medios de transporte alternativos para disminuir la contaminación y promover hábitos saludables.
Descripción de la actividad:

Se realizará una charla de sensibilización dirigida a todo el personal de la obra, en la que se abordarán los beneficios ambientales, económicos y de salud del uso de la bicicleta, los desplazamientos a pie y el transporte compartido. Asimismo, se socializará la disponibilidad de espacios destinados al estacionamiento seguro de

bicicletas y se promoverá el compromiso de los trabajadores con la movilidad sostenible.

- **Acción 4. Capacitación "Construcción Sostenible"**

Objetivo: Promover buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las obras.

Descripción de la actividad:

Se desarrollará una capacitación sobre construcción sostenible, abordando el uso eficiente de materiales, ahorro de agua y energía, manejo responsable de residuos de construcción y demolición (RCD) y control de impactos ambientales.

- **MES 3**

- **Acción 5. Taller de Seguridad Vial para Trabajadores**

Objetivo: Fortalecer la cultura de prevención de accidentes durante los desplazamientos hacia y desde la obra.

Descripción de la actividad:

Se brindará capacitación sobre normas básicas de tránsito, uso de elementos reflectivos, desplazamiento seguro de peatones y ciclistas, y prevención de riesgos en zonas de intervención vial.

- **Acción 6. Capacitación sobre Uso Eficiente del Agua y la Energía**

Objetivo: Promover el consumo responsable de los recursos naturales.

Descripción de la actividad:

Se explicarán estrategias para reducir el consumo de agua y energía durante las actividades constructivas y en los espacios administrativos de la obra.

- **MES 4**

- **Acción 7. Campaña "Comparte tu Vehículo"**

Objetivo: Incentivar el uso compartido del transporte entre los trabajadores.

WER INGENIERÍA S.A.S.

Descripción de la actividad:

Se promoverá la organización de grupos de trabajadores que compartan vehículo para reducir emisiones, costos de transporte y congestión vehicular.

- **Acción 8. Capacitación sobre Cambio Climático**

Objetivo: Sensibilizar sobre los efectos del cambio climático y las acciones que pueden implementarse desde la obra.

Descripción de la actividad:

Se explicarán las causas del cambio climático, sus efectos sobre el territorio y las medidas de mitigación aplicables en proyectos de infraestructura.

- **MES 5**

- **Acción 9. Protección de Fuentes Hídricas**

Objetivo: Promover la conservación de cuerpos de agua cercanos a la obra.

Descripción de la actividad:

Se socializarán las medidas para prevenir la contaminación de quebradas, canales y drenajes, así como las buenas prácticas para el manejo de combustibles y materiales.

- **Acción 10. Taller de Economía Circular**

Objetivo: Incentivar el aprovechamiento de materiales y el reciclaje.

Descripción de la actividad:
Se explicarán los principios de la economía circular y las oportunidades de reutilización de materiales generados durante la ejecución de la obra.

- **MES 6**

- **Acción 11. Jornada de Cierre de la Campaña de Movilidad Sostenible**

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos durante la implementación del programa.

WER INGENIERÍA S.A.S.

Descripción de la actividad:

Se realizará una reunión con el personal para presentar los logros alcanzados, reconocer la participación de los trabajadores y fortalecer el compromiso con las prácticas sostenibles.

- **Acción 12. Socialización Final con la Comunidad**

Objetivo: Presentar a la comunidad los resultados del programa y promover la continuidad de las buenas prácticas ambientales.

Descripción de la actividad:

Se desarrollará un encuentro con la comunidad del área de influencia para socializar las actividades ejecutadas, los beneficios obtenidos y las recomendaciones para continuar promoviendo el cuidado de la infraestructura vial y del medio ambiente

6. CONCLUSIONES

La implementación del Programa Social de Movilidad Sostenible y Educación para la Sostenibilidad constituye una estrategia que complementa la ejecución del contrato MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01, fortaleciendo el componente social y ambiental mediante acciones que promueven la participación activa del personal de la obra y de la comunidad del área de influencia.

Las jornadas de capacitación y sensibilización contribuirán al fortalecimiento de una cultura de sostenibilidad, generando mayor compromiso por parte de los trabajadores y de la comunidad frente al cuidado del entorno, la adecuada gestión de los residuos, el uso eficiente del agua y la energía, y la adopción de buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las obras.

Finalmente, este programa permitirá dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión social y la sostenibilidad, dejando capacidades instaladas en los participantes y promoviendo comportamientos responsables que trasciendan la ejecución de la obra, contribuyendo al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Sogamoso.

No.01

REUNION DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO

FECHA: 30/06/2026

HORA DE: Iniciación: 04:00pm

Finalización: 06:00pm

LUGAR: Salón Comunal Monquirá, municipio de Sogamoso, Boyacá.

ASISTENTES:

- Representante de la Entidad Contratante. / William Eduardo Rojas Africano
- Representante de la Interventoría. / Carlos Corzo Corredor
- Residente de Obra. /Diego Fernando Orduz Rojas
- Apoyo residente de obra/ Oscar Eduardo Pava Cely
- Analista de SST. /Mónica Alejandra Rojas Bonilla
- Presidente de la Junta de Acción Comunal de Monquirá/Fanny Alvarado Siachoque
- Comunidad beneficiaria del proyecto.

INVITADOS:

Habitantes de Monquirá y sectores aledaños, líderes comunitarios y demás interesados.

AUSENTES

No se registran ausencias.

ORDEN DEL DIA:

- Verificación del quórum.
- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior (No aplica).
- Presentación de los asistentes.
- Socialización del proyecto.
- Alcance de las actividades a ejecutar.
- Cronograma estimado de ejecución.
- Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), señalización y Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
- Espacio para preguntas, observaciones y compromisos.
- Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum.

Se verifica la asistencia de los representantes del contratista, la interventoría y la comunidad, constatando la existencia del quórum necesario para dar inicio a la reunión.

2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.

No aplica, por tratarse de la primera reunión de socialización del proyecto.

3. Puntos a tratar.

Se realiza la presentación del proyecto cuyo objeto corresponde al:

"Mejoramiento de la vía Monquirá – La Reforma, Etapa 01, en el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá."

Durante la reunión se informó a la comunidad sobre:

- El objeto y alcance del contrato.
- Las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de la obra.
- El plazo estimado de ejecución.
- Los horarios de trabajo.
- La maquinaria y equipos que serán utilizados.
- La implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para garantizar la seguridad de trabajadores, peatones y usuarios de la vía.

- Las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo que serán implementadas durante la ejecución del proyecto.
- Las acciones de manejo ambiental para el control de residuos, material particulado y demás aspectos ambientales.
- La importancia de respetar la señalización instalada y las restricciones temporales de movilidad durante el desarrollo de las actividades.
- Los canales de comunicación para atender inquietudes, sugerencias o reportes de la comunidad.

Posteriormente se abrió un espacio de participación en el que los asistentes manifestaron sus inquietudes relacionadas con los cierres parciales de la vía, los tiempos de ejecución y el acceso a las viviendas. Estas fueron resueltas por el equipo técnico del contratista, aclarando que las afectaciones a la movilidad serán temporales y se informarán oportunamente.

Finalmente, se solicitó el apoyo de la comunidad para respetar la señalización, seguir las recomendaciones del personal de obra y contribuir al adecuado desarrollo del proyecto.

COMPROMISOS

- Mantener informada a la comunidad sobre el avance de la obra.
- Informar oportunamente cualquier cierre temporal o modificación en la movilidad.
- Mantener la señalización vial y peatonal durante toda la ejecución del proyecto.
- Atender las inquietudes de la comunidad mediante los canales establecidos.
- La comunidad se compromete a respetar la señalización y colaborar con el desarrollo seguro de las actividades.
- CONVOCATORIA:

En caso de requerirse una nueva reunión de socialización o seguimiento con la comunidad, esta será informada oportunamente indicando la fecha, hora y lugar de realización.

(Firma) presidente

(Firma) Secretario

NIT 891 855 130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN HUMANA
PROCESO: GESTIÓN HUMANA

CODIGO: AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	FECHA 2026/02	VERSIÓN: 5

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento: Socialización Proyecto mejoramiento de la vía Manquirá - la reforma etapa 01.
Lugar: Salón comunal Vereda manquira. Fecha: 30/06/2026
Hora Iniciación: 04:00 pm Hora finalización: 06:00 pm

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Gerardi Barrera Rodriguez	Manquira	Propietario	no Registro	Gerardi.
2	Maria Vargas	Manquira	Propietaria	No registra.	Maria Vargas
3	Dora Rincon	Manquira	propietario	daita47@gmail.com	
4	Isidro Lopez Tolosa	Manquira	Propietario	no	
5	Claudia Lopez	Manquira	Propietario	No registra	claudia lopez
6	Maria fernanda Ruiz Rincon	Manquira	Propietaria	No registro	
7	Maria del Pilar Naranjo	Manquira	Propetaria	Pilinc251@gmail.com	
8	Juan Carlos Nino	Manquira	Propietario	No registra	Juan Carlos N.
9	Nedra Bonilla S.	Manquira.	Arrendatario	bonillandrea19@gmail.com	
10	Hernan Molano Rodriguez	Manquira	Ama de casa	Hernmolano23@hotmail.com	Hernan Molano.
11	Diana Inés Molano	Manquira	Ama de casa	d.ines22@hotmail.com	Diana Molano
12	Lidia Rodriguez Rodriguez	Manquira	Ama de Casa	No Registra	Lidia Rodriguez
14	Rodrigo Molano Rodriguez	Manquira	Pensionado	No Registra	
15	Sebastian Medina Bonilla	Manquira	arrendatario	N/A	

Firma Organizador | Firma Capacitador | Vo Bo Firma Secretario y/o Jefe Oficina

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN HUMANA
PROCESO: GESTIÓN HUMANA

CÓDIGO: AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	FECHA 2026/02	VERSIÓN: 5

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento: Socialización - Proyecto mejoramiento de la vía Manguira - la reforma Etapa 01, Municipio de Sogamoso - Boyacá

Lugar: Salón comunal vereda manguira **Fecha:** 30/06/2026

Hora Iniciación: 04:00 pm **Hora finalización:** 6:00 pm

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
16	Franchesca Sandoval	Manguira	amable	No registra.	
17	Roberto Lopez	Aliente del sector	Auxiliar hora	No registra.	
18	IVAN SUAREZ	AYUDANTE CONSTR	AUXILIAR OBRA	[illegible]@GMAIL.COM	
19	RODRIGO MOLANO R	MANGUIRA	DUEÑO	NO REGISTRA	
20	Sandra Trujillo H	Manguira	Propietaria	No registra.	
21	Natalia olarte perez	Manguira	propietario	olartenatalia@gmail.com	
22	Genesis Lucena	Manguira	propietario	No registra	
23	Baldelde Badelopa	Manguira	Propietario	No registra	
24	Angela Patricia Perez	Manguira	Residente	angelithaperez@gmail.com	
25	Rosa Ymalda Cardenas	manguira	residente	No registra	
26	María Isabel Alvarado	Manguira	residente	No registra	
27	maria isabel Diaz	manguira	residente	no registra	
28	José Javier Rios Ortiz	Manguira	residente	riosortizjosejavier@gmail.com	

Firma Organizador | Firma Capacitador | Vo.Bo. Firma Secretario y/o Jefe Oficina

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN HUMANA
PROCESO: GESTIÓN HUMANA

CÓDIGO: AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	FECHA 2026/02	VERSIÓN: 5

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento: Socialización - Proyecto mejoramiento de la vía Monquira / la reforma etapa 01, municipio de Sogamoso - Boyacá

Lugar: Salón Comunal vereda Monquira. **Fecha:** 30/06/2026

Hora Iniciación: 04:00 pm **Hora finalización:** 06:00 pm

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
29	Mariela Alvarado	Monquira	Residente	no registra	Mariela. Al
30	Vitalina ordiz	Monquira	Residente	no registra.	Vitalina.
31	William Chaparro	Monquira	Residente	no registra	
32	Germán.	MONQUIRA	RESIDENTE		Germán
33	Sonia Barrera	Monquira	Residente.	.	Sonia Barrera.
34	Jhonatan mojica	Monquira	Recidente	no registra	
35	Reinaldo Lara	Reforma	Recidente	NO registra	
36	Angie Alejandra chaparro	Monquira	Recidente	NO registra	Angie chaparro
37	Mireya Bonilla A	Monquira	Recident.	No regist	
38	Jaime tejedor	Monquir	Recdte	no regist	
39	Luis Samuel Gutierrez	Monquira	Residte	no regist	
40	Marlon Tejedor	Monquira	Residert	no regist	
41	Cristian A Tejedor	Monquira	Residen	no Regis	

Firma Organizador	Firma Capacitador	Vo.Bo. Firma Secretario y/o Jefe Oficina

NIT 891855130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN HUMANA
PROCESO: GESTION HUMANA

CÓDIGO: AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	FECHA 2026/02	VERSIÓN: 5

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento: Socialización Proyecto mejoramiento de la vía Monquira / la reforma etapa 01, municipio de Sogamoso / Boyacá

Lugar: Salon Comunal Vereda Monquira **Fecha:** 30/08/2026

Hora Iniciación: 04:00 pm **Hora finalización:** 6:00pm

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
42	Dois Beatriz pacheco	Monquira	Carpintería	No registro	Dois Beatriz P
43	Yeimy Salcedo S.	Barrio Monquirá	Hogar	No registra	Yeimy S.S
44	Gloria Nelvira.	Barr Monquira	Aux Administ	isabel-2102@hotmail.com	Nelvira.
45	Fernando Alarcon	Barrio monquirá	Hogar	No registra.	
46	Yineth Adriana Siera	B. Monquira	Contadora	yasf12@gmail.com	Yineth Siera
47	Campo Elias Orduz	Monquira	—	—	Campo Elias
48	Floroliva Moreno	Barrio Monquira	—	—	Floroliva
49	Ricardo Orduz	Monquira	—	—	Ricardo
50	Hernan Orduz	Monquira	—	—	Hernan
51	Juan Sebastian Patiño	Monquira	—	—	Juan Sebastian
52	Yurly Alexandra Chaparro	Monquira	—	—	Yurly
53	Erika Dayanna Acevedo Cárdenas	Monquira.	Estudiante.	erikaacevedo2410@gmail	Erika
54					

Firma Organizador	Firma Capacitador	Vo.Bo. Firma Secretario y/o Jefe Oficina

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO: GESTIÓN HUMANA

CÓDIGO		FECHA	VERSIÓN
AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	2026/02	5

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento: Socializacion proyecto mejoramiento de la via monquira / la retirada etapa 01, municipio de Sogamoso / Boyaca
Lugar: salon comunal vereda monquira **Fecha:** 30/06/2026
Hora Iniciación: 04 00 pm **Hora finalización:** 6 00 pm

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
55	Maria Cristina	B Monquira	Residente		
56	Dayana Yulibeth G	B monquira	Residente		Dayana G
57	Luz Mery Gutierrez	B Monquira	Residente		
58	Edelyes Mesa	B Monquila	Residente		Edelyes
59	Mario Cecilio Barrero	B Monquira	residente		Mario Barrero
60	Cecilio Salcedo	B Monquira	residente		
61	Dumar Vargas	B monquira	Residente		
62	Luz Mary Angulo	B Monquira	Residente		Luz Angulo
63	William Fabian Bonilla	B Monquira	Residente		
64	Ana Zulma Perez Marcos	B monquira	Residente		Ana Zulma
65	Libardo Muñoz	Monquira	Residente		Libardo
66	Jhonny Alexander Pena A	B monquira	Residente		
67	Andres Camilo Diaz	B Monquira	Residente		

Firma Organizador	Firma Capacitador	Vo.Bo. Firma Secretario y/o Jefe Oficina

NIT 891.855.150-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN HUMANA
PROCESO: GESTIÓN HUMANA

CÓDIGO: AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	FECHA 2026/02	VERSIÓN: 5

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento: Socialización proyecto mejoramiento de la vía Manquira / la reforma etapa 01, municipio de Sogamoso / Boyacá.
Lugar: Salón Comunal Vereda Manquira **Fecha:** 30/06/2026
Hora Iniciación: 04:00 pm **Hora finalización:** 6:00 pm

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
68	Sulma Yaneth Castro Magdón	B- Manquira	Residente		
69	Epimenio Albarracin	B: Manquira	Residente		Epimenio A/b
70	Ligia Alarcon Gutierrez	B- manquira	Residente		
71	[illegible]	Barrio Manquira	Residente		
72	Angela Consuelo Barrera	B Manquira	Residente		Angela Barrero
73	Maria Adelina Gutierrez	B Manquira	Residente		M Adelina Gutierrez
74	[illegible]	manquira	Residente.		
75					
76					
77					
78					
79					
80					

Firma Organizador	Firma Capacitador	Vo.Bo. Firma Secretario y/o Jefe Oficina

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA


NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja	1	de	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA								
CONTRATISTA:	Wer ingeniería S.A.S								
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.								
REGISTRO No.	01	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

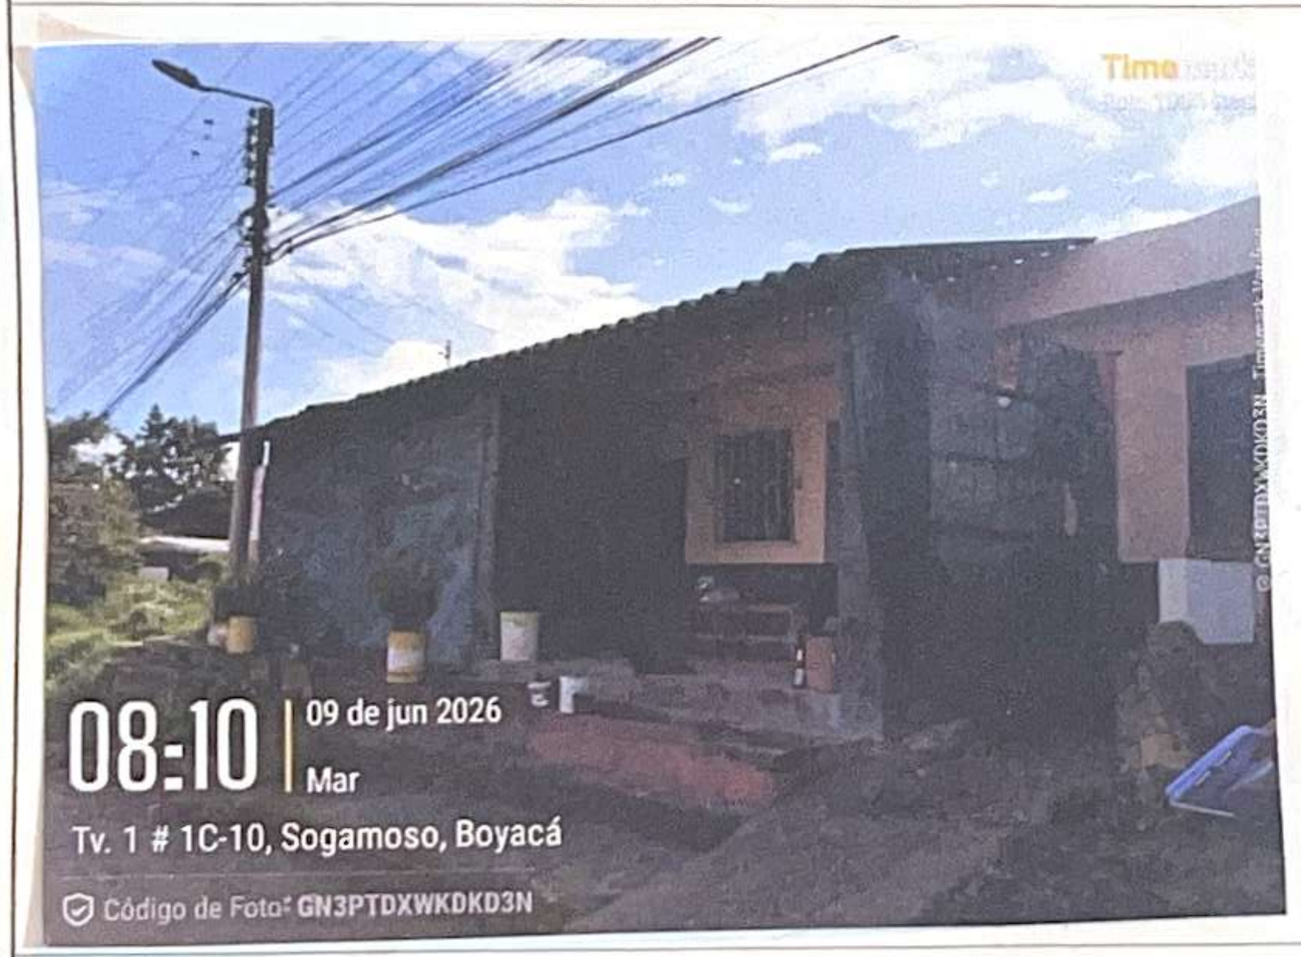

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Familia Lopez Cardenas		
DIRECCIÓN	Transversal 1c sur 1-28		
TELÉFONO	3203021586	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12 metros	ESTRATO	2 Bajo

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	N/A	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL ?	N/A	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL	✓	URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realiza socialización del Proyecto a iniciar, Junto con inspección del estado actual de la vivienda; dejando registro fotografico del predio; durante la inspección realizada se evidencia agrietamiento en muros externos Junto con dilataciones, Anden en obra gris; se deja anexo fotografico de la vivienda registrado como acta 001. Por Solicitud del responsable se realiza inspección Frente vivienda.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT Claudia Lopez C.
46383837

Firma
Nombre: Willian Eduardo Rojas Africano.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

NIT: 891.855.130-1


MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja	1	de	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ								
CONTRATISTA:	Wer Ingeniería S.A.S								
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.								
REGISTRO No.	02	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

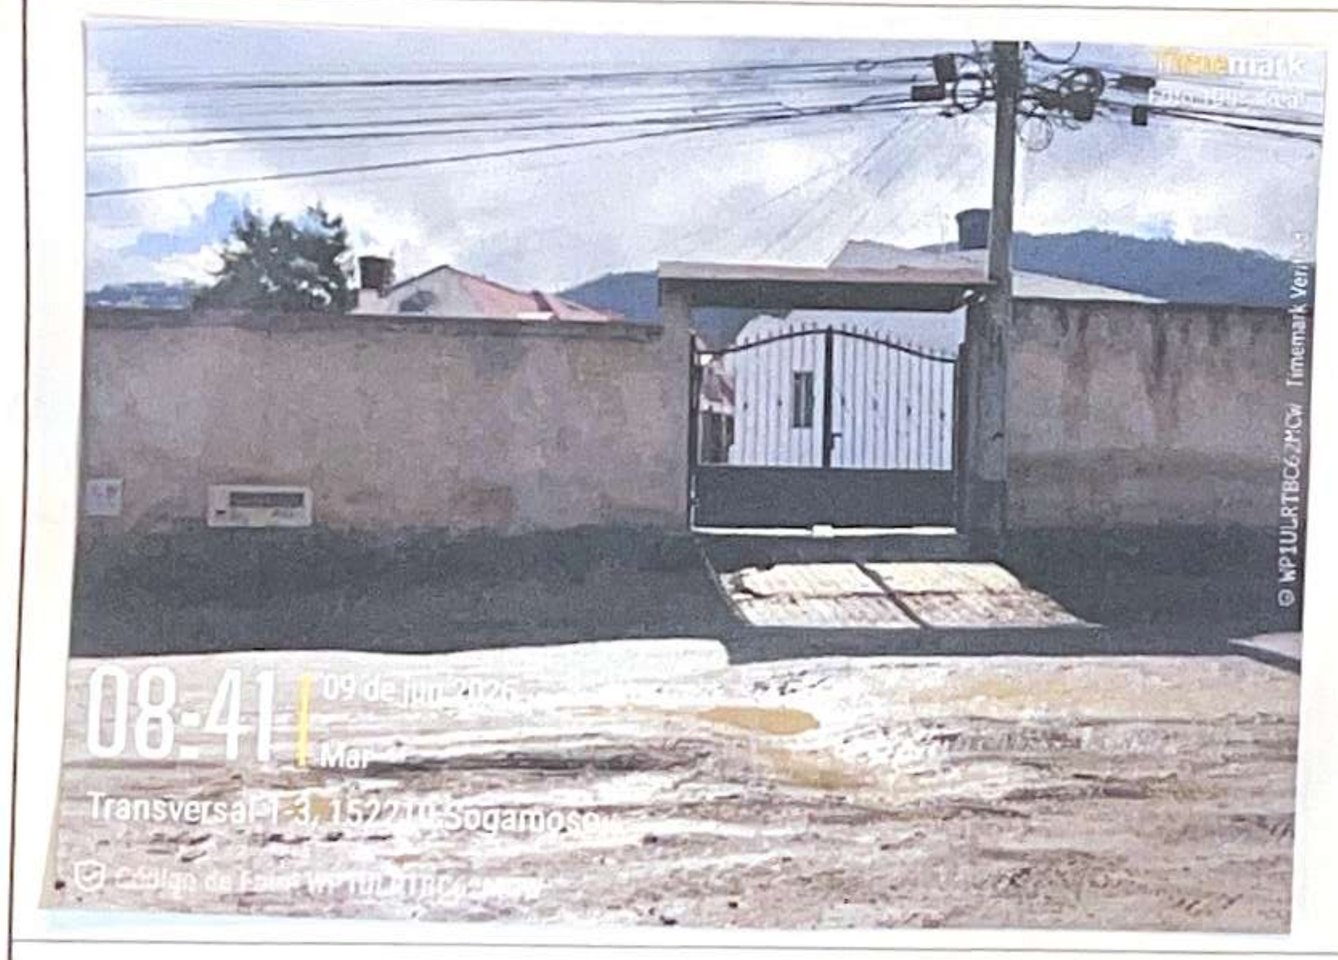

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Fernely Castro		
DIRECCIÓN	Transversal 1 # 1C-64 sur		
TELÉFONO	3172175629	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)		ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?	N/A	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada conformada por muro perimetral en mamposteria con acabado pañetado y porton metalico de acceso vehicular; se observan manchas de humedad, desgaste superficial y fisuras en los muros. se realiza socialización con los propietarios de las viviendas; junto con inspección visual.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Fernelly Castro
4207.954.

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

606

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

Hoja 1 de 1

CONTRATO No. :	20260631						
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA						
CONTRATISTA:	WER INGENIERIA S.A.S						
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.						
REGISTRO No.	03	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	paola Lopez Rojas

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Francelina Sanchez		
DIRECCIÓN	Transversal 1ª N°2, Sor 16		
TELÉFONO	3124235133	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	14 metros	ESTRATO	2, bajo

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?	N/A	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se evidencia humedad y desprendimiento de pañete en la parte interior de la fachada, deterioro localizado en andenes y acceso, asi como exposicion de acometidas domiciliarias. No se observan mas novedades en la parte externa de la vivienda, se socializa la ejecucion del proyecto a ejecutar.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 33 [illegible]

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631						Hoja	1	de 1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA								
CONTRATISTA:	CUER INGENIERIA S.A.S								
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.								
REGISTRO No.	04	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas.	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Zoly Rodriguez		
DIRECCIÓN	Transversal 1 # 2 - 216		
TELÉFONO	3114561634	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10,30	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS	2	OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda de un nivel con fachada en mampostería pañetada y pintada, acceso vehicular acometidas de servicios públicos visible, se observan deterioros en el anden y zona peatonal con fisuras, desprendimiento y desgaste superficial. La fachada presenta buenas condiciones generales. La presente inspección se realizo en las areas externas desde la via publica. sin acceso a la vivienda.

Firma
Nombre: Zoly Mariaé Rodriguez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1057599413.

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez R
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja	1	de	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ								
CONTRATISTA:	WEP INGENIERIA S.A.S								
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.								
REGISTRO No.	05	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Bersely Bonilla Rodriguez		
DIRECCIÓN	Transversal 1 Sur 246		
TELÉFONO	3142833606	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7 metros	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?	N/A	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se evidencian fisuras superficiales en el muro, desprendimiento de pintura, manchas de humedad en la parte inferior de la fachada, deterioro del acceso vehicular en material granular. la inspección se realizo unicamente sobre las areas exteriores visibles, sin acceso al interior de la vivienda.

Firma
Nombre: Bersely Bonilla Rodriguez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.52.8055.

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja 1 de 1	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
CONTRATISTA:	CUER INGENIERIA S.A.S						
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.						
REGISTRO No.	06	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Betilde Bonilla lopez		
DIRECCIÓN	Transversal 1c Sur 1-18		
TELÉFONO	3066078125	No. PISOS	1 y bajo
FRENTE (Mts)	8 metros	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL ?	X	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se observan fisuras menores y manchas de humedad en elementos del cerramiento, desgaste superficial en acabados deteriorado leve en escalones y acceso peatonal, asi como almacenamiento de materiales en el area frontal del predio. No se evidencian daños estructurales aparentes. la inspeccion se realizo sobre las areas exteriores.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT Betilde Bonilla Lopez
1163517998

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

Hoja 1 de 1

CONTRATO No. :	20260631		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA:	WER INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	REVISÓ	Paola lopez Rojas
REGISTRO No. 07	FECHA 09 06 2026	ELABORÓ	



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Rosa Cardenas		
DIRECCIÓN	Transversal 1C 115	No. PISOS	3
TELÉFONO	3134723307	ESTRATO	2
FRENTE (Mts)	8 metros		

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?	N/A	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		✓ URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se observan manchas de humedad y desgastes superficial en el Cerramiento Frontal, asi como agrietamiento en la placa de acceso y piso exterior. La inspección se realiza unicamente sobre las areas exteriores visibles desde la via Publica, sin acceso a la vivienda.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 46378117 Rosa Cardonas

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

679

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja	1	de	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA								
CONTRATISTA:	WER INGENIERIA S.A.S								
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.								
REGISTRO No.	08	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Erika Dayana Acevedo Cardenas		
DIRECCIÓN	Transversal 1-3-13213		
TELÉFONO	322 7073317	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	13 metros	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL ?	X	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Durante la inspección visual se evidencian fisuras capilares y grietas menores en muros de fachada y cerramiento frontal, deterioro superficial por humedad y oxidación en tapas metalicas en medidores, se evidencia agrietamiento longitudinal y transversal de baja apertura en la placa de concreto del acceso vehicular asociado al desgaste normal y asentamientos.

Firma		
Nombre:	Erika Dayana Acevedo Cardenas.	William Eduardo Rojas Africano
	PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA
C.C. / NIT	1058351809.	

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

612

Comprometidos por la CALIDAD del servicio
"SUAMOSX.Ciudad del Sol"

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631						Hoja	1	de	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ									
CONTRATISTA:	WER INGENIERIA S.A.S									
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									
REGISTRO No.	09	FECHA	09	06	2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola lopez Rojas	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Deisy Adela Gutierrez		
DIRECCIÓN	Transversal 1 N 2-24.		
TELÉFONO	3102407908	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	16 metros	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

la fachada presenta acabado en pañete y cerramiento en mampostería y malla metalica. Se evidencian manchas de humedad, fisuras superficiales y desgaste propio del uso y la exposición a la interperie. El anden en concreto presenta humedad y grietas visibles durante la inspección externa.

Firma
Nombre: Deisy Adela Gutierrez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1116862005

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

613

NIT. 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631							Hoja	1	de 1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ									
CONTRATISTA:	UER INGENIERIA S.A.S									
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									
REGISTRO No.	10	FECHA	09	06	2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			X
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se evidencia lote con cerramiento en malla y presencia de vegetacion y cultivos al momento de la inspeccion. No se cuenta con infarmacion del propietario del predio.

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: William Eduardo Rojas Africano	Nombre: Paola Lopez Rojas
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
C.C. / NIT		

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

M9

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.


NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

Hoja 1 de 1

CONTRATO No. :	20260631						
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
CONTRATISTA:	UER INGENIERIA S.A.S						
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.						
REGISTRO No.	11	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISO	Paola Lopez Rojas

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

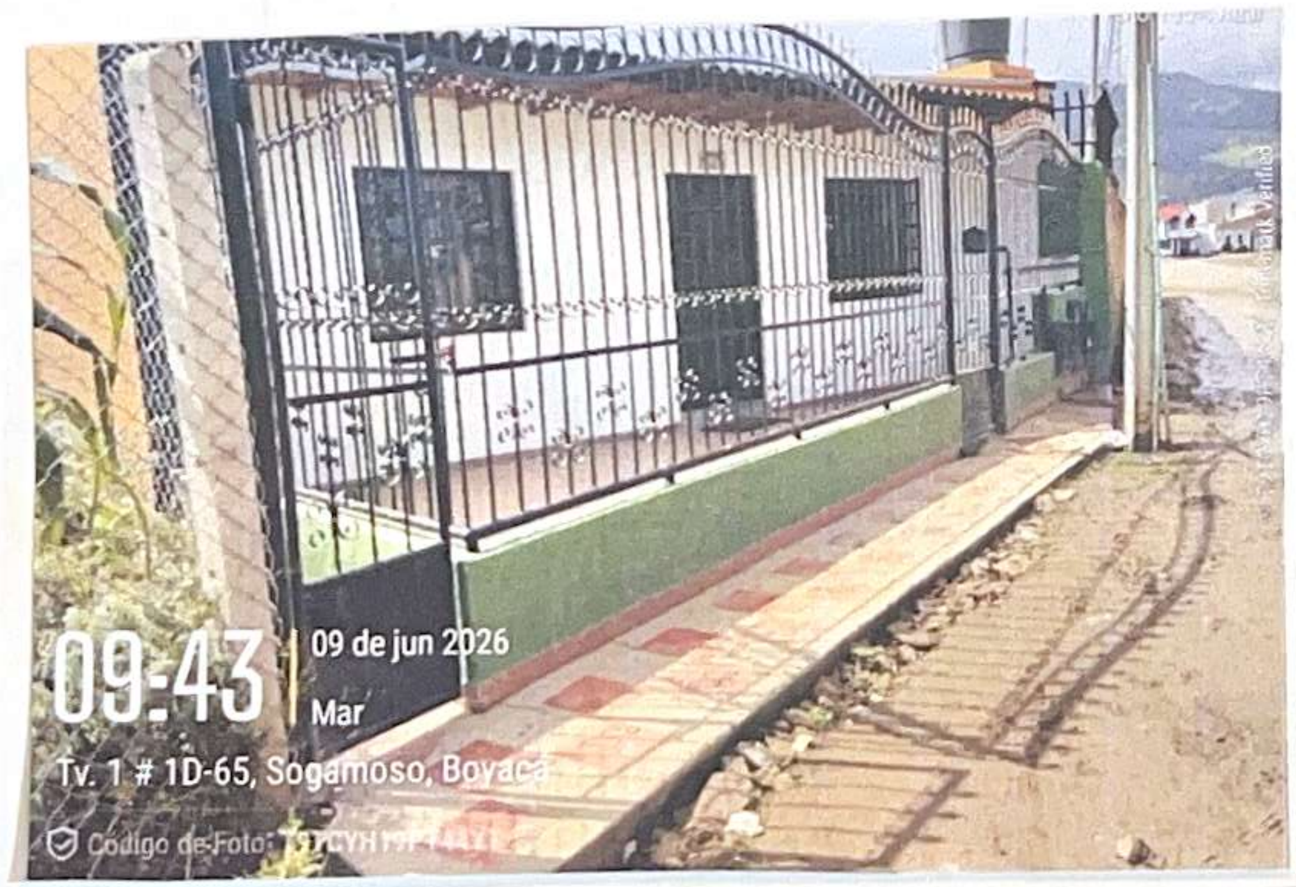

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Andres Rodriguez		
DIRECCIÓN	Transversal 1 No 2-28 Sur		
TELÉFONO	3202537013274	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	16 mts	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	✓	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se evidencia vivienda de un nivel con cerramiento metalico y acabados en buen estado. el anden presenta desgaste superficial y material suelto en algunos sectores. durante la inspeccion visual externa, realizada en la vivienda.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1053586841
Andres Rodriguez
Arrendatario

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja 1 de	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA						
CONTRATISTA:	UER INGENIERÍA S.A.S						
INTERVENTOR:	Lypsa Ingeniería y Construcciones S.A.S						
REGISTRO No. 12	FECHA 10 06 2026	ELABORÓ Alejandra Rojas		REVISÓ Paola Lopez Rojas			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Andres Rodriguez		
DIRECCIÓN	Transversal 1 # 21-28 Sur		
TELÉFONO	3202579327	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10 metros	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?	X	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cerramiento perimetral en mampostería y estructura metalica, con desgaste superficial, Fisuras menores y desprendimiento parcial de acabado en algunos sectores evidenciadas en el momento de la inspección. externa

Firma Andres Rodriguez
Nombre: Andres Rodriguez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1053586891
ARRENDATARIO

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

919

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA


S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja	1	de	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ								
CONTRATISTA:	UER INGENIERIA S.A.S								
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.								
REGISTRO No.	13	FECHA	09/06/2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas.	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

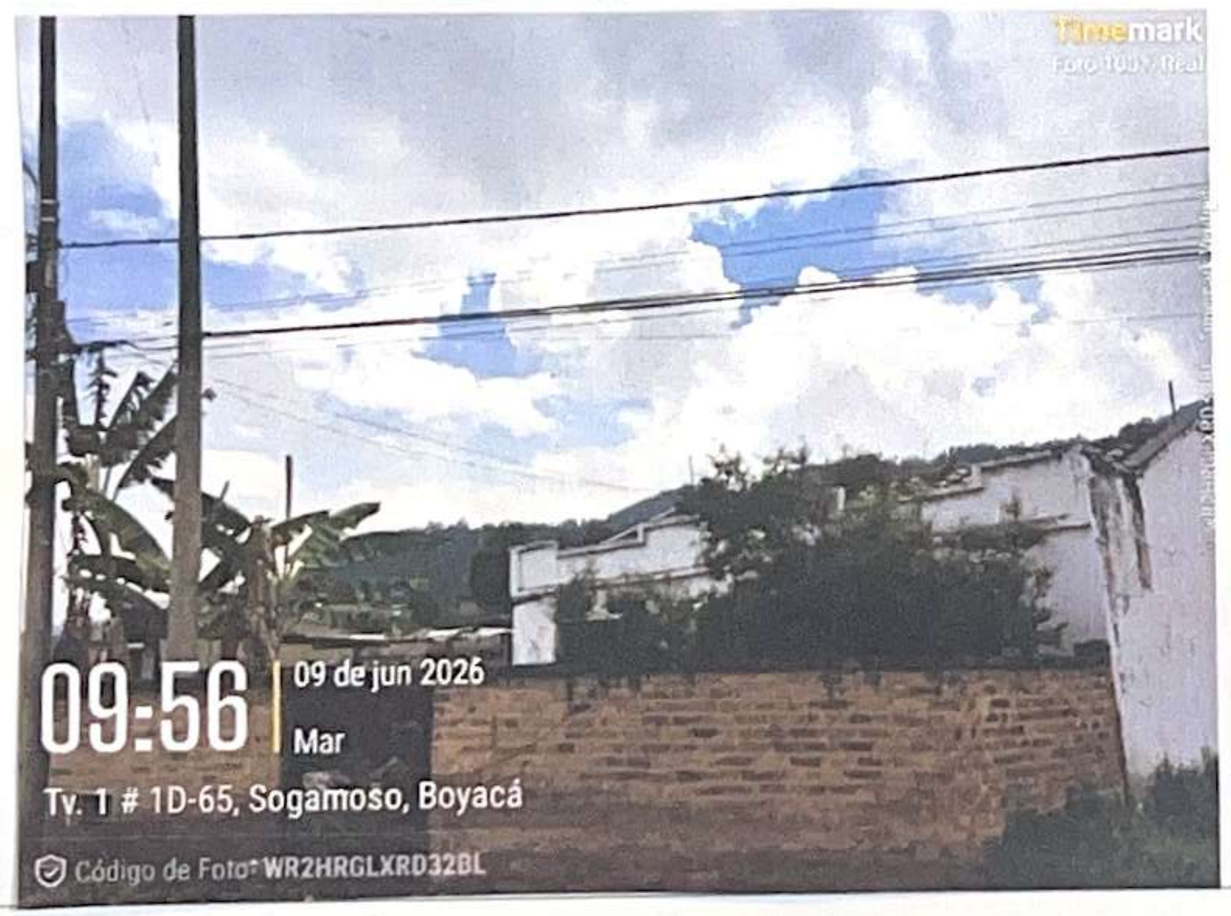

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Yesica Lorena Chaparro Gutierrez.		
DIRECCIÓN	Trans 1 sur N° 3-06 Monquira.		
TELÉFONO	3207659872.	No. PISOS	2.
FRENTE (Mts)	8 mts.	ESTRATO	2.

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

se observa anden con desgaste normal por uso, presencia de fisuras superficiales y acumulación de material particulado en algunos sectores. La Fachada y el cerramiento presentan manchas de humedad deterioro de acabados y grietas superficiales, al momento de la inspección externa.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT Yesica Chaparro
1002558787
Encargada.

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

Hoja 1 de 1

CONTRATO No. :	20260631
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	WER INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
REGISTRO No. 14	FECHA 09/06/26 ELABORÓ Alejandra Rojas REVISÓ Paola Lopez Rojas

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Dora Alvarado		
DIRECCIÓN	Transversal 1 # 1-13	No. PISOS	2
TELÉFONO	3123590780	ESTRATO	2
FRENTE (Mts)	12 metros		

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Inspección externa: Fachada con desgaste superficial en el area de acceso, irregularidades del terreno y Fisura superficial en mura lateral, no se evidencian otras estructuales aparentes al momento de la Inspección.

Firma
Nombre: Dora Alvarado
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 46.358.648

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez R.
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631						Hoja	1	de
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA								
CONTRATISTA:	CWEP Ingeniería S.A.S								
INTERVENTOR:	CYPSA Ingeniería y Construcciones S.A.S								
REGISTRO No.	15	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISO	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Lote sin construir con cobertura vegetal y maleza de crecimiento natural. El terreno presenta superficies irregulares en material granular y tierra, no se obtienen durante la inspeccion datos del Propietario.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez R
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

619

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja	1	de	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA								
CONTRATISTA:	UEP INGENIERIA S.A.S								
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.								
REGISTRO No.	16	FECHA	09/06/2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas.	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Diana Molano		
DIRECCIÓN	Transversal 1 # 10-03		
TELÉFONO	3172340239	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	15 metros	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?	N/A	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL	✓	URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se evidencia desgaste superficiales en el anden perimetral, incluyendo Fisuras menores, desprendimiento en material de bordes y sectores con humedad localizada. Se observa poste de concreto con ligera inclinación. No se evidencian grietas adicionales a las mencionadas y registradas en las evidencias fotograficas; durante la inspección realizada.

Firma		Firma
Nombre:		Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO		REPRESENTANTE CONTRATISTA: William Eduardo Rojas Africano
C.C. / NIT	Diana Molano 46384254	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA: Paola Lopez Rojas
	Diana Molano Encargada.	

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja	1	de	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ								
CONTRATISTA:	WER INGENIERIA S.A.S								
INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.								
REGISTRO No.	17	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas.	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Rodrigo Molano.		
DIRECCIÓN	Transversal 19 # 10-33		
TELÉFONO	3133925477	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	10 mts	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL	✓	URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda de dos niveles con fachada en ladrillo a la vista, cerramiento metalico y cubierta liviana sobre el acceso vehicular. Se evidencian desgaste por uso y exposicion en la intemperie, deterioro localizado en la base del muro lateral, consistente en fisuras, desprendimiento de material y Fracturas en el anden Continuo; Se anexa registro Fotografico durante la inspección externa

Firma
Nombre: RODRIGO MOLANO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 9398490

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Bonilla.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA


S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :			20260631				Hoja	1	de
OBJETO:			MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA						
CONTRATISTA:			WER ingenieria S.A.S						
INTERVENTOR:			Cupsol ingenieria y construcciones S.A.S						
REGISTRO No.	18	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandro Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

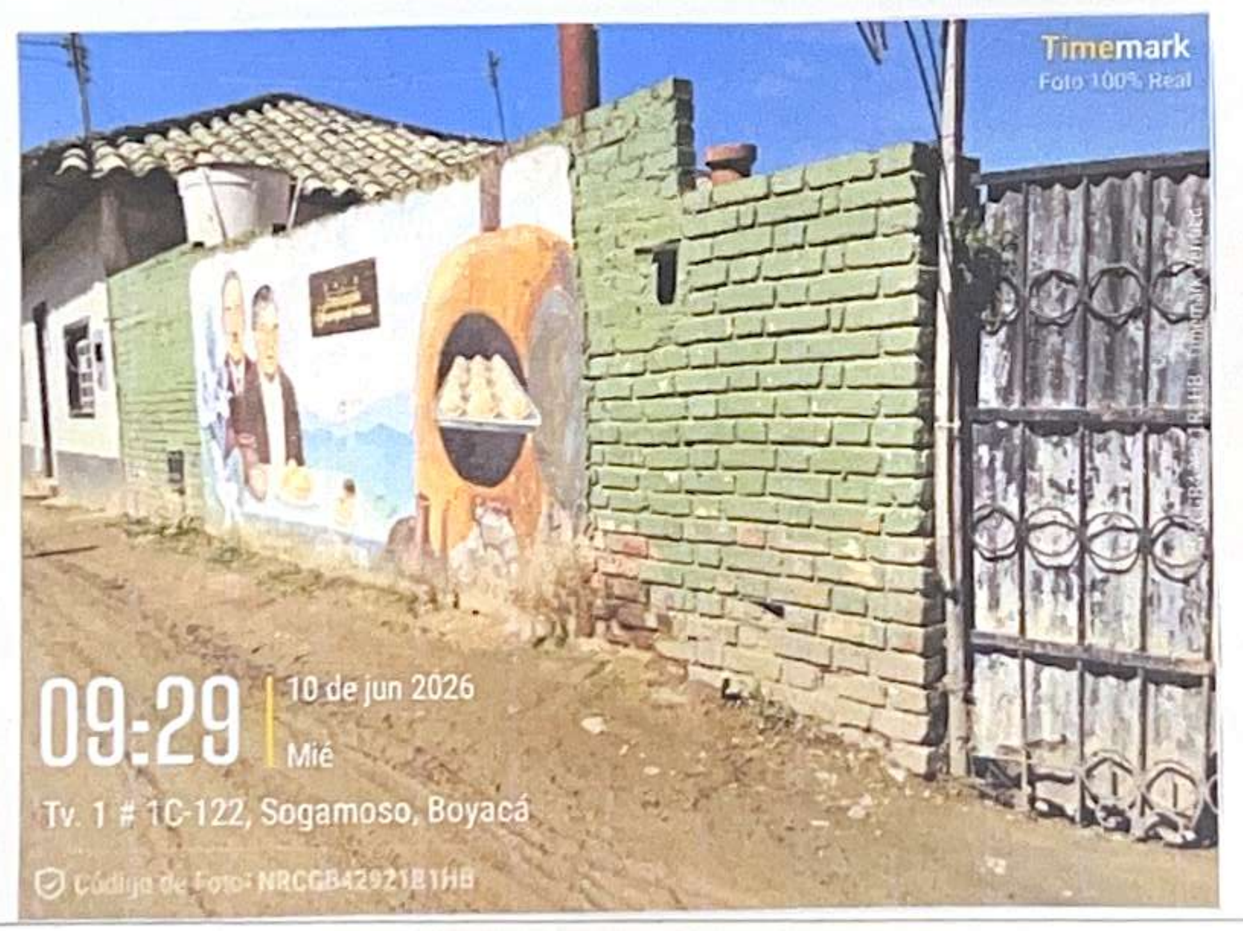

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Juan Pablo Gomez		
DIRECCIÓN	Transversal 1 1B-61		
TELÉFONO	3215094562	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	20 metros	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	NO	
OTRO - ¿CUAL ?	N/A	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	✓		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Durante la inspeccion se evidencian fisuras capibles y grietas superficiales en los muros de fachada, desgaste de pintura y revestimientos, deterioro localizado en andenes y elementos de drenaje, envejecimiento general de cubierta y cerramiento se anexan registros fotograficos para evidenciar lo anteriormente mencionado. Durante la inspeccion externa.

Firma :
Nombre: Juan Pablo Gomez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 98175426.

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez R
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631						Hoja	1	de
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA								
CONTRATISTA:	UNER ingeniería S.A.S								
INTERVENTOR:	Cupsa ingeniería y construcciones S.A.S								
REGISTRO No.	20	FECHA	09	06	2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Al momento de la inspección se evidencian fisuras en muros, desprendimiento de pintura y parete, manchas de humedad, desgaste superficial de acabados y deterioros localizados en la parte inferior de la fachada. Se deja constancia fotografica en la inspección

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

623

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA


NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja 1 de	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA						
CONTRATISTA:	WER Ingeniería S.A.S.						
INTERVENTOR:	Cupsa Ingeniería y construcciones S.A.S						
REGISTRO No.	21	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	paola Lopez Rojas

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

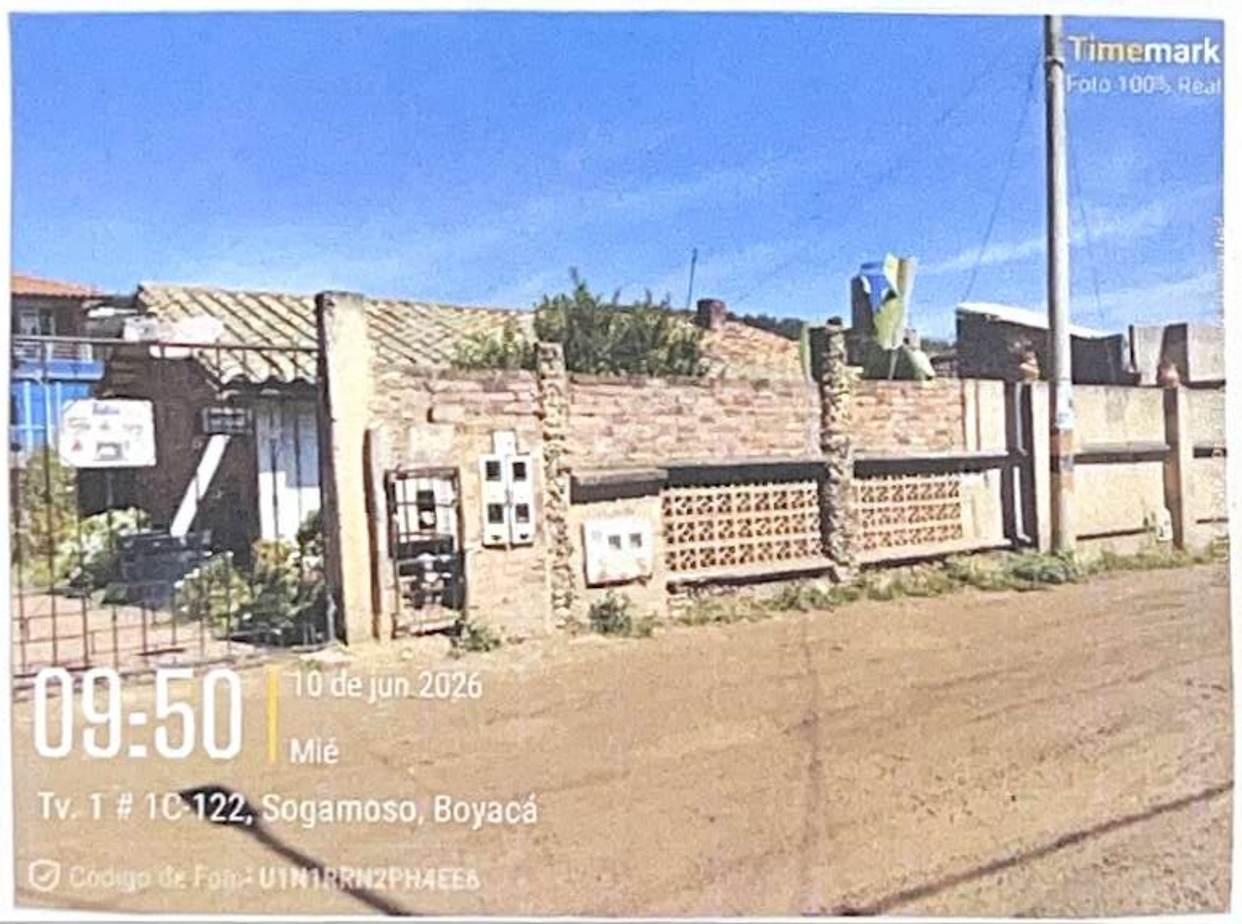

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Alba Silena Girón Fernandez		
DIRECCIÓN	Transversal 1 # 13		
TELÉFONO	3113280077	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	20 metros	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	X	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?	X	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Durante la inspección se evidencia un estado general de conservación regular, observando desgaste propio por uso y antigüedad de los materiales en el cerramiento se evidencian fisuras finas y grietas superficiales en elementos revestidos, perdida de acabado manchas de humedad y deterioro de algunos elementos. Se anexa evidencia fotografica.

Firma Alba S. Girón F.
Nombre: Alba Silena Giron Fernandez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT
Arrendatario

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631						Hoja	1	de
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA								
CONTRATISTA:	Wer Ingeniería S.A.S								
INTERVENTOR:	Lursa Ingeniería y Construcciones S.A.S								
REGISTRO No.	22	FECHA	09 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas		REVISÓ	Paola Lopez Rojas	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Isabel Alvarado		
DIRECCIÓN	Transversal 1 2 A 39 - SUR		
TELÉFONO	3180877769	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8 metros	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	X	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?	X	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL	✓	URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Inmueble con Cerramiento en mampostería y acceso metalica. se evidencian Fisuras capilares, desgaste superficial de acabados, manchas de humedad y deterioro localizado con desprendimiento en borde de acceso condiciones registradas en evidencia fotografica durante la visita; se constata inspección desde el frente de la vivienda.

Firma
Nombre: María Isabel Alvarado
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 46671842

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

625

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :			20260631				Hoja	1	de
OBJETO:			MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA						
CONTRATISTA:			Cver ingenieria S.A.S						
INTERVENTOR:			Lypsa Ingenieria y Construcciones S.A.S						
REGISTRO No.	23	FECHA	10 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Izabelina Oroz		
DIRECCIÓN	Transversal 1 #2A-43		
TELÉFONO	No suministra	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8 metros	ESTRATO	1 bajo

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	X	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?	N/A	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en mamposteria pañetada con desgaste superficial de acabados, manchas de humedad y presencia de acometidas de servicios publicos, Acceso en concreto con empozamientos localizados, perdida superficial de acabado y deterioro puntual de bordillos. Evidencia fotografica anexada.

Firma
Nombre: 3344699
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre: William Eduardo Ropas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paula Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

929

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

Hoja 1 de

CONTRATO No. :	20260631						
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA						
CONTRATISTA:	WER Ingeniería S.A.S						
INTERVENTOR:	Lopsa Ingeniería y Construcciones S.A.S						
REGISTRO No.	24	FECHA	10 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	Paola Lopez Rojas

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Campo Elias Ordoz Vargas		
DIRECCIÓN	Transversal 1-2A 49 Sur Vereda		
TELÉFONO	3208334102	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	8 metros	ESTRATO	2 bajo

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	✓	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	N/A	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada con presencia de humedad en zocalo y area de aacometidas, desgaste superficial de acabados y fisuras menores en anden y bordillos. Registro realizado junto con evidencia fotografica previo a la inspección.

Firma Campo Elias Ordoz
Nombre: -
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 9518.907 sogamoso

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

623

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631						Hoja	1	de
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA								
CONTRATISTA:	Wer Ingeniería S.A.S								
INTERVENTOR:	Lupsa Ingeniería y Construcciones S.A.S								
REGISTRO No.	25	FECHA	10 06 2026	ELABORÓ	Alejandra Rojas	REVISÓ	paola Lopez Rojas		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se registran manchas de humedad ascendentes en la zona de la fachada, con afectación localizada del revestimiento superficial, fisuras finas en el parete, suciedad adherida y desgaste del anden perimetral. Se realizo inspeccion externa de la vivienda.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre: William Eduardo Rojas Africano
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: MGI-01-07-F-29	ACTA DE VECINDAD	FECHA: 2011/12	VERSION 1

CONTRATO No. :	20260631					Hoja 1 de	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA- LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA						
CONTRATISTA:	Avel ingeniería S.A.S						
INTERVENTOR:	Lupsa ingeniería y construcciones S.A.S.						
REGISTRO No.	216	FECHA	10 06 2026	ELABORÓ		REVISÓ	Paola Lopez Rojas

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luz Mery Alvarez		
DIRECCIÓN	Transversal 1 2 A 63		
TELÉFONO	3103541003	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	6 metros	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	✓	
ALCANTARILLADO	✓	
ENERGÍA	✓	
TELÉFONO	X	
GAS	✓	
TELEVISIÓN - CABLE	✓	
OTRO - ¿CUAL ?	X	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL ?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se observan fisuras en fachadas, manchas localizadas de humedad, desprendimiento de pañete y desgaste general de acabados. Asimismo, se observan fisuras menores en el acceso peatonal. Inspección realizada de forma externa.

Firma	Luz Mery Alvarez Cuellar	
Nombre:	Luz Mery Alvarez	William Eduardo Rojas Africano
	PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA
C.C. / NIT	46.363382	

Firma
Nombre: Paola Lopez Rojas
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

679

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2026/02	VERSIÓN:09

COPIA CONTROLADA

FECHA:	29 de julio de 2026			**INFORME No.:**	1
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	LP-MS-0012026	**No. CONTRATO:**	20260631	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA PÚBLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S R.L./ PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS			**CARGO:** **No. DE TELÉFONO:**	INTERVENTOR 312 479 3095
CONTRATISTA:	WER INGENIERÍA SAS			**C.C. O NIT:**	900.943.507-3
E-MAIL:	ingenieriawrtecnica@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	320 491 4210
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO			**C.C.:**	9.534.232
OBJETO CONTRACTUAL:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	17-jun-2026	**DESDE:**	N/A	**DESDE:**	17-jun-2026
TERMINA:	16-dic-2026	**HASTA:**	N/A	**HASTA:**	16-jul-2026

INFORMACIÓN TÉCNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

a. Para prestación de Servicios:

	RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	El contratista se obliga para con el municipio, a realizar las actividades enmarcadas dentro del objeto del contrato y el presupuesto, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el estudio previo, contrato, propuesta, y demás documentos que hacen parte integral del contrato, acompañados de los respectivos manuales de operación y/o funcionamiento y garantías comerciales cuando a ello haya lugar.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
2	Constituir las garantías que cumplan el cubrimiento de los riesgos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
3	Notificar a la entidad contratante la ampliación del plazo y/o monto de las garantías cuando se requiera debido a la prórroga, adición o modificación del contrato.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LOS INFORMES QUE LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO Y QUE ES PARTE DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL
4	Destinar los recursos aportados por la entidad contratante exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente contrato, en este sentido deberá presentar informes sobre el avance de la obra con base a la programación y control al flujo de caja, cuando lo requiera el supervisor	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
5	Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, y efectuar la correcta entrega de la obra con base a los criterios de calidad exigibles y las especificaciones técnicas y normativas de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados en el presupuesto de obra y dentro del plazo establecido en el presente estudio previo.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
6	Mantener registros fotográficos y documentos de todas sus actividades	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
7	Realizar recibos parciales y totales de las obras mediante actas de pago, entrega y recibo, así como socializar con la entidad contratante antes, durante y después de la ejecución de los proyectos.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LOS INFORMES QUE LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO Y QUE ES PARTE DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL
8	Conservar de manera independiente y segura todos los documentos relacionados con los aspectos jurídicos, contables que se generen en desarrollo del contrato sujetándose en lo pertinente a las normas vigentes aplicables	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
9	Presentar informe final técnico y financiero de ejecución y demás documentos requeridos para la liquidación.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
10	Notificar a la entidad contratante de forma anticipada a su ejecución las obras adicionales y extras que se requieran, y toda modificación necesaria para el normal desarrollo de la misma, las cuales se someterán a la aceptación final del municipio de Sogamoso.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
11	Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
12	Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia o en la Ley.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
13	Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine la entidad contratante, dentro del plazo del contrato.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
14	Suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de las actividades descritas en el Contrato.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
15	Abstenerse de divulgar la información que llegue a conocer con ocasión de la ejecución de este contrato, a personal no autorizado por el municipio de Sogamoso.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
16	El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el contratista, quien verificará que el mismo se encuentre calificado de acuerdo con cada una de las actividades a desarrollar y según las disposiciones legales vigentes en Colombia. La empresa contratante no adquiere con personal de la obra ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
17	Durante la ejecución del contrato, el contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes del dueño del proyecto, el supervisor y de terceras personas.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
18	El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Municipio de "Sogamoso" y la ciudadanía, antes del inicio de la obra, cuyo costo deberá incluirse dentro de los costos indirectos (A.I.U.) del contrato, por lo tanto, no tendrá ítem de pago. Así como de los elementos de seguridad industrial que requiera el personal que labora en la obra, tales como: cascos, tapabocas, guantes, gafas, botas, etc. Será obligación de la supervisión velar porque se cumpla esta disposición.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
19	Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013 Compilado por el Decreto 1072 de 2015, y el Decreto 1273 de 2018, con relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. (salud, pensión y Riesgos Laborales y parafiscales), al personal de obra.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
20	El contratista deberá informar al Interventor o supervisor, dentro del plazo y en la forma establecida, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
21	Conforme a la Ley 2119 de 2021 corresponde al municipio promover la inserción laboral de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad que sean profesionales, técnicos o tecnólogos. Siendo esta la situación, se constituye como obligación del contratista de obra que durante toda la ejecución del contrato vincule un mínimo de jóvenes equivalente a no menor del 8% del total del personal que va a requerir en la ejecución de todo el contrato. Para el efecto, se hace saber que los perfiles de los jóvenes a vincular deben acreditar formación profesional, técnica o tecnóloga que le permita desempeñar cualquiera de los siguientes roles dentro de la ejecución del contrato así: 1. Técnico o tecnólogo en construcción de obras civiles. 2. Ingeniero civil y/o arquitecto. 3. Profesional o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. 4. Técnico o tecnólogo en operación de maquinaria pesada.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA
22	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.	PAGO PARCIAL N° 01	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE OBLIGACIÓN ESPECIFICA

Otras Observaciones:	

b. Para los demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Gq3j8355hpqjpWZgOUBwh5-AvGQyL2E0/view

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar	[X] 4. Certificación de Parafiscales	[X]
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	[X] 5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	[ ]
3. Planilla de pago de la Seguridad Social integral	[X] 6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	[ ]

NIT: 891.655.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

PORCENTAJE:	19,42%	No. FACTURA O SOPORTE:	FE N° 80

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
JUNIO — 2026	9507899647	$ 8.251.400,00	$ 2.292.000,00	$ 3.693.400,00	**$ 14.236.800,00**

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL	VALOR PAGO ACTUAL
6.02.02.02.005.004.03.01-16-24-2402-157590001	BPIN 2025157590001 MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRA LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO/ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 329.293.209,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2026000001	226	$ 329.293.209,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO (APORTES DEL MUNICIPIO)

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 1.695.820.634,00	
(+) Valor adiciones	$ 0,00	
(-) Valor reducciones	$ 0,00	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.695.820.634,00	
(-) Anticipo		$ 0,00
(-) Valor pagos parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar		$ 329.293.209,00
(-) Valor sin ejecutar		$ 1.366.527.425,00
SUMAS IGUALES	**$ 1.695.820.634,00**	**$ 1.695.820.634,00**

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 329.293.209,00	Valor en letras:	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO (APORTES DEL CONTRATISTA)

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor aporte inicial	$ 0,00	
(+) Valor adiciones	$ 0,00	
(=) VALOR TOTAL DEL APORTE	$ 0,00	
(-) Anticipo		$ 0,00
(-) Valor aportes parciales ejecutados		$ 0,00
(-) Valor aporte acutal		$ 0,00
(-) Valor sin ejecutar		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**	**$ 0,00**

NOTA: Este recuadro solo se utilizará para convenios donde existen aportes de otras entidades, entidades sin ánimo de lucro, juntas de acción comunal y/o donde se realicen aportes.

Para constancia suscribimos:

LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L./ PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS
INTERVENTOR

WER INGENIERÍA SAS
R.L. WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO
CONTRATISTA

HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO
Secretario De Infraestructura y Proyectos

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 80

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086542974 que habilita desde FE 51 hasta FE 100. Vence 2026-12-31

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7110 6.00 X 1000

WER INGENIERIA S.A.S

Nit 900943507 3

CLIENTE	MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT	891855130 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	EMAIL CLIENTE
5 12 P 7 ED TOR	Sogamoso	7702040	tesoreria@sogamoso-boyaca.gov.co

POR CONCEPTO DE
COBRO DE PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO N° 20260631 QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2026	29/07/2026	WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Servicio de Obra: COBRO DE PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO N° 20260631 QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,00	Und.	255.758.432	0%	0	255.758.432,00
2	Administración 21%	1,00	Und.	53.709.271	0%	0	53.709.271,00
3	Imprevistos 1%	1,00	Und.	2.557.584	0%	0	2.557.584,00
4	Utilidad 5%	1,00	Und.	12.787.922	0%	0	12.787.922,00
5	PMT	1,00	Und.	4.480.000	0%	0	4.480.000,00

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 5

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ 0,00

SUBTOTAL	**329.293.209,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**329.293.209,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**329.293.209,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 16:03:28

CR 24 16 77 OFICINA CENTRAL Teléfono 3204914210

Correo Electrónico ingenieriawrtecnica@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71a543fdd05d90c5b67fae13cb94cbf072c91ee0bb1953b8b5cd72f6c2f4dee755666761bf04614082a8303d05c1f687 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2026 5:52:35 p. m.

Contrato No. 20260631

En Sogamoso, a los 16 días del mes de julio del 2026, se reunieron, **ING HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO**, en calidad de secretario de Infraestructura y Proyectos, **LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**, con Nit. 901.525.021-7, representada legalmente por **PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS,** identificada con cedula de ciudadanía No. 46.377.602 De Sogamoso, en calidad de interventoría y **WER INGENIERÍA SAS**, con Nit. 900.943.507-3, representada legalmente por **WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.534.232 De Sogamoso, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibido a satisfacción del acta **Parcial N° 01**, así:

CONTRATO No. 20260631	TIPO	**CONTRATO DE OBRA**		
	Fecha de suscripción del contrato	AÑO	MES	DIA
		2026	**05**	**20**

Objeto del Contrato:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**					
Supervisor:	**N/A**					
Interventor:	**LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** R.L./ PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS					
Contratista:	**WER INGENIERÍA SAS** R.L. WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO					
Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:			
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
2026	**06**	**17**	**2026**	**12**	**16**	
Fecha Acta de Suspensión N° 01:			**N/A**			
Fecha Acta de Reinicio N° 01:			**N/A**			
Valor del contrato:	**$ 1.695.820.634,00**		Valor Adicional: **N/A**			
Valor Ejecutado:	**$ 329.293.209,00**					
Plazo del contrato:	**SEIS (06) MESES**		Prórroga N° 01: **N/A**			
Duración del contrato:	**SEIS (06) MESES**					
No. Registro Presupuestal:	**226** (17/06/2026)	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:			
		6.02.02.02.005.004.03.01-16-24-2402-157590001	BPIN 2025157590001 MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRA LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO/ASIGNACIONES DIRECTAS			
Observaciones:	**COBRO DE ACTA PARCIAL N° 01**					

Contrato No. 20260631

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El municipio de Sogamoso declara que ha recibido a satisfacción el cumplimiento del objeto contratado, declaran las partes que el balance financiero del negocio se realizara en el Acta de Liquidación parcial respectiva de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

WER INGENIERÍA SAS
R.L. WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO
Contratista

Vo. Bo. **LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
R.L./ PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS
Interventoría

Vo. Bo. **HELBER DANILO MARTÍNEZ**
Secretario de Infraestructura y Proyectos

Via. Monguira - La Reforma.

Contrato 20260631

Ubicacion Via monguira - La reforma

Direccion: via monguira - La reforma

Objeto del Contrato: Mejoramiento de la via monguira - La Reforma. etapa 01 en el municipio de sogamoso. - departamento de Boyaca

Valor: $ 1.695 820.634

Plazo del contrato. SEIS. (6) meses.

Terminacion del contrato. 16/12/2026.

Entidad Contratante: Municipio de Sogamoso

Contratista: Wer ingenieria SAS

Interventor: Lupsa ingenieria. y construcciones sas.

Residente: Ing. Diego. Fernando Oduz Rojas
Obra.

Fecha de Inicio: 17/06/2026.

17/jan/2020 Miercoles

Hora de Entrada: 7:00 am. Hora de Salida 4:00 pm

Personal En obra Residente de obra - SST

· Maestro de obra - Ayudantes (2)

· Director de obra -

Clima: cielo parcialmente nublado.

Actividades Ejecutadas Se hace Reconocimiento de obra Tramos iniciales, señalizacion de obra y Socializacion con la comunidad vecina se adelanto la localizacion y Replanteo de los pozos 250 mL.

Observaciones:

Residente de obra.

Supervisor o Interventor.

18/Jul/2022 Jueves.

Hora de Entrada 7:00 am. Hora de Salida 4:00 pm.

Personal En obra: Residente
: Maestro
: Topografía
: SST
: Interventoría
: Ing. Ambiental
: Operador Retroexcavadora
: Conductor de Volqueta

clima: parcial parcialmente nublado

Actividades: Se señaliza obra
: Se socializan los predios en los cuales se va hacer la disposición de los materiales de excavación.
. Se pasan niveles se inicia excavación mecánica.
.

Observaciones:

Residente de obra

Supervisor y Interventor

18/Jun/2026 Viernes.

Hora de Entrada: 7:00 am Hora de Salida 4:00 pm

Personal de obra: Residente
: Maestro
Topografia
: SST
: Inteventoria
: Ing. Ambiental
: Operador de Retroexcavadora
: Operador de vibrocompactador
: Conductor Volqueta
: Ayudantes de obra

Clima: parcialmente nublado

Actividades: Se continua con la señalizacion de obra
- Se continua con la Excavacion mecanica
- Se continue sacando material
- Se continua poleando niveles
- Se hace demolicion de anclajes existentes frente al colegio
- Se inicia a compactar subrasante para vias

Observaciones:

Residente de obra

Supervisor e Interventor

20/jun/2020 Sabado

Hora de Entrada: 7:00 am Hora de Salida: 14:00 pm

Personal en obra: Residente de obra
- maestro
- Topografia
- Inventario
- SST
- operadores de maquinaria
- Conductores
- Ayudantes de obra
- Ing. Ambiental

Clima: Soleado

Actividades: Se continua con Señalizacion de obra
- excavacion mecanica y retirando material de excavacion asi como compactando la subrasante, se hace demolicion de cuneta frente al colegio y frente al

Observaciones:

Residente de obra

Fotointerventor

21/Jun/2020 Domingo

Dia no Laboral

22/Jun/2020 Lunes.

Hora de Entrada: 700 am Hora de Salida 4 00 pm

personal en obra Residente
maestro
Topografia
SST
Ing Ambiental
Interventoria
Operadora de maquinaria
Conductores
Ayudantes de obra

Clima: Soleado

Actividades: Se señaliza obra se continua con la Excavacion mecanica y retirando material de excavacion, se inicia la nivelacion de base granular y compactación de la misma asi como de subrasante se identifican fallas existentes en la primeras 50 mL y se inician a Retirar y mejorar con piedra

Residente de obra

Interventoria

23/Jun/2020 Martes

Hora de Entrada 7:00 am Hora de Salida 4:00 pm

Personal en obra: Residente
- Maestro de obra
- Topografo
- SST
- Inspectora
- Operadores de maquinaria
- Ing Ambiental
- Ayudantes de obra
- Conductor Volquete

Clima Soleado

Actividades: Se continua señalizando, excavando mecanicamente y retirando el material asi como nivelando con base granular y compactando la misma asi como la subrasante se hace las mejoramiento de fallas existentes el dia con piedra

Observaciones

Residente de obra

Inspectora de obra

29/Jun/2020 Miercoles

Hora de Entrada 7:00 am Hora de Salida 4:00 pm

Personal en obra Residente
maestro de obra
topografo
SST
Inspectora
Operadores de maquinaria
Ing Ambiental
Ayudantes de obra
Conductor de Volqueta

Clima Soleado

Actividades Se continua con la excavacion mecanica y retirando el material de excavacion asi como nivelando con base granular y compactando la misma asi como la subrasante se hace demolicion de anden y tubo de hormigon presente en la via

Observaciones

Residente de Obra

Interventor de obra

25/Jun/2020 Jueves

Hora de Entrada 7:00 am Hora de Salida 5:00 pm

Personal en obra: Residente de Obra
: maestro
: topografia
: SST
: Inventario
: operadora de maquinaria
: Ing. ambiental
: Ayudante de obra
: Conductora

Clima: Soleado.

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y retirando los sobrantes de excavacion se continua con la nivelacion de base granular asi como con la compactacion de la subrasante, se inicia la excavacion manual para la instalacion de sardinel A-10

Observaciones.

Residente de obra

Inventaria

26/Jun/2020 Viernes

Hora de Entrada 7:00 am Hora de Salida 4:00 pm

Personal en obra Residente
: maestro
: topografia
: SST
Interventoria
Operador de maquinaria
: Ing Ambiental
Ayudante de obra
Conductores

Clima Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y retirando el material de la excavacion se continua nivelando y compactando via y subrasante. asi como base granular se continua con excavacion manual y instalacion de Sardinel A-10

Observaciones:

Residente de Obra

Interventoria

27/Jn/2024 Sabado

Hora de Entrada 7:00 am

Hora de Salida: 11:00 am

Personal en obra: Residente de obra
: maestro
: Topografia
: SST
: Interventoria
: operadora de maquinaria
Ing ambiental
: Ayudantes de Obra
Conductores

Clima Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y el retiro de escombros asi como el relleno con base granular y compactacion de la misma y de la subrasante, se continua con la excavacion manual e instalacion de sardinel A-10, se inicia la instalacion y nivelacion de final asi como instalacion de adoquin.

Observaciones

Residente de obra

Interventoria

28/Jun/2026 Domingo

Dia no Laboral

Personal en obra: N/A.

29/Jun/2026 Lunes. Dia Festivo
Dia no Laboral
Personal en obra / N/A.

30/Jun/2026 Martes
Hora de Entrada 7:00 am Hora de Salida 4:00 pm.

Personal en obra: Residente de obra
: maestro
: topografo
: SST
: Interventoria
: Operador de maquinaria
: Ing ambiental
: Ayudante de obra
: Conductores

Clima: Soleada:

Actividades: Se continua con la excavacion manual y el retiro de material de excavacion, se continua con el relleno y nivelacion de base granular, asi mismo con la compactacion de la misma y de la subrasante e instalacion badillo A-10 se radica formalmente el contrato de concesion vial la Arboma a ver ingenieria sas

Residente de obra

Interventoria

01/Jul/2020 Miercoles

Hora de Entrada. 7:00am Hora de Salida: 5:00pm.

Personal en obra: Residente de obra
: maestro
: Topografo
: SST
: Ing ambiental
: Operadores
: Conductores
: Ayudantes.

Clima: Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y el retiro de material de excavacion. asi como la excavacion manual para instalacion de sardinel tipo A-10 y instalacion de tuberia para sumideros. Se continua con la instalacion de pinn para instalacion de adoquin en los primeros 100 ml de obra

Observaciones

Residente de obra

Interventoria.

02/jul/2026. Jueves

Hora de Entrada: 7:00 am Hora de Salida: 4:00 pm

Personal en obra: Residente de Obra
- maestro
- Topografo
- SST
- Ing ambiental
- Operadores
- Interventoria
- Conductores
- Ayudantes

Clima Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y el retiro de material de excavacion asi como la instalacion y compactacion de base granular y de subrasante, se continua con la excavacion mecanica para instalacion de tuberia de Sumideros y sardinel #10. Se deja señalizado la obra al finalizar labores

Observaciones

Residente de obra

Interventoria

03/11/2016 Viernes

Hora de Entrada 7:00 am Hora de Salida: 4:00 pm

Personal en obra: Residente de obra
: maestro de obra
· Topografo
SST
· Interventoria
· Operador de maquinaria
· Ing ambiental
: Ayudantes
: Conductor de Volqueta

Clima: Nublado

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y el retiro de material resultante de excavacion, se continua con excavaciones manuales de Sardinel A-10 y tuberia de sumideros. Se continua con la demolicion de andenes y losa de hormigon se continua extendido fino e instalando adoquin

Observaciones

Residente de Obra

Interventoria

04/jul/2026 Sabado

Hora de Entrada: 7:00 am Hora de Salida 4:00 pm

Personal en obra: Residente de obra
: maestro de obra
: topografo
: SST
: Inteventoria
: Operador de motoniveladora
: Ing. Ambiental
: Ayudante
: Conductor Volqueta

Clima Nublado.

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y el retiro de materiales resultantes de la misma ademas de la excavacion manual para la instalacion de sardinel A-10 y tuberia de sumideros, se extienden finas en la via y se extiende final bajo sardinel se continua con la instalacion de adoquin

Observaciones

Residente

Interventoria

05/Jul/2026 Domingo.

Dia no Laboral

06/Jul/2026 Lunes

Hora de Entrada: 7:00 am. Hora de Salida 4:00 pm

Personal En obra: Residente de obra
= maestro de obra
- Topografia
- SST
- Interventoria
- Operador de maquinaria
- Ayudantes
- Conductor de Volqueta

Clima Soleado

Actividades. Se continua con la excavacion mecanica y el retiro del material resultante asi como la excavacion manual para sardinel A-10 y tubos de sumideros, se continua extendiendo base en la via para instalacion de adoquin e sardinel A-10

Observaciones

Residente

Interventoria

9/Jul/2026 Martes

Hora de Entrada: 7:00 am Hora de Salida: 4.00 pm

Personal En obra: Residente de obra
maestro de obra
Topografia
SST
Interventoria
Operador de maquinaria
Ayudantes
Conductor de Volqueta

Clima: LLuvioso.

Actividades: Se continua con la excavación mecanica y el retiro de material de excavación asi mismo se continua la excavacion manual para sardinel A-10. y se extiende firme para continua con la instalación de Adoquin.

Observaciones

Residente

Interventoria

05 08/Jul/2026 Miercoles

Hora de Entrada: 7:00 am Hora de Salida: 4:00 pm

06,

Personal En Obra Residente
- maestro
- Topografia
- SST
- Inventario
- Ing Ambiental
- Operadores
- Conductor volquete
- Ayudantes

Clima: Lluvioso.

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y el retiro del material sobrante, asi como de la excavacion manual resultante de la instalacion del Sardinel A-10 se continua instalando fino y adoquin en la via.

Observaciones

Residente

Interventora

09/1/2026 Jueves

Hora de Entrada: 7:00 am Hora de Salida: 5:00 pm

Personal en obra: Residente
maestro
Topografía
SST
Interventoría
Ing ambiental
Operadores
Conductor Volqueta
Ayudante

Clima. Lluvioso.

Actividades. Se continuo con la excavacion mecanica y el retiro de material asi como de la excavacion mecanica y manual de la instalacion de sardinel A-10 se continuo con la instalacion de Finos y adoquin en via

Observaciones

Residente

Interventoria

10/Jul/2016 Viernes.

Hora de Entrada. 7:00am. Hora de Salida: 4:00 pm

Personal en Obra Residente
- maestro.
- Topografia
- SST
- Ing Ambiental
- Interventoria
- Operadores de maquinaria
- Conductor de Volqueta
- Ayudante.

Clima. Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y manual para vra y sardinel A-30 se continua instalando y compactando base granular y subbase se continua extendiendo pisos en vra para dale continuidad a la instalacion de adoquin

Observaciones

Residente de Obra

Interventoria

11/Jul/2026 Sabado

Hora de Entrada 7:00 a.m. Hora de Salida 4:00 p.m.

Personal en obra: Residente
maestro
Topografia
SST
Ing Ambiental
Interventoria
Operador de maquinaria
Conducta de Volqueta
Ayudante

Clima: Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y manual para via y sardinel A-10 se continua instalando y compactando base granular y subrasante a si como fundida en via para dale continuidad a la instalacion de adoquin

Observaciones

Residente de Obra

Interventoria

12/Jul/2026 Domingo

Dia no Laboral

13/Jul/2026 Lunes Festivo

Dia no Laboral

14/Jul/2026 Martes

Hora de Entrada: 7:00 am Hora de Salida: 4:00 pm

Personal en obra: Residente - maestro de obra
· Topografia - SST
· Ing Ambiental - Interventoria
- Operadores - Conductores
- Ayudantes

Clima: Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y manual para la via se instalacion de sadinel A-10 se continua instalando y compactando subrasante y base granular se sigue extendiendo finos y instalando adoquin en via

Observaciones

Residente de obra

Interventoria

15/Jul/2026 Miercoles

Hora de Entrada 7:00 am Hora de Salida: 4:00 pm

Personal en obra: Residente
: maestro
: Topografia
: SST
: Interventoria
: Ingambiental
: Operadores
: Conductores
: Ayudantes

Clima soleado

Actividades: Se continua con la excavación mecanica y manual para instalacion de base granular y sodinel A-10. se continua instalado y compactado base granular como fina para la instalacion de adoquin

Observaciones

Residente de obra

Interventoria

16/Jul/2026 Jueves

Hora de Entrada: 7:00am Hora de Salida: 1:00pm

Personal En obra: Residente
: maestro
: Topografia
: SST
: Ing ambiental
: Interventoria
: Operadores
: Conductores
: Ayudantes

Clima: Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica y Retiro del material resultante de la misma asi mismo se sigue con la excavacion manual para la instalacion de Sardinel A-10 se continua suministrando y compactando base granular y subrasante y fina en via para instalacion de adoquin

Observaciones

Residente de Obra

Interventor

17/Jul/2026 Viernes / No Laboral

18/Jul/2026 Sabado / No Laboral

19/Jul/2026 Domingo / No Laboral

20/Jul/2026 Lunes Festivo / No Laboral

21/Jul/2026 Martes
