Municipio de Pensilvania NIT 890801137-7	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GG-022 Versión:1 Fecha de Modificacion: 20/03/2025

ACTA DE SUPERVISION N° 01

FECHA DEL ACTA 11/8/2026

Concepto	Descripción			
N° DEL CONTRATO	C-215-2026	**TIPO DE CONTRATO**		CONVENIO SOLIDARIO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	811	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		1134
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal de Los Medios	**NIT / CC:**		901017609-8
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS MEDIOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN CONCRETO EN VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA			
VALOR CONTRATO	$71.777.483	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**
VALOR ADICIÓN (1)		Aporte Municipio:		$64.153.483
VALOR ADICIÓN (2)		Otros aportes:		$7.624.000
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/07/2026	Fecha de Terminación inicial	23/10/2026
	Plazo (días)	90 días		
	Prórroga N° (días)	0	Nueva fecha de terminación	
POLIZAS (SI, APLICA)	N° de póliza	CHU 100016152 – CHU 100084326		
	Número de anexo	0		

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato: (APORTE ALCALDÍA)		$ 64.153.483
Valor de la Adición N°.	$ -	$ 0
Valor de la Adición N°.	$ -	$ 0
Valor de la Adición N°.	$ -	$ 0
Valor Final del contrato		**$ 64.153.483**
Valor Acta Nro. 01	$ 32.076.742	$ 32.076.742
Valor Acta Nro. 02	$ -	
Valor Acta Nro. 03	$ -	
Valor Acta Nro. 04	$ -	
Valor Acta Nro. 05	$ -	
Valor Acta Nro. 06	$ -	
Valor Acta Nro. 07	$ -	
Valor Acta Nro. 08	$ -	
Valor Acta Nro. 09	$ -	
Valor Acta Nro. 10	$ -	
Valor Acta Nro. 11	$ -	
Valor pagado	$ 32.076.742	
SALDO CONTRATO	$ 32.076.742	
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		$ 0,00
Amortización del Anticipo Acta 1	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 2	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 3	$ -	
Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

OBSERVACIÓN: Se adjunta la cuenta de cobro No. 001, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

FIRMA
Alejandro Urrea Gomez
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente
Supervisor

Proyectó: María Paula Jaramillo Lopera
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONVENIO No. 215 - 2026	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	11 AGOSTO DE 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	C-215-2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAC LOS MEDIOS				
NIT	901.012.910-8				
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY YOHANA CIFUENTES AGUIRRE				
CC	901017609-8				
OBJETO DE CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS MEDIOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN CONCRETO EN VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.				
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($71.777.483 M/L)				
VALOR POR LA ADMINISTRACIÓN	SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($64.153.483 M/L)				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	3 MESES	FECHA INICIACIÓN	24/07/2026	FECHA TERMINACIÓN	23/10/2026
PRÓRROGA	0 DÍAS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		0	
PERIODO DEL INFORME	24/07/2026		HASTA		11/08/2026

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)	NIVEL DE AVANCE %

Localización y replanteo	La actividad se ha desarrollado conforme a lo estipulado en los diseños, permitiendo definir los ejes y niveles del proyecto para orientar las siguientes fases constructivas. Se realizó el trazado y marcación del área de intervención de manera precisa y acorde con la topografía del terreno.	50%
Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera	Se ha iniciado la excavación del terreno natural hasta alcanzar el nivel de subrasante, cumpliendo con las especificaciones técnicas. El material sobrante está siendo retirado y transportado adecuadamente a sitio autorizado para su disposición.	50%
Conformación de subrasante	Se adelanta la adecuación y compactación del terreno excavado, buscando garantizar una base estable para la colocación de capas superiores. Se emplea maquinaria adecuada y controles de humedad y densidad para asegurar la calidad de la conformación.	50%
Suministro, transporte e instalación de afirmado compactado	Se inició la colocación del afirmado sobre la subrasante conformada, garantizando la compactación en capas y conforme a los parámetros establecidos en el diseño estructural. El material está siendo suministrado desde fuentes autorizadas y cumple con las características granulométricas requeridas.	50%
Suministro, transporte e instalación de acero ¼ de pulgada (varilla de 6 metros de longitud)	Se ha iniciado la distribución y ubicación del acero de refuerzo para las placas de concreto, en función del avance de la instalación de la base granular. La manipulación del material se realiza cumpliendo las medidas de seguridad y especificaciones técnicas.	50%
Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 15 x 15 cms - 4 m.m	Se ha iniciado la instalación de malla sobre las zonas donde ya se cuenta con base estabilizada y formaleta. La disposición se realiza con traslape adecuado y fijación según diseño estructural.	50%
Suministro, transporte e	Se ha realizado la fundida de placas en algunos tramos	50%

instalación de Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0.15 m - Placas y dentellones	donde ya se completó la instalación del acero y malla. El concreto cumple con los requisitos de resistencia y asentamiento especificados. El curado se realiza de forma controlada para asegurar el desarrollo de la resistencia.	
Suministro, transporte e instalación de concreto clase G: 60% concreto clase de y 40% piedra – Enrocado central	Se han iniciado los trabajos de colocación del enrocado en el sector central del proyecto. La mezcla se elabora conforme a lo indicado en el diseño y se dispone adecuadamente para garantizar estabilidad estructural.	50%

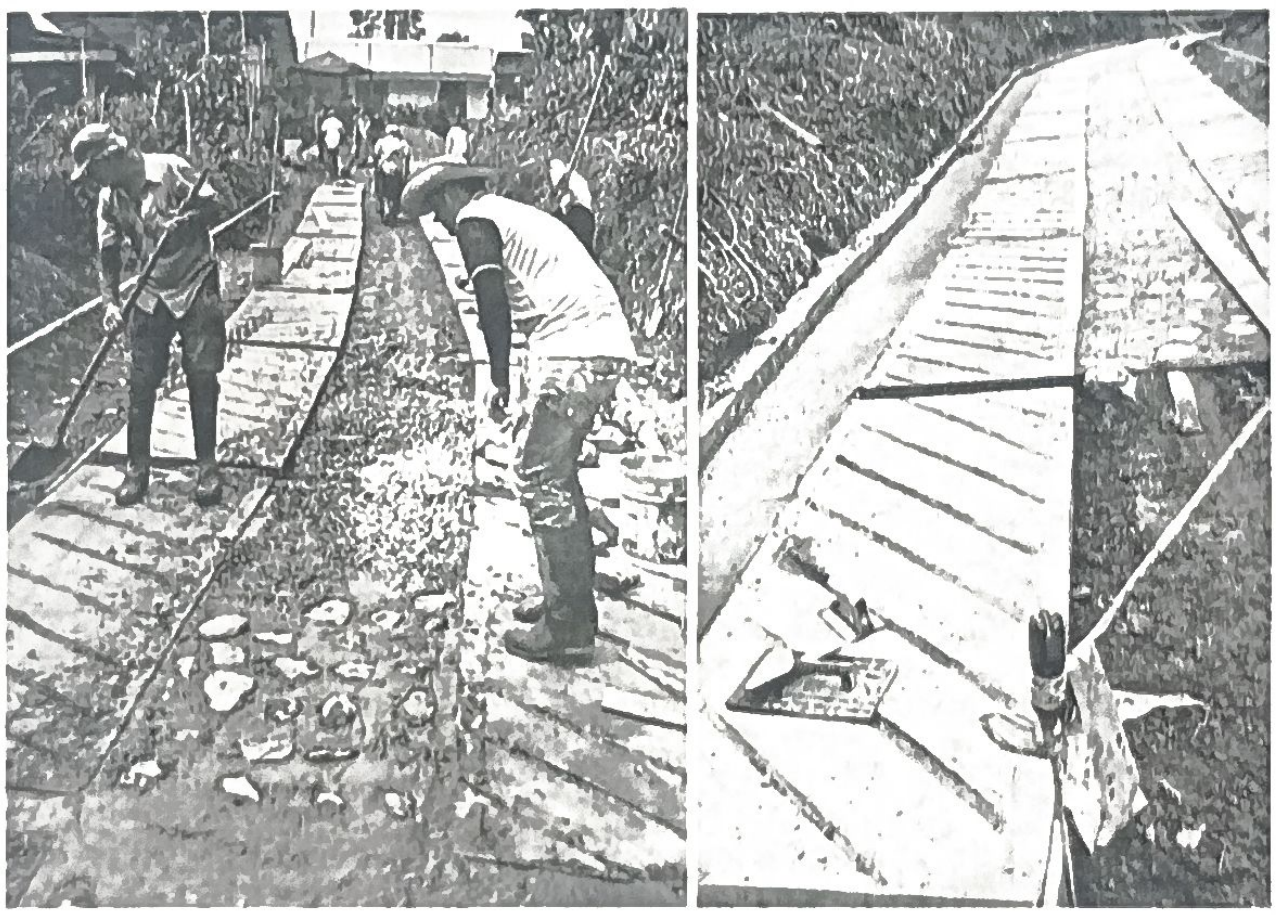

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. AUTORIZACIÓN	APORTES ($)
SALUD	N/A			
PENSIÓN	N/A			
ARL	N/A			

3. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta de AHORROS DE DAVIVIENDA No 1089-0066-9426

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta **Nro.** 001 lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los once (11) días del mes de agosto de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ALEJANDRO URREA GOMEZ** Secretario De Planeación Infraestructura Desarrollo Social Y Medio Ambiente Municipal	Firma:
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MARIA PAULA JARAMILLO LOAIZA Contratista	Firma:
